



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

## LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 25209/04-05-90

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

### RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 227-2023-MDK/GM

Kimbiri, 31 de Marzo de 2023

VISTO:

EL Informe N° 439-2023-GDTI-MDK/NPDL-G; Informe N° 452-2023-MDK-GM-OGSEI/VVC-D; Carta N° 008-2023-MDK-OGSEI/MHR-MAD1; Carta N° 011-2023-MDK-RME/SO; Carta N° 008-2023-MDK-GDTI-NPP/RO, respecto a la Solicitud de Aprobación del Cronograma de Ejecución Valorizado Reprogramado N° 02 del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1389 DIVINO JESUS DE LA LOCALIDAD DE IRAPITARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO CUSCO"; anexo documentos que forman parte integrante de la presente resolución en (33) folios, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, en cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Perú como señala el Art. 194° que a la letra dice: "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. //..."; Art. 195° que dice: "Los gobiernos locales promueve el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competencias para: 1.- Aprobar su organización interna y su presupuesto//...";

Que, Carta N° 008-2023-MDK-GDTI-NPP/RO, de fecha 17 de febrero de 2023, el Residente de Obra solicita al Supervisor de obra, la aprobación de la Actualización del Calendario de Avance de Obra Valorizado N° 02 Y Cronograma de Ejecución de Obra (CPM) N° 02, por reinicio de Obra N° 02 del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1389 DIVINO JESUS DE LA LOCALIDAD DE IRAPITARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION- DEPARTAMENTO CUSCO", quien previo análisis, concluye y recomienda de acuerdo a lo siguiente:

...//

**4.3 CUADERNO DE OBRA:**

ASIENTO N°195 DEL RESIDNETE DE OBRA con fecha 01 de febrero del 2023, se describe; esta residencia de obra pone conocimiento el Reinicio De Ejecución De Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 1389 DIVINO JESUS DE LA LOCALIDAD DE IRAPITARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO". Teniendo como antecedentes que esta obra da inicio su ejecución el 18 de agosto del 2022, teniendo un plazo de ejecución de 180 días calendarios, teniendo como fecha de culminación el 13 de febrero del 2023, se realizó la suspensión de obra n°01 por 21 días calendarios durante el periodo de 24 de agosto hasta 13 de setiembre modificando la fecha de culminación el 06 de marzo del 2023, se tiene un corte de obra por motivos de transferencia de gestión durante los periodos de 31 de diciembre del 2022 hasta el 31 de enero del 2023, modificando la fecha de culminación del proyecto al 07 de abril teniendo un plazo vigente de ejecución de obra de 66 días calendarios, encontrado un avance físico según informe de corte al 2022, en cuanto avance físico del expediente técnico principal de 12.48%, a si mismo se cuenta con una aprobación de adicional de obra n°01 por mayores metros y partidas nuevas por el monto de S/. 598,482.54 con RGM N° 0461-2022-MDK/GM, un reporte de avance físico ejecutado al 2022 de 3.93% a nivel de costo directo.


**4.4 CALENDARIO ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 02 Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (CPM) N° 02**

Se da Inicio de Obra el 18 de agosto del 2022 teniendo plazo vigente de 180 Días Calendarios, la suspensión de obra N°01 fue el 24 de agosto del 2022, por 21 Días Calendarios, y el reinicio de obra n°01 fue el 14 de Setiembre del 2022 y el corte de obra 30 de diciembre del 2022, hasta el 31 de enero del 2023 por 32 días calendarios, dando reinicio de obra n°02 el 01 de febrero del 2023 y se cuenta con la aprobación del ampliación de plazo N°01 por 56 días calendarios modificando la fecha de culminación de obra el 02 de junio del 2023.

**CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA - PROYECTO PRINCIPAL**

DESCRIPCION	MES-ANO	DIAS	MONTO POR MES	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE AVANCE FISICO	PORCENTAJE ACUMULADO AVANCE FISICO
			S/.	S/.	%	%
INICIO DE OBRA			-	-	0.00%	0.00%
VALORIZACION N° 01	AGOSTO DE 2022	VAL(18/08/22 AL 23/08/22)	52,173.06	52,173.06	2.10%	2.10%
VALORIZACION N° 02	SEPTIEMBRE DE 2022	VAL(14/09/22 AL 30/09/22)	38,064.95	90,238.02	1.53%	3.63%
VALORIZACION N° 03	OCTUBRE DE 2022	VAL(01/10/22 AL 31/10/22)	100,114.73	190,353.34	4.03%	7.66%
VALORIZACION N° 04	NOVIEMBRE DE 2022	VAL(01/11/22 AL 30/11/22)	66,272.45	256,625.80	2.67%	10.33%
VALORIZACION N° 05	DICIEMBRE DE 2022	VAL(01/12/22 AL 31/12/22)	91,512.83	348,138.63	3.68%	14.02%
VALORIZACION N° 06	FEBRERO DE 2023	VAL(01/02/23 AL 28/02/23)	92,261.47	440,400.10	3.71%	17.73%
VALORIZACION N° 07	MARZO DE 2023	VAL(01/03/23 AL 31/03/23)	210,065.30	650,465.40	5.50%	23.23%
VALORIZACION N° 08	ABRIL DE 2023	VAL(01/04/23 AL 30/04/23)	641,844.00	1,292,309.40	25.84%	49.07%
VALORIZACION N° 09	MAYO DE 2023	VAL(01/05/23 AL 31/05/23)	1,176,543.24	2,468,852.64	39.72%	88.79%
VALORIZACION N° 10	JUNIO DE 2023	VAL(01/06/23 AL 30/06/23)	203,817.88	2,672,670.52	8.21%	100.00%
			2,423,539.53			

Méstor Dipas Torres  
Acalde 2023 - 2026





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

## LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 25209/04-05-90

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

### CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA - ADICIONAL DE OBRA


DESCRIPCION	MES-AÑO	MES-AÑO DIAS	MONTO POR MES	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE AVANCE FISICO	PORCENTAJE ACUMULADO AVANCE FISICO
			S/.	S/.	%	%
INICIO DE OBRA			-	-	0.00%	0.00%
VALORIZACION N° 01	DICIEMBRE DE 2022	VAL(01/12/22 AL 31/12/22)	23,525.75	23,525.75	3.93%	3.93%
VALORIZACION N° 02	FEBRERO DE 2023	VAL(01/02/23 AL 28/02/23)	20,736.66	44,262.41	3.46%	7.39%
VALORIZACION N° 03	MARZO DE 2023	VAL(01/03/23 AL 31/03/23)	56,572.91	100,835.32	9.45%	16.85%
VALORIZACION N° 04	ABRIL DE 2023	VAL(01/03/23 AL 30/04/23)	279,839.20	380,674.52	46.76%	63.61%
VALORIZACION N° 05	MAYO DE 2023	VAL(01/05/23 AL 31/05/23)	217,808.02	598,482.54	36.39%	100.00%
			598,482.54		100.00%	

#### 4.5 ANÁLISIS:

Con RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°372-2022-MDK/GDTI, se **Aprueba El Cronograma Reprogramado De Ejecución De Obra N°01**, con fecha 10 de octubre del 2022.

Con RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°503-2022-MDK/GDTI, se **Aprueba El Cronograma Acelerado De Ejecución De Obra N°01**, con fecha 07 de diciembre del 2022.

Se cuenta con la aprobación de ampliación de plazo n°01 por 56 días calendarios ampliando al plazo contractual.

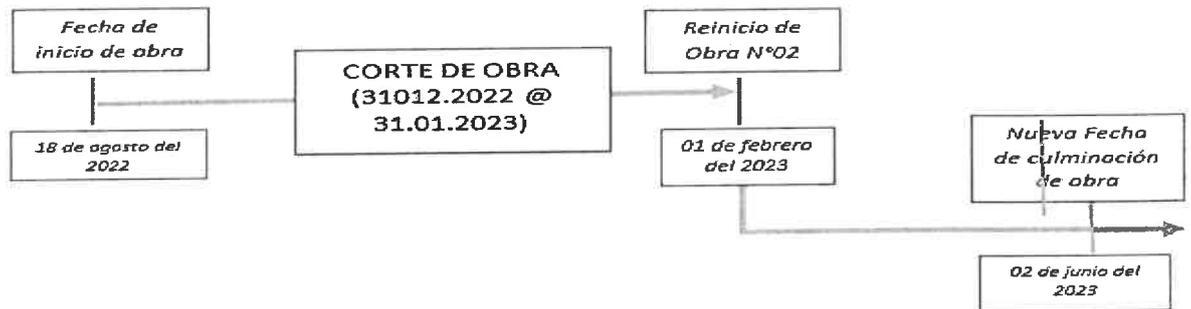

#### 5. CONCLUSIONES:

Por lo tanto: de acuerdo al análisis dado se SOLICITA AL SUPERVISOR DE OBRA, **APRUEBE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DE LOS CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 02, POR REINICIO DE OBRA N°02 DE 180 INCLUIDO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 POR 56 DIAS CALENDARIOS DONDE MODIFICA LA FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO EL 02 DE JUNIO DEL 2023.** EN CUMPLIMIENTO D.S. N°344-2018-EF, REGLAMENTO DE LA LEY N°30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, MODIFICADOS CON D.S. N°162-2021-EF AL ARTICULO 202. Y LA DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI, del proyecto; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1389 DIVINO JESÚS DE LA LOCALIDAD DE IRAPITARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

...//

Que, mediante Carta N° 011-2023-MDK-RME/SO, de fecha 20 de febrero de 2023, el Ing. Romeo Martínez Enciso Supervisor de Obra, remite al Director General de la Oficina de Supervisión y Evaluación de Inversiones, la aprobación del Cronograma de Actualización del Calendario de Avance de Obra Valorizado N° 02 y Cronograma de Ejecución de Obra (CPM) N° 02 por reinicio de Obra N° 02; de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1389 DIVINO JESUS DE LA LOCALIDAD DE IRAPITARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION- DEPARTAMENTO CUSCO", que, en calidad de Supervisor de la obra, adjunta los documentos pertinentes para el tramite correspondiente solicitando su revisión, evaluación y aprobación, cumpliéndose la directiva de Supervisión de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Kimbiri y con la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante Informe N° 452-2023-MDK-GM-OGSEI/VVC-D, de fecha 02 de marzo de 2023, el Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación y liquidación de Inversiones, remite al Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, la aprobación del Calendario Actualizado de Avance de Obra Valorizado N° 02 – Proyecto Principal y Calendario Actualizado de Avance de Obra Valorizado N° 02 -ADICIONAL DE OBRA N° 01. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1389 DIVINO JESUS DE LA LOCALIDAD

Héctor Dipas Torres  
Alcalde 2023 - 2026

*Quinto a su Pueblo*



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

## LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 25209/04-05-90

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

DE IRAPITARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION- DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 2520533, con un plazo de ejecución de 66 días calendarios para el presente año fiscal 2023, por un presupuesto de S/. 2,163,571.00 soles, en tal sentido remito dicho CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA determinado con fecha de REINICIO DE OBRA EL 01 DE FEBRERO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINO DE OBRA AL 02 DE JUNIO DEL 2023, con el siguiente detalle:



CUADRO N° 01: CALENDARIO ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 02 - PROYECTO PRINCIPAL

DESCRIPCION	MES-AÑO	MONTOS POR MES	MONTOS ACUMULADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE	
				AVANCE FISICO	ACUMULADO	
	DIAS	S/.	S/.	%	%	
INICIO DE OBRA		-	-	0.00%	0.00%	
VALORIZACION N° 01	AGOSTO DE 2022	VAL(18/08/22 AL 23/08/22)	52,173.66	52,173.66	2.10%	2.10%
VALORIZACION N° 02	SEPTIEMBRE DE 2022	VAL(14/09/22 AL 30/09/22)	38,064.95	90,238.62	1.53%	3.63%
VALORIZACION N° 03	OCTUBRE DE 2022	VAL(01/10/22 AL 31/10/22)	100,114.73	190,353.34	4.03%	7.66%
VALORIZACION N° 04	NOVIEMBRE DE 2022	VAL(01/11/22 AL 30/11/22)	66,272.45	256,625.80	2.67%	10.33%
VALORIZACION N° 05	DICIEMBRE DE 2022	VAL(01/12/22 AL 31/12/22)	91,512.83	348,138.63	3.68%	14.02%
VALORIZACION N° 06	FEBRERO DE 2023	VAL(01/02/23 AL 28/02/23)	92,261.47	440,400.10	3.71%	17.73%
VALORIZACION N° 07	MARZO DE 2023	VAL(01/03/23 AL 31/03/23)	210,995.30	651,395.40	8.50%	26.23%
VALORIZACION N° 08	ABRIL DE 2023	VAL(01/04/23 AL 30/04/23)	641,844.00	1,293,239.40	25.84%	52.07%
VALORIZACION N° 09	MAYO DE 2023	VAL(01/05/23 AL 31/05/23)	986,542.26	2,279,781.65	39.72%	91.79%
VALORIZACION N° 10	JUNIO DE 2023	VAL(01/06/23 AL 2/05/23)	203,817.88	2,483,599.53	8.21%	100.00%
			2,483,599.53		100.00%	

CUADRO N° 02 CALENDARIO ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 02- ADICIONAL DE OBRA N° 01

DESCRIPCION	MES-AÑO	MONTOS POR MES	MONTOS ACUMULADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE	
				AVANCE FISICO	ACUMULADO	
	DIAS	S/.	S/.	%	%	
INICIO DE OBRA		-	-	0.00%	0.00%	
VALORIZACION N° 01	DICIEMBRE DE 2022	VAL(01/12/22 AL 31/12/22)	23,525.75	23,525.75	3.93%	3.93%
VALORIZACION N° 02	FEBRERO DE 2023	VAL(01/02/23 AL 28/02/23)	20,736.66	44,262.41	3.46%	7.40%
VALORIZACION N° 03	MARZO DE 2023	VAL(01/03/23 AL 31/03/23)	56,572.91	100,835.32	9.45%	16.85%
VALORIZACION N° 04	ABRIL DE 2023	VAL(01/03/23 AL 30/04/23)	279,839.20	380,674.52	46.76%	63.61%
VALORIZACION N° 05	MAYO DE 2023	VAL(01/05/23 AL 31/05/23)	217,808.02	598,482.54	36.39%	100.00%
			598,482.54		100.00%	

Por lo tanto, en virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicito la APROBACION DE CALENDARIO ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 02 - PROYECTO PRINCIPAL Y CALENDARIO ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 02 - ADICIONAL DE OBRA N° 01, a fin de llevar correctamente el control y seguimiento de la ejecución del Proyecto, el mismo que debe ser puesto en conocimiento al Supervisor y Residente de Obra, esto para su continuidad de la ejecución del Proyecto.  
...//

Que, mediante Informe N° 439-2023-GDTI-MDK/NPDL-G, de fecha 29 de marzo del 2023, el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, remite a la Gerencia Municipal, la aprobación del Cronograma de Ejecución Valorizado Reprogramado N° 02 - Bajo Acto Resolutivo "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1389 DIVINO JESUS DE LA LOCALIDAD DE IRAPITARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION- DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 2520533; concluyendo y recomendando de acuerdo a lo siguiente:

...//  
II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Héctor Dipas Torres  
Alcalde 2023 - 2026

¡Crecer con tu Pueblo!



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

## LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 25209/04-05-90

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Por lo tanto, revisado la parte documentaria y la normativa el quien preside el Ing. NOEL LUIS PEREZ DE LA CRUZ, Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, ratifica dando la OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE Y DECLARA PROCEDENTE LA APROBACION DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN REPROGRAMADA N° 02 del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1389 DIVINO JESUS DE LA LOCALIDAD DE IRAPITARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION- DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 2520533, la misma como describe en la siguiente cuadro:



ITEM	FECHA	CANTIDAD DIAS	COSTO DIRECTO				COSTO TOTAL			
			VALORIZACION MENSUAL		% AVANCE		VALORIZACION MENSUAL		% AVANCE	
			VAL. PARCIAL	VAL. ACUMULADO	PARCIAL	ACUMUL.	VAL. PARCIAL	VAL. ACUMULADO	PARCIAL	ACUMUL.
N° 01	18 AL 23 DE AGOSTO 2022	6.00	6,463.99	6,463.99	0.30%	0.30%	52,173.66	52,173.66	2.10%	2.10%
N° 02	14 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	17.00	33,700.28	40,164.28	1.57%	1.87%	38,064.95	90,238.62	1.53%	3.63%
N° 03	01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	31.00	88,635.19	128,799.46	4.12%	5.99%	100,114.73	190,353.34	4.03%	7.66%
N° 04	01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	30.00	58,673.40	187,472.87	2.73%	8.71%	66,272.45	256,625.80	2.67%	10.33%
N° 05	01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	31.00	81,019.63	268,492.49	3.77%	12.48%	91,512.83	348,138.63	3.68%	14.02%
N° 06	01 AL 28 DE FEBRERO 2023	28.00	81,682.42	350,174.91	3.80%	16.28%	92,261.47	440,400.10	3.71%	17.73%
N° 07	01 AL 31 DE MARZO 2023	31.00	186,801.76	536,976.67	8.68%	24.96%	210,995.30	651,395.40	8.50%	26.23%
N° 08	01 AL 30 DE ABRIL 2023	30.00	568,247.65	1,105,224.32	26.41%	51.37%	641,844.00	1,293,239.40	25.84%	52.07%
N° 09	01 AL 31 DE MAYO 2023	31.00	873,421.45	1,978,645.77	40.60%	91.97%	986,542.26	2,279,781.65	39.72%	91.79%
N° 10	01 AL 02 DE JUNIO 2023	2.00	172,735.95	2,151,381.73	8.03%	100.00%	203,817.88	2,483,599.53	8.21%	100.00%
<b>TOTALES</b>		<b>237.00</b>	<b>2,151,381.73</b>		<b>100.00%</b>		<b>2,483,599.53</b>		<b>100.00%</b>	

NOTA : El resumen de cronograma de obra reprogramado corresponde al Costo Directo y Costo Total

ITEM	FECHA	CANTIDAD DIAS	COSTO DIRECTO				COSTO TOTAL			
			VALORIZACION MENSUAL		% AVANCE		VALORIZACION MENSUAL		% AVANCE	
			VAL. PARCIAL	VAL. ACUMULADO	PARCIAL	ACUMUL.	VAL. PARCIAL	VAL. ACUMULADO	PARCIAL	ACUMUL.
N° 01	18 AL 23 DE AGOSTO 2022	6.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%
N° 02	14 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	17.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%
N° 03	01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	31.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%
N° 04	01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	30.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%
N° 05	01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	31.00	20,889.04	20,889.04	3.93%	3.93%	23,525.75	23,525.75	3.93%	3.93%
N° 06	01 AL 28 DE FEBRERO 2023	28.00	18,412.55	39,301.59	3.46%	7.40%	20,736.66	44,262.41	3.46%	7.40%
N° 07	01 AL 31 DE MARZO 2023	31.00	50,232.36	89,533.95	9.45%	16.85%	56,572.91	100,835.32	9.45%	16.85%
N° 08	01 AL 30 DE ABRIL 2023	30.00	248,475.50	338,009.45	46.76%	63.61%	279,839.20	380,674.52	46.76%	63.61%
N° 09	01 AL 31 DE MAYO 2023	31.00	193,396.62	531,406.07	36.39%	100.00%	217,808.02	598,482.54	36.39%	100.00%
N° 10	01 AL 02 DE JUNIO 2023	2.00								
<b>TOTALES</b>		<b>237.00</b>	<b>531,406.07</b>		<b>100.00%</b>		<b>598,482.54</b>		<b>100.00%</b>	

ITEM	FECHA	CANTIDAD DIAS	COSTO DIRECTO				COSTO TOTAL			
			VALORIZACION MENSUAL		% AVANCE		VALORIZACION MENSUAL		% AVANCE	
			VAL. PARCIAL	VAL. ACUMULADO	PARCIAL	ACUMUL.	VAL. PARCIAL	VAL. ACUMULADO	PARCIAL	ACUMUL.
N° 01	18 AL 23 DE AGOSTO 2022	6.00	6,463.99	6,463.99	0.24%	0.24%	52,173.66	52,173.66	1.69%	1.69%
N° 02	14 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	17.00	33,700.28	40,164.28	1.26%	1.50%	38,064.95	90,238.62	1.24%	2.93%
N° 03	01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	31.00	88,635.19	128,799.46	3.30%	4.80%	100,114.73	190,353.34	3.25%	6.18%
N° 04	01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	30.00	58,673.40	187,472.87	2.19%	6.99%	66,272.45	256,625.80	2.15%	8.33%
N° 05	01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	31.00	101,908.67	289,381.54	3.80%	10.79%	115,038.58	371,664.38	3.73%	12.06%
N° 06	01 AL 28 DE FEBRERO 2023	28.00	100,094.97	389,476.50	3.73%	14.52%	112,998.13	484,662.51	3.67%	15.73%
N° 07	01 AL 31 DE MARZO 2023	31.00	237,034.11	626,510.62	8.84%	23.35%	267,568.21	752,230.72	8.68%	24.41%
N° 08	01 AL 30 DE ABRIL 2023	30.00	816,723.15	1,443,233.77	30.44%	53.80%	921,683.20	1,673,913.92	29.90%	54.31%
N° 09	01 AL 31 DE MAYO 2023	31.00	1,066,818.08	2,510,051.85	39.77%	93.56%	1,204,350.27	2,878,264.19	39.08%	93.39%
N° 10	01 AL 02 DE JUNIO 2023	2.00	172,735.95	2,682,787.80	6.44%	100.00%	203,817.88	3,082,082.07	6.61%	100.00%
<b>TOTALES</b>		<b>237.00</b>	<b>2,682,787.80</b>		<b>100.00%</b>		<b>3,082,082.07</b>		<b>100.00%</b>	

...//

Que, en atención al numeral 1°, artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S N° 004-2019-JUS, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante Resolución de Alcaldía N° 054-2023-MDK/A, de fecha 28 de febrero de 2023, donde se delega facultades administrativas y resolutorias al Gerente Municipal, todo ello con la finalidad y atribuciones de hacer más dinámica y eficiente la administración municipal;

Estando el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S N° 004-2019-JUS; en virtud de los considerandos expuestos, la delegación de facultades y las atribuciones de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en cumplimiento de las normas vigentes:

**SE RESUELVE:**

Héctor Días Torres  
Alcalde 2023 - 2026

*Devuélveme a su Pueblo*





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

## LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 25209/04-05-90

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



**ARTÍCULO PRIMERO.** - APROBAR, el Calendario Actualizado de Avance de Obra Valorizado N° 02 – Proyecto Principal y Calendario Actualizado de Avance de Obra Valorizado N° 02 Adicional de Obra N° 01 del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1389 DIVINO JESUS DE LA LOCALIDAD DE IRAPITARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO CUSCO”, en sujeción a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; de acuerdo al siguiente cuadro

... corazón del VRAEM

ITEM	FECHA	CANTIDAD DIAS	COSTO DIRECTO				COSTO TOTAL			
			VALORIZACION MENSUAL		% AVANCE		VALORIZACION MENSUAL		% AVANCE	
			VAL. PARCIAL	VAL. ACUMULADO	PARCIAL	ACUMUL.	VAL. PARCIAL	VAL. ACUMULADO	PARCIAL	ACUMUL.
N° 01	18 AL 23 DE AGOSTO 2022	6.00	6,463.99	6,463.99	0.30%	0.30%	52,173.66	52,173.66	2.10%	2.10%
N° 02	14 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	17.00	33,700.28	40,164.28	1.57%	1.87%	38,064.95	90,238.62	1.53%	3.63%
N° 03	01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	31.00	88,635.19	128,799.46	4.12%	5.99%	100,114.73	190,353.34	4.03%	7.66%
N° 04	01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	30.00	58,673.40	187,472.87	2.73%	8.71%	66,272.45	256,625.80	2.67%	10.33%
N° 05	01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	31.00	81,019.63	268,492.49	3.77%	12.48%	91,512.83	348,138.63	3.68%	14.02%
N° 06	01 AL 28 DE FEBRERO 2023	28.00	81,682.42	350,174.91	3.80%	16.28%	92,261.47	440,400.10	3.71%	17.73%
N° 07	01 AL 31 DE MARZO 2023	31.00	186,801.76	536,976.67	8.68%	24.96%	210,995.30	651,395.40	8.50%	26.23%
N° 08	01 AL 30 DE ABRIL 2023	30.00	568,247.65	1,105,224.32	26.41%	51.37%	641,844.00	1,293,239.40	25.84%	52.07%
N° 09	01 AL 31 DE MAYO 2023	31.00	873,421.45	1,978,645.77	40.60%	91.97%	986,542.26	2,279,781.65	39.72%	91.79%
N° 10	01 AL 02 DE JUNIO 2023	2.00	172,735.95	2,151,381.73	8.03%	100.00%	203,817.88	2,483,599.53	8.21%	100.00%
<b>TOTALES</b>		<b>237.00</b>	<b>2,151,381.73</b>		<b>100.00%</b>		<b>2,483,599.53</b>		<b>100.00%</b>	

NOTA : El resumen de cronograma de obra reprogramado corresponde al Costo Directo y Costo Total

ITEM	FECHA	CANTIDAD DIAS	COSTO DIRECTO				COSTO TOTAL			
			VALORIZACION MENSUAL		% AVANCE		VALORIZACION MENSUAL		% AVANCE	
			VAL. PARCIAL	VAL. ACUMULADO	PARCIAL	ACUMUL.	VAL. PARCIAL	VAL. ACUMULADO	PARCIAL	ACUMUL.
N° 01	18 AL 23 DE AGOSTO 2022	6.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%
N° 02	14 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	17.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%
N° 03	01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	31.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%
N° 04	01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	30.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%
N° 05	01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	31.00	20,889.04	20,889.04	3.93%	3.93%	23,525.75	23,525.75	3.93%	3.93%
N° 06	01 AL 28 DE FEBRERO 2023	28.00	18,412.55	39,301.59	3.46%	7.40%	20,736.66	44,262.41	3.46%	7.40%
N° 07	01 AL 31 DE MARZO 2023	31.00	50,232.36	89,533.95	9.45%	16.85%	56,572.91	100,835.32	9.45%	16.85%
N° 08	01 AL 30 DE ABRIL 2023	30.00	248,475.50	338,009.45	46.76%	63.61%	279,839.20	380,674.52	46.76%	63.61%
N° 09	01 AL 31 DE MAYO 2023	31.00	193,396.62	531,406.07	36.39%	100.00%	217,808.02	598,482.54	36.39%	100.00%
N° 10	01 AL 02 DE JUNIO 2023	2.00								
<b>TOTALES</b>		<b>237.00</b>	<b>531,406.07</b>		<b>100.00%</b>		<b>598,482.54</b>		<b>100.00%</b>	

ITEM	FECHA	CANTIDAD DIAS	COSTO DIRECTO				COSTO TOTAL			
			VALORIZACION MENSUAL		% AVANCE		VALORIZACION MENSUAL		% AVANCE	
			VAL. PARCIAL	VAL. ACUMULADO	PARCIAL	ACUMUL.	VAL. PARCIAL	VAL. ACUMULADO	PARCIAL	ACUMUL.
N° 01	18 AL 23 DE AGOSTO 2022	6.00	6,463.99	6,463.99	0.24%	0.24%	52,173.66	52,173.66	1.69%	1.69%
N° 02	14 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	17.00	33,700.28	40,164.28	1.26%	1.50%	38,064.95	90,238.62	1.24%	2.93%
N° 03	01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	31.00	88,635.19	128,799.46	3.30%	4.80%	100,114.73	190,353.34	3.25%	6.18%
N° 04	01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	30.00	58,673.40	187,472.87	2.19%	6.99%	66,272.45	256,625.80	2.15%	8.33%
N° 05	01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	31.00	101,908.67	289,381.54	3.80%	10.79%	115,038.58	371,664.38	3.73%	12.06%
N° 06	01 AL 28 DE FEBRERO 2023	28.00	100,094.97	389,476.50	3.73%	14.52%	112,998.13	484,662.51	3.67%	15.73%
N° 07	01 AL 31 DE MARZO 2023	31.00	237,034.11	626,510.62	8.84%	23.35%	267,568.21	752,230.72	8.68%	24.41%
N° 08	01 AL 30 DE ABRIL 2023	30.00	816,723.15	1,443,233.77	30.44%	53.80%	921,683.20	1,673,913.92	29.90%	54.31%
N° 09	01 AL 31 DE MAYO 2023	31.00	1,066,818.08	2,510,051.85	39.77%	93.56%	1,204,350.27	2,878,264.19	39.08%	93.39%
N° 10	01 AL 02 DE JUNIO 2023	2.00	172,735.95	2,682,787.80	6.44%	100.00%	203,817.88	3,082,082.07	6.61%	100.00%
<b>TOTALES</b>		<b>237.00</b>	<b>2,682,787.80</b>		<b>100.00%</b>		<b>3,082,082.07</b>		<b>100.00%</b>	

**ARTÍCULO SEGUNDO-** ENCARGAR a la Oficina General de Supervisión y Evaluación de Inversiones, Oficina General de Administración, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, y demás áreas competentes, efectúen las demás acciones administrativas que correspondan bajo responsabilidad y de acuerdo a sus competencias.

**ARTÍCULO TERCERO.** – NOTIFÍQUESE el presente Acto Resolutivo al Director General de Supervisión y Evaluación de Inversiones, Oficina General de Administración, Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura,



Héctor Dipas Torres  
Alcalde 2023 - 2026

*Devoto a su Pueblo*



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 25209/04-05-90

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Supervisor de Obra, Residente de obra y demás órganos competentes, para su conocimiento y fines correspondientes.

**ARTÍCULO CUARTO.** – **PRECISAR** que, la presente Resolución se ampara en el Principio de Confianza y Presunción de Veracidad, ya que esta se emite en merito a los Informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo responsabilidad cada uno de los informantes y firmantes de las unidades orgánicas y externos, por la fundamentación, informes, opiniones y la sustentación de la documentación que genera la presente Resolución, existiendo en todos ellos una responsabilidad solidaria de carácter administrativo del VRAEM civil y penal.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y PUBLÍQUESE**



CPC. Otto Enrique Sulca Carrasco  
GERENTE MUNICIPAL

Héctor Dipas Torres

Alcalde 2023 - 2026

*Junto a su Pueblo*
