



**RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 008-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J**

Cayhuayna, 25 de enero del 2024.

**VISTO:**

Los documentos que se acompañan en ciento veinticuatro (124) folios, en físico;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, Ley N° 30220 – Ley Universitaria; el Estado Reconoce la autonomía normativa, de gobierno, académico, administrativo y económico en los asuntos de su competencia;

Que, el T.U.O. de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sobre la base de aplicación de leyes en el tiempo, prescriben una serie de disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contratación pública, en lo concerniente a Bienes, Servicios u Obras, y a su vez regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, mediante CONTRATO N°007-2023-UNHEVAL de fecha 31 de marzo de 2023, la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN y el CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN suscriben el Contrato de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO" con un plazo de ejecución de trescientos sesenta días y cuyo monto contractual asciende a la suma de S/. 13,206,369.77;

Que, con fecha 05 de julio del 2023 se suscribe la Adenda N° 01 al Contrato N° 007-2023-UNHEVAL, entre la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco y el CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO", cuyo monto contractual asciende a la suma de S/ 13,167,745.69;

Que, con fecha 27 de octubre del 2023 se suscribe el Contrato N° 045-2023-UNHEVAL, entre la UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZÁN y el CONSORCIO SUPERVISOR ALMACEN Y ARCHIVO, para el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO", con un plazo de servicio de 390 días calendario (360 días para la supervisión de la obra y 30 días para la recepción y liquidación de obra) y cuyo monto contractual asciende a la suma de S/. 598,466.73

Que, el literal f) del segundo párrafo del artículo 2° del T.U.O. de la Ley de N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 082-2019 -EF, establece lo siguiente: "f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos".

Que, en ese orden de ideas, el artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, precisa que: "202.1. Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un plazo máximo de siete (7) días hace una actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica. 202.2. El Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecución de Obra previo, así como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual. 202.3. El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) días manifiesta su aprobación u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo máximo de siete (7) días luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos señalados, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes. 202.4. Ante la falta de presentación del Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo señalado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos".

Que, en mérito a la norma legal señalada en líneas anteriores, se advierte los siguientes actuados:

...///

TRANSCRIPCIÓN

En la fecha se ha expedido  
Resolución siguiente



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la  
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 08-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J

Cayhuayna, 25 de enero del 2024.

pág. 2

1. Que, mediante Resolución Jefatural N° 002-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J de fecha 03 de enero del 2024, se resuelve aprobar, el **EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°03**, correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
2. Que, mediante Resolución Jefatural N° 004-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J de fecha 11 de enero del 2024, se resuelve aprobar, el **EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°04**, correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
3. Que, mediante Resolución Directoral N° 070-2024-DIGA/ UNHEVAL de fecha 12 de enero del 2024, se resuelve Autorizar la Ejecución del **ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°03**, correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
4. Que, mediante Resolución Directoral N° 135-2024-DIGA/ UNHEVAL de fecha 19 de enero del 2024, se resuelve Autorizar la Ejecución del **ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°04**, correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
5. Que, mediante Carta N°006-2024-LLTM/RC(CVCU) con fecha de recepción por parte del Supervisor de Obra el día 23 de enero de 2024, en el cual remite su cronograma actualizado de ejecución de obra; asimismo, adjunta el Informe N°006-2024-HGLLA/RO(CVCU), suscrito por el Residente de Obra quien emite el cronograma actualizado por los Adicionales N°03 y N° 04, correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO"; asimismo, señala lo siguiente:

(...)

IV. ANÁLISIS

4.1. RESPECTO A LA APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA N°03 Y N°04 CON DEDUCTIVOS VINCULANTES

Habiéndose aprobado la ejecución del Adicional de Obra con Deductivo Vinculante N°03 mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°0070-2024-DIGA/UNHEVAL y Adicional de Obra con Deductivo vinculante N°04 mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°0135-2024-DIGA/UNHEVAL corresponde la actualización del cronograma de ejecución de Obra, actualizando la fecha de inicio de actividades a la fecha de aprobación del mismo, así mismo dicha actualización significará la presentación de un nuevo cronograma valorizado como una nueva curva S para el control físico y financiero de la obra. Por otro lado, habiendo realizado el análisis correspondiente de las partidas presentes en dichos expedientes técnicos aprobados, se observan deductivos de partidas contractuales, por lo que, al realizar el cronograma unificado de obra, reflejará nuevos porcentajes en el cronograma valorizado y por ende en la curva S.

4.2. RESPECTO A LA RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE

Habiendo realizado la vinculación de partidas adicionales con el último cronograma vigente de obra, se observó que estas no afectaron a la ruta crítica del proyecto, por lo que el plazo de ejecución se mantendrá conforme al contrato principal.

4.3. RESPECTO AL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

Al realizar una reducción de obra se modifica directamente el presupuesto contractual, por ende, conlleva a actualizar el cronograma valorizado.

| ESPECIALIDAD                                | PRESUPUESTO O EXPEDIENTE CONTRACTUAL | REDUCCION DE OBRA N°01 | PRESUPUESTO O VIGENTE | PRESUPUESTO O ADICIONAL N°01 | PRESUPUESTO O ADICIONAL N°02 | PRESUPUESTO O ADICIONAL N°03 | PRESUPUESTO O ADICIONAL N°04 | PRESUPUESTO O DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 | PRESUPUESTO O DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 | PRESUPUESTO O DEDUCTIVO VINCULANTE N°03 | PRESUPUESTO O ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO NETO. | INCIDENCIA RESPECTO AL MONTO VIGENTE CONTRACTUAL |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | S/ 210.605 43                        |                        | S/210.605 43          |                              |                              |                              |                              |                                         |                                         |                                         | S/0.00                                      | S/210.605 43                                     |
| ESTRUCTURAS                                 | S/ 3.939.062 75                      |                        | S/3.939.062 75        |                              | S/2.709 10                   |                              |                              | S/59.584 73                             | S/159.866 50                            |                                         | S/0.00                                      | S/3.722.326 62                                   |
| ARQUITECTURA                                | S/ 3.336.837 53                      |                        | S/3.336.837 53        | S/74.962 48                  |                              | S/67.687 60                  | S/243.948 75                 | S/19.946 86                             | S/19.675 09                             | S/78.857 44                             | S/165.091 31                                | S/3.604.916 97                                   |
| INSTALACIONES SANITARIAS                    | S/ 245.577 63                        |                        | S/245.577 63          |                              |                              |                              |                              |                                         |                                         |                                         | S/0.00                                      | S/245.577 63                                     |
| INSTALACIONES ELECTRICAS                    | S/ 523.971 17                        |                        | S/523.971 17          | S/47.151 48                  |                              |                              |                              | S/17.300 32                             |                                         |                                         | S/0.00                                      | S/453.822 33                                     |
| INSTALACIONES ELECTROMECANICAS              | S/ 473.617 01                        |                        | S/473.617 01          |                              |                              |                              |                              |                                         |                                         |                                         | S/0.00                                      | S/473.617 01                                     |
| INSTALACIONES DE COMUNICACIONES             | S/ 283.383 49                        |                        | S/283.383 49          |                              |                              |                              |                              |                                         |                                         |                                         | S/0.00                                      | S/283.383 49                                     |
| SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                   | S/ 326.230 60                        | S/ 29.642 43           | S/296.588 17          |                              |                              |                              |                              |                                         |                                         |                                         | S/0.00                                      | S/266.945 74                                     |
| IMPACTO AMBIENTAL                           | S/ 160.186 28                        |                        | S/160.186 28          |                              |                              |                              |                              |                                         |                                         |                                         | S/0.00                                      | S/160.186 28                                     |

...///



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMITO VALDIZAN

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 08-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J

Cayhuayna, 25 de enero del 2024.



pág. 3

|                          |                 |             |                 |              |            |             |              |              |              |              |              |                 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| COSTO TOTAL:             | S/9,499,471.89  | S/29,842.43 | S/8,469,829.46  | S/122,133.98 | S/2,709.10 | S/67,887.80 | S/243,948.75 | S/96,831.91  | S/179,541.59 | S/78,857.44  | S/155,091.31 | S/9,551,077.93  |
| GASTOS GENERALES 15.30%: | S/1,453,419.20  | S/4,535.29  | S/1,448,883.91  | S/18,686.50  | S/414.49   | S/10,358.20 | S/37,324.16  | S/14,815.28  | S/27,469.86  | S/12,085.19  | S/25,258.97  | S/1,461,314.93  |
| UTILIDAD 15.00%:         | S/1,424,920.78  | S/4,446.36  | S/1,420,474.42  | S/18,320.09  | S/408.37   | S/10,153.14 | S/36,592.31  | S/14,524.79  | S/26,831.24  | S/11,828.62  | S/24,763.69  | S/1,432,861.68  |
| COSTO PARCIAL:           | S/12,377,811.87 | S/38,624.08 | S/12,339,187.79 | S/159,140.55 | S/3,529.96 | S/88,196.94 | S/217,865.22 | S/126,171.98 | S/233,842.69 | S/102,751.25 | S/215,113.97 | S/12,445,054.54 |
| EQUIPAMIENTO:            | S/828,557.90    |             | S/828,557.90    |              |            |             |              |              |              |              |              | S/828,557.90    |
| COSTO TOTAL:             | S/13,206,369.77 | S/38,624.08 | S/13,167,745.59 | S/159,140.55 | S/3,529.96 | S/88,196.94 | S/217,865.22 | S/126,171.98 | S/233,842.69 | S/102,751.25 | S/215,113.97 | S/13,273,612.44 |
| ADICIONAL NETO           |                 |             |                 |              |            |             |              |              |              |              | S/215,113.97 | S/105,866.75    |

### V. ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - UNIFICADO

| Mes 1          | Mes 2         | Mes 3         | Mes 4         | Mes 5         | Mes 6         | Mes 7         | Mes 8           | Mes 9         | Mes 10          | Mes 11          | Mes 12          | Mes 13        |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Del 13/04/2023 | Del 1/05/2023 | Del 1/05/2023 | Del 1/07/2023 | Del 1/09/2023 | Del 1/09/2023 | Del 1/10/2023 | Del 1/11/2023   | Del 1/12/2023 | Del 1/01/2024   | Del 1/02/2024   | Del 1/03/2024   | Del 1/04/2024 |
| AI 30/04/2023  | AI 31/05/2023 | AI 30/06/2023 | AI 31/07/2023 | AI 31/08/2023 | AI 30/09/2023 | AI 31/10/2023 | AI 30/11/2023   | AI 31/12/2023 | AI 31/01/2024   | AI 29/02/2024   | AI 31/03/2024   | AI 13/04/2024 |
| S/ 164,793.83  | S/ 603,453.59 | S/ 434,038.37 | S/ 709,254.95 | S/ 705,068.90 | S/ 539,520.12 | S/ 387,967.92 | S/ 793,652.92   | S/ 581,865.02 | S/ 1,696,498.73 | S/ 1,775,972.03 | S/ 905,465.63   | S/ 253,525.92 |
| S/ 25,213.46   | S/ 92,328.40  | S/ 66,407.87  | S/ 108,516.01 | S/ 107,875.54 | S/ 82,546.58  | S/ 59,359.09  | S/ 121,428.90   | S/ 89,025.35  | S/ 259,564.31   | S/ 271,723.72   | S/ 138,536.24   | S/ 38,789.46  |
| S/ 24,719.07   | S/ 90,518.04  | S/ 65,105.76  | S/ 106,388.24 | S/ 105,760.34 | S/ 80,928.02  | S/ 58,195.19  | S/ 119,047.94   | S/ 87,279.75  | S/ 254,474.81   | S/ 266,395.80   | S/ 135,819.84   | S/ 38,028.88  |
| S/ 214,726.36  | S/ 786,300.03 | S/ 565,552.00 | S/ 924,159.20 | S/ 918,704.78 | S/ 702,994.72 | S/ 505,522.20 | S/ 1,034,129.76 | S/ 758,170.12 | S/ 2,210,537.85 | S/ 2,314,091.55 | S/ 1,179,821.71 | S/ 330,344.26 |
| S/ 214,726.36  | S/ 786,300.03 | S/ 565,552.00 | S/ 924,159.20 | S/ 918,704.78 | S/ 702,994.72 | S/ 505,522.20 | S/ 1,034,129.76 | S/ 758,170.12 | S/ 2,210,537.85 | S/ 2,314,091.55 | S/ 1,179,821.71 | S/ 330,344.26 |
| 1.62%          | 5.92%         | 4.26%         | 6.96%         | 6.92%         | 5.30%         | 3.81%         | 7.79%           | 5.71%         | 16.55%          | 17.43%          | 8.89%           | 8.73%         |
| 1.62%          | 7.54%         | 11.80%        | 18.76%        | 25.69%        | 30.98%        | 34.79%        | 42.58%          | 48.29%        | 64.95%          | 82.38%          | 91.27%          | 100.00%       |

| N° | MES    | PROGR. CONTRACTUAL - DEDUCT. | PROGRAMADO ADICIONAL N°01 | PROGRAMADO ADICIONAL N°02 | PROGRAMADO ADICIONAL N°03 | PROGRAMADO ADICIONAL N°04 | PROGRAMADO ACUMULADO ADICIONAL + CONTACTUAL - DEDUCT. |                  |           |         | 80% PROGRAMADO |  |
|----|--------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|----------------|--|
|    |        |                              |                           |                           |                           |                           | MONTO PARCIAL ACUM.                                   | MONTO ACUMULADO. | % PARCIAL | % ACUM  |                |  |
| 1  | Abr-22 | S/ 214,726.36                |                           |                           |                           |                           | S/ 214,726.36                                         | S/ 214,726.36    | 1.62%     | 1.62%   | 1.29%          |  |
| 2  | May-22 | S/ 786,300.03                |                           |                           |                           |                           | S/ 786,300.03                                         | S/ 1,001,026.39  | 5.92%     | 7.54%   | 6.03%          |  |
| 3  | Jun-22 | S/ 565,552.00                |                           |                           |                           |                           | S/ 565,552.00                                         | S/ 1,566,578.39  | 4.26%     | 11.80%  | 9.44%          |  |
| 4  | Jul-22 | S/ 924,159.20                |                           |                           |                           |                           | S/ 924,159.20                                         | S/ 2,490,737.59  | 6.96%     | 18.76%  | 15.01%         |  |
| 5  | Ago-22 | S/ 918,704.78                |                           |                           |                           |                           | S/ 918,704.78                                         | S/ 3,409,442.37  | 6.92%     | 25.69%  | 20.56%         |  |
| 6  | Set-22 | S/ 701,229.72                |                           | S/ 1,765.00               |                           |                           | S/ 702,994.72                                         | S/ 4,112,437.09  | 5.30%     | 30.98%  | 24.79%         |  |
| 7  | Oct-22 | S/ 494,414.01                | S/ 10,225.71              | S/ 882.48                 |                           |                           | S/ 505,522.20                                         | S/ 4,617,959.29  | 3.81%     | 34.79%  | 27.83%         |  |
| 8  | Nov-22 | S/ 948,156.79                | S/ 85,090.49              | S/ 882.48                 |                           |                           | S/ 1,034,129.76                                       | S/ 5,652,089.05  | 7.79%     | 42.58%  | 34.07%         |  |
| 9  | Dic-22 | S/ 755,784.15                | S/ 2,385.97               |                           |                           |                           | S/ 758,170.12                                         | S/ 6,410,259.17  | 5.71%     | 48.29%  | 38.63%         |  |
| 10 | Ene-23 | S/ 2,028,305.32              |                           |                           | S/ 81,446.00              | S/ 100,786.53             | S/ 2,210,537.85                                       | S/ 8,620,797.02  | 16.55%    | 64.95%  | 51.96%         |  |
| 11 | Feb-23 | S/ 2,090,261.92              |                           |                           | S/ 6,750.94               | S/ 217,078.69             | S/ 2,314,091.55                                       | S/ 10,934,888.57 | 17.43%    | 82.38%  | 65.90%         |  |
| 12 | Mar-23 | S/ 1,118,383.33              | S/ 61,438.38              |                           |                           |                           | S/ 1,179,821.71                                       | S/ 12,114,710.28 | 8.89%     | 91.27%  | 73.02%         |  |
| 13 | Abr-23 | S/ 1,158,902.16              |                           |                           |                           |                           | S/ 1,158,902.16                                       | S/ 13,273,612.44 | 8.73%     | 100.00% | 80.00%         |  |

### VI. ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA CONTRACTUAL

| Mes 1          | Mes 2         | Mes 3         | Mes 4         | Mes 5         | Mes 6         | Mes 7         | Mes 8         | Mes 9         | Mes 10          | Mes 11          | Mes 12          | Mes 13        |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Del 13/04/2023 | Del 1/05/2023 | Del 1/05/2023 | Del 1/07/2023 | Del 1/09/2023 | Del 1/09/2023 | Del 1/10/2023 | Del 1/11/2023 | Del 1/12/2023 | Del 1/01/2024   | Del 1/02/2024   | Del 1/03/2024   | Del 1/04/2024 |
| AI 30/04/2023  | AI 31/05/2023 | AI 30/06/2023 | AI 31/07/2023 | AI 31/08/2023 | AI 30/09/2023 | AI 31/10/2023 | AI 30/11/2023 | AI 31/12/2023 | AI 31/01/2024   | AI 29/02/2024   | AI 31/03/2024   | AI 13/04/2024 |
| S/ 164,793.83  | S/ 603,453.59 | S/ 434,038.37 | S/ 709,254.95 | S/ 705,068.90 | S/ 538,165.56 | S/ 379,442.83 | S/ 727,672.13 | S/ 580,033.88 | S/ 1,556,642.61 | S/ 1,604,191.80 | S/ 858,314.15   | S/ 608,756.86 |
| S/ 25,213.46   | S/ 92,328.40  | S/ 66,407.87  | S/ 108,516.01 | S/ 107,875.54 | S/ 82,339.33  | S/ 58,054.75  | S/ 111,333.84 | S/ 88,745.18  | S/ 238,166.32   | S/ 245,441.35   | S/ 131,322.02   | S/ 93,139.80  |
| S/ 24,719.07   | S/ 90,518.04  | S/ 65,105.76  | S/ 106,388.24 | S/ 105,760.34 | S/ 80,724.83  | S/ 56,916.42  | S/ 109,150.82 | S/ 87,005.08  | S/ 233,496.39   | S/ 240,628.77   | S/ 128,747.12   | S/ 91,313.54  |
| S/ 214,726.36  | S/ 786,300.03 | S/ 565,552.00 | S/ 924,159.20 | S/ 918,704.78 | S/ 701,229.72 | S/ 494,414.00 | S/ 948,156.79 | S/ 755,784.14 | S/ 2,028,305.32 | S/ 2,090,261.92 | S/ 1,118,383.33 | S/ 793,210.20 |
| S/ 214,726.36  | S/ 786,300.03 | S/ 565,552.00 | S/ 924,159.20 | S/ 918,704.78 | S/ 701,229.72 | S/ 494,414.00 | S/ 948,156.79 | S/ 755,784.14 | S/ 2,028,305.32 | S/ 2,090,261.92 | S/ 1,118,383.33 | S/ 793,210.20 |
| 1.63%          | 5.97%         | 4.29%         | 7.02%         | 6.98%         | 5.33%         | 3.75%         | 7.20%         | 5.74%         | 15.40%          | 15.87%          | 8.49%           | 12.32%        |
| 1.63%          | 7.60%         | 11.90%        | 18.92%        | 25.89%        | 31.22%        | 34.97%        | 42.17%        | 47.91%        | 63.32%          | 79.19%          | 87.68%          | 100.00%       |

| N° | MES    | PROGRAMADO      |        |                  |            | 80% PROGRAMADO. |        |           |        |
|----|--------|-----------------|--------|------------------|------------|-----------------|--------|-----------|--------|
|    |        | MENSUAL         | %/MES  | ACUMULADO        | %ACUMULADO | MENSUAL         | %/MES  | ACUMULADO |        |
| 1  | Abr-22 | S/ 214,726.36   | 1.63%  | S/ 214,726.36    | 1.63%      | S/171,781.09    | 1.30%  |           | 1.30%  |
| 2  | May-22 | S/ 786,300.03   | 5.97%  | S/ 1,001,026.39  | 7.60%      | S/629,040.02    | 4.78%  |           | 6.08%  |
| 3  | Jun-22 | S/ 565,552.00   | 4.29%  | S/ 1,566,578.39  | 11.90%     | S/452,441.60    | 3.44%  |           | 9.52%  |
| 4  | Jul-22 | S/ 924,159.20   | 7.02%  | S/ 2,490,737.59  | 18.92%     | S/739,327.36    | 5.61%  |           | 15.13% |
| 5  | Ago-22 | S/ 918,704.78   | 6.98%  | S/ 3,409,442.37  | 25.89%     | S/734,963.82    | 5.58%  |           | 20.71% |
| 6  | Set-22 | S/ 701,229.72   | 5.33%  | S/ 4,110,672.09  | 31.22%     | S/560,983.78    | 4.26%  |           | 24.97% |
| 7  | Oct-22 | S/ 494,414.00   | 3.75%  | S/ 4,605,086.09  | 34.97%     | S/395,531.20    | 3.00%  |           | 27.98% |
| 8  | Nov-22 | S/ 948,156.79   | 7.20%  | S/ 5,553,242.88  | 42.17%     | S/758,525.43    | 5.76%  |           | 33.74% |
| 9  | Dic-22 | S/ 755,784.14   | 5.74%  | S/ 6,309,027.02  | 47.91%     | S/604,627.31    | 4.59%  |           | 38.33% |
| 10 | Ene-23 | S/ 2,028,305.32 | 15.40% | S/ 8,337,332.34  | 63.32%     | S/1,622,644.26  | 12.32% |           | 50.65% |
| 11 | Feb-23 | S/ 2,090,261.92 | 15.87% | S/ 10,427,594.26 | 79.19%     | S/1,672,209.54  | 12.70% |           | 63.35% |
| 12 | Mar-23 | S/ 1,118,383.33 | 8.49%  | S/ 11,545,977.59 | 87.68%     | S/894,706.66    | 6.79%  |           | 70.15% |
| 13 | Abr-23 | S/ 1,621,768.10 | 12.32% | S/ 13,167,745.69 | 100.00%    | S/1,297,414.48  | 9.85%  |           | 80.00% |

### VII. ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - ADICIONAL N°01

| Mes 1          | Mes 2         | Mes 3         | Mes 4         | Mes 5         | Mes 6         | Mes 7           | Mes 8         | Mes 9         | Mes 10        | Mes 11        | Mes 12        | Mes 13        |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Del 13/04/2023 | Del 1/05/2023 | Del 1/05/2023 | Del 1/07/2023 | Del 1/09/2023 | Del 1/09/2023 | Del 1/10/2023   | Del 1/11/2023 | Del 1/12/2023 | Del 1/01/2024 | Del 1/02/2024 | Del 1/03/2024 | Del 1/04/2024 |
| AI 30/04/2023  | AI 31/05/2023 | AI 30/06/2023 | AI 31/07/2023 | AI 31/08/2023 | AI 30/09/2023 | AI 31/10/2023   | AI 30/11/2023 | AI 31/12/2023 | AI 31/01/2024 | AI 29/02/2024 | AI 31/03/2024 | AI 13/04/2024 |
| S/ 0.00        | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 7,847.82     | S/ 65,303.52  | S/ 1,831.14   | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 47,151.48  | S/ 0.00       |
| S/ 0.00        | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 1,200.72     | S/ 9,991.44   | S/ 280.16     | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 7,214.18   | S/ 0.00       |
| S/ 0.00        | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 1,177.17     | S/ 9,795.53   | S/ 274.67     | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 7,072.72   | S/ 0.00       |
| S/ 0.00        | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 10,225.71    | S/ 85,090.49  | S/ 2,385.97   | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 61,438.38  | S/ 0.00       |
| S/ 0.00        | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 10,225.71    | S/ 85,090.49  | S/ 2,385.97   | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 61,438.38  | S/ 0.00       |
| 0.00%          | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         | 6.43%           | 53.47%        | 1.50%         | 0.00%         | 0.00%         | 38.61%        | 0.00%         |
| 0.00%          | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         | 6.43%           | 59.89%        | 61.39%        | 61.39%        | 61.39%        | 100.00%       | 100.00%       |
| N°             | MES           | PROGRAMADO    |               |               |               | 80% PROGRAMADO. |               |               |               |               |               |               |
|                |               | MENSUAL       | %/MES         | ACUMULADO     | % ACUMULADO   | MENSUAL         | %/MES         | ACUMULADO     |               |               |               |               |
| 1              | Abr-22        |               | 0.00%         |               | 0.00%         | S/0.00          | 0.00%         | 0.00%         |               |               |               |               |
| 2              | May-22        |               | 0.00%         |               | 0.00%         | S/0.00          | 0.00%         | 0.00%         |               |               |               |               |
| 3              | Jun-22        |               | 0.00%         |               | 0.00%         | S/0.00          | 0.00%         | 0.00%         |               |               |               |               |
| 4              | Jul-22        |               | 0.00%         |               | 0.00%         | S/0.00          | 0.00%         | 0.00%         |               |               |               |               |
| 5              | Ago-22        |               | 0.00%         |               | 0.00%         | S/0.00          | 0.00%         | 0.00%         |               |               |               |               |
| 6              | Set-22        |               | 0.00%         |               | 0.00%         | S/0.00          | 0.00%         | 0.00%         |               |               |               |               |
| 7              | Oct-22        | S/ 10,225.71  | 6.43%         | S/ 10,225.71  | 6.43%         | S/8,180.57      | 5.14%         | 5.14%         |               |               |               |               |
| 8              | Nov-22        | S/ 85,090.49  | 53.47%        | S/ 95,316.20  | 59.89%        | S/68,072.39     | 42.78%        | 47.92%        |               |               |               |               |
| 9              | Dic-22        | S/ 2,385.97   | 1.50%         | S/ 97,702.17  | 61.39%        | S/1,908.78      | 1.20%         | 49.11%        |               |               |               |               |
| 10             | Ene-23        |               | 0.00%         |               | 61.39%        | S/0.00          | 0.00%         | 49.11%        |               |               |               |               |
| 11             | Feb-23        |               | 0.00%         |               | 61.39%        | S/0.00          | 0.00%         | 49.11%        |               |               |               |               |



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la  
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 08-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J

Cayhuayna, 25 de enero del 2024.

pág. 4

|    |        |    |           |        |    |            |         |             |        |        |
|----|--------|----|-----------|--------|----|------------|---------|-------------|--------|--------|
| 12 | Mar-23 | S/ | 61,438.38 | 38.61% | S/ | 159,140.55 | 100.00% | S/49,150.70 | 30.89% | 80.00% |
| 13 | Abr-23 |    |           | 0.00%  |    |            | 100.00% | S/0.00      | 0.00%  | 80.00% |

S/ 159,140.55

S/ 127,312.44

VIII. ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - ADICIONAL N°02

| Mes 1          | Mes 2          | Mes 3          | Mes 4          | Mes 5          | Mes 6          | Mes 7          | Mes 8          | Mes 9          | Mes 10         | Mes 11         | Mes 12         | Mes 13         |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Del 13/04/2023 | Del 15/05/2023 | Del 10/06/2023 | Del 10/07/2023 | Del 10/08/2023 | Del 10/09/2023 | Del 10/10/2023 | Del 10/11/2023 | Del 10/12/2023 | Del 10/01/2024 | Del 10/02/2024 | Del 10/03/2024 | Del 10/04/2024 |
| Al 30/04/2023  | Al 31/05/2023  | Al 30/06/2023  | Al 31/07/2023  | Al 31/08/2023  | Al 30/09/2023  | Al 31/10/2023  | Al 30/11/2023  | Al 31/12/2023  | Al 31/01/2024  | Al 29/02/2024  | Al 31/03/2024  | Al 30/04/2024  |
| S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 1,354.56    | S/ 677.27      | S/ 677.27      | S/ 677.27      | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        |
| S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 207.25      | S/ 103.62      | S/ 103.62      | S/ 103.62      | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        |
| S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 203.19      | S/ 101.59      | S/ 101.59      | S/ 101.59      | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        |
| S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 1,765.00    | S/ 882.48      | S/ 882.48      | S/ 882.48      | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        |
| S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 1,765.00    | S/ 882.48      | S/ 882.48      | S/ 882.48      | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        |
| 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 50.00%         | 25.00%         | 25.00%         | 25.00%         | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 50.00%         | 75.00%         | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |

| N° | MES    | PROGRAMADO  |        |           | 80% PROGRAMADO. |        |           |
|----|--------|-------------|--------|-----------|-----------------|--------|-----------|
|    |        | MENSUAL     | %/MES  | ACUMULADO | MENSUAL         | %/MES  | ACUMULADO |
| 1  | Abr-22 |             | 0.00%  | 0.00%     | S/0.00          | 0.00%  | 0.00%     |
| 2  | May-22 |             | 0.00%  | 0.00%     | S/0.00          | 0.00%  | 0.00%     |
| 3  | Jun-22 |             | 0.00%  | 0.00%     | S/0.00          | 0.00%  | 0.00%     |
| 4  | Jul-22 |             | 0.00%  | 0.00%     | S/0.00          | 0.00%  | 0.00%     |
| 5  | Ago-22 |             | 0.00%  | 0.00%     | S/0.00          | 0.00%  | 0.00%     |
| 6  | Set-22 | S/ 1,765.00 | 50.00% | 50.00%    | S/1,412.00      | 40.00% | 40.00%    |
| 7  | Oct-22 | S/ 882.48   | 25.00% | 75.00%    | S/705.98        | 20.00% | 60.00%    |
| 8  | Nov-22 | S/ 882.48   | 25.00% | 100.00%   | S/705.98        | 20.00% | 80.00%    |
| 9  | Dic-22 |             | 0.00%  | 100.00%   | S/0.00          | 0.00%  | 80.00%    |
| 10 | Ene-23 |             | 0.00%  | 100.00%   | S/0.00          | 0.00%  | 80.00%    |
| 11 | Feb-23 |             | 0.00%  | 100.00%   | S/0.00          | 0.00%  | 80.00%    |
| 12 | Mar-23 |             | 0.00%  | 100.00%   | S/0.00          | 0.00%  | 80.00%    |
| 13 | Abr-23 |             | 0.00%  | 100.00%   | S/0.00          | 0.00%  | 80.00%    |

S/ 3,529.96

S/ 2,823.97

IX. ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - ADICIONAL N°03

| Mes 1          | Mes 2          | Mes 3          | Mes 4          | Mes 5          | Mes 6          | Mes 7          | Mes 8          | Mes 9          | Mes 10         | Mes 11         | Mes 12         | Mes 13         |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Del 13/04/2023 | Del 15/05/2023 | Del 10/06/2023 | Del 10/07/2023 | Del 10/08/2023 | Del 10/09/2023 | Del 10/10/2023 | Del 10/11/2023 | Del 10/12/2023 | Del 10/01/2024 | Del 10/02/2024 | Del 10/03/2024 | Del 10/04/2024 |
| Al 30/04/2023  | Al 31/05/2023  | Al 30/06/2023  | Al 31/07/2023  | Al 31/08/2023  | Al 30/09/2023  | Al 31/10/2023  | Al 30/11/2023  | Al 31/12/2023  | Al 31/01/2024  | Al 29/02/2024  | Al 31/03/2024  | Al 30/04/2024  |
| S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 62,506.52   | S/ 5,181.08    | S/ 0.00        | S/ 0.00        |
| S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 9,563.50    | S/ 792.70      | S/ 0.00        | S/ 0.00        |
| S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 9,375.98    | S/ 777.16      | S/ 0.00        | S/ 0.00        |
| S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 81,446.00   | S/ 6,750.94    | S/ 0.00        | S/ 0.00        |
| S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 81,446.00   | S/ 6,750.94    | S/ 0.00        | S/ 0.00        |
| 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 92.35%         | 7.65%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 92.35%         | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |

| N° | MES    | PROGRAMADO   |        |           | 80% PROGRAMADO. |        |           |
|----|--------|--------------|--------|-----------|-----------------|--------|-----------|
|    |        | MENSUAL      | %/MES  | ACUMULADO | MENSUAL         | %/MES  | ACUMULADO |
| 1  | Abr-22 |              | 0.00%  | 0.00%     | S/0.00          | 0.00%  | 0.00%     |
| 2  | May-22 |              | 0.00%  | 0.00%     | S/0.00          | 0.00%  | 0.00%     |
| 3  | Jun-22 |              | 0.00%  | 0.00%     | S/0.00          | 0.00%  | 0.00%     |
| 4  | Jul-22 |              | 0.00%  | 0.00%     | S/0.00          | 0.00%  | 0.00%     |
| 5  | Ago-22 |              | 0.00%  | 0.00%     | S/0.00          | 0.00%  | 0.00%     |
| 6  | Set-22 |              | 0.00%  | 0.00%     | S/0.00          | 0.00%  | 0.00%     |
| 7  | Oct-22 |              | 0.00%  | 0.00%     | S/0.00          | 0.00%  | 0.00%     |
| 8  | Nov-22 |              | 0.00%  | 0.00%     | S/0.00          | 0.00%  | 0.00%     |
| 9  | Dic-22 |              | 0.00%  | 0.00%     | S/0.00          | 0.00%  | 0.00%     |
| 10 | Ene-23 | S/ 81,446.00 | 92.35% | 92.35%    | S/65,156.80     | 73.88% | 73.88%    |
| 11 | Feb-23 | S/ 6,750.94  | 7.65%  | 100.00%   | S/5,400.75      | 6.12%  | 80.00%    |
| 12 | Mar-23 |              | 0.00%  | 100.00%   | S/0.00          | 0.00%  | 80.00%    |
| 13 | Abr-23 |              | 0.00%  | 100.00%   | S/0.00          | 0.00%  | 80.00%    |

S/ 88,196.94

S/ 70,557.55

X. ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - ADICIONAL N°04

| Mes 1          | Mes 2          | Mes 3          | Mes 4          | Mes 5          | Mes 6          | Mes 7          | Mes 8          | Mes 9          | Mes 10         | Mes 11         | Mes 12         | Mes 13         |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Del 13/04/2023 | Del 15/05/2023 | Del 10/06/2023 | Del 10/07/2023 | Del 10/08/2023 | Del 10/09/2023 | Del 10/10/2023 | Del 10/11/2023 | Del 10/12/2023 | Del 10/01/2024 | Del 10/02/2024 | Del 10/03/2024 | Del 10/04/2024 |
| Al 30/04/2023  | Al 31/05/2023  | Al 30/06/2023  | Al 31/07/2023  | Al 31/08/2023  | Al 30/09/2023  | Al 31/10/2023  | Al 30/11/2023  | Al 31/12/2023  | Al 31/01/2024  | Al 29/02/2024  | Al 31/03/2024  | Al 30/04/2024  |
| S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 77,349.60   | S/ 166,599.15  | S/ 0.00        | S/ 0.00        |
| S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 11,834.49   | S/ 25,489.67   | S/ 0.00        | S/ 0.00        |
| S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 11,602.44   | S/ 24,989.87   | S/ 0.00        | S/ 0.00        |
| S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 100,786.53  | S/ 217,078.69  | S/ 0.00        | S/ 0.00        |
| S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 0.00        | S/ 100,786.53  | S/ 217,078.69  | S/ 0.00        | S/ 0.00        |
| 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 31.71%         | 68.29%         | 0.00%          | 0.00%          |
| 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 31.71%         | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |

| N° | MES    | PROGRAMADO |       |           | 80% PROGRAMADO. |       |           |
|----|--------|------------|-------|-----------|-----------------|-------|-----------|
|    |        | MENSUAL    | %/MES | ACUMULADO | MENSUAL         | %/MES | ACUMULADO |
| 1  | Abr-22 |            | 0.00% | 0.00%     | S/0.00          | 0.00% | 0.00%     |
| 2  | May-22 |            | 0.00% | 0.00%     | S/0.00          | 0.00% | 0.00%     |
| 3  | Jun-22 |            | 0.00% | 0.00%     | S/0.00          | 0.00% | 0.00%     |
| 4  | Jul-22 |            | 0.00% | 0.00%     | S/0.00          | 0.00% | 0.00%     |
| 5  | Ago-22 |            | 0.00% | 0.00%     | S/0.00          | 0.00% | 0.00%     |
| 6  | Set-22 |            | 0.00% | 0.00%     | S/0.00          | 0.00% | 0.00%     |
| 7  | Oct-22 |            | 0.00% | 0.00%     | S/0.00          | 0.00% | 0.00%     |
| 8  | Nov-22 |            | 0.00% | 0.00%     | S/0.00          | 0.00% | 0.00%     |
| 9  | Dic-22 |            | 0.00% | 0.00%     | S/0.00          | 0.00% | 0.00%     |

...///



TRANSCRIPCIÓN

En la fecha se ha recibido  
Resolución siguiente

|    |        |    |               |        |         |               |        |        |
|----|--------|----|---------------|--------|---------|---------------|--------|--------|
| 10 | Ene-23 | S/ | 100,786.53    | 31.71% | 31.71%  | S/80,629.22   | 25.37% | 25.37% |
| 11 | Feb-23 | S/ | 217,078.69    | 68.29% | 100.00% | S/173,662.95  | 54.63% | 80.00% |
| 12 | Mar-23 |    |               | 0.00%  | 100.00% | S/0.00        | 0.00%  | 80.00% |
| 13 | Abr-23 |    |               | 0.00%  | 100.00% | S/0.00        | 0.00%  | 80.00% |
|    |        |    | S/ 317,865.22 |        |         | S/ 254,292.18 |        |        |

#### XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo a La aprobación Expediente Adicional con deductivo vinculante de obra N°03 y N°04, se presenta el siguiente calendario actualizado para fines de control económico y físico de obra.
- La modificación del cronograma de realzio para las partidas que estuvieron involucradas con el Expediente adicional con deductivo vinculante de Obra N°03 y N°04.
- La fecha de termino de ejecución de obra se mantendrá vigente en vista que el deductivo realizado no era parte de la ruta critica del proyecto.
- Se solicita al Supervisor de Obra verificar y/o evaluar la Actualización del Cronograma valorizado de Ejecución de Obra, en caso de encontrarse conforme su correspondiente aprobación.
- Se recomienda a la entidad aprobar mediante el acto resolutivo la presente actualización del cronograma

(...)

6. Que, mediante Carta N°013-2024-FHES/RC-CSAYA con fecha de recepción por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones el día 23 de enero de 2024, en el cual el Consorcio Supervisor Almacén y Archivos remite la Actualización del Cronograma de Ejecución de Obra actualizado por los Adicionales N°03 y N° 04 correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO"; asimismo, adjunta el Informe N°007-2024-CSAYA/CEVV-JSO, en el cual señala las siguientes conclusiones y recomendaciones:

(...)

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

000100

1. Se recomienda aprobar el CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE OBRA CON LOS MONTOS Y  
PRCENTAJES SIGUIENTES:

| N° | MES    | PROGR. CONTRACTUAL - DEDUCT. | PROGRAMADO ADICIONAL N°01 | PROGRAMADO ADICIONAL N°02 | PROGRAMADO ADICIONAL N°03 | PROGRAMADO ADICIONAL N°04 |
|----|--------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | abr-22 | S/ 214,726.38                |                           |                           |                           |                           |
| 2  | may-22 | S/ 786,300.03                |                           |                           |                           |                           |
| 3  | jun-22 | S/ 565,552.09                |                           |                           |                           |                           |
| 4  | jul-22 | S/ 924,159.20                |                           |                           |                           |                           |
| 5  | ago-22 | S/ 918,704.78                |                           |                           |                           |                           |
| 6  | sep-22 | S/ 701,229.72                |                           | S/ 1,765.00               |                           |                           |
| 7  | oct-22 | S/ 494,414.01                | S/ 10,225.71              | S/ 882.48                 |                           |                           |
| 8  | nov-22 | S/ 948,158.79                | S/ 85,090.49              | S/ 882.48                 |                           |                           |
| 9  | dic-22 | S/ 755,784.15                | S/ 2,385.97               |                           |                           |                           |
| 10 | ene-23 | S/ 2,028,305.32              |                           |                           | S/ 81,446.00              |                           |
| 11 | feb-23 | S/ 2,090,261.92              |                           |                           | S/ 6,750.94               | S/ 71,245.64              |
| 12 | mar-23 | S/ 1,118,383.33              | S/ 61,438.38              |                           |                           | S/ 158,932.61             |
| 13 | abr-23 | S/ 1,158,902.16              |                           |                           |                           | S/ 87,686.97              |
|    |        | S/ 12,704,879.77             | S/ 159,140.65             | S/ 3,528.96               | S/ 88,195.94              | S/ 317,865.22             |
|    |        | S/ 13,273,612.44             |                           |                           |                           |                           |

| N° | MES    | PROGRAMADO ACUMULADO ADICIONAL + CONTRACTUAL - DEDUCT. |                  |           |         | 80% PROGRAMADO |
|----|--------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|----------------|
|    |        | MONTO PARCIAL ACUM.                                    | MONTO ACUMULADO. | % PARCIAL | % ACUM  |                |
| 1  | abr-22 | S/ 214,726.38                                          | S/ 214,726.38    | 1.62%     | 1.62%   | 1.29%          |
| 2  | may-22 | S/ 786,300.03                                          | S/ 1,001,026.39  | 5.92%     | 7.54%   | 6.03%          |
| 3  | jun-22 | S/ 565,552.09                                          | S/ 1,566,578.39  | 4.26%     | 11.80%  | 9.44%          |
| 4  | jul-22 | S/ 924,159.20                                          | S/ 2,490,737.59  | 6.95%     | 18.76%  | 15.01%         |
| 5  | ago-22 | S/ 918,704.78                                          | S/ 3,409,442.37  | 6.92%     | 25.69%  | 20.55%         |
| 6  | sep-22 | S/ 702,994.72                                          | S/ 4,112,437.09  | 5.30%     | 30.98%  | 24.79%         |
| 7  | oct-22 | S/ 505,522.20                                          | S/ 4,617,959.29  | 3.81%     | 34.79%  | 27.83%         |
| 8  | nov-22 | S/ 1,034,129.76                                        | S/ 5,652,089.05  | 7.79%     | 42.58%  | 34.07%         |
| 9  | dic-22 | S/ 758,170.12                                          | S/ 6,410,259.17  | 5.71%     | 48.29%  | 38.63%         |
| 10 | ene-23 | S/ 2,109,751.32                                        | S/ 8,520,010.49  | 15.89%    | 64.19%  | 51.35%         |
| 11 | feb-23 | S/ 2,168,258.50                                        | S/ 10,688,268.99 | 16.34%    | 80.52%  | 64.42%         |
| 12 | mar-23 | S/ 1,338,754.32                                        | S/ 12,027,023.31 | 10.09%    | 90.61%  | 72.49%         |
| 13 | abr-23 | S/ 1,246,589.13                                        | S/ 13,273,612.44 | 9.39%     | 100.00% | 80.00%         |
|    |        | S/                                                     | 13,273,612.44    |           |         |                |

2. La fecha de término de ejecución de obra vigente se mantiene para el 13 de abril del 2024, ya que se programaron las partidas del expediente del ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 04 dentro del plazo establecido.
3. Se indica el nuevo presupuesto de Obra, por el monto de S/13,273,612.45 (Trece Millones Doscientos Setenta Y Tres Mil Seiscientos Doce Con 45/100 Soles), ya que se afectó por la reducción del monto, como también a causa de los Adicionales de Obra N°01, N°02, N°03 y N°04 con sus respectivos Deductivos de Obra N°01, N°02 y N°03.

...///



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD  
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 08-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J  
Cayhuayna, 25 de enero del 2024.

pág. 6

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| MONTO CONTRACTUAL:                                            | S/ 13,236,612.44 |
| REDUCCION DEL MONTO CONTRACTUAL:                              | S/ 25,726.55     |
| Resolución Jefatural N° 076 - 2023 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J |                  |
| ADICIONAL DE OBRA CON SEGUIMIENTO INICIAL N° 01               | S/ 12,168.97     |
| Adicional de Obra N° 01:                                      | S/ 159,140.55    |
| Deductivo de Obra N° 01:                                      | S/ 126,171.98    |
| Resolución Jefatural N° 082 - 2023 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J |                  |
| ADICIONAL DE OBRA N° 02                                       | S/ 1,628.94      |
| Resolución Jefatural N° 092 - 2023 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J |                  |
| ADICIONAL DE OBRA N° 03 CON SEGUIMIENTO INICIAL N° 02         | S/ 148,740.79    |
| Adicional de Obra N° 03:                                      | S/ 88,196.94     |
| Deductivo de Obra N° 02:                                      | S/ 233,942.69    |
| Resolución Jefatural N° 002 - 2024 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J |                  |
| ADICIONAL DE OBRA N° 04 CON SEGUIMIENTO INICIAL N° 03         | S/ 218,113.88    |
| Adicional de Obra N° 04:                                      | S/ 317,865.22    |
| Deductivo de Obra N° 03:                                      | S/ 102,751.25    |
| Resolución Jefatural N° 004 - 2024 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J |                  |
| NUEVO MONTO CONTRACTUAL MODIFICADO:                           | S/ 13,273,612.44 |

4. Se recomienda a la entidad aprobar vía acto resolutivo la presente actualización del cronograma, para llevar el control de ejecución de obra, de lo contrario se continuará el control de obra con el cronograma vigente emitido según Resolución Jefatural N° 118 - 2023 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J, de fecha 13 de Noviembre del 2023.

(...)

7. Que, mediante Informe N°026-2024-UNHEVAL-UEI/SGAG con fecha de recepción por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones el día 24 de enero de 2024, en el cual el personal de este despacho remite la conformidad del Cronograma Actualizado de Ejecución de Obra por los Adicionales de Obra N°03 y 04 correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO" y señala lo siguiente:

(...)

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


6.1. CONCLUSIONES

- ✓ Se concluye que el periodo de ejecución de la obra es desde el 13 de abril del 2023 hasta el 13 de abril del 2024, teniendo un plazo de 360 días calendarios y una suspensión de plazo desde el 21 al 27 de octubre del 2023.
- ✓ El calendario valorizado CONSOLIDADO de la obra se representa en el siguiente cuadro:

| N° | MES    | AVANCE PROGRAMADO |               |           |             |               |
|----|--------|-------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
|    |        | PARCIAL S/        | ACUMULADO S/  | PARCIAL % | ACUMULADO % | ACUMULADO 80% |
| 1  | abr-23 | 214,726.36        | 214,726.36    | 1.62%     | 1.62%       | 1.29%         |
| 2  | may-23 | 786,300.03        | 1,001,026.39  | 5.92%     | 7.54%       | 6.03%         |
| 3  | jun-23 | 565,552.00        | 1,566,578.39  | 4.26%     | 11.80%      | 9.44%         |
| 4  | jul-23 | 924,159.20        | 2,490,737.59  | 6.96%     | 18.76%      | 15.01%        |
| 5  | ago-23 | 918,704.78        | 3,409,442.37  | 6.92%     | 25.69%      | 20.55%        |
| 6  | set-23 | 702,994.72        | 4,112,437.09  | 5.30%     | 30.98%      | 24.79%        |
| 7  | oct-23 | 505,522.20        | 4,617,959.29  | 3.81%     | 34.79%      | 27.83%        |
| 8  | nov-23 | 1,034,129.76      | 5,652,089.05  | 7.79%     | 42.58%      | 34.07%        |
| 9  | dic-23 | 758,170.12        | 6,410,259.17  | 5.71%     | 48.29%      | 38.63%        |
| 10 | ene-24 | 2,210,537.85      | 8,620,797.02  | 16.65%    | 64.95%      | 51.96%        |
| 11 | feb-24 | 2,314,091.55      | 10,934,888.57 | 17.43%    | 82.38%      | 65.90%        |
| 12 | mar-24 | 1,179,821.71      | 12,114,710.28 | 8.89%     | 91.27%      | 73.02%        |
| 13 | abr-24 | 1,158,902.16      | 13,273,612.44 | 8.73%     | 100.00%     | 80.00%        |
|    |        | 13,273,612.44     |               |           |             |               |

\*Los montos expuestos anteriormente son a nivel de costo total sin IGV

- ✓ La Curva S a utilizar para el control físico de la obra es la siguiente:

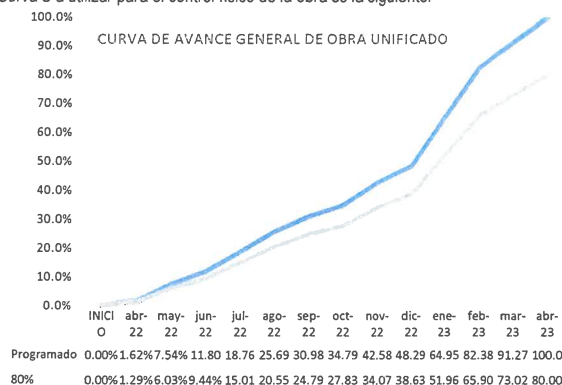

- ✓ Se da CONFORMIDAD a la actualización del cronograma de ejecución de obra, cronograma valorizado de ejecución de obra y Curva S presentados por la Supervisión de Obra.

6.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Entidad Universidad Nacional Hermilio Valdizán aprobar el Calendario de Avance Programado Actualizado, el Cronograma Valorizado de Ejecución de obra y la Curva S mediante acto resolutivo.

(...)

...///



Que, estando a las facultades y atribuciones resolutiveas conferidas al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, mediante la Resolución Rectoral N° 586-2020-UNHEVAL de fecha 16 de julio de 2020, en concordancia con la Resolución Rectoral N° 0145-2022-UNHEVAL, de fecha 17 de febrero del 2021 y en concordancia con la Ley N° 30220 - Ley Universitaria y su reglamento;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y ACTUALIZADO,** concerniente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO", siendo la fecha de **inicio de obra el 13 de abril de 2023** y su **fecha de fin de plazo el 13 de abril de 2024**, en virtud a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

| N° | MES    | AVANCE PROGRAMADO    |               |           |             |               |
|----|--------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
|    |        | PARCIAL S/           | ACUMULADO S/  | PARCIAL % | ACUMULADO % | ACUMULADO 80% |
| 1  | abr-23 | 214,726.36           | 214,726.36    | 1.62%     | 1.62%       | 1.29%         |
| 2  | may-23 | 786,300.03           | 1,001,026.39  | 5.92%     | 7.54%       | 6.03%         |
| 3  | jun-23 | 565,552.00           | 1,566,578.39  | 4.26%     | 11.80%      | 9.44%         |
| 4  | jul-23 | 924,159.20           | 2,490,737.59  | 6.96%     | 18.76%      | 15.01%        |
| 5  | ago-23 | 918,704.78           | 3,409,442.37  | 6.92%     | 25.69%      | 20.55%        |
| 6  | Set-23 | 702,994.72           | 4,112,437.09  | 5.30%     | 30.98%      | 24.79%        |
| 7  | oct-23 | 505,522.20           | 4,617,959.29  | 3.81%     | 34.79%      | 27.83%        |
| 8  | nov-23 | 1,034,129.76         | 5,652,089.05  | 7.79%     | 42.58%      | 34.07%        |
| 9  | dic-23 | 758,170.12           | 6,410,259.17  | 5.71%     | 48.29%      | 38.63%        |
| 10 | ene-24 | 2,210,537.85         | 8,620,797.02  | 16.65%    | 64.95%      | 51.96%        |
| 11 | feb-24 | 2,314,091.55         | 10,934,888.57 | 17.43%    | 82.38%      | 65.90%        |
| 12 | mar-24 | 1,179,821.71         | 12,114,710.28 | 8.89%     | 91.27%      | 73.02%        |
| 13 | abr-24 | 1,158,902.16         | 13,273,612.44 | 8.73%     | 100.00%     | 80.00%        |
|    |        | <b>13,273,612.44</b> |               |           |             |               |

**ARTÍCULO SEGUNDO. - PRECISAR,** que de conformidad con los alcances de Contrato N° 045-2023-UNHEVAL, corresponde al CONSORCIO SUPERVISOR ALMACEN Y ARCHIVO el control y exigir el cumplimiento de la programación y calendarios de obra vigentes, por tanto, el inspector deberá cumplir sus obligaciones.

**ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR,** la presente Resolución al Contratista (CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN-UNHEVAL) y al Supervisor (CONSORCIO SUPERVISOR ALMACEN Y ARCHIVO), con las formalidades de Ley.

**ARTÍCULO CUARTO. - DAR A CONOCER,** la presente Resolución a los Órganos Competentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE



UNIVERSIDAD NACIONAL  
"HERMILIO VALDIZAN"  
GUILLERMO ALSENOZ RAMOS  
JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

**TRANSCRIPCIÓN**

En la fecha se le ha dado  
Resolución siguiente

Distribución:  
RECTOR  
TRANSPARENCIA  
OAJ  
OCI  
DIGA  
ARCHIVO
