



RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 018-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J

Cayhuayna, 22 de marzo del 2024.

VISTO:

Los documentos que se acompañan en ciento treinta (130) folios, en físico;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, Ley N° 30220 – Ley Universitaria; el Estado Reconoce la autonomía normativa, de gobierno, académico, administrativo y económico en los asuntos de su competencia;

Que, el T.U.O. de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sobre la base de aplicación de leyes en el tiempo, prescriben una serie de disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contratación pública, en lo concerniente a Bienes, Servicios u Obras, y a su vez regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, mediante CONTRATO N°007-2023-UNHEVAL de fecha 31 de marzo de 2023, la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN y el CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN suscriben el Contrato de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO" con un plazo de ejecución de trescientos sesenta días y cuyo monto contractual asciende a la suma de S/. 13,206,369.77;

Que, con fecha 05 de julio del 2023 se suscribe la Adenda N° 01 al Contrato N° 007-2023-UNHEVAL, entre la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco y el CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO", cuyo monto contractual asciende a la suma de S/ 13,167,745.69;

Que, con fecha 27 de octubre del 2023 se suscribe el Contrato N° 045-2023-UNHEVAL, entre la UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZÁN y el CONSORCIO SUPERVISOR ALMACEN Y ARCHIVO, para el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO", con un plazo de servicio de 390 días calendario (360 días para la supervisión de la obra y 30 días para la recepción y liquidación de obra) y cuyo monto contractual asciende a la suma de S/. 598,466.73

Que, el literal f) del segundo párrafo del artículo 2° del T.U.O. de la Ley de N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 082-2019 -EF, establece lo siguiente: "f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos".

Que, en ese orden de ideas, el artículo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, precisa que: "Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra 203.1. Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. 203.2. El calendario acelerado es revisado por el supervisor o inspector de obra, quién a su vez en un plazo de tres (3) días otorga conformidad y lo eleva a la Entidad para su aprobación en un plazo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. 203.3. Dicho calendario se toma en cuenta solo con fines del control de los avances físicos reprogramados de la obra y no para el análisis de afectación de la ruta crítica con fines de trámite de ampliaciones de plazo, para cuyo caso se considera el último calendario actualizado vigente. 203.4. La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el numeral precedente puede ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reajustes ni para sustentar las solicitudes de ampliaciones de plazo. 203.5. Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra e informa a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo

...///



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 08-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J
Cayhuayna, 25 de enero del 2024.

pág. 2

necesario apercibimiento alguno al contratista de obra".

Que, en mérito a la norma legal señalada en líneas anteriores, se advierte los siguientes actuados:

Que, mediante Carta N° 029-2024-LLTM/RC(CVCU) con fecha de recepción por parte del Supervisor de Obra el día 14 de marzo de 2024, en el cual remite la actualización del Cronograma de Ejecución de Obra, correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO"; asimismo, adjunta el Informe N° 025-2024-HGLLA/RO(CVCU), el mismo que señala lo siguiente:

(...)

IV. ANÁLISIS

4.1. CRONOGRAMA ACCELERADO DE OBRA

En vista que no se cumplió con la meta establecida en la programación inicial del proyecto, en marco a la ley de contrataciones del estado Art.203, se presenta la reprogramación de las actividades pendientes con el fin de cumplir con la fecha de término previsto inicialmente, es por ende que se presentan; el cronograma valorizado (contractual + deductivo) - (Adicional N°01) y (Contractual - Deductivo + Adicional N°01), siendo este último el que se usará para controlar el avance global de la obra.

Cabe resaltar que la reprogramación de las actividades solo se tomará en cuenta para la comparación mensual del avance ejecutado con el nuevo programado.

4.2. CURVA "S" Y CALENDARIO VALORIZADO

La actualización del cronograma se fundamenta en el párrafo anterior, en consecuencia, corresponde la actualización del Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra y Curva "S", entonces, habiendo realizado la reprogramación y consecuentemente observado la nueva curva "S" se tiene una programación de acuerdo a lo que se vienen avanzando actualmente, lo cual se ve reflejado en los porcentajes de avance ejecutados y los nuevos proyectados.

ESPECIALIDAD	PRESUPUESTO TO EXPENDIABLE CONTRACTUAL AL	REDUCCION N DE OBRA N°01	PRESUPUESTO TO VIGENTE	PRESUPUESTO TO ADICIONAL N°01	PRESUPUESTO TO ADICIONAL N°02	PRESUPUESTO TO ADICIONAL N°03	PRESUPUESTO TO ADICIONAL N°04	PRESUPUESTO TO ADICIONAL N°05	PRESUPUESTO TO DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	PRESUPUESTO TO DEDUCTIVO VINCULANTE N°02	PRESUPUESTO TO DEDUCTIVO VINCULANTE N°03	PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N°04	INCIDENCIA RESPECTO AL MONTO VIGENTE CONTRACTUAL AL
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 210,605.43		S/ 210,605.43										S/ 210,605.43
ESTRUCTURAS	S/ 3,939,062.75		S/ 3,939,062.75		S/ 2,709.10					S/ 56,584.73	S/ 158,866.50		S/ 3,770,277.00
ARQUITECTURA	S/ 3,336,837.53		S/ 3,336,837.53		S/ 74,982.48		S/ 67,687.60	S/ 243,948.75	S/ 19,865.67	S/ 19,946.86	S/ 19,575.09	S/ 78,857.44	S/ 3,155,616.91
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 245,577.63		S/ 245,577.63										S/ 245,577.63
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 523,971.17		S/ 523,971.17		S/ 47,151.48					S/ 17,300.32			S/ 506,670.85
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	S/ 473,617.01		S/ 473,617.01										S/ 473,617.01
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	S/ 283,383.49		S/ 283,383.49										S/ 283,383.49
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	S/ 326,230.60	S/ 29,642.43	S/ 296,588.17										S/ 296,588.17
IMPACTO AMBIENTAL	S/ 160,186.28		S/ 160,186.28										S/ 160,186.28
COSTO TOTAL:	S/ 8,499,471.89	S/ 29,642.43	S/ 8,469,829.46	S/ 122,133.96	S/ 2,709.10	S/ 67,687.60	S/ 243,948.75	S/ 318,886.87	S/ 86,831.81	S/ 178,541.59	S/ 78,857.44	S/ 273,228.73	S/ 8,196,587,717.87
GASTOS GENERALES 15.30%:	S/ 1,453,419.20	S/ 4,535.29	S/ 1,448,883.91	S/ 18,686.50	S/ 414.49	S/ 10,335.20	S/ 37,324.16	S/ 48,939.60	S/ 14,815.28	S/ 27,469.88	S/ 12,065.19	S/ 41,803.88	S/ 1,406,488.94
UTILIDAD 15.00%:	S/ 1,424,920.72	S/ 4,448.38	S/ 1,420,472.34	S/ 18,323.09	S/ 406.37	S/ 10,153.14	S/ 38,592.31	S/ 47,880.00	S/ 14,524.79	S/ 26,931.24	S/ 11,828.82	S/ 40,894.01	S/ 1,379,678.67
COSTO PARCIAL:	S/ 12,377,811.87	S/ 38,624.10	S/ 12,339,187.77	S/ 159,140.55	S/ 3,529.96	S/ 80,196.94	S/ 171,865.22	S/ 416,788.27	S/ 128,171.88	S/ 223,842.69	S/ 102,751.25	S/ 83,681.43	S/ 12,155,505.86
EQUIPAMIENTO:	S/ 828,557.00		S/ 828,557.00										S/ 828,557.00
COSTO TOTAL:	S/ 13,206,368.87	S/ 38,624.10	S/ 13,167,744.77	S/ 159,140.55	S/ 3,529.96	S/ 80,196.94	S/ 171,865.22	S/ 416,788.27	S/ 128,171.88	S/ 223,842.69	S/ 102,751.25	S/ 83,681.43	S/ 13,086,589.31
													ADICIONAL NETO S/ 168,638.59

V. DEL CRONOGRAMA ACCELERADO DE OBRA - UNIFICADO

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13
Del 15/04/2023	Del 15/05/2023	Del 15/06/2023	Del 15/07/2023	Del 15/08/2023	Del 15/09/2023	Del 15/10/2023	Del 15/11/2023	Del 15/12/2023	Del 15/01/2024	Del 15/02/2024	Del 15/03/2024	Del 15/04/2024
A/ 309,040.00	A/ 315,020.00	A/ 309,020.00	A/ 310,100.00	A/ 310,020.00	A/ 310,020.00	A/ 310,020.00	A/ 310,020.00	A/ 310,020.00	A/ 310,020.00	A/ 310,020.00	A/ 310,020.00	A/ 310,020.00
S/ 234,985.37	S/ 625,740.42	S/ 457,802.03	S/ 577,548.70	S/ 745,664.22	S/ 641,852.76	S/ 390,121.54	S/ 407,198.69	S/ 283,799.76	S/ 952,124.82	S/ 871,735.26	S/ 1,457,115.68	S/ 1,954,028.62
S/ 35,952.76	S/ 95,738.28	S/ 70,043.71	S/ 88,354.95	S/ 114,086.63	S/ 98,203.47	S/ 59,688.60	S/ 62,301.40	S/ 43,115.36	S/ 145,675.10	S/ 133,375.49	S/ 222,938.70	S/ 238,966.39
S/ 35,247.81	S/ 93,861.06	S/ 68,670.30	S/ 85,632.31	S/ 111,849.63	S/ 96,277.91	S/ 58,518.23	S/ 61,079.80	S/ 42,269.95	S/ 142,818.78	S/ 130,760.29	S/ 218,567.35	S/ 233,104.30
S/ 306,185.94	S/ 815,339.76	S/ 596,516.04	S/ 752,545.96	S/ 971,600.48	S/ 836,334.14	S/ 508,328.37	S/ 530,579.89	S/ 367,185.08	S/ 1,240,618.64	S/ 1,135,871.04	S/ 1,898,621.73	S/ 2,546,099.31
S/ 306,185.94	S/ 815,339.76	S/ 596,516.04	S/ 752,545.96	S/ 971,600.48	S/ 836,334.14	S/ 508,328.37	S/ 530,579.89	S/ 367,185.08	S/ 1,240,618.64	S/ 1,135,871.04	S/ 1,898,621.73	S/ 2,546,099.31
2.30%	6.11%	4.47%	5.64%	7.29%	6.27%	3.81%	3.98%	2.75%	9.30%	8.52%	14.24%	25.31%
2.30%	8.41%	12.88%	18.53%	25.81%	32.09%	35.90%	39.86%	42.63%	51.94%	60.45%	74.69%	100.00%

N°	MES	PROGR. CONTRACTUAL - DEDUCT.	PROGRAMADO ADICIONAL N°01	PROGRAMADO ADICIONAL N°02	PROGRAMADO ADICIONAL N°03	PROGRAMADO ADICIONAL N°04	PROGRAMADO ADICIONAL N°05	PROGRAMADO ACUMULADO ADICIONAL + CONTRACTUAL - DEDUCT.	80% PROGRAMADO
		MONTO PARCIAL ACUM.	MONTO ACUMULADO	% PARCIAL	% ACUM.				
1	Abr-22	S/ 306,185.94						S/ 306,185.94	2.30%
2	May-22	S/ 815,339.76						S/ 1,121,525.70	6.11%
3	Jun-22	S/ 596,516.04						S/ 1,718,041.74	12.88%
4	Jul-22	S/ 752,545.96						S/ 2,470,587.70	18.53%
5	Ago-22	S/ 971,600.48						S/ 3,442,188.18	25.81%
6	Sep-22	S/ 836,334.14						S/ 4,278,522.32	32.09%
7	Oct-22	S/ 508,328.37						S/ 4,786,850.69	35.90%
8	Nov-22	S/ 530,579.89	S/ 3,529.96					S/ 5,317,430.59	39.86%
9	Dic-22	S/ 367,185.08						S/ 5,684,615.67	42.63%
10	Ene-23	S/ 1,164,106.09	S/ 40,691.23		S/ 36,421.33			S/ 6,925,234.32	51.94%
11	Feb-23	S/ 782,320.47	S/ 44,867.53			S/ 187,438.63	S/ 121,244.41	S/ 8,061,105.36	60.45%
12	Mar-23	S/ 1,438,051.11	S/ 74,161.79			S/ 5,752.22	S/ 285,115.90	S/ 9,559,727.07	74.69%
13	Abr-23	S/ 3,283,301.96				S/ 46,023.39	S/ 14,905.90	S/ 13,334,384.28	100.00%

VI. DEL CRONOGRAMA ACCELERADO DE OBRA CONTRACTUAL



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
comemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 08-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J
Cayhuayna, 25 de enero del 2024.

pág. 3

En la fecha se ha expedido
Resolución siguiente

TRANSCRIPCIÓN

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13
Diciembre 2023	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024
A/30440923	A/31052023	A/30662023	A/31461023	A/31062023	A/30992023	A/31072023	A/30712023	A/31032023	A/31032024	A/31032024	A/31032024	A/31042024
S/ 234,985.37	S/ 625,740.42	S/ 457,802.03	S/ 577,548.70	S/ 745,664.22	S/ 641,852.76	S/ 390,121.54	S/ 404,489.59	S/ 281,799.76	S/ 893,404.52	S/ 600,399.44	S/ 1,103,646.29	S/ 2,512,374.82
S/ 35,952.76	S/ 95,738.28	S/ 70,043.71	S/ 88,364.95	S/ 114,086.63	S/ 98,203.47	S/ 59,688.60	S/ 61,886.91	S/ 43,115.36	S/ 136,690.89	S/ 91,861.11	S/ 168,857.88	S/ 384,393.36
S/ 35,247.81	S/ 93,861.06	S/ 68,670.30	S/ 86,632.31	S/ 111,849.63	S/ 96,277.91	S/ 58,518.23	S/ 60,673.44	S/ 42,269.96	S/ 134,010.68	S/ 90,059.92	S/ 165,546.94	S/ 376,856.23
S/ 306,185.94	S/ 815,139.76	S/ 596,516.04	S/ 752,545.96	S/ 971,600.48	S/ 836,334.14	S/ 508,328.37	S/ 527,049.94	S/ 367,185.08	S/ 1,164,106.09	S/ 782,320.47	S/ 1,438,051.11	S/ 3,273,624.41
828557.9												
S/ 306,185.94	S/ 815,139.76	S/ 596,516.04	S/ 752,545.96	S/ 971,600.48	S/ 836,334.14	S/ 508,328.37	S/ 527,049.94	S/ 367,185.08	S/ 1,164,106.09	S/ 782,320.47	S/ 1,438,051.11	S/ 3,102,182.31
2.33%	6.19%	4.53%	5.72%	7.38%	6.35%	3.86%	4.00%	2.79%	8.84%	5.94%	10.92%	31.15%
2.33%	6.19%	4.53%	5.72%	7.38%	6.35%	3.86%	4.00%	2.79%	8.84%	5.94%	10.92%	31.15%
PROGRAMADO												
N°	MES	MENSUAL	%/MES	ACUMULADO	%ACUMULADO	MENSUAL	%/MES	ACUMULADO				
	1	Abr-22	S/ 306,185.94	2.33%	S/ 306,185.94	2.33%	S/244,948.75	1.86%	1.86%			
	2	May-22	S/ 815,339.76	6.19%	S/ 1,121,525.70	8.52%	S/652,271.81	4.95%	6.81%			
	3	Jun-22	S/ 596,516.04	4.53%	S/ 1,718,041.74	13.05%	S/477,212.83	3.62%	10.44%			
	4	Jul-22	S/ 752,545.96	5.72%	S/ 2,470,587.70	18.76%	S/602,036.77	4.57%	15.01%			
	5	Ago-22	S/ 971,600.48	7.38%	S/ 3,442,188.18	26.14%	S/777,280.38	5.90%	20.91%			
	6	Set-22	S/ 836,334.14	6.35%	S/ 4,278,522.32	32.49%	S/669,067.31	5.08%	25.99%			
	7	Oct-22	S/ 508,328.37	3.86%	S/ 4,786,850.69	36.35%	S/406,662.70	3.09%	29.08%			
	8	Nov-22	S/ 527,049.94	4.00%	S/ 5,313,900.63	40.36%	S/421,639.95	3.20%	32.28%			
	9	Dic-22	S/ 367,185.08	2.79%	S/ 5,681,085.71	43.14%	S/293,748.06	2.23%	34.52%			
	10	Ene-23	S/ 1,164,106.09	8.84%	S/ 6,845,191.80	51.98%	S/931,284.87	7.07%	41.59%			
	11	Feb-23	S/ 782,320.47	5.94%	S/ 7,627,512.27	57.93%	S/625,856.38	4.75%	46.34%			
12	Mar-23	S/ 1,438,051.11	10.92%	S/ 9,065,563.38	68.85%	S/1,150,440.89	8.74%	55.08%				
13	Abr-23	S/ 4,102,182.31	31.15%	S/ 13,167,745.69	100.00%	S/3,281,745.85	24.92%	80.00%				
		S/ 13,167,745.69					S/ 10,534,196.55					

VII. DEL CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA - ADICIONAL N°01

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13
Diciembre 2023	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024
A/30642023	A/31052023	A/30662023	A/31461023	A/31062023	A/30992023	A/31072023	A/30712023	A/31032023	A/31032024	A/31032024	A/31032024	A/31042024
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 30,768.40	S/ 34,434.02	S/ 56,931.54	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 4,707.57	S/ 5,268.41	S/ 8,710.52	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 4,615.26	S/ 5,165.10	S/ 8,539.73	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 40,091.23	S/ 44,867.53	S/ 74,181.79	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 40,091.23	S/ 44,867.53	S/ 74,181.79	S/ 0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.19%	28.19%	46.61%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.19%	53.39%	100.00%	100.00%

N°	MES	PROGRAMADO				80% PROGRAMADO.		
		MENSUAL	%/MES	ACUMULADO	% ACUMULADO	MENSUAL	%/MES	ACUMULADO
1	Abr-22		0.00%		0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
2	May-22		0.00%		0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
3	Jun-22		0.00%		0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
4	Jul-22		0.00%		0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
5	Ago-22		0.00%		0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
6	Set-22		0.00%		0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
7	Oct-22	S/ 10,225.71	6.43%	S/ 10,225.71	6.43%	S/8,180.57	5.14%	5.14%
8	Nov-22	S/ 85,090.49	53.47%	S/ 95,316.20	59.89%	S/68,072.39	42.78%	47.92%
9	Dic-22	S/ 2,385.97	1.50%	S/ 97,702.17	61.39%	S/1,908.78	1.20%	49.11%
10	Ene-23		0.00%		61.39%	S/0.00	0.00%	49.11%
11	Feb-23		0.00%		61.39%	S/0.00	0.00%	49.11%
12	Mar-23	S/ 61,438.38	38.61%	S/ 159,140.55	100.00%	S/49,150.70	30.89%	80.00%
13	Abr-23		0.00%		100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%
		S/ 159,140.55				S/ 127,312.44		

VIII. DEL CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA - ADICIONAL N°02

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13
Diciembre 2023	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024
A/30642023	A/31052023	A/30662023	A/31461023	A/31062023	A/30992023	A/31072023	A/30712023	A/31032023	A/31032024	A/31032024	A/31032024	A/31042024
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

N°	MES	PROGRAMADO			80% PROGRAMADO.		
		MENSUAL	%/MES	ACUMULADO	MENSUAL	%/MES	ACUMULADO
1	Abr-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
2	May-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
3	Jun-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
4	Jul-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
5	Ago-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
6	Set-22	S/ 1,765.00	50.00%	50.00%	S/1,412.00	40.00%	40.00%
7	Oct-22	S/ 882.48	25.00%	75.00%	S/705.98	20.00%	60.00%
8	Nov-22	S/ 882.48	25.00%	100.00%	S/705.98	20.00%	80.00%
9	Dic-22		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%
10	Ene-23		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%
11	Feb-23		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%
12	Mar-23		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%
13	Abr-23		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%
		S/ 3.529.96			S/ 2.823.97		

IX. DEL CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA - ADICIONAL N°03



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 08-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J

Cayhuayna, 25 de enero del 2024.

pág. 4

TRANSCRIPCIÓN

En la fecha se ha recibido

Resolución siguiente

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Del 13/04/2023	Del 14/05/2023	Del 14/06/2023	Del 14/07/2023	Del 14/08/2023	Del 14/09/2023	Del 14/10/2023	Del 14/11/2023	Del 14/12/2023	Del 14/01/2024	Del 14/02/2024	Del 14/03/2024
A/3094/2023	A/3105/2023	A/3106/2023	A/3107/2023	A/3108/2023	A/3109/2023	A/3110/2023	A/3111/2023	A/3112/2023	A/3101/2024	A/3102/2024	A/3103/2024
S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/27,951.90	S/0.00	S/4,414.60
S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/4,276.64	S/0.00	S/675.43
S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/4,192.79	S/0.00	S/662.19
S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/36,421.33	S/0.00	S/5,752.22
S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/36,421.33	S/0.00	S/5,752.22
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	41.30%	0.00%	6.52%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	41.30%	41.30%	47.82%

N°	MES	PROGRAMADO			80% PROGRAMADO.		
		MENSUAL	%/MES	ACUMULADO	MENSUAL	%/MES	ACUMULADO
1	Abr-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
2	May-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
3	Jun-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
4	Jul-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
5	Ago-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
6	Set-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
7	Oct-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
8	Nov-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
9	Dic-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
10	Ene-23	S/ 81,446.00	92.35%	92.35%	S/65,156.80	73.88%	73.88%
11	Feb-23	S/ 6,750.94	7.65%	100.00%	S/5,400.75	6.12%	80.00%
12	Mar-23		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%
13	Abr-23		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%

S/ 88,196.94 S/ 70,557.55

X. DEL CRONOGRAMA ACCELERADO DE OBRA - ADICIONAL N°04

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Del 13/04/2023	Del 14/05/2023	Del 14/06/2023	Del 14/07/2023	Del 14/08/2023	Del 14/09/2023	Del 14/10/2023	Del 14/11/2023	Del 14/12/2023	Del 14/01/2024	Del 14/02/2024	Del 14/03/2024
A/3094/2023	A/3105/2023	A/3106/2023	A/3107/2023	A/3108/2023	A/3109/2023	A/3110/2023	A/3111/2023	A/3112/2023	A/3101/2024	A/3102/2024	A/3103/2024
S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/143,851.60	S/88,657.48
S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/22,009.29	S/13,564.59
S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/21,577.74	S/13,298.62
S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/187,438.63	S/115,520.69
S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/187,438.63	S/115,520.69
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	58.97%	36.34%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	58.97%	95.31%

N°	MES	PROGRAMADO			80% PROGRAMADO.		
		MENSUAL	%/MES	ACUMULADO	MENSUAL	%/MES	ACUMULADO
1	Abr-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
2	May-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
3	Jun-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
4	Jul-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
5	Ago-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
6	Set-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
7	Oct-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
8	Nov-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
9	Dic-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
10	Ene-23	S/ 100,786.53	31.71%	31.71%	S/80,629.22	25.37%	25.37%
11	Feb-23	S/ 217,078.69	68.29%	100.00%	S/173,662.95	54.63%	80.00%
12	Mar-23		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%
13	Abr-23		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%

S/ 317,865.22 S/ 254,292.18

XI. DEL CRONOGRAMA ACCELERADO DE OBRA - ADICIONAL N°05

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Del 13/04/2023	Del 14/05/2023	Del 14/06/2023	Del 14/07/2023	Del 14/08/2023	Del 14/09/2023	Del 14/10/2023	Del 14/11/2023	Del 14/12/2023	Del 14/01/2024	Del 14/02/2024	Del 14/03/2024
A/3094/2023	A/3105/2023	A/3106/2023	A/3107/2023	A/3108/2023	A/3109/2023	A/3110/2023	A/3111/2023	A/3112/2023	A/3101/2024	A/3102/2024	A/3103/2024
S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/93,050.20	S/209,465.77
S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/14,236.68	S/31,130.26
S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/13,957.53	S/30,519.87
S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/121,244.41	S/265,115.90
S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/121,244.41	S/265,115.90
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.09%	63.61%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.09%	92.70%

N°	MES	PROGRAMADO			80% PROGRAMADO.		
		MENSUAL	%/MES	ACUMULADO	MENSUAL	%/MES	ACUMULADO
1	Abr-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
2	May-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
3	Jun-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
4	Jul-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
5	Ago-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
6	Set-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
7	Oct-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
8	Nov-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
9	Dic-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
10	Ene-23		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
11	Feb-23	S/ 94,915.82	22.77%	22.77%	S/75,932.66	18.22%	18.22%
12	Mar-23	S/ 285,912.49	68.60%	91.37%	S/228,729.99	54.88%	73.10%
13	Abr-23	S/ 35,957.96	8.63%	100.00%	S/28,766.37	6.90%	80.00%

S/ 416,786.27 S/ 333,429.02

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se concluye que en el nuevo cronograma planteado permitirá la culminación de actividades según lo programado inicialmente y permitirá analizar la situación actual en la que se encuentra el avance físico de la obra.
- Para la reprogramación de actividades se tuvo en cuenta el tiempo restante de plazo, así como las partidas por ejecutar, por lo que se realizó la aceleración de trabajos pendientes para poder así cumplir con el plazo establecido.
- Se solicita al supervisor de Obra verificar y/o evaluar la Reprogramación del Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra, en caso de encontrarse conforme su correspondiente aprobación.

...!!!



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 08-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J
Cayuhayna, 25 de enero del 2024.

pág. 5

- (...)
- Se recalca que el nuevo calendario presentado solo se tomará en cuenta para el control de avances físicos reprogramados de la obra.

2. Que, mediante Carta N°042-2024-FHES/RC-CSAYA con fecha de recepción por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones el día 15 de marzo de 2024, en el cual el Consorcio Supervisor Almacén y Archivos remite la presentación del Cronograma Acelerado de Ejecución de Obra por caída por debajo del 80% de su ejecución con el programado durante el periodo de febrero 2024 correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO"; asimismo, adjunta el Informe N°031-2024-CSAYA/CEVV-JSO, en el cual señala las siguientes conclusiones y recomendaciones:

(...)

Item	Unidad	Medida	Valor	Unidad	Medida	Valor	Unidad	Medida	Valor	Unidad	Medida	Valor	Unidad	Medida	Valor	Unidad	Medida	Valor
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	8													



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Cayhuayna, 25 de enero del 2024.

pág. 6

[illegible]

TRANSOMITE

2. La fecha de término de Ejecución de obra vigente se mantiene el 13 de abril del 2024, acelerando los trabajos para cumplir con la fecha prevista de culminación de obra.

...



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 08-2024-UNHEVAL-DIGA-UEIJ
Cayhuayna, 25 de enero del 2024.

pág. 7

3. Se indica el nuevo presupuesto de Obra por el monto de S/13,334,384.29 (Trece Miliones Treientos treinta y cuatro mil Treientos treinta y cuatro con 28/100 Soles), ya que se afectó por la reducción del monto como también a causa de los Adicionales de Obra N°01, N°02, N°03, N°04 y N°05 con sus respectivos Deductivos de Obra N°01, N°02, N°03 y N°04.

(...)

3. Que, mediante Informe N°079-2024-UNHEVAL-UEIJ/SGAG con fecha de recepción por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones el día 22 de marzo de 2024, en el cual el Ingeniero Civil II de este despacho remite la conformidad del Cronograma Acelerado de Obra correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO" y señala lo siguiente:

(...)

4. ANÁLISIS

Mediante el Informe N°031-2024-CSAYA/CEVV-JSO, presentado con Carta N°042-2024-FHES/RC-CSAYA, el Supervisor de Obra presenta el cronograma de ejecución acelerado, toda vez que, de fecha 01 de marzo del 2024, mediante Asiento N°819, el Supervisor de obra solicitó la presentación del cronograma acelerado de obra, ya que la valorización acumulada del mes de febrero resultó ser menor al 80% del avance acumulado programado, y en cumplimiento al Art. 203 del RLCE en el ítem 203.1, el cual señala: "(...) En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra (...)". Se solicitó el cronograma mencionado. Cabe señalar que el presente cronograma no contempla el Adicional N°06, toda vez que este fue aprobado posteriormente a la presentación del cronograma acelerado.

Luego de haber revisado y evaluado los documentos alcanzados, las mismas que se encuentran de acuerdo al plazo contractual vigente, se señala lo siguiente:

Fecha de inicio de obra : 13 de abril de 2023
Plazo contractual de ejecución : 360 días calendario
Suspensión de Plazo N°01 : 07 días
Fecha de culminación de Obra : 13 de abril de 2024

Así mismo, se ha podido verificar que el cronograma PERT-CPM, elaborado por la Residencia, y aprobado por la Supervisión, cuenta con las partidas aceleradas, buscando garantizar la culminación de la obra en el plazo estipulado.

Se presenta, en primer lugar, el cronograma valorizado del Expediente contractual, el cual incluye la Reducción de obra N°01.


N°	MES	AVANCE PROGRAMADO				
		PARCIAL S/	ACUMULADO S/	PARCIAL %	ACUMULADO %	ACUMULADO 80%
1	abr-23	306,185.94	306,185.94	2.33%	2.33%	1.86%
2	may-23	815,339.76	1,121,525.70	6.19%	8.52%	6.81%
3	jun-23	596,516.04	1,718,041.74	4.53%	13.05%	10.44%
4	jul-23	752,545.96	2,470,587.70	5.72%	18.76%	15.01%
5	ago-23	971,600.48	3,442,188.18	7.38%	26.14%	20.91%
6	set-23	836,334.14	4,278,522.32	6.35%	32.49%	25.99%
7	oct-23	508,328.37	4,786,850.69	3.86%	36.35%	29.08%
8	nov-23	527,049.94	5,313,900.63	4.00%	40.36%	32.28%
9	dic-23	367,185.08	5,681,085.71	2.79%	43.14%	34.52%
10	ene-24	1,164,106.09	6,845,191.80	8.84%	51.98%	41.59%
11	feb-24	782,320.47	7,627,512.27	5.94%	57.93%	46.34%
12	mar-24	1,438,051.11	9,065,563.38	10.92%	68.85%	55.08%
13	abr-24	4,102,182.31	13,167,745.69	31.15%	100.00%	80.00%

* Los montos expuestos anteriormente son a nivel de costo total sin IGV

Asimismo, se presenta el cronograma valorizado de ejecución de obra y la curva S consolidados (CONTRACTUAL - REDUCCIÓN + ADICIONAL N°01 + ADICIONAL N°02 + ADICIONAL N°03 + ADICIONAL N°04 + ADICIONAL N°05 - DEDUCTIVOS VINCULADOS), los cuales servirán para el control de avance mensual físico y financiero de la obra de referencia (3), los mismos que se detallan a continuación:

N°	MES	AVANCE PROGRAMADO				
		PARCIAL S/	ACUMULADO S/	PARCIAL %	ACUMULADO %	ACUMULADO 80%
1	abr-23	306,185.94	306,185.94	2.30%	2.30%	1.84%
2	may-23	815,339.76	1,121,525.70	6.11%	8.41%	6.73%
3	jun-23	596,516.04	1,718,041.74	4.47%	12.88%	10.31%
4	jul-23	752,545.96	2,470,587.70	5.64%	18.53%	14.82%
5	ago-23	971,600.48	3,442,188.18	7.29%	25.81%	20.65%
6	set-23	836,334.14	4,278,522.32	6.27%	32.09%	25.67%
7	oct-23	508,328.37	4,786,850.69	3.81%	35.90%	28.72%
8	nov-23	530,579.90	5,317,430.59	3.98%	39.88%	31.90%
9	dic-23	367,185.08	5,684,615.67	2.75%	42.63%	34.11%
10	ene-24	1,240,618.65	6,925,234.32	9.30%	51.94%	41.55%
11	feb-24	1,135,871.04	8,061,105.36	8.52%	60.45%	48.36%
12	mar-24	1,898,621.71	9,959,727.07	14.24%	74.69%	59.75%
13	abr-24	3,374,657.21	13,334,384.28	25.31%	100.00%	80.00%

* Los montos expuestos anteriormente son a nivel de costo total sin IGV

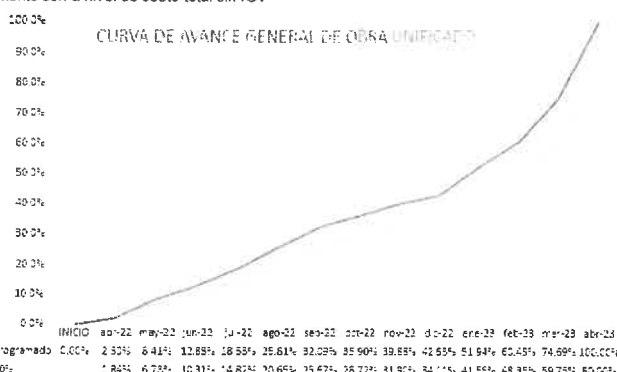



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 08-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J
Cayhuayna, 25 de enero del 2024.

pág. 8

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


5.1. CONCLUSIONES

- ✓ Se concluye que el periodo de ejecución de la obra es desde el 13 de abril del 2023 hasta el 13 de abril del 2024, teniendo un plazo de 360 días calendario y una suspensión de plazo desde el 21 al 27 de octubre del 2023.
- ✓ El calendario valorizado CONSOLIDADO ACELERADO de la obra se representa en el siguiente cuadro:

N°	MES	AVANCE PROGRAMADO				
		PARCIAL S/	ACUMULADO S/	PARCIAL %	ACUMULADO %	ACUMULADO 80%
1	abr-23	306,185.94	306,185.94	2.30%	2.30%	1.84%
2	may-23	815,339.76	1,121,525.70	6.11%	8.41%	6.73%
3	jun-23	596,516.04	1,718,041.74	4.47%	12.88%	10.31%
4	jul-23	752,545.96	2,470,587.70	5.64%	18.53%	14.82%
5	ago-23	971,600.48	3,442,188.18	7.29%	25.81%	20.65%
6	Set-23	836,334.14	4,278,522.32	6.27%	32.09%	25.67%
7	oct-23	508,328.37	4,786,850.69	3.81%	35.90%	28.72%
8	nov-23	530,579.90	5,317,430.59	3.98%	39.88%	31.90%
9	dic-23	367,185.08	5,684,615.67	2.75%	42.63%	34.11%
10	ene-24	1,240,618.65	6,925,234.32	9.30%	51.94%	41.55%
11	feb-24	1,135,871.04	8,061,105.36	8.52%	60.45%	48.36%
12	mar-24	1,898,621.71	9,959,727.07	14.24%	74.69%	59.75%
13	abr-24	3,374,657.21	13,334,384.28	25.31%	100.00%	80.00%
		13,334,384.29				

*Los montos expuestos anteriormente son a nivel de costo total sin IGV

- ✓ La Curva S a utilizar para el control físico de la obra es la siguiente:

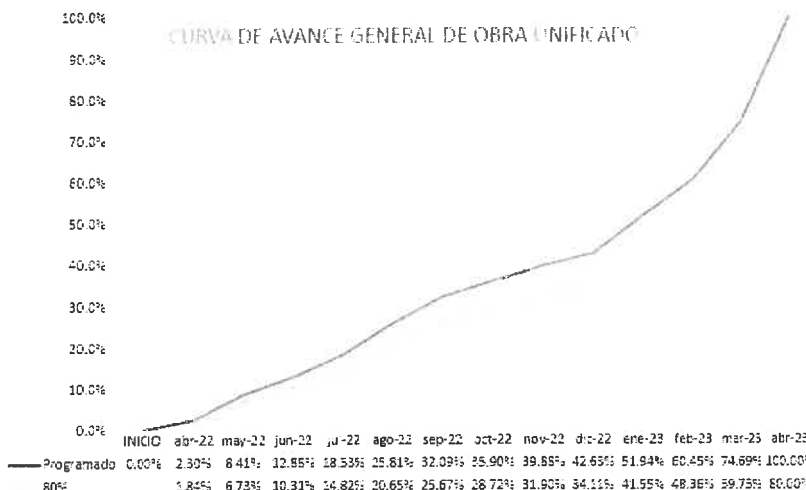

- ✓ Se da **CONFORMIDAD** a la actualización del cronograma de ejecución de obra **ACELERADO**, cronograma valorizado de ejecución de obra **ACELERADO** y Curva S presentados por la Supervisión de Obra.
- ✓ Como señala el Art. 203, en el numeral N°05, "cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra e informa a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra", por lo que, si el contratista realiza un avance menor al 80% programado por segunda vez, será causal de resolución de contrato o intervención económica.
- ✓ El presente cronograma no contempla la aprobación del Adicional N°06, toda vez que el mencionado adicional fue aprobado posteriormente a la presentación del cronograma acelerado. Asimismo, la obra se encuentra con el plazo de ejecución suspendido.

5.2. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda a la Entidad Universidad Nacional Hermilio Valdizán aprobar el Calendario de Avance Programado Acelerado, el Cronograma Valorizado de Ejecución de obra Acelerado y la Curva S respectiva.
- ✓ Se recomienda comunicar al contratista CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN y a la supervisión CONSORCIO SUPERVISOR ALMACEN Y ARCHIVOS la aprobación del cronograma acelerado de obra.

Que, estando a las facultades y atribuciones resolutorias conferidas al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, mediante la Resolución Rectoral N° 586-2020-UNHEVAL de fecha 16 de julio de 2020, en concordancia con la Resolución Rectoral N° 0145-2022-UNHEVAL, de fecha 17 de febrero del 2021 y en concordancia con la Ley N° 30220 - Ley Universitaria y su reglamento;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - **TENGASE POR APROBADA**, el Calendario Programado Acelerado de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO", por demoras injustificadas en la ejecución de la obra, en virtud a los fundamentos expuestos en la parte

...///



considerativa de la presente resolución, debiendo tenerse en consideración lo siguiente:

N°	MES	AVANCE PROGRAMADO				
		PARCIAL S/	ACUMULADO S/	PARCIAL %	ACUMULADO %	ACUMULADO 80%
1	abr-23	306,185.94	306,185.94	2.30%	2.30%	1.84%
2	may-23	815,339.76	1,121,525.70	6.11%	8.41%	6.73%
3	jun-23	596,516.04	1,718,041.74	4.47%	12.88%	10.31%
4	jul-23	752,545.96	2,470,587.70	5.64%	18.53%	14.82%
5	ago-23	971,600.48	3,442,188.18	7.29%	25.81%	20.65%
6	Set-23	836,334.14	4,278,522.32	6.27%	32.09%	25.67%
7	oct-23	508,328.37	4,786,850.69	3.81%	35.90%	28.72%
8	nov-23	530,579.90	5,317,430.59	3.98%	39.88%	31.90%
9	dic-23	367,185.08	5,684,615.67	2.75%	42.63%	34.11%
10	ene-24	1,240,618.65	6,925,234.32	9.30%	51.94%	41.55%
11	feb-24	1,135,871.04	8,061,105.36	8.52%	60.45%	48.36%
12	mar-24	1,898,621.71	9,959,727.07	14.24%	74.69%	59.75%
13	abr-24	3,374,657.21	13,334,384.28	25.31%	100.00%	80.00%
		13,334,384.29				

ARTÍCULO SEGUNDO. – PRECISAR, que de conformidad con los alcances de Contrato N° 045-2023-UNHEVAL, corresponde al CONSORCIO SUPERVISOR ALMACEN Y ARCHIVO el control y exigir el cumplimiento de la programación y calendarios de obra vigentes, por tanto, el Supervisor deberá cumplir sus obligaciones.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución al Contratista (CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN-UNHEVAL) y al Supervisor (CONSORCIO SUPERVISOR ALMACEN Y ARCHIVO), con las formalidades de Ley.

ARTÍCULO CUARTO. - DAR A CONOCER, la presente Resolución a los Órganos Competentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
"HERMILIO VALDIZÁN"
ING. GUILLELMO ALONSO PROZEMOS
2024-01-25

TRANSCRIPCIÓN
En la fecha se ha expedido
Resolución siguiente

Distribución:
RECTOR
TRANSPARENCIA
CAJ
CCI
DIGA
ARCHIVO

