



RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 023-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J

Cayhuayna, 29 de abril del 2024.

VISTO:

Los documentos que se acompañan en doscientos treinta y tres (233) folios, en físico.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, Ley N° 30220 – Ley Universitaria; el Estado Reconoce la autonomía normativa, de gobierno, académico, administrativo y económico en los asuntos de su competencia;

Que, el T.U.O. de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sobre la base de aplicación de leyes en el tiempo, prescriben una serie de disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contratación pública, en lo concerniente a Bienes, Servicios u Obras, y a su vez regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, mediante **CONTRATO N°007-2023-UNHEVAL** de fecha 31 de marzo de 2023, la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN y el CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN suscriben el Contrato de Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO"** con un plazo de ejecución de trescientos sesenta días y cuyo monto contractual asciende a la suma de **S/. 13,206,369.77**;

Que, con fecha 05 de julio del 2023 se suscribe la **Adenda N° 01 al Contrato N° 007-2023-UNHEVAL**, entre la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco y el CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN, para la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO"**, cuyo monto contractual asciende a la suma de **S/ 13,167,745.69**.

Que, con fecha 27 de octubre del 2023 se suscribe el **Contrato N° 045-2023-UNHEVAL**, entre la UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZÁN y el CONSORCIO SUPERVISOR ALMACEN Y ARCHIVO, para el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO"**, con un plazo de servicio de 390 días calendario (360 días para la supervisión de la obra y 30 días para la recepción y liquidación de obra) y cuyo monto contractual asciende a la suma de **S/. 598,466.73**;

Que, el literal f) del segundo párrafo del artículo 2° del T.U.O. de la Ley de N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante **D.S. N° 082-2019 -EF**, establece lo siguiente:

...f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos". ...

Que, en ese orden de ideas, el artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, precisa que:

"202.1. Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un plazo máximo de siete (7) días hace una actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica. 202.2. El Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecución de Obra previo, así como la propuesta sustentada del contratista que permita superar

...///



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 023-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J

Cayhuayna, 29 de abril del 2024.

pág. 2

las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual. 202.3. El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) días manifiesta su aprobación u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo máximo de siete (7) días luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos señalados, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes. 202.4. Ante la falta de presentación del Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo señalado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos".

Que, en mérito a la norma legal señalada en líneas anteriores, se advierte los siguientes actuados:

1. Que, mediante CARTA N°045-2024-LLTM/RC(CVCU) con fecha de recepción por parte del Supervisor de Obra el día 24 de abril de 2024, en el cual remite la actualización del cronograma de ejecución de obra por el Adicional de Obra N° 06 y Suspensión de Plazo N°02; asimismo, adjunta el INFORME N°001-2024-EFFM/RO(CVCU), suscrito por el Residente de Obra quien remite el cronograma actualizado por el Adicional de Obra N° 06 y Suspensión de Plazo N°02, correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO"; asimismo, señala lo siguiente:

(...)

VI. ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA VIGENTE
6.1. CRONOGRAMA VALORIZADO ACCELERADO UNIFICADO

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Item 12	Item 13	Item 14
Del 13/04/2023	Del 14/05/2023	Del 16/06/2023	Del 18/07/2023	Del 19/08/2023	Del 19/09/2023	Del 19/10/2023	Del 19/11/2023	Del 19/12/2023	Del 19/01/2024	Del 19/02/2024	Del 19/03/2024	Del 19/04/2024	Del 19/05/2024
N 3004/2023	N 3105/2023	N 3006/2023	N 3107/2023	N 3008/2023	N 3009/2023	N 3110/2023	N 3011/2023	N 3112/2023	N 3013/2023	N 3114/2024	N 3015/2024	N 3116/2024	N 3017/2024
S/ 234,985.37	S/ 625,740.42	S/ 457,802.03	S/ 577,548.70	S/ 745,664.22	S/ 641,852.76	S/ 390,121.54	S/ 407,138.69	S/ 281,799.76	S/ 952,124.82	S/ 871,735.26	S/ 871,849.34	S/ 496,859.26	S/ 2,205,424.38
S/ 35,952.76	S/ 95,738.28	S/ 70,043.71	S/ 88,164.95	S/ 114,086.63	S/ 98,203.47	S/ 59,688.60	S/ 62,301.40	S/ 43,115.36	S/ 145,675.10	S/ 133,392.92	S/ 133,392.92	S/ 75,631.47	S/ 324,706.87
S/ 35,247.81	S/ 93,161.06	S/ 68,670.30	S/ 86,632.31	S/ 111,849.63	S/ 96,177.91	S/ 58,518.23	S/ 61,079.80	S/ 42,169.96	S/ 142,118.72	S/ 130,760.29	S/ 130,760.29	S/ 74,528.89	S/ 330,113.66
S/ 306,185.94	S/ 815,339.76	S/ 596,516.04	S/ 752,545.96	S/ 971,600.48	S/ 836,334.14	S/ 508,328.37	S/ 530,579.89	S/ 367,185.08	S/ 1,240,618.64	S/ 1,135,871.04	S/ 1,135,871.04	S/ 646,949.62	S/ 2,860,944.91
S/ 306,185.94	S/ 815,339.76	S/ 596,516.04	S/ 752,545.96	S/ 971,600.48	S/ 836,334.14	S/ 508,328.37	S/ 530,579.89	S/ 367,185.08	S/ 1,240,618.64	S/ 1,135,871.04	S/ 1,135,871.04	S/ 646,949.62	S/ 2,860,944.91
2.26%	6.02%	4.41%	5.56%	7.18%	6.18%	3.76%	3.92%	2.71%	8.39%	8.39%	8.39%	4.78%	27.26%
2.26%	8.29%	12.69%	18.26%	25.43%	31.61%	35.37%	39.29%	42.00%	51.17%	59.56%	67.96%	72.74%	100.00%

6.2. CRONOGRAMA VALORIZADO ACCELERADO CONTRACTUAL

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Item 12	Item 13	Item 14
Del 13/04/2023	Del 14/05/2023	Del 16/06/2023	Del 18/07/2023	Del 19/08/2023	Del 19/09/2023	Del 19/10/2023	Del 19/11/2023	Del 19/12/2023	Del 19/01/2024	Del 19/02/2024	Del 19/03/2024	Del 19/04/2024	Del 19/05/2024
N 3004/2023	N 3105/2023	N 3006/2023	N 3107/2023	N 3008/2023	N 3009/2023	N 3110/2023	N 3011/2023	N 3112/2023	N 3013/2023	N 3114/2024	N 3015/2024	N 3116/2024	N 3017/2024
S/ 234,985.37	S/ 625,740.42	S/ 457,802.03	S/ 577,548.70	S/ 745,664.22	S/ 641,852.76	S/ 390,121.54	S/ 404,489.59	S/ 281,799.76	S/ 893,404.52	S/ 800,399.44	S/ 619,772.94	S/ 392,589.18	S/ 2,603,658.99
S/ 35,952.76	S/ 95,738.28	S/ 70,043.71	S/ 88,164.95	S/ 114,086.63	S/ 98,203.47	S/ 59,688.60	S/ 61,886.91	S/ 43,115.36	S/ 136,650.89	S/ 121,611.21	S/ 94,125.26	S/ 60,066.14	S/ 398,359.84
S/ 35,247.81	S/ 93,161.06	S/ 68,670.30	S/ 86,632.31	S/ 111,849.63	S/ 96,177.91	S/ 58,518.23	S/ 60,673.44	S/ 42,169.96	S/ 134,010.68	S/ 120,019.92	S/ 92,965.93	S/ 58,888.39	S/ 390,548.85
S/ 306,185.94	S/ 815,339.76	S/ 596,516.04	S/ 752,545.96	S/ 971,600.48	S/ 836,334.14	S/ 508,328.37	S/ 527,049.94	S/ 367,185.08	S/ 1,164,106.09	S/ 782,320.47	S/ 807,564.13	S/ 511,543.71	S/ 3,192,567.68
S/ 306,185.94	S/ 815,339.76	S/ 596,516.04	S/ 752,545.96	S/ 971,600.48	S/ 836,334.14	S/ 508,328.37	S/ 527,049.94	S/ 367,185.08	S/ 1,164,106.09	S/ 782,320.47	S/ 807,564.13	S/ 511,543.71	S/ 3,192,567.68
2.33%	6.19%	4.53%	5.72%	7.38%	6.35%	3.86%	4.00%	2.79%	8.84%	5.94%	6.13%	3.88%	32.06%
2.33%	8.52%	13.05%	18.76%	26.14%	32.49%	36.35%	40.36%	43.14%	51.98%	57.93%	64.06%	67.94%	96.12%

6.3. CRONOGRAMA VALORIZADO ACCELERADO ADICIONAL N°01

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Item 12	Item 13	Item 14
Del 13/04/2023	Del 14/05/2023	Del 16/06/2023	Del 18/07/2023	Del 19/08/2023	Del 19/09/2023	Del 19/10/2023	Del 19/11/2023	Del 19/12/2023	Del 19/01/2024	Del 19/02/2024	Del 19/03/2024	Del 19/04/2024	Del 19/05/2024
N 3004/2023	N 3105/2023	N 3006/2023	N 3107/2023	N 3008/2023	N 3009/2023	N 3110/2023	N 3011/2023	N 3112/2023	N 3013/2023	N 3114/2024	N 3015/2024	N 3116/2024	N 3017/2024
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 30,768.40	S/ 34,434.02	S/ 3,780.86	S/ 47,151.48	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5,268.41	S/ 5,496.34	S/ 3,496.34	S/ 7,114.18	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 4,615.26	S/ 5,365.10	S/ 1,417.01	S/ 7,072.72	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 40,091.23	S/ 44,867.53	S/ 12,748.41	S/ 61,408.38	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 40,091.23	S/ 44,867.53	S/ 12,748.41	S/ 61,408.38	S/ 0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.19%	28.19%	8.01%	38.61%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.19%	53.39%	61.39%	100.00%	100.00%

6.4. CRONOGRAMA VALORIZADO ACCELERADO ADICIONAL N°02

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Item 12	Item 13	Item 14
Del 13/04/2023	Del 14/05/2023	Del 16/06/2023	Del 18/07/2023	Del 19/08/2023	Del 19/09/2023	Del 19/10/2023	Del 19/11/2023	Del 19/12/2023	Del 19/01/2024	Del 19/02/2024	Del 19/03/2024	Del 19/04/2024	Del 19/05/2024
N 3004/2023	N 3105/2023	N 3006/2023	N 3107/2023	N 3008/2023	N 3009/2023	N 3110/2023	N 3011/2023	N 3112/2023	N 3013/2023	N 3114/2024	N 3015/2024	N 3116/2024	N 3017/2024
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,709.10	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 414.49	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 406.37	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,529.96	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,529.96	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

6.5. CRONOGRAMA VALORIZADO ACCELERADO ADICIONAL N°03



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 023-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J

Cayhuayna, 29 de abril del 2024.

pág. 3

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14
Diciembre 2023	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024	Enero 2025
A 36442023	A 36442024	A 36442025	A 36442026	A 36442027	A 36442028	A 36442029	A 36442030	A 36442031	A 36442032	A 36442033	A 36442034	A 36442035	A 36442036
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,230.40	S/ 37,505.30
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 4,276.64	S/ 0.00	S/ 341.25	S/ 736.31
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 4,192.79	S/ 0.00	S/ 334.56	S/ 5,625.79
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 36,421.33	S/ 0.00	S/ 2,906.21	S/ 48,869.40
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 36,421.33	S/ 0.00	S/ 2,906.21	S/ 48,869.40
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	41.30%	0.00%	0.00%	55.41%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	41.30%	0.00%	0.00%	100.00%

6.6. CRONOGRAMA VALORIZADO ACELERADO ADICIONAL N°04

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14
Diciembre 2023	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024	Enero 2025
A 36442023	A 36442024	A 36442025	A 36442026	A 36442027	A 36442028	A 36442029	A 36442030	A 36442031	A 36442032	A 36442033	A 36442034	A 36442035	A 36442036
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 143,851.60	S/ 60,058.29	S/ 25,739.27	S/ 14,299.59
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 22,009.29	S/ 9,188.92	S/ 3,188.11	S/ 1,187.84
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 21,577.74	S/ 9,008.74	S/ 3,860.89	S/ 1,144.94
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 187,438.63	S/ 78,255.95	S/ 33,538.27	S/ 18,632.57
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 187,438.63	S/ 78,255.95	S/ 33,538.27	S/ 18,632.57
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	58.97%	24.62%	10.55%	5.86%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	58.97%	83.59%	94.14%	100.00%

7. CRONOGRAMA VALORIZADO ACELERADO ADICIONAL N°05

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14
Diciembre 2023	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024	Enero 2025
A 36442023	A 36442024	A 36442025	A 36442026	A 36442027	A 36442028	A 36442029	A 36442030	A 36442031	A 36442032	A 36442033	A 36442034	A 36442035	A 36442036
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 93,050.20	S/ 182,237.85	S/ 19,105.12	S/ 25,473.50
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 14,236.68	S/ 27,812.39	S/ 2,928.08	S/ 3,817.45
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 13,957.53	S/ 27,335.68	S/ 2,865.77	S/ 3,821.02
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 121,244.41	S/ 237,455.92	S/ 24,993.97	S/ 33,191.97
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 121,244.41	S/ 237,455.92	S/ 24,993.97	S/ 33,191.97
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.09%	56.97%	5.97%	7.96%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.09%	86.06%	92.04%	100.00%

8. CRONOGRAMA VALORIZADO ACELERADO ADICIONAL N°06

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14
Diciembre 2023	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024	Enero 2025
A 36442023	A 36442024	A 36442025	A 36442026	A 36442027	A 36442028	A 36442029	A 36442030	A 36442031	A 36442032	A 36442033	A 36442034	A 36442035	A 36442036
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 10,043.81	S/ 279,014.58
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,078.71	S/ 29,966.17
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,506.57	S/ 41,852.20
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 12,629.09	S/ 350,833.05
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 12,629.09	S/ 350,833.05
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.53%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo a La aprobación Expediente Adicional con deductivo vinculante de obra N°06 y la suspensión de plazo de ejecución de Obra N°02, se presenta el siguiente calendario actualizado para fines de control económico y físico de obra.
- Se realizó la actualización del último cronograma vigente de obra, esto con fines de que se siga manteniendo actualizada la ruta crítica contractual para fines de modificaciones del plazo de ejecución de obra.
- Se realizó la actualización del calendario acelerado de obra, para el control financiero mensual y cumplimiento de ejecución de partidas dentro del plazo vigente.
- La modificación de los cronogramas de realzo para las partidas que estuvieron involucradas con el Expediente adicional con deductivo vinculante de Obra N°07, así mismo la actualización del tiempo suspendido, el cual fue por 31 días calendario.
- La nueva fecha de término de ejecución de obra vigente será el 14 de mayo del 2024.
- Se solicita al Supervisor de Obra verificar y/o evaluar la Actualización del Cronograma valorizado de Ejecución de Obra, en caso de encontrarse conforme su correspondiente aprobación.
- Se recomienda a la entidad aprobar mediante el acto resolutorio la presente actualización del cronograma.

2. Que, mediante CARTA N°057-2024-FHES/RC-CSAYA, con fecha de recepción por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones el día 24 de abril de 2024, en el cual el Consorcio Supervisor Almacén y Archivos remite la Actualización del Cronograma de Ejecución de Obra por el Adicional N°06 con deductivo Vinculante N°05 y el reinicio de plazo de ejecución N°02 de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO"; asimismo, adjunta el INFORME N°042-2024-CSAYA/CEVV-JSO, en el cual señala las siguientes conclusiones y recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se recomienda aprobar los CRONOGRAMAS DE OBRA Y EL CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA, ya que la obra se encuentra atrasada, CON LOS MONTO Y PORCENTAJES SEÑALADOS, a continuación:

- CRONOGRAMA UNIFICADO: (ADICIONAL 1+2+3+4+5+6) - (DEDUCTIVO 1 + 2+ 3 + 4 + 5)



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 023-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J
Cayhuayna, 29 de abril del 2024.

pág. 4

N°	MES	PROGR. CONTRACTUAL - DEDUCT.	PROGRAMADO ADICIONAL N°01	PROGRAMADO ADICIONAL N°02	PROGRAMADO ADICIONAL N°03	PROGRAMADO ADICIONAL N°04	PROGRAMADO ADICIONAL N°05	PROGRAMADO ADICIONAL N°06
1	Abr-22	S/ 214,726.36						
2	May-22	S/ 786,300.03						
3	Jun-22	S/ 565,552.00						
4	Jul-22	S/ 924,159.20						
5	Ago-22	S/ 918,704.78						
6	Sep-22	S/ 701,229.72						
7	Oct-22	S/ 494,414.01	S/ 10,225.71	S/ 882.46				
8	Nov-22	S/ 948,156.79	S/ 85,090.49	S/ 882.46				
9	Dic-22	S/ 754,520.94	S/ 2,385.97					
10	Ene-23	S/ 1,841,440.81			S/ 61,446.00	S/ 100,786.53		
11	Feb-23	S/ 1,921,635.91			S/ 6,750.94	S/ 217,078.69	S/ 94,915.82	
12	Mar-23	S/ 775,009.78	S/ 61,438.38				S/ 246,154.03	
13	Abr-23	S/ 155,349.43					S/ 33,982.48	S/ 12,029.09
14	May-23	S/ 1,183,386.36					S/ 38,723.96	S/ 350,833.05

PROGRAMADO ACUMULADO ADICIONAL + CONTRACTUAL - DEDUCT.			
MONTO PARCIAL ACUM.	MONTO ACUMULADO.	% PARCIAL	% ACUM.
S/ 214,726.36	S/ 214,726.36	1.59%	1.59%
S/ 786,300.03	S/ 1,001,026.39	5.81%	7.40%
S/ 565,552.00	S/ 1,566,578.39	4.18%	11.58%
S/ 924,159.20	S/ 2,490,737.59	6.83%	18.40%
S/ 918,704.78	S/ 3,409,442.37	6.79%	25.19%
S/ 702,984.72	S/ 4,112,437.09	5.19%	30.39%
S/ 505,522.20	S/ 4,617,959.29	3.74%	34.12%
S/ 1,034,129.76	S/ 5,652,089.05	7.64%	41.76%
S/ 756,906.91	S/ 6,408,995.96	5.56%	47.36%
S/ 2,023,673.34	S/ 8,432,669.30	14.95%	62.31%
S/ 2,240,381.36	S/ 10,673,050.66	16.55%	78.86%
S/ 1,065,602.19	S/ 11,738,652.85	8.02%	86.89%
S/ 201,970.98	S/ 11,960,623.83	1.49%	88.38%
S/ 1,572,953.37	S/ 13,533,577.20	11.62%	100.00%
S/	S/ 13,533,577.20		

• CRONOGRAMA CONTRACTUAL: (DEDUCTIVO 1 + 2+ 3 +4 +5)

N°	MES	PROGRAMADO			
		MENSUAL	%/MES	ACUMULADO	%ACUMULADO
1	Abr-22	S/ 214,726.36	1.63%	S/ 214,726.36	1.63%
2	May-22	S/ 786,300.03	5.97%	S/ 1,001,026.39	7.60%
3	Jun-22	S/ 565,552.00	4.29%	S/ 1,566,578.39	11.90%
4	Jul-22	S/ 924,159.20	7.02%	S/ 2,490,737.59	18.92%
5	Ago-22	S/ 918,704.78	6.98%	S/ 3,409,442.37	25.89%
6	Sep-22	S/ 701,229.72	5.33%	S/ 4,110,672.09	31.22%
7	Oct-22	S/ 494,414.01	3.75%	S/ 4,605,086.10	34.97%
8	Nov-22	S/ 948,156.79	7.20%	S/ 5,553,242.89	42.17%
9	Dic-22	S/ 754,520.94	5.73%	S/ 6,307,763.83	47.90%
10	Ene-23	S/ 1,841,440.81	13.96%	S/ 8,149,204.64	61.89%
11	Feb-23	S/ 1,921,635.91	14.59%	S/ 10,070,840.55	76.48%
12	Mar-23	S/ 775,009.78	5.89%	S/ 10,845,850.33	82.37%
13	Abr-23	S/ 155,349.43	1.18%	S/ 11,001,199.76	83.55%
14	May-23	S/ 2,166,545.93	16.45%	S/ 13,012,366.26	100.00%
		S/ 13,167,745.69			

• CRONOGRAMA UNIFICADO ACELERADO:

N°	MES	PROGR. CONTRACTUAL - DEDUCT.	PROGRAMADO ADICIONAL N°01	PROGRAMADO ADICIONAL N°02	PROGRAMADO ADICIONAL N°03	PROGRAMADO ADICIONAL N°04	PROGRAMADO ADICIONAL N°05	PROGRAMADO ADICIONAL N°06
1	Abr-22	S/ 306,185.94						
2	May-22	S/ 815,339.76						
3	Jun-22	S/ 596,516.04						
4	Jul-22	S/ 752,545.96						
5	Ago-22	S/ 971,600.48						
6	Sep-22	S/ 836,334.14						
7	Oct-22	S/ 508,328.37						
8	Nov-22	S/ 527,049.94		S/ 3,529.96				
9	Dic-22	S/ 367,185.08						
10	Ene-23	S/ 1,164,106.09	S/ 40,091.23		S/ 36,421.33			
11	Feb-23	S/ 782,320.47	S/ 44,867.53			S/ 187,438.63	S/ 121,244.41	
12	Mar-23	S/ 807,564.13	S/ 12,743.41			S/ 78,255.95	S/ 237,456.92	
13	Abr-23	S/ 511,543.71	S/ 61,438.38		S/ 2,906.21	S/ 33,538.27	S/ 24,893.97	S/ 12,629.09
14	May-23	S/ 3,237,976.01			S/ 48,869.40	S/ 18,632.37	S/ 33,191.97	S/ 350,833.05

PROGRAMADO ACUMULADO ADICIONAL + CONTRACTUAL - DEDUCT.			
MONTO PARCIAL ACUM.	MONTO ACUMULADO.	% PARCIAL	% ACUM.
S/ 306,185.94	S/ 306,185.94	2.26%	2.26%
S/ 815,339.76	S/ 1,121,525.70	6.02%	8.29%
S/ 596,516.04	S/ 1,718,041.74	4.41%	12.69%
S/ 752,545.96	S/ 2,470,587.70	5.56%	18.26%
S/ 971,600.48	S/ 3,442,188.18	7.18%	25.43%
S/ 836,334.14	S/ 4,278,522.32	6.18%	31.61%
S/ 508,328.37	S/ 4,786,850.69	3.76%	35.37%
S/ 530,579.90	S/ 5,317,430.59	3.92%	39.29%
S/ 367,185.08	S/ 5,684,615.67	2.71%	42.00%
S/ 1,240,618.65	S/ 6,925,234.32	9.17%	51.17%
S/ 1,135,871.04	S/ 8,061,105.36	8.39%	59.56%
S/ 1,136,019.41	S/ 9,197,124.77	8.39%	67.96%
S/ 646,949.63	S/ 9,844,074.40	4.78%	72.74%
S/ 3,689,502.80	S/ 13,533,577.20	27.26%	100.00%
S/	S/ 13,533,577.20		

• CRONOGRAMA CONTRACTUAL ACELERADO:



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 023-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J

Cayhuayna, 29 de abril del 2024.

pág. 5

N°	MES	PROGRAMADO			
		MENSUAL	%/MES	ACUMULADO	%ACUMULADO
1	Abr-22	S/ 306,185.94	2.33%	S/ 306,185.94	2.33%
2	May-22	S/ 815,339.76	6.19%	S/ 1,121,525.70	8.52%
3	Jun-22	S/ 596,516.04	4.53%	S/ 1,718,041.74	13.05%
4	Jul-22	S/ 752,545.96	5.72%	S/ 2,470,587.70	18.76%
5	Ago-22	S/ 971,600.48	7.38%	S/ 3,442,188.18	26.14%
6	Sep-22	S/ 836,334.14	6.35%	S/ 4,278,522.32	32.49%
7	Oct-22	S/ 508,328.37	3.86%	S/ 4,786,850.69	36.35%
8	Nov-22	S/ 527,049.94	4.00%	S/ 5,313,900.63	40.36%
9	Dic-22	S/ 367,185.08	2.79%	S/ 5,681,085.71	43.14%
10	Ene-23	S/ 1,164,106.09	8.84%	S/ 6,845,191.80	51.98%
11	Feb-23	S/ 782,320.47	5.94%	S/ 7,627,512.27	57.93%
12	Mar-23	S/ 807,564.13	6.13%	S/ 8,435,076.40	64.06%
13	Abr-23	S/ 511,543.71	3.88%	S/ 8,946,620.11	67.94%
14	May-23	S/ 4,221,125.58	32.06%	S/ 13,167,745.69	100.00%
		S/ 13,167,745.69			

2. La nueva fecha de término de ejecución de obra se tiene para el día 14 de mayo del 2024.

MONTOS MODIFICADOS DE LA OBRA	
Monto Contractual	S/ 13,206,369.77
Reducción del monto contractual	-S/ 38,624.08
Resolución Jefatural N° 074 - 2023 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J	S/ 13,167,745.69
ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01:	S/ 32,968.57
Adicional de Obra N° 01:	S/ 159,140.55
Deductivo de Obra N° 01:	S/ 126,171.98
Resolución Jefatural N° 082 - 2023 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J	S/ 13,200,714.26
ADICIONAL DE OBRA N° 02:	S/ 3,529.96
Resolución Jefatural N° 092 - 2023 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J	S/ 13,204,244.22
ADICIONAL DE OBRA N° 03 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02:	-S/ 145,745.75
Adicional de Obra N° 03:	S/ 88,196.94
Deductivo de Obra N° 02:	S/ 233,942.69
Resolución Jefatural N° 002 - 2024 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J	S/ 13,058,498.47
ADICIONAL DE OBRA N° 04 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03:	S/ 215,113.98
Adicional de Obra N° 04:	S/ 317,865.22
Deductivo de Obra N° 03:	S/ 102,751.25
Resolución Jefatural N° 004 - 2024 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J	S/ 13,273,612.45
ADICIONAL DE OBRA N° 05 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 04:	S/ 60,771.84
Adicional de Obra N° 05:	S/ 416,786.27
Deductivo de Obra N° 04:	S/ 356,014.43
Resolución Jefatural N° 012 - 2024 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J	S/ 13,534,384.29
ADICIONAL DE OBRA N° 06 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 05:	S/ 199,192.91
Adicional de Obra N° 06:	S/ 363,462.14
Deductivo de Obra N° 05:	S/ 164,269.23
Resolución Directoral N° 0842 - 2024 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J	S/ 13,533,577.20
ADICIONAL DE OBRA N° 07 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 06:	S/ 179,410.00
Adicional de Obra N° 07:	S/ 449,983.39
Deductivo de Obra N° 06:	S/ 276,573.39
Resolución Directoral N° 0404 - 2024 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J	S/ 13,706,987.20
NUEVO MONTO CONTRACTUAL MODIFICADO	S/ 13,706,987.20

3. Se indica el nuevo presupuesto de Obra, por el monto de S/13,706,987.20 (Trece Millones Setecientos Seis mil Novecientos Ochenta y Siete con 20/100 Soles), ya que se afectó por la reducción del monto, como también a causa de los Adicionales de Obra N°01, N°02, N°03, N°04, N° 05, N° 06 y N° 07 con sus respectivos Deductivos de Obra N°01, N°02, N°03, N° 04, N° 05 y N° 06

(...)

3. Que, a través del **INFORME N°099-2024-UNHEVAL-UEI/SGAG** con fecha de recepción por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones el día 26 de abril de 2024, en el cual el Ingeniero Civil II de este despacho remite la conformidad del Cronograma Actualizado de Ejecución de Obra por Reinicio de Plazo de Ejecución correspondiente a la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO"** y señala lo siguiente:

(...)

4. **ANÁLISIS**

Mediante el Informe N°042-2024-CSAYA/CEVV-JSO, presentado con Carta N°057-2024-FHES/RC-CSAYA, el Supervisor de Obra presenta la actualización del cronograma de ejecución de obra, cronograma valorizado de ejecución de obra y la Curva S, debido a que con fecha 22 de abril del 2024 se reinició el plazo de ejecución de obra después de 31 días de haber suspendido el mencionado plazo hasta la aprobación de la autorización de la ejecución del Adicional N°07 mediante la Resolución Directoral N°404-2024-DIGA/UNHEVAL.

Luego de haber revisado y evaluado los documentos alcanzados, las mismas que se encuentran de acuerdo al plazo contractual vigente, se señala lo siguiente:

Fecha de inicio de obra : 13 de abril de 2023
Plazo contractual de ejecución : 360 días calendario
Suspensión de Plazo N°01 : 21 al 27 de octubre del 2023 (07 días)
Suspensión de Plazo N°02 : 22 de marzo al 21 de abril del 2024 (31 días)
Fecha de culminación de Obra : 14 de mayo de 2024

Así mismo, se ha podido verificar que el cronograma PERT-CPM, elaborado por la Residencia, y aprobado por la Supervisión, cuenta con las partidas consideradas dentro de la ruta crítica, la misma que servirá para tomar en consideración en cualquier afectación de la ejecución de la obra que sea causal de ampliación de plazo. Además, se verificó que se modificaron solo las partidas relacionadas al Adicional de Obra N°06.
Se presenta, en primer lugar, el cronograma valorizado del Expediente contractual, el cual incluye la Reducción de obra N°01.

...///


N°	MES	AVANCE PROGRAMADO				
		PARCIAL S/	ACUMULADO S/	PARCIAL %	ACUMULADO %	ACUMULADO 80%
1	abr-23	214,726.36	214,726.36	1.63%	1.63%	1.30%
2	may-23	786,300.03	1,001,026.39	5.97%	7.60%	6.08%
3	jun-23	565,552.00	1,566,578.39	4.29%	11.90%	9.52%
4	jul-23	924,159.20	2,490,737.59	7.02%	18.92%	15.13%
5	ago-23	918,704.78	3,409,442.37	6.98%	25.89%	20.71%
6	set-23	701,229.72	4,110,672.09	5.33%	31.22%	24.97%
7	oct-23	644,355.38	4,755,027.47	4.89%	36.11%	28.89%
8	nov-23	1,034,123.03	5,789,150.50	7.85%	43.96%	35.17%
9	dic-23	1,179,716.85	6,968,867.35	8.96%	52.92%	42.34%
10	ene-24	2,320,933.56	9,289,800.91	17.63%	70.55%	56.44%
11	feb-24	1,993,896.35	11,283,697.26	15.14%	85.69%	68.55%
12	mar-24	1,023,893.63	12,307,590.89	7.78%	93.47%	74.77%
13	abr-24	860,154.80	13,167,745.69	6.53%	100.00%	80.00%
		13,167,745.69				

* Los montos expuestos anteriormente son a nivel de costo total sin IGV

Asimismo, se presenta el cronograma valorizado de ejecución de obra y la curva S consolidados (CONTRACTUAL - REDUCCIÓN + ADICIONAL N°01 + ADICIONAL N°02 + ADICIONAL N°03 + ADICIONAL N°04 + ADICIONAL N°05 + ADICIONAL N°06 - DEDUCTIVOS VINCULADOS), los cuales servirán para el control de avance mensual físico y financiero de la obra de referencia (3), así como para la solicitud de ampliaciones de plazo y análisis de afectación de ruta crítica.

N°	MES	AVANCE PROGRAMADO				
		PARCIAL S/	ACUMULADO S/	PARCIAL %	ACUMULADO %	ACUMULADO 80%
1	abr-23	214,726.36	214,726.36	1.59%	1.59%	1.27%
2	may-23	786,300.03	1,001,026.39	5.81%	7.40%	5.92%
3	jun-23	565,552.00	1,566,578.39	4.18%	11.58%	9.26%
4	jul-23	924,159.20	2,490,737.59	6.83%	18.40%	14.72%
5	ago-23	918,704.78	3,409,442.37	6.79%	25.19%	20.15%
6	set-23	702,994.72	4,112,437.09	5.19%	30.39%	24.31%
7	oct-23	505,522.20	4,617,959.29	3.74%	34.12%	27.30%
8	nov-23	1,034,129.76	5,652,089.05	7.64%	41.76%	33.41%
9	dic-23	756,906.91	6,408,995.96	5.59%	47.36%	37.89%
10	ene-24	2,023,673.34	8,432,669.30	14.95%	62.31%	49.85%
11	feb-24	2,240,381.36	10,673,050.66	16.55%	78.86%	63.09%
12	mar-24	1,085,602.19	11,758,652.85	8.02%	86.89%	69.51%
13	abr-24	201,970.97	11,960,623.82	1.49%	88.38%	70.70%
14	may-24	1,572,953.38	13,533,577.20	11.62%	100.00%	80.00%
		13,533,577.20				

* Los montos expuestos anteriormente son a nivel de costo total sin IGV

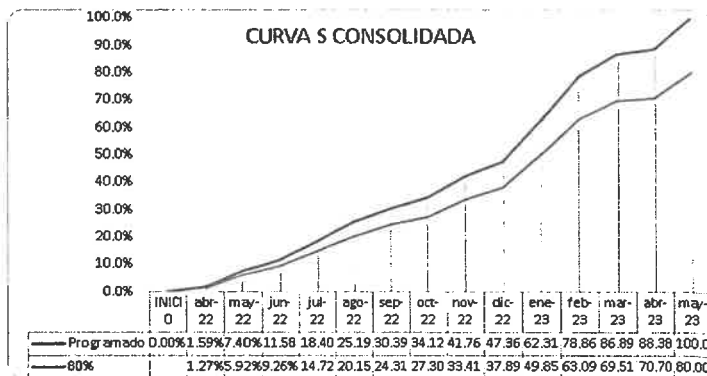

El presente cronograma no cuenta con la incorporación del Adicional de Obra N°07, toda vez que el plazo del mencionado adicional supera la fecha de término vigente, y se encuentra en trámite la ampliación de plazo correspondiente.

Asimismo, debido a que en el mes de febrero el avance fue menor al 80% del avance programado acumulado, se solicitó el cronograma acelerado para el control de obra en cumplimiento al Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Razon por la cual el contratista presentó un cronograma acelerado, sin embargo, al suspender el plazo (Suspensión de Plazo N°02), se modificó el cronograma, por lo que el Supervisor remite también el cronograma acelerado incluyendo la suspensión para fines de control, mas no para la solicitud de ampliaciones de plazo, ni análisis de afectación de ruta crítica.

Se da conformidad al cronograma acelerado para fines de control, y se expone a continuación el mencionado cronograma.

N°	MES	AVANCE PROGRAMADO				
		PARCIAL S/	ACUMULADO S/	PARCIAL %	ACUMULADO %	ACUMULADO 80%
1	abr-23	306,185.94	306,185.94	2.26%	2.26%	1.81%
2	may-23	815,339.76	1,121,525.70	6.02%	8.29%	6.63%
3	jun-23	596,516.04	1,718,041.74	4.41%	12.69%	10.16%
4	jul-23	752,545.96	2,470,587.70	5.56%	18.26%	14.60%
5	ago-23	971,600.48	3,442,188.18	7.18%	25.43%	20.35%
6	set-23	836,334.14	4,278,522.32	6.18%	31.61%	25.29%
7	oct-23	508,328.37	4,786,850.69	3.76%	35.37%	28.30%
8	nov-23	530,579.89	5,317,430.58	3.92%	39.29%	31.43%
9	dic-23	367,185.08	5,684,615.66	2.71%	42.00%	33.60%
10	ene-24	1,240,618.64	6,925,234.30	9.17%	51.17%	40.94%
11	feb-24	1,135,871.04	8,061,105.34	8.39%	59.56%	47.65%
12	mar-24	1,136,019.43	9,197,124.77	8.39%	67.96%	54.37%
13	abr-24	646,949.62	9,844,074.39	4.78%	72.74%	58.19%
14	may-24	3,689,502.81	13,533,577.20	27.26%	100.00%	80.00%
		13,533,577.20				

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

- ✓ Se concluye que el periodo de ejecución de la obra es desde el 13 de abril del 2023 hasta el 14 de mayo del 2024, teniendo un plazo de 360 días calendario y dos suspensiones de plazo: desde el 21 al 27 de octubre del 2023, y desde el 22 de marzo al 21 de abril del 2024.
- ✓ El calendario valorizado CONSOLIDADO de la obra se representa en el siguiente cuadro:

N°	MES	AVANCE PROGRAMADO				
		PARCIAL S/	ACUMULADO S/	PARCIAL %	ACUMULADO %	ACUMULADO 80%
1	abr-23	214,726.36	214,726.36	1.59%	1.59%	1.27%
2	may-23	786,300.03	1,001,026.39	5.81%	7.40%	5.92%

TRANSCRITO
En la fecha se ha expedido
Resolución siguiente



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES


LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 023-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J
Cayhuayna, 29 de abril del 2024.

pág. 7

3	jun-23	565,552.00	1,566,578.39	4.18%	11.58%	9.26%
4	jul-23	924,159.20	2,490,737.59	6.83%	18.40%	14.72%
5	ago-23	918,704.78	3,409,442.37	6.79%	25.19%	20.15%
6	Set-23	702,994.72	4,112,437.09	5.19%	30.39%	24.31%
7	oct-23	505,522.20	4,617,959.29	3.74%	34.12%	27.30%
8	nov-23	1,034,129.76	5,652,089.05	7.64%	41.76%	33.41%
9	dic-23	756,906.91	6,408,995.96	5.59%	47.36%	37.89%
10	ene-24	2,023,673.34	8,432,669.30	14.95%	62.31%	49.85%
11	feb-24	2,240,381.36	10,673,050.66	16.55%	78.86%	63.09%
12	mar-24	1,085,602.19	11,758,652.85	8.02%	86.89%	69.51%
13	abr-24	201,970.97	11,960,623.82	1.49%	88.38%	70.70%
14	may-24	1,572,953.38	13,533,577.20	11.62%	100.00%	80.00%
		13,533,577.20				

*Los montos expuestos anteriormente son a nivel de costo total sin IGV

✓ La Curva S correspondiente es la siguiente:

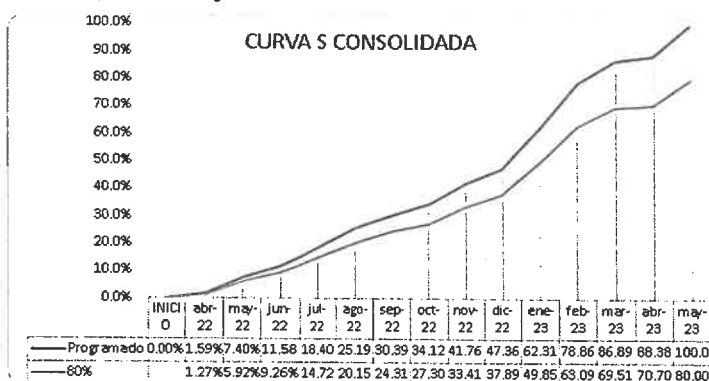

- ✓ Se da CONFORMIDAD a la actualización del cronograma de ejecución de obra, cronograma valorizado de ejecución de obra y Curva S presentados por el contratista CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN y aprobados por la Supervisión de Obra.
- ✓ El cronograma actualizado aprobado en el presente informe es el único documento que puede ser utilizado como sustento para la solicitud de ampliaciones de plazo, así como para el análisis de afectación de ruta crítica.

5.2. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda aprobar el Calendario de Avance Programado Actualizado, el Cronograma Valorizado de Ejecución de obra y la Curva S mediante acto resolutorio.

(...)

Que, estando a las facultades y atribuciones resolutorias conferidas al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, mediante la **Resolución Rectoral N° 586-2020-UNHEVAL** de fecha 16 de julio de 2020, en concordancia con la **Resolución Rectoral N° 0145-2022-UNHEVAL**, de fecha 17 de febrero del 2021 y en concordancia con la Ley N° 30220 - Ley Universitaria y su reglamento.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y ACTUALIZADO, concerniente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO", siendo la fecha de inicio de obra el 13 de abril de 2023 y su fecha de fin de plazo el 14 de mayo de 2024, en virtud a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	MES	AVANCE PROGRAMADO				
		PARCIAL S/	ACUMULADO S/	PARCIAL %	ACUMULADO %	ACUMULADO 80%
1	abr-23	214,726.36	214,726.36	1.59%	1.59%	1.27%
2	may-23	786,300.03	1,001,026.39	5.81%	7.40%	5.92%
3	jun-23	565,552.00	1,566,578.39	4.18%	11.58%	9.26%
4	jul-23	924,159.20	2,490,737.59	6.83%	18.40%	14.72%
5	ago-23	918,704.78	3,409,442.37	6.79%	25.19%	20.15%
6	Set-23	702,994.72	4,112,437.09	5.19%	30.39%	24.31%
7	oct-23	505,522.20	4,617,959.29	3.74%	34.12%	27.30%
8	nov-23	1,034,129.76	5,652,089.05	7.64%	41.76%	33.41%
9	dic-23	756,906.91	6,408,995.96	5.59%	47.36%	37.89%
10	ene-24	2,023,673.34	8,432,669.30	14.95%	62.31%	49.85%



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 023-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J
Cayhuayna, 29 de abril del 2024.

pág. 8

11	feb-24	2,240,381.36	10,673,050.66	16.55%	78.86%	63.09%
12	mar-24	1,085,602.19	11,758,652.85	8.02%	86.89%	69.51%
13	abr-24	201,970.97	11,960,623.82	1.49%	88.38%	70.70%
14	may-24	1,572,953.38	13,533,577.20	11.62%	100.00%	80.00%
		13,533,577.20				

ARTÍCULO SEGUNDO. – PRECISAR, que de conformidad con los alcances de **CONTRATO N° 045-2023-UNHEVAL**, corresponde al **CONSORCIO SUPERVISOR ALMACEN Y ARCHIVO** exigir el control y cumplimiento de la programación de calendarios de obra vigentes, por consiguiente, el supervisor deberá cumplir sus obligaciones.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la empresa Contratista **CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN- UNHEVAL** y a la Supervisión **CONSORCIO SUPERVISOR ALMACEN Y ARCHIVO**, con las formalidades de Ley.

ARTÍCULO CUARTO. - DAR A CONOCER, la presente Resolución a los Órganos Competentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE



UNIVERSIDAD NACIONAL
"HERMILIO VALDIZAN"

ING. GUILLERMO J. ALBORNOZ RAMOS
DIRECTOR EJECUTIVO DE INVERSIONES

TRANSCRIPCIÓN
En la fecha se expedido
Resolución siguiente

Distribución:
RECTOR
TRANSPARENCIA
OAU
OCI
DIGA
ARCHIVO
