



### Ficha Técnica del Proyecto de Inversión Pública:

"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES"

Informado al: 28 de febrero del 2024

COORDINADOR GENERAL (e) Arq. Oscar Antonio Moreano Valencia

A.1 RESIDENTE DE OBRA : Ing. Quiroz Cisneros Carlos Enrique  
Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro. 2498

A.2 SUPERVISOR (E) : Ing. Torres Rosas Manuel Oswaldo Guillermo  
Total de asientos (a la fecha informada): Nro. 48

A.3 DATOS DEL PROYECTO :  
Codigo de inversión : 2192979  
Unidad Ejecutora : Proyecto Especial Regional Plan COPESCO  
Ejecucion de trabajos de movimiento de tierras, pavimentos, obras de arte y drenaje, obras complementarias, plan de manejo socio ambiental, construccion de puentes, interferencias electricas sanitarias

Meta del año en curso

Meta Física (resumen) :

Mejoramiento integral de la Vía Expresa, en el tramo Ovalo Los Libertadores, Nodo Versalles, con 6,8 Km. de longitud y 04 vías de 02 carriles cada uno comprende 02 puentes 01 paso a nivel deprimido y 01 viaducto; 06 puentes peatonales, calzadas de asfalto, veredas de concreto.

Fuente de Financiamiento : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO  
Modalidad de Ejecución :

Estado Actual del Proyecto:

En Ejecución

Ejecución Por Contrata

Ubicación exacta:

(\*) Compatibilidad, En Ejecución, Paralizado, Concluido, Pre-Liquidación, Liquidación

Localidades : Av. Vía Expresa

Distrito : Wanchaq, San Sebastian, Cusco

Provincia : Cusco

Presupuesto :

Ppto. Aprobado del Proyecto : S/.	347,244,873.00	Ppto. asignado años anteriores : S/.	220,354,187.11
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : S/.	342,349,892.80	Presupuesto Asignado año 2023 : S/.	107,624,132.00
Ppto. Aprobado modificación N° 1400-166-2020-DE-COPESCO/PRODER/GRC	324,011,616.12	Presupuesto Costo Directo Contrato : S/.	289,218,000.00
Ppto. Aprobado modificación N° 1400-485-2021-DE-COPESCO/GRC : S/.	326,671,633.25	Presupuesto Costo Directo Contrato actualizado : S/.	290,741,331.68
Ppto. Aprobado modificación R.E.R. N° 682-2022-GR CUSCO/ : S/.	329,948,109.57		
Ppto. Aprobado modificación R.D. N° 141-2023-GR/PLAN COPESCO/ : S/.	365,586,337.48		

Necesita Verificación de Viabilidad ? NO

#### A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

DESCRIPCION	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA
Aprobación Expediente	RD	R.D.143-2019-DE-COPESCO/GRC	13/06/2019
Contrato Empresa Contratista	CONTRATO	CONTRATO N° 1400-164-2020-DE-COPESCO/PRODER/GRC	29/12/2020
Contrato Supervision	CONTRATO	CONTRATO N° 1400-166-2020-DE-COPESCO/PRODER/GRC	28/12/2020

#### A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO ANUAL: (Actual).

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	EJEC.ACUM. 2022	145,430,291.98	50.02%	210,923,805.41	57.69%	154,662,532.07
2	01-Ene a 31-Ene de 2023	7,956,786.29	2.74%	9,384,850.33	2.57%	145,277,681.74
3	01-Feb a 28-Feb de 2023	2,101,477.08	0.72%	9,139,159.86	2.50%	136,138,521.88
4	01-Mar a 31-Mar de 2023	5,633,095.81	1.94%	9,396,964.61	2.57%	126,741,557.27
5	01-Abr a 30-Abr de 2023	1,976,770.23	0.68%	783,756.41	0.21%	125,957,800.86
6	01-May a 31-May de 2023	5,786,279.44	1.99%	9,888,752.67	2.70%	116,069,048.19
7	01-Jun a 30-Jun de 2023	2,762,857.09	0.95%	0.00	0.00%	116,069,048.19
8	01-Jul a 31-Jul de 2023	5,203,670.48	1.79%	731,739.65	0.20%	115,337,308.54
9	01-Ago a 31-Ago de 2023	7,802,817.43	2.68%	9,178,190.00	2.51%	106,159,118.54
10	01-Sep a 30-Sep de 2023	4,231,006.05	1.46%	9,205,390.00	2.79%	96,953,728.54
11	01-Oct a 31-Oct de 2023	3,562,148.64	1.23%	10,155,316.38	3.08%	86,798,412.16
12	01-Nov a 30-Nov de 2023	5,277,588.31	1.82%	0.00	0.00%	86,798,412.16
13	01-Dic a 31-Dic de 2023	2,730,500.29	0.94%	10,013,781.92	3.03%	76,784,630.24
14	01-Ene a 31- Ene de 2024	12,543,001.43	4.31%	9,545,642.00	2.89%	67,238,988.24
15	01-Feb a 28-Feb de 2023			14,963,800.71	4.54%	52,275,187.53
TOTAL		212,998,290.56	73.26%	313,311,149.95	87.29%	52,275,187.53
Porcentaje de Avance Acumulado c/r al monto del contrato			73.26%	% Av. Financiero con relacion al expediente tecnico aprobado	87.29%	

Ing. Jorge Lenin Gamba Romero  
OFICIAL DE MONITOREO Y SUPERVISION  
PLAN COPESCO

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO:** (Aprobado(s) mediante Resolución(es)).

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Deductivos	TOTAL MODIF.

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Reinicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO FEBRERO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
720		09/12/2023	985	0	277	997
			136.81%	0.00%	38.47%	138.47%

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

**Limitaciones**


'La temporada de lluvias viene ocasionando retrasos en la ejecución de la obra, se tienen frentes de trabajo los cuales no son intervenidos por el contratista

**Recomendaciones:**

Continuar con las reuniones y mesas de trabajo con la Empresa Contratista y el Consorcio Supervisor a fin de que se aperturen frentes de trabajo y ya se pavimente la obra



Construccion de sardineles:

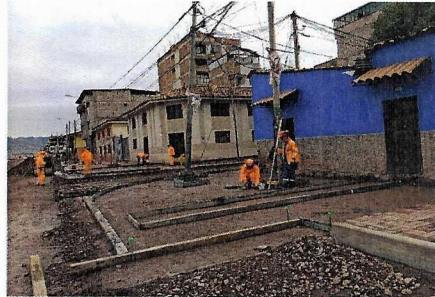

Construccion de veredas



Colocacion de asfalto



Colocacion de asfalto

