

**Ficha Técnica del Proyecto de Inversión Pública:****"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES"****Informado al: 31 de marzo del 2024**

COORDINADOR GENERAL (e) Ing.

A.1 RESIDENTE DE OBRA : Ing. Quiroz Cisneros Carlos Enrique

A.2 SUPERVISOR (E) : Ing. Torres Rosas Manuel Oswaldo Guillermo

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Codigo de inversión : 2192979

Unidad Ejecutora Proyecto Especial Regional Plan COPESCO

Meta del año en curso Ejecución de trabajos de movimiento de tierras, pavimentos, obras de arte y drenaje, obras complementarias, plan de manejo socio ambiental, construcción de puentes, interferencias eléctricas sanitarias.

Meta Física (resumen) :

Mejoramiento integral de la Vía Expresa, en el tramo Óvalo Los Libertadores, Nodo Versalles, con 6,8 Km. de longitud y 04 vías de 02 carriles cada uno comprende 02 puentes 01 paso a nivel deprimido y 01 viaducto; 06 puentes peatonales, calzadas de asfalto, veredas de concreto.

Fuente de Financiamiento : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

Estado Actual del Proyecto:

Modalidad de Ejecución :

En Ejecución

Ejecución Por Contrata

Ubicación exacta:

(*) Compatibilidad, En Ejecución, Paralizado, Concluido, Pre-Liquidación, Liquidación

Localidades : Av. Via Expresa

Distrito: Wanchaq, San Sebastián, Cusco

Provincia: Cusco

Presupuesto :

Ppto. Aprobado del Proyecto :

S/ 347,244,873.00

Ppto. asignado años anteriores:

S/ 299,221,936.26

Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :

S/ 342,349,892.80

Presupuesto Asignado año 2024:

S/ 69,530,081.00

Ppto. Aprobado Modificado N° 1400-166-2020-DE-COPESCO/PRODER/GRC:

S/ 324,011,616.12

Presupuesto Costo Directo Contrato:

S/ 289,218,000.00

Ppto. Aprobado Modificado N° 1400-485-2021-DE-COPESCO/GRC:

S/ 326,671,633.25

Presupuesto Costo Directo Contrato actual:

S/ 290,741,331.68

Ppto. Aprobado Modificado R.D. N° 030-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO:

S/ 370,768,082.47

Necesita Verificación de Viabilidad ? NO**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA
Aprobación Expediente	RD	R.D.143-2019-DE-COPESCO/GRC	13/06/2019
Contrato Empresa Contratista	CONTRATO	CONTRATO N° 1400-164-2020-DE-COPESCO/PRODER/GRC	29/12/2020
Contrato Supervisión	CONTRATO	CONTRATO N° 1400-166-2020-DE-COPESCO/PRODER/GRC	28/12/2020

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO ANUAL: (Actual).

Nro.	Meses	AVANCE FÍSICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D	Presupuesto	Porcentaje	
1	EJEC.ACUM. 2021	S/ 57,487,703.73	19.77%	S/ 109,224,405.46	31.90%	S/ 233,125,487.34
2	01 Ene a 31 Ene de 2022	S/ 7,688,098.52	2.64%	S/ 11,854,699.96	3.46%	S/ 221,270,787.38
3	01-Feb a 28 Feb de 2022	S/ 3,720,209.54	1.28%	S/ -	0.00%	S/ 221,270,787.38
4	01-Mar a 31 Mar de 2022	S/ 4,282,520.66	1.47%	S/ 13,518,188.94	3.95%	S/ 207,752,598.44
5	01-Abr a 30 Abr de 2022	S/ 6,233,336.37	2.14%	S/ -	0.00%	S/ 207,752,598.44
6	01-May a 31 May de 2022	S/ 10,232,336.77	3.52%	S/ -	0.00%	S/ 207,752,598.44
7	01-Jun a 30 Jun de 2022	S/ 10,583,233.56	3.64%	S/ 25,966,581.71	7.58%	S/ 181,786,016.73
8	01-Jul a 31 Jul de 2022	S/ 9,113,960.04	3.13%	S/ -	0.00%	S/ 181,786,016.73
9	01-Ago a 31 Ago de 2022	S/ 8,187,605.42	2.82%	S/ 24,595,255.35	7.18%	S/ 157,190,761.38
10	01-Set a 30 Set de 2022	S/ 6,370,277.44	2.19%	S/ -	0.00%	S/ 157,190,761.38
11	01-Oct a 31 Oct de 2022	S/ 7,794,473.89	2.68%	S/ 10,284,484.18	3.00%	S/ 146,906,277.20
12	01-Nov a 30 Nov de 2022	S/ 6,011,485.29	2.07%	S/ 9,430,382.10	2.75%	S/ 137,475,895.10
13	01-Dic a 31 Dic de 2022	S/ 7,745,050.73	2.66%	S/ 15,470,036.83	4.52%	S/ 122,005,858.27
14	01 Ene a 31 Ene de 2023	S/ 7,956,786.29	2.74%	S/ 9,384,850.33	2.74%	S/ 112,621,007.94
15	01-Feb a 28 Feb de 2023	S/ 2,101,477.08	0.72%	S/ 9,139,159.86	2.67%	S/ 103,481,848.08
16	01-Mar a 31 Mar de 2023	S/ 5,633,095.81	1.94%	S/ 9,396,964.61	2.74%	S/ 94,084,883.47
17	01-Abr a 30 Abr de 2023	S/ 1,976,770.23	0.68%	S/ 783,756.41	0.23%	S/ 93,301,127.06
18	01-May a 31 May de 2023	S/ 5,786,279.44	1.99%	S/ 9,888,752.67	2.89%	S/ 83,412,374.39
19	01-Jun a 30 Jun de 2023	S/ 2,762,857.09	0.95%	S/ -	0.00%	S/ 83,412,374.39
20	01-Jul a 31 Jul de 2023	S/ 5,203,670.48	1.79%	S/ 731,739.65	0.21%	S/ 82,680,634.74
21	01-Ago a 31 Ago de 2023	S/ 7,802,817.43	2.68%	S/ 9,178,189.53	2.68%	S/ 73,502,445.21
22	01-Set a 30 Set de 2023	S/ 4,231,006.05	1.46%	S/ 9,205,390.37	2.69%	S/ 64,297,054.84
23	01-Oct a 31 Oct de 2023	S/ 3,562,148.64	1.23%	S/ 11,155,316.38	3.26%	S/ 53,141,738.46
24	01-Nov a 30 Nov de 2023	S/ 5,277,588.31	1.82%	S/ -	0.00%	S/ 53,141,738.46
25	01-Dic a 31 Dic de 2023	S/ 2,730,500.29	0.94%	S/ 10,013,781.92	2.93%	S/ 43,127,956.54
14	01 Ene a 31 Ene de 2024	S/ 12,543,001.43	4.31%	S/ 9,545,641.61	2.79%	S/ 33,582,314.93
15	01-Feb a 29 Feb de 2024	S/ 7,521,110.15	2.59%	S/ 14,963,800.71	4.37%	S/ 18,618,514.22
16	01-Mar a 31 Mar de 2024	S/ -	0.00%	S/ 1,837,507.29	0.54%	S/ 16,781,006.93
17	01-Abr a 30 Abr de 2024	S/ -	-	S/ -	-	-
18	01-May a 25 May de 2024	S/ -	-	S/ -	-	-
TOTAL		S/ 220,519,400.69	75.85%	S/ 325,568,885.87	95.10%	S/ 16,781,006.93
		% de Avance Físico Acum. c/r al Monto del Contrato	75.85%	% Avance Financiero Acum. c/r al Exp. Téc. Aprob.	95.10%	



A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO: (Aprobado(s) mediante Resolución(es)).

Variación	Resolución	Fecha de Aprob.		Monto
Variación N° 01	Resolución N° 485-2021-D-COPESCO/GRC	21 de Diciembre de 2021	S/	83,769.51
Variación N° 02	Resolución N° 064-2022-D-COPESCO/GRC	2 de Marzo de 2022	S/	717,246.90
Variación N° 03	Resolución N° 181-2022-GR CUSCO/PLAN COPESCO	12 de Mayo de 2022	S/	50,934.28
Variación N° 05	Resolución N° 045-2023-GR CUSCO/PLAN COPESCO	13 de Abril de 2023	S/	495,297.72
Variación N° 08	Resolución N° 049-2023-GR CUSCO/PLAN COPESCO	13 de Abril de 2023	S/	62,777.64
Variación N° 04	Resolución N° 231-2023-GR CUSCO/PLAN COPESCO	14 de Setiembre de 2023	S/	113,305.63

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:

	Días	Fecha Conclusión	Ejecut. Febrero	Paralizado	Ampliación	Total Modific.
Programado	720	18 de Marzo de 2021	720 100.00%	-	-	720
Ampl. N° 01	172	26 de Agosto de 2023	891 100.00%	-	172	891
Ampl. N° 03	105	9 de Diciembre de 2023	996 100.00%	-	105	996
Ampl. N° 04	168	25 de Mayo de 2024	1110 95.36%	-	168	1,164

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

Limitaciones:


Se tienen dificultades por poco personal en la obra, cabe señalar que se tiene frentes de trabajo.

Se tienen retrasos por la presencia de las interferencias eléctricas, sanitarias y de telecomunicaciones, que a la fecha no han sido resueltas en su totalidad.


Recomendaciones:

Se debe de continuar con las gestiones con las empresas prestadoras de servicios, para ello es necesario la iniciativa de la Empresa Contratista y de Supervisión del Proyecto.

A.9 PANEL FOTOGRÁFICO:

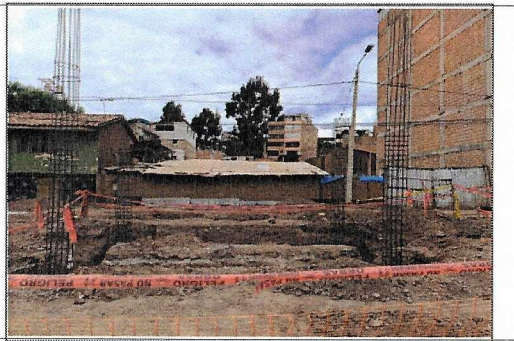

Colocado de acero para columnas en caseta de Sub estación N° 02.

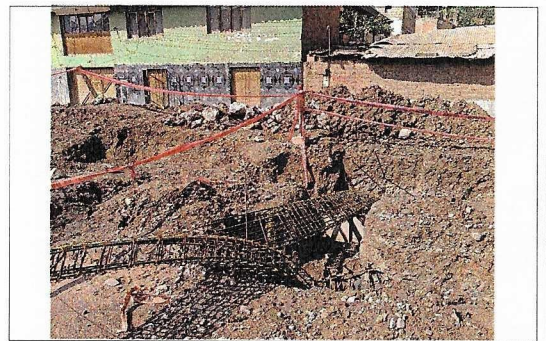

Armado de acero en el suelo, al parecer realizado por los vecinos en caseta de Sub estación N° 02.




Reunión con los propietarios que se oponen a la construcción de la Sub estación N° 02.



Presencia de efectivo policial para solucionar los conflictos con los beneficiarios.




Vaciado de veredas en el Sector Túpac Amaru, margen derecha.

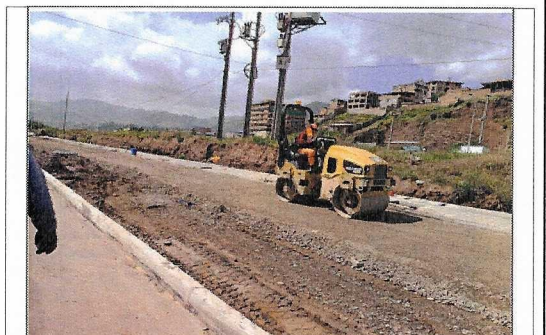

Mejoramiento de base para ciclovía en el Sector Versalles.

CONSULTOR PRODER CUSCO
 Ing. Jorge Lenin
 Gamboa Romero
 OFICINA DE MONITOREO
 Y SUPERVISIÓN
 -PER PLAN COPESCO

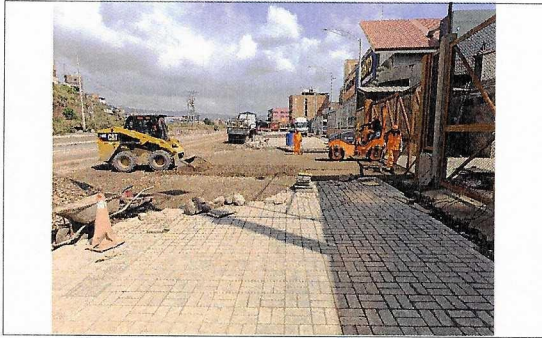


Mejoramiento de base para veredas en la progresiva 6+600.




Colocado de acero y encofrado de sumidero en bocacalles.



Planta de asfalto. Produccion para la 2da capa con el MAC 2 a partir del km. 1+550 carril izquierdo.

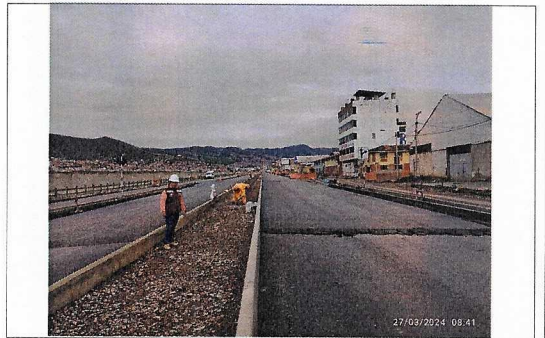

Asfaltado de capa MAC 1 y 2 en la progresiva 1+800.

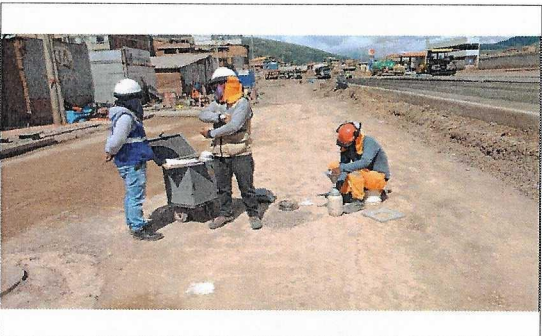

Pruebas de Densidad de campo en base granular en el Km. 4+100 carril auxiliar izquierda.



Trabajos para colocación de hidrante áreas verdes, progresiva 2+000.

