




ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, SANITARIAS,
ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN
GENERAL. SERVICIOS GENERALES



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

000072

CARTA N° 165-2022-WABA-ING. CONSULTOR/GO-PRODESA

Baños del Inca, 02 de mayo del 2022

Señor:

Lic. Jorge Manrique Linares

Jefe de Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – PRODESA

Atención:

Ing. Ever Becerra Coronado

Representante de PRODESA

Presente. -

Asunto : CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N°02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (01/04/2022 al 29/04/2022) DEL CONTRATISTA CONSORCIO EL SAUCE.

Referencia: ADENDA N°04 AL CONTRATO DE OBRAS N°038-2021-SENASA-PRODESA FASE II
Contrato de Consultor Individual N° 027-2021

Ejecución de Obra: "Construcción del Centro de Operaciones Baños del Inca – Cajamarca"

Mediante el presente WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA, identificado con DNI N° 32961822 me dirijo a usted como Gerente de Obra en la Consultoría para la Supervisión de la obra: "Construcción del Centro de Operaciones Baños del Inca – Cajamarca", para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzarle el presente informe correspondiente a la conformidad de la Valorización N° 02 del Adicional de Obra N°02, correspondiente al mes de abril del 2022, del Contratista Consorcio El Sauce, para lo cual informo lo siguiente:

El monto del adicional de obra N°02, según ADENDA N°04 AL CONTRATO DE OBRAS N°038-2021-SENASA-PRODESA FASE II, se describe a continuación:

DESCRIPCION	MONTO (S/.)	INCIDENCIA %
ADICIONAL DE OBRA N°02	158,514.45	3.83 %

Por lo tanto, el monto valorizado corresponde a S/ 47,253.28 soles por concepto de ejecución del adicional de obra N°02, durante el periodo del 01/04/2022 al 29/04/2022.

El porcentaje de avance de la Valorización N°02 del Adicional de obra (del 01/4/2022 al 29/04/2022) es de 29.81% correspondiente a un monto valorizado por la contratista Consorcio el Sauce de S/ 47,253.28 soles, culminando los trabajos al 100% del adicional n°02.

Por consiguiente, el monto a facturar por la contratista Consorcio El Sauce, que viene a ser S/ 47,253.28 soles, tal como lo detalla el siguiente cuadro:



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, SANITARIAS,
ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN
GENERAL. SERVICIOS GENERALES



Item	Descripción	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL	
		COSTO TOTAL	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
1.00	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	1,505.38	604.00	0.75	580.00	0.46	1,505.38	1.21	0.00	0.00
2.00	SEGURIDAD Y SALUD	6,219.84	2,842.10	2.40	2,074.04	2.05	6,219.84	5.25	0.00	2.40
3.00	DEMOLICIONES	93,277.56	18,371.56	0.69	8.00	0.00	10,277.56	8.88	8.00	0.00
4.00	MOVIMIENTO DE TIERRA	6,989.58	9,289.98	5.14	8.00	0.00	9,989.98	5.14	8.00	5.14
5.00	CONCRETO SIMPLE	23,398.92	33,308.98	19.67	3.00	1.00	23,308.98	19.67	8.00	19.67
6.00	CONCRETO ARMADO	71,086.13	38,718.91	33.53	38,361.98	28.47	71,086.13	48.00	0.01	33.53
	COSTO DIRECTO	118,471.61	92,594.76	8.08	38,361.98	28.47	118,471.61	100.00	-	8.08
	GASTOS GENERALES	8,758.81			2,698.87		8,758.81		-	
	UTILIDAD	7,908.28			2,118.16		7,908.28		-	
	SUB TOTAL	135,138.70			41,178.81		135,138.70		-	
	I.G.V. (18%)	24,325.17			7,412.18		24,325.17		-	
	VALOR REFERENCIAL	S/ 159,514.48			S/ 47,253.28		S/ 159,514.48		S/ -	

RESUMEN DE PAGO -VALORIZACION 01

COSTO DIRECTO	S/ 92,594.76
GASTOS GENERALES	S/ 2,698.87
UTILIDAD	S/ 2,118.18
SUB TOTAL VALORIZADO	S/ 41,178.81
I.G.V. 18%	S/ 7,412.18
TOTAL	S/ 47,253.28

SOL: MONTO CINCO MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO SOLES

Es todo cuanto informo para su revisión y trámite correspondiente a la presente.

Atentamente

WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114868 RUC N° 10829818221 REG. CONSULTOR C15326

ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC.
VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN
GENERAL. SERVICIOS GENERALES



000070

INFORME DE VALORIZACION

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 11-48



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS GENERALES



000009

INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION
DE OBRA N° 02 DEL ADICIONAL N°02

**OBRA: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA"**



CONTRATISTA

Ejecuta

: Consorcio El Sauce

Residente de Obra

: Ing. Cesar Augusto Chávez Sarmiento – CIP N°32383

GERENTE DE OBRA

Gerente de Obra

: Ing. Walter Alfredo Botello Alva – CIP N°114668

Plazo de la Consultoría

: 45 días calendarios.

ABRIL DEL 2022


Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114 668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVÁ

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS GENERALES



FICHA TÉCNICA

000083

DE LA OBRA

Obra	: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA"
Ubicación Geográfica	: El proyecto se ubica en: Localidad : Baños del Inca Distrito : Baños del Inca Provincia : Cajamarca Región : Cajamarca
Financiamiento	: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Entidad Ejecutora	: Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria y la Inocuidad Agroalimentaria

EJECUTOR DE OBRA

Ejecuta	: CONSORCIO EL SAUCE
Contrato de ejecución de obra	: N° 038-2021 SENASA - PRODESA FASE II
Plazo de Ejecución de Obra	: 240 días calendarios
Modalidad de Ejecución	: Contrata
Fecha de entrega de Terreno	: 19 de Julio del 2021
Inicio del plazo de ejecución	: 12 de agosto del 2021
Fecha de término de Obra	: 08 de abril del 2022
Presupuesto Referencial C/IGV	: S/ 4'143,521.37
Presupuesto Contratado C/IGV	: S/ 4'143,521.37
Representante Legal	: Ing. Gladis Emperatriz Campos Saldaña.
Residente de Obra	: Ing. Cesar Augusto Chávez Sarmiento CIP N°32363

ADENDA N°4 CONTRATO N° 038 - 2021 SENASA - PRODESA FASE II (ADICIONAL DE OBRA 2)

FECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION	: 04/03/2022
FECHA DE TERMINO	: 17/04/2022
TIEMPO DE EJECUCION	: 45 DIAS CALENDARIOS
PRESUPUESTO DE ADENDA	: S/ 158,514.45 SOLES

GERENTE DE OBRA

Gerente de Obra	: Ing. Walter Alfredo Botello Alva CIP N° 114668
Presupuesto contratado	: S/ 165,805.40
Plazo de la Consultoría	: 240 días calendarios.
Modalidad	: Tarifario

DE LA VALORIZACION N° 02 - ADICIONAL 2

➤ Avance Mensual Programado	: 35.61%
➤ Avance Mensual Ejecutado	: 29.81%
➤ Avance Programado Acumulado	: 100%
➤ Avance Ejecutado Acumulado	: 100%
➤ Estado situacional de la Obra	: SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100%

COLONIA DE AGROPECUARIOS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS GENERALES



360067

1. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA".

1.2. OBJETIVO

1.2.1. OBJETIVOS GENERALES

El presente proyecto tiene como objetivo principal la remodelación y Ampliación "Centro de Operaciones Baños del Inca – Cajamarca".

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

El objetivo del proyecto es el de mejorar las condiciones de trabajo de los personales de SENASA así mismo Garantizar la integridad física de los personales que laboran en SENASA

1.3. CARACTERISTICAS GENERALES

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El predio donde se ubicará el proyecto, se encuentra en el distrito de Baños del Inca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, exactamente entre la intersección de la Avenida Manco Cápac y jirón Cahulide. El terreno destinado al proyecto tiene un área de 4,907.82m² aprox.

Departamento	:	Cajamarca
Provincia	:	Cajamarca
Distrito	:	Baños del Inca
Altitud	:	2,750 m.s.n.m

El área en estudio se encuentra al costado de la Institución Educativa SENATI, frente al óvalo ubicado en la Av. Manco Cápac de la carretera pavimentada del Distrito de Cajamarca al Distrito de Baños del Inca, en la intersección con el Jr. Cahulide.

INGENIERO DE INGENIERIA DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668




ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS GENERALES



LOCALIZACIÓN

000000

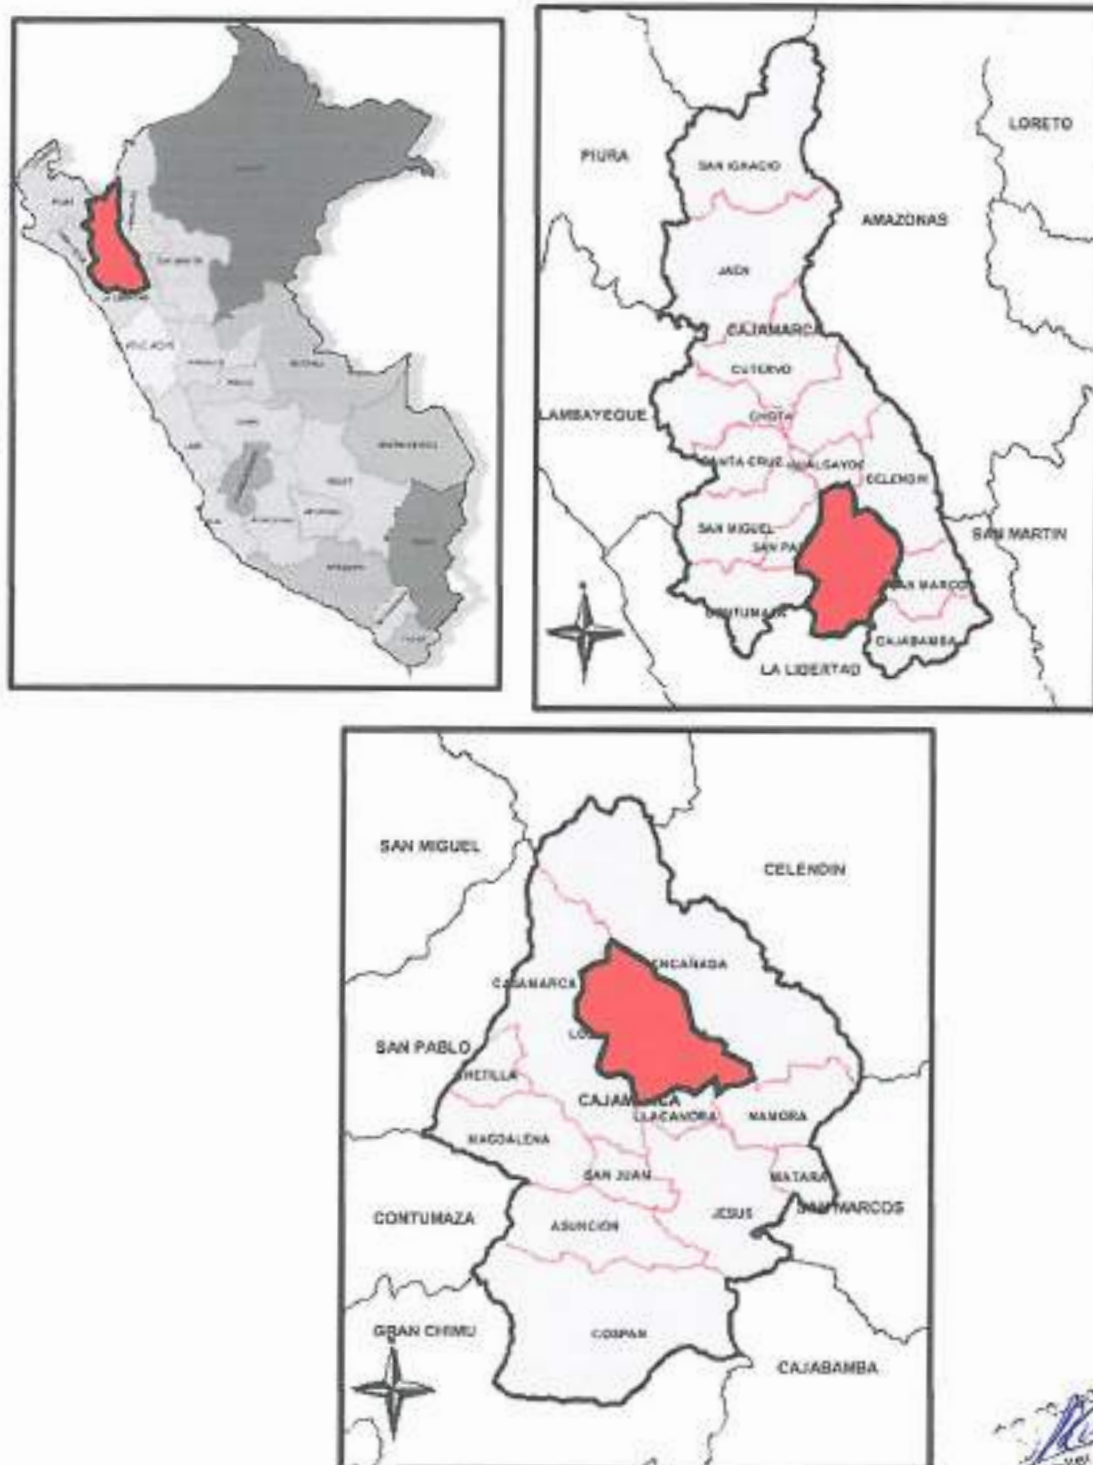

Ubicación Geográfica del Distrito Baños del Inca

Ubicación del proyecto entre la intersección de la Avenida Manco Cápac y jirón Cahuiide.

Walter Alfredo Botello Alva
Ingeniero Civil
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVÁ

REG. CIP N° 114666 RUC N° 10329616221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS GENERALES



060065



El área en estudio se encuentra al costado de la Institución Educativa SENATI, frente al óvalo ubicado en la Av. Manco Cápac de la carretera pavimentada del Distrito de Cajamarca al Distrito de Baños del Inca, en la intersección con el Jr. Cahuide.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto "Adicional N° 02" comprende la construcción de un muro perimetral posterior y los trabajos de acabados en uno existente que colinda con la propiedad de SENATI.

2.1 Planteamiento Arquitectónico

El proyecto responde a la necesidad de contar con un cerco perimetral seguro para el futuro Centro de Operaciones de SENASA en la Ciudad de Cajamarca, por ello se plantea la construcción de un muro de albañilería de una altura considerable y adecuada, tal como se observa en el detalle adjunto.

CONSEJO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114666



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326


ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS,

SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE

CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS GENERALES



000064

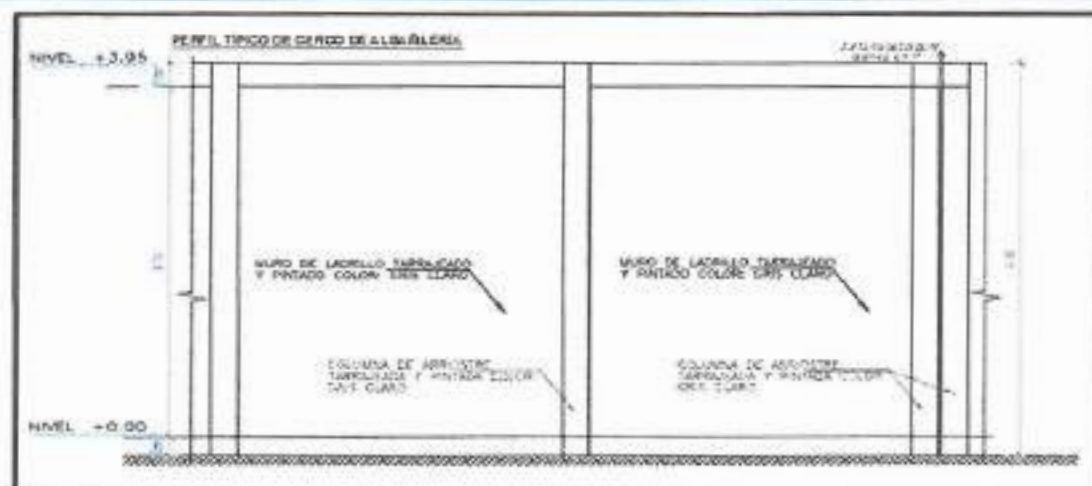

2.2 Planteamiento Estructural

La edificación consiste en un muro de albañilería, con una altura de 3.95 m. con paños uniformes de 3.00 m. de largo. Las columnas en su totalidad tienen una resistencia $F'c=210 \text{ kg/cm}^2$, y vigas de amarre que tienen una resistencia $F'c=175 \text{ kg/cm}^2$.

3. COSTO DEL PROYECTO

3.1 Generalidades

Para realizar el presupuesto del proyecto "ADICIONAL DE OBRA N° 02" se ha considerado lo siguiente:

- Los precios de mano de obra se han tomado como referencia de los planteados en el proyecto "CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA".
- El costo de los materiales de construcción se ha tomado como referencia de los planteados en el proyecto "CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA".
- El costo del alquiler de maquinaria y equipos se ha tomado como referencia de los planteados en el proyecto "CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA".

3.2 Descripción

El costo de ejecución del proyecto "CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA", es el que se detalla a continuación:

Detalle de Financiamiento	
Descripción	total
Costo Directo	118,471.01
Gastos Generales	8,755.01
Utilidades	7,108.26
Subtotal	134,334.28
Impuesto (IGV 18%)	24,180.17
Total, de Presupuesto	158,514.45

Son: Ciento cincuenta y ocho mil quinientos catorce con 45/100 soles.

Walter Alfredo Botello Alva
Ingeniero Civil
CIP N° 114668



000063

4. MODALIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO

La modalidad de ejecución del proyecto será por **CONTRATA**.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del proyecto es de doscientos cuarenta **(45)** días calendarios.

6. ANTECEDENTES:

- Con fecha 01 de julio del 2021 se firma el Contrato de Consultor Individual N° 027-2021 para la contratación de la consultoría de la Supervisión de la Obra indicada en la referencia, entre el Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria y el Consultor de Obra Ing. Walter Alfredo Botello Alva.
- Con fecha 09 de agosto del 2021 se realiza el acto protocolar de entrega de terreno con la presencia de las autoridades de PRODESA, empresa contratista Consorcio El Sauce y el Gerente de Obra encargada de la supervisión del proyecto.
- Con fecha 11 de agosto del 2021 se cumple con las condiciones estipuladas en el Contrato indicado en la referencia (Contrato de Obras N° 038-2021- SENASA-PRODESA FASE II) en su Clausula Quinta – Plazo del Contrato.
- Con fecha 12 de agosto del 2021 se inicia la ejecución de la obra con la firma del Acta de inicio de obra entre la empresa contratista Consorcio El Sauce y el Gerente de Obra en representación de PRODESA.
- Con fecha 02 de marzo del 2022, se aprueba la ADENDA N°04 AL CONTRATO DE OBRAS N°038 – 2021 SENASA – PRODESA FASE II, del adicional n°02. (cerco perimetrico).

7. SITUACIÓN DE LA OBRA

El adicional n°01 se inició el 03 de marzo del 2022 y la segunda valorización del 01 de abril al 29 de abril del 2022, durante los 29 días calendarios de ejecución en el presente mes, se tuvo un avance físico mensual de 29.81% con un monto valorizado de S/. 47,253.28 soles y un avance ejecutado acumulado de 100% lo que representa un monto acumulado de S/. 158,514.45 soles.

MES: 01 AL 29 DE ABRIL DEL 2022			
PROGRAMADO		EJECUTADO	
Avance programado para el mes		Avance ejecutado en el mes	
Monto Programado	Porcentaje	Monto Valorizado	Porcentaje
S/56,443.17	35.61%	S/47,253.28	29.81%
Avance programado Acumulado		Avance ejecutado Acumulado	
Monto Programado	Porcentaje	Monto Valorizado	Porcentaje
s/ 158,514.45	100%	S/158,514.45	100%

IMPORTE DE INGENIERIA DEL PRO
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668

Situación de la Obra

: SE ESCUENTRA CULMINADA AL 100%



000002

8. AVANCE FÍSICO MENSUAL Y ACUMULADO

4.1. EVALUACIÓN DE LOS AVANCES

4.1.1. PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL MES (PERIODO ABRIL DEL 01/04/2022 AL 29/04/2022)

De acuerdo al cronograma de Ejecución de Obra, se indican los siguientes porcentajes programados sus respectivos montos.

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS				
MES	MONTOS (Inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	S/.	%	%
Inicio 04 de Marzo del 2022	0.00	102,071.28	0.00%	0.00%
DEL 04/03/2022 AL 31/03/2022	102,071.28	102,071.28	64.39%	64.39%
DEL 01/04/2022 AL 29/04/2022	56,443.17	158,514.45	35.61%	100.00%
TOTAL	158,514.45			

4.1.2. PROGRAMACIÓN ACUMULADO A LA EVALUACIÓN DEL MES (PERIODO ABRIL 2022)

El porcentaje programado acumulado para el periodo 01/04/2022 al 29/04/2022 es de 100% y el porcentaje mensual programado para el mes es de 35.61%

❖ Cabe indicar que se está valorizando los 29 días de trabajo del 01/04/2022 al 29/04/2022.

4.1.3. EJECUTADO REAL DEL MES (PERIODO DEL 01/04/2022 al 29/04/2022)

El porcentaje mensual ejecutado es 29.81% cuyo monto valorizado es de S/. 47,253.28 el porcentaje acumulado 70.19% de S/. 111,261.16 soles tal como se muestra en la siguiente tabla.

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS				
MES	MONTOS (Inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	S/.	%	%
Inicio 04 de Marzo del 2022	0	47,253.28	0	0.00%
DEL 04/03/2022 AL 31/03/2022	111,261.16	111,261.16	70.19%	70.19%
DEL 01/04/2022 AL 29/04/2022	47,253.28	158,514.45	29.81%	100.00%
TOTAL	158,514.45		100.00%	


ANÁLISIS

El porcentaje programado de avance mensual es de 35.61% y el porcentaje acumulado programado es de 100%, frente a un porcentaje de avance mensual real ejecutado para el mes de marzo de 29.81 % y un porcentaje real acumulado de 100%, encontrándose la obra culminada al 100%.

WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114668

**CURVA S**

000061

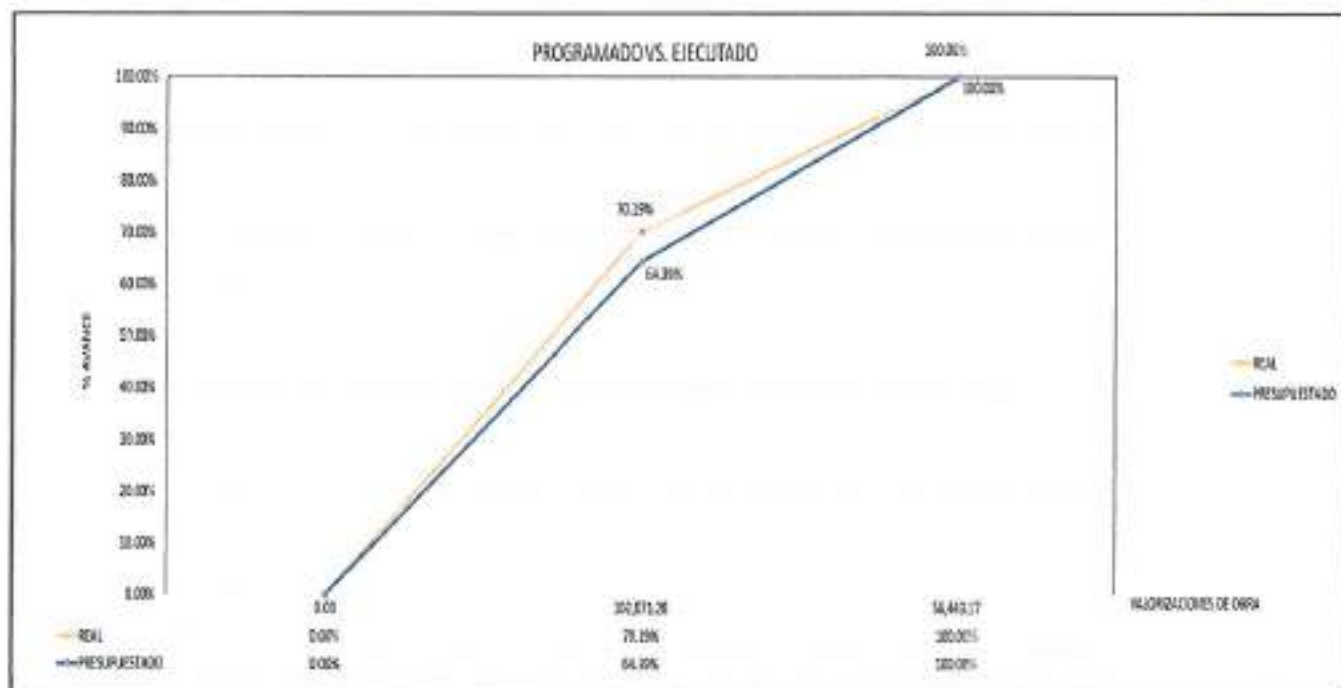**9. CONTROL DE VALORIZACIÓN DE LA OBRA**

En el presente periodo, se está presentando la valorización de obra N° 02 del adicional n°2 correspondiente al avance ejecutado del 01 al 29 de abril del 2022.

A continuación, se presenta el cuadro de resumen de valorización correspondiente al mes de abril del 2022, que tiene un avance físico mensual de 29.81% equivalente a un monto de S/. 47,253.26 soles y un avance físico acumulado de 100% correspondiente a S/ 158,514.45 soles tal como se detalla en el cuadro que a continuación se presenta:

Item	Descripción	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL	
		COSTO TOTAL		MONTO		MONTO		MONTO		MONTO	
1.00	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	1,505.35	0.94	0.78	509.00	0.40	1,505.35	1.27	0.00	0.00	0.00
2.00	SEGURIDAD Y SALUD	6,219.84	2,942.10	2.40	5,574.64	2.85	6,219.84	5.23	0.00	0.00	0.00
3.00	CONVULSIONES	18,277.56	10,277.56	8.88	0.00	0.00	18,277.56	8.88	0.00	0.00	0.00
4.00	MOVIMIENTO DE TIERRA	8,885.88	6,088.88	5.14	0.00	0.00	8,885.88	5.14	0.00	0.00	0.00
5.00	CONCRETO SIMPLE	23,300.80	23,300.80	19.87	0.00	0.00	23,300.80	19.87	0.00	0.00	0.00
6.00	CONCRETO ARMADO	71,886.78	36,718.61	35.53	11,585.16	28.47	71,886.78	89.00	0.00	0.00	0.00
	COSTO DIRECTO	118,471.41	66,184.79	6.30	16,219.30	28.81	118,471.41	104.88	-	-	0.00
	CARGOS GENERALES	8,764.61			2,808.87		8,764.61		-	-	-
	OTROS	7,308.36			2,118.08		7,308.36		-	-	-
	SUB TOTAL	134,544.38			46,945.19		134,544.38		-	-	-
	IG. V. (18%)	24,218.17			7,308.10		24,218.17		-	-	-
	VALOR REFERENCIAL	S/ 158,762.55			S/ 54,253.29		S/ 158,762.55		S/ -	-	-

10. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL**7.1 CONTROLES****a) CONTROL DE PRECIOS**

- ✚ Durante el mes de abril se realizó el control de metrados de avance y la valorización correspondiente.

RECIBIDO DE PRESIDENTE DEL PEU
Walter Alfredo Botello Alva
17 de Abril 2022



000080

b) CONTROL ADMINISTRATIVO

- ✚ Durante el presente periodo se exigió y verificó que el contratista entregue a todo el personal de trabajo sus equipos de protección personal (EPPS) en especial el ARNÉS DE SEGURIDAD puesto que durante el mes se han realizado trabajos en altura y todos los procedimientos que se han realizado fueron en base a la LEY 29783 – LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y la norma G-0.50, con el objetivo de evitar cualquier accidente en obra.
- ✚ Durante el mes el gerente de Obra hizo que se garantice que la ejecución del proyecto no afecta al medio ambiente.
- ✚ Se verificó que todo trabajador no presente cualquier riesgo ante la propagación del Covid-19.
- ✚ Se controló la ejecución del proyecto cumpliendo con los lineamientos del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid- 19 en el trabajo, como es el control de la sintomatología, lavados de manos, desinfección de herramientas, distanciamiento social, entre otros cargos de la profesional de salud.
- ✚ Se ha controlado las charlas diarias de parte del Ing. Especialista en Seguridad y salud en obra hacia los trabajadores de acuerdo al trabajo a desarrollar.
- ✚ Se pidió al contratista que presente los pagos de seguro de los trabajadores.
- ✚ Se brindó el apoyo necesarias ante cualquier duda encontrado en los planos y sobre todo las consultas realizadas mediante cuaderno de obra.
- ✚ Se exigió al contratista el suministro oportuno de los materiales, personal, maquinarias o equipos necesarios para garantizar el fiel cumplimiento del avance de la obra.

c) CONTROL DE CALIDAD

- ✚ Durante el presente mes el gerente de obras exigió los ensayos de control de calidad de los agregados.
- ✚ **Concreto:** Se chequeó que la dosificación de los materiales para la preparación del concreto sea la indicada en los diseños de mezcla correspondientes.
Del mismo modo se controló la trabajabilidad del concreto mediante el ensayo de revenimiento o Slump.
- ✚ Se verificó que el tiempo de preparación, el tiempo de mezcla y el tiempo para colocar el concreto esté dentro del tiempo mínimo.
- ✚ **Encofrado:** Se verificó la verticalidad del encofrado en estructuras como columnas y placas así mismo la horizontalidad en estructuras con cargas bidireccionales en losa aligerada.
- ✚ **Cemento:** Se brindó la aceptación al cemento adquirido por el contratista en donde previamente se verificó que el insumo cumpla con las Especificaciones Técnicas descritas en los planos y especificaciones Técnicas.
- ✚ **Agregados:** Se verificó en obra que los agregados se encuentren limpios de impurezas y contaminación además se verificó el análisis granulométrico de estos con el objetivo de lograr un concreto con buenas características como: trabajabilidad y resistencia.
- ✚ **Diseño de Mezcla:** Es el ensayo fundamental que se ha venido verificando para la ejecución de las diferentes partidas de obras de concreto armado.

d) CONTROL DE PLAZOS

- ✚ Durante Este mes se realizó el control de plazos en donde se indica que la ejecución de la obra se encuentra dentro del plazo.
- ✚ La presente valorización n°02 del adicional n°02 corresponde a la fecha (01/04/2022 al 29/04/2022), la ejecución se encuentra dentro del plazo establecido y se observa que la obra se encuentra **culminada al 100%**

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668

**e) CONTROL DEL COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA****PAGO AL CONSORCIO EL SAUCE:**

Según el contrato de obra N° 038-2021 SENASA – PRODESA FASE II, del adicional n°02 el monto total para la ejecución de la obra es S/ 158,514.45 soles, el monto neto apagar al contratista: S/ 47,253.28 soles.

Item	Descripción	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		VALIDACIÓN ACUMULADA ANTERIOR		VALIDACIÓN ACTUAL		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRACTUAL	
		COSTO TOTAL		MONTO		MONTO		MONTO		MONTO	
1.00	OBRAS PRELIMINARES Y PRELIMINARES	1,505.35	894.85	9.18		590.50	9.45	1,505.35	1.27	1,505.35	9.18
2.00	SEGURIDAD Y SALUD	6,218.54	2,842.10	2.40		1,154.59	2.85	6,218.54	5.25	6,218.54	2.40
3.00	MANEJO DE AGUAS	16,277.56	10,277.56	9.88		0.00	0.00	16,277.56	9.88	16,277.56	9.88
4.00	MOVIMIENTO DE TIERRA	6,089.08	6,089.08	5.14		0.00	0.00	6,089.08	5.14	6,089.08	5.14
5.00	CONCRETO SIMPLE	23,209.80	23,209.80	18.07		0.00	0.00	23,209.80	18.07	23,209.80	18.07
6.00	CONCRETO ARMADO	71,080.78	39,718.81	32.50		2,381.58	28.47	71,080.78	86.00	71,080.78	32.50
	COSTO DIRECTO	118,471.11	88,594.34	9.89		15,976.38	38.91	118,471.11	186.88	118,471.11	9.89
	GASTOS GENERALES	8,716.31				2,899.57		8,716.31		8,716.31	
	UTILIDAD	7,119.28				2,119.38		7,119.28		7,119.28	
	SUB TOTAL	134,306.70				40,995.33		134,306.70		134,306.70	
	I.G.V. (18%)	24,195.17				7,380.13		24,195.17		24,195.17	
	VALOR REFERENCIAL	S/ 158,514.45				S/ 47,253.28		S/ 158,514.45		S/ 47,253.28	

RESUMEN DE PAGO -VALORIZACION 01

COSTO DIRECTO	S/ 118,471.11
GASTOS GENERALES	S/ 8,716.31
UTILIDAD	S/ 7,119.28
SUB TOTAL VALORIZADO	S/ 134,306.70
I.G.V. 18%	S/ 24,195.17
TOTAL	S/ 158,514.45

SON: CIENTO CINCE MIL, CINCECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCE SOLES

8 PRINCIPALES INCIDENCIAS OCURRIDAS EN EL MES

- la ADENDA N°04 AL CONTRATO DE OBRAS N°038 – 2021- SENASA – PRODESA FASE II, fue aprobado con fecha del día 03 de marzo del 2022, ADICIONAL N°02 por el monto S/ 158,514.45 soles.
- Ocurrencia de lluvias que merman el rendimiento contemplado en el Adicional n°02
- Se presencian lluvias fuertes, atrasando trabajos programados
- En el mes de abril, se tuvo la visita de los representantes de PRODESA y JEFE NACIONAL DE SENASA, para verificar el avance de los adicionales aprobados.
- Se tuvo la visita de la OCI, para verificar el avance de la obra

9 ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA SUPERVISIÓN PARA EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

- Recomendar a la residencia realizar los trabajos con más cuadrillas en diferentes frentes si fuera necesario para evitar posibles retrasos.
- Mantener la coordinación con el plantel técnico y la entidad para absolver cualquier consulta y evitar se pierda tiempo.
- Continuar con el cumplimiento de los protocolos del plan de vigilancia, prevención y control de covid, evitando de esta manera el contagio del covid-19.

INGENIERO DE PROYECTO DE P.E.U.
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO EN CIVIL
CIP N° 114-666



000053

- Continuar con la señalización en obra y la verificación del uso de los EPPs para evitar accidentes no deseados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- El avance físico mensual ejecutado al periodo del 01 al 29 de abril del 2022, correspondiente a la VALORIZACIÓN N° 02 es de 29.81 % y el avance programado parcial es 35.61%.
- El avance acumulado correspondiente a la valorización es 100% frente a un avance programado acumulado de 100%, por lo que se deduce que la obra se encuentra culminada al 100%.
- El monto valorizado durante el periodo del 01/04/2022 al 29/04/2022 es de S/. 47,253.28 soles, mientras que el monto ejecutado acumulado hasta el mes es de S/. 158,514.45 soles
- LA ADENDA N°04 AL CONTRATO DE OBRA N°038 – 2021 – SENASA – PRODESA FASE II, perteneciente al ADICIONAL N°02, es aprobado el 03 de marzo del 2022, con un monto de S/ 158,514.45 soles.
- El monto neto a cobrar por el servicio del consorcio el sauce es: S/ 47,253.28 Soles
- Durante el presente periodo se verificó que todo el personal de trabajo cuenta con sus equipos de protección personal (EPPS) en base a la LEY 29783 – LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y la norma G-0.50, con el objetivo de evitar cualquier accidente en obra.
- Durante la ejecución se ha exigido que se cumpla y se controló el distanciamiento social obligatorio.
- La supervisión vigiló que se cumpliera estrictamente con todos Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 según la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA indicados en el Numeral 7.01.
- Se constató la continua señalización en obra durante el horario laboral

RECOMENDACIONES

- Se recomienda el pago por el servicio del CONSORCIO EL SAUCE por el monto de S/ 47,253.28 Soles.
- Se recomienda el continuo uso de los EPPs ya que con ello se disminuirá el riesgo de posibles accidentes en el trabajo, así como las charlas de seguridad y salud en obra, y al mismo tiempo se recomienda seguir brindando las charlas de prevención del COVID-19 en obra para evitar cualquier tipo de contagio.
- Se recomienda mantener de la misma manera señalizada el área de los trabajos para evitar los accidentes e incidentes con los trabajadores.

INGENIERO DE INGENIERO DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326

ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC.
VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN
GENERAL. SERVICIOS GENERALES



000057

VALORIZACION DE OBRA

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114 68



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668

RUC N° 10329618221

REG. CONSULTOR C15326

ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC.

VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN
GENERAL. SERVICIOS GENERALES



000054

METRADOS EJECUTADOS

 **Walter Alfredo Botello Alva**
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668

ADICIONAL 02 - EVENTO COMPENSABLE

000053

RESÚMEN DE METRADOS

Proyecto: "Construcción de cerco perimétrico".

Propietario : SENASA

Fecha : 2022

Ubicación : Baños del Inca

Provincia: Cajamarca

Region: Cajamarca

CERCO PERIMÉTRICO DE ALBANILERÍA

ITEM	PARTIDA	UND	TOTAL
1.00.	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE ALBANILERIA		
1.01.00.00	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES		
01.01.01.01	FLETE TERRESTRE	GLB	0.10
01.01.01.02	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	MES	0.88
1.01.02	OBRAS PRELIMINARES		
01.01.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO (TODA EL AREA)	M2	
01.01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	
01.02	SEGURIDAD Y SALUD		
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OBRA	mes	0.88
01.02.01.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVAS POR COVID 19	glb	0.09
01.02.01.03	SEÑALIZACION BASICA DE PREVENCIÓN CONTRA EL CONTAGIO AL COVID 19	glb	0.09
01.02.01.04	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA	mes	0.88
01.02.01.05	CILINDROS METALICOS PARA ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	0.09
01.02.01.06	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	0.09
01.02.01.07	MAMELUCO CON CAPUCHA EN TELA TALLAN ENGOMADO RESISTENTE	und	0.09
01.02.01.08	MASCARILLAS DE PROTECCION	und	0.09
01.02.01.09	PROTECTOR FACIAL DE PVC VINIFAN	und	0.09
01.02.01.10	RESPIRADOR DE SILICONA CON FILTROS SEGÚN ESPECIFICACIONES	und	0.09
01.02.01.11	ALCOHOL LIQUIDO PURO 96°DE 1000ML	und	0.09
01.02.01.12	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 MOLECULARES DE DESCARTE	und	0.09
01.02.01.13	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 RAPIDAS DE DESCARTE	und	0.09
1.03.00.00	DEMOLICIONES		
1.03.01.00	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	
1.03.02.00	ELIMINACIÓN Y LIMP. DE MAT. DE DEMOLICIÓN	M3	
1.04.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.04.01	NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	
01.04.02	CORTE SUPERFICIAL MANUAL E=0.20M	M3	
01.04.03	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTO CORRIDO	M3	
01.04.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	
01.05	CONCRETO SIMPLE		
1.05.01.00	SOLADOS e=0.10 m. C.H. 1:12	M3	
1.05.02.00	CIMIENTO CORRIDO C.H = 1:10 + 30% P.G.	M3	
1.05.03.00	CIMIENTO CORRIDO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	
1.06.00.00	CONCRETO ARMADO		
1.06.01.00	SOBRECIMIENTO ARMADO		
1.06.01.01	SOBRECIMIENTO ARMADO-CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	M3	
1.06.01.02	SOBRECIMIENTO ARMADO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	
1.06.01.03	SOBRECIMIENTO ARMADO-ACERO $FY=4,200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	KG	
1.06.01.04	TARAJEO DE SOBRECIMIENTO	M2	
1.06.02.00	COLUMNAS		
1.06.02.01	COLUMNAS - CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	M3	14.13
1.06.02.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	199.58
1.06.02.03	COLUMNAS - ACERO $FY=4,200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	KG	
1.06.03.00	VIGAS		
1.06.03.01	VIGAS DE AMARRE - CONCRETO $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	M3	3.77
1.06.03.02	VIGAS DE AMARRE - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	100.65
1.06.03.03	VIGAS DE AMARRE - ACERO $FY=4,200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	KG	511.06


 Ingeiero Civil
 CIP N° 11085

PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURAS

060052

Proyecto: "Construcción de cerco perimetrico",

Propietario: SENASA

Fecha:

2022

Ubicación: Baños del Inca

Provincia: Cajamarca

Región: Cajamarca

CERCO PERIMETRICO DE ALBANILERIA

ITEM	PARTIDA	UNO	CANTIDAD	N° de Vistas	LARGO	ANCHO	ALTURA	PARCIAL	TOTAL
01.02	SEGURIDAD Y SALUD								
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
01.02.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OBRA	mes	0.88					0.88	0.88
01.02.01.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVAS POR COVID 19	gb	0.09					0.09	0.09
01.02.01.03	SEÑALIZACION BASICA DE PREVENCION CONTRA EL CONTAGIO AL COVID	gb	0.09					0.09	0.09
01.02.01.04	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA	mes	0.88					0.88	0.88
01.02.01.05	CIENDROS METALICOS PARA ACCESO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS	gb	0.09					0.09	0.09
01.02.01.06	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	gb	0.09					0.09	0.09
01.02.01.07	MANEJO CON CAPUCHA EN TELA TALLAN ENCONADO RESISTENTE A	und	0.09					0.09	0.09
01.02.01.08	MASCARILLAS DE PROTECCION	und	0.09					0.09	0.09
01.02.01.09	PROTECTOR FACIAL DE PVC VINIFAN	und	0.09					0.09	0.09
01.02.01.10	RESPIRADOR DE SILICONA CON FILTROS SEGUN ESPECIFICACIONES	und	0.09					0.09	0.09
01.02.01.11	ALCOHOL LIQUIDO PURO 96% DE 1000ML	und	0.09					0.09	0.09
01.02.01.12	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 MOLECULARES DE DESCARTE	und	0.09					0.09	0.09
01.02.01.13	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 RAPIDAS DE DESCARTE	und	0.09					0.09	0.09
1.06.00	CONCRETO ARMADO								
1.06.01.04	TARAJEO DE SOBRECIMIENTO	M2							39.56
	Eje X-X		1.00	2.00	47.81		0.20	19.12	
	EJE Y-Y		1.00	2.00	51.10		0.20	20.44	
1.06.02	COLUMNAS								
1.06.02.01	COLUMNAS - CONCRETO f _{cc} = 210 kg/cm ²	M3							14.13
	C1- 25X25 CERCO PERIMETRICO		38.00	1.00	0.25	0.25	5.95	14.13	
1.06.02.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2							169.58
	C1- 25X25 CERCO PERIMETRICO		38.00	1.00	0.75		5.95	169.58	
1.06.03	VIGAS								
1.06.03.01	VIGAS DE AMARRE - CONCRETO f _{cc} = 175 kg/cm ²	M3							3.77
	C1- 15X25 CERCO PERIMETRICO EJE X-X								
	TRAMO 01		3.00	1.00	3.00	0.15	0.25	0.34	
	TRAMO 02		3.00	1.00	3.00	0.15	0.25	0.34	
	TRAMO 03		3.00	1.00	3.00	0.15	0.25	0.34	
	TRAMO 04		3.00	1.00	3.00	0.15	0.25	0.34	
	TRAMO 05		3.00	1.00	3.00	0.15	0.25	0.34	
			1.00	1.00	1.45	0.15	0.25	0.05	
	C1- 15X25 CERCO PERIMETRICO EJE Y-Y								
	TRAMO 01		16.00	1.00	3.00	0.15	0.25	1.80	
	TRAMO 02		1.00	1.00	3.90	0.15	0.25	0.15	
	TRAMO 03		1.00	1.00	2.30	0.15	0.25	0.09	
1.06.03.02	VIGAS DE AMARRE - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2							100.65
	C1- 15X25 CERCO PERIMETRICO EJE X-X								
	TRAMO 01		3.00	2.00	3.00		0.50	9.00	
	TRAMO 02		3.00	2.00	3.00		0.50	9.00	
	TRAMO 03		3.00	2.00	3.00		0.50	9.00	
	TRAMO 04		3.00	2.00	3.00		0.50	9.00	
	TRAMO 05		3.00	2.00	3.00		0.50	9.00	
	TRAMO 06		1.00	2.00	1.45		0.50	1.45	
	C1- 15X25 CERCO PERIMETRICO EJE Y-Y								
	TRAMO 01		16.00	2.00	3.00		0.50	48.00	
	TRAMO 02		1.00	2.00	3.90		0.50	3.90	
	TRAMO 03		1.00	2.00	2.30		0.50	2.30	
1.06.03.03	VIGAS DE AMARRE - ACERO F _y =4200 kg/cm ² GRADO 60	KG							511.08

PROYECTO: CERCO PERIMETRICO DEL PDS
 Walter Alvarado B. Velloso
 INGENIERO CIVIL
 "P. N. 11- 88"

PLANILLA DE METRADOS - OBRAS PROVISIONALES

000051

Proyecto: "Construcción de cerco perimétrico".

Propietario : SENASA

Fecha :

2022

Ubicación : Baños del Inca

Provincia: Cajamarca

Región: Cajamarca

OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRICO DE ALBANILERIA

ITEM	PARTIDA	UND	CANTIDAD	N° de Veces	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTURA		
1.00.00	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE ALBANILERIA								
1.01.00	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES								
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES								
01.01.01.01	FLETE TERRESTRE	GLB	0.10						0.10
01.01.01.02	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	MES	0.88						0.88


 COLEGIO DE INGENIEROS
 Walter Alfredo Botello Arce
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114068

PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURAS (ACERO EN SOBRECIMIENTO)

Proyecto: "Construcción de cerco perimétrico",

Propietario : SENASA

Fecha : 2022

Ubicación : Baños del Inca

Provincia: Cajamarca

Region: Cajamarca

ITEM	ELEMENTO		DISEÑO DEL ACERO		CANT.	LONG. SEGUN Ø (M)						
	DECOMINACION	CANT.	FORMA	Ø		L	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1
1.06.01.03	SOBRECIMIENTO ARMADO-ACERO FY=4,200 kg/cm2 GRADO 60											
SOBRECIMIENTO EN CERCO PERIMÉTRICO DE ALBANILERIA												
Sentido Horizontal			93.72			1/2	93.72	10.93	1,023.94			
e = 20 cm												
Sentido Vertical			0.30 1.85			3/8	2.15	626.00	1,345.90			
r = 4 cm												
e = 15 cm												
LONGITUD TOTAL POR Ø EN MIL.						0.00	1,345.90	1,023.94	0.00	0.00	0.00	0.00
PESO EN KG/MIL.						0.250	0.560	0.990	1.600	2.240	3.970	0.00
PESO TOTAL POR Ø EN KG.						0.00	753.70	1,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00
PESO TOTAL EN KG.						1,767.03						

INGENIERO DE INGENIERO DEL T.T.

 Walter Alfredo B. 1980 Ave.
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114.708



000950

PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURAS (ACERO EN COLUMNAS)

Proyecto: "Construcción de cerco perimetrico".

Propietario : SENASA
Ubicación : Baños del Inca

Fecha : 2022
Provincia: Cajamarca
Region: Cajamarca

ITEM	ELEMENTO		DISEÑO DEL ACERO		CANT	LONGITUD SEGUN Ø(M)					
	DESCRIPCION	CANT.	FORMA	Ø		L	1/4	3/8	1/2	5/8	1
1.06 02.03	COLUMNAS - ACERO FY=4,200 kg/cm ² GRADO 60										
C1- 25X25 CERCO PERIMETRICO											
Acero Longitudinal											
Número de Columnas 48.00											
4 Ø 1/2"											
											
1/2 6.55 4.00 1,257.60											
Estribos											
Número de Columnas 48.00											
C1- 25X25 CERCO PERIMETRICO											
1Ø0.05, 4Ø0.10,											
R@0.20											
											
0.23 1er Nivel # 3/8 1.11 42.00 2,229.29											
LONGITUD TOTAL POR Ø EN ML											
PESO EN KG/ML											
PESO TOTAL POR Ø EN KG											
PESO TOTAL EN KG											
0.00 2,229.29 1,257.60 0.00 0.00 0.00											
0.250 0.560 0.994 1.600 2.240 3.970											
0.00 1,248.40 1,250.02 0.00 0.00 0.00											
2,498.43											

COLLEJO DE INGENIEROS DEL PERU
Ingeniero Alfredo B. Bello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 115-108

000049

PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURAS (ACERO EN VIGAS)

Proyecto: "Construcción de cerco perimétrico".

Propietario : SENASA
Ubicación : Baños del Inca

Fecha : 2022
Provincia: Cajamarca
Region: Cajamarca

ITEM	ELEMENTO		DISEÑO DEL ACERO		CANT		LONGITUD SEGUN D (M.)					
	DENOMINACION	CANT	FORMA	Ø	L		1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1
1.05.03.03	COLUMNAS - ACERO FY=4.200 kg/cm2 GRADO 60											
VA-1, 15X25 CERCO PERIMETRICO												
Acero Longitudinal												
Número de Vigas												
4 Ø 1/2"												
0.25 VARIABLE 0.25												
1/2 3.50 4.00 42.00												
1/2 3.50 4.00 42.00												
1/2 3.50 4.00 42.00												
1/2 3.50 4.00 42.00												
1/2 3.50 4.00 42.00												
1/2 1.55 4.00 6.20												
1/2 3.50 4.00 224.00												
1/2 4.20 4.00 16.80												
1/2 2.60 4.00 10.40												
Estribos												
Número de Vigas												
34.00												
0.10 0.06 0.20 0.08 0.10												
1er Nivel Ø 0.20 0.08 0.08												
3/8 0.75 22.00 752.40												
3/8 0.75 26.00 39.52												
3/8 0.75 19.00 14.44												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.20 0.08 0.10												
0.10 0.08 0.												



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326

ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC.

VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN

GENERAL. SERVICIOS GENERALES



000047

RESUMEN DE LA VALORIZACION

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
Walter Alfredo B. Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668

RESUMEN DE VALORIZACIONES

ENTIDAD	PRODESA - SENASA
CONTRATO	CONTRATO DE OBRAS N° 038-2021-SENASA-PRODESA FASE II
OBRA	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CALAMARCA"
CONTRATISTA	CONSORCIO EL SAUCE
RESIDENTE DE OBRA	ING. CESAR AUGUSTO CHAVEZ SARMIENTO
SUPERVISOR DE OBRA	ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
PRESUPUESTO CONTRATADO CON IGV	S/ 188,514.45

ITEM	DESCRIPCION	PERIODO	MONTOS (Incl IGV)		AVANCE %		SALDO	
			PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL
1.00	VALORIZACION N° 01	DEL 04/03/2022 AL 31/03/2022	S/ 111,281.16	S/ 111,281.16	70.19%	70.19%	S/ -47,253.29	29.81%
1.01	VALORIZACION N° 02	DEL 01/04/2022 AL 29/04/2022	S/ 47,253.29	S/ 158,514.45	29.81%	100.00%	S/ -	100.00%


 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y URBANISMO
 Walter Alfredo Botello Alva
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114-98

000046



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668

RUC N° 10329616221

REG. CONSULTOR C15326

ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC.

VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN

GENERAL. SERVICIOS GENERALES



000045


CURVA "S"

OFICINA DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Botello Alva
Walter Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668

CURVA "S" - DE AVANCE DE OBRA VALORIZACIÓN N° 02 -ADICIONAL N° 02

ENTIDAD	PROCESA - SENASA
OBRA	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CALAMARCA
CONTRATO	CONTRATO DE OBRAS N° 008-2021 SENASA-PROCESA FASE II
CONTRATISTA	CONSORCIO EL SAUCE
RESIDENTE DE OBRA	ING. CÉSAR AUGUSTO CHAVEZ BARRIENTO
GERENTE DE OBRA	ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
PRESUPUESTO CONTRATADO	150,314.45
PERIODO:	DEL 01/04/2022 AL 29/04/2022

PROGRAMADO VS. EJECUTADO

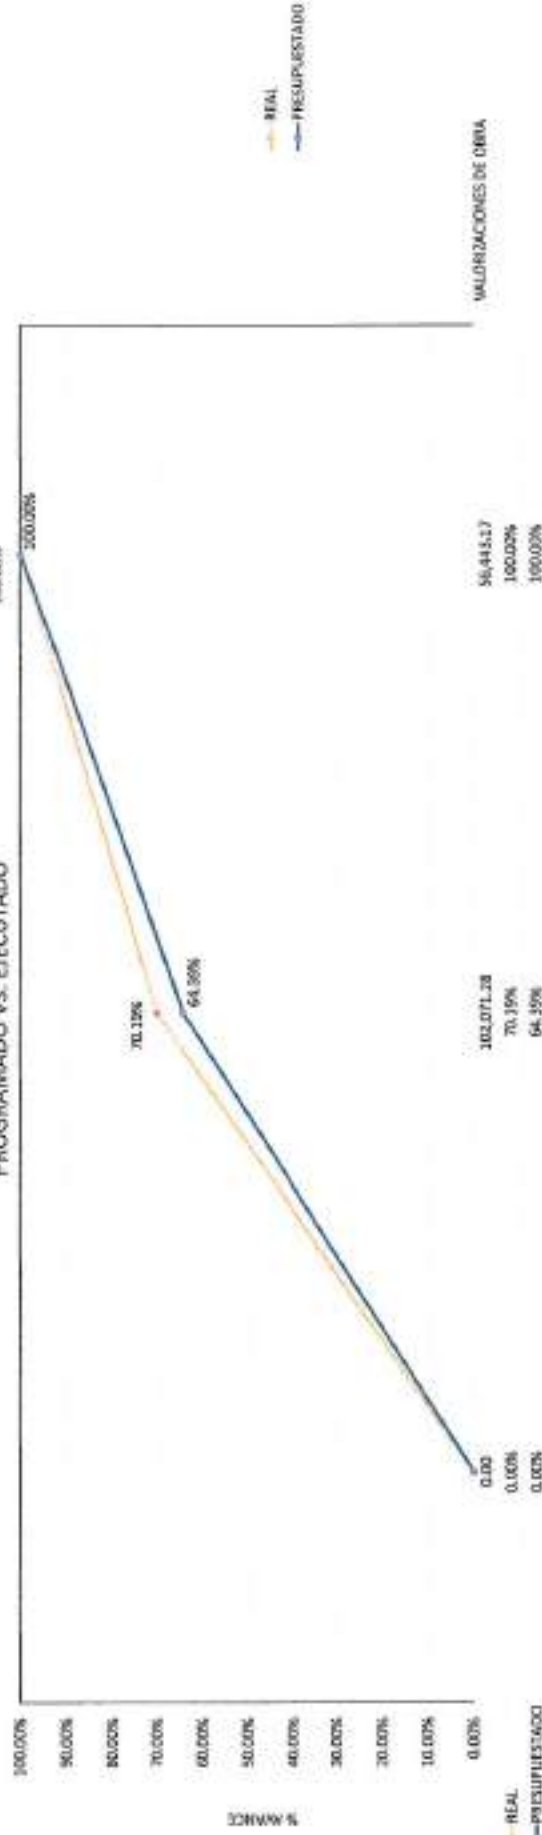

MES	MONTOS (MIL/US)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
01 de Marzo del 2022	0.00	02.071.28	0.00%	1.00%
02 de Marzo del 2022	102.071.28	102.071.28	64.55%	64.55%
TOTAL	102.071.28	102.071.28	100.00%	100.00%

MES	MONTOS (MIL/US)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
01 de Marzo del 2022	0.00	02.071.28	0.00%	1.00%
02 de Marzo del 2022	102.071.28	102.071.28	64.55%	64.55%
TOTAL	102.071.28	102.071.28	100.00%	100.00%

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114-85

000044



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329616221 REG. CONSULTOR C15326

ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC.

VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN

GENERAL. SERVICIOS GENERALES



000043

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329616221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS,
SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS GENERALES



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

000042

CONCLUSIONES

- El avance físico mensual ejecutado al periodo del 01 al 29 de abril del 2022, correspondiente a la VALORIZACIÓN N° 02 es de 29.81 % y el avance programado parcial es 35.61%.
- El avance acumulado correspondiente a la valorización es 100% frente a un avance programado acumulado de 100%, por lo que se deduce que la obra se encuentra culminada al 100%.
- El monto valorizado durante el periodo del 01/04/2022 al 29/04/2022 es de S/. 47,253.28 soles, mientras que el monto ejecutado acumulado hasta el mes es de S/. 158,514.45 soles
- LA ADENDA N°04 AL CONTRATO DE OBRA N°038 – 2021 – SENASA – PRODESA FASE II, perteneciente al ADICIONAL N°02, es aprobado el 03 de marzo del 2022, con un monto de s/ 158,514.45 soles.
- El monto neto a cobrar por el servicio del consorcio el sauce es: S/ 47,253.28 Soles
- Durante el presente periodo se verificó que todo el personal de trabajo cuente con sus equipos de protección personal (EPPs) en base a la LEY 29783 – LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y la norma G-0.50, con el objetivo de evitar cualquier accidente en obra.
- Durante la ejecución se ha exigido que se cumpla y se controló el distanciamiento social obligatorio.
- La supervisión vigiló que se cumpliera estrictamente con todos Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 según la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA indicados en el Numeral 7.01.
- Se constató la continua señalización en obra durante el horario laboral

RECOMENDACIONES

- Se recomienda el pago por el servicio del CONSORCIO EL SAUCE por el monto de S/ 47,253.28 Soles.
- Se recomienda el continuo uso de los EPPs ya que con ello se disminuirá el riesgo de posibles accidentes en el trabajo, así como las charlas de seguridad y salud en obra, y al mismo tiempo se recomienda seguir brindando las charlas de prevención del COVID-19 en obra para evitar cualquier tipo de contagio.
- Se recomienda mantener de la misma manera señalizada el área de los trabajos para evitar los accidentes e incidentes con los trabajadores.

WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114688

RUC N° 10329618221

REG. CONSULTOR C15326

ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC.

VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN

GENERAL. SERVICIOS GENERALES



000041

PANEL FOTOGRAFICO

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Botello
WALTER BOTELLO B. 1960 RNS
INGENIERIA CIVIL
CIP N° 114688



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114666 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS
GENERALES



PANEL FOTOGRAFICO – ADICIONAL N°02



Fotografía N° 01: en esta imagen apreciamos las charlas de prevención durante el trabajo.



Fotografía N° 02: se observan los trabajos de terraje en el cerco perimétrico.

PROYECTO DE URBANIZACION DE MZ J'26
Walter Alfredo B. Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114666



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS
GENERALES



Fotografía N° 03: se visualiza al gerente de obra verificando los trabajos de pintura.



Fotografía N° 04: en la toma fotográfica se observa los acabados en el cerco, como el pintado.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668

Cajamarca, 28 de abril del 2022

CARTA N° 0067-2022-CONSORCIO EL SAUCE

Atención : Ing. Walter Alfredo Botello Alva
Gerente de Obra

Referencia : a) CONTRATO DE OBRAS N° 038-2021 SENASA PRODESA FASE II
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA
– CAJAMARCA.
b) Adenda N° 04 Contrato N° 038-2021-SENASA-PRODESA FASE II

Asunto : Valorización N° 02 _ Del adicional N° 02

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez hacerle llegar la Valorización N° 02 _ Del adicional N° 02, de la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA", correspondiente al periodo del 01/04/2022 al 29/04/2022, para su revisión, aprobación y trámite de pago respectivo.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

CONSORCIO EL SAUCE

Ing. Emperatriz Campos Saldana
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. César Chávez Sarmento
RESIDENTE DE OBRA
CIP 32382
CONSORCIO EL SAUCE


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
N° 111111

000037

CEYCA SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCION SAC
JR. DELFIN CERNA 457 URB. SAN ROQUE
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20311227913
E001-379

Fecha de Emisión : 02/05/2022
Señor(es) : PROGRAMA DE DESARROLLO DE
RUC : 20414251551
Dirección del Receptor de la factura : UNIV AGRARIA PUERTA 1 LIMA
LIMA LA MOLINA
Dirección del Cliente : UNIV AGRARIA PUERTA 1 LIMA-
LIMA-LA MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OPERACION SUJETA A
DETRACCION DEL SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	COMPARACION DE PRECIOS NO.005-2021 SENASA/PRODESA - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES BANOS DEL INCA CAJAMARCA - VALORIZACION NO.02 DEL ADICIONAL 02 - CONTRATO DE OBRAS NO.058-2021-SENASA-PRODESA FASE II	40045.15	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y
28/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 40,045.15
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 40,045.15
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7,208.13
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 47,253.28

Información del crédito
Monto nro pendiente de pago : S/ 43,000.62
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/06/2022	43,000.62						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSORCIO EL SAUCE
Campos
Ing. Empresarial Campos Saldarña
REPRESENTANTE LEGAL

Walter
CONSORCIO EL SAUCE

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter
Walter Alfredo Borella Araya
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114988

INDICE

1. FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA
2. INFORME DE RESIDENTE DE AVANCE DE OBRA
3. HOJA DE RESUMEN DE PAGO
4. VALORIZACION
5. CURVA DE "S"
6. RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES
7. RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS – PLANILLA DE METRADOS
8. SITUACION DE LA OBRA
9. CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO
10. VIGENCIA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
11. PANEL FOTOGRAFICO
12. ADENDA

CONSORCIO EL SAUCE
Canepa
Ing. Emperatriz Campos Saldana
REPRESENTANTE LEGAL

Chavez
Ing. Cesar Chavez Sarmiento
RESIDENTE DE OBRA
CIP 32343
CONSORCIO EL SAUCE

COLEGIO DE INGENIEROS
Alfredo Boleto
Walter Alfredo Boleto Arias
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114-48

1. FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA

CONSORCIO EL SAUCE

Ing. Emperatriz Campos Saldana
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. César Chávez Sarmiento
RESIDENTE DE OBRA
CIP 32363
CONSORCIO EL SAUCE

MIEMBRO DEL PCU

Ing. Alfredo Bustillo Añón
INGENIERO CIVIL
Nº 134468

Proceso de Adjudicación : Comparación de Precios CP N° 0052021-
SENASA/PRODESA.

Resolución Jefatural : Resolución Jefatural N° 0180-
2019-MINAGRI-SENASA

ADENDA N° 04 CONTRATO N° 038-2021 SENASA – PRODESA FASE II
(ADICIONAL DE OBRA N° 02)

Fecha de inicio de plazo de ejecución : 04/03/2022
Fecha de termino : 17/03/2022
Tiempo de ejecución : 45 días calendario
Presupuesto adenda : S/ 158,514.45
Adicional N° 02 : S/ 158,514.45

VALORIZACION N° 02 – ADICIONAL N°02

Porcentaje de avance programado al mes : 35.61 %
Porcentaje de avance ejecutado al mes : 29.81 %
Porcentaje de avance programado acumulado : 100.00 %
Porcentaje de avance ejecutado acumulado : 100.00 %

Estado situacional de la obra : Culminada.

CONSORCIO EL SAUCE

Ing. Emperatriz Campos Saldana
REPRESENTANTE LEGAL


Walter Alfredo Binsolo Alva
INGENIERO CIVIL
D.N° 114708


Ing. Cesar Chavez
RESIDENTE DE OBRA
CP 32363
CONSORCIO EL SAUCE

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA

DE LA OBRA

Nombre de la Obra : "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOSDEL INCA - CAJAMARCA"

Ubicación :
Distrito: Baños del Inca
Provincia: Cajamarca
Departamento: Cajamarca

Entidad ejecutora : Programa De Desarrollo De La Sanidad Agropecuaria

Financiamiento : Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

EJECUTOR DE LA OBRA

Empresa Ejecutora : Consorcio El sauce

Contrato de Obra : N° 038-2021-SENASA-PRODESA FASE II

Modalidad de Ejecución : POR CONTRATA

Sistema de Adjudicación : A SUMA ALZADA

Plazo Contractual : 240 d.c

Presupuesto Base, Con IGV : S/ 4'143 521.37

Monto del Contrato, Con IGV : S/ 4'143 521.37

Fecha Entrega de Terreno : 09.08.2021

Fecha de Inicio Contractual : 12.08.2021

Fecha Prevista de Término de Obra : 08.04.2022

Adelanto directo 30% : S/ 1'243,056.41

Representante Legal : Gladis Emperatriz Campos Saldaña,

Residente de Obra : Ing. Cesar Augusto Chávez Sarmiento,
CIP. N° 32363

Gerente de Obra : Ing. Walter Alfredo Botello Alva,
CIP. N° 114668

CONSORCIO EL SAUCE

Ing. Emperatriz Campos Saldaña
REPRESENTANTE LEGAL


Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668


Ing. Cesar Augusto Sarmiento
CIP N° 32363
RESIDENTE DE LA OBRA

2. INFORME DE RESIDENTE DE AVANCE DE OBRA

CONSORCIO EL SAUCE

Ing. Empartrix Torres Saldana
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Cesar Chavez Cordero
RESIDENTE DE OBRA
CIP 32383
CONSORCIO EL SAUCE

CONSORCIO INGENIERIA DEL PEU

Walter Alfredo Borillo Nino
INGENIERO CIVIL
CIP 22751



INFORME N° 19- 2022-CCHS-EL SAUCE / IR

A : ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
Gerente de Obra - Prodesa

DEL : ING. CESAR AUGUSTO CHAVEZ SARMIENTO
Residente de Obra

ASUNTO : INFORME DE AVANCE DE ADICIONAL N° 02

REFERENCIA : CONTRATO DE OBRAS N° 038-2021-SENASA-PRODESA
FASE II

Adenda N° 04 Contrato de Obras N° 038-2021-
ENASA-PRODESA FASE II

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL
INCA - CAJAMARCA" – ADICIONAL N°01

FECHA : 29/04/2022

Mediante el presente, me dirijo a Ud., para informarle en avance de obra del periodo 01/04/2022 al 29/04/2022.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Los trabajos realizados durante este periodo del 01/04/2022 al 29/04/2022 son:

- Encofrado de columnas.
- Concreto $f'c=210$ kg/m² en columnas
- Encofrado de vigas de amarre
- Habilitado y armado de acero en columnas y vigas.
- Concreto $f'c=175$ kg/m² en vigas
- Tarrajeo de muros.

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL ADICIONAL

De la curva "S" se pueden apreciar los datos siguientes:

Porcentaje de avance programado al mes : 35.61 %

CONSORCIO EL SAUCE
Emperatriz Campos Saldaña
Ing. Emperatriz Campos Saldaña
REPRESENTANTE LEGAL

COLABORADOR DE INGENIERIA DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114778

Cesar Augusto Chavez Sarmiento
ING. CESAR CHAVEZ SARMIENTO
RESIDENTE DE OBRA
CIP 32363
CONSORCIO EL SAUCE

Porcentaje de avance ejecutado al mes	: 29.81 %
Porcentaje de avance programado acumulado	: 100 %
Porcentaje de avance ejecutado acumulado	: 100 %

La obra se encuentra culminada al 100%.

3. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO

En obra se cuenta con un Ingeniero de seguridad y un técnico en enfermería, encargados de auditar diariamente los AST, y temas concernientes a la seguridad.

Todos los días al ingresar a la obra se realiza el protocolo para evitar el contagio de la covid-19.

Luego se realiza las charlas de pre inicio de obra.

Se verifica que, para realizar cualquier actividad, se cuente con su AST dicha actividad.

4. CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Diariamente se está controlando dimensiones, materiales, equipos calibrados, los mismos que están siendo plasmados en los protocolos.

Semanalmente se está presentando el Dossier de calidad de las actividades realizadas en la semana.

5. HORARIO LABORAL

Se está trabajando 48 horas semanales en el horario siguiente:

Lunes a viernes	: 07:30 am – 12:30 pm y de 13:30 pm a 17:00 pm.
Sábados	: 07:30 am a 13:00 pm

6. CONCLUSIONES

- La obra se encuentra culminada.


CONSORCIO DE INGENIEROS DEL Cusco
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
D. Nº 114-998

CONSORCIO EL SAUCE
Ing. Emperatriz Campos Saldaña
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO EL SAUCE
RESOLUCIÓN DE OBRA
D. Nº 32-160

3. HOJA DE RESUMEN DE PAGO

CONSORCIO EL SAUCE


Ing. Emperor Campos Saldana
REPRESENTANTE LEGAL
Walter Alfredo Boleto Awa
INGENIERO CIVIL
Walter Alfredo Boleto Awa
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114969



RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 02 DEL ADICIONAL N° 02											
PERÍODO: DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022											
PROCESA - SENASA											
CONTRATO DE OBRAS N° 008 2021 SENASA PROCEBA FASE II											
OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA"											
CONSORCIO EL SAUCE											
ING. CESAR AUGUSTO CHAVEZ SARMIENTO											
ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA											
PRESUPUESTO CONTRATADO INC. 10V 158,514.44											
Ítem	Descripción	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL	
		COSTO TOTAL	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
1.00	OBRAS PROYECTUALES Y PRELIMINARES	1,003.36	0.78	324.58	0.49	540.50	1.37	1,605.56	1.37	17.01	0.09
2.00	DESGRABIO Y SALDO	8,216.84	2.42	2,892.19	2.86	3,814.94	5.25	6,216.84	5.25	0.00	0.00
3.00	DEMOLICIONES	10,277.56	6.08	10,277.56	0.10	0.00	0.00	10,277.56	6.08	10.20	0.00
4.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS	6,089.58	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.58	5.14	10.80	0.00
5.00	CONCRETO SIMPLE	23,300.80	19.67	23,300.80	0.10	0.00	0.00	23,300.80	19.67	10.80	0.00
6.00	CONCRETO ARMADO	71,990.78	33.53	39,719.81	29.47	0.00	0.00	71,990.78	33.53	0.00	0.00
COSTO DIRECTO		118,471.81	0.00	82,154.78	29.81	38,318.30	100.00	118,471.81	100.00	0.00	0.00
GASTOS GENERALES		8,755.09		2,693.87		8,755.09		8,755.09		-	
UTILIDAD		7,104.29				3,118.09		7,104.29		-	
SUB TOTAL		134,331.27				43,048.15		134,331.27		-	
I.G.V. (18%)		24,180.17				7,208.15		24,180.17		-	
VALOR REFERENCIAL		59				59		59		59	
RESUMEN DE PAGO - VALORIZACIÓN 03											

RESUMEN DE PAGO VALORIZACION 03

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL VALORIZADO
I.G.V. 18%
TOTAL

59 30,518.36
59 2,496.87
59 2,118.98
59 40,048.10
59 7,208.15
59 47,253.38

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 28710 SOLES

CONSORCIO EL SAUCE
ING. Camacho
ING. Camacho Campos Salceda
REPRESENTANTE LEGAL

OTELI JORDY INGENIERO DEL P.V.
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
Nº 110-198

ING. César Chirva Sarmiento
RESIDENTE DE OBRA
CP 32083

CONSORCIO EL SAUCE



SENASA PERU



000028

4. VALORIZACION


Ing. Cesar Chavez Salmeron
RESIDENTE DE OSHA
CRAPSO
CONSORCIO EL SAUCE

CONSORCIO EL SAUCE

Mr. Emperatriz Campos Saldana
REPRESENTANTE LEGAL



CONSORCIO
EL SAUCE

VALORIZACIÓN MENSUAL N° 02 DEL ADICIONAL N° 02

ENTIDAD: PROCESA - SEMASA
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BANDOS DEL INCA - CARAMARCA"
CONTRATISTA: CONSORCIO EL SAUCE
RESIDENTE DE OBRA: ING. CESAR AUGUSTO CHAVEZ SARMIENTO
GERENTE DE OBRA: ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

PERIODO:

Item	Descripción	UND	METRADO	PRECIO UNITARIO	SUMA TOTAL	COSTO TOTAL	VALORIZACIÓN ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
							METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
01	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO DE ALBANELERIA				118.471.01	118.471.01						
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES											
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES											
01.01.01.01	FILETE TERRESTRE	m	0.19	1,600.00	307.80	307.80	0.19	153.90	50.00%	0.19	307.80	100.00%
01.01.01.02	AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN	m ³	1.50	498.00	729.00	729.00	1.50	428.60	98.52%	1.50	729.00	100.00%
01.01.02	OBRAS PRELIMINARES				468.55							
01.01.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO (TODA EL AREA)	m ²	74.97	4.20	314.87	314.87	-	-	0.00%	74.97	314.87	100.00%
01.01.02.02	TRAZO Y REPLANTIO PRELIMINAR	m ²	74.97	2.00	150.00	150.00	-	-	0.00%	74.97	150.00	100.00%
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				6.216.64							
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				6.216.64							
01.02.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECTACIÓN DE OBRA	m ²	1.50	1,986.25	2,979.38	2,979.38	0.00	1,747.90	58.67%	1.50	2,979.38	100.00%
01.02.01.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVAS POR COVID-19	SE	0.19	4,200.70	815.23	815.23	0.09	386.16	47.37%	0.19	815.23	100.00%
01.02.01.03	SEÑALIZACIÓN BÁSICA DE PREVENCIÓN	SE	0.19	672.84	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00%	0.19	127.84	100.00%
01.02.01.04	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19	m ²	1.00	540.00	540.00	540.00	0.00	403.95	58.67%	1.00	540.00	100.00%
01.02.01.05	GLINDOROS METÁLICOS PARA ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS INC. TAPAS	SE	0.19	248.19	47.16	47.16	0.09	22.34	47.36%	0.19	47.16	100.00%
01.02.01.06	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	SE	0.19	950.70	1,821.77	1,821.77	0.09	895.10	47.37%	0.19	1,821.77	100.00%
01.02.01.07	MANEJO CON CAPUCHA EN TELA TALLAN ENCOMENDADO RESISTENTE A LA LLEJA	UND	0.19	50.49	11.30	11.30	0.09	5.35	47.36%	0.19	11.30	100.00%
01.02.01.08	MASCARILLAS DE PROTECCIÓN	UND	0.19	31.97	6.07	6.07	0.09	2.88	47.40%	0.19	6.07	100.00%
01.02.01.09	PROTECTOR FACIAL DE PVC VINIFAN	UND	0.19	5.49	1.03	1.03	0.09	0.49	47.10%	0.19	1.03	100.00%
01.02.01.10	RESPIRADOR DE SILICONA CON FILTROS SEGUN ESPECIFICACIONES	UND	0.19	170.24	32.35	32.35	0.00	15.32	47.36%	0.19	32.35	100.00%
01.02.01.11	ALCOHOL LÍQUIDO PURO 80% DE 1000ML	UND	0.19	19.47	3.13	3.13	0.09	1.48	47.36%	0.19	3.13	100.00%
01.02.01.12	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 MOLECULARES DE DESCARTE	UND	0.19	194.90	37.03	37.03	0.09	17.04	47.37%	0.19	37.03	100.00%
01.02.01.13	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 RAPIDAS DE DESCARTE	UND	0.19	50.24	9.55	9.55	0.09	4.53	47.36%	0.19	9.55	100.00%
01.03	DEMOLICIONES				10,277.56							
01.03.01	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m ³	48.50	137.85	7,340.78	7,340.78	-	-	0.00%	48.50	7,340.78	100.00%
01.03.02	ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIALES DE DEMOLICIÓN	m ³	69.76	43.10	2,936.78	2,936.78	-	-	0.00%	69.76	2,936.78	100.00%
01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				5,088.58							
01.04.01	NIVELACIÓN DE TERRENO	m ²	93.71	5.64	528.52	528.52	-	-	0.00%	93.71	528.52	100.00%
01.04.02	CORTE SUPERFICIAL MANUAL E=0.20M	m ²	37.48	3.72	139.44	139.44	-	-	0.00%	37.48	139.44	100.00%
01.04.03	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CEMENTO CORRIDO	m ³	54.70	34.00	1,859.80	1,859.80	-	-	0.00%	54.70	1,859.80	100.00%
01.04.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m ³	58.20	63.35	3,681.90	3,681.90	-	-	0.00%	58.20	3,681.90	100.00%
01.05	CONCRETO SIMPLE				23,300.00							
01.05.01	SOLADO a=0.10M C.H. 1:12	m ²	1.80	33.05	59.35	59.35	-	-	0.00%	1.80	59.35	100.00%
01.05.02	CONCRETO CIMENTOS CORRIDOS C/H 1:10 + 30% P.G.	m ³	59.61	217.40	12,958.21	12,958.21	-	-	0.00%	59.61	12,958.21	100.00%

CO. RES. DE INGENIERIA CIVIL
ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
CIP N° 114.466

CONSORCIO EL SAUCE
RESIDENTE DE OBRA
CIP 32363

RESIDENTE DE OBRA
CIP 32363

[illegible]Ministerio
de Agricultura y Fomento

SENASA — PERU

RICENTENARIO
DEBUT 2021



CONSORCIO DEL SAUCE
Camp
Ing. Emperatriz Campos Saldaña
REPRESENTANTE LEGAL

Water Alfredo Borello Ave
INGENIERO CIVIL
10 N. 114-00

ING. CESAR OLIVERA SERRANO
RESIDENTE DE OBRA
CUE-3270

00007

5. CURVA DE "S"

CONSORCIO EL SAUCE
Empresita
Ing. Empresita Campos Salazar
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
Ing. César Chávez Salas
RESIDENTE DE OBRAS
CIP 32383
CONSORCIO EL SAUCE

COLEGIO DE INGENIEROS DEL
[Signature]
Valter Alfredo Borda Ruiz
INGENIERO CIVIL
N° 114-98



CONSORCIO
EL SAUCE

CURVA "S" - DE AVANCE DE OBRA VALORIZACION N° 02-ADICIONAL N° 02

PRODESA - SENASA

"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES BANDOS DEL INCA - CAJAMARCA"

CONTRATO DE OBRAS N° 008 2021 SENASA PRODESA FASE II

CONSORCIO EL SAUCE

ING. CESAR AUGUSTO CHAVEZ SARMENTO

ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA


PRESUPUESTO CONTRATADO

135 514.44

PERIODO:

DEL 01/04/2022 AL 29/04/2022

PROGRAMADO VS. EJECUTADO

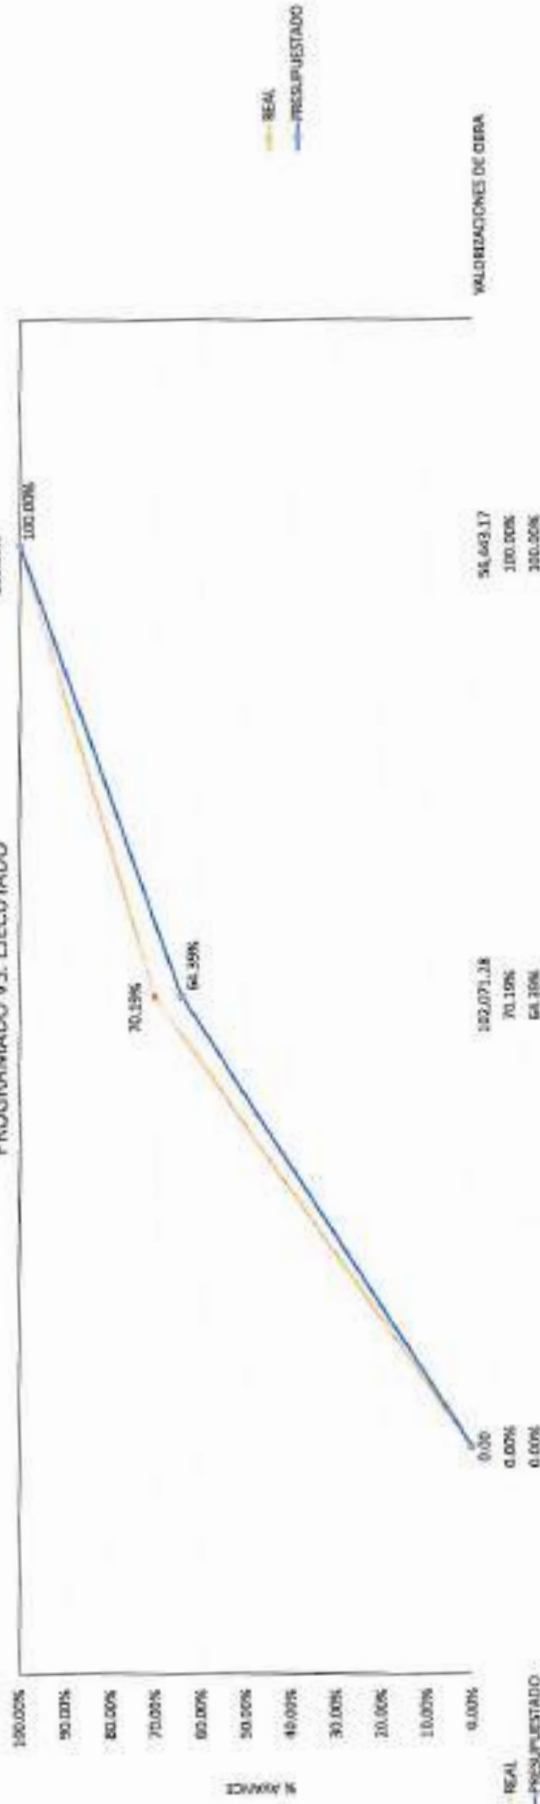

MONEDAS VALORIZACIONES PROGRAMADAS				
MES	MONEDAS (MIL/USD)		PORCENTAJES	
	PORCENTAJE	MONEDAS	PORCENTAJE	MONEDAS
ABRIL 2022	0.00%	0.00	0.00%	0.00
MAYO 2022	30.15%	40,911.16	30.15%	40,911.16
JUNIO 2022	64.59%	84,722.28	64.59%	84,722.28
TOTAL	100.00%	125,633.44	100.00%	125,633.44

MONEDAS VALORIZACIONES EJECUTADAS				
MES	MONEDAS (MIL/USD)		PORCENTAJES	
	PORCENTAJE	MONEDAS	PORCENTAJE	MONEDAS
ABRIL 2022	0.00%	0.00	0.00%	0.00
MAYO 2022	30.15%	40,911.16	30.15%	40,911.16
JUNIO 2022	64.59%	84,722.28	64.59%	84,722.28
TOTAL	100.00%	125,633.44	100.00%	125,633.44



SENASA
PERU

CONSORCIO EL SAUCE
Ing. Empedrado Campos Salazar
REPRESENTANTE LEGAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Ing. Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
N° 11.11.11



CONSORCIO EL SAUCE

000023

6. RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES

CONSORCIO EL SAUCE
Empresario
ING. Empressa Empressa Saldana
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
CONSORCIO EL SAUCE

COLEGIO DE INGENIEROS
[Signature]
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114-98



**CONSORCIO
EL SAUCE**

RESUMEN DE VALORIZACIONES	
ENTIDAD	PRODESA - SENASA
CONTRATO	CONTRATO DE OBRAS N° 038-2021 SENASA-PRODESA FASE II
OBRA	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CALAMARCA"
CONTRATISTA	CONSORCIO EL SAUCE
RESIDENTE DE OBRA	ING. CESAR AUGUSTO CHAVEZ SARMIENTO
SUPERVISOR DE OBRA	ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
PRESUPUESTO CONTRATADO CON IGV	S/ 158,514.44

ITEM	DESCRIPCION	PERIODO	MONTOS (Incl IGV)		AVANCE %		SALDO	
			PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL
1.00	VALORIZACION N° 01	DEL 04/03/2022 AL 31/03/2022	S/ 111,261.18	S/ 111,261.18	70.18%	70.18%	S/ 47,253.28	28.81%
2.00	VALORIZACION N° 02	DEL 01/04/2022 AL 29/04/2022	S/ 47,253.28	S/ 158,514.44	28.81%	100.00%	S/ 0.00	100.00%

CONSORCIO EL SAUCE
Campos
ING. Emperatriz Campos Saldaña
REPRESENTANTE LEGAL

OFICINA DE INGENIERIA DEL P.I.
Walter Botello
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
C.O. N° 111 - 95

Ing. César Chávez Sarmiento
ING. César Chávez Sarmiento
RESIDENTE DE OBRA
CP 32383
CONSORCIO EL SAUCE



**SENASA
— PERU**



BICENTENARIO
PERU 2023

060021

7. RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS – PLANILLA DE METRADOS

CONSORCIO EL SAUCE
Emperatriz
Ing. Emperatriz Campos Sakiana
REPRESENTANTE LEGAL

César
Ing. César Chávez Sacristán
RESIDENTE DE OBRA
CH-32963
CONSORCIO EL SAUCE

COLEGIO DE INGENIEROS DEL
Walter
Walter Alfredo Borelio Aysa
INGENIERO CIVIL
"ID N° 11" - 48

ADICIONAL 02 - EVENTO COMPENSABLE

RESÚMEN DE METRADOS

Proyecto: "Construcción de cerco perimétrico".

Propietario: SENASA

Fecha: 2022

Ubicación: Baños del Inca

Provincia: Cajamarca

Region: Cajamarca

CERCO PERIMÉTRICO DE ALBANILERIA

ITEM	PARTIDA	UND	TOTAL
1.00.	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA		
1.01.00.00	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES		
01.01.01.01	FLETE TERRESTRE	GLB	0.10
01.01.01.02	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	MES	0.88
1.01.02	OBRAS PRELIMINARES		
01.01.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO (TODA EL AREA)	M2	
01.01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	
01.02	SEGURIDAD Y SALUD		
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OBRA	mes	0.88
01.02.01.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVAS POR COVID 19	glb	0.09
01.02.01.03	SEÑALIZACION BASICA DE PREVENCION CONTRA EL CONTAGIO AL COVID 19	glb	0.09
01.02.01.04	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA	mes	0.88
01.02.01.05	CILINDROS METALICOS PARA ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	0.09
01.02.01.06	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	0.09
01.02.01.07	MAMELUCO CON CAPUCHA EN TELA TASLAN ENGOMADO RESISTENTE	und	0.09
01.02.01.08	MASCARILLAS DE PROTECCION	und	0.09
01.02.01.09	PROTECTOR FACIAL DE PVC VINIFAN	und	0.09
01.02.01.10	RESPIRADOR DE SILICONA CON FILTROS SEGÚN ESPECIFICACIONES	und	0.09
01.02.01.11	ALCOHOL LIQUIDO PURO 96° DE 1000ML	und	0.09
01.02.01.12	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 MOLECULARES DE DESCARTE	und	0.09
01.02.01.13	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 RAPIDAS DE DESCARTE	und	0.09
1.03.00.00	DEMOLICIONES		
1.03.01.00	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	
1.03.02.00	ELIMINACIÓN Y LIMP. DE MAT. DE DEMOLICIÓN	M3	
1.04.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.04.01	NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	
01.04.02	CORTE SUPERFICIAL MANUAL E=0.20M	M3	
01.04.03	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTO CORRIDO	M3	
01.04.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	
01.05	CONCRETO SIMPLE		
1.05.01.00	SOLADOS e=0.10 m. C.H. 1:12	M3	
1.05.02.00	CIMIENTO CORRIDO C.H = 1:10 + 30% P.G.	M3	
1.05.03.00	CIMIENTO CORRIDO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	
1.06.00.00	CONCRETO ARMADO		
1.06.01.00	SOBRECIMIENTO ARMADO		
1.06.01.01	SOBRECIMIENTO ARMADO-CONCRETO $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$	M3	
1.06.01.02	SOBRECIMIENTO ARMADO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	
1.06.01.03	SOBRECIMIENTO ARMADO-ACERO $FY=4,200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	KG	
1.06.01.04	TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO	M2	
1.06.02.00	COLUMNAS		
1.06.02.01	COLUMNAS - CONCRETO $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$	M3	14.13
1.06.02.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	169.58
1.06.02.03	COLUMNAS - ACERO $FY=4,200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	KG	
1.06.03.00	VIGAS		
1.06.03.01	VIGAS DE AMARRE - CONCRETO $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$	M3	3.77
1.06.03.02	VIGAS DE AMARRE - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	100.65
1.06.03.03	VIGAS DE AMARRE - ACERO $FY=4,200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	KG	511.06

CONSEJO DE SALUD
 Ing. Comunalis Campos Salazar
 REPRESENTANTE LEGAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
 Ing. Alvaro Rojas Alva
 INGENIERO CIVIL

CONSEJO DE SALUD
 Ing. Comunalis Campos Salazar
 REPRESENTANTE LEGAL

PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURAS

Proyecto: "Construcción de cerco perimetrico".

Propietario SENASA

Fecha :

2022

Ubicación : Baños del Inca

Provincia: Cajamarca

Region: Cajamarca

CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA

ITEM	PARTIDA	UND	CANTIDAD	Nº de Veces	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTURA		
01.02	SEGURIDAD Y SALUD								
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
01.02.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OBRA	mes	0.88					0.88	0.88
01.02.01.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVAS POR COVID 19	gb	0.09					0.09	0.09
01.02.01.03	SEÑALIZACION BASICA DE PREVENCIÓN CONTRA EL CONTAGIO AL COVID	gb	0.09					0.09	0.09
01.02.01.04	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA	mes	0.88					0.88	0.88
01.02.01.05	CILINDROS METALICOS PARA ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS	gb	0.09					0.09	0.09
01.02.01.06	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	gb	0.09					0.09	0.09
01.02.01.07	MAMELUCO CON CAPUCHA EN TELA TASLAN ENGOMADO RESISTENTE A	und	0.09					0.09	0.09
01.02.01.08	MASCARILLAS DE PROTECCION	und	0.09					0.09	0.09
01.02.01.09	PROTECTOR FACIAL DE PVC VINIFAN	und	0.09					0.09	0.09
01.02.01.10	RESPIRADOR DE SILICONA CON FILTROS SEGÚN ESPECIFICACIONES	und	0.09					0.09	0.09
01.02.01.11	ALCOHOL LIQUIDO PURO 96° DE 1000ML	und	0.09					0.09	0.09
01.02.01.12	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 MOLECULARES DE DESCARTE	und	0.09					0.09	0.09
01.02.01.13	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 RAPIDAS DE DESCARTE	und	0.09					0.09	0.09
1.06.01	CONCRETO ARMADO								
1.06.01.04	TARAJEO DE SOBRECIMIENTO	M2							39.56
	Eje X-X		1.00	2.00	47.81		0.20	19.12	
	EJE Y-Y		1.00	2.00	51.10		0.20	20.44	
1.06.02	COLUMNAS								
1.06.02.01	COLUMNAS - CONCRETO Fc= 210 kg/cm2	M3							14.13
	C1- 25X25 CERCO PERIMETRICO		38.00	1.00	0.25	0.25	5.95	14.13	
1.06.02.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2							169.58
	C1- 25X25 CERCO PERIMETRICO		38.00	1.00	0.75		5.95	169.58	
1.06.03	VIGAS								
1.06.03.01	VIGAS DE AMARRE - CONCRETO Fc= 175 kg/cm2	M3							3.77
	C1- 15X25 CERCO PERIMETRICO EJE X-X								
	TRAMO 01		3.00	1.00	3.00	0.15	0.25	0.34	
	TRAMO 02		3.00	1.00	3.00	0.15	0.25	0.34	
	TRAMO 03		3.00	1.00	3.00	0.15	0.25	0.34	
	TRAMO 04		3.00	1.00	3.00	0.15	0.25	0.34	
	TRAMO 05		3.00	1.00	3.00	0.15	0.25	0.34	
			1.00	1.00	1.45	0.15	0.25	0.05	
	C1- 15X25 CERCO PERIMETRICO EJE Y-Y								
	TRAMO 01		16.00	1.00	3.00	0.15	0.25	1.80	
	TRAMO 02		1.00	1.00	3.90	0.15	0.25	0.15	
	TRAMO 03		1.00	1.00	2.30	0.15	0.25	0.08	
1.06.03.02	VIGAS DE AMARRE - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2							100.65
	C1- 15X25 CERCO PERIMETRICO EJE X-X								
	TRAMO 01		3.00	2.00	3.00		0.50	9.00	
	TRAMO 02		3.00	2.00	3.00		0.50	9.00	
	TRAMO 03		3.00	2.00	3.00		0.50	9.00	
	TRAMO 04		3.00	2.00	3.00		0.50	9.00	
	TRAMO 05		3.00	2.00	3.00		0.50	9.00	
	TRAMO 06		1.00	2.00	1.45		0.50	1.45	
	C1- 15X25 CERCO PERIMETRICO EJE Y-Y								
	TRAMO 01		16.00	2.00	3.00		0.50	48.00	
	TRAMO 02		1.00	2.00	3.90		0.50	3.90	
	TRAMO 03		1.00	2.00	2.30		0.50	2.30	
1.06.03.03	VIGAS DE AMARRE - ACERO FY=4,200 kg/cm2 GRADO 60	M3							511.04

CONSORCIO EL SAUCE

Ing. Emperatriz Camacho Saldaña
REPRESENTANTE LEGAL

COLABORADOR INGENIERO DEL PEU

Ing. Wilber Alvarado Bonillo Alva
INGENIERO CIVIL
Nº 11- 09Ing. César Chávez Cevallos
RESIDENTE

CONSORCIO

PLANILLA DE METRADOS - OBRAS PROVISIONALES

660017

Proyecto: "Construcción de cerco perimétrico".

Propietario : SENASA

Fecha :

2022

Ubicación : Baños del Inca

Provincia: Cajamarca

Region: Cajamarca

OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA

ITEM	PARTIDA	UND	CANTIDAD	N° de Veces	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTURA		
1.00.00	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA								
1.01.00	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES								
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES								
01.01.01.01	FLETE TERRESTRE	GLB	0.10						0.10
01.01.01.02	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	MES	0.88						0.88

CONSORCIO EL SAUCE
Ing. Emparenta Campos Saldaña
REPRESENTANTE LEGAL

MIS. César Chávez S. S. M. M. M.
RESIDENTE DE OBRA
CIP 32363
CONSORCIO EL SAUCE

ING. WALTER ALFREDO BOTOSO ALVA
INGENIERO CIVIL
N° 11. 48

8. SITUACION DE LA OBRA

CONSORCIO EL SAUCE

Ing. Emperatriz Campos Saldaña
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. César Chávez Sarmiento
RESIDENTE DE OBRA
GP-32343
CONSORCIO EL SAUCE

 COLECCIÓN INGENIERO DEL P.O.


Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
Nº 5.1. 198

98.- SITUACION DE LA OBRA

De la curva "S" se pueden apreciar los datos siguientes:

% de Avance programado al mes	35.61%
% de Avance ejecutado al mes	100.00%
% de Avance programado acumulado	100.00%
% de Avance ejecutado acumulado	100.00%

Por lo tanto, se indica que la obra se encuentra culminada. 0.00%

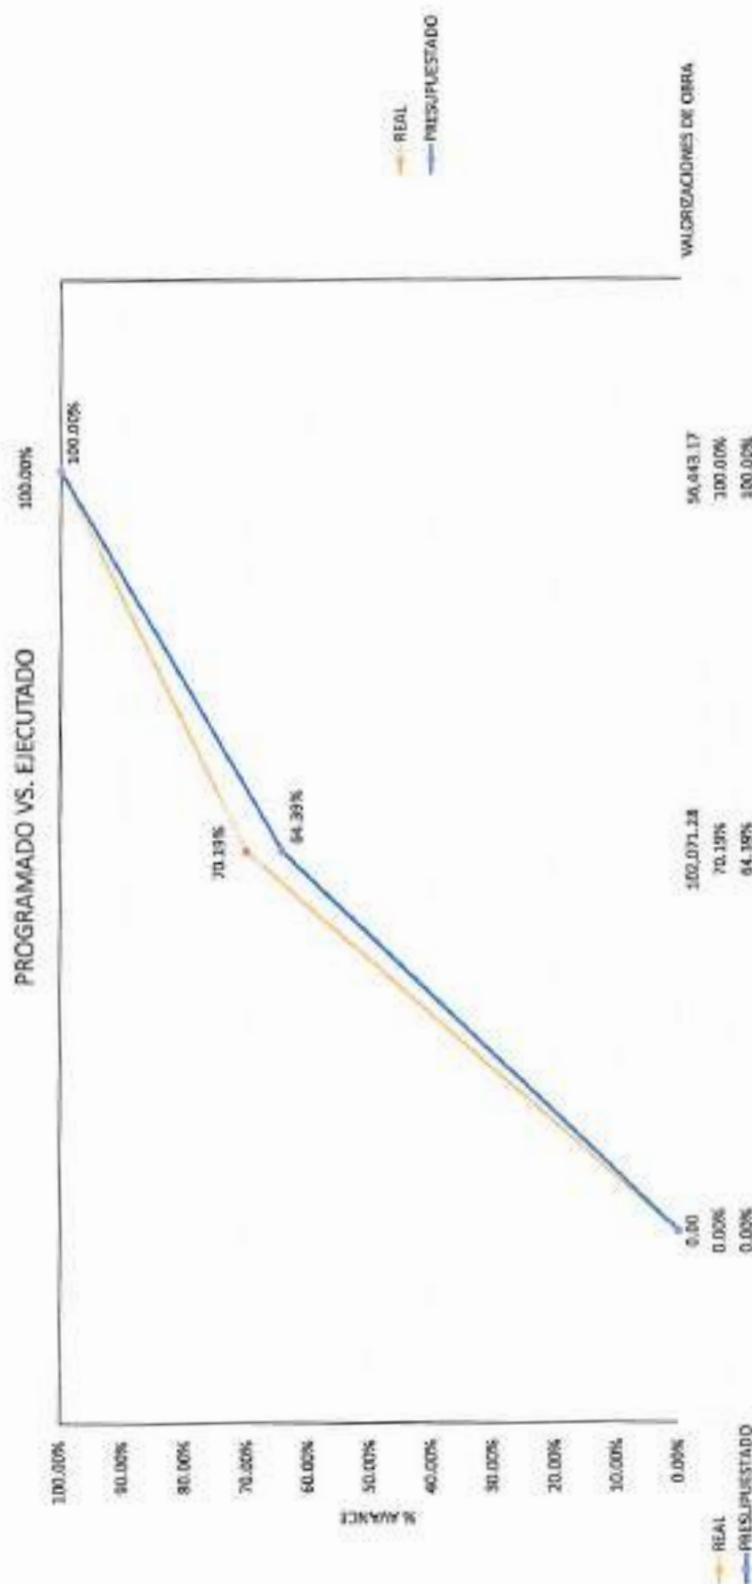

CONSORCIO EL SAUCE
Ing. Edgar Cárdenas Salazar
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Alfonso Rodríguez del Real
Ing. Alfredo Rodríguez Alva
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Oscar Guzmán
RESIDENTE DE OBRA
CIP 1283
CONSORCIO EL SAUCE

060014

9. CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO

CONSORCIO EL SAUCE

Ing. Emperador Campos Saldana
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Cesar Chavez Samiento
RESIDENTE DE OBRA
CIP 32369
CONSORCIO EL SAUCE

 CONSEJO DE INGENIEROS DE GUATEMALA

Ing. Alfredo Botello Aysa
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114666

CONSORCIO EL SAUCE

CRONOGRAMA VALORIZADO - ADICIONAL N° 02

Proyecto: ADICIONAL N° 02
Fecha: Cajamarca, 07 Marzo 2022
Cliente: SENASA
Lugar: BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA - CAJAMARCA

EDT	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO P.	2022					TOTAL
						4-0-22	1-0-22	2-0-22	3-0-22	4-0-22	
1	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA INCLUYENDO PARTIDAS CONTRACTUALES				118,471.81						
1.1	1.1.1 OBRAS PRELIMINARES	m ²	1,038.84								
1.1	1.1.2 FLITE TIERRERES	m ²	307.85								
1.2	1.2.1 AGUA PARA LA CONSTRUCCION	m ³	1,020.96								
1.2	1.2.2 OBRAS PRELIMINARES	m ²	480.83								
1.3	1.3.1 LIMPIEZA DEL TERRENO (TODA EL AREA)	m ²	74.37	4.30							
1.3	1.3.2 TRAZO Y REPLANTO PRELIMINAR	m ²	74.37	2.55							
1.4	1.4.1 TRABAJOS PRELIMINARES	m ²	5,216.84								
1.4	1.4.2 LIMPIEZA Y DESMONTAJE DE OBRA	m ²	6,216.84								
1.5	1.5.1 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA POR COVID 19	m ²	2,909.38								
1.5	1.5.2 SEÑALIZACION BASICA DE PREVENCIÓN CONTRA EL CONTAGIO AL COVID 19	m ²	815.23								
1.5	1.5.3 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	m ²	127.84								
1.5	1.5.4 GUARDOS METALICOS PARA APOYO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS	m ²	831.88								
1.5	1.5.5 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	m ²	47.16								
1.5	1.5.6 MANEJO CON CAPUCHA EN TELA TALLER ENCONTRANDO RESISTENTE A LA LARVA	m ²	6,894.35								
1.5	1.5.7 MASCARILLAS DE PROTECCION	m ²	11.30								
1.5	1.5.8 PROTECTOR FACIAL DE PVC VERDEAN	m ²	31.87								
1.5	1.5.9 RESERVOIRIO DE DILUION CON FILTROS SEGUN ESPECIFICACIONES	m ²	1.03								
1.5	1.5.10 ALICATORIO LIQUIDO PLUMBO PINTO 1838ML	m ²	170.24								
1.5	1.5.11 KIT DE PHUBA SAGE COVID 19 MOLICULARES DE DESGASTE	m ²	18.47								
1.5	1.5.12 KIT DE PHUBA SAGE COVID 19 MOLICULARES DE DESGASTE	m ²	34.08								
1.5	1.5.13 KIT DE PHUBA SAGE COVID 19 RAPIDOS DE DESGASTE	m ²	54.34								
1.6	1.6.1 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m ³	18,377.86								
1.6	1.6.2 ELIMINACION Y LIMPIEZA DE MATERIALES DE DEMOLICION	m ³	7,340.78								
1.7	1.7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS	m ³	2,535.78								
1.7	1.7.2 REVELACION DE TERRENO	m ²	6,888.83								
1.7	1.7.3 CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN 1/20M	m ²	528.53								
1.7	1.7.4 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m ³	138.44								
1.7	1.7.5 ESCORIFICACION MANUAL PARA CEMENTO CONCRETO	m ³	1,839.30								
1.7	1.7.6 CONCRETO SIMPLE	m ³	3,591.82								
1.7	1.7.7 SOLADO en 0.10M C/a, 1/2	m ³	20,306.86								
1.7	1.7.8 CONCRETO CEMENTOS CONCRETO C-H 1/10 + 20% P.O.	m ³	31.05								
1.7	1.7.9 CEMENTO CORRIDO - ENCONTRADO Y DESMONTADO	m ³	217.42								
1.7	1.7.10 CONCRETO ARMADO	m ³	34.89								
1.7	1.7.11 SOBRE CEMENTO ARMADO - CONCRETO Fc=215 MPa	m ³	375.27								
1.7	1.7.12 SOBRE CEMENTO ARMADO - ENCONTRADO Y DESMONTADO NORMAL	m ³	208.48								
1.7	1.7.13 SOBRE CEMENTO ARMADO - ACERO Fy= 4200 MPa	m ³	1787.83								
1.7	1.7.14 TALLADO DE SOBRECIMENTOS	m ³	28.93								

CONSORCIO EL SAUCE
Ing. Emperatriz Córdova Saldarriaga
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO DE INGENIEROS EL SAUCE
Ing. Alfredo Balleza
INGENIERO EN CIVIL
CIP N° 11.48

Ing. Javier Samaniego
PRESIDENTE DE OURA
CIP 32963

EDF	DESCRIPCION	UNIDAD CANTIDAD PRECIO P. MEDIO P.					MAYO					ABRIL				
		4.02	5.03	20.32	17.32	5.02	5.03	20.32	17.32	5.02	5.03	18.02	17.02	24.02	24.02	24.02
1.2.2	COLUMNAS	35,338.43					11892.85					10945.81				
1.2.2.1	COLUMNAS - CONCRETO Fc=210 kg/cm ²	17.88	515.83									5084.19				
1.2.2.2	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESMOLDADO NORMAL	214.28	88.89									4143.41				
1.2.2.3	COLUMNAS - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	2489.43	4.70				11892.85					9459.19				
1.2.3	VIGAS											8410				
1.2.3.1	VIGAS DE ALUMBRE - CONCRETO Fc=170 kg/cm ²	5.71	287.31									87.40				
1.2.3.2	VIGAS DE ALUMBRE - ENCOFRADO Y DESMOLDADO NORMAL	130.05	79.87									5186.28				
1.2.3.3	VIGAS DE ALUMBRE - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	1987.78	4.70									1151.29				
COSTO DIRECTO (C1)		110,071.63	13,294.22				21,353.33					16,183.13				
GASTOS DE SERVICIOS (C2) 8.3%		9,136.61	801.23				3,316.38					1,382.28				
UTILIDADES (C3) 7.25%		7,918.34	707.87				3,819.88					1,122.31				
Sub Total (C1+C2+C3)		124,924.43	18,803.33				28,492.47					21,493.38				
I.V.T (19%)		24,160.17	3,571.4				5,403.37					3,853.51				
COSTO DE OBRAS		148,956.55	22,374.74				33,895.83					25,346.89				
PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL		11.41%	20.36%	19.19%	8.81%	15.73%	64.28%	65.19%	64.16%	15.35%	18.35%	18.84%	18.84%	18.84%	18.84%	18.84%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO		11.41%	33.21%	52.35%	73.85%	89.58%	98.16%	98.16%	98.16%	98.16%	98.16%	98.16%	98.16%	98.16%	98.16%	98.16%

Ing. César Quiroga Samartino
RESIDENTE DE OBRAS
CIP 28763
CONSORCIO EL SAUCE

CONSORCIO EL SAUCE
Ing. Emperatriz Campos Salas
REPRESENTANTE LEGAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL CHILE
Ing. Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 11. 49

10. VIGENCIA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CONSORCIO EL SAUCE


Ing. Emperatriz Campos Saldaña
REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Cesar Chavez Salcedo
RESIDENTE EN EL PAIS

CONSORCIO EL SAUCE


Walter Alfredo Bivello Noya
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 11. 14

BEC LIMA 1
AV. REPUBLICA DE PANAMA 3055
SAN ISIDRO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA
CEYCA SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCIO

PRESENTE.-

SAN ISIDRO, 24-02-2022
CARTA FIANZA N°: 0011-0436-9900005777-32
VENCE EL: 30-06-2022

Señor/es:

PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA

Presente.-

De nuestra consideración:

Por la presente afianzamos ante Ud./s. al/a los señor/es CONSORCIO EL SAUCE (CEYCA SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCION SAC Y QIAN BEI S.R.L) en forma solidaria, irrevocable, incondicionada y de realización automática y sin beneficio de excusión, hasta por la suma de S/15,851.45(QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 45/100 SOLES) a fin de garantizar el fiel cumplimiento del ADICIONAL N°02 DEL CONTRATO COMPARACION DE PRECIOS N°05-2021-SENASA/PRODESA - "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA,CAJAMARCA", en caso de incumplimiento de nuestro afianzado.

Esta fianza que en ningún caso y por ningún concepto excederá al monto señalado en el párrafo anterior, regirá desde el 24-02-2022 hasta el 30-06-2022, luego de lo cual el Banco quedará liberado de toda responsabilidad.

El requerimiento de pago de la presente fianza deberá de realizarse necesariamente por conducto notarial en un plazo que no deberá exceder del previsto en el artículo 1898 del Código Civil, en la dirección abajo indicada y dentro del horario de atención que tenga establecido el Banco, señalándose obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total al que asciende la presente garantía. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe, se entenderá que Uds. renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago aún cuando el plazo de vencimiento y/o ejecución de esta fianza no hubieren vencido.

De haberse otorgado la presente carta fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutarla indistintamente, los términos de requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición.

El pago será efectuado de conformidad con lo expresamente establecido en los párrafos precedentes.

La presente fianza no garantiza operaciones de mutuo dinerario, salvo lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 217 de la Ley 26702.

Américo Dalia Malabrigo Ramirez
Ejecutivo Banca Negocios
Oficina Cajamarca

Marcelino Jara Paredillo
Sub Gerente Oficina
Oficina Cajamarca

CONSORCIO EL SAUCE
Ing. Emperatriz Campos Saldaña
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EL SAUCE

COLEGEIO DE INGENIEROS DEL PERU
Ing. Alfredo Britez Arellano
INGENIERO CIVIL
D.N. 115018 - VI - Febrero 2021



22022414

RUC 20100130204

REFRENDO: 2106622022414CCY0436@/18:25:31
S/ 15,851.45

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO BBVABE LLAMAR AL TELEFONO 085-1300 opción 8

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de Ud./s.

Atentamente,


BANCO BBVA PERÚ
p.p.

Dirección donde debe ser requerido su pago BEC LIMA 1 ubicado en AV. REPUBLICA DE PANAMA 3055 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro


Amparo Della Malsbriga Ramirez
Ejecutiva Banca Negocios
Oficina Cajamarca


Marcelino Jara Penadillo
Sub Gerente Oficina
Oficina Cajamarca

CONSORCIO EL SAUCE


Ing. Emperatriz Campos Saldaña
REPRESENTANTE LEGAL


Walter Alfredo Sotillo Riva
INGENIERO CIVIL
N° 11. 48



RUC 20100130204

REFRENDO: 2108922022414CCY0438@/18:25:31
S/ 15,851.45

UAG11 - VS - Petros 2021

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO BIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 096-1200 ap0012

11. PANEL FOTOGRAFICO

CONSORCIO EL SAUCE

Ing. Emperatriz Campos Saldana
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Cesar Chavez S. M. M. T.
RESIDENTE DE OBRA
CIP 32343
CONSORCIO EL SAUCE



Victor Alfredo Botello Rivas
INGENIERO CIVIL
CIP N° 11- 88

PANEL FOTOGRÁFICO – ADICIONAL N° 02



FOTO N° 01: Muro perimétrico terminado, vista posterior.



FOTO N° 02: Muro perimétrico, vista interior en proceso de tarrajeo.

CONSORCIO EL SAUCE
 Ing. Emperatriz Carrizosa Saldaña
 REPRESENTANTE LEGAL

Ing. César Chávez Samudio
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP 32293
 CONSORCIO EL SAUCE

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 Walter Alfredo Botello Alva
 INGENIERO CIVIL
 N° 114 108



FOTO N° 03: Imprimación de muro perimétrico, segunda mano.




FOTO N° 04: Pintado de muro perimétrico, segunda mano.

CONSORCIO EL SALUCE
Ing. Emperatriz Campos Saldana
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Cesar Javier Sarmiento
RESOLUCIÓN N° 0004
DE 2013
CONSORCIO EL SALUCE

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Borella Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114-28

12. ADENDA

CONSORCIO EL SAUCE

Ing. Emparino Campos Saldana
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Cesar Chavez Samaniego
RESIDENTE DE OBRA
CIP-3202
CONSORCIO EL SAUCE


Walter Alfredo Boreto Ruiz
INGENIERO CIVIL
ID N° 114 48



PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SANIDAD AGRARIA Y LA INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA FASE II

ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE OBRAS N° 038-2021-SENASA-
PRODESA FASE II

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS
DEL INCA – CAJAMARCA

Conste por el presente documento, la Adenda N° 04 al Contrato de Obras N° 038-2021-SENASA-PRODESA FASE II, derivada del procedimiento por Comparación de Precios CP N° 005-2021-SENASA/PRODESA, contratación para la "Construcción del centro de operaciones Baños del Inca – Cajamarca", que de una parte celebra la Unidad Ejecutora 002: Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria, que ejecutará el Programa Desarrollo de la Sanidad Agraria y la Inocuidad Agroalimentaria - Fase II, del Pliego 160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria, con RUC N° 20414251561, con domicilio legal en Av. La Molina 1915, distrito La Molina, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su titular Jefe **JORGE ANTONIO MANRIQUE LINARES**, identificado con DNI N° 29416214, designado mediante Resolución Jefatural N° 0180-2019-MINAGRI-SENASA, publicada el 12 de diciembre de 2019, a quien en adelante se le denominará "el comprador", y; de la otra parte, el **CONSORCIO EL SAUCE**, integrado por la Empresa **CEYCA SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.** con RUC N° 20311227913, debidamente representada por su Gerente General, **GLADIS EMPERATRIZ CAMPOS SALDAÑA**, identificada con DNI N° 26629387, según poder y facultades inscrito en el Asiento N° B00004 de la Partida Electrónica N° 11000919, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Cajamarca; y la Empresa **QIAN BEI S.R.L.** con RUC N° 20496159811, debidamente representado por su Gerente General, **NELLY LUCELINA MENDOZA DE LA CRUZ**, identificada con DNI N° 45489995, según poder y facultades inscrito en el Asiento N° C00001 de la Partida Electrónica N° 11098789, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Cajamarca. El **CONSORCIO EL SAUCE** designa como Representante legal común a **GLADIS EMPERATRIZ CAMPOS SALDAÑA**, identificada con DNI N° 26629387, señalando como domicilio legal común sito en Jr. Delfín Cerna N° 457- Cajamarca, según Contrato de Consorcio, suscrito por los representantes legales de las Empresas; a quien en adelante se le denominará "el Contratista".



CONSORCIO EL SAUCE
GLADIS EMPERATRIZ CAMPOS SALDAÑA
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 19 de julio de 2021, El Comprador y El Contratista suscribieron el Contrato de Obras N° 038-2021-SENASA-PRODESA FASE II, para la "Construcción del Centro de Operaciones Baños del Inca – Cajamarca", derivado de la Comparación de Precios CP N° 005-2021-SENASA/PRODESA, por la suma de S/ 4'143 521.37 (Cuatro millones ciento

CONSORCIO EL SAUCE

GLADIS EMPERATRIZ CAMPOS SALDAÑA
REPRESENTANTE LEGAL

PODERADO DEL PERU
Ing. Alfredo Boteño Alva
INGENIERO CIVIL
D N° 11

CONSORCIO EL SAUCE



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoSENASA
PERU**CLAUSULA TERCERA.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

El Contratista entrega la respectiva garantía de forma solidaria, Irrevocable, Incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, a favor de El Comprador, por el concepto, monto y vigencia siguiente:

- Garantía de Fiel Cumplimiento de los costos adicionales N° 02 al Contrato; a través de la Carta Fianza N° 0011-0436-9800005777-32, de fecha 24 de febrero de 2022, por el importe de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 45/100 SOLES (S/ 15,851.45), emitido por la Entidad financiera BBVA - CONTINENTAL, cuya vigencia data hasta el 30 de junio de 2022.

CLAUSULA CUARTA.- VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO

Las demás cláusulas del Contrato primigenio, no han sido modificadas, por tanto mantienen su plena vigencia y eficacia legal.

En señal de conformidad de lo expresado, las partes extienden y suscriben, dos ejemplares de la presente adenda, en la ciudad de Lima, a los tres (03) días del mes de marzo del 2022.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SANIDAD AGROPECUARIA

Big. Jorge Antonio Manrique Linares
Jefe de PRODESA
Prestador BIO N° 4407/QC-PE

JORGE A. MANRIQUE LINARES
Jefe Unidad Ejecutora 002
COMPRADOR

CONSORCIO EL SAUCE
Ing. Emperatriz Campos Saldaña
REPRESENTANTE LEGAL

GLADIS EMERATRIZ CAMPOS SALDAÑA
CONSORCIO EL SAUCE
CONTRATISTA

Ing. César Trivez Saldivento
RESIDENTE DE OBRA
CIP 32363
CONSORCIO EL SAUCE

CONSORCIO EL SAUCE
Ing. Emperatriz Campos Saldaña
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Alfredo Bolo Alto
INGENIERO CIVIL
CIP N° 111 37
