

Lima, 06 de mayo del 2022

CARTA N°050-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA

Sr.:

Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria (PRODESA)
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
Av. La Molina N°1915 – La Molina – Lima – Lima

Asunto : VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°02.

Referencia : (a.) OBRA: "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE."

(b.) INFORME N°018-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA

(c.) CARTA N°074-2022-ATE.GG

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente, y a la vez mediante el presente, en concordancia con los documentos de la referencia, y en armonía al cumplimiento de las funciones del CONTRATO de Consultoría Individual de GERENTE DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE", para informar lo siguiente:

Que la Supervisión de Obra otorga CONFORMIDAD de la **VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°02**, ya que efectivamente fue revisada y es conforme al acuerdo estipulado en el Contrato de Ejecución de Obra (Adenda N°03), por lo tanto, remito adjunto el INFORME DE VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°02 (periodo del 14 al 30 de abril del 2022), para su trámite administrativo correspondiente, por lo que se recomienda cancelar al contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS el monto señalado en el cuadro resumen de valorización.

Así mismo, hago de conocimiento que la obra se encuentra con un AVANCE EJECUTADO ACUMULADO equivalente al 70.20%, frente a un AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO de 66.79%. En consecuencia, la obra se encuentra **ADELANTADA en 3.41%** en relación al CALENDARIO DE OBRA PROGRAMADO.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles las muestras de mi especial consideración.

Atentamente;


Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA
GERENTE DE OBRA

SE ADJUNTA:

. INFORME N°018-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA
. CARTA N°074-2022-ATE.GG

INFORME N°018-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA

A : Blg. JORGE ANTONIO MANRIQUE LINARES
Jefe de Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria (PRODESA)
Av. La Molina N°1915 - La Molina - Lima - Lima

DE : Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
GERENTE DE OBRA

ASUNTO : VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°02.

REFERENCIA : CARTA N°074-2022-ATE.GG

FECHA : Lima, 06 de mayo del 2022.

Mediante el presente me dirijo a usted en mi condición de GERENTE DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE", con la finalidad de remitir el INFORME DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°02, correspondiente al mes de ABRIL del 2022, periodo del 14.04.22 al 30.04.22 para lo cual se informa lo siguiente:

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar a la Entidad "Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria (PRODESA)", la VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°02 correspondiente al mes de ABRIL del 2022, elaborada por la supervisión y contratista, con los metrados conciliados y ejecutados en la obra, de acuerdo al Artículo 194 "Valorizaciones y metrados" del RLCE; para que se genere el pago correspondiente según CONTRATO DE OBRA N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II, la misma que se ejecuta bajo el sistema de contratación a suma alzada.

I. GENERALIDADES:

OBRA : "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE."

CODIGO UNICO DE INVERSIONES : 2344004

DISTRITO : ATE

PROVINCIA : LIMA

DEPARTAMENTO : LIMA

II. DATOS GENERALES:**2.1. INFORMACION DEL GERENTE DE OBRA**

GERENTE DE OBRA : JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA

RUC : 10700275260

CORREO ELECTRONICO : jefrainchavarriac@gmail.com

DOMICILIO LEGAL : Ca. Los Tulpanes Mz.B Lote05 - Pueblo Nuevo - Chapén - La Libertad.

TELEFONO CELULAR : 913452148

CONTRATO DE CONSULTOR : N°026 - 2021

FECHA DE CONTRATO : 01 de julio del 2021

INICIO DEL PLAZO : 05 de octubre del 2021

MONTO DEL CONTRATO : S/ 122,522.00 (Incluido IGV)

Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. C.O.N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

2.2. INFORMACION DEL CONTRATISTA

▪ Empresa Contratista	: CONSORCIO MULTIPROYECTOS
▪ Representante Común	: RAUL MONTERO LANDA LEON
▪ Domicilio Legal	: Ca. Luis Espejo N°849 Dpto. 201 – Urb. Santa Catalina –La Victoria –Lima.
▪ Contrato de Obra	: N°037-2021-SENASA-PRODESA
▪ RESIDENTE DE OBRA	: Ing. JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO Reg. CIP N° 159001
▪ ASISTENTE DE OBRA	: ING. HUMBERTO PALOMINO ROMERO, Reg. CIP N° 212189
▪ ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	: ING. EDA MIRLA RODRIGUEZ ACHO. Reg. CIP N° 230776

2.3. INFORMACION DE LA OBRA

▪ Fuente de Financiamiento	: CONTRATO DE PRÉSTAMO N°4457/OC-PE
▪ Sistema de Contratación	: COMPARACION DE PRECIOS
▪ Modalidad de Ejecución	: INDIRECTA A SUMA ALZADA
▪ Proceso	: CP N°003-2021-SENASA-PRODESA
▪ Contratista	: CONSORCIO MULTIPROYECTOS
▪ Plazo de Ejecución Base	: 180 DÍAS CALENDARIO
▪ Valor Referencial de la Obra	: S/ 2'321,219.90 (Incluido IGV)
▪ Monto de la Obra Contratado	: S/ 2'664,642.19 (Incluido IGV)
▪ ADENDA N°02	: 28 de marzo del 2022
▪ Deductivo de Obra N°01	: S/ 65,122.23 (Inc. IGV)
▪ Adicional de Obra N°01	: S/ 73,382.25 (Inc. IGV)
▪ Monto Contractual Modificado	: S/ 2'599,519.96 (Inc. IGV)
▪ ADENDA N°03	: 13 de abril del 2022
▪ Deductivo de Obra N°02	: S/ 84,047.80 (Inc. IGV)
▪ Adicional de Obra N°02	: S/ 212,950.49 (Inc. IGV)
▪ Monto Contractual Modificado	: S/ 2'515,472.16 (Inc. IGV)
▪ MONTO FINAL DE OBRA	: S/ 2'801,804.90 (Inc. IGV)
▪ Acta de Entrega de Terreno	: 21/09/2021
▪ Inicio del Plazo Contractual	: 05/10/2021
▪ Fin de Plazo Contractual Inicial	: 02/04/2022
▪ Suspensión de Plazo	: 20/01/2022
▪ Reinicio de Obra	: 24/01/2022
▪ Fin de Plazo Contractual Real	: 06/04/2022
▪ Plazo de Ejecución Adicional 1	: 09 DÍAS CALENDARIO
▪ Inicio del Plazo Adicional 1	: 29/03/2022
▪ Fin del Plazo Adicional 1	: 06/04/2022
▪ Ampliación de Plazo N°01	: 07 DÍAS CALENDARIO (TRAMITADO)
▪ Fin del Plazo Ampliado N°01	: 13/04/2022
▪ Plazo de Ejecución FINAL	: 187 DÍAS CALENDARIO
▪ Ampliación de Plazo N°02	: 30 DÍAS CALENDARIO (TRAMITADO)
▪ Plazo de Ejecución FINAL	: 217 DÍAS CALENDARIO


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

III. ANTECEDENTES:

- 3.1. Con fecha 25 de junio del 2021, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro de la Comparación de Precios N°003-2021-SENASA / PRODESA: "Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Ate" al CONSORCIO MULTIPROYECTOS (integrado por las empresas CREACIONES HADASA S.A.C. con RUC 20510862440 y RÍO BRAVO S.A.C. con RUC 20352429709).
- 3.2. Con fecha 14 de Julio del 2021, se suscribió el CONTRATO DE OBRA N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II para la Ejecución de la Comparación de Precios N°003-2021-SENASA/PRODESA: "Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Ate", siendo el monto contratado S/ 2,664,642.19 (dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos con 19/100 soles) inc. IGV, bajo el sistema de contratación de Suma Alzada.
- 3.3. Con fecha 01 de Julio del 2021, se suscribió el CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL N°026-2021-SENASA-PRODESA para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE", siendo el monto contratado S/ 122,522.00 (ciento veintidós mil quinientos veintidós con 00/100 soles) inc. IGV, bajo el sistema de contratación de Suma Alzada.
- 3.4. Con fecha 21 de septiembre del 2021, se suscribió el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
- 3.5. Con fecha 05 de octubre del 2021, se suscribió el ACTA DE INICIO DE OBRA.
- 3.6. Con fecha 20 de enero del 2022, se suscribió el ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DE OBRA.
- 3.7. Con fecha 24 de enero del 2022, se suscribió el ACTA DE REINICIO DE OBRA.
- 3.8. Con fecha 26 de enero del 2022, se OTORGÓ CONFORMIDAD de los CRONOGRAMAS DE OBRA ACTUALIZADOS, producto de la Suspensión de Plazo, quedando de esta manera como nueva fecha de CULMINACION DE OBRA el 06 de abril del 2022; dichos documentos fueron remitidos a la ENTIDAD para conocimiento mediante CARTA N°009-2022-JEHC-GERENTE DE OBRA.
- 3.9. Con fecha 25 de marzo del 2022, la Empresa Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS, suscribe la ADENDA N°02 al Contrato de Obras N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II. Por la aprobación del Adicional de Obra por Deductivo Vinculante N°01.


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

- 3.10. Con fecha 30 de marzo del 2022, se OTORGÓ CONFORMIDAD de los CRONOGRAMAS DE OBRA ACTUALIZADOS PRODUCTO DEL ADICIONAL POR DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, quedando de esta manera como nuevo monto contractual S/. 2'599,519.96, con la misma fecha de CULMINACION DE OBRA del 06 de abril del 2022; dichos documentos fueron remitidos a la ENTIDAD para conocimiento mediante CARTA N°028-2022-JEHC-GERENTE DE OBRA.
- 3.11. Con fecha 30 de marzo del 2022, se OTORGÓ CONFORMIDAD de los CRONOGRAMAS DE OBRA DEL ADICIONAL DE OBRA N°01, por el monto de obra de S/. 73,382.25, con fecha de CULMINACION DE OBRA del 06 de abril del 2022; dichos documentos fueron remitidos a la ENTIDAD para conocimiento mediante CARTA N°029-2022-JEHC-GERENTE DE OBRA.
- 3.12. Con fecha 30 de marzo del 2022, la Empresa Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS alcanza a la SUPERVISION la CARTA N°056-2022-ATE.GG donde remite el EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA N°02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02.
- 3.13. Con fecha 31 de marzo del 2022, mediante CARTA N°030-2022-JEHC-GERENTE DE OBRA, en mi calidad de Gerente de Obra, se remitió a PRODESA, EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA N°02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02, otorgando la conformidad de los documentos, y así proceder con la suscripción de la ADENDA al Contrato de Ejecución.
- 3.14. Con fecha 04 de abril del 2022, la Empresa Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS alcanza a la SUPERVISION la CARTA N°057-2022-ATE.GG donde solicita PRÓRROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DE OBRA (AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL CON FECHA ABIERTA).
- (*) Ampliación de Plazo parcial (fecha abierta), hasta la suscripción de la ADENDA del Contrato de Ejecución de Obra, por aprobación del ADICIONAL N°02 y DEDUCTIVO N°02.
- 3.15. Con fecha 05 de abril del 2022, mediante CARTA N°032-2022-JEHC-GERENTE DE OBRA, se tramitó la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 PARCIAL (con fecha abierta) hasta la aprobación con ADENDA del ADICIONAL N°02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02.
- 3.16. Con fecha 13 de abril del 2022, la Empresa Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS, suscribe la ADENDA N°03 al Contrato de Obras N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II. Por la aprobación del Adicional de Obra por Deductivo Vinculante N°02.


ING. JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

Por lo tanto, el día 13 de abril del 2022 se firmó la ADENDA N°3 AL CONTRATO DE OBRA N°37-2021-SENASA-PRODESA FASE II.

Siendo así resulta que el día 13 de abril finaliza la causal de Ampliación de Plazo N°01; por lo tanto, se deja constancia que dicha AMPLIACION DE PLAZO N°01 resultaría de 7 días calendario; teniendo como nueva fecha de termino contractual el día 13 de abril del 2022.

- 3.17. Con fecha 21 de abril del 2022, se OTORGÓ CONFORMIDAD de los CRONOGRAMAS DE OBRA ACTUALIZADOS PRODUCTO DEL ADICIONAL N°02 Y DEDUCTIVO N°02, quedando de esta manera como nuevo monto contractual S/. 2'515,472.16, con fecha de CULMINACION DE OBRA del 13 de abril del 2022; dichos documentos fueron remitidos a la ENTIDAD para conocimiento mediante CARTA N°042-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA.
- 3.18. Con fecha 21 de abril del 2022, se OTORGÓ CONFORMIDAD de los CRONOGRAMAS DE OBRA DEL ADICIONAL N°02, por el monto de obra de S/. 212,950.49, con fecha de CULMINACION DE OBRA del 13 de mayo del 2022; dichos documentos fueron remitidos a la ENTIDAD para conocimiento mediante CARTA N°043-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA.
- 3.19. Con fecha 22 de abril del 2022, mediante CARTA N°044-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA, se tramitó la PRÓRROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DE OBRA N°02 (AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 por Adicional de Obra N°02), por 30 días calendario por ADENDA del ADICIONAL N°02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02, presentando como fecha de culminación de obra final el día 13 de mayo del 2022.

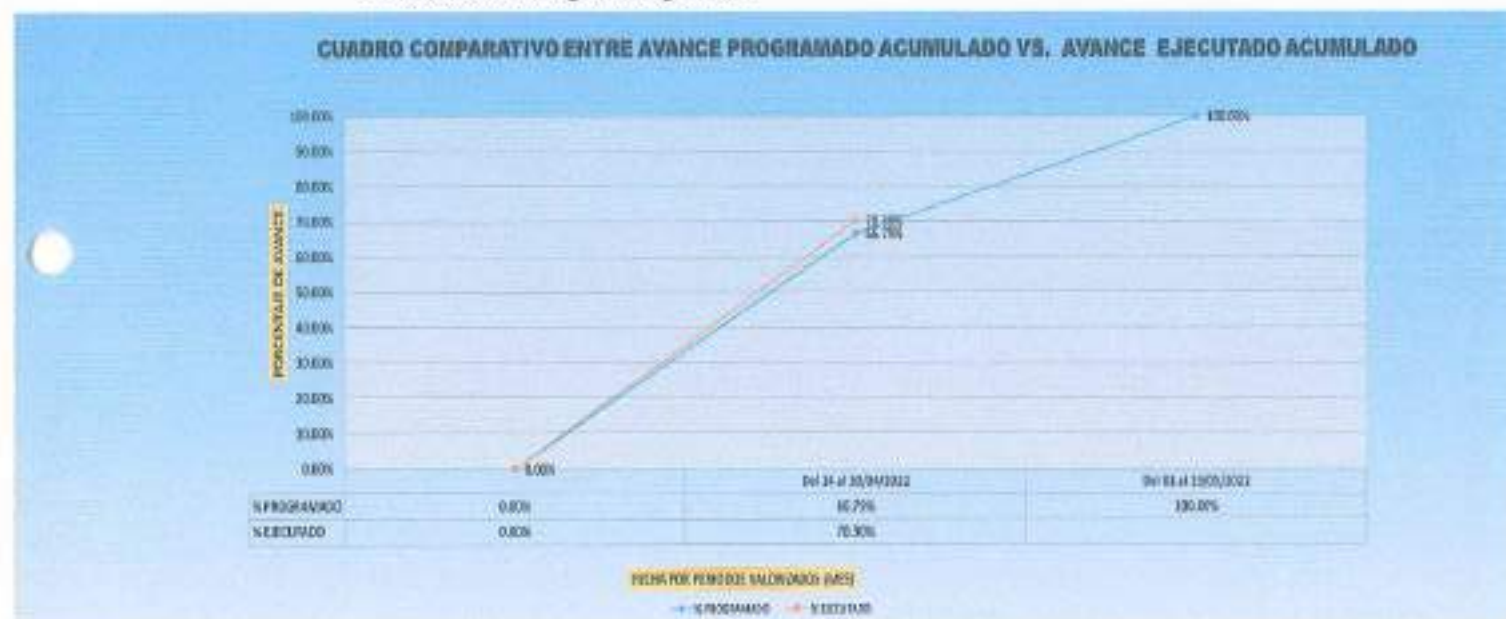

Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

IV. SITUACIÓN DE LA OBRA

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS:

- Situación de la obra: resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto por el informe y de las principales incidencias ocurridas.

La situación actual de la VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONA N°02 de la obra, se detalla en el siguiente gráfico:



Actualmente la obra se encuentra en ejecución.

- Avance programado vigente en el mes : 66.79%
- Avance ejecutado real en el mes : 70.20%
- Avance programado acumulado al mes : 66.79%
- Avance ejecutado acumulado real al mes : 70.20%
- Situación actual de avance de Obra : **ADELANTADA en 3.41%**

De acuerdo al Expediente Técnico del ADICIONAL N°02, donde se definen los alcances del proyecto, se desarrollaron de acuerdo a la programación recomendado en el cronograma de avance de obra presentado por el contratista, por aprobación del ADICIONAL DE OBRA N°02.

Se muestra el cuadro de avance en la siguiente hoja:


Ing. JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

PLANILLA DE METRADOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES		
01.01.01.01	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES (ALO. 1 POR MES)	mes	1.00
37257	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m ²	221.18
37622	MOVILIZACION MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		
01.01.03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gbl	0.15
01.01.03.02	FLETE TERRESTRE	gbl	0.15
01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO		
01.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m ²	265.02
01.02	SEGURIDAD Y SALUD		
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OBRA	mes	1.00
01.02.01.02	DEMOLICION DE MURO DE SOGA	m ²	4.46
01.02.01.03	CORTE DE MURO DE SOGA A DEMOLER	m	7.20
01.02.02	TRABAJOS PROVISIONALES - INFRAESTRUCTURA POR DISTANCIAMIENTO SOCIAL		
01.02.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVAS POR COVID 19	gbl	0.17
01.02.03.02	SEÑALIZACION BASICA DE PREVENICION CONTRA EL CONTAGIO FRENTE AL COVID 19	gbl	0.17
01.02.03	RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS COVID 19		
01.02.03.01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID	mes	1.00
01.02.03.02	CILINDROS METALICOS PARA ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y	gbl	0.17
01.02.04	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL		
01.02.04.01	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL		
01.02.04.02	MASCARILLAS DE PROTECCION	und	12.00
01.02.04.03	PROTECTOR FACIAL DE PVC VINIFAN	und	1.00
01.02.05	MATERIALES DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONTROL Y MEDICION SANITARIA		
01.02.05.01	MEDICAMENTOS VARIOS		
01.02.05.01.01	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 MOLECULARES DE DESCARTE	und	3.80
01.02.05.01.02	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 RAPIDAS DE DESCARTE	und	8.80
02	ESTRUCTURAS		
02.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE CANALETA ANTI HORMIGA		
02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE CANALETA ANTI HORMIGA	m ³	32.57
02.01.02	CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 40CM DE PROFUNDIDAD	m ²	174.84
02.01.03	CONFORMACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL DE FONDO DE CANALETA	m ²	46.33
02.01.04	AGARRE DE DESMONTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m ³	75.64
02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA A UNA DISTANCIA PROMEDIO		
02.01.06.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA A UNA DISTANCIA PROMEDIO	m ³	75.64
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.01	SOLADO C.H 1:10 E=0.10M	m ²	46.53
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.01	DINTELES		
02.03.01.01	DINTELES - CONCRETO FC=175KG/CM2	m ²	0.05
02.03.01.02	DINTELES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	0.82
02.03.01.03	DINTELES - ACERO FY=4200KG/CM2	kg	9.76
02.03.02	BASE MESAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.02.01	BASE DE MESAS DE CONCRETO - CONCRETO FC=210KG/CM2	m ²	1.42
02.03.02.02	BASE DE MESAS DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	41.02
02.03.02.03	BASE DE MESAS DE CONCRETO - ACERO FY=4200KG/CM2	kg	114.17
02.03.03	CANALETA ANTI HORMIGAS		
02.03.03.01	CANALETA ANTI HORMIGAS FC= 210 kg/cm2	m ²	16.29
02.03.03.02	CANALETA ANTI HORMIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	86.42
02.03.03.03	CANALETA ANTI HORMIGAS - ACERO FY= 4200 kg/cm2	kg	365.74
02.04	OTROS		
02.04.01	JUNTA EN VEREDA E=1/2" CON SELLO FLEXIBLE	m	131.75

Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

PLANILLA DE METRADOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
03	ARQUITECTURA		
03.01	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDEAS		
03.01.01	TARAJEO DE BASES DE MUEBLES C/MEZCLA C/A 1.5 E=1.5CM	und	37.25
03.01.02	VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15M MEZCLA C/A 1.5 E=1.5CM	m	7.20
03.01.03	VESTIDURA DE BORDES DE CANALETA CON ACABADO PUUDO CENTRAL CURVO	m	141.76
03.02	PINTURAS		
03.02.01	PINTURA OLEO EN CIELORASO Y VIGAS	m²	888.52
03.02.02	PINTURA EPOXICA EN CIELORASO Y VIGAS	m²	163.54
03.02.03	PINTURA OLEO EN MUROS INTERIORES DOS MANOS	m²	2,281.92
03.02.04	PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES DOS MANOS	m²	583.45
03.03	VARIOS		
03.03.01	POZA DE DRENAJE DE AUTOCLAVE	qtd	1.00
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
04.01.01	VALVULAS		
04.01.01.01	VALVULA DE BOLA DE 2"	und	
04.02	DESAGUE Y VENTILACION		
04.02.01	SALIDAS DE DESAGUE		
04.02.01	SALIDA DE DRENAJE DE AGUA DE CANALETA SINFIN DE Ø2"	pzo	5.00
04.02.02	REUBICACION DE DESAGUE DE 2"	pzo	1.00
04.02.02	CAMARAS DE INSPECCION		
04.02.02.01	CAMARAS DE INSPECCION	und	3.00
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
05.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y FUERZA		
05.01.01	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES		
05.01.01.01	REUBICACION SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L/T	pzo	4.00
05.01.02	SALIDAS DE FUERZA		
05.01.02.01	SALIDA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100AMP.	und	1.00
05.01.03	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS		
05.01.03.01	CORTE DE PISO Y PARED INCL. RESANE	m	30.30
05.01.03.02	TUBERIA PVC SAP 40 mm	m	30.30
05.01.04	CAJAS DE PASE		
05.01.04.01	TAPA TIPO FLUSH 200 x 200	und	1.00
05.02	TABLEROS E INTERRUPTORES		
05.02.01	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS		
05.02.01.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100A	und	2.00
05.02.02	CONDUCTORES Y/O CABLES		
05.02.02.01	CABLE LSCH 1X35MM²	m	96.90
05.02.03	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO		
05.02.03.01	LUMINARIA RECTANGULAR LED DE 72W 8863 LM IP65	und	78.00

Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CP/N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

Plan de trabajo

Se hizo recomendación mediante Cuaderno de Obra, de avanzar con los trabajos y/o partidas correspondientes al periodo de acuerdo al cronograma de avance de obra presentado por el contratista, y así evitar atrasos en obra.

- Desarrollo de la obra (aspectos críticos, problemas presentados, acciones correctivas propuestas o tomadas para incrementar el ritmo de la obra si fuera necesario, comentarios relevantes).

El desarrollo de la obra durante el PRIMER MES, viene abocado a las OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, así también a los trabajos correspondientes a ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA, INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS, las mismas que se viene ejecutando de acuerdo a lo establecido en el EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°02.

Por tal motivo, en este periodo mensual CON RESPECTO A LAS PARTIDAS CONTRACTUALES la obra se encuentra con un AVANCE EJECUTADO ACUMULADO equivalente al 70.20%, frente a un AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO de 66.79%. En consecuencia, la obra se encuentra ADELANTADA en 3.41% en relación al CALENDARIO DE OBRA PROGRAMADO.

Durante el desarrollo de la obra en este periodo mensual, no se ha registrado ningún aspecto crítico, así mismo no se han registrado problemas en el proceso de ejecución.

Los trabajos ejecutados en el MES DE ABRIL del periodo del 14 al 30 de abril del 2022, que corresponden:

01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.02	SEGURIDAD Y SALUD
02	ESTRUCTURAS
02.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE CANALETA ANTI HORMIGA
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA A UNA DISTANCIA PROMEDIO
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.01	DINTELES
02.03.02	BASE MESAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.03	CANALETA ANTI HORMIGAS
03	ARQUITECTURA
03.01	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.02	PINTURAS
03.02.01	PINTURA OLEO EN CIELRASO Y VIGAS
03.02.02	PINTURA EPOXICA EN CIELRASO Y VIGAS
03.02.03	PINTURA OLEO EN MUROS INTERIORES DOS MANOS
03.02.04	PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES DOS MANOS
04	INSTALACIONES SANITARIAS
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.02	DESAGUE Y VENTILACION
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
05.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y FUERZA
05.02	TABLEROS E INTERRUPTORES


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

- **Condiciones meteorológicas en el área del proyecto y otros factores que afectan el desarrollo normal de la obra.**

No hay mayor condición adversa que pudieran afectar al normal desarrollo de la obra, hasta la fecha el clima es típico de la estación de primavera con temperaturas que van desde 16°C hasta los 23°C, vientos moderados.

Otros factores como el acceso vehicular, es de regular a bueno, con vías a nivel de asfalto casi en su totalidad por donde puede haber tránsito pesado con dificultad moderada.

- **Resultados de la inspección y control de calidad del trabajo realizado por el contratista, presentando la documentación por el cual certifique que los materiales utilizados en la obra cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto.**

Los trabajos realizados por el contratista se vienen ejecutando dentro de los estándares de la construcción civil, con rendimientos promedio y calidad aceptable.

Los materiales utilizados hasta la fecha son de marcas reconocidas por el mercado especializado cuyas especificaciones técnicas son concordantes con lo exigido en el Expediente Técnico de Obra.

CONTROL DE LOS TRABAJOS DE CAMPO

Los procedimientos constructivos se cumplen fielmente a los contenidos en las especificaciones técnicas del expediente técnico del proyecto.

CONTROL DE LOS MATERIALES

En el periodo de trabajo se ingresó los materiales, que estos han sido comprados en concordancia con las especificaciones técnicas del expediente técnico y el calendario de adquisición de materiales o insumos.

CONTROL DEL PERSONAL TECNICO Y OBRERO DE LA OBRA

El contratista mantiene en obra en forma permanente a un Ingeniero Residente de Obra quien es el responsable por velar la calidad de las partidas ejecutadas.

- **Equipo mecánico empleado por el contratista, indicando sus principales características y su comparación con el equipo mínimo solicitado en bases y/o propuesto por el contratista en su oferta.**

Los avances ejecutados en promedio durante el periodo mensual del mes de marzo, el contratista mantiene el equipo mínimo solicitado en las bases y/o propuesto en la oferta presentada:

RELACION DE EQUIPOS UTILIZADOS EN EL MES:

- *Herramientas Manuales.*


Ing. JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

- **Personal profesional y técnico empleado por el contratista en el periodo del informe.**

El contratista mantiene en obra en forma permanente a un Ing. Residente de Obra quien es el responsable por velar la calidad de las partidas ejecutadas.

PERSONAL EN OBRA:

En cuanto al personal obrero, se ha tenido cuidado en tener al personal idóneo para las tareas ejecutadas en calidad como en número; se ha procurado contratar a personal obrero de la zona para los trabajos que impliquen la mano de obra no calificada.

PERSONAL PROFESIONAL

N°	CARGO	PROFESIONAL
01	RESIDENTE DE OBRA	ING. LUIS ENRIQUE MINAURO VELIZ
02	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA	ING. HUMBERTO JUNIOR VICTOR RAUL PALOMINO ROMERO
03	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	ING. EDA MIRLA RODRIGUEZ ACHO
04	MAESTRO DE OBRA	SR. ZENÓN HONORATO QUEVEDO MITMA
05	ALMACENERO DE OBRA	SR. WILLIAM PEREZ MOLINA
06	TÉCNICO DE ENFERMERÍA	LIC. CINTHIA PAOLA AMAYA MANYAVILCA
07	ADMINISTRADOR DE OBRA	LIC. KEYLA LANDA VENTURA
08	CONTADOR	CPC. MERCY MARLENI CHIRINOS ESCOBEDO

- **Visitas efectuadas por funcionarios de la ENTIDAD.**

Hubo visitas técnicas por parte de los funcionarios del Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria (PRODESA), en la fecha del periodo valorizado, correspondiente al mes de ABRIL.

- **Organización del contratista y recursos empleados en la ejecución de la obra.**

La ejecución de la obra se ha organizado con la asignación de recursos materiales y humanos, acorde a las exigencias establecidas en el expediente técnico y de la experiencia alcanzada por la empresa contratista en ejecución de obras similares.

El contratista cuenta con los siguientes recursos instalados en obra:

a) En la obra se ha implementado los ambientes de oficina técnica, para la residencia de obra, almacén para materiales de ferretería, implementado con extintor, camilla, botiquín de primeros auxilios y equipos de protección personal, e implementos e insumos para la prevención del covid-19

b) Personal profesional:

- Ing. Residente de Obra, con participación al 100%
- Ing. Asistente de Residente de Obra, con participación al 100%
- Ing. Especialista en Seguridad de Obra, con participación al 100%
- Lic. en Enfermería, con participación al 100%
- Lic. en Administración, con participación al 100%
- Lic. en Contabilidad, con participación al 100%

Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

- **Organización del supervisor y recurso empleado o asignado a la obra.**

La función general del supervisor de obra, consiste en realizar el control de los trabajos efectuados en obra, cautelando de forma directa y permanente, la correcta ejecución de las actividades constructivas programadas para alcanzar

la finalidad y cumplimiento del contrato. Así mismo debe absolver las consultas que formule el contratista, ajustando su actuación a las estipulaciones contractuales sin poder modificar o alterar su contenido.



El Supervisor de Obra "GERENTE DE OBRA" es el representante de la Entidad y, en términos genéricos, tiene las siguientes funciones:

Control Técnico: Materiales, calidad de obra, rendimientos, etc.

Control Económico: Financiero: valorizaciones, adelantos, adicionales, etc.

Control Contractual: Administrativo Legal: plazos, documentación, etc.

V. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATISTA:

- 5.1. Número de valorizaciones tramitadas : 00
VALORIZACIONES TRAMITADAS.
- 5.2. Número de valorizaciones pagadas : 00
VALORIZACIONES PAGADAS.
- 5.3. Monto valorizado (del 14 al 30 de ABRIL) : S/. 126,860.71 (Sin IGV)
COMPROMISOS A SOLICITAR : S/. 149,895.64 (Inc. IGV)
(PARTIDAS DEL ADICIONAL N°02)
- 5.4. MONTO TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA : S/. 142,210.86 (Inc. IGV)


Ing. JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

El monto total a cancelar al contratista queda aprobado de acuerdo al cuadro:
Resumen de VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°02.

RESUMEN DE PAGO - VALORIZACION N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02

DEL 14 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

(EN NUEVOS SOLES)

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRINIZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"

CONTRATO N°	N° 003-2021-SERMSA/PHODESA	PRESUPUESTO APROBADO	S/ 212,991.49
UBICACIÓN	Ate Vinto, Lima, Lima	CONTRATISTA	CONSORCIO MULTIPROYECTOS
Fecha entrega de terreno	21/09/2021	SUPERVISIÓN/CONSULTOR	JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
Plazo de ejecución inicial	100 d.c. 05/10/2021 al 03/04/2022	RESIDENTE	ING. JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Suspensión de plazo N° 01	04 días calendario (del 26 al 23/01/2022)	SUPERVISOR	ING. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
Ampliación de plazo N° 01	07 días calendario (del 07 al 13/02/2022)		
Ampliación de plazo N° 02	30 días calendario (del 14/04/2022 al 13/05/2022)		
Plazo de ejecución	Del 14/04/2022 al 13/05/2022		

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO S/100	ADICIONALES Y REDUCTIVOS	VALORIZACIONES		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
			ANTERIOR	ACTUAL	MONTO S/	%	MONTO S/	%
A. VALORIZACION CONTRACTUAL (V)								
COSTO DIRECTO								
PRESUPUESTO COMPONENTE I	156,927.41	0.00	0.00	110,313.66	110,313.66	70.36%	46,613.75	29.70%
TOTAL	156,927.41	0.00	0.00	110,313.66	110,313.66	70.36%	46,613.75	29.70%
AVANCE DE LA OBRA %				70.36%		70.36%		29.70%
B. REAJUSTES (S)				0.00				
SUB TOTAL (B)				0.00				
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)	156,927.41	0.00	0.00	110,313.66	110,313.66		46,613.75	29.70%
C. DEDUCCIONES (D)								
DEDUCCIÓN DEL ADELANTO DIRECTO				0.00				
DEDUCCIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES				0.00				
TOTAL DEDUCCIONES (D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
D. AMORTIZACIONES (A)								
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO				0.00				
TOTAL AMORTIZACIONES (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
E. VALORIZACION NETA (VN=VB-D-A)	156,927.41	0.00	0.00	110,313.66	110,313.66		46,613.75	
F. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD								
GASTOS GENERALES 8.00%	12,554.19		0.00	8,825.09	8,825.09		3,729.10	
UTILIDAD 7.00%	10,984.92		0.00	7,721.96	7,721.96		3,252.96	
MONTO TOTAL (E+F)	169,482.32	0.00	0.00	126,860.71	126,860.71		53,623.61	
G. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA								
EFFECTIVO (VN-D)	160,488.32		0.00	126,860.71	126,860.71		46,613.75	
EN I.G.V. (18%)	22,483.97		0.00	22,834.93	22,834.93		6,280.47	
MONTO TOTAL CON I.G.V.	212,972.29	0.00	0.00	149,695.64	149,695.64			
H. TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			0.00	149,695.64	149,695.64			
I. RETENCION FONDO DE GARANTIA								
Garantía de cumplimiento			0.00	0.00	0.00			
RETENCION 5.00%			0.00	7,484.78	7,484.78			
TOTAL RETENCIONES (I)			0.00	7,484.78	7,484.78			
TOTAL MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA			0.00	5,142,218.86				

5.5. Cuadro del estado de las amortizaciones de los Adelantos.

NO CORREPONDE.

5.6. Control de amortizaciones del Adelanto de Materiales.

NO CORREPONDE.


Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

VI. CONCLUSIONES

- Se contó con el personal técnico capacitado para desarrollar las actividades en obra correspondiente al ADICIONAL N°02.
- Se realizó las charlas de motivación y seguridad ocupacional antes de cada jornada de trabajo.
- Se adoptan medidas de seguridad en los diferentes frentes de trabajo, preservando la integridad física de los trabajadores.
- Se verifica el cumplimiento de los protocolos del PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 DE LA OBRA.
- Se continúa con el abastecimiento de materiales e incorporado de acuerdo al avance de la obra.
- Durante el proceso constructivo, se dio el cumplimiento a las especificaciones técnicas y planos del proyecto.
- Los metrados valorizados corresponden a las partidas ejecutadas al 30 de ABRIL del 2022. En el periodo del 14 al 30 del mes de abril del 2022.
- A la fecha, por tal motivo, en este periodo mensual CON RESPECTO A LAS PARTIDAS CONTRACTUALES la obra se encuentra con un AVANCE EJECUTADO ACUMULADO equivalente al 70.20%, frente a un AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO de 66.79%. En consecuencia, la obra se encuentra ADELANTADA en 3.41% en relación al CALENDARIO DE OBRA PROGRAMADO.
- En mi condición de SUPERVISOR DE OBRA, después de ser revisado la VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°02, se otorga CONFORMIDAD de los documentos presentados por la Empresa Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS.

VII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Entidad tramitar el pago de la presente VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°02 (del 14 al 30 de ABRIL del 2022), y comunicar al contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS el cumplimiento de los pagos y/o depósitos.
- Se anexa en tres (03) volúmenes físicos y copia digital del informe de VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°02 presentado por el Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS.


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

264

VIII. ANEXOS:

- 8.1. CHECKLIST VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°02.
- 8.2. RESUMEN DE PAGO POR VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°02.
- 8.3. CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA.
- 8.4. VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°02.
- 8.5. RESUMEN DE METRADOS.
- 8.6. GRÁFICO DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS. EJECUTADO.
- 8.7. PANEL FOTOGRÁFICO.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines.

Atentamente;


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA
FIRMA Y SELLO
SUPERVISOR DE OBRA

Nombre: Joel Efrain Chavarria Cotrina.
N° de Colegiatura: 174545.

FECHA: 06 de mayo del 2022.

**8.1. CHECKLIST VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL
ADICIONAL N°02.**


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

CHECKLIST VALORIZACION			
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE"			
VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N° 02			
GERENTE DE OBRA: JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA, Reg. CIP N°174545			
ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA.	✓	
2	INFORME DE RESIDENTE DE OBRA.	✓	
3	HOJA DE RESUMEN DE PAGO.	✓	
4	VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N° 02	✓	
5	RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS (PANILLA DE METRADOS).	✓	
6	CURVA "S".	✓	
7	RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES.	✓	
8	TOTAL DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA.	✓	
9	CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA.	✓	
10	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES.	✓	
11	COPIA DE CUADERNO DE OBRA.	✓	
12	CONTROL DE CALIDAD.	✓	
13	INFORME DE MONITOREO, MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA.	✓	
14	POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN. (CAR)	✓	
15	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES.	✓	
16	POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS.	✓	
17	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO. (SCTR)	✓	
18	PAGO SENCICO, CONAFOVICER, SUNAT, SEGURO SOCIAL.	✓	
19	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.	✓	
20	CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES.	✓	
21	REVISION DE OTRAS PENALIDADES.	✓	
22	CERTIFICADO DE HABILIDAD DE RESIDENTE DE OBRA.	✓	
23	PANEL FOTOGRAFICO.	✓	


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N°174545
 SUPERVISOR DE OBRA

**8.2. RESUMEN DE PAGO POR VALORIZACION DE
OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°02.**


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

RESUMEN DE PAGO - VALORIZACION N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02

DEL 14 AL 30 DE ABRIL DEL 2022
(EN NUEVE SOLES)

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRUJADA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE

OBRA
CONTRATO N°
UBICACIÓN
Fecha entrega de terreno
Pazo de ejecución inicial
Suspensión de plazo N° 01
Aplicación de Ocas N° 01
Aplicación de Ocas N° 02
Pazo de ejecución

N° 003-2021-SERASA-PROCESA
Ate Nueva, Lima, Lima
21/03/2021
193 ó.c. 05/10/2021 al 03/04/2022
34 días calendario (del 20 al 22/07/2022)
37 días calendario (del 07 al 13/04/2022)
30 días calendario (del 14/04/2022 al 13/05/2022)
Del 14/04/2022 al 13/05/2022

15/212.900.48
CONSORCIO MULTIPROYECTOS
JOEL EFRAN CHAVARRIA COTRINA
ING. JOSE LEONIDAS ROSA YACTAYO
ING. JOEL EFRAN CHAVARRIA COTRINA

PRESUPUESTO APROBADO
CONTRATISTA
SUPERVISIÓN/CONTRATISTA
RESIDENTE
SUPERVISOR

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO E/OTRO	ADICIONALES Y DEDUCCIONES	VALORIZACIONES ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO MONTO S/	%	SALDO POR VALORIZAR MONTO S/	%
A. VALORIZACION CONTRACTUAL (A)								
GASTO DIRECTO								
PRESUPUESTO CONTRACTUAL	156,927.41	0.00	0.00	110,313.66	110,313.66	70.30%	46,613.75	29.70%
TOTAL	156,927.41	0.00	0.00	110,313.66	110,313.66	70.30%	46,613.75	29.70%
AVANCE DE LA OBRA %				70.34%				29.70%
B. REAJUSTES (B)				0.00				
SUB TOTAL (B)				0.00				
VALORIZACION BRUTA (B+A+B)	156,927.41	0.00	0.00	110,313.66	110,313.66		46,613.75	29.70%
C. DEDUCCIONES (C)								
DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO				0.00				
DEDUCCION DEL ADELANTO DE MATERIALES				0.00				
TOTAL DEDUCCIONES (C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
D. AMORTIZACIONES (D)								
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO				0.00				
TOTAL AMORTIZACIONES (D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
E. VALORIZACION NETA (E=A+B-C-D)	156,927.41	0.00	0.00	110,313.66	110,313.66		46,613.75	
F. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD								
GASTOS GENERALES	3.00%			0.00	0.00		0.00	
UTILIDAD	7.00%			0.00	0.00		0.00	
MONTO TOTAL (E+F)	156,927.41	0.00	0.00	110,313.66	110,313.66		46,613.75	
G. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA								
IN EFECTIVO (G-H)	18.00%			0.00	0.00		0.00	
EN (S.V. 18%)				0.00	0.00		0.00	
MONTO TOTAL CON I.O.V.	212,450.48			148,695.34	148,695.34			
H. TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR				148,695.34	148,695.34			
I. RETENCION FONDO DE GARANTIA								
GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO	5.00%			0.00	0.00		0.00	
RETENCION				0.00	0.00		0.00	
TOTAL RETENCIONES (I)				0.00	0.00		0.00	
TOTAL MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA				0.00	9,142,210.38			


Ing. JOEL EFRAN CHAVARRIA COTRINA
Reg. C.P. N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

8.3. CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA.



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES - OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE

(En Soles)

Contratista	CONSORCIO MULTIPROYECTOS		
Residente de obra	JOSE LEONIDAS SUSA YACHTAYO		
Supervisor/Gestor de obra	Ing. Joel Efraim Cotrina Cotrina		
Obra	"CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"		

Nº de Contrato	Nº 025-2025-SUMADA/19405664		
Plazo de ejecución (Días)	180		
Fecha entrega de terreno	25/09/2021		
Suspensión de plazo N° 01	Del 20 al 25/01/2022		
Ampliación de plazo N° 01	Del 07 al 15/06/2022		
Fecha Inicio	14/04/2022		
Fecha Término	13/05/2022		
Plazo de ejecución (Días)	18		

MONTOS	NETO	IGV	BRUTO
0000000001	300,466.52	32,483.97	312,950.49
TOTAL	300,466.52	32,483.97	312,950.49

ADICIONALES	NETO	IGV	BRUTO	INCIDENCIA
0000000001	0.00	0.00	0.00	0.00%

N° de Valorización	Valorización del Período (A)	Anticipos (B)	Adelanto del Anticipo Amortización (B/1)	IGV (C) D = 18%*(C)	Oferta Neto a Facturar (B/1 + C)	Retención 5% (B/1 * 5%) P = 25%*(D)	Monto Neto a Pagar (B/1 + C - P)
Anticipo	325,860.70	0.00	0.00	0.00	325,860.70	0.00	325,860.70
Valorización N° 01 - Del 24 al 30/04/2022	125,860.71	0.00	0.00	22,834.95	148,695.66	7,434.78	141,260.88
Pagada	325,860.70	0.00	0.00	22,834.95	348,695.65	7,434.78	341,260.87

TOTAL General	325,860.70	0.00	0.00	22,834.95	348,695.65	7,434.78	341,260.87
---------------	------------	------	------	-----------	------------	----------	------------

Antes Físico	Actual	Acumulado
	70.10%	70.30%
	0.00%	0.00%


Ing. JOEL EFRAIM COTRINA COTRINA
Reg. C/N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

**8.4. VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL
N°02.**


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. C.O. N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

8.5. RESUMEN DE METRADOS.


ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

PLANILLA DE METRADOS

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS"
VALORIZACION DE OBRA N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 2
TITULO RESUMEN DE METRADOS
ENTIDAD SENASA/PRODESA
FECHA ABRIL 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES		
01.01.01.01	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES (ALQ. 1 POR MES)	mes	1.00
37257	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	221.18
37622	MOVILIZACION MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		
01.01.03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gbl	0.15
01.01.03.02	FLETE TERRESTRE	gbl	0.15
01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO		
01.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	265.02
01.02	SEGURIDAD Y SALUD		
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OBRA	mes	1.00
01.02.01.02	DEMOLICION DE MURO DE SOGA	m²	4.46
01.02.01.03	CORTE DE MURO DE SOGA A DEMOLER	m	7.20
01.02.02	TRABAJOS PROVISIONALES - INFRAESTRUCTURA POR DISTANCIAMIENTO SOCIAL		
01.02.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVAS POR COVID 19	gbl	0.17
01.02.03.02	SENAIZACION BASICA DE PREVENION CONTRA EL CONTAGIO FRENTE AL COVID 19	gbl	0.17
01.02.03	RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS COVID 19		
01.02.03.01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID	mes	1.00
01.02.03.02	CILINDROS METALICOS PARA ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y	gbl	0.17
01.02.04	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL		
01.02.04.01	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL		
01.02.04.02	MASCARILLAS DE PROTECCION	und	12.00
01.02.04.03	PROTECTOR FACIAL DE PVC VINIFAN	und	1.00
01.02.05	MATERIALES DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONTROL Y MEDICION SANITARIA		
01.02.05.01	MEDICAMENTOS VARIOS		
01.02.05.01.01	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 MOLECULARES DE DESCARTE	und	3.00
01.02.05.01.02	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 RAPIDAS DE DESCARTE	und	8.00
02	ESTRUCTURAS		
02.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE CANALETA ANTI HORMIGA		
02.01.02	CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 40CM DE PROFUNDIDAD	m²	32.57
02.01.03	CONFORMACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL DE FONDO DE CANALETA	m²	174.04
02.01.04	ACARREO DE DESMONTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m³	46.53
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA A UNA DISTANCIA PROMEDIO		
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.01	SOLADO C:H 1:10 E=0.10M	m²	75.64
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.01	DINTELES		
02.03.01.01	DINTELES - CONCRETO FC=175KG/CM2	m³	75.64
02.03.01.02	DINTELES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	0.05
02.03.01.03	DINTELES - ACERO FY=4200KG/CM2	kg	0.82
02.03.02	BASE MESAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.02.01	BASE DE MESAS DE CONCRETO - CONCRETO FC=210KG/CM2	m³	9.76
02.03.02.02	BASE DE MESAS DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	1.42
02.03.02.03	BASE DE MESAS DE CONCRETO - ACERO FY=4200KG/CM2	kg	41.02
02.03.03	CANAleta ANTI HORMIGAS		
02.03.03.01	CANAleta ANTI HORMIGAS fc= 210 kg/cm2	m³	114.17
02.03.03.02	CANAleta ANTI HORMIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	16.29


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. C/P N°174545
 SUPERVISOR DE OBRA

02.03.03.03	CANAleta ANTI HORMIGAS - ACERO FY= 4200 kg/cm2	kg	365.74
02.04	OTROS		
02.04.01	JUNTA EN VEREDA E= 1/2" CON SELLO FLEXIBLE	m	131.75
03	ARQUITECTURA		
03.01	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
03.01.01	TARRAJEO DE BASES DE MUEBLES C/MEZCLA C/A 1:5 E=1.5CM	und	37.25
03.01.02	VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15M MEZCLA C/A 1:5 E=1.5CM	m	7.20
03.01.03	VESTIDURA DE BORDES DE CANAleta CON ACABADO PULIDO CENTRAL CURVO	m	141.76
03.02	PINTURAS		
03.02.01	PINTURA OLEO EN CIELORASO Y VIGAS	m²	880.52
03.02.02	PINTURA EPOXICA EN CIELORASO Y VIGAS	m²	163.64
03.02.03	PINTURA OLEO EN MUROS INTERIORES DOS MANOS	m²	2,201.92
03.02.04	PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES DOS MANOS	m²	503.45
03.03	VARIOS		
03.03.01	POZA DE DRENAJE DE AUTOCLAVE	gbl	1.00
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
04.01.01	VALVULAS		
04.01.01.01	VALVULA DE BOLA DE 2"	und	
04.02	DESAGUE Y VENTILACION		
04.02.01	SALIDAS DE DESAGUE		
04.02.01	SALIDA DE DRENAJE DE AGUA DE CANAleta SINFIN DE Ø2"	plo	5.00
04.02.02	REUBICACION DE DESAGUE DE 2"	plo	1.00
04.02.02	CAMARAS DE INSPECCION		
04.02.02.01	CAMARAS DE INSPECCION	und	3.00
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
05.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y FUERZA		
05.01.01	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES		
05.01.01.01	REUBICACION SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L/T	plo	4.00
05.01.02	SALIDAS DE FUERZA		
05.01.02.01	SALIDA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100AMP.	und	1.00
05.01.03	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS		
05.01.03.01	CORTE DE PISO Y PARED INCL. RESANE	m	30.30
05.01.03.02	TUBERIA PVC SAP 40 mm	m	30.30
05.01.04	CAJAS DE PASE		
05.01.04.01	TAPA TIPO PLUSH 200 x 200	und	1.00
05.02	TABLEROS E INTERRUPTORES		
05.02.01	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS		
05.02.01.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100A	und	2.00
05.02.02	CONDUCTORES Y/O CABLES		
05.02.02.01	CABLE LSOH 1X35MM2	m	98.90
05.02.03	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO		
05.02.03.01	LUMINARIA RECTANGULAR LED DE 72W 8063 LM IP65	und	78.00


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. C/N°174545
 SUPERVISOR DE OBRA

**8.6. GRAFICO DE AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO VS. EJECUTADO.**


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. C.O. N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

8.7. PANEL FOTOGRAFICO.


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

PANEL FOTOGRAFICO



TOMA FOTOGRAFICA N°01: CHARLAS DE SEGURIDAD EN OBRA.



TOMA FOTOGRAFICA N°02: ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.


Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA



TOMA FOTOGRAFICA N°03: CANALETA ANTI HORMIGAS $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$


Ing. JOEL EFRAIN MAVARRÍA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA



**TOMA FOTOGRAFICA N°04: CANALETA ANTI HORMIGAS ACERO $FY= 4200$
kg/cm²**


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP. N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



TOMA FOTOGRAFICA N°05: INSTALACION DE CAMARAS DE INSPECCION.


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

Carta N° 74-2022/Ate.gg

Sres.:

Ing. Joel Efraín Chavarria Cotrina – Gerente de Obra

Presente.-

Asunto: Valorización de obra N° 01 del Adicional de Obra N° 02 desde el 14 al 30 de abril del 2022.

Referencia: ADENDA N° 03 AL CONTRATO DE OBRAS N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II derivado de la COMPARACIÓN DE PRECIOS CP N° 003-2021-SENASA/PRODESA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE.

De nuestra consideración:

Remito la Valorización de obra N° 01 del Adicional de Obra N° 02 derivado de la ADENDA N° 03 AL CONTRATO DE OBRAS N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE, correspondiente al periodo del 14 al 30 de abril del 2022; el mismo que contiene los siguientes documentos:

1. Ficha de Identificación de Obra
2. Informe de Residente respecto a la situación de la obra
3. Hoja de resumen de pago
4. Valorización
5. Resumen de metrados ejecutados - Panilla de Metrados
6. Curva "S"
7. Resumen general de valorizaciones
8. Total de pagos a cuenta por valorizaciones de obra
9. Calendario valorizado de obra
10. Amortización de adelanto directo y de materiales
11. Copia de cuaderno de obra
12. Control de calidad
13. Informe de Monitoreo, Mitigación del Impacto Ambiental y Seguridad en Obra.

14. Póliza de Seguro Contra Todo Riesgo De Construcción (CAR).
15. Póliza de Seguro de Accidentes Personales.
16. Póliza de Seguro Responsabilidad Civil frente a Terceros.
17. Seguro Complementario de Trabajo De Riesgo (SCTR).
18. Pago Sencico, Conafovicer, Sunat - Seguro Social
19. Carta fianza de fiel cumplimiento
20. Carta fianza de adelanto directo y de materiales
21. Revisión de penalidades
22. Certificado de habilidad del ingeniero residente
23. Panel fotográfico

Sin otro particular, me despido de Ud.

Atentamente,

Lima, 05 de mayo del 2022

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común
.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO MULTIPROYECTOS

VALORIZACIÓN N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02

OBRA:

**“CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE
CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y
HOSPEDEROS – ATE”**



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

SENASA
PERÚ

JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRIMA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

ABRIL 2022

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 156001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDALEÓN
Representante Común

CONSTRUCTORA HADASA
CREACIONES HADASA S.A.C.
 CAL. LUIS ESPEJO 849 DPTO. 201
 LA VICTORIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20510862440
E001-124

Forma de pago : Contado

Fecha de Emisión : 05/05/2022
 Señor(es) : PROGRAMA DE DESARROLLO DE
 SANIDAD AGROPE
 RUC : 20414251561
 Dirección del Cliente : AV. LA MOLINA 1915 FRENTE A
 LA UNIV AGRARIA PUERTA 1
 LIMA-LIMA-LA MOLINA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : N° CTA. DE DETRACCION: 00-
 019-048659

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO POR EL ADICIONAL DE OBRA N2-VALORIZACION N1 ABR 2022-OBRA: CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS ATE- COMPARACION DE PRECIOS CP N003-2021- SENASA/PRODESA-CONTRATO N037-2021-SENASA- PRODESA-FASE II	126860.71186	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
 NOVENTA Y CINCO Y 64/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 126,860.71
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 126,860.71
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 22,834.93
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 149,695.64

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común

1. Ficha de identificación de obra


JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRERA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA

1. Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE
CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE"
2. Ubicación: Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los
Topacios – Ate Vitarte – Lima – Lima.
3. Entidad : PROGRAMA DE DESARROLLO DE
SANIDAD AGRARIA - PRODESA
4. Comparación de Precios: N° 003-2021-SENASA/PRODESA
5. Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS
6. Sistema de Contratación: Suma Alzada
7. Contrato de Ejecución de la obra: N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II
8. Residente de Obra: Ing. José Leonidas Sosa Yactayo
9. Monto del Contrato con IGV: S/ 2, 664,642.19
10. Plazo de Ejecución según contrato: 180 días calendarios
11. Plazo de ejecución inicial: 05 de octubre del 2021 al 03 de abril del 2022
12. Suspensión de plazo N° 01: 04 días calendario (del 20 al 23/01/2022)
13. Ampliación de Obra N° 01: 07 días calendario (del 07 al 13/04/2022)
14. Periodo de término actualizado: 187 días calendario
15. Monto del Adicional de Obra N° 01 : S/ 73,382.25 (Adenda N° 02)
16. Monto de Deductivo Vinculante N° 01: S/ 65,122.23
17. Monto del Adicional de Obra N° 02: S/ 212,950.49 (Adenda N° 03)
18. Monto de Deductivo Vinculante N° 02: S/ 84,047.80
19. Presupuesto modificado aprobado: S/ 2, 515,472.16
20. Plazo de Ejecución Adicional N° 01: 09 días calendarios
21. Plazo de Ejecución Adicional N° 02: 30 días calendarios
22. Fecha de término de ejecución del: 13 de mayo del 2022
Adicional de Obra N° 02
23. Anticipo: No solicitado
24. Gerente de Obra: Ing. Joel Efraín Chavarría Cotrina
25. Supervisión de Obra: Ing. Joel Efraín Chavarría Cotrina
26. Avance Programado Acumulado al 30-04-2022:
66.79 %
27. Avance Ejecutado Acumulado al 30-04-2022:
70.20%
28. Diferencia del Avance de Obra al 30-04-2022:
03.41%


JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

2. Informe de Residente respecto a la situación de la obra



JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

INFORME RESIDENCIA DE OBRA

1. FICHA TÉCNICA DE OBRA

DATOS GENERALES:

- ✓ Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"
- ✓ Ubicación: Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios - Ate Vitarte - Lima - Lima.
- ✓ Entidad: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGRARIA - PRODESA
- ✓ Comparación de Precios: N° 003-2021-SENASA/PRODESA
- ✓ Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS
- ✓ Sistema de Contratación: Suma Alzada
- ✓ Contrato de Ejecución de la obra: N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II
- ✓ Residente de Obra: Ing. José Leonidas Sosa Yactayo
- ✓ Monto del Contrato con IGV: S/ 2, 664,642.19
- ✓ Plazo de Ejecución según contrato: 180 días calendarios
- ✓ Plazo de ejecución inicial: 05 de octubre del 2021 al 03 de abril del 2022
- ✓ Suspensión de plazo N° 01: 04 días calendario (del 20 al 23/01/2022)
- ✓ Ampliación de Obra N° 01: 07 días calendario (del 07 al 13/04/2022)
- ✓ Periodo de término actualizado: 187 días calendario
- ✓ Monto del Adicional de Obra N° 01 : S/ 73,382.25 (Adenda N° 02)
- ✓ Monto de Deductivo Vinculante N° 01: S/ 65,122.23
- ✓ Monto del Adicional de Obra N° 02: S/ 212,950.49 (Adenda N° 03)
- ✓ Monto de Deductivo Vinculante N° 02: S/ 84,047.80
- ✓ Presupuesto modificado aprobado: S/ 2, 515,472.16
- ✓ Plazo de Ejecución Adicional N° 01: 09 días calendarios
- ✓ Plazo de Ejecución Adicional N° 02: 30 días calendarios
- ✓ Fecha de término de ejecución del: 13 de mayo del 2022
- Adicional de Obra N° 02
- ✓ Anticipo: No solicitado
- ✓ Gerente de Obra: Ing. Joel Efraín Chavarria Cotrina
- ✓ Supervisión de Obra: Ing. Joel Efraín Chavarria Cotrina
- ✓ Avance Programado Acumulado al 30-04-2022: 66.79 %
- ✓ Avance Ejecutado Acumulado al 30-04-2022: 70.30%
- ✓ Diferencia del Avance de Obra al 30-04-2022: 03.51%

JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 476545

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. UBICACIÓN:

La obra Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos se encuentra ubicado en el distrito de Ate Vitarte, exactamente en la calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios. El terreno destinado al proyecto tiene un área de 809.53m² aprox.

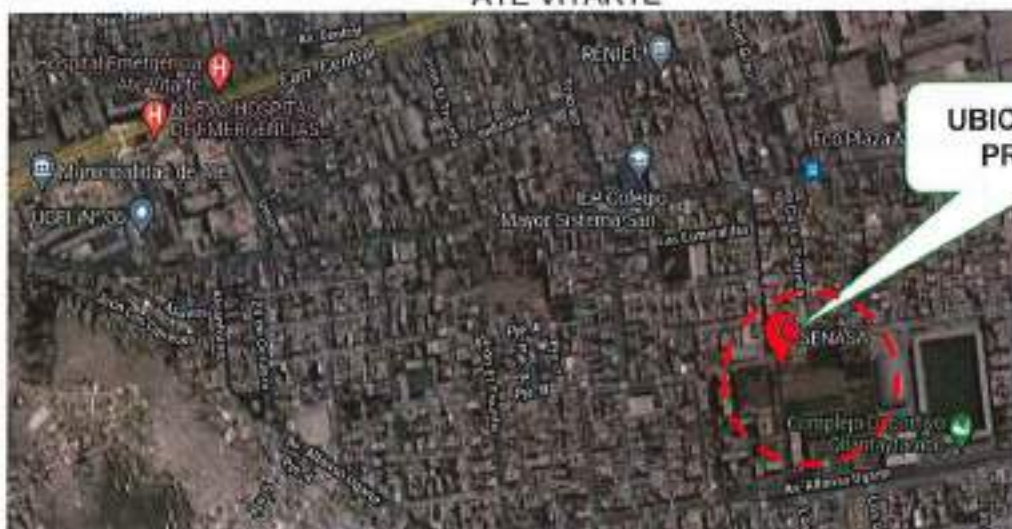

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
ING. MONTEIRO LARDA LEON
Ingeniero Civil

UBICACIÓN GEOGRÁFICA – DPTO. Y PROVINCIA DE LIMA, DISTRITO DE ATE VITARTE



UBICACIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN DEL PROYECTO – SENASA ATE

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOR BENEFICOSY HOSPEDEROS ATE


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

2.2. ANTECEDENTES

- ✓ Con fecha 25 de junio del 2021, mediante CARTA-0204-2021-MIDAGRI-SENASA-PRD el Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria adjudicó la Buena Pro de la Comparación de Precios N° 003-2021-SENASA/PRODESA para la contratación de la Ejecución de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE" a CONSORCIO MULTIPROYECTOS.
- ✓ Con fecha 14 de Julio del 2021 se suscribió el Contrato N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II para la Ejecución de la Comparación de Precios N° 003-2021-SENASA/PRODESA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE", siendo el monto contratado S/ 2, 664,642.19 (dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos con 19/100 soles) inc. IGV.
- ✓ El día 21 de septiembre del 2021, la Entidad contratante hace entrega del terreno al Contratista para la ejecución de obra.
- ✓ Al haberse cumplido con las condiciones para el inicio del plazo contractual de la obra establecidas en el contrato suscrito, se inicia el plazo contractual de ejecución de obra a partir del día 05 de octubre del 2021.
- ✓ Con el plazo de 180 días calendario, el plazo vence el día 03 de abril del 2022.
- ✓ Suspensión de plazo del 20 al 23 de enero del 2022, siendo la nueva fecha término de ejecución el 06 de abril del 2022.
- ✓ Se suscribió la Adenda N° 02, con fecha 25 de marzo del 2022 por el Adicional de Obra N° 01, por el monto de S/ 8,260.02 (Ocho mil doscientos sesenta con 02/100 soles).
- ✓ Se suscribió la Adenda N° 03, con fecha 13 de abril del 2022 por el Adicional de Obra N° 02, por el monto de S/ 128,902.69 (Ciento veintiocho mil novecientos dos con 69/100 soles).


JOEL EFRAIM CHAZARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del presente Adicional de Obra N° 02 es de 30 días calendarios, iniciando el 14 de abril del 2022 al 13 de mayo del 2022. Para la presente Valorización N° 01 el periodo inicia el 14.04.2022 y culmina el 30.04.2022.


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 155001


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO CANDA LEÓN
Representante Contratista

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOR BENEFICOSY HOSPEDEROS - ATE

2.4. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO MODIFICADO OFERTADO

El presupuesto total ofertado Modificado es de:

ITEM	DESCRIPCION PARTIDA	PRESUPUESTO
		PARCIAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	48,264.03
02	ESTRUCTURAS	703,361.11
03	ARQUITECTURA	627,350.80
04	INSTALACIONES SANITARIAS	85,003.24
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	389,721.75
	COSTO DIRECTO	1,853,700.93
	GASTOS GENERALES	148,296.07
	UTILIDAD	129,759.07
	SUB TOTAL	2,131,756.07
	IGV 18%	383,716.09
	TOTAL	2,515,472.16

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 16/100 SOLES. El presupuesto base incluye gastos generales, utilidades más costo de IGV.

Los precios unitarios de las partidas consideradas en el presupuesto han sido analizados en sus componentes: mano de obra, materiales y equipos, rendimiento, en donde los precios deben ser actualizados de acuerdo al mercado local.

2.4. CONSIDERACIONES:

Se hace referencia a las consideraciones que se tomaron en cuenta para la elaboración de los siguientes documentos:

- a) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.

Cabe mencionar que el monto con el que gana la buena pro asciende a: S/. 2, 664,642.19 Soles (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 19/100 SOLES), incluido el impuesto general a las ventas IGV 18%.

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LAMDA LEON
Representante legal

Según los tiempos establecidos de acuerdo a la firma del contrato, son los siguientes:

Inicio de obra	05/10/2021
Tiempo de Obra	180 días calendarios
Término de Obra	03/04/2022
Suspensión de plazo	Del 20 al 23 de enero del 2022
Nueva fecha de término de obra	13/04/2022

En el Cronograma de Obra Valorizado, indican los porcentajes de avance de obra según los tiempos de programación.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - ADICIONAL DE OBRA N° 02					
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE		Monto Adicional de Obra N° 02:			
Entidad: SENASA - SEDE ATE		Plazo : 30 Días Calendarios			
Ubicación: Distrito Ate Vitarte, Provincia Lima y Departamento de Lima.		Fecha			
de Inicio Contractual: 14/04/2022		Fecha Culminación de Obra: 13/05/2022			
Contratista: Consorcio Multiproyectos					
ITEM	DESCRIPCIÓN	PARCIAL S/.	MES 1		MES 2
			30 días calendario		
			14 al 30 abril	01 al 13 de	
1	ADICIONAL DE OBRA N° 02				
1.1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				
1.2	ESTRUCTURAS				
1.3	ARQUITECTURA				
1.4	INSTALACIONES SANITARIAS				
1.5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
	COSTO DIRECTO	S/ 156,827.41	S/ 104,805.23	S/ 52,122.18	
	GASTOS GENERALES (8.0%)	S/ 12,554.19	S/ 8,384.42	S/ 4,169.77	
	UTILIDAD (7.0%)	S/ 10,984.92	S/ 7,336.37	S/ 3,648.55	
	SUB TOTAL	S/ 180,488.52	S/ 120,526.02	S/ 58,840.50	
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV 18%	S/ 32,483.97	S/ 21,694.68	S/ 10,789.29	
	PRESUPUESTO TOTAL INC/IGV	S/ 212,950.49	S/ 142,220.70	S/ 70,729.79	
	AVANCE PROGRAMADO		142,220.70	70,729.79	
	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO		142,220.70	212,950.49	
	AVANCE PROGRAMADO EN PORCENTAJE		66.78%	33.21%	
	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO EN PORCENTAJE		66.78%	100.00%	

En el diagrama de GANTT y PERTT se han considerado los tiempos de duración de cada una de las partidas consideradas en el presupuesto indicando la ruta crítica.

b) CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES.

Este calendario es muy necesario para la ejecución de la obra, está elaborado en concordancia con el calendario de avance de obra. La contratista no solicito adelanto por materiales.

Este calendario deberá ser actualizado, por cada ampliación de plazo otorgada (Ampliación de plazo justificada, solicitada y aprobada por el Supervisor/Inspector) en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Este calendario describe todos los materiales, unidades, cantidades y precios unitarios de cada uno de los recursos, que se requieren para la correcta ejecución de la obra.

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174848

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYU
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

2.5. ÁREA DE INTERVENCIÓN

El Área en ejecución del Proyecto: " CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOR BENEFICOSY HOSPEDEROS – ATE" se ejecutará en un Área del terreno de 809.53 m², con un Perímetro de 142,84 ml, de propiedad de SENASA.

2.6. VALORIZACIÓN

En el presente periodo de Valorización N° 01 del Adicional de obra N° 02, correspondiente del 14 al 30 de Abril del 2022, se ha valorizado por el monto de S/ 149,695.64 (Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y cinco con 64/100 soles), incluye IGV.

2.7. AVANCE MENSUAL

En el presente periodo de valorización N° 01 del adicional de obra N° 02, se alcanzó un avance físico del 70.30% con respecto al avance programado de 66.79%, teniendo un saldo de 29.70% por ejecutarse.

2.8. GRÁFICO DE CONTROL DE AVANCE DE OBRA – CURVA S



Mediante la Curva S, se muestra el avance de obra, se observa el avance real acumulado del 70.30% vs. el avance programado del 66.79%, correspondiente al periodo de la valorización de Obra N° 01 del Adicional de obra N° 02 (del 14 hasta el 30 de abril del 2022).

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOR BENEFICOSY HOSPEDEROS - ATE

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

2.9. ACTUALIZACIÓN DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

	MONTO	SIN IGV	CON IGV
A.	Monto de contrato principal	2,258,171.35	2,664,642.19
B.	Deductivo N° 01	55,188.33	65,122.23
C.	Deductivo N° 02	71,226.95	84,047.80
D.	Monto de contrato actualizado	2,131,756.07	2,515,472.16
E.	Adicional de Obra N° 01	62,188.35	73,382.25
F.	Adicional de Obra N° 02	180,466.52	212,950.49
	Monto de Contrato vigente	2,374,410.94	2,801,804.90

	MONTO	SIN IGV	CON IGV	% incidencia
A.	Monto de contrato principal	2,258,171.35	2,664,642.19	100.00%
(F-C)	Total de Costo Adicional	109,239.57	128,902.69	4.8226%
	Monto de Contrato vigente	2,148,931.78	2,535,739.50	

A la fecha se tiene un monto contractual de S/ 2, 515,472.16 (Dos millones quinientos quince mil cuatrocientos setenta y dos con 16/100 soles), incluido IGV.

2.10. AVANCE FINANCIERO DE OBRA

MONTO	CON IGV	% Avance
Presupuesto de Adicional de Obra N° 02	212,950.49	100.00%
Valorización de Obra N° 01	149,695.64	70.30%

Para la presente valorización de adicional de obra se tiene un avance del 70.30 % del monto del presupuesto de adicional de obra.

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546

2.11 VIGENCIA DE CARTAS FIANZAS

DEFINICIÓN	ENTIDAD	MONTO	N° DE CARTA	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 10% del monto de adicional de Obra N° 02	BANCO BANBIF	S/12, 890.30	4410087457.00	07/04/2022	04/10/2022

2.11. ESTADO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CONSTRUCCIÓN (Póliza CAR)

ASEGURADORA	POLIZA N°	MONTO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	23021115100039	S/. 2,801,805.00	31/03/2022	01/07/2022

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOR BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LAMDA LEÓN
Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

2.12. ESTADO DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES

ASEGURADORA	POLIZA N°	VIGENCIA		ESTADO
		DESDE	HASTA	
MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	1012115100058	01/04/2022	01/07/2022	VIGENTE

2.13. ESTADO DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	POLIZA N°	VIGENCIA		ESTADO
		DESDE	HASTA	
MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	2402115100121	31/03/2022	01/07/2022	VIGENTE

2.14. ESTADO DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE LOS TRABAJADORES - (SCTR)

ASEGURADORA	RUBRO	POLIZA O CONTRATO N°	VIGENCIA		ESTADO
			DESDE	HASTA	
MAPFRE PERÚ S.A.	PENSIÓN	7012200006330	01/04/2022	30/04/2022	VIGENTE
MAPFRE PERÚ S.A.	SALUD	7022200007345	01/04/2022	30/04/2022	VIGENTE

2.15. OBSERVACIONES DEL MES

La obra se viene ejecutando por encima del cronograma de ejecución de obra.

- La valorización de obra N° 01 del Adicional de obra N° 02, corresponde al periodo desde el 14 al 30 de abril del 2022.
- Se cumplió con los protocolos de bioseguridad contra el covid 19.
- Se contó con la presencia del personal clave, concluyendo el periodo con:

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

N°	CARGO	PROFESIONAL
01	RESIDENTE DE OBRA	ING. JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
02	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA	ING. HUMBERTO JUNIOR VICTOR RAUL PALOMINO ROMERO
03	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	ING. EDA MIRLA RODRIGUEZ ACHO
04	MAESTRO DE OBRA	SR. MIGUEL ROJAS YURIVILCA
05	ALMACENERO DE OBRA	SR. WILLIAM PEREZ MOLINA
06	TÉCNICO DE ENFERMERÍA	LIC. CINTHIA PAOLA AMAYA MANYAVILCA
07	ADMINISTRADOR DE OBRA	LIC. ANÍBAL GEREMÍAS COSME MOLINA
08	CONTADOR	LIC. EDWIN YAURI BALDOCEDA

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOR BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE

2.16. CONCLUSIONES

- En obra estamos cumpliendo los procedimientos constructivos y cualquier consulta o decisión se coordina con la supervisión.
- Se cumplió con los lineamientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, como con el Plan De Vigilancia y Prevención en el Trabajo Covid19- Senasa Ate.
- Dentro de los alcances del expediente se busca dar las mejores soluciones para garantizar con los trabajos ejecutados y la garantía de los equipos.


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

3. Hoja de resumen de pago



JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS



.....
RAÚL MONTERO LARRAÍN LEÓN
Representante Común

RESUMEN DE PAGO - VALORIZACION N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02DEL 14 AL 30 DE ABRIL DEL 2022
(EN NUEVOS SOLES)

OBRA

: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRÍANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"

CONTRATO N°

: N° 005-2021-SENASA/PRODESA

PRESUPUESTO APROBADO

: S/ 212,950.49

UBICACIÓN

: Ate Vicos, Lima, Lima

CONTRATISTA

: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Fecha entrega de terreno

: 21/09/2021

SUPERVISIÓN/CONSULTOR

: JOEL EFRAN CHAVARRIA COTRIMA

Plazo de ejecución inicial

: 180 d.c. 05/10/2021 al 03/04/2022

RESIDENTE

: ING. JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO

Sección de plazo N° 01

: 04 días calendario (del 20 al 23/01/2022)

SUPERVISOR

: ING. JOEL EFRAN CHAVARRIA COTRIMA

Ampliación de Obra N° 01

: 07 días calendario (del 07 al 13/04/2022)

Plazo de ejecución

: Del 14/04/2022 al 13/05/2022

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO S/00V	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS	VALORIZACIONES		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
			ANTERIOR	ACTUAL	MONTO S/	%	MONTO S/	%
A. VALORIZACION CONTRACTUAL (V)								
GASTO DIRECTO								
PRESUPUESTO COMPLEMENTO I	158,827.41	0.00	0.00	110,313.66	110,313.66	70.30%	48,513.75	29.70%
TOTAL	158,827.41	0.00	0.00	110,313.66	110,313.66	70.30%	48,513.75	29.70%
AVANCE DE LA OBRA %				70.30%		70.30%		29.70%
B. REAJUSTES (B)				0.00				
SUB TOTAL (B)				0.00				
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)	158,827.41	0.00	0.00	110,313.66	110,313.66		48,513.75	29.70%
C. DEDUCCIONES (D)								
DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO				0.00				
DEDUCCION DEL ADELANTO DE MATERIALES				0.00				
TOTAL DEDUCCIONES (D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
D. AMORTIZACIONES (A)								
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO				0.00				
TOTAL AMORTIZACIONES (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
E. VALORIZACION NETA (VN=VB-D-A)	158,827.41	0.00	0.00	110,313.66	110,313.66		48,513.75	
F. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD								
GASTOS GENERALES 8.00%	12,504.19		0.00	8,829.89	8,829.89		3,729.90	
UTILIDAD 7.00%	10,984.93		0.00	7,721.95	7,721.95		3,292.90	
MONTO TOTAL (E+F)	183,496.52	0.00	0.00	126,865.50	126,865.50		53,636.61	
G. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA								
EN EFECTIVO (VN-D)	158,488.52		0.00	126,865.50	126,865.50		48,513.75	
EN I.G.V. (18%)	22,481.50		0.00	22,824.93	22,824.93		8,390.47	
MONTO TOTAL CON I.G.V.	212,950.49		0.00	149,690.43	149,690.43			
H. TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			0.00	149,690.43	149,690.43			
I. RETENCION FONDO DE GARANTIA								
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO			0.00	0.00	0.00			
RETENCION 5.00%			0.00	7,484.78	7,484.78			
TOTAL RETENCIONES (R)			0.00	7,484.78	7,484.78			
TOTAL MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA			0.00	8,142,216.88				


 JOEL EFRAN CHAVARRIA COTRIMA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 158001


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

4. Valorización



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159301



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LASSO LEÓN
Representante Común

[illegible]


JOSÉ LEGNIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOEL EFRAN CHAVARRIA COTRINA
INGÉNIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSEJO MUNICIPAL
RAÚL MONTERO LANDA (EDN
Representante Ciudad)

5. Resumen de metrados ejecutados



JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS BOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
EMP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

PLANILLA DE METRADOS

PROYECTO *CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS*
TITULO VALORIZACION DE OBRA N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 2
ENTIDAD RESUMEN DE METRADOS
FECHA SENASA/PRODESA
 ABRIL 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES		
01.01.01.01	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES (ALQ. 1 POR MES)	mes	1.00
37257	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	221.18
37622	MOVILIZACION MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		
01.01.03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gbl	0.15
01.01.03.02	FLETE TERRESTRE	gbl	0.15
01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO		
01.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	265.02
01.02	SEGURIDAD Y SALUD		
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OBRA	mes	1.00
01.02.01.02	DENOLICION DE MURO DE SOGA	m²	4.46
01.02.01.03	CORTE DE MURO DE SOGA A DEMOLER	m	7.20
01.02.02	TRABAJOS PROVISIONALES - INFRAESTRUCTURA POR DISTANCIAMIENTO SOCIAL		
01.02.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVAS POR COVID 19	gbl	0.17
01.02.03.02	SEÑALIZACION BASICA DE PREVENCION CONTRA EL CONTAGIO FRENTE AL COVID 19	gbl	0.17
01.02.03	RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS COVID 19		
01.02.03.01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID	mes	1.00
01.02.03.02	CILINDROS METALICOS PARA ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y	gbl	0.17
01.02.04	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL		
01.02.04.01	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL		
01.02.04.02	MASCARILLAS DE PROTECCION	und	12.00
01.02.04.03	PROTECTOR FACIAL DE PVC VINIFAN	und	1.00
01.02.03	MATERIALES DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONTROL Y MEDICION SANITARIA		
01.02.03.01	MEDICAMENTOS VARIOS		
01.02.03.01.01	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 MOLECULARES DE DESCARTE	und	3.00
01.02.03.01.02	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 RAPIDAS DE DESCARTE	und	8.00
02	ESTRUCTURAS		
02.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE CANALETA ANTI HORMIGA	m³	32.57
02.01.02	CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 40CM DE PROFUNDIDAD	m²	174.04
02.01.03	CONFORMACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL DE FONDO DE CANALETA	m²	46.53
02.01.04	ACARREO DE DESMONTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m³	75.64
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA A UNA DISTANCIA PROMEDIO	m³	75.64
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.01	SOLADO C/H 1:10 E=0.10M	m²	46.53
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.01	DINTELES		
02.03.01.01	DINTELES - CONCRETO FC=175KG/CM2	m²	0.05
02.03.01.02	DINTELES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	0.82
02.03.01.03	DINTELES - ACERO FY=4200KG/CM2	kg	9.76
02.03.02	BASE MESAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.02.01	BASE DE MESAS DE CONCRETO - CONCRETO FC=210KG/CM2	m³	1.42
02.03.02.02	BASE DE MESAS DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	41.02
02.03.02.03	BASE DE MESAS DE CONCRETO - ACERO FY=4200KG/CM2	kg	114.17
02.03.03	CANALETA ANTI HORMIGAS		
02.03.03.01	CANALETA ANTI HORMIGAS Fc= 210 kg/cm2	m³	16.29

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159301

02.03.03.02	CANAleta ANTI HORMIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	86.42
02.03.03.03	CANAleta ANTI HORMIGAS - ACERO FY= 4200 kg/cm²	kg	365.74
02.04	OTROS		
02.04.01	JUNTA EN VEREDA E=1/2" CON SELLO FLEXIBLE	m	131.75
03	ARQUITECTURA		
03.01	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
03.01.01	TARRAJEO DE BASES DE MUEBLES C/MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM	und	37.25
03.01.02	VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15M MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM	m	7.20
03.01.03	VESTIDURA DE BORDES DE CANAleta CON ACABADO PULIDO CENTRAL CURVO	m	141.76
03.02	PINTURAS		
03.02.01	PINTURA OLEO EN CIELORASO Y VIGAS	m²	880.52
03.02.02	PINTURA EPOXICA EN CIELORASO Y VIGAS	m²	163.54
03.02.03	PINTURA OLEO EN MUROS INTERIORES DOS MANOS	m²	2,201.92
03.02.04	PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES DOS MANOS	m²	503.45
03.03	VARIOS		
03.03.01	POZA DE DRENAJE DE AUTOCLAVE	gbl	1.00
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
04.01.01	VALVULAS		
04.01.01.01	VALVULA DE BOLA DE 2"	und	
04.02	DESAGUE Y VENTILACION		
04.02.01	SALIDAS DE DESAGUE		
04.02.01	SALIDA DE DRENAJE DE AGUA DE CANAleta SINFIN DE Ø2"	pto	5.00
04.02.02	REUBICACION DE DESAGUE DE 2"	pto	1.00
04.02.02	CAMARAS DE INSPECCION		
04.02.02.01	CAMARAS DE INSPECCION	und	3.00
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
05.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y FUERZA		
05.01.01	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES		
05.01.01.01	REUBICACION SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L/T	pto	4.00
05.01.02	SALIDAS DE FUERZA		
05.01.02.01	SALIDA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100AMP.	und	1.00
05.01.03	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS		
05.01.03.01	CORTE DE PISO Y PARED INCL. RESANE	m	30.30
05.01.03.02	TUBERIA PVC SAP 40 mm	m	30.30
05.01.04	CAJAS DE PASE		
05.01.04.01	TAPA TIPO FLUSH 200 x 200	und	1.00
05.02	TABLEROS E INTERRUPTORES		
05.02.01	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS		
05.02.01.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100A	und	2.00
05.02.02	CONDUCTORES Y/O CABLES		
05.02.02.01	CABLE LSDH 1X35MM²	m	96.90
05.02.03	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO		
05.02.03.01	LUMINARIA RECTANGULAR LED DE 72W 8863 LM IP65	und	78.00


 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 MARIO MONTERO LAMALLEÓN
 Representante Común

SUSTENTO DE PLANILLA DE METRADOS OBRAS PROVISIONALES

PROYECTO: EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRUZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y PESTICIDAS

TÍTULO: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

ENTREGA: SENASA, PROCESA

FECHA: MARZO 2022

ITEM	DESCRIPCION	U.D.	CANT.	Longitud (m)	Área (m²)	Vol. (m³)	PESO (kg)	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD							
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES							
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES							
01.01.01.01	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES (AÑO 1 POR MES)	m³	1.00					1.00
01.01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES							-
01.01.01.03	LIMPIEZA DEL TERRENO MARCADO	m²	221.36					221.36
01.01.01.04	MOVILIZACION MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS							-
01.01.01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gm	0.15					0.15
01.01.01.06	FLUJO TEMPORAL	gm	0.15					0.15
01.01.04	TRAZO, MOVILES Y REPLANTEO							
01.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	205.02					205.02
01.02	SEGURIDAD Y SALUD							-
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01.01	LIMPIEZA Y DESPRENSION DE OBRA	m³	1.00					1.00
01.02.01.02	DEMOLICION DE MURO DE OBRA	m²	4.45					4.45
01.02.01.03	CORTE DE MURO DE OBRA A BORDOS	m	7.20					7.20
01.02.01.04	TRABAJOS PROVISIONALES - ATRASESTRUCTURA POR DISTANCIAMIENTO SOCIAL							-
01.02.01.05	GRUPOS DE PROTECCION COLECTIVA POR COVID 19	gm	0.17					0.17
01.02.01.06	SEÑALIZACION PASIVA DE PREVENCIÓN CONTRA EL CONTIGO FRENTE AL COVID 19	gm	0.17					0.17
01.02.01.07	RESERVOIRIOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS COVID 19	m³	1.00					1.00
01.02.01.08	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MANEJO DE LA ENFERMEDAD SINTOMATICA DEL COVID 19	gm	0.17					0.17
01.02.01.09	GRUPOS DE PROTECCION PERSONAL							-
01.02.01.10	GRUPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL	gm	0.17					0.17
01.02.01.11	MAQUINARIA DE PROTECCION	und	12.00					12.00
01.02.01.12	PROTECCION FACIAL DE PROYECTOR	und	1.00					1.00
01.02.02	MATERIALES DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONTROL Y MEDICION SANITARIA							
01.02.02.01	MEDICAMENTOS VARIOS							-
01.02.02.02	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 MOLECULAR DE DESGASTE	und	3.00					3.00
01.02.02.03	KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 RAPIDO DE DESGASTE	und	8.00					8.00


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 R.O.C. N° 146815


JOSÉ LEONIDAS SOSA YAC
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

SUSTENTO DE PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURAS

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRUZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS"
TITULO ESTRUCTURAS
ENTIDAD SENASA/PRODESA
FECHA ABRIL 2022

ITEM	DESCRIPCION	UBICACION	UNO	CANT	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	PARCIAL	TOTAL
2.02	ESTRUCTURAS								
2.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE								
02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE CANALETA ARTI HORMIGA		M3						22.67
	Eje horizontal			1.00	26.95	0.35	0.70	6.80	
	Eje A con I-B			1.00	2.63	0.35	0.70	0.64	
	Eje P con O-1			1.00	29.57	0.35	0.70	7.24	
	Eje H con O-6								
	Eje vertical								
	Eje I con P-G			1.00	10.65	0.35	0.70	2.61	
	Eje I con C-F			1.00	26.25	0.35	0.70	6.43	
	Eje I con A-H			1.00	36.90	0.35	0.70	9.04	
02.01.02	CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 40CM DE PROFUNDIDAD		M2						174.04
	Eje horizontal								
	Eje A con I-B			1.00	29.46	1.25	1.00	36.83	
	Eje F con O-1			1.00	2.67	1.25	1.00	3.34	
	Eje H con O-6			1.00	32.10	1.25	1.00	40.13	
	Eje vertical								
	Eje I con F-P			1.00	11.25	1.25	1.00	14.06	
	Eje I con A-H			1.00	26.25	1.25	1.00	32.61	
	Eje I con A-H			1.00	37.50	1.25	1.00	46.88	
02.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL DE FONDO DE CANALETA		M2						46.53
	Base								
	Eje horizontal								
	Eje A con I-B			1.00	26.95	0.35	1.00	9.43	
	Eje P con O-1			1.00	2.63	0.35	1.00	0.92	
	Eje H con O-6			1.00	29.57	0.35	1.00	10.35	
	Eje vertical								
	Eje I con F-B			1.00	10.65	0.35	1.00	3.73	
	Eje I con C-F			1.00	26.25	0.35	1.00	9.19	
	Eje I con A-H			1.00	36.90	0.35	1.00	12.92	
02.01.04	ACARREO DE DESMONTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION		M3						75.64
	Eje horizontal								
	Eje A con I-B			1.00	26.95	0.35	0.70	6.80	
	Eje P con O-1			1.00	2.63	0.35	0.70	0.64	
	Eje H con O-6			1.00	29.57	0.35	0.70	7.24	
	Eje vertical								
	Eje I con P-G			1.00	10.65	0.35	0.70	2.61	
	Eje I con C-F			1.00	26.25	0.35	0.70	6.43	
	Eje I con A-H			1.00	36.90	0.35	0.70	9.04	
	Corte de terreno								
	Eje horizontal								
	Eje A con I-B			0.50	29.46	1.25	0.35	6.44	
	Eje F con O-1			0.50	2.67	1.25	0.35	0.58	
	Eje H con O-6			0.50	32.10	1.25	0.35	7.02	
	Eje vertical								
	Eje I con F-P			0.50	11.25	1.25	0.35	2.46	
	Eje I con A-H			0.50	26.25	1.25	0.35	5.74	
	Eje I con A-H			0.50	37.50	1.25	0.35	8.20	
								63.03	
								12.61	
								75.64	
02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA A UNA DISTANCIA PROMEDIO 300M		M3						75.64
	Eje horizontal								
	Eje A con I-B			1.00	26.95	0.35	0.70	6.80	
	Eje P con O-1			1.00	2.63	0.35	0.70	0.64	
	Eje H con O-6			1.00	29.57	0.35	0.70	7.24	
	Eje vertical								
	Eje I con P-G			1.00	10.65	0.35	0.70	2.61	
	Eje I con C-F			1.00	26.25	0.35	0.70	6.43	
	Eje I con A-H			1.00	36.90	0.35	0.70	9.04	
	Corte de terreno								
	Eje horizontal								
	Eje A con I-B			0.50	29.46	1.25	0.35	6.44	
	Eje F con O-1			0.50	2.67	1.25	0.35	0.58	
	Eje H con O-6			0.50	32.10	1.25	0.35	7.02	
	Eje vertical								
	Eje I con F-P			0.50	11.25	1.25	0.35	2.46	
	Eje I con A-H			0.50	26.25	1.25	0.35	5.74	
	Eje I con A-H			0.50	37.50	1.25	0.35	8.20	
								63.03	
								12.61	
								75.64	

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRIL
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 474545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
SAUL MONTERO CAMA LEON
Representante Común

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE								
02.02.01	SOLADO C/H 1:30 E=0,10M		M2						45.53
		Base							
		Eje horizontal							
		Eje A con 1-6		1.00	29.55	0.35	1.00	9.43	
		Eje P con 0-1		1.00	2.63	0.35	1.00	0.92	
		Eje H con 0-6		1.00	29.57	0.35	1.00	10.35	
		Eje vertical							
		Eje 1 con P-G		1.00	10.85	0.35	1.00	3.73	
		Eje 1 con C-F		1.00	26.25	0.35	1.00	9.19	
		Eje 1 con A-H		1.00	36.90	0.35	1.00	12.92	
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO								
02.03.01	DINTELES								
02.03.01.01	DINTELES - CONCRETO FC=170KG/CM2		M3						0.69
		Base							
		Tipo 1		1.00	1.60	0.15	0.20	0.05	
02.03.01.02	DINTELES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL		M2						0.93
		Tipo 1		1.00	3.20	0.20		0.64	
				1.00	1.20	0.15		0.18	
02.03.01.03	DINTELES - ACERO FY=4200KG/CM2		KG						9.76
				1.00	9.76				
02.03.02	BASE MESAS DE CONCRETO ARMADO								
02.03.02.01	BASE DE MESAS DE CONCRETO - CONCRETO FC=210KG/CM2		M3						1.42
		Base							
		Tipo 1		41.00	0.47	0.08	0.80	1.23	
		Tipo 2		3.60	0.95	0.09	0.80	0.18	
02.03.02.02	BASE DE MESAS DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL		M2						41.02
		Tipo 1		41.00	1.10	0.90	38.08		
		Tipo 2		3.00	2.56	0.80	4.94		
02.03.02.03	BASE DE MESAS DE CONCRETO - ACERO FY=4200KG/CM2		KG						9.76
				1.00	9.76				
02.03.03	CANALETAS ANTI HORMIGAS								
02.03.03.01	CANALETAS ANTI HORMIGAS FC= 210 kg/cm2		M3						16.29
		Eje horizontal							
		Eje A con 1-6		1.00	35.95	0.35	0.35	3.30	
		Eje P con 0-1		1.00	2.63	0.35	0.35	0.32	
		Eje H con 0-6		1.00	29.57	0.35	0.35	3.62	
		Eje vertical							
		Eje 1 con P-G		1.00	10.85	0.35	0.35	1.30	
		Eje 1 con C-F		1.00	26.25	0.35	0.35	3.22	
		Eje 1 con A-H		1.00	36.90	0.35	0.35	4.52	
02.03.03.02	CANALETAS ANTI HORMIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL		M2						86.42
		Eje A con 1-6		1.00	29.55	0.35	9.43		
		0.00		1.00	35.95	0.30	8.03		
		Eje P con 0-1		1.00	2.63	0.35	0.92		
		0.00		1.00	2.63	0.30	0.79		
		Eje H con 0-6		1.00	29.57	0.35	10.35		
		0.00		1.00	29.57	0.30	8.07		
		Eje vertical							
		Eje 1 con P-G		1.00	10.85	0.35	3.73		
		0.00		1.00	10.85	0.30	3.50		
		Eje 1 con C-F		1.00	26.25	0.35	9.19		
		0.00		1.00	26.25	0.30	7.88		
		Eje 1 con A-H		1.00	36.90	0.35	12.92		
		0.00		1.00	36.90	0.30	11.07		
02.03.03.03	CANALETAS ANTI HORMIGAS - ACERO FY= 4200 kg/cm2		KG						395.74
				1.00	395.74				


 JOEL ERRASTI / INGENIERIA CIVIL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANZA LEÓN
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001



SUSTENTO DE PLANILLA DE METRADOS - SANITARIAS

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS"
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS
ENTIDAD SENASA/PRODESA
FECHA ABRIL 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
04.01.01	VALVULAS		
04.01.01.01	VALVULA DE BOLA DE 2"	und	
04.02	DESAGUE Y VENTILACION		
04.02.01	SALIDAS DE DESAGUE		
04.02.01	SALIDA DE DRENAJE DE AGUA DE CANALETA SINFIN DE Ø2"	pto	5.00
04.02.02	REUBICACION DE DESAGUE DE 2"	pto	1.00
04.02.02	CAMARAS DE INSPECCION		
04.02.02.01	CAMARAS DE INSPECCION	und	3.00


 JOEL EFRAIN CHIVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 PAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

SUSTENTO DE PLANILLA DE METRADOS

PROYECTO *CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS*
ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ENTIDAD SENASA/PRODESA
FECHA ABRIL 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
05.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y FUERZA		
05.01.01	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES		
05.01.01.01	REUBICACION SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L/T	pto	4.00
05.01.02	SALIDAS DE FUERZA		
05.01.02.01	SALIDA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100AMP.	und	1.00
05.01.03	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS		
05.01.03.01	CORTE DE PISO Y PARED INCL. RESANE	m	30.30
05.01.03.02	TUBERIA PVC SAP 40 mm	m	30.30
05.01.04	CAJAS DE PASE		
05.01.04.01	TAPA TIPO PLUSH 200 x 200	und	1.00
05.02	TABLEROS E INTERRUPTORES		
05.02.01	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS		
05.02.01.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100A	und	2.00
05.02.02	CONDUCTORES Y/O CABLES		
05.02.02.01	CABLE LSCH 1X35MM ²	m	96.90
05.02.03	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO		
05.02.03.01	LUMINARIA RECTANGULAR LED DE 72W 8863 LM IP65	und	78.00



JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174548



JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDALEÓN
 Representante Común

6. Curva "S"



JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS



RAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Ministerio
de Agricultura y Riego

U.E. N° 02: PROGRAMA DE DESARROLLO DE MANEJO AGROPECUARIO - PMADESA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

SENASA
PERU

CURVA "S" - VALORIZACION N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02

DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2022
(EN SOLES)

UBICACIÓN DEL LAB: MUNICIPIO DE CHAUCA DE BAYOS INTERIORES Y HIGUEROS - A.T.

PROYECTO: 002-001-SENASA/PROYECTOS

Ala: Ycaja, Lima, Ica

Fecha: 21/08/2022

Fecha de inicio de obra: 15/08/2022

Fecha de ejecución de obra: 23/01/2023

OT: con calendario del 01 al 13/08/2022

Del 14/08/2022 al 13/08/2023

PREPUESTA: 700 APPROXIMADO
CONTRATISTA:
SUPERVISOR: CONSULTOR
PRESIDENTE:
SUPERVISOR:

CONSEJO DE BAYOS INTERIORES
JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
ING. JOSE LEONIDAS ROSA YACTAYO
ING. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA

FECHA	DEL 01 AL 13/08/2022	DEL 14 AL 20/08/2022	DEL 01 AL 13/08/2023
% PROGRAMADO	0.00%	0.00%	100.00%
% EJECUTADO	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO

CUADRO COMPARATIVO ENTRE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO VS. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO



NOTA: PARA VERIFICAR VALORES ACUMULADOS

→ S PROGRAMADO → S EJECUTADO

[Signature]

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174513

[Signature]

JOSE LEONIDAS ROSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 139001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
SENASA
INGENIERO CIVIL
INGENIERO CIVIL

7. Resumen general de valorizaciones



JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



PERU
Ministerio
de Agricultura y Riego

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

SENASA
- PERU

U.E. N° 02: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PROCESA

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES - OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE

(En Soles)

Contratista	CONSORCIO MULTIPROYECTOS		
Beneficiario de obra	JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO		
Supervisor/Representante de obra	ING. JOEL STRAIN Chavarria Cotrina		
Obra	"CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"		

N° de Contrato	N° 037-2021-SENASA/PROD045A
Plazo de ejecución (D.C)	180
Fecha entrega de terreno	11/09/2021
Suspensión de plazo N° 01	Del 20 al 24/01/2022
Ampliación de obra N° 01	Del 07 al 13/04/2022
Fecha Inicio	14/04/2022
Fecha Termina	13/06/2022
Plazo de ejecución (D.C)	30

MONTOS	NETO	IGV	BRUTO
Contractual	180,466.52	32,483.97	212,950.49
TOTAL	180,466.52	32,483.97	212,950.49

ADOLAMTO	NETO	IGV	BRUTO	INCIDENCIA
Contractual	0.00	0.00	0.00	0.00%

N° de Valorización	Valorización del Pedido (A)	Adiantos del Anticipo (B)	Amortización (C)	Valorización Neta (D)	IGV (E)	Montos Neta a Pagar (F)	Retención 5% (G)	Montos Neta a Pagar (H)
Anticipo	125,850.70	0.00	0.00	125,850.70	22,834.93	148,685.63	7,434.28	141,251.35
Parcial	125,850.70	0.00	0.00	125,850.70	22,834.93	148,685.63	7,434.28	141,251.35
Total General	125,850.70	0.00	0.00	125,850.70	22,834.93	148,685.63	7,434.28	141,251.35

Avance Físico	Actual	Acumulado
	70.50%	70.50%
	0.00%	0.00%

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
PAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOEL STRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Rsg. CIP N° 174545

8. Total de pagos a cuenta por valorizaciones de obra



JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRIMA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



PERU
Ministerio de Agricultura y Riego

U.L. N° 01 PROBLEMA DE PLAGA DEL DE SAN BLAS AGROPECUARIA - MODELO

PASOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA: LABORATORIO DE CRANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPERIOS - ATE

(En Soles)

Contrato	CONSORCIO MULTIPROVECTOS		
Beneficiario de obra	JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO		
Beneficiario de obra	Ing. Joel Efraim Chavarria Cotrina		
Obra	LABORATORIO DE CRANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPERIOS - ATE		
MONTOS	NETO	IGV	BRUTO
Contractual	320,483.51	23,483.87	343,967.38
TOTAL	320,483.51	23,483.87	343,967.38

N° de Contrato	N° 027-2021-SENASA/PRODESA		
Plazo de ejecución (D/C)	180		
Fecha entrega de obra	21/06/2021		
Suspensión de obra N° 01	Del 20 al 23/01/2022		
Ampliación de obra N° 02	Del 07 al 13/04/2022		
Fecha inicio	14/04/2022		
Fecha término	13/06/2022		
Plazo de ejecución (D/C)	30		

N° de Valoración	VALORIZACIONES EJECUTADAS				VALORIZACION		RENTACION		NETO A PAGAR	
	VALORIZACION V	RENTA R	DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO	DEDUCCION POR ADELANTO MATERIALES	BRUTO VB	DIRECTO D	MATERIALES M	AMORTIZACION MA	NETA VN=VB-MA	RENTA RN
Valoración N° 01 - Del 14 al 30/04/2022	5/ 126,860.71	8/ 9.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 126,860.71	5/ 0.00	5/ 0.00	8/ 0.00	5/ 126,860.71	5/ 7,484.78
TOTAL	126,860.71	9.00	0.00	0.00	126,860.71	0.00	0.00	0.00	126,860.71	7,484.78
									32,834.93	142,215.69

CONSORCIO MULTIPROVECTOS
Ing. JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
CIP N° 159001

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

9. Calendario valorizado de obra



JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - ADICIONAL DE OBRA N° 02

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRANZA DE INSECTOS
BENEFICIOS Y HOSPEDEROS
Entidad: SEMASA - SEDE ATE
Ubicación: Distrito Alca Viente, Provincia Lima y Departamento de Lima
Contratista: Consorcio MultiProyectos

Monto Adicional de Obra N° 02:

S/ 212,890.48

Plazo:

30

Días Calendarios

Fecha de Inicio Construcción:

14/04/2022

Fecha Culminación de Obra:

13/05/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/	PARCIAL S/	MES 1		MES 2	
						30 días calendario			
						14 al 29 abril		01 al 13 de mayo	
1	ADICIONAL DE OBRA N° 02								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD								
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES Y TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1.1	CONTRATACIONES PRELIMINARES								
1.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS POTENCIALES (S/ 1 POR MES)	mes	1.00	S/ 648.33	S/ 648.33	S/ 648.33			
1.1.1.1.2	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1.1.2.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MAJAL	m²	221.16	S/ 3.79	S/ 838.27	S/ 838.27			
1.1.1.1.3	MOVILIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS								
1.1.1.1.3.1	MOVILIZACIÓN Y DEMOLICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gbl	8.00	S/ 1,000.00	S/ 248.89	S/ 248.89			
1.1.1.1.3.2	PISTE TERRAPLEN	gbl	8.00	S/ 1,000.00	S/ 248.89	S/ 248.89			
1.1.1.1.4	TRABAJO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN								
1.1.1.1.4.1	TRABAJO Y REPARACIÓN PRELIMINAR	m²	285.00	S/ 7.10	S/ 2023.50	S/ 2023.50			
1.1.2	SEGURIDAD Y SALUD								
1.1.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.2.1.1	LIMPIEZA Y DEMOLICIÓN DE OBRA	mes	1.00	S/ 1,004.89	S/ 1,004.89	S/ 1,004.89			
1.1.2.1.2	DEMOLICIÓN DE MURO DE SOTA	m²	4.48	S/ 23.39	S/ 104.72	S/ 104.72			
1.1.2.1.3	CORTE DE MURO DE SOTA A DAVANILA	m	7.20	S/ 9.36	S/ 67.39	S/ 67.39			
1.1.2.2	TRABAJOS PRELIMINARES - INFRAESTRUCTURA POR DESARROLLO SOCIAL								
1.1.2.2.1	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA POR COVID-19	gbl	0.17	S/ 1,880.36	S/ 267.20	S/ 267.20			
1.1.2.2.2	SOLUCIÓN DE OBRA DE PREVENCIÓN CONTRA EL CONTAGIO POR COVID-19	gbl	0.17	S/ 886.15	S/ 107.91	S/ 107.91			
1.1.2.3	RECURSOS HUMANOS PRELIMINARES Y DE PREVENCIÓN COVID-19								
1.1.2.3.1	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL AREA DE LA SEGURIDAD SANITARIA DEL COVID-19	mes	1.00	S/ 432.74	S/ 432.74	S/ 432.74			
1.1.2.3.2	QUEDAR DE MATERIALES PARA ACCIÓN TEMPORAL DE RECURSOS HUMANOS PRELIMINARES Y DE PREVENCIÓN COVID-19	gbl	0.17	S/ 345.35	S/ 41.00	S/ 41.00			
1.1.2.4	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL								
1.1.2.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL	gbl	0.17	S/ 1,374.62	S/ 233.69	S/ 233.69			
1.1.2.4.2	MASCARILLAS DE PROTECCIÓN	und	12.00	S/ 35.09	S/ 421.08	S/ 421.08			
1.1.2.4.3	PROTECCIÓN FACIAL DE PVC SIFON	und	1.00	S/ 4.43	S/ 4.43	S/ 4.43			
1.1.2.5	INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS DE CONTROL Y INSPECCIÓN SANITARIA								
1.1.2.5.1	INDICADORES SANITARIOS								
1.1.2.5.1.1	BIT DE PINTURA PARA COLOREAR LOS INDICADORES DE DESCRIPCIÓN	und	3.08	S/ 192.27	S/ 579.21	S/ 579.21			
1.1.2.5.1.2	BIT DE PINTURA PARA COLOREAR LOS INDICADORES DE DESCRIPCIÓN	und	6.00	S/ 48.73	S/ 292.34	S/ 292.34			
1.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS								
1.2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS								
1.2.1.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO								
1.2.1.1.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m²	32.52	S/ 38.78	S/ 1,259.08	S/ 1,259.08			
1.2.1.1.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m²	174.04	S/ 8.83	S/ 1,536.68	S/ 1,536.68			
1.2.1.1.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m²	40.53	S/ 9.48	S/ 441.10	S/ 441.10			
1.2.1.1.4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m²	75.64	S/ 14.81	S/ 1,106.10	S/ 1,106.10			
1.2.1.1.5	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m²	75.64	S/ 33.81	S/ 2,421.24	S/ 2,421.24			
1.2.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE								
1.2.2.1	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	m²	48.53	S/ 28.49	S/ 1,372.17	S/ 1,372.17			
1.2.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO								
1.2.3.1	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m²	8.85	S/ 467.85	S/ 205.85	S/ 205.85			
1.2.3.1.1	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m²	8.85	S/ 63.14	S/ 558.55	S/ 558.55			
1.2.3.1.2	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	kg	8.79	S/ 4.89	S/ 42.43	S/ 42.43			
1.2.3.2	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m²	1.42	S/ 374.89	S/ 531.15	S/ 531.15			
1.2.3.2.1	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m²	41.82	S/ 45.80	S/ 1,912.82	S/ 1,912.82			
1.2.3.2.2	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	kg	154.17	S/ 4.89	S/ 754.87	S/ 754.87			
1.2.3.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m²	16.29	S/ 438.56	S/ 7,166.45	S/ 7,166.45			
1.2.3.3.1	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m²	88.42	S/ 48.80	S/ 4,303.72	S/ 4,303.72			
1.2.3.3.2	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	kg	285.74	S/ 4.89	S/ 1,377.58	S/ 1,377.58			
1.2.4	OBRAS								
1.2.4.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m	101.75	S/ 21.40	S/ 2,178.45	S/ 2,178.45			
1.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS								
1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO								
1.3.1.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO	und	37.35	S/ 62.64	S/ 2,333.34	S/ 2,333.34			
1.3.1.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m	7.30	S/ 13.99	S/ 102.13	S/ 102.13			
1.3.1.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m	141.78	S/ 42.65	S/ 6,027.87	S/ 6,027.87			
1.3.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS								
1.3.2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m²	850.82	S/ 20.91	S/ 17,781.87	S/ 17,781.87			
1.3.2.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m²	103.54	S/ 33.21	S/ 3,438.50	S/ 3,438.50			
1.3.2.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m²	2,201.82	S/ 19.07	S/ 41,985.01	S/ 41,985.01			
1.3.2.4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m²	503.45	S/ 33.21	S/ 16,718.57	S/ 16,718.57			
1.3.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS								
1.3.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO	gbl	1.00	S/ 284.29	S/ 284.29	S/ 284.29			
1.4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS								
1.4.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACCESORIOS								
1.4.1.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	und	7.08	S/ 197.67	S/ 1,399.69	S/ 1,399.69			
1.4.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS								
1.4.2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	gbl	7.08	S/ 122.65	S/ 868.36	S/ 868.36			
1.4.2.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	gbl	1.00	S/ 83.59	S/ 83.59	S/ 83.59			
1.4.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS								
1.4.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	und	7.08	S/ 223.79	S/ 1,584.63	S/ 1,584.63			
1.5	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS								
1.5.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS								

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LAMPA LEÓN
Representante Común

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - ADICIONAL DE OBRA N° 02

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRUZADA DE INSECTOS
BENEFICIOS Y HOSPEDAJE
Entidad: SENASA - SEGE ATE
Ubicación: Distrito Alto Viterbo, Provincia Lima y Departamento de Lima.
Contratista: Consorcio Multiproyectos

Monto Adicional de Obra N° 02:

S/ 212,990.49

Plazo:

38

Días Calendarios

Fecha de Inicio Construcción:

14/02/2022

Fecha Calificación de Obra:

19/03/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO DL	PARCIAL DL	MES 1		MES 2	
						18 días calendario			
						14 al 28 de feb		01 al 12 de mayo	
1.5.1.1	REJILLA PARA TOMACORRIENTES								
1.5.1.1.1	REJILLA PARA TOMACORRIENTES (OPCIONAR DE 1/2" A 1/4")	plm	4.83	S/ 64.40	S/ 312.48			S/	337.88
1.5.1.2	CAJAS DE FIBRA								
1.5.1.2.1	CAJAS DE FIBRA PARA TOMACORRIENTES DE 1/2" A 1/4"	und	1.83	S/ 144.34	S/ 144.34	S/	144.34		
1.5.1.3	CABLEADO PARA FIBRA								
1.5.1.3.1	CABLE DE FIBRA Y FIBRA DE 1/2" A 1/4"	m	30.32	S/ 28.90	S/ 876.99	S/	876.99		
1.5.1.3.2	FIBRA PVC 1/2" A 1/4"	m	30.32	S/ 15.17	S/ 460.85	S/	460.85		
1.5.1.4	CAJAS DE FIBRA								
1.5.1.4.1	CAJA DE FIBRA 1/2" A 1/4"	und	1.83	S/ 81.87	S/ 81.87	S/	81.87		
1.5.1.5	INTERFACES DE FIBRA								
1.5.1.5.1	INTERFACES DE FIBRA 1/2" A 1/4"	und	2.80	S/ 179.33	S/ 504.00	S/	504.00		
1.5.1.6	CONDUCTORES Y CABLES								
1.5.1.6.1	CABLE 1/2" A 1/4"	m	66.90	S/ 33.47	S/ 2,238.24	S/	2,238.24		
1.5.1.7	INTERFACES DE FIBRA								
1.5.1.7.1	INTERFACES DE FIBRA 1/2" A 1/4"	und	78.00	S/ 288.00	S/ 22,464.00	S/	22,464.00		
	COSTO DIRECTO				S/ 180,827.41	S/ 180,827.41	S/	57,122.18	
	GASTOS GENERALES (8.5%)				S/ 15,269.83	S/ 15,269.83	S/	4,654.77	
	UTILIDAD (2.0%)				S/ 3,616.92	S/ 3,616.92	S/	1,094.05	
	SUB TOTAL				S/ 199,714.16	S/ 199,714.16	S/	62,871.00	
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV (18%)				S/ 35,948.55	S/ 35,948.55	S/	10,793.25	
	PREDIPOSITO TOTAL INICIAL				S/ 235,662.71	S/ 235,662.71	S/	73,787.58	

AVANCE PROGRAMADO	142,228.76	16,728.76
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	142,228.76	212,990.49
AVANCE PROGRAMADO EN PORCENTAJE	60.35%	33.31%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO EN PORCENTAJE	60.35%	100.00%

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL AGUIRRE AGUIRRE
Representante General

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

10. Amortización de adelanto directo y de materiales



JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

No aplica



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174515



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

11. Copia de cuaderno de obra




JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 343

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 16/04/2022 20:35

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE CONTINUA A LA ESPERA DE LA ADENDA DEL ADICIONAL 02

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174549



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 343

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 16/04/2022 20:35

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE CONTINUA A LA ESPERA DE LA ADENDA DEL ADICIONAL 02

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS 2 ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 344

Título EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora 19/04/2022 09:42

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: POR MOTIVOS DE INTERNET DEL ASIENTO DEL DIA 18-04-2022
SE ESTA PREPARANDO LOS CRONOGRAMAS DEL ADICIONAL 02 Y ACTUALIZANDO LOS
CRONOGRAMAS
Y SE ESTA DANDO INICIO LAS ACTIVIDADES DEL ADICIONAL 02 DE LA ADENDA 03

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIN CHAMARRA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contralista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 345

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 19/04/2022 23:24

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE DEJA CONSTANCIA QUE SE TUVO PROBLEMAS PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL COD; POR LO TANTO, SE PROCEDE CON EL LLENADO DEL ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL DEL DÍA MIERCOLES 13 DE ABRIL DEL 2022, INDICANDO LO SIGUIENTE:

QUE CON FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SE SUSCRIBIÓ LA ADENDA N°03 AL CONTRATO DE OBRA N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II, RESPECTO A LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL N°02 Y DEDUCTIVO N°02.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 158001


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 346

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 19/04/2022 23:29

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE DEJA CONSTANCIA QUE SE TUVO PROBLEMAS PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL COD; POR LO TANTO, SE PROCEDE CON EL LLENADO DEL ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL DEL DÍA SÁBADO 16 DE ABRIL DEL 2022, INDICANDO LO SIGUIENTE:
- SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS DÍAS JUEVES 14 Y VIERNES 15 DE ABRIL, FUERON DÍAS FERIADOS NO LABORABLES EN OBRA.

- QUE CON FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, HABIÉNDOSE SUSCRITO LA ADENDA N°03 AL CONTRATO DE OBRA N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II, RESPECTO A LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL N°02 Y DEDUCTIVO N°02. SE PROCEDIÓ A SOLICITAR AL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174345


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero CMI
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS L ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 347

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 19/04/2022 23:34

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE DEJA CONSTANCIA QUE SE TUVO PROBLEMAS PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL COD; POR LO TANTO, SE PROCEDE CON EL LLENADO DEL ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL DEL DÍA LUNES 18 DE ABRIL DEL 2022, INDICANDO LO SIGUIENTE:

- QUE CON FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, HABIÉNDOSE SUSCRITO LA ADENDA N°03 AL CONTRATO DE OBRA N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II, RESPECTO A LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL N°02 Y DEDUCTIVO N°02. SE PROCEDIÓ A SOLICITAR AL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA.

- ASÍ TAMBIEN SE COORDINÓ CON EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, CONTINUAR CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL N°02, HABIÉNDOSE APROBADO MEDIANTE LA ADENDA N°03 AL CONTRATO DE EJECUCIÓN.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
SAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 348

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 19/04/2022 23:44

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: - EL DÍA DE HOY SE DEJA CONSTANCIA QUE SE COORDINÓ CON EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, CONTINUAR CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL N°02, HABIÉNDOSE APROBADO MEDIANTE LA ADENDA N°03 AL CONTRATO DE EJECUCIÓN.

- SE COORDINO CON EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, RESPECTO LOS CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS TANTO DEL CONTRACTUAL MODIFICADO, COMO DEL ADICIONAL DE OBRA N°02.

- SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATISTA VIENE FORMULANDO SU AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 POR LOS 30 DÍAS CALENDARIO QUE RESULTA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL ADICIONAL N°02; POR LO TANTO, SE SOLICITA PRESENTAR A LA BREVEDAD PARA SU RESPECTIVA EVALUACIÓN Y CONFORMIDAD PARA SER REMITIDO A LA ENTIDAD Y SER APROBADO CON ADENDA. SIN EMBARGO, SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS 30 DÍAS CALENDARIO DE SER APROBADO INICIARÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITA LA ADENDA N°03 DE APROBACION DEL ADICIONAL N°02.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEGNIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS, ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 349

Título: EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora: 20/04/2022 22:24

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Por problema de internet se actualiza asiento del día 19-04-2022

Se viene controlando los lineamientos de bioseguridad

Se viene ejecutando las partidas del adicional en cuanto a la pintura y el canal antihormigas

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Consón


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS L ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 350

Título: EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora: 20/04/2022 22:30

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se viene controlando los lineamientos de bioseguridad
Se viene avanzando con el adicional 02 en las partidas de canal antihormigas,
Las actividades del área del autoclave
Y tratamiento de pintura en los muros interiores y cielo raso

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CLAVARRÍA CÓRREA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS, ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 351

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 20/04/2022 23:51

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE DEJA CONSTANCIA VIENE CUMPLIENDO CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19.

ASÍ TAMBIEN SE DEJA CONSTANCIA QUE SE VIENE AVANZANDO CON EL ADICIONAL 02, CORRESPONDIENTE CON LAS PARTIDAS DEL CANAL ANTIHORMIGAS, LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DEL AUTOCLAVE.

SE VERIFICA TAMBIEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y CIELO RASO.

EL DIA DE HOY SE DEJA CONSTANCIA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO MULTIPROYECTOS, PRESENTÓ LOS CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159301



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS, ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 352

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 22/04/2022 23:08

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE DEJA CONSTANCIA QUE SE TUVO PROBLEMAS PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL COD; POR LO TANTO, SE PROCEDE CON EL LLENADO DEL ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL DEL DÍA JUEVES 21 DE ABRIL DEL 2022, INDICANDO LO SIGUIENTE:

SE CUMPLIÓ CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19. ASÍ TAMBIEN SE DEJA CONSTANCIA QUE SE AVANZÓ CON EL ADICIONAL 02, CORRESPONDIENTE CON LAS PARTIDAS DEL CANAL ANTIHORMIGAS, LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DEL AUTOCLAVE. SE VERIFICA TAMBIEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y CIELO RASO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 353

Título: EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora: 22/04/2022 23:14

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Por problemas de internet se actualiza de la fecha 21-04-2022

Se continúa con los lineamientos de bioseguridad

Se continúa con los trabajos de adicional 02 en la zona de autoclave

Se viene trabajando con los pintados de los cielos rasos y paredes interiores

Se viene realizando el canal antihormigas

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
ROL CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS L ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 354

Título: EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora: 22/04/2022 23:21

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se continúa controlando los lineamientos de bioseguridad
 Se viene desarrollando las instalaciones eléctricas de las modificaciones de autoclave
 Se viene desarrollando el tratamiento y pintura de los muros interiores y cielo raso.
 Se han vaciado 16 ml de canal antihormigas además de colocar las válvulas de desfogue de desagüe

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 150001


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANZA LEÓN
 Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 355

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 22/04/2022 23:46

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE DEJA CONSTANCIA QUE SE CONTINÚA CONTROLANDO LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19.

SE VIENE DESARROLLANDO LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS MODIFICACIONES DE AUTOCLAVE.

SE VERIFICA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL TRATAMIENTO Y PINTURA DE LOS MUROS INTERIORES Y CIELO RASO.

EL DÍA DE HOY SE PROCEDIO CON EL VACIADO DE CONCRETO EN 16 ML DE CANAL ANTIHORMIGAS, ASÍ MISMO SE PROCEDIO A COLOCAR LAS VÁLVULAS DE DESFOQUE DE DESAGÜE.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174515


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 356

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 25/04/2022 14:38

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se actualiza asiento del día 23-04/2022 debido a interferencias de internet

- Se viene controlando los lineamientos de bioseguridad
- Se viene dando el tratamiento y pintado de los muros interiores y cielo raso por pintura Oleo y Epoxica
- Se esta trabajando en el canal antihormigas y las instalaciones del cableado para el termomagnetico en el area de autoclave.
- Se esta instalando las luminarias hermeticas segun el expediente del adicional 02

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 155001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Constan



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS, ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 357

Título: EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora: 25/04/2022 22:18

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se viene controlando los lineamientos de bioseguridad

- Se esta realizando los trabajos de pintura en los muros interiores y cielo raso

- Se esta avanzando con el canal antihormiga

- Se viene desarrollando las instalaciones de la llave termoagnetico

- Se esta colocando las bases de los muebles, en el cual en las mesas de 1.00m. de ancho por 2.30m de largo, debido a longitud y el propio peso sumado la carga viva puede flexar. Por lo tanto se ha recomendado colocar un apoyo central. el cual se pide pronunciamiento de la supervisión.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS, ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 358

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 25/04/2022 23:22

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE DEJA CONSTANCIA QUE SE TUVO PROBLEMAS PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL COD; POR LO TANTO, SE PROCEDE CON EL LLENADO DEL ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL DEL DÍA SABADO 23 DE ABRIL DEL 2022, INDICANDO LO SIGUIENTE:

SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19.

SE VERIFICÓ LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL TRATAMIENTO Y PINTADO DE LOS MUROS INTERIORES Y CIELO RASO POR PINTURA OLEO Y EPOXICA.

SE VERIFICÓ LOS TRABAJOS EN EL CANAL ANTIHORMIGAS Y LAS INSTALACIONES DEL CABLEADO PARA EL TERMOMAGNETICO EN EL AREA DE AUTOCLAVE.

SE COORDINÓ CON EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA PROCEDER CON LA INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS HERMETICAS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 359

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 25/04/2022 23:27

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: A LA FECHA SE DEJA CONSTANCIA QUE SE VIENE CONTROLANDO LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19.

SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN LOS MUROS INTERIORES Y CIELO RASO.

SE COORDINA CON EL INGENIERO RESIDENTE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CANAL ANTIHORMIGAS.

SE VERIFICA LA COLOCACIÓN DEL REFORZAMIENTO DE LAS BASES DE LOS MUEBLES Y/O MESAS DE CONCRETO; EN EL CUAL EN LAS MESAS DE 1.00M. DE ANCHO POR 2.30M DE LARGO, DEBIDO A LONGITUD Y EL PROPIO PESO SUMADO LA CARGA VIVA PUEDE FLECTAR, POR LO TANTO SE APRUEBA AL RESIDENTE DE OBRA PROCEDER CON LA COLOCACIÓN DEL APOYO CENTRAL.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Rég. CIP N° 174545


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LAHDA LEON
Representante Común


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS 4 ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 360

Título EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora: 26/04/2022 20:10

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se viene controlando los lineamientos de bioseguridad


- Se continúa con los trabajos del adicional 2
- Se está trabajando en el tratamiento de las paredes y techos con la pintura oleo y epóxica
- Se está trabajando en el canal antihormigas con el vaciado de concreto posterior al encofrado y colocado de acero
- las instalaciones sanitarias y eléctricas de adicional 02 se vienen ejecutando
- Se viene colocando los refuerzos de las bases de las mesas de concreto

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LANZA LEÓN
 Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 361

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 26/04/2022 21:41

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19, CON LA PRESENCIA DEL PROFESIONAL DE SALUD.

ASI TAMBIEN SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, A CARGO DEL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DE OBRA.

SE VERIFICAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DEL TRATAMIENTO DE LAS PAREDES Y TECHOS CON LA PINTURA OLEO Y EPÓXICA.

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DEL CANAL ANTIHORMIGAS CON EL VACIADO DE CONCRETO PORTERIOR AL ENCOFRADO Y COLOCADO DE ACERO.

SE VERIFICA LOS TRABAJOS DE LA COLOCACIÓN DE LOS REFUERZOS DE LAS BASES DE LAS MESAS DE CONCRETO.

EL DÍA DE HOY SE DEJA CONSTANCIA QUE SE PROCEDIÓ A EMITIR ANTE LA ENTIDAD (PRODESA) LA CARTA N°47-2022-JEHC-GO (DESCARGO TÉCNICO AL INFORME DE HITO DE CONTROL N°004-2022-OCI/4540-SCC, DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI-SENASA))

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 362

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 27/04/2022 22:57

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE DEJA CONSTANCIA QUE MEDIANTE CARTA N°048-2022-JEHC-GERENTE DE OBRA, SE PRESENTO A LA ENTIDAD, LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N°01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2022.

EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL DE OBRA N°02. (PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL CANAL ANTIHORMINAS Y A LOS TRABAJOS DE PINTADO DE MUROS)

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645



JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 363

Título: EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora: 28/04/2022 11:04

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Por motivos de mala señal de internet ,

Se viene manteniendo los linesaminetos de biseguridad

Se viene trabajando con las actividades del adicional 2, con las actividades del:

Canal antihormigas, tratamiento de acabados y vaciado de concreto.

Tratamiento de pintura en los muros interiores con oleo y pintura.

Instalación de las llaves termomagneticas del autoclave

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS L ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 364

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 29/04/2022 23:18

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE DEJA CONSTANCIA QUE SE TUVO PROBLEMAS PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL COD; POR LO TANTO, SE PROCEDE CON EL LLENADO DEL ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL DEL DÍA JUEVES 28 DE ABRIL DEL 2022, INDICANDO LO SIGUIENTE:

SE VIENE VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19.

SE VIENE TRABAJANDO CON LAS ACTIVIDADES DEL ADICIONAL 2, CON LAS ACTIVIDADES DEL CANAL ANTIHORMIGAS, TRATAMIENTO DE ACABADOS Y VACIADO DE CONCRETO. TRATAMIENTO DE PINTURA EN LOS MUROS INTERIORES CON OLEO Y PINTURA. INSTALACIÓN DE LAS LLAVES TERMOMAGNETICAS DEL AUTOCLAVE.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS GOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 158001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 365

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 29/04/2022 23:24

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: - A LA FECHA DE DEJA CONSTANCIA QUE SE VIENE CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19.

- A LA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CANAL ANTIHORMIGAS, SEGÚN DETALLES DE PLANOS DEL ADICIONAL DE OBRA N°02.

- SE COORDINA CON EL INGENIERO RESIDENTE PROCEDER CON LA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y CORTES DE TERRENO.

- SE CONTINUA A LA FECHA CON LOS TRABAJOS DE OLEO EN MUROS INTERIORES Y CIELO RASO, ASÍ TAMBIEN CON PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES Y CIELO RASO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 174545


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LAMPA LEÓN
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS, ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 366

Título: EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora: 30/04/2022 17:22

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se actualiza asiento del día 29 /04/2022

Se continúa con los lineamientos de bioseguridad

Se continúa con las actividades de adicional 02 en cuanto al revestimiento de la canaleta antihormigas

Se está trabajando en el pintado de los muros interiores y cielo raso.

Los desagües del canal antihormigas ya se han colocado

Se culminó con el colocado de las luminarias herméticas que pertenecen al adicional 02

El nivelado del terreno natural que colinda con el canal ya se encuentra con la pendiente según expediente adicional

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


.....
CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


.....
JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS 4 ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 367

Título EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora 30/04/2022 17:25

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se viene controlando los lineamientos de bioseguridad
Se viene haciendo los trabajos de remates de acabados del canal antihormigas
Se continúa con el tratamiento de las paredes para su acabado final
Se viene colocando las válvulas de limpieza del adicional 02 en el canal antihormigas

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RADI MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 368

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 30/04/2022 23:24

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: - EL DIA DE HOY SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19.

- A LA FECHA SE CONTINUÓ REALIZANDO LOS ACABADOS DEL CANAL ANTIHORMIGAS.

- SE VERIFICÓ TAMBIEN EL DIA DE HOY QUE CONTINUA CON EL TRATAMIENTO DE LOS MUROS PARA SU ACABADO FINAL.

- SE COORDINÓ TAMBIEN CON EL INGENIERO RESIDENTE LA COLOCACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE LIMPIEZA EN EL CANAL ANTIHORMIGAS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546



JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

12. Control de calidad



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común



F-39
Ver. 05
Fecha: 05/09/20



ÓLEO MATE SINTÉTICO MAESTRO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto a base de resina alquídica, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solvente alifático, secante libre de plomo.

TIPO

Alquídico.

USOS Y RECOMENDACIONES

Para interiores y exteriores, sobre superficies de metal, madera y concreto que se deseen recubrir con un acabado satinado.

COLOR

Según carta de colores.

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

50 - 65

DENSIDAD (Kg/Gl)

4.55 - 5.10

VISCOSIDAD

1800 - 3400 Cps a 25 °C, al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Óleo Mate Sintético Maestro, proporciona buen nivelado, buena brochabilidad, dejando un acabado de alta durabilidad, satinado, terso, con buena adherencia.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

En el caso de sustratos de cemento nuevo debe dejar curar la superficie un mínimo de 45 días y un 12% máximo de humedad antes de aplicar la capa base y el recubrimiento, así como asegurarse que el muro a recubrir no presente problemas de salitre y humedad, en caso contrario tomar las medidas necesarias para eliminarlas.

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CAPA BASE

De acuerdo al tipo de superficie a recubrir:

Superficies Ferrosas: Se recomienda tratarlas con Anticorrosivo Kitok Maestro o Base Zincromato Maestro previo a la aplicación del Óleo Mate Sintético Maestro.

Muro de Concreto, Yeso: Se recomienda tratar con Imprimante Korál.

Superficie de Madera: Pueden sellarse con una mano de Óleo Mate Sintético Maestro.

Recomendación: Los colores acento se utilizan solo para matizados, si se desea aplicar directamente se aplicará sobre fondo blanco previo al color de acabado.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha y soplete.

DILUCIÓN

Para aplicación con soplete: Diluir 20 - 25% con Maestrazo Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

Para aplicación con brocha: Diluir 5 - 10% con Maestrazo Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

Nota: Homogenizar completamente la mezcla del producto y solvente antes de aplicar.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.

TIEMPO DE SECADO

Tacto (horas)	: 4 - 6
Duro (horas)	: 24
Repintado (horas)	: 12
Número de manos	: 2 - 3

ÓLEO EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

Nota: Depende de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.

Espesor recomendado de película húmeda por capa

3 - 4 mils

Espesor recomendado de película seca por capa

1.5 - 2 mils

RENDIMIENTO TEÓRICO

38 m²/Gl.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDALEÓN
Responsable Técnico

ANYPsa CORPORATION S.A.
R.U.C. N° 20600346149

Car. Chillon Trápiche Mza. S/N Lote. 69 Urb. Los Huertos de Tungasuca Lima - Lima - Carabayillo
www.anypsa.com.pe venta@anypsa.com.pe Tel: (51-1)613-9090 Fax: (51-1)613-9091



F-39
Ver. 05
Fecha: 05/08/20



Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variación del espesor, mezclados inadecuados, aplicación inadecuada, irregularidades de la superficie o porosidad.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilice Maestrazo Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice mascarilla para vapores orgánicos.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda para usos marinos, condiciones severas de resistencia mecánica, superficies directas con base solvente.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de hojalata de 1 Gl. (3.785 L.)



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
JOSE MONTERO LANDIA LEÓN
Representante Común

JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
R.O.C. CIP N° 174645

JOSE LEONIDAS SOSA YACUBO
Ingeniero Civil
CIP N° 158801

8. IMPORTANTE

ANYPSA CORPORATION S.A.
R.U.C. N° 20800346149

Car. Chillon Tropiche Mza. S/N Lote. 69 Urb. Los Huertos de Tungasuca Lima - Lima - Carabayillo
www.anypsa.com.pe venta@anypsa.com.pe Tel: (51-1)613-9090 Fax: (51-1)613-9091



F-39
Ver. 05
Fecha: 05/09/2020

ESMALTE EPÓXICO TITANIC

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto elaborado con resina epóxi poliamidas, aminas de alto sólido, pigmentos, aditivos especiales de alta calidad que proporcionan gran flexibilidad, buena resistencia a la abrasión y alta resistencia al impacto.

TIPO

Epóxico.

USOS Y RECOMENDACIONES

Como acabado de sistema epóxico donde se requiere alta protección, para mantenimiento de equipos e instalaciones industriales, tanques de fierro, bombas, tuberías, cubierta de embarcaciones y pintado de piscinas de concreto.

COLORES

Según carta de colores.

ACABADOS

Semi-brillante.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

84 - 90

DENSIDAD (Kg/Gl)

5.40 - 6.10

VISCOSIDAD

40 000 - 50 000 Cps a 25 °C, al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Esmalte Epóxico Titanic brinda buena resistencia a la intemperie, agentes químicos, agentes ácidos, agentes alcalinos, excelente adherencia, buena resistencia a los solventes, agua dulce o agua salada, aceites minerales y excelente resistencia al roce mecánico o fricción.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA EN SECO

Continuo 93 °C

RESISTENCIA AL IMPACTO ASTM D2794

60 lb x pulg. directo

FLEXIBILIDAD MANDRIL CONICO ASTM D522

9 % elongación

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOEL EFRAIM ZAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

DUREZA DE LAPIZ ASTM D3363

5H

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Desaparecer cualquier rastro de óxido mediante el uso de Acondicionador para Metales X1, y un eficiente lijado.

Para Superficies Metálicas (nuevo) es conveniente arenar según norma SSPC - SP6 aplicar previamente una Base Zincromato Epóxico.

Para Superficies Metálicas (antiguas) es conveniente un arenado comercial SSPC - SP2 o SSPC - SP3 aplicar previamente una Base Zincromato Epóxico.

Para Superficies de Madera y Concreto se debe efectuar un buen lijado y limpieza.

Nota: En cualquier caso, se deberá usar de acuerdo a las instrucciones dadas para cada caso.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Equipo de aplicación: Soplete convencional a presión de 40 -45 psi (Lb / in²). A pistola de alta presión de 60 -70 psi (Lb / in²).

Tipo de sustrato: Fierro acerado, concreto no pulido, fierro negro, madera.

Diluyente: Disolvente Epóxico - Recubrimientos Industriales y Marinos.

Preparación de mezcla

1 volumen de Esmalte Epóxico Titanic (parte A).

1 volumen de Catalizador Epóxico Titanic (parte B).

1 volumen de Disolvente Epóxico - Recubrimientos Industriales y Marinos.

Tiempo de inducción: 30 minutos.

Duración de mezcla: 8 horas máximos.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto (horas)	: 2 - 3
Secado duro (horas)	: 24
Secado total (días)	: 7
Repintado (horas)	: 12 mínimos

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LAMIA LEON
Representante General

ANYP SA CORPORATION S.A.
R.U.C. N° 20600346149

Car. Chillon Trapiche Mza. SIN Lote, 69 Urb. Los Hueros de Tungasuca Lima - Lima - Carabaylo
www.anypsa.com.pe venta@anypsa.com.pe Tel: (51-1)613-9090 Fax: (51-1)613-9091



F- 39
Ver. 05
Fecha: 05/09/2020



Espesor recomendado de película húmeda por capa
3 - 4 mils

Espesor recomendado de película seca por capa
1.5 - 2 mils

RENDIMIENTO TEÓRICO
60 m²/Gl Dependiendo del color.

Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variación del espesor, mezclas inadecuadas, aplicación inadecuada, irregularidades de la superficie o porosidad.

LIMPIEZA DEL EQUIPO
Utilice Maestrazo Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD
Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO
Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.


CUIDADOS ESPECIALES
Aplicarse en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No aplica.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Kit: Envase de hojalata de 1 Gl. (3.785 L.) de Esmalte Epóxico Titanic + 1 Gl. (3.785 L.) de Catalizador Epóxico Titanic + 1 Gl. de plástico (3.5 L.) de Disolvente Epóxico - Recubrimientos Industriales y Marinos.



8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL
Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
PAUL MONTERO LANDALEÓN
Representante General

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL,
Reg. CIP N° 174546

ANYPSA CORPORATION S.A.
R.U.C. N° 20600346149

Car. Chillon Trapiche Mza. SIN Lote. 69 Urb. Los Huertos de Tungasaca Lima - Lima - Corabaillo
www.anypsa.com.pe venta@anypsa.com.pe Tel: (51-1)613-9090 Fax: (51-1)613-9091



TEMPLE MAJESTAD

DESCRIPCIÓN

El Temple Majestad es un producto acuoso de cero VOC, elaborado con resina vegetal pigmentada, Producto ecológico de bajo olor, no irrita la garganta, no ocasiona alergias.
Producto no inflamable sin restricciones de transporte.
Presentación: Bolsas de 5 y 25 kg.

USOS PRINCIPALES

Por su blancura es utilizado en el pintado de cielos rasos, cercos perimétricos, señalización de árboles, jardines.

RECUBRIMIENTOS DE ACABADO RECOMENDADOS

Sellador Maxi, Sellador PVA, Nativo, Ecolatex, Ecomate antibacterial, Satinado antibacterial, Aquamate antibacterial, Maxilatex.

PROPIEDADES FÍSICAS

VOLUMEN DE SÓLIDOS	: 48 +/- 2%	COLOR	: Blanco
RELACION DE MEZCLA	: No aplicable	REND. TEÓRICO	: Pasta: 2.8 a 3 m ² /Kg.
COMPONENTES	: 1		: Imprimante: 3.5 a 4 m ² /Kg.
POT LIFE	: Indefinido		
INDUCCIÓN	: No requiere	SECADO	Tacto : 40 minutos
DILUYENTE	Dilución : Agua		Repintado min. : 2 horas
	Limpieza : Agua		
T° DE APLICACIÓN		APLICACIÓN	: Brocha
	Mínimo : 10°C		: Rodillo
	Máximo : 40°C		: Plancha
T° DE SERVICIO SECO		ALMACENAJE	: 6 meses en condiciones normales
	Continuo : 70 °C		
	Intermitente : 70°C	VOC	: 0 gramo/litro
ACABADO	: Mate		

APLICACION

La superficie a pintar debe estar seca y limpia de polvo, cemento mal adherido, aceite, grasas y otras materias contaminantes.

En caso de cemento nuevo, se deberá esperar 28 días de secado antes de proceder a pintar, (preguntar al departamento técnico para pintado en menor tiempo).

Aplicar cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 10 °C y menos de 40 °C, la humedad relativa menos a 85%.

Esperar por lo menos que seque 2 horas antes de aplicar la segunda capa.

Aplique con plancha, brocha, rodillo ó pistola en buen estados.

LIMPIEZA

Limpiar las herramientas de inmediato con agua.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDALEON
Representante General

JOSÉ LEONIDAS ROSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 153201

JOEL EFRAIN CHIVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174648



CALIDAD Y SEGURIDAD

**CERTIFICADO DE PRUEBAS N° 22-04-089**

Lima, 04 de Febrero del 2 022

Cliente : PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA-PRODESA
 Obra : CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE, DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II/COMPARACIÓN DE PRECIOS CP N° 003-2021-SENASA/PRODESA.
 Ejecutor de Obra : CONSORCIO MULTIPROYECTOS (INTEGRADO POR LAS EMPRESAS CREACIONES HADASA S.A.C. Y RIO BRAVO S.A.C.)
 Orden de Compra : 06-2022
 N° Guía de Remisión : 0001-0119927
 N° de Factura : 001-00053195
 Tipo de Cable : LS0HX-90 (H07Z-R)
 Norma : NTP 370.252 / NTP 370.266-3-41

I PRUEBAS ELECTRICAS

Ítem	Tipo de Cable	Longitud Mts.	Valor Prescrito a 20°C		Valor Medido	
			R. Aislam. Mín. MΩ-km	R. Eléctrica Máx. Ω/km	R. Aislam. MΩ-km	R. Eléctrica Ω/km
1	LS0HX-90 CAB. 16 mm² 750 V	120	358	1,15	910	1,13
2	LS0HX-90 CAB. 35 mm² 750 V	24	358	0,52	940	0,51
3	LS0HX-90 CAB. 95 mm² 750 V	150	186	0,19	970	0,18

Prueba de Tensión 5 minutos

Prescrito: 2,5 kV. C.A. (Mínimo)

Resultado: OK

Tensión Aplicada en Resistencia de Aislamiento:

500V C.C. 1 minuto

Resultado: OK

II CONTROLES DIMENSIONALES

Ítem	Tipo de Cable	Espesores de aislamiento (mm)				Espesores de cubierta (mm)			
		Valor Prescrito		Valor Medido		Valor Prescrito		Valor Medido	
		Mín. Abs.	Mín. Prom.	Mín. Abs.	Mín. Prom.	Mín. Abs.	Mín. Prom.	Mín. Abs.	Mín. Prom.
1	LS0HX-90 CAB. 16 mm² 750 V	0,90	1,00	1,29	1,36	-	-	-	-
2	LS0HX-90 CAB. 35 mm² 750 V	1,10	1,20	1,52	1,52	-	-	-	-
3	LS0HX-90 CAB. 95 mm² 750 V	1,40	1,60	1,68	1,76	-	-	-	-

III PRUEBAS VARIAS

Ensayo Resistencia a la llama, Categoría C, Según NTP-IEC 60332-3-24

Resultado: 2,0 m. (Cumple)

Ensayo Densidad de humos Emitidos, Según NTP-IEC 61034-2

Resultado: Transmitancia 71% (Cumple)

Ensayo Grado de Acidez, Según NTP-IEC 60754-2

Resultado: pH 5,1 (Cumple)

Ensayo de Conductividad, Según NTP-IEC 60754-2

Resultado: 8,6 μS/mm (Cumple)

Ensayo Emisión de Gases Ácidos, Según NTP-IEC 60754-1

Resultado: 0,4% HCL (Cumple)

Ensayo Contenido de Flúor, Según NTP 370.260

Resultado: 0,01% (Cumple)

OBSERVACIONES:

Cualquier observación, recomendación o mejora, agradeceremos se comunique con nosotros al Teléfono (511) 326-1373.

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LARREA LEÓN
 Representante Común

CONDUCTORES ELÉCTRICOS LIMA S.A.
 Ing. Marco Córdova
 CELSA

CONDUCTORES ELÉCTRICOS LIMA S.A.

RUC: 20100063680

Alexander Fleming 454 - Urb. Santa Rosa - Ate - Lima - Perú

Central: 326-1373 - Email: ventas@celsa.com.pe

www.celsa.com.pe

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA

INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 174545

H07Z-R (LSOHX-90)
TENSIÓN NOMINAL
 $U_0 / U = 450 / 750 \text{ V}$

Rigidez dieléctrica, c.a. 2,5 kV

Tiempo de Rigidez dieléctrica, 5 minutos

TEMPERATURA

Máxima de operación 90 ° C

Máxima de sobrecarga de emergencia 130 ° C

Máxima del conductor en corto-circuito 250 ° C


NORMAS
Nacional
NTP-IEC 60228-2010: Conductores para cables aislados

NTP 370.252 (2018): CONDUCTORES ELECTRICOS. Cables aislados con compuesto termoplástico y termoestable para tensiones hasta e inclusive 450/750 V

NTP 370.266-3-41-2013: CONDUCTORES ELECTRICOS. Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión nominal inferior o igual a 450/750 V (U_0/U). Parte 3-41: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de humo.

NTP 370.266-1: Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión nominal inferior o igual a 450/750 V (U_0/U). Parte 1: Requisitos generales.

NTP 370.264-5: Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión - Parte 5: Compuestos reticulados libres de halógenos para aislamiento.

NTP-IEC 60811-1-4: Materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos y cables de fibra óptica. Métodos de ensayos comunes. Parte 1-4: Aplicación general. Ensayos a baja temperatura. (IEC 60811-1-4)

Internacional
IEC 60228: Conductores para cables aislados

IEC 60332-1-2: Ensayo de propagación de llama vertical para un alambre o cable simple - Procedimiento para llama premezclada de 1kW.

UL 2556: Métodos de ensayo para alambre y cable. Sección 9.3: Ensayo de propagación de llama - FT-1 (muestra vertical).

IEC 60684-2: Tubos aislantes flexibles - Métodos de ensayo.

IEC 60754-1: Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables - Parte 1: Determinación del contenido de gases halógenos ácidos.

IEC 60754-2: Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables - Parte 2: Determinación de la acidez (por medida del pH) y la conductividad

IEC 61034-1: Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas. Parte 1: Equipo de ensayo.

IEC 61034-2: Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas.

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 NAUL MONTERO LANGA LEON
 Ingeniero Civil

 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001



Conductores Eléctricos Lima S.A.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CERTIFICADO POR:



APLICACIONES

Cumple con la **RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 175-2008-MEM/DM** que modifica el Código Nacional de Electricidad del Perú (Utilización).

Apto para locales de pública concurrencia donde se exigen cables Libre de Halógenos, No propagador del incendio, Baja emisión de humos.

Para instalaciones fijas. Se instalan generalmente dentro de tubos en locales con ambiente seco o húmedo, en hospitales, hoteles, cines, teatros, discotecas, oficinas, plantas industriales, comercio, edificios residenciales, colegios, etc.

Donde se requieran conductores de características superiores al H07Z1-R (LSOH-80).

CONSTRUCCIÓN

1. **Conductor:** cobre electrolítico de 99,99 % mínimo de pureza, suave cableado clase 2.
2. **Aislante:** compuesto reticulado libre de halógenos y baja emisión de humo, Tipo EI 5.

MARCACION

Distancia entre marcas no mayor a un metro.

HECHO EN EL PERU CELSA - H07Z-R (LSOHX-90) Sección 450/750 V – Año

Secciones de 10 mm² y mayores tienen Metraje Secuencial, con marcación cada un metro.

COLORES

Del 1,5 al 6 mm²: negro, blanco, rojo, azul, amarillo y verde.

Secciones mayores: negro y verde, amarillo para puestas a tierra.

A pedido se fabrica en otros colores.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LARGA LEÓN
Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174646

TABLA DE DATOS TECNICOS

Sección Nominal mm ²	Número mínimo de alambres	Espesor Aislante mm	Diámetro Exterior mm		Peso Nominal kg / km	Amperaje (*)	
			Mínimo	Máximo		Aire	Ducto
2,5	7	0,8	3,3	4,1	36	37	27
4	7	0,8	3,8	4,7	50	45	35
6	7	0,8	4,3	5,4	70	61	45
10	7	1,0	5,6	7,0	130	88	65
16	7	1,0	6,4	8,0	200	124	80
25	7	1,2	8,1	10,1	290	158	105
35	7	1,2	9,0	11,3	390	197	130
50	19	1,4	10,6	13,2	520	245	165
70	19	1,4	12,1	15,1	730	307	200
95	19	1,6	14,1	17,6	980	375	240
120	37	1,6	15,6	19,4	1 250	437	275
150	37	1,8	17,3	21,6	1 530	501	315
185	37	2,0	19,3	24,1	1 890	586	355
240	61	2,2	22,0	27,5	2 430	654	415
300	61	2,4	24,6	30,6	3 070	757	470

Los datos de la tabla están sujetos a las tolerancias normales de manufactura.

- (*) Temperatura ambiente: 30 °C
 Temperatura máxima de conductor: 90 °C
 No más de tres conductores por ducto

Para temperatura ambiente superior a 30 °C, aplicar los factores de corrección

Para instalaciones mayores de tres conductores en cada tubo, aplicar los factores de corrección

Factores de corrección para temperatura ambiente del aire diferente a 30 °C

Temperatura máxima del conductor °C	Temperatura ambiente del aire °C							
	20	25	35	40	45	50	55	60
90	1,08	1,04	0,96	0,91	0,87	0,82	0,76	0,71

**Factores de corrección
 Por agrupamiento de cables en tubos**

Número de Conductores Agrupados	Factor de corrección
4 a 6	0,80
7 a 24	0,70
25 a 42	0,60
43 ó más	0,50

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Legal


 JOEL LLANOS CRAVARIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174645


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

TABLA DE DATOS ELECTRICOS

Sección Nominal mm ²	Resistencia Eléctrica Max. c.c. 20 °C Ohm/km	Resistencia Eléctrica Max. c.a. 90 °C Ohm/km	Resistencia Aislam. Mín. a 90 °C MΩ-km	Reactancia Inductiva a 60 Hz Ohm/km
2,5	7,41	9,45	0,009	0,118
4	4,61	5,88	0,0077	0,110
6	3,08	3,93	0,0065	0,105
10	1,83	2,33	0,0065	0,106
16	1,15	1,46	0,0050	0,100
25	0,727	0,927	0,0050	0,095
35	0,524	0,669	0,0043	0,092
50	0,387	0,494	0,0043	0,093
70	0,268	0,343	0,0035	0,090
95	0,193	0,248	0,0035	0,087
120	0,153	0,197	0,0032	0,088
150	0,124	0,161	0,0032	0,087
185	0,0991	0,130	0,0032	0,085
240	0,0754	0,101	0,0032	0,084
300	0,0601	0,0828	0,0030	0,084

Tres conductores por ducto

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Cliente

 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 174515

SIEMENS
Ingenio para la vida


[Signature]
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

[Signature]
 RAÚL MONTAÑA LAMAR LEÓN
 Representante Común

[Signature]
 JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174546

Interrupción en caja moldeada 3VA

Una solución diseñada
pensando en usted

Totally Integrated Power – SENTRON

Múltiples combinaciones: para ambos modelos.

Los dos modelos de interruptores en caja moldeada 3VA son acompañados por un gran número de accesorios, permitiendo que el sistema sea adaptado a las necesidades específicas de su proyecto. Un portafolio consistente de principio a fin que también asegura una utilización flexible.

Como resultado, el interruptor en caja moldeada 3VA ofrece casi ilimitadas posibilidades para la ampliación de funciones, de forma fácil, rápida y extremadamente flexible en todo momento.



Gracias a esto, ambos modelos estarán perfectamente equipados para manejar los desafíos de su proyecto.

Dispositivos

Software por

Comu

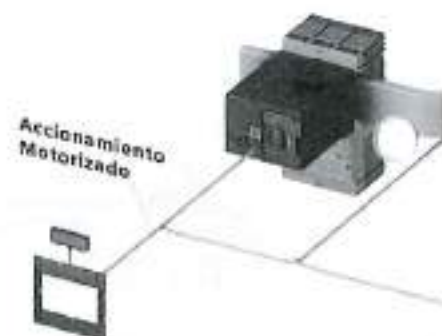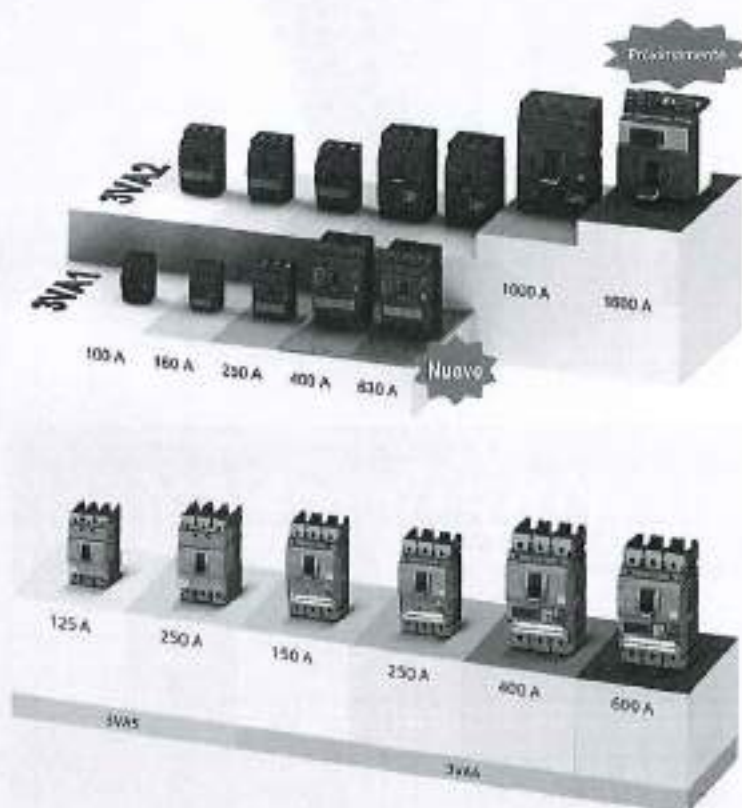
Accesorios In



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTENEGRO LARREA LEÓN
Representante General

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

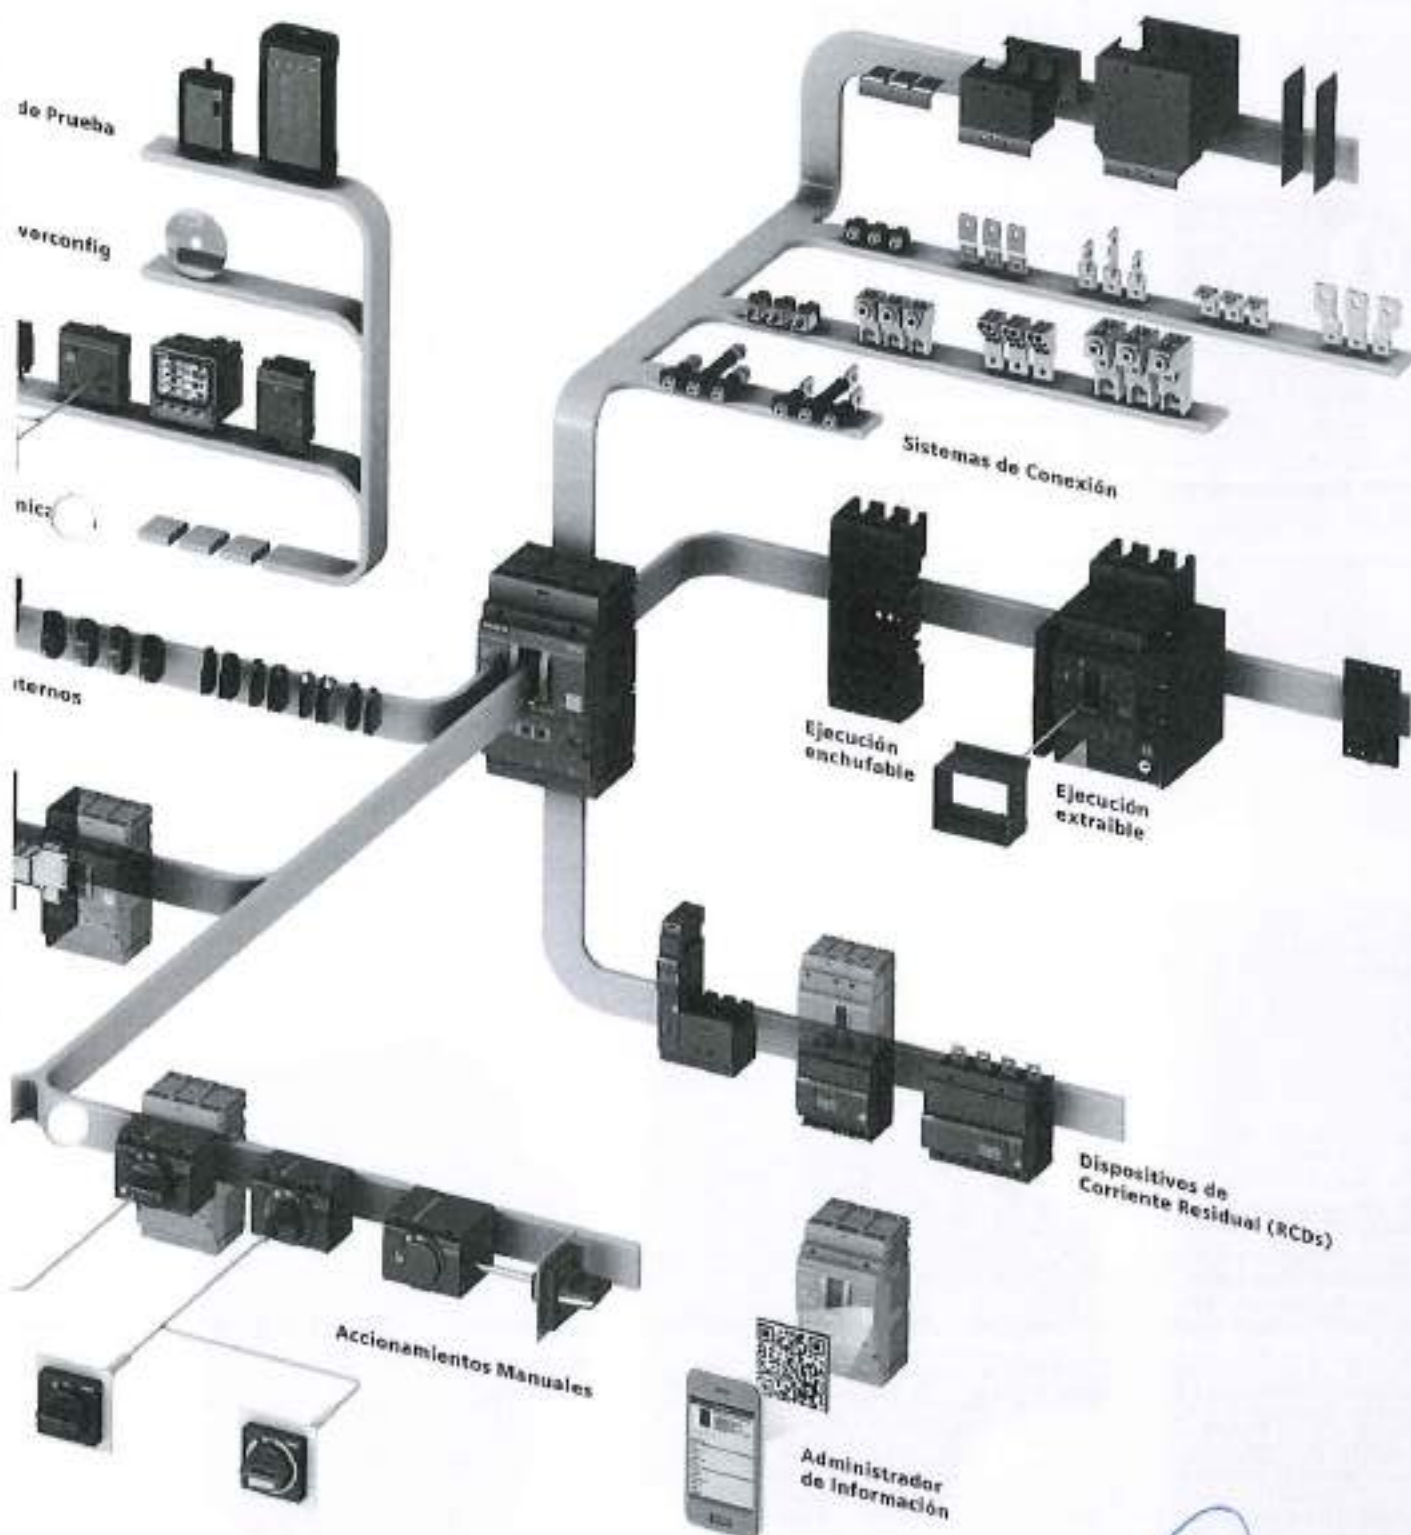JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRIMA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MANTERO LANDALEÓN
 Representante Gestión

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174515

Encontrar soluciones: Cumplir con todos los requerimientos.



Planee su sistema de distribución de energía sin restricciones: Elegir desde una gama completa de interruptores básicos y accesorios, configurar su interruptor en caja moldeada 3VA para que coincida con sus necesidades. Nuestro interruptor 3VA lo ayuda desde la planificación para que pueda poner en práctica sus ideas sin ningún *pero*, y sí...

Planificación flexible: campos de aplicación

Gracias al portafolio consistente, un despliegue flexible y el intercambio de accesorios asegurado. Los interruptores en caja moldeada 3VA ofrecen la adecuada solución para sus desafíos, gracias a la gama completa de accesorios. Los accesorios pueden montarse individualmente para cualquier aplicación.

Funcional:
Accionamiento motorizado le permiten la conmutación remota del interruptor en caja moldeada.

Conveniente:
Accionamientos manuales rotativos se utilizan donde se requiere una operación práctica del interruptor en caja moldeada (por ejemplo, a través de una puerta de tablero).



Interruptor en caja moldeada 3VA con accionamiento motorizado



Interruptor en caja moldeada 3VA con accionamiento manual rotativo iluminado

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LIMITACIÓN
Representación General

JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 174735

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP Nº 159001

Ideas sin límites: combinaciones

Usted puede tener todas las funciones que desee: Funciones adicionales se pueden implementar fácilmente con la ayuda del accionamiento manual o motorizado, del módulo RCD, de varias opciones de enclavamientos y mucho más. Los accesorios internos también ofrecen combinaciones inmejorables: una variedad de contactos auxiliares y de alarma de señal confiable de los estados y alarmas, disponibles en versiones HQ y HP, una versión compacta y una versión con mayor capacidad de maniobra. Diseñados en forma de módulos insertables, que son insertados en las ranuras y son compatibles con todos los tamaños de interruptores en caja moldeada 3VA.

Ahorro de espacio: diseño compacto

Amplia tecnología, disponible incluso para los más pequeños espacios: Gracias a su diseño compacto, el interruptor compacto en caja moldeada 3VA es siempre útil en espacios limitados.

El modelo de interruptores compactos en caja moldeada 3VA1 con corrientes nominales hasta 160 A, es especialmente apropiado para el uso en tableros de distribución, gracias su tamaño de tapa de sólo 45 mm y su construcción extremadamente compacta. Cuando el interruptor en caja moldeada 3VA1 es combinado con accesorios tales como el módulo RCD, montado lateralmente, una profundidad total uniforme facilita la planificación y configuración.

Destacados

- Soluciones para su planificación individual
- Fácil expansión de funciones
- Accesorios internos extendidos en una amplia variedad de combinaciones
- Flexibilidad gracias a un portafolio consistente de accesorios
- Ahorro de espacio, gracias al diseño compacto del interruptor 3VA1

Accesorios internos - múltiples funciones y de fácil instalación

Los accesorios internos están codificados por colores para facilitar su instalación. Una codificación mecánica adicional asegura una instalación libre de errores.



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LARCA LEÓN
Representante General

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 158001

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

Minimizar el esfuerzo: Planear de manera eficiente.



Planifique su sistema de distribución de energía lo más eficiente posible: El interruptor en caja moldeada 3VA lo soporta con muchas características útiles. Esto permite precisamente implementar su sistema hacia abajo hasta el último detalle de acuerdo a sus requisitos individuales de forma fácil y rápida. Reducir su esfuerzo ahorrando tiempo en la planificación, configuración y documentación de su sistema de distribución de energía.

Sea selectivo: Planning Efficiency™

Cuando planificar y configurar su sistema de distribución de energía con el interruptor 3VA son soportados por muchas herramientas inteligentes.

Gastar menos de su valioso tiempo en búsquedas de productos y transferencias de datos: Identifique su combinación ideal de dispositivos básicos y accesorios rápida y fácilmente usando configurador del producto práctico.

Ahorre tiempo: numerosos tipos de datos Download Manager CAX le proporciona todos los tipos de datos CAX necesarios para el producto que usted elija.

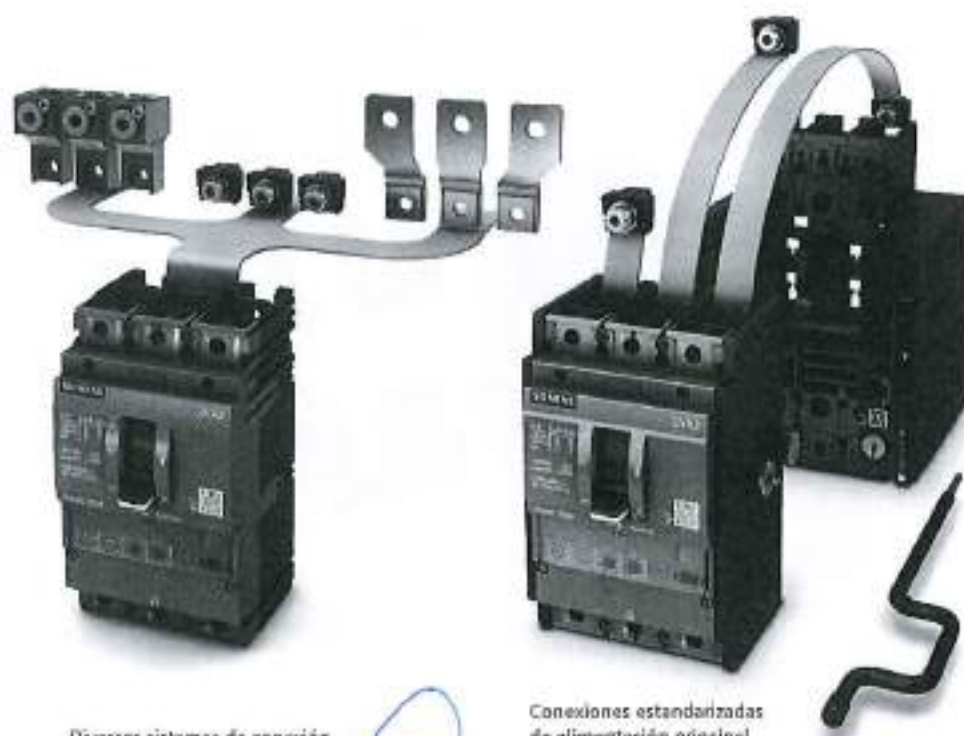
Esquemas de medidas en 2D y modelos en 3D, fotos de productos e incluso macros EPLAN Electric P8.

Siemens soporta su proceso de ingeniería con 12 diferentes tipos de datos relevantes para el interruptor 3VA.

Esto le permite alcanzar hasta un 80 por ciento ahorro de su tiempo en la selección de productos e integración de sus herramientas.

Flexible:
Las diferentes versiones de conexión del interruptor en caja moldeada 3VA cumplen todos los requisitos para la conveniente conexión en tableros de distribución.

Estandarizado:
Las mismas opciones de conexión están disponibles para todos los tipos de instalación (montaje fijo, extraíble, enchufable)



Diversos sistemas de conexión

Conexiones estandarizadas de alimentación principal

Adaptar flexiblemente: conexiones
No se preocupe por la compatibilidad en su instalación: El interruptor 3VA es siempre la solución adecuada. Le ofrece una amplia y variada gama de tecnologías de conexión y puede ser adaptado a cualquier requerimiento de su instalación.

Instalación rápida: tecnología consistente
Planificar en menos tiempo, por sistemas de conexión consistentes, simplificando en gran medida la instalación. Permitiendo utilizar las mismas conexiones para montajes mixtos, tecnología enchufable y extraíble. Dimensiones idénticas para cambiar seccionadores e interruptores también facilitan su planificación.

Datos sobre la marcha: Administrador de información

Cuando necesite información técnica, de día y de noche, durante la instalación, parametrización o mantenimiento, el administrador de información estará siempre listo. La información técnica del producto puede ser obtenida desde el sistema en base al código del producto o a través del código QR. Esto le da práctico y continuo acceso a los datos de productos de referencia, incluyendo curvas características, certificados, manuales e incluso las instrucciones de funcionamiento.

Destacados

- Menos tiempo y esfuerzo necesarios para la planificación, configuración y documentación
- Selección fácil y rápida de los dispositivos básicos y accesorios usando configuradores
- Adecuado para todos los requisitos de instalación gracias a la variedad de tecnologías de conexión
- Administrador de datos: La información técnica puede ser recuperada directamente en el dispositivo instalado

Administrador de información - recuperar toda la información directamente en su sistema

Si requiere información técnica durante la instalación, parametrización o el mantenimiento, puede obtenerla directamente en su sistema a través de un código QR. Este le da acceso instantáneo a datos, en todo el mundo y durante todo el día.



El código QR está claramente visible en cada interruptor 3VA.



Escanear el código QR con un teléfono inteligente o una tablet. Disfrute de toda la gama de servicios mediante el uso de la aplicación gratuita "Industry Support" de Siemens.



Usted puede directamente bajar toda la información del producto.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDALEÓN
Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174646

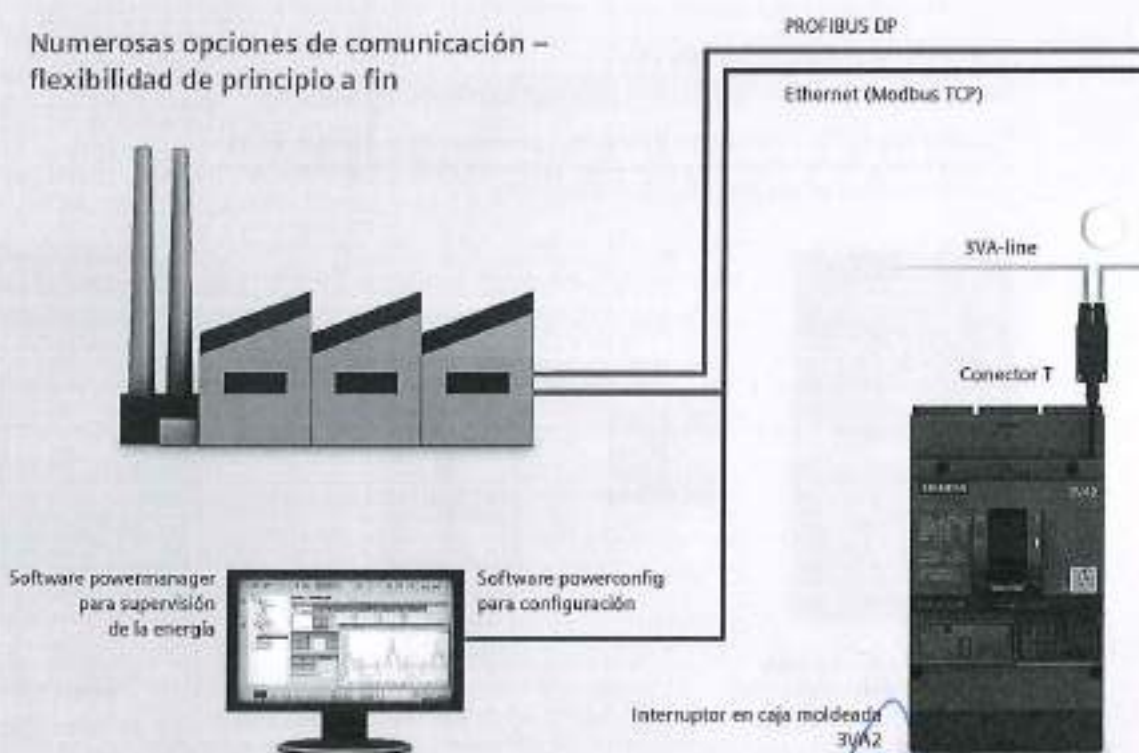
Incrementar la transparencia: Vigile su sistema.



Mantenga una estrecha vigilancia sobre su sistema en todo momento y al instante poder identificar el potencial ahorro de energía. Los interruptores en caja moldeada 3VA2 son también ideales para cumplir los desafíos de la distribución de energía moderna, pudiéndose integrar fácilmente a los sistemas de control de nivel superior y a los sistemas de automatización.

Optimizar inteligentemente: adquisición de datos
Optimizar el flujo de energía de su sistema sin perder el tiempo o la dispersión de pérdidas: El interruptor 3VA2 le asegura tener una visión óptima con todos sus datos siempre, gracias a la adquisición integrada de corriente, tensión y valores de energía desde la ETUB. El estado del interruptor (ON, OFF, TRIP) y los valores también son adquiridos. Usted puede mantener una estrecha vigilancia sobre su sistema, mientras también disfruta de la alta disponibilidad del sistema.

Numerosas opciones de comunicación – flexibilidad de principio a fin



Comunicativo:
El interruptor en caja moldeada 3VA2 puede conectarse a los niveles superiores de los sistemas de gerenciamento a través de sistemas convencionales de comunicación.

Hacer un balance instantáneo: comunicación

Puede conectar su interruptor en caja moldeada comunicable 3VA2 a su administrador de energía o sistema de automatización de nivel superior a través de buses de sistemas PROFIBUS, PROFINET y Ethernet (Modbus TCP). Esto permite la transparencia en los procesos de su sistema en todo momento.

El concentrador de datos COM800 le permite controlar más de un interruptor compacto de caja moldeada 3VA2, recopilando y comunicando los datos de hasta ocho interruptores. Se puede utilizar el módulo de comunicación COM100 si solamente un interruptor en caja moldeada 3VA2 va a ser integrado en la vista de comunicación.

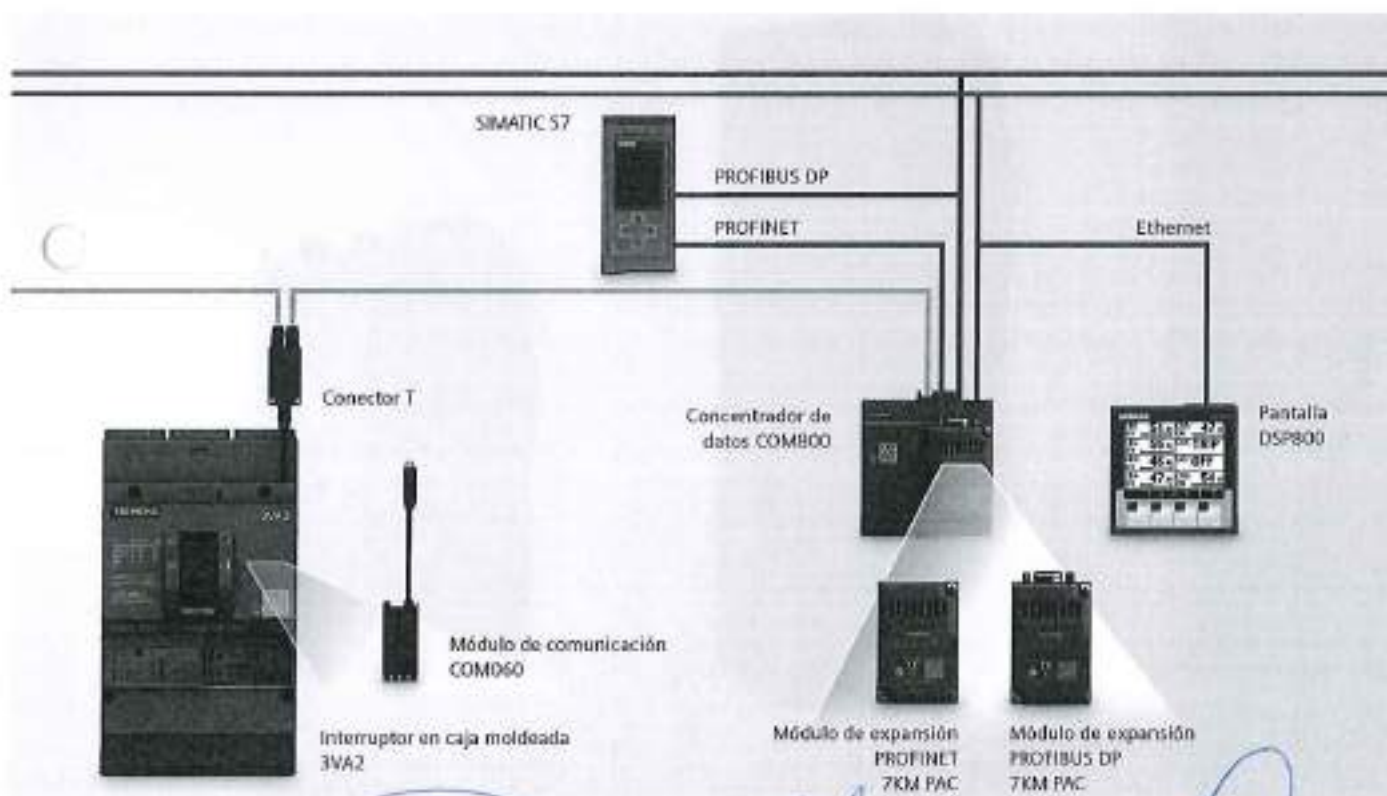
Los valores más recientes se pueden visualizar en la puerta del tablero a través de la pantalla DSP800.

Rápidamente actualizado: monitoreo

Tome la ruta más fácil para una máxima disponibilidad del sistema con el interruptor en caja moldeada 3VA2 y su capacidad de comunicación. Transmite continuamente el estado, error y señales de alarma a los sistemas de gestión de nivel superior. Si el interruptor en caja moldeada 3VA2 se instala en el marco extraíble, su posición (CONECTADO, TEST, DESCONECTADO) también puede transmitirse al sistema. Esto asegura continuamente que usted siempre tenga vigilado su sistema.

Destacados

- ETU serie 8: función de medición de tensión, corriente y valores de energía integrada.
- Visión constante del estado del interruptor (ON, OFF, TRIP) y valores límite.
- Capacidad de comunicación a través de PROFIBUS, PROFINET y Ethernet (Modbus TCP).
- Pantalla DSP800 para la visualización de los datos de medición de hasta ocho interruptores en caja moldeada, para la instalación en una puerta del tablero.
- Identificación temprana de las corrientes de falla.



CONSORCIO MULTIDIRECCIONES
RAUL MONTERO LARDA LEON
Representante Gestión

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001

JOSÉ EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

Asegurar la disponibilidad del sistema: Respuesta instantánea.



Usted puede confiar en el funcionamiento de su sistema sin problemas, ya que el interruptor en caja moldeada 3VA establece el estándar de confiabilidad. Un concepto de funcionamiento intuitivo, propiedad de selectividad excelente, y accesorios para las funciones de protección extendida aseguran una alta disponibilidad, seguridad y protección de sus sistemas.

Operar fluidamente: funciones de protección
Estar siempre del lado seguro durante la operación. El interruptor 3VA identifica rápidamente estados críticos del sistema, lo que le permite responder con rapidez para evitar paradas no programadas del sistema. Los informes de la unidad de disparo, combinados con los informes de los contactos auxiliares y de alarma, garantizan un diagnóstico rápido y fácil, así como un funcionamiento fluido.

Protección directa: selectividad
Evita los gastos innecesarios y mantiene la disponibilidad. Gracias al sofisticado concepto de selectividad de Siemens. Selectividad completa permite que el interruptor en caja moldeada 3VA desconecte el componente específico del sistema que no está funcionando correctamente, incluso en el rango de disparo dinámico, lo que previene una parada completa de todo su sistema.

Seguridad:
RCDs desconectan de manera fiable las fallas en corrientes para incrementar la seguridad del personal contra incendios y fugas a tierra.



Interruptor en caja moldeada 3VA2 con RCD820 montado del lado inferior



Interruptor en caja moldeada 3VA1 con RCD510 montado lateralmente

Constantemente protegido: seguridad operacional

Disfrute del aumento de seguridad del personal y la protección de la línea sin esfuerzo, pero con una alta confiabilidad, gracias a los dispositivos de corriente residual (RCD) montados en el interruptor en caja moldeada 3VA. Los RCD detectan continuamente las corrientes de falla de fuga a tierra y garantizan la desconexión en caso de una emergencia.

Operar convenientemente: identificación

La intuitiva operación del interruptor en caja moldeada 3VA no deja nada al azar: es claro y sencillo de manejar, así como seguro y ahorra tiempo durante la operación diaria. Por ejemplo, se puede identificar claramente la posición del interruptor, independientemente de la visibilidad, gracias al kit de iluminación inteligente.

La seguridad de los operadores del sistema fue también una consideración importante en el desarrollo del interruptor en caja moldeada 3VA.

El resultado: un alto nivel de protección contra la manipulación no autorizada, enclavamiento posterior y frontal, asegurando al actuador en la posición ON u OFF.

Pausas cortas aseguradas, incluso para aplicaciones críticas: El interruptor en caja moldeada 3VA puede reemplazarse rápida y fácilmente, especialmente cuando se instala con la tecnología enchufable o extraíble.

Destacados

- Máxima seguridad para el personal y los sistemas
- Rápida respuesta gracias al rápido y fiable diagnóstico de errores
- Prevenir paradas por medio de un concepto de selectividad sofisticado
- Operación fácil e intuitiva

Identificación clara incluso con mala visibilidad

Iluminación en los indicadores del actuador indicando la posición del interruptor 3VA, incluso cuando la visibilidad es pobre. La iluminación cambia junto con el indicador de posición del interruptor 3VA. El kit de iluminación se puede utilizar en el frente, en la puerta y en los accionamientos manuales rotativos de montaje lateral.



Amplio espectro:
Con corrientes nominales desde 16 A hasta 630 A, el interruptor 3VA1 es apropiado para muchas aplicaciones estándar, ya sea en plantas industriales o de infraestructura.



Interruptor en caja moldeada 3VA1: Estableciendo un estándar.

Destacados

- Realiza funciones estándar en residencias, edificios públicos y en infraestructura
- Su diseño extremadamente compacto lo hace ideal para su uso en pequeños tableros de distribución
- También disponible como un interruptor seccionador en un diseño en caja moldeada para aplicaciones industriales
- Interruptor en caja moldeada disponible en versiones de 1, 2, 3 y 4 polos

Especialmente diseñado para aplicaciones estándar: El interruptor en caja moldeada 3VA1 convence con un amplio rango de aplicaciones potenciales. Gracias a una corriente nominal desde 16 A hasta 630 A y una capacidad de ruptura de hasta 70 kA, es adecuado para las funcionar en hogares residenciales, edificios públicos, infraestructura y plantas industriales.

Diseño que ahorra espacio
Tiene el tamaño perfecto para los tableros de distribución: El interruptor en caja moldeada 3VA1 con corriente nominal hasta 630 A posee una tapa de tan sólo 45 mm y una construcción muy compacta. Las versiones de 1 y 2 polos son especialmente adecuados para pequeños tableros de distribución.

Adaptable como protección de línea
El interruptor en caja moldeada 3VA1 proporciona protección contra sobrecargas y cortocircuitos en cables, líneas y cargas (no motores). Sus unidades de disparo magneto-térmicos tienen un rango de ajuste extendido (0,7 a 1,0 x I_n), que les hace extremadamente flexibles en cuanto a su elección de equipo básico.

Rentable como un interruptor seccionador
El nuevo interruptor-seccionador 3VA1 disponible para IEC 60947-3 y UL 489 en un diseño de interruptor en caja moldeada, le permite desconectar de forma segura grupos de máquinas individualmente desde la red. Con sus funcionalidades adicionales, es el perfecto complemento para la serie de interruptores. Un diseño que le permite utilizar los mismos accesorios.



Instalación eléctrica segura en el mínimo espacio:
El interruptor en caja moldeada 3VA1 es ideal para su uso en tableros de distribución.

							
Interruptor en caja moldeada 3VA1	100 A	160 A	160 A	160 A	250 A	400 A	630 A
Protección de líneas	■	■	■	■	■	■	■
Seccionador	—	—	—	■	■	■	■
Aplicaciones en DC	■	■	■	■	■	■	■
Número de polos	3 ó 4	1	2	3 ó 4	3 ó 4	3 ó 4	3 ó 4
Corriente asignada I_n 50°C [A]	16 ... 100	16 ... 160	16 ... 160	16 ... 160	160 ... 250	250 ... 400	400 ... 630
Tensión asignada de operación U_n AC [V]	Hasta 690	Hasta 220	Hasta 220	Hasta 690	Hasta 690	Hasta 690	Hasta 690
Capacidad de ruptura última asignada I_{cu} 380 ... 415 V [kA]	16, 25, 36	25, 36*	25, 36	25, 36, 55, 70	36, 55, 70	36, 55, 70	36, 55, 70
Unidad de disparo Térmica	fija	fija	fija	fija / regulable	fija / regulable	Fija / regulable	Fija / regulable
Unidad de disparo Magnética	fija	fija	fija	fija / regulable	fija / regulable	Fija / regulable	Fija / regulable

* a 240V AC

CONSORCIO MULTIOBJETOS
Rude
RAÚL MONTERO LARDA LEÓN
Representante General

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

Alta funcionalidad:
Con una corriente nominal de 25
a 1000 A, el interruptor en caja
moldeada 3VA2 está diseñado
para aplicaciones exigentes.



Interruptor en caja moldeada 3VA2: Cumple con altas exigencias.

Destacados

- Cumple con las más altas exigencias técnicas de la infraestructura y la industria
- Excelentes características de selectividad para alta disponibilidad del sistema
- Opciones de comunicación flexibles para la transparencia en el sistema de distribución de energía

En el tablero principal, en el de distribución de energía: Las necesidades exigentes son un juego de niños para el interruptor en caja moldeada 3VA2. Con sus unidades de disparo electrónicas, las opciones integradas de comunicación y la función de medición integradas, totalmente equipadas para su aplicación específica. Y su mayor capacidad de ruptura y excelentes características de protección selectiva también agregan valor importante.

Siempre listo

El interruptor en caja moldeada 3VA2 ofrece una protección de línea confiable y disponibilidad óptima del sistema en la industria de procesos y automatización, en edificios industriales y en infraestructura. Numerosos accesorios incluyendo gran variedad de tecnologías de conexión, diversos accionamientos, y accesorios internos que permiten un uso flexible, especialmente en la construcción de máquinas.

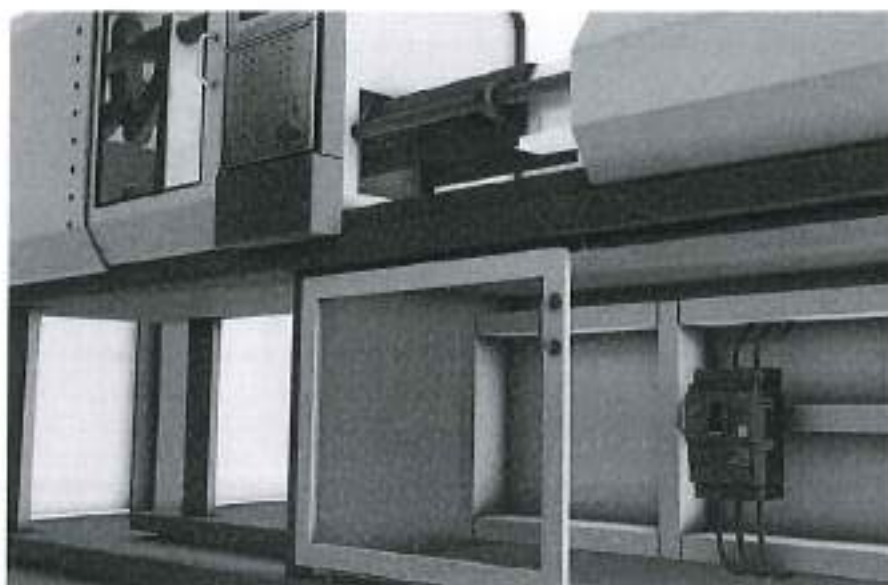
Comunicación flexible

Gracias a sus capacidades de comunicación flexibles, el interruptor en caja moldeada 3VA2 ayuda a optimizar su utilización en el sistema e identificar posibles ahorros de energía. Informa de manera fiable los estados del sistema y los valores medidos al sistema de gestión de energía de nivel superior y los sistemas de automatización, que proporcionan importantes beneficios de la eficiencia, en particular en plantas industriales.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANZA LEÓN
Reg. CIP N° 159001

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



Aumento de la eficiencia:
El interruptor en caja moldeada 3VA2 supervisa de manera confiable el flujo de energía en entornos industriales, lo que garantiza una disponibilidad óptima del sistema.


						
Interruptor en caja moldeada 3VA2	100 A	160 A	250 A	400 A	630 A	1000 A
Número de polos	3 ó 4	3 ó 4	3 ó 4	3 ó 4	3 ó 4	3 ó 4
Corriente asignada I_n 50°C [A]	25 ... 100	25 ... 160	160 ... 250	250 ... 400	400 ... 630	630 ... 1000
Tensión asignada de operación U_n AC [V]	690	690	690	690	690	Hasta 690
Capacidad de ruptura última asignada I_{cu} AC [kA] 380 ... 415 V AC	55, 85, 110, 150	55, 85, 110, 150	55, 85, 110, 150	55, 85, 110, 150	55, 85, 110, 150	55, 85, 110, 150
Unidad de disparo (electrónica)						
Protección de líneas LI ETU320	■	■	■	■	■	■
LIG ETU330	■	■	■	■	■	■
LSI ETU350/550/850	■	■	■	■	■	■
LSIG ETU560/860	■	■	■	■	■	■
Capacidad de comunicación (opcional)	■	■	■	■	■	■
Adquisición de datos de energía	Disponible en las ETUs 8					

CONSORCIO MULTIPROYECTOR
PAUL MONTERO LANZA LEÓN
Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

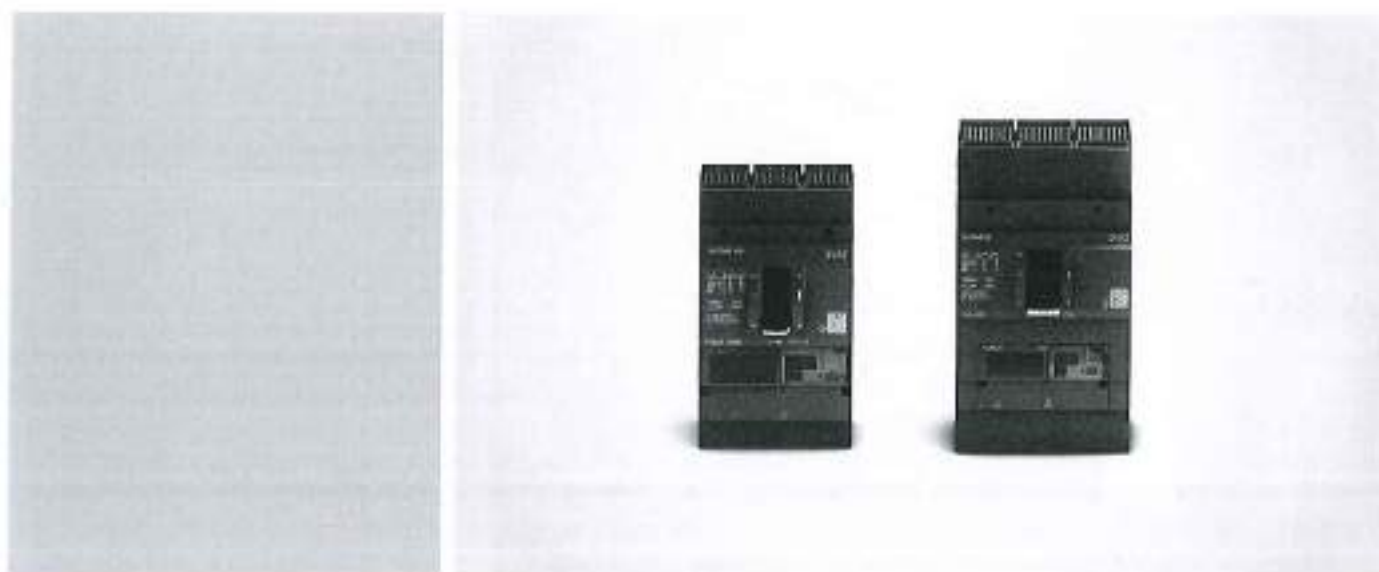Características principales



	3VA1 (Aplicaciones Standard)	3VA2 (Aplicaciones Selectivas)
Aplicaciones	Aplicaciones Standard	Demandas Exigentes
Tamaño	100 A / 160 A / 250 A / 400 A / 630 A	100 A / 160 A / 250 A / 400 A / 630 A / 800 A / 1000 A
Unidad de disparo	Termomagnética (TMTU)	Electrónica (ETU)
Capacidad Interruptiva IEC I_{cu} 415 V 50/60 Hz 690 V 50/60 Hz	16-70 kA Arriba de 10 kA	55-150 kA Arriba de 24 kA
Selectividad	Restringida	Excelente 1:2,5
Comunicación	No	Opción Disponible
Adquisición de Datos	No	Posible con la serie 800
Accesorios	Amplio Rango	Amplio Rango
	• Aplicaciones Standard I_{cu} 70 kA@415V • Aplicaciones DC • Diseño Compacto	• Alta Capacidad Interruptiva • Selectividad • Comunicación y Función de Medida

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 PAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

Unidades de disparo



Tipos de unidades de disparo

ETU 3-series	ETU 5-series	ETU 8-series
		
Ajustes rotatorios de corriente absoluta en Amps	- Menú de pantalla - Opción de comunicación Disponible - Opción externa de N-CT	- Menú de pantalla - Monitoreo y adquisición de Datos - Opción de Comunicación - Opción externa de N-CT
Línea / Protección de Generador protección: - ETU320 U - ETU330 UG - ETU350 LSI	Línea / Protección de Generador: - ETU550 LSI - ETU560 LSIg	Línea / Protección de Generador: - ETU850 LSI - ETU860 LSIg
Protección de Línea: ETU340 Característica de Fusible (ELISA)		
Protección de Motor: ETU350M LSI	Protección de Motor: —	Protección de Motor: ETU860M
Protección de Arrancador: ETU310M I	Protección de Arrancador: —	Protección de Arrancador: —

Funciones de protección de las unidades de disparo

Protección		ETU320	ETU330	ETU340	ETU350	ETU550	ETU560	ETU850	ETU860	ETU310M	ETU350M	ETU860M
		LI	UG	ELISA	LSI	LSI	LSIG	LSI	LSIG	I	LSI	LSIG
Protección de Línea		x	x	x	x	x	x	x	x	—	—	—
Protección de Motor		—	—	—	—	—	—	—	—	x	x	x
Versión disponible en:												
3-poles sin transformador externo de protección del neutro		x	x	x	—	—	—	—	x	x	x	
3-poles con transformador externo de protección del neutro		—	—	—	x	x	x	x	—	—	—	
4-poles con protección del Neutro		x	x	x	x	x	x	x	—	—	Parámetros de protección	
Parámetros de protección disponibles:												
L	Curva característica de Tiempo Largo I_t	x	x	I_t	x	x	x	x	x	—	x	x
	I_{t1}	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x	x
	I_{t2}	x	x	—	x	x	x	x	x	—	x	x
	Memoria Térmica	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x	x
	Memoria Térmica puede ser Habilitada o Deshabilitada, on / off	—	—	—	—	x	x	x	x	—	—	—
S	I_{t3}	—	—	—	x	x	x	x	x	—	—	x
	I_{t4}	—	—	—	x	x	x	x	x	—	—	x
	Características de la Curva en Tiempo Corto I_1 I_{t5}	—	—	—	x	x	x	x	x	—	—	x
	Características de la Curva en Tiempo Corto 5 Ajustable: I_{t5} / I_{t6}	—	—	—	—	x	x	x	x	—	—	—
	I_1 Ajustable	x	x	—	—	x	x	x	x	x	—	x
I	I_1 No Ajustable	—	—	x	x	—	—	—	—	—	x	—
	I_{t6}	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x	x
	I_{t7}	—	x	—	—	—	x	—	x	—	x	x
	I_{t8}	—	x	—	—	—	x	—	x	—	x	x
	Características de la Protección 0 - Area: P_0	—	—	—	—	—	x	—	x	—	—	x
G	Características de la Protección 0 - Area: Ajustable I_{t8} / I_{t9}	—	—	—	—	—	x	—	x	—	—	x
	Función de Alarma de la falla a Tierra	—	—	—	—	—	x	—	x	—	—	—
	Protección de anillo de Fase I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	x
	I_{t9} I_{t10}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	x
	Protección de Bloqueo I_{t11}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x
E	I_{t12}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x
	Protección de marcha en Vacío Icc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x
	Icc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x
29		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Características y Opciones:												
Ajustes por Potenciómetros Rotatorios		x	x	x	x	—	—	—	—	x	x	—
Ajustes por Pantalla		—	—	—	—	x	x	x	x	—	—	—
Visualización de Valores vía pantalla de la ETU		—	—	—	—	x	x	x	x	—	—	—
Funciones de Medición		—	—	—	—	—	—	x	x	—	—	x
Opción de Comunicación		—	—	—	—	x	x	x	x	—	—	x
Interface Frontal		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

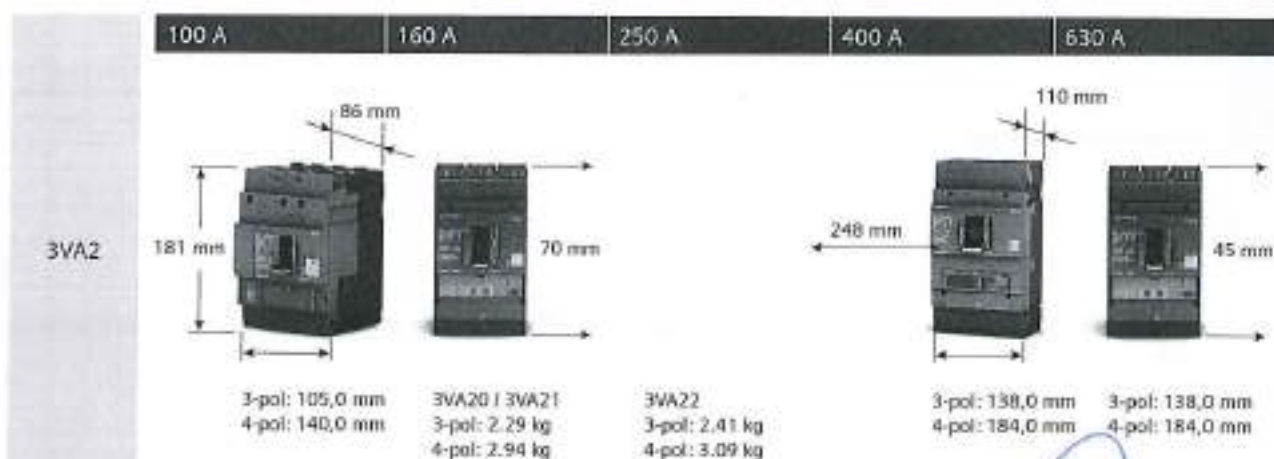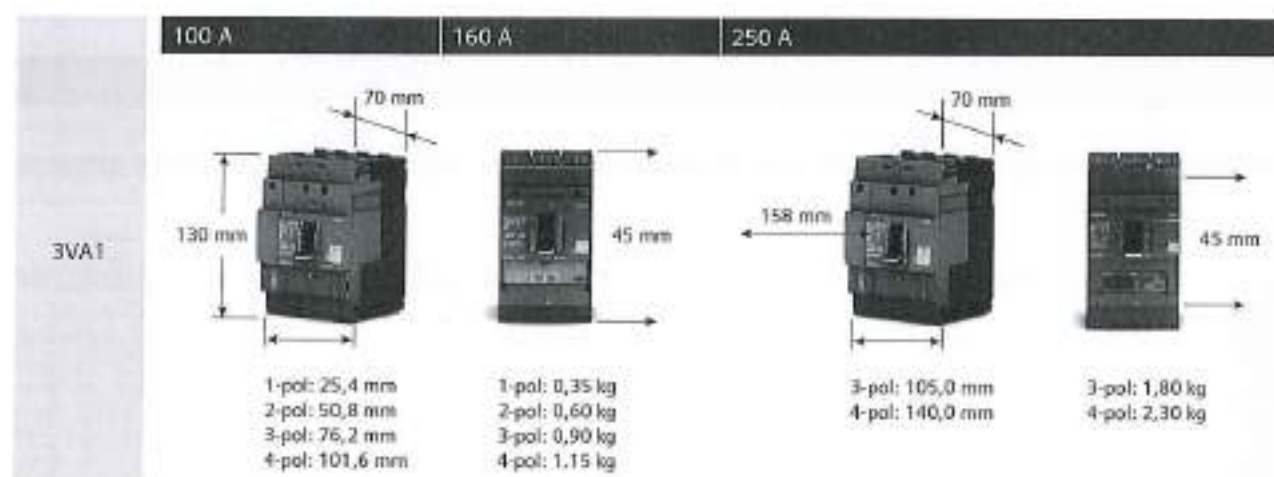Dimensiones / Corte de Toggle / Peso



Dispositivos de corrientes residuales

Basic RCD310



Basic RCD510



Basic RCD320



Basic RCD520



MRCD



Advanced RCD820



MRCD



Los dispositivos de Corriente Residual nos proporcionan:

- Protección de fallas contra contactos indirecto
- Protección adicional contra el Contacto directo en caso de que falle el aislamiento básico o que las partes vivas fueran afectadas directamente.
- La prevención o reducción de lesiones a las personas y los animales domésticos, así como daños a la propiedad.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
INGENIERO LAMDA LEON
Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645



Sede Central, Siemens SA de CV

Ejército Nacional 350
Polanco V Sección, Deleg. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México.

Centro de Atención a Clientes
servicios.mx@siemens.com
01800 560 0158, opción 2

Este folleto de productos contiene solo descripciones generales o prestaciones que en el caso de aplicación concreta pueden o no coincidir exactamente con lo descrito, o bien haber sido modificadas como consecuencia de un anterior desarrollo del producto. Por ello, la presencia de las prestaciones descritos solo será vinculante si se ha estipulado expresamente al concluir el contrato.

f /SIEMENS.Mexico

tw @SIEMENS_MEXICO

in /COMPANY/SIEMENS

yt /user/SIEMENS

www.siemens.com.mx

Sujeto a cambios sin previo aviso
Impreso en México
Siemens S.A. de C.V. ®

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LARDA LEÓN
Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159801

JOEL EFRAÍN CAMARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

Lima, 12 de abril de 2022

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores:

CREACIONES HADASA S.A.C.

Presente. –

Referencia: OC 14-2022 y OC 15-2022

Estimados Señores:

Por medio de la presente dejamos constancia que las luminarias que han sido suministradas para las órdenes indicadas en la referencia están fabricadas siguiendo las normas IEC-60598/ IEC-61547/ IEC-62471 / IEC-61000-3-2

LUMINARIAS
HABITAD 0X24W ML ADOS PE RED EL 4K
SEÑALIZADOR MOD SALIDA <= 5W ML ADOS ATR REC EL
WALL PACK LED 50W ML ADOS PC REC EL 4K
HERMETICO LED 0X70W ML ADOS PCA REC EL 4K

FACTURA	FECHA
F002-003017	17/03/2022
F002-003064	06/04/2022
F002-003066	06/04/2022


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRIMA
 INGENIERO CIVIL,
 Reg. CIP N° 174848

Beneficiario	Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – PRODESA
RUC	20414251561
Obra	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE, derivado del CONTRATO DE OBRA N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II / COMPARACIÓN DE PRECIOS CP N° 003-2021-SENASA/PRODESA.
Dirección	Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios - Ate Vitarte-Lima-Lima

Así mismo, garantizamos que los materiales y/o equipos ofrecidos son fabricados con materiales de alta calidad y en perfecto estado de conservación

PORTALAMPARAS S.A.C


Sergio Ordoñez Ore
 GERENTE COMERCIAL

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA
 Representante Común


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 160001

● LIGHTI

TRIAL

● MOBILIARIO

● MEDIC



HERMETICO LED 72W

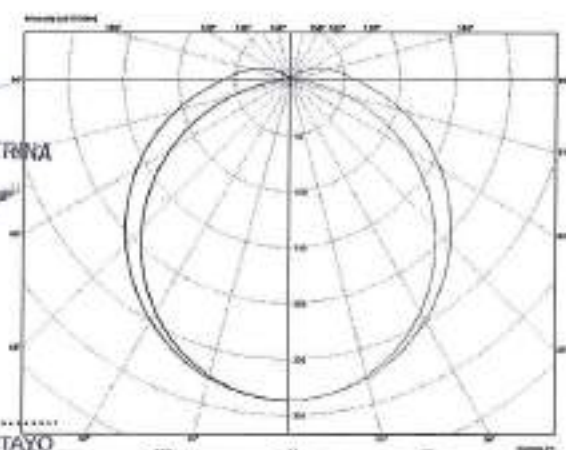
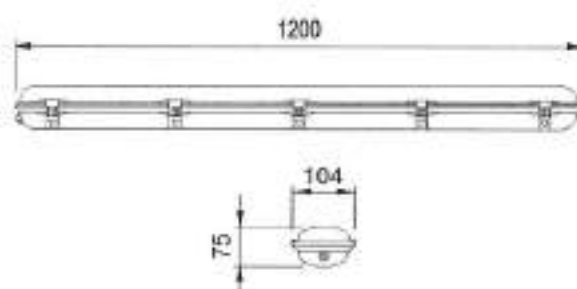
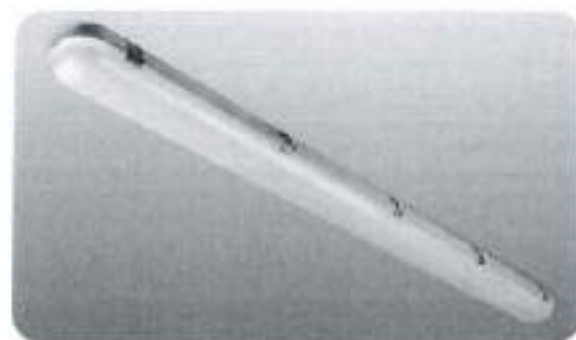
Luminaria hermética para ser instalada adosada o suspendida.

Aplicaciones:

Para iluminar almacenes, galpones, estacionamientos, talleres de uso múltiple, baños y en todo ambiente donde tengan gran humedad y polvo.

Descripción:

- Módulo LED fabricado con chip tipo SMD 2835.
- Cuerpo fabricado en Policarbonato.
- Cubierta de óptica fabricada en policarbonato opalina.
- Cuenta con conexión de puesta a tierra.
- Incluye accesorios para fijación de luminaria en techo y una prensaestopa para acceso de cable.
- El diseño y fabricación cumplen con las normas IEC-60598 / IEC-61547 / IEC-62471 / IEC 61000-3-2 ECM.
- Flujo luminoso : 8863 lm
- Eficacia : 123 lm/W
- CRI : > 80
- CCT : 4000 K
- Apert. Del haz : Extensivo
- Tipo de led : SMD 2835
- Vida útil : L70B50@25°C > 50000 H
- Riesgo Fotobiológico: RG0 Exento
- Consistencia del Color < 3SDCM
- Libre de FLICKER
- Driver : Electrónico
- Potencia : 70 W
- Input : 220 -240 VAC
- Frecuencia : 50/60 Hz
- Fdp : 0.95
- THD : 13.8 %
- IP : 65
- IK : 08
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 40°C



JOEL EFRAIN CHAVARRIA GUTIERRA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 139001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LAMDA LEON
Representante General



13. Informe de Monitoreo, Mitigación del Impacto Ambiental y Seguridad en Obra.



JOEL EFRAIN CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE
 CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y



HOSPEDEROS"

		RESPONSABLE / CARGO	FIRMA
REVISIÓN:01	ELABORÓ	ING. Eda Mirla Rodríguez Acho ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 Eda Mirla Rodríguez Acho CIP N° 230779 Ing. Especialista en Seguridad
	REVISÓ	ING. José Leónidas Sosa Yactayo RESIDENTE DE OBRA	 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 150001

ABRIL - 2022

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 JOEL CFRÁN CHAVARRÍA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

Contenido

1. INTRODUCCION	3
2. ALCANCES Y OBJETIVOS:	3
3. MARCO LEGAL	5
4. DESCRIPCION DEL PROYECTO	6
5. ORGANIGRAMA	7
6. DESCRIPCIÓN	7
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	10
8. EVIDENCIA FOTOGRAFICA	2


 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Legal


 Eda Miria Rodriguez Acha
 CIP 239776
 Ing. Ambiental
 Ing. SSCMA


 JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeiero Civil
 CIP N° 155009

1. INTRODUCCION

El presente informe de monitoreo, implementación de las medidas de mitigación del medio ambiente y seguridad en la obra para la "Construcción Del Laboratorio De Crianza De Insectos Benéficos Y Hospederos" da a conocer las diferentes actividades realizadas en el periodo del 01 al 30 de Abril del 2022, con respecto al plan de trabajo.

Para ello fue necesario efectuar un análisis de los principales factores de riesgo, en cada actividad realizada estableciendo las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo para prevenir posibles riesgos presentados en la obra, también accidentes laborales y daños a terceros.

Su aplicación es obligatoria para todo el personal que participe en la ejecución de la obra. Con ello, se deja constancia que se viene realizando la concientización al personal en obra sobre los peligros y riesgos inherentes en las diferentes actividades realizadas diariamente en los diferentes frentes de trabajo establecidos por el proyecto.

Para lo cual se espera conseguir la máxima identificación y compromiso por parte de todos los trabajadores y teniendo en cuenta los principios de seguridad y salud en el trabajo, además de la conservación del medio ambiente, cumpliendo así con el plan de seguridad y salud en el trabajo elaborado para la obra.

Se presenta el siguiente informe en donde se detalla las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas en obra durante la ejecución de actividades que corresponden a la Valorización de Obra N°01 del adicional N° 2 del periodo del 14 al 30 de Abril del 2022 del proyecto.

2. ALCANCES Y OBJETIVOS:

2.1. Alcances

En el presente informe va dirigido a toda la línea de mando para que pueda estar informada de la situación actual en el proyecto, creando más líneas de comunicación de manera oportuna y segura para la verificación de los procedimientos que se aplicó en las actividades realizadas referente a la Seguridad y Salud en el Trabajo, por todo el personal que labora en la Obra

JOEL EFRAN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

Eda Miria Rodríguez Ache
 CIP 230796
 Ing. Ambiental
 Ing. SSCMA

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	---	---

en cuanto a lo ambiental y Seguridad se está tomando como base la Matriz de Riesgo que considera en la ubicación y estado del terreno.

2.2. Propósito

El presente informe da a conocer la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de los trabajos de CONSORCIO MULTIPROYECTOS, en el proyecto: "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE".

A través de las actividades de prevención descritas en nuestro Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y el Plan de Vigilancia, Prevención y Control frente al COVID-19, se busca concientizar al personal en el cumplimiento de los procedimientos de seguridad:

- Manteniendo comprometidos a todos los niveles de la organización.
- Promoviendo una cultura preventiva en seguridad, proteger la salud y la integridad física de los colaboradores.
- Optimizando el análisis y control de riesgos.
- Reduciendo los accidentes de trabajo.
- Optimizando el desempeño del personal en el control de emergencias.
- Garantizando la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar el SARS-CoV-2.

JOEL EFRATA CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

2.3. Objetivos.

- Cumplir con los estándares ambientales y de seguridad requeridas para la construcción de la edificación que proporcionen todos los ambientes seguros y con la confianza de un trabajo seguro, brindando todas las facilidades para una evacuación segura de la edificación en caso de emergencia en salvaguarda de la vida humana, cumpliendo los estándares de protección y seguridad establecidos en el RNE y otras normas vigentes.
- Involucrar e instruir a todo el personal que labore en la ejecución de obra.
- Realizar la eliminación de basura y conservación del Medio Ambiente en un 100% generada en la obra y velar por la Seguridad y Salud en el Trabajo.

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159301

Eda Miria Rodríguez Acha
CIP 230726
Ing. Ambiental
RNE GSOMA

3. MARCO LEGAL

- Ley N° 30222, modificatoria de la Ley N° 29783-2011 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo".
- D.S. 006-2014-TR "Reglamento de la Ley 30222".
- R.M. 375 Norma Básica de ergonomía.
- Norma G.050 Seguridad durante la construcción – Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud N° 26790.
- Reglamento de la Ley 26790 "Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud N° 26790".
- Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos - D.S. 003-98-SA.
- Ley General de Residuos Sólidos N° 27314.
- Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos D.S. 057-2004-PCM.
- Aprueban Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agente Químicos en el Ambiente de Trabajo – D.S. N° 0015-2005 SA.


 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


 JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Eda Miria Rodríguez Achá
 CIP 230778
 Ing. Ambiental
 Reg. SBCMA

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	---	---

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

4.1. LOCALIZACIÓN:

El proyecto se encuentra ubicado en el Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios, Distrito de Ate Vitarte, Provincia y Departamento de Lima.



Ubicación:	Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios – Ate Vitarte – Lima – Lima.
Distrito:	ATE VITARTE
Provincia:	LIMA
Tipo de Proyecto	CONSTRUCCIÓN.

4.2. INTEGRANTES DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE:

- Ing. Eda Mirla Rodríguez Acho– PREVENCIÓNISTA SSOMA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP-N° 159001


 Eda Mirla Rodríguez Acho
 CIP 238776
 Ing. Ambiental
 Ing. SSOMA


 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

5. ORGANIGRAMA




6. DESCRIPCIÓN

6.1. TRABAJOS EJECUTADOS:

ACTIVIDAD	EMPRESA	TRABAJOS DE ALTO RIESGO IMPLICADOS
Excavación manual para el canal de anti hormigas	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo
Encofrado y desencofrado de la para el canal de anti hormigas	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo
Vaciado para el canal de anti hormigas	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo
Pintado en óleo en cielo raso y vigas	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Pintado en óleo en muros interiores	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Pintado epóxido en muros interiores	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Instalación de caja de registro para válvula en piso	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Instalaciones eléctricas	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo
Instalación de salidas para tomacorrientes	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Canalizaciones y/o tuberías	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Eliminación de material excedente	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Eda Mirla Rodríguez Acho
 CIP 230776
 Ing. Ambiental
 Ing. SSCMA


 JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	--	---

6.2 DETALLADO DE CAPACITACIONES

En este mes se han desarrollado Inducción de Hombre Nuevo, Charlas de 10 minutos e Inducción a Visitas, abarcando temas con referencia a seguridad en obra y medidas a tomar frente al COVID-19.

CUADRO DE CHARLAS DEL MES DE ABRIL- 2022	
DIA	TEMAS
13/04/2022	Que quieres ser pato o águila
14/04/2022	Feriado (Semana Santa)
15/04/2022	Feriado (Semana Santa)
16/04/2022	Los trabajadores que piensan evitan accidentes
18/04/2022	Nunca se es demasiado viejo o sabio para aprender
19/04/2022	Los excesos no son buenos
20/04/2022	Los buenos hábitos ayudan
21/04/2022	Cadena de hábitos
22/04/2022	Orden y limpieza
23/04/2022	Protección para la cabeza
25/04/2022	Los riesgos de realizar bromas en el área de trabajo.
26/04/2022	Ergonomía
27/04/2022	Prevención contra Incendios -General
28/04/2022	autodisciplina "Una forma para alcanzar la seguridad"
29/04/2022	La importancia de la desinfección de las herramientas
30/04/2022	Manejo de residuos peligrosos

6.3 INDUCCION HOMBRE NUEVO Y VISITAS

Inducción Hombre Nuevo

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645


Mes	Tema	Minut. Cap.	Asistentes	Horas Cap.	Expositor	Cargo
Abril	Inducción a Hombre Nuevo	0.83	10	5	Ing. Eda Mirla Rodríguez Acho	Jefe de Seguridad
Total de horas capacitadas				8		

Inducción Visitas

Mes	Tema	Minut. Cap.	Asistentes	Horas Cap.	Expositor	Cargo
Abril	Inducción a Visitas	0.56	17	2	Ing. Eda Mirla Rodríguez Acho	Jefe de Seguridad
Total de horas capacitadas				3		

Eda Mirla Rodríguez Acho
CIP 236796
Ing. Ambiental
Ing. SBCMA

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 158001

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	---	---

6.4 INDUCCION A REUNION DE INICIO DE JORNADA

Reunión de Inicio de Jornada (Personal de STAFF)

Mes	Tema	Minut. Cap.	Asistentes	Horas Cap.	Expositor	Cargo	Cargo
Abril	Temas del Mes	2.4	6	24	Ing. Eda Mirla Rodríguez Acho	Jefe de Seguridad	
Total de horas capacitadas				425			

Reunión de Inicio de Jornada (Personal de Obra)

Mes	Tema	Minut. Cap.	Asistentes	Horas Cap.	Expositor	Cargo	Cargo
Abril	Temas del Mes	3.153	473	400	Ing. Eda Mirla Rodríguez Acho	Jefe de Seguridad	
Total de horas capacitadas				425			

6.5 RESUMEN DE CAPACITACIONES

DESCRIPCIÓN	NUMERO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES	TOTAL, HORAS HOMBRE CAPACITADAS
Inducción a Personal Nuevo	6	1 H.H.
Inducción a Visita	3	0.83 H.H.
Charlas a Inicio de Jornada	27	3.65 H.H.
Total		5.48 H.H.

6.6. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1.1 FORMATOS DE SST E INSPECCIONES REALIZADAS

FORMATOS DE SST	CANTIDAD
ATS	38
INSPECCIONES REALIZADAS	
Inspecciones de Extintor	01
Inspecciones de Botiquín	01
Inspección equipos y herramientas	01

6.1.2 INCIDENTES Y ACCIDENTES EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD
Horas Hombre Trabajadas	3.153
Horas Hombre Capacitadas	400

JOEL EFRAIM CAYARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

Eda Mirla Rodríguez Acho
CIP 230776
Ing. Ambiental
Rg. SCSMA

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

SENASA PERU	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	CONSORCIO MULTIPROYECTOS
-----------------------	---	---------------------------------

Número de trabajadores	473
Número de Atenciones Médicas comunes reportadas y días perdidos	0
Número de Atenciones Médicas ocupacionales reportadas y días perdido	0
Incidentes	0
Accidentes	0

6.1.3 CALCULO ESTADISTICO DE INDICADORES

Para el cálculo del índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad se utilizarán las siguientes formulas según el DS 011-2019-TR.

CALCULO DE INDICES DE SEGURIDAD Para el cálculo de los indices de seguridad, se tomaran en cuenta los accidentes mortales y los que hayan generado descanso medico certificado por colegiado.		
Índice de frecuencia mensual	IFm	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el mes} \times 100000}{\text{numero de horas trabajadas en el mes}}$
Índice de gravedad mensual	IGm	$\frac{\text{Días perdidos en el mes} \times 1000000}{\text{numero de horas trabajadas en el mes}}$
Índice de frecuencia acumulado	IFa	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el año} \times 100000}{\text{numero de horas trabajadas en el año}}$
Índice de gravedad acumulado	IGa	$\frac{\text{Días perdido en el año} \times 1000000}{\text{numero de horas trabajadas en lo que va del año}}$
Índice de accidentabilidad	IA	$\frac{IFa \times IGa}{100}$

$$IF = \frac{0}{11000} \times 1000000 = 0$$

$$IS = \frac{0}{11000} \times 1000000 = 0$$

$$IA = \frac{IF \times IS}{1000} = \frac{0 \times 0}{1000} = 0$$


 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


 Eda Miria Rodríguez Acha
 CIP 230796
 Ing. Ambiental
 Ing. 690544


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 150001

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se determina que:

- Se realiza el cumplimiento de la implementación de las medidas según el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. Se siguen los protocolos sanitarios según la RM No 087-2020-VIVIENDA y RM-972-2020-MINSA.
- En el presente mes de Abril se ha tenido un total de 425 horas hombre trabajadas con un total de 400 horas hombre capacitadas.
- No hubo incidentes y accidentes durante el periodo del 01 al 14 de Abril del 2022.
- Durante el mes no se reportó ningún tipo de derrame dentro de la obra o algún hecho que pudiera ocasionar contaminación alguna.
- Se cumple con realizar según el Plan de Seguridad y Salud las inspecciones programadas.

MR
 Eda Miria Rodríguez Acha
 CIP 230778
 Ing. Ambiental
 Ing. ASOMA

J. S.
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

Joel Efraim Chavarria Cotrina
 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

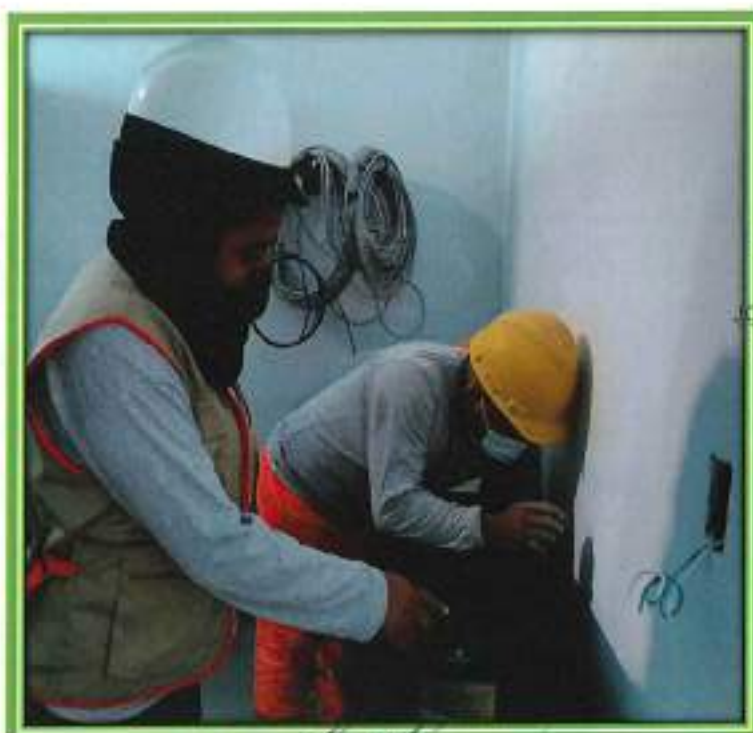
8. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL COVID-19

CHARLAS DIARIAS AL INGRESO DE LA JORNADA



USO DE EPPS ADECUADOS.



[Signature]
 JOEL EFRAIN CHAVARRIA GUTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174645

[Signature]
 Eda Miria Rodríguez Acha
 CIP 230776
 Ing. Ambiental
 Ing. ESOMSA

[Signature]
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

ELIMINACION Y RIEGO DE MATERIAL PARTICULADO CON MAQUINARIAS

SEGREGACION DE RESIDUOS PELIGROS POR LA EMPRESA HUANCHAQUITO S.R.L.


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

Ing. María Rodríguez Acha
 CIP 230776
 Ing. Ambiental
 Ing. SSO66A

JOSÉ LEONIDAS SOGA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

PERSONAL HACIENDO EL BUEN USO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS



INSPECCION DE EXTINTOR Y CAMILLA DE EMERGENCIA



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

Eda Miria Rodríguez Acha
 CIP 230778
 Ing. Ambiental
 Ing. S&S&A

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-CC05
		F. EMISION:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 15min

HORA: 7:00-7:15

DÍA: 16-04-22

TEMAS TRATADOS:

Los trabajadores que piensan evitar accidentes.

PARTICIPANTES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	DAILES RIVERA C. M. I. U.	
2	COMPLIDO ALVARADO SEGURA	
3	VILLANUEVA SALAS HUGO	
4	ESPINOSA GRANDEZ J. L. H.	
5	DIAS ANDERSON P. E. D.	
6	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILLIAM	
7	ESPINOSA GRANDEZ J. L. H.	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 Edo Miró Rodríguez Acha CIP 230776 Ing. Ambiental mg. SSOMA FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTA Ingeniero Civil CIP N° 158001 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	--	---

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-C095
		F. EMISIÓN:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 15 min

HORA: 7:00-7:15



DÍA: 18-04-22

TEMAS TRATADOS:

Nunca se es demasiado viejo
 o sabio para aprender

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	COMETIVO ALVARADO SEGUNDO EDUARDO	
2	Cometivos Davila Edward Maycol	
3	Cometivos Ortiz Cirilo	
4	Cometivos Calderon Jedy	
5	Cometivos Pardo Yimull	
6	Cometivos Moreatto Maycol	
7	Cometivos Lopez Roscos	
8	Cometivos Salas Hugo	
9	Cometivos Gallegos	
10	Cometivos Cosme Molina	
11	Cometivos Gonzalez John Juan	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	--	---

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-CC05
		F. EMISION:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 15 min

HORA: 7:00-7:15

DÍA: 19-04-22

TEMAS TRATADOS:

Los excesos no son buenos

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Cometines David Eduardo Maycol	
2	Graus Calderon Fredy	
3	Cometines Alvarado SEYMEN	
4	Cometines David Arnold	
5	Miguel Rito Yvanely	
6	Duciles Ruyter Cirilo	
7	Perez Molina William	
8	Amal Gallegos M	
9	Elijo Roca Adelina	
10	Morales Salas Hugo	
11	Sanchez Cesar Marcos	
12	de la Cruz Lopez Wilman	
13	Tafur Cieza Ruth	
14	Luis Oswaldo Leon Curo	
15	Maximo Navarro Eusebio	
16	Isaac Lopez B	
17	Anibal Cosme Molina	
18	RESERVO. VALLE	
19	Silvestre Jhonatan	
20	William Rojas Guey	
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		


 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O
CAPATAZ


 Eda Miria Rodriguez Acha
 CIP 236775
 Ing. Ambiental
 M. B. 2018/01/10
 FIRMA DEL SUPERVISOR
SSOMA


 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545
 FIRMA DEL RESIDENTE DE
OBRA



	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-CC05
		F. EMISION:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 1 horaHORA: 9:00 - 10:00DÍA: 19-04-22

TEMAS TRATADOS:

Inducción a la visita
"Los excesos no son buenos"

PARTICIPANTES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	JUNIOR GONZO RAMIREZ	
2	ACHUNERO JOHNS PORDAL	
3	LUQUE YBACERA PAUL ERNESTO	
4	CHAVEZ, GARCIA YOLIANA MAGGLEY	
5	SANCHEZ GILANO ROBERTO	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 Eda Mila Rodríguez Acha CIP N° 230776 Ing. Ambiental Ing. SANCHEZ FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	--	---


	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-CC05
		F. EMISION:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 1 horaHORA: 09:00 - 10:00DÍA: 19-04-22

TEMAS TRATADOS:

Hombre nuevo " los excesos no
son buenos.

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Tafur Cieza Ruth	
2	Eda Miro Rodriguez A.	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 574545
24		
25		
26		
27	CONSORCIO MULTIPROYECTOS	
28		
29	RAUL MONTERO LANDALEON Representante Comen	
30		

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	--	---

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CÓDIGO:	SGSSOMA-CC05
		F. EMISIÓN:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 15 min



HORA: 7:15 - 7:30

DÍA: 20-04-22

TEMAS TRATADOS:

Los buenos hábitos ayudan

PARTICIPANTES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Nazari Soriani Sandro	
2	Daviles Rector Cirilo	
3	De la Cruz Lopez Wilmar	
4	Rojas Yumaila Miguel	
5	Morales Suarez Marino	
6	Cortez Maldonado Macy	
7	Peralta Silitas Sara	
8	Garcia Calderon Yedy	
9	Perez Molina William	
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 Eda Miria Rodriguez Acha CIP 230776 Ing. Ambiental Representante Común FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 158001 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	---	---

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-CC05
		F. EMISION:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 30 min

HORA: 7:00-7:30

DÍA: 21-09-22

TEMAS TRATADOS:

Locales de cobitos

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Desario Oblitas Sara	
2	Cortez Morcote Henry	
3	Luis Oswaldo Leon Curo	
4	Guillermo Collares Jedy	
5	Tafur Cioza Puth	
6	Maximo M. Jmo. Quento	
7	Darin Serrano Sando	
8	Miguel Ota Yizivilin	
9	Carlos Adelirara Elisco	
10	Daniel Rojas Ciriaco	
11	Liraillo Rojas Jose Wilg	
12	Guil Collares M	
13	Guil Collares M	
14	Anibal Cosme Molina	
15	WILFREDO HUARACA GOMEZ	
16	EDWIN YAKI BAUDOCES	
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ		 FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA
		 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
PAUL INGENIERO LANDALON
Representante Común

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 156001

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO: 5GSSOMA-CC05
		F. EMISION: 17/03/2022
		VERSION: 01
		PAGINA: 1 de 1

DURACIÓN: 30 min

HORA: 7:00 - 7:30

DÍA: 22-04-22

TEMAS TRATADOS:

Orden y limpieza

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Cometivos David Eduardo Maycol	
2	Cometivos Paula Arnold	
3	Cortez Margarita Marco	
4	Peralta Obdilia Sara	
5	de la Cruz Lopez Wilmar	
6	Luis Oswaldo Leon Curi	
7	MANUEL NABALLANES PAVAR	
8	Mexiles Renteria Cirilo	
9	Maximo Mariano Augusto	
10	Marin Spriano Sandro	
11	La Sol Ato Yuvia	
12	Torres Ciro Ruth	
13	Juan Carlos	
14	Carro P. L. S. E. E. E.	
15	CARILLO ROSAS JOSE	
16	Sanchez Cesar Marco	
17	La Cruz V. S. E. E. E.	
18	Anibal Cosme Molina	
19	VILFREDO HUARACA GOMEZ	
20	Henry Torres Guispe	
21	Julian Aliaga Milton	
22	EDWIN YAUZ AMPICCAN	
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 Eda Miria Rodriguez Acha CIP 230776 Ing. Ambiental FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 JOSE LEONIDAS SANCHEZ YACTANI Ingeniero Civil CIP N° 158001 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	--	--

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAUL MONTERO LAMBA LEON
Representante Común

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	808SOMA-CG05
		F. EMISION:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 30 min.

HORA: 7:00 - 7:30

DÍA: 23-04-22

TEMAS TRATADOS:

Protección para la obra

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Cometivos Davila Maycol	
2	Cometido ALVARO ZEBORRO	
3	Cotoz Joralejo Marcelo	
4	Morales Buentto HERNAN	
5	Luis Oswaldo Leon Curi	
6	Daniel Bustos Cirilo	
7	Tacor Cioza Ruth	
8	Rita VILLALBA NGUEL	
9	Rocío Soriano Sandro	
10	Hugo VILLANUEVA SALAS	
11	Henny Torres Quispe	
12	Perez MOLINA Nelly	
13	VILFREDA HERNANDEZ GOMEZ	
14	CARRILLO ROSAS JOSE LUIS	
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		


JOE EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174515


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LARREA
 Representante Legal

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	--	---

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-CC05
		F. EMISION:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 30 min

HORA: 7.00 - 7.30

DÍA: 25-04-22

TEMAS TRATADOS:

Los riesgos de realizar bromas en el
 area de trabajo

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Cometivos David Maycol	
2	Perez MOLINO William	
3	Cortez HERNANDEZ MARCEL	
4	PERALTA OBLITAS SONIA	
5	SPINOZA SOLORZANO THAIR	
6	PEREZ RIVERA CINDY	
7	MORAN DORTCH MAXIMO	
8	COELLO ALVARO SEBASTIAN	
9	ARCE SANCHEZ SANDRO	
10	LOS CASTAÑO DEON CAYO	
11	ALFARO LUIS YANIRA	
12	TAPIA CIEZA RUTH	
13	SANCHEZ CRUZ MARCO	
14	ARWEL HERNANDEZ PABLO	
15	ISLAS LOPEZ BENI	
16	VILLANUEVA ALAS NUBIA	
17	DE LA CRUZ LOPEZ WILLIAM	
18	ARIBAL COSME MOLINA	
19	SANCHEZ APOLINARIO ELISEO	
20	EDWIN YAUPI RAMIREZ	
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RADI MONTERO LAHOA LEON
 Representante Común

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 Eda Miro Rodríguez Acha CIP 230770 Ing. Ambiental Ing. SSOMA FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	---	---

	SISTEMA DE GESTIÓN	CODIGO:	SGSSOMA-CC05
	CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y	F. EMISION:	17/03/2022
	CONSORCIO MULTIPROYECTOS	VERSION:	01
	CHARLA DIARIA	PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 10 min




HORA: 7:00 - 7:10

DÍA: 26-04-22

TEMAS TRATADOS:

Ergonomía

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Sanabria Durán Saricena	
2	Morales Barranto MARINO	
3	Cometivos Davila Maycol	
4	Perez Molina William	
5	Tafur Cieza Ruth	
6	Villalva SALLIS HUGO	
7	CARRILLO ROSAS JOSE	
8	Juan Osvaldo deon Gino	
9	Cañón Palmenes ELIAS	
10	Juan Carlos M	
11	Rodriguez RIVERA CIRILO	
12	Pardo ramos lucio	
13	Henry Torres Quispe	
14	VARELA PABLO CESAR	
15	Quispe Cota elia	
16	Arbela Cosme Molina	
17	Gil Mayora JEAN PIERRE	
18	EDWIN YACRI BARRERA	
19	Salas Lopez Berru	
20	COMETIVOS SUVARADO SEGUNDO	
21	MANUEL MALLANES PABLO	
22	Miguel Rojas Yurivilca	
23	Wilmer de la cruz Lopez	
24	Sanchez Caceres Mayra	
25		
26		
27		
28	JOEL EFRAIM CHAVARRA COSTRINA	
29	INGENIERO CIVIL	
30	Reg. CIP N° 174345	

	 Edo Mirlo Rodriguez Acha CIP 230776 ING. AMBIENTE ING. RESOLVA	 JOSE LUIS VILLALBA INGENIERO CIVIL CIP N° 15511
FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

	SISTEMA DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SGSSOMA-CC05
	CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS	F. EMISIÓN:	17/03/2022
	CHARLA DIARIA	VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 15 min

HORA: 7:00-7:15


DÍA: 27-04-22

TEMAS TRATADOS:

Prevención contra incendios
General.

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	José Meléndez Wilfredo	
2	Tafur Cioza Ruth	
3	Jacín Soriano Sandro	
4	Hugo Villalobos Spalal	
5	CARRILLO ROSAS José Luis	
6	Leon Curo Luis Osvaldo	
7	Carra Delgado Elías	
8	José Gómez M	
9	David Ruiz Cinila	
10	VARGAS PARDO CESAR	
11	Henry Torres Cruzado	
12	Francisco Ruiz W.R.	
13	Alicia Ruiz Ruiz	
14	Anibal Cosme Molina	
15	Alexandro Moreno	
16	Gil Mendoza Juan Pedro	
17	Edwin Yana Sandoval	
18	Isaias Lopez Berru	
19	Pardo Ramos Lucio	
20	COMAUP ALVARADO SEGUNDO	
21	Correinos Davila Marcel	
22	Rojas Quintana Miguel	
23	de la Cruz Lopez Wilman	
24	Bonchey Cacho	
25	MANUEL MARGALHONES PAUCAR	
26		
27		
28		
29		
30		


 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRIMA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174845

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	--	---

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDALEON
 Representante Común

	SISTEMA DE GESTIÓN	CODIGO:	SGSSOMA-CC05
	CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS	F. EMISION:	17/03/2022
	CHARLA DIARIA	VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 5 minHORA: 7:00 - 7:15DÍA: 28-04-22

TEMAS TRATADOS:

Una Autodisciplina
forma para alcanzar la
seguridad

PARTICIPANTES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Perez Molina Wilmar	
2	Rosario Sociano Sandro	
3	Juan Carlos M.	
4	Camacho Rojas Jose Luis	
5	Villanueva Salas Hugo	
6	Morales Torres Cirilo	
7	Anibal Cosme Molina	
8	Quevedo Coto Wilmar	
9	Maximo Quispe Duran	
10	Canoa Apolinar Eusebio	
11	Tafur Cieza Ruth	
12	Leon Curo Luis Oswaldo	
13	GIL MENDOZA Juan PIERRE	
14	EDUW YAUH BALDOCEA	
15	Isaias Lopez Berru	
16	Pardo Ramos Lucio	
17	COMATEZ ALVARO SEGUNDA	
18	Cometivos Davila Maycol	
19	Rosa Yumbica Miguel	
20	De la Cruz Lopez Wilmar	
21	Sanchez Capan M.	
22	DANIEL TABALLANES PAJCAR	
23		
24		
25		
26		
27	JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA	
28	INGENIERO CIVIL	
29	Reg. CIP N° 174545	
30		

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	--	---

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-CC05
		F. EMISION:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 10 min

HORA: 7:00 - 7:10

DÍA: 29-04-22

TEMAS TRATADOS:

La importancia de la desinfección
de la herramienta

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Marin Sociano Suncro	
2	Juan Carlos M.	
3	Isaías López Berru	
4	Perez Molina William	
5	Cuiza Dolores Eliseo	
6	CARRILLO ROSA JESUS	
7	BOYLOS BUSTOS Cirilo	
8	WILLYS SALAS HUGO	
9	Amber Cosme Molina	
10	Maximo Moreno B.	
11	Tafur Cieza Ruth	
12	Leon Curió Luis Oswaldo	
13	GIL MENDOZA JEAN PIERRE	
14	Rochon Carlos	
15	EDWIN YAGUI RODRIGUEZ	
16	Pardo Ramos Lucio	
17	COMETIVOS ALVARADO SEGUNDO	
18	COMETIVOS LEVILA MIGUEL	
19	ROSA YUMILC. MIGUEL	
20	PERLA CORTI LOPEZ WILMAN	
21	Sanchez Carlos Marco	
22	MANOLI MARQUEZ PAULAR	
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		


 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	--	---

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANZA LEÓN
 Representante Común

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-CCDS
		F. EMISION:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 30 min







HORA: 7:00-7:30

DÍA: 30-04-22

TEMAS TRATADOS:

Manejo de residuos Peligrosos

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Carmona Apolinario Eliseo	
2	Carriello Rojas Jose Luis	
3	Maximo Moreno O	
4	Marin Soriano Sandro	
5	Melillo Bustos Cirila	
6	Anibal Cosme Molina	
7	Edwin Yauri Andocson	
8	Yerra Melina William	
9	Villanueva Salas Hugo	
10	Gil Mendoza Jean Pierre	
11	Isaías Lopez Barró	
12	Tapur Cieza Ruth	
13	Leon Curo Luis Oswaldo	
14	Jaime Gomez Ari	
15	Pardo Ramos Lucio	
16	Mancha Estela Wilma	
17	COMETIVOS HUARADO SEGUNDA	
18	COMETIVOS Lavila Maycol	
19	Notas Yumvilc Miguel	
20	De la Cruz Lopez Wilman	
21	Sanchez Correa Marcos	
22	MANUEL MABALLANCA PAVCA	
23		
24		
25		
26		
27	JOEL EFRAN CRIVARINA CONTRA	
28	INGENIERO CIVIL	
29	Reg. CIP N° 174546	
30		
 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 Eda Maria Rodriguez Ache CIP 22079a Ing. Ambiental M. 55032a FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS



RAÚL BECERRA LANDA LEÓN
Representante Común

	INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"	Código	INF-SST-CM-01
		Fecha Elaboración	30-04-2022
		Página	1/1
Calle los Diamantes S/N Urb. Los Topacios – Ate Vitarte Lima			

**INFORME N° 9
ADICIONAL DE OBRA N°2
MES DE ABRIL 2022**

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN LA OBRA



PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS – ATE 2022"


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174345

REVISIÓN: 08	RESPONSABLE / CARGO	FIRMA
	Cinthia Paola Amaya Manyavilca TECNICA EN ENFERMERIA	 Cinthia P. Amaya Manyavilca Técnica en Enfermería
	Ing. José Sosa Yactayo RESIDENTE DE LA OBRA	 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
PAUL MONTERO LARREA LEON
 Representante Común

	INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"	Código	INF-SST-CM-01
		Fecha Elaboración	30-04-2022
		Página	2/1
Calle los Diamantes S/N Urb. Los Topacios – Ate Vitarte Lima			

INDICE

INTRODUCCION		3
OBJETIVOS		3
LINEAMIENTOS		3
CONCLUSIONES		5
RECOMENDACIONES		6
ANEXO		6
FOTOS		7


 JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174546


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Cinthia P. Zunaya Manyavilca
 Técnica en Enfermería

	INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"	Código	INF-SST-CM-01
		Fecha Elaboración	30-04-2022
		Página	3/1
Calle los Diamantes S/N Urb. Los Tepalcates – Ate Vitarte Lima			

1. INTRODUCCION

En el contexto de la pandemia del virus SARS-CoV-2 representa un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y su alta transmisibilidad. Ante ello, la organización ha asumido el compromiso de adoptar medidas y prácticas destinadas al estricto cumplimiento de lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores.

En base a los estándares recomendados por el Ministerio de Salud y la OMS, se viene estableciendo medidas de prevención con el fin de promover mejores prácticas y así proteger a los trabajadores.

La Empresa Constructora "CONSORCIO MULTIPROYECTOS", elaboro un plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el trabajo, que tiene como propósito ser una herramienta para la gestión y aplicación del sistema de Bioseguridad en todas las unidades de nuestra organización.

2. OBJETIVOS

2.1. Contribuir en la vigilancia, prevención y control de los trabajadores con riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2; en el marco de la EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - SEDE ATE".

2.2. Contribuir en el fortalecimiento de la vigilancia ante la respuesta sanitaria frente al riesgo de contagio del COVID-19 en la EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - SEDE ATE"

3. LINEAMIENTOS

Este procedimiento se aplica a todos los trabajadores y así como también personal que ingrese a las instalaciones de la "EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - SEDE ATE".

3.1. ANTES DE REGRESO A LA OBRA

- ✓ A todos los trabajadores que tengan que acudir a laborar a las instalaciones, firmaran una Declaración Jurada y Ficha de Sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo.

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

Cynthia P. Amaya Manyavilca
Técnica en Enfermería

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
PAUL MONTERO LAMDA LEON
Representante Camión

	INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"	Código	INF-SST-CM-01
		Fecha Elaboración	30-04-2022
		Página	4/1
Calle los Diamantes S/N Urb. Los Topacios - Ate Vitarte Lima			

- ✓ A la fecha todo trabajador nuevo llenara adicional a lo mencionado un cuestionario de despistaje de COVID-19.
- ✓ Todo personal NUEVO ingresara como requisito a laborar a la entidad con su carnet de vacunación.
- ✓ La TECNICA EN ENFERMERIA recibirá esta información y verificara si tiene criterios de caso sospechoso y/o contacto directo para COVID-19.
- ✓ En caso el trabajador no tenga criterios de caso sospechoso y de contacto directo, podrá asistir al trabajo.

3.2. AL INGRESO A LA OBRA

- ✓ Control de Temperatura y Saturación de Oxígeno.
- ✓ Antes del ingreso a las instalaciones de la Obra se cumplirá con el control de temperatura descrito y medición de Saturación de Oxígeno.

3.3. VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES

En caso se identifique un caso sospecho después del retorno de laborar; LA TECNICA DE ENFERMERIA evaluara el riesgo de exposición.

3.4. EN CASO DE FIEBRE Y/O SÍNTOMAS DE COVID-19

- ✓ El trabajador se considera sospechoso, se aplica el cuestionario y se procede a realizar la evaluación médica.
- ✓ Se realizará la toma de prueba rápida y se coordinará con el Centro de Salud más cercano en caso el resultado sea positivo.
- ✓ Se identificará los contactos del centro de trabajo, según los criterios sanitarios del MINSA.
- ✓ Se aplicará la prueba serológica a los contactos del área de trabajo.
- ✓ Se identificará a los contactos del domicilio.
- ✓ Se comunicará a la autoridad de la salud de la jurisdicción, para el seguimiento del caso.

JOEL EFRAN CHAVARRIA COIRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

3.5. LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (concientización en obra)

Establecer lineamientos promoviendo el lavado y desinfección de manos en los trabajadores, con la finalidad de evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. Contribuir a limitar la diseminación de enfermedades infecciosas y la supervivencia de microorganismos infecciosos incluyendo al SARS-Cov-2 (COVID-19) y sus variantes.

Cynthia P. Amaya Manyavilca
Técnica en Enfermería

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

	INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"	Código	INF-SST-CM-01
		Fecha Elaboración	30-04-2022
		Página	5/1
Calle los Diamantes S/N Urb. Los Topacios – Ate Vitarte Lima			

3.6. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Programa de capacitación, sensibilización, difusión y/o entrenamiento el cual será en función a los riesgos, así como otras necesidades de capacitación.

El programa incluye:

- ✓ Difusión sobre coronavirus y medios de protección laboral en las actividades a través de carteles, afiches físicos.
- ✓ Difusión a través de afiches físicos o digitales de la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro.
- ✓ Difusión a través de afiches físicos sobre el uso obligatorio de mascarillas durante la jornada de trabajo, así como también su uso adecuado.
- ✓ Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología del COVID-19 y sus variantes.
- ✓ Facilitar medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto al COVID-19 y las variantes.
- ✓ Educación permanente en medidas preventivas, para evitar el contagio por COVID_19.

Las capacitaciones, sensibilizaciones y difusiones serán desarrolladas en la obra.

4. CONCLUSIONES

Se determina que:

- ✓ Se realiza el cumplimiento de la implementación de las medidas según EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19.
- ✓ Se registra a todo el personal de obra al ingreso, así como también se cumple con el control de la toma de temperatura y saturación de oxígeno.
- ✓ En el periodo del mes de ABRIL no se reportó ningún caso de COVID-19.
- ✓ Se realiza la vigilancia epidemiológica en cuanto a accidentes de trabajo; en el mes de ABRIL no se reportó ningún accidente laboral, ni enfermedad relacionada al trabajo.
- ✓ Se brindan mascarillas a todo el personal de obra al ingreso, así como también durante jornada según necesidad.
- ✓ Se realiza check list del extintor correspondiente al inicio de mes.
- ✓ Se realiza check list del botiquín correspondiente al mes.


 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LAMDA LEON
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Cinthia P. Amaya Manyavilca
 Técnica en Enfermería

	INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"		Código	INF-SST-CM-01
			Fecha Elaboración	30-04-2022
	Calle los Diamantes S/N Urb. Los Topacios - Ate Vitarte Lima		Página	6/1

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda seguir trabajando en la concientización y sensibilización con respecto al control y prevención del COVID-19.

Es todo cuanto tengo que informar.

6. ANEXO

FORMATO DE CAPACITACION / MES DE ABRIL

¿Cómo lavarse las manos?

¡Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! Si no, utilice la solución alcohólica.

1 Duración de todo el procedimiento: **40-60 segundos**

0



Mójese las manos con agua;

1



Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos;

2



Frótase las palmas de las manos entre sí;

3



Frótase la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;

4



Frótase las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;

5



Frótase el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;

6



Frótase con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;

7



Frótase la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;

8



Enjuáguese las manos con agua;

9



Séquese con una toalla desechable;

10



Sírvase de la toalla para cerrar el grifo;

11



Sus manos son seguras.

Organización Mundial de la Salud

Seguridad del Paciente

SAVE LIVES
Clean Your Hands

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 158001

Cynthia P. Amaya Manayavilca
Técnica en Enfermería

	INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"	Código	INF-SST-CM-01
		Fecha Elaboración	30-04-2022
		Página	7/1
Calle los Diamantes S/N Urb. Los Topacios – Ate Vitarte Lima			

7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL COVID-19

Foto N° 1. TOMA DE TEMPERATURA Y SATURACION DE OXIGENO PARA

INGRESO DE OBRA



[Signature]
JOEL EFRAIN CHAVARRIA GUTIERRA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645

FOTO N° 2. EVALUACION A PERSONAL NUEVO PARA INGRESO A OBRA.



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
PAUL HUMBERTO LAMPA LEON
Representante Común

[Signature]
Cinthia P. Zunaya Manayrica
Técnica en Enfermería

[Signature]
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001

	INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"		Código	INF-SST-CM-01
			Fecha Elaboración	30-04-2022
	Calle los Diamantes S/N Urb. Los Topacios - Ate Vitarte Lima		Página	8/1

FOTO N°3. CONCIENTIZACION DE LAVADO DE MANOS.



FOTO N° 4. CHECK LIST DE BOTIQUIN (MES DE ABRIL).




 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRIMA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


 Cinthia P. Anaya Manyavilca
 Técnica en Enfermería


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 150001

	INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"	Código	INF-SST-CM-01
		Fecha Elaboración	30-04-2022
		Página	9/1
Calle los Diamantes S/N Urb. Los Topacios – Ate Vitarte Lima			

FOTO N°5. CHARLA EDUCATIVA AL PERSONAL AL INGRESO DE OBRA




 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LARCO LEÓN
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Cinthia P. Arias Manyavilca
 Técnica en Enfermería

CONSORCIO ASALTEMPROVECTOR		REGISTRO DIARIO DE SINTOMATOLOGÍA																
N° DE REGISTRO		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC		DOMICILIO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		N° TRABAJO								
DATOS DEL EMPLEADOR		CONSORCIO MULTIPROYECTOS		20660588993		CALLE LUIS ESPINO N° 845 DPTO 201 LIMA UMA LA VICTORIA		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS		20								
SÍMBOLO/PROYECTO		Sede Ate																
Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Sede Ate		CRITERIOS DE EVALUACIÓN																
LISTA DE TRABAJADORES		CONDICIÓN PARA INGRESAR: NO PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA Y/O TEMPERATURA MAYOR A 38°C																
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	HORA	INGRESO		T°	S	FIEBRE	DIFICULTAD RESPIRATORIA	DOLOR MUSCULAR	DOLOR DE CABEZA	NÁUSEAS/VÓMITOS	DOLOR ARTICULAR	OTROS DETALLES	OTROS DETALLES	SÍNTOMAS NO PRESENTA	
SÍRVASE ESCRIBIR CON LETRA LEGIBLE EN TODOS LOS CAMPOS SOLICITADOS																		
1	Mayra Conchinos Davila	OP	[Firma]	7:00	36°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Arnoldo Conchinos Davila	OP	[Firma]	7:00	36.4°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perla Obispo Soto	RY	[Firma]	7:30	36.1°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	María Guileé Jaramba	O.P.	[Firma]	7:30	35.9°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	De la Cruz Lopez Wilmer	O.P.	[Firma]	7:30	36°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	José Osvaldo de la Cruz	P.V.	[Firma]	7:40	36.5°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Helianel Muñoz Pantoja	OP	[Firma]	7:50	36.7°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Raul Bustos Ciriaco	OP	[Firma]		36°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Miguel Ángel Pantoja Davila	OP	[Firma]	7:30	37°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Samuel Narin Socón	Oficial	[Firma]	7:00	36.5°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tafor Cieza Ruiz	am	[Firma]	7:30	36°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Miguel Cota Yanch	OP	[Firma]	7:30	36.5°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Elisao Cárdenas Polanco	OP	[Firma]	7:30	36.1°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jaime Gallegos M.	OP	[Firma]	7:30	36°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Roberto Rivas José	OP	[Firma]	7:30	36°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	María Sánchez Caza		[Firma]	8:00	36.2°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Roberto Trujillo	OP	[Firma]	7:30	36.5°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Andrés Cosme Molina	Adm	[Firma]	8:30	36°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	WILFRIDO HUAYACOLA	OP	[Firma]	8:30	36.2°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Henry Torres Quispe	OP	[Firma]	8:50	36°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Conchinos Pantoja Davila
Ingeniero en Enfermería

Ingeniero Civil
CIP N° 159001

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR										REGISTRO DIARIO DE SINTOMATOLOGÍA																			
DATOS DEL EMPLEADOR					DATOS DEL PROYECTO					ACTIVIDAD ECONÓMICA					N° TRABAJO														
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSORCIO MULTIPROYECTOS					RUC 20006538092					DOMICILIO CALLE LUIS ESPINO N° 848 DPTO 202 LIMA LIMA LA VICTORIA					CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS														
Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Sede Ate										ÁREA OPERACIONES										FECHA 22.04.22									
LISTA DE TRABAJADORES										INGRESO										CRITERIOS DE EVALUACIÓN									
CONDICIÓN PARA INGRESAR: NO PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA Y/O TEMPERATURA MAYOR A 38°C																													
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EDAD	HORA	T°	T°	TOS	FEBRE	DEBILIDAD	INFLUENZA	DOLORES DE GARGANTA	NARICORR	SECUNDADE	DOLORES MUSCULARES	DOLORES DE CABEZA	MANUS/PIEDRAS	OTROS SÍNTOMAS												
1	EDUARDO RIVERA	COORD. Edif.	36	7:00	36.98																								
2	WILLIAM RIVERA	PLMC	36.5	7:02	36.98																								
3	Eda. RIVERA	SSOMA	36.1	7:02	36.99																								
4	Jose RIVERA	PLMC	36.0	7:00	36.98																								
5	Cinthia RIVERA	Tec. Edif.	36.5	7:00	36.97																								
6	HUMBERTO RIVERA	ASISTENTE	36	7:40	36.98																								
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													

JOEL EFRAIM GONZALEZ CONTRAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 179843

JOSE LEONIDAS SUISA YACAYE
Ingeniero Civil
CIP N° 135001

EDUARDO RIVERA
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

Cinthia P. Anaya Manyaylla
Técnica en Enfermería

REGISTRO DIARIO DE SINTOMATOLOGÍA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

N° DE REGISTRO

DATOS DEL EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

SEDE/PROYECTO

CONSTRUCCIÓN del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Sede Ate

LISTA DE TRABAJADORES

CONDICIÓN PARA INGRESAR: NO PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA Y/O TEMPERATURA MAYOR A 38°C

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONDICIÓN PARA INGRESAR: NO PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA Y/O TEMPERATURA MAYOR A 38°C

NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	FIRMA	HORA	38	5	TOS	FIEBRE	DIFICULTAD RESPIRATORIA	DOLOR MUSCULAR	DOLOR DE GARGANTA	MANOS EN LA MIT.	SCOTICHE 5 MASILLAS	DETON DE CABLEA	NAUSEAS/VÓMITOS	BOLEN ARTICULAR	OTRO DETALLAR	OTRO DETALLAR	NO PRESENTA SINTOMAS
SÍRVASE ESCRIBIR CON LETRA LEGIBLE EN TODOS LOS CAMPOS SOLICITADOS																			
1	Edwin Yael Briones	Coor.	[Firma]	7:00	38°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Miguel Condejas David	OP	[Firma]	7:10	38°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hector Guterres Morante	O.P	[Firma]	7:12	36.1°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sebastián Condejas D.	OP	[Firma]	7:13	36°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Maximo Masera R.	O.P	[Firma]	7:15	36.5°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	José Osvaldo Aren Curo	N.Y	[Firma]	7:20	36°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Neerón Bustos Ciro	OP	[Firma]	7:23	36°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tafur Gieza Ruth	Lum	[Firma]	7:24	36.4°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Miguel Pata ym	OP	[Firma]	7:25	36°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sandra Harin S	OP	[Firma]	7:30	38.2°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Hugo Villalobos S	OP	[Firma]	7:35	36°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Henry Torres O	OP	[Firma]	7:35	38.4°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	William Fern Molano	NM	[Firma]	7:35	36°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	WILFRIDO HUAMAN M.	OP	[Firma]	7:38	36.5°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Eliseo Carr. Dalmacio	OP	[Firma]	7:40	36°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Yamil Cedeño M	OP	[Firma]	8:00	36°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Yurella Rojas Jose Luis	OP	[Firma]	8:00	36.5°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Anibal Coame-Tolina	Adm	[Firma]	8:15	36°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Humberto Pantoja Bortero	ASISTENTE	[Firma]	8:45	36°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Cinthia Paola Amaya M.	Tec. Inf	[Firma]	7:00	36.1°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ingeniero Civil
CIP N° 159001Cynthia P. Amaya Manyavica
Técnica en Enfermería

REGISTRO DIARIO DE SINTOMATOLOGÍA									
DATOS DEL EMPLEADO									
Razón Social o Denominación Social									
CONSORCIO MULTIPROYECTOS									
RUC									
2006588993									
DOMICILIO									
CALLE LUIS ESPINO N° 808 DPTO 201 LIMA LIMA LA VICTORIA									
ACTIVIDAD ECONÓMICA									
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS									
N° TRABAJO									
04									
FECHA									
25.07.22									
SEDE/PROYECTO									
Sede Ate									
CRITERIOS DE EVALUACIÓN									
CONDICIÓN PARA INGRESAR: NO PRESENTAR ALGÚN SINTOMA Y/O TEMPERATURA MAYOR A 38°C									
LISTA DE TRABAJADORES									
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	PRIMA	NOTA	TEMP.	INGRESO	FECHA	TIPO	SÍNTOMA
SÍRVASE ESCRIBIR CON LETRA LEGIBLE EN TODOS LOS CAMPOS SOLICITADOS									
1	Carolina Paola Arroya M.	Tec. Ent.	Ed.	7100	36.7	98	-	-	-
2	Eda. Xela Rodriguez Rolo	Somos	HR	7110	36.7	97	-	-	-
3	Joe San J. Lopez	Asist.	Asist.	7125	36.1	98	-	-	-
4	Humberto Palomino Romero	Asistente	Asist.	7140	36.9	99	-	-	-
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12	JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRIÑA	INGENIERO CIVIL							
13									
14									
15									
16									
17	CONSORCIO MULTIPROYECTOS								
18	PAUL MOLTERO LANDALEON	Representante Común							
19									
20									

Carolina P. Arroya M.

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRIÑA

PAUL MOLTERO LANDALEON

CONSORCIO MULTIPROYECTOS										REGISTRO DIARIO DE SINTOMATOLOGÍA														
DATOS DEL EMPLEADOR										DATOS DEL EMPLEADO														
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL					RUC					DOMICILIO					ACTIVIDAD ECONÓMICA					N° TRABAJ.				
CONSORCIO MULTIPROYECTOS					2046568993					CALLE LUIS ESPINO N° 849 DPTO 201 LIMA LIMA LA VICTORIA					CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS					20				
SECTOR/PROYECTO										SECTOR														
Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Sede Ate										Operaciones														
LISTA DE TRABAJADORES										CRITERIOS DE EVALUACIÓN														
INGRESO										CONDICIÓN PARA INGRESAR: NO PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA Y/O TEMPERATURA MAYOR A 38°C														
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HRMA	HORA	TE	F	TOS	RESQUE	OPUNTAS	IN	DOLORES MUSCULARES	DOLORES DE CABEZA	MAJADURAS EN LA PIEL	SEÑALES EN LA PIEL	DOLORES DE OÍDIO	ARTICULACIÓN	OTROS DETALLAR	NO PRESENTA SÍNTOMAS							
William para Helén	MHC	Wfhs	7:00	36.7	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Suarez Karin S	oicial	Scd	7:22	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Tegor Cezar Ruth	Lm	PL	8:00	36.5	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Canello Rojas Jue	OP	PL	7:30	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Hugo Villanueva Soho	OT	PL	7:10	36.4	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Eliseo Caceres Pachamanc	OT	PL	7:00	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Leon euro Luis Osvaldo	BY	PL	8:00	36.1	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Jaime Collopes M	OP	PL	7:45	36	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Francisco Bustos Ciriaco	OP	PL	7:40	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Walter Guerrero Chue	OP	PL	7:00	36.5	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Lucio Pachagarcas	OP	PL	8:00	36.4	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Henry Torres O	OP	PL	8:08	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Cesar VARGAS P	OP	PL	8:00	36	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Amibael Cosme Molina	Adm	PL	8:30	36.4	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Makima Moreno	Barrio	PL	7:30	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
EL MANARA Juan Pablo	M	PL	7:30	36.1	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
EDWIN YANER AMERCEAN	Carla	PL	7:30	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Isaías Lopez Barr	OP	PL	8:00	36.5	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
SFRUTO COMFUPA	OP	PL	7:30	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Maced Ametivos De	OP	PL	7:30	36.1	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

JOEL ESPINOZA MARTINEZ COPIRIN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 44545

CONSEJO MULTIPROYECTOS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 199001

Cynthia P. Anaya Manayilca
Técnica en Enfermería

CONSEJO MULTIPROYECTOS		REGISTRO DIARIO DE SINTOMATOLOGÍA							
N° DE REGISTRO		RAC		DOMICILIO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		R° TRABAJO	
FUENTE DEL EMPLEADOR		CONSEJO MULTIPROYECTOS		CALLE LUIS BORGES N° 848 SEPTO 281 LIMA LIMA LA VICTORIA		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS		5	
Razón Social o Denominación Social		RAC		DOMICILIO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		R° TRABAJO	
CONSEJO MULTIPROYECTOS		CONSEJO MULTIPROYECTOS		CALLE LUIS BORGES N° 848 SEPTO 281 LIMA LIMA LA VICTORIA		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS		5	
Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Sede Ate									
CRITERIOS DE EVALUACIÓN									
CONDICIÓN PARA INGRESAR: NO PRESENTAR ALGUN SINTOMA Y/O TEMPERATURA MAYOR A 38°C									
LISTA DE TRABAJADORES									
INGRESO									
SÍRVASE ESCRIBIR CON LETRA LEGIBLE EN TODOS LOS CAMPOS SOLICITADOS									
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EDAD	FECHA	HORA	TEMP.	OTROS	OTROS	OTROS
1	Jose San Yago	Asistente	36	98	7:00	36.4	98	98	98
2	Cynthia Paola Amaya M.	Asistente	36	98	7:00	36.4	98	98	98
3	Eda María Rodríguez Rto	Asistente	36	98	7:00	36.4	98	98	98
4	Walter Roberto Alvarado	Asistente	36	98	7:00	36.4	98	98	98
5	Miguel Torres Yacayo	Asistente	36	98	7:00	36.4	98	98	98
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17	CONSEJO MULTIPROYECTOS								
18	RAÚL MONTERO LARREA LEÓN								
19	REPRESENTANTE COMITÉ								
20									

JOEL PERAZA CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174548

Carolina P. Acosta
Técnica en Enfermería

JOSE LEONIDAS SANCHEZ YACAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS		REGISTRO DIARIO DE SINTOMATOLOGÍA																		
N° DE REGISTRO DATOS DEL EMPLEADOR		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSORCIO MULTIPROYECTOS		RUC 20605588693		DOMICILIO CALLE LUIS ESPINO N° 845 DPTO. JOR UNA UIMA LA VICTORIA		ACTIVIDAD ECONÓMICA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS		N° TRABAJ.										
SEDE/PROYECTO		Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Sede Ate																		
LISTA DE TRABAJADORES		INGRESO		CRITERIOS DE EVALUACIÓN																
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	FECHA	HORA	TEMP.	S	POS.	FRUITE	DEBILIDAD RESPIRATORIA	DEBILIDAD MUSCULAR	DEBILIDAD GARGANTA	MANCHAS EN LA PIEL	SECCIONES EN LA PIEL	BOLOS DE SANGRE	BOLOS DE CARNE	NAUSEAS/VÓMITOS	DEBILIDAD ARTICULAR	OTROS DETALLAR	OTROS DETALLAR	NO SINTOMAS
CONDICIÓN PARA INGRESAR: NO PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA Y/O TEMPERATURA MAYOR A 38°C																				
SÍRVASE ESCRIBIR CON LETRA LEGIBLE EN TODOS LOS CAMPOS SOLICITADOS																				
1	William Noel Molina	BME	21/07	36°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sandra Karin S	asista	21/07	36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Helena Llanos	OP	21/07	36°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Amir Gómez M.	OP	21/07	36.3°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Arribal Cesar Molina Adm	Adm	21/07	36°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tafur Cieza Ruth	km	21/07	36.1°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Caravita Rojas Jose	OP	21/07	36°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Cleves Cieza Adelina	OP	21/07	36.2°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Daniel Ruiz Cirilo	OP	21/07	36°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Leon Curo Ruiz Osvaldo	OP	21/07	36.7°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ulises Guay Ciro	OP	21/07	36.4°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lucio Paulo R	OP	21/07	36.1°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Maximo Masana David	OP	21/07	36°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	GU MENDOZA JUAN CARLOS	OP	21/07	36°	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	EDWIN RUIZ RAMIREZ	OP	21/07	36.1°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Isaias Lopez Berni	OP	21/07	36.4°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SERGIO GONZALEZ DAVID	OP	21/07	37°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Miguel Contreras D	OP	21/07	36.1°	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Cifuentes Rocio Amaya H.	OP	21/07	36°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Eda Rocio Rodriguez Rto	OP	21/07	36.2°	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ing. P. Amaya Manyarica
C. P. N° 159001
Técnica en Enfermería

JOSE LEONIDAS SOSA VARGAS
Ingeniero Civil
C. P. N° 159001

14. Póliza de Seguro Contra Todo Riesgo De Construcción (CAR).



JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 158001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


MAPFRE

PAG: 2

POLIZA 2302115100039	COLECTIVO	SUPLEMENTO 4
APLICAC. 0	VIGENCIA 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común

EL ASEGURADO

GENERADO POR : KBEDREGA

 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común



Miraflres, 03 de Mayo del 2022

Señor(es):

Creaciones Hadasa Sac

Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

RUC 20510862440

Moneda: S/

Corredor 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En las fechas indicadas en la columna "obligación de pago" se inicia el plazo establecido para el pago de cada uno de los recibos. La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.
- b) En la columna "fecha límite de pago" se indica el plazo del que usted dispone para pagar la prima adeudada, la falta de pago podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
2302115100039	4	291.08		52.39	343.47

343.47

NRO. CUOTA	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE		SITUACION RECIBO
			OBLIGACION PAGO	LIMITE DE PAGO	
131832941	SOLES	343.47	31/03/2022	30/04/2022	PENDIENTE

343.47

TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %

JOEL EFRATA CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

Ingresando en la WEB de su banco @

En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza

Afiliándose al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express

BBVA
BCP
SCOTIABANK
DE LA NACION (solo presencial)
FALABELLA
BIF
INTERBANK

Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfreperu.com/oim-clientes

CONSORCIO MULTA PROYECTOS
RAÚL MONTERO LAMDA LEÓN
Representante Común

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


MAPFRE

Pag. 2

Miraflores, 03 de Mayo del 2022

Señor(a)(rta)(es):

Creaciones Hadasa Sac
Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

Corredor: 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

RUC 20510862440

Moneda: S/

Atentamente,

 FELIPE RIOS GAJATE
DIRECTOR UNIDAD DE GENERALES

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

CLIENTE ACEPTADO

 JOEL EFRAIN CHAWARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645

 JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común



POLIZA	COLECTIVO	SUPLENTO
2302115100039		4
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

Obra .-

Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos – Ate

Lugar .- Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios, distrito Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima.

Monto de la Obra .-

S/ 2,664,642.19

Duración .-

Desde 01/10/2021

Hasta: 31/03/2022

Coberturas	Suma Asegurada	Deducibles
- Cobertura "A" - Principal. Daños materiales en la obra por accidentes, incendio.	S/ 2,664,642.19	10% del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- " B " - Terremoto, temblor, erupción volcánica	S/ 2,664,642.19	10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00
- " C " - Daños por inundación, huayco, lluvia, derrumbe, vientos, deslizamientos de terreno.	S/ 2,664,642.19	10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00
- " D " - Mantenimiento amplio (6 meses)	S/ 2,664,642.19	10% del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- HMCCDMVT	S/ 2,664,642.19 Por evento / Vigencia	10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00
- " G " - Rem. Escombros	S/ 666,160.55	El de la cobertura afectada.
- Riesgos de Diseño	S/ 1,332,321.10	10% del monto indemnizable mínimo S/ #REF!
- Flete Aéreo	S/ 13,323.21	10% del valor del flete mínimo S/ 1,000.00
- Gastos extraordinarios	S/ 13,323.21	El de la cobertura afectada.

Tasa Neta .-

1.32% (por mil)

JOEL EFRAN CHAVARRIA COTRINA

INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 174515

Cláusulas y Condiciones Adicionales .-

Cláusulas Generales de Contratación

Condicionado General contra Todo Riesgo para Contratistas (CAR)

ENDOSO 001 - Huelga, Motín y Conmociones Civiles

ENDOSO 001A - Terrorismo

ENDOSO 005 - Condiciones Especiales concernientes al Cronograma de Construcción y/o

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAUL MONTERO LANDALEON
Representante Común



POLIZA	COLECTIVO	SUPLENDO
2302115100039		4
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

Montaje.

ENDOSO 006 - Gastos Extraordinarios (Horas extras, trabajos nocturnos, trabajos en días feriados y flete expreso).

ENDOSO 007 - Flete aéreo

ENDOSO 102 - Cables y Tuberías subterráneas

ENDOSO 008 - Estructuras en Zonas Sísmicas

ENDOSO 107 - Campamentos y Almacenes de Materiales de Construcción:

Límite para campamentos y por unidad de Almacenaje de material hasta 15% del Valor de la Obra, máximo S/. 300,000.

ENDOSO 108 - Obligación relativa al Almacenaje de materiales de construcción

ENDOSO 110 - Medidas de Seguridad contra Precipitación, Avenida e Inundación (Período de Recurrencia: 20 años). La Compañía de Seguros solo indemnizará los siniestros de lluvia y/o inundación y/o precipitación y/o avenida en caso el asegurado demuestre que las lluvias que dieron origen al siniestro, superaron en el sitio de la obra el nivel máximo de lluvias ocurridas en los últimos 20 años.

ENDOSO 115 - Riesgo de diseño

ENDOSO 004 - Mantenimiento Amplio (6 meses)

ENDOSO 112 - Equipos Extintores de Incendio

Evento Siniestral - 72 horas

Cláusula LMA5394 - Exclusión de Enfermedades Transmisibles

Condiciones Especiales:

- * No se renuncia a la aplicación del infraseguro
- * No se aceptan prórrogas automáticas
- * Reajuste de la prima del Seguro al final de la vigencia, sobre la base del valor final alcanzado
- * El cuestionario de solicitud, presupuesto de Construcción, el cronograma de construcción y los estudios geotécnicos o de suelos, forman parte integrante de la póliza.
- * No se cubren los gastos incurridos por las actividades necesarias para restituir y/o abatir el nivel freático en las zonas aledañas al proyecto de construcción, tampoco se cubren los gastos para estabilizar el terreno y/o aumentar el factor de seguridad del proyecto, por situaciones no contempladas en los estudios geológicos y de suelos.
- * En caso las condiciones de riesgo se modifiquen, la compañía se reserva el derecho de ajustar la prima.
- * Para la Cobertura de HMCCDMVT:
 - Aviso de Cancelación 10 días, contados desde la fecha de aviso de cancelación.
 - No habrá restitución de la suma asegurada en caso de siniestro.
 - Esta cobertura se otorga bajo la garantía de que el asegurado no contratará coberturas o límites adicionales que operen en exceso del límite aquí propuesto. En caso contrario, la cobertura será invalidada de manera automática.
 - Se excluyen daños biológicos/químicos
 - Se excluyen daños por cohetes/mísiles
 - Queda excluidos los daños o pérdidas que se originen por Hundimiento y Asentamiento causados por deficiente compactación y/o estabilización del terreno así como por trabajos de hinchado no adecuados o deficientes. Asimismo quedan excluidos daños causados por asentamientos previsibles del terreno (se disponga o no de estudio geotécnico previo) según el subsuelo, los materiales y los métodos de construcción empleados.
 - * Hurto calificado (Robo): S/.30,000 por evento y S/.60,000 por vigencia. Deducible: 10% del monto indemnizable, mínimo S/.3,000.
 - * Por HMCCDMVT se entenderá: Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL DE LA CRUZ
Ingeniero en Construcción



POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2302115100039		4
VALIDA DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

- * Queda excluido daños a las edificaciones colindantes y/o adyacentes a la obra (demolición o construcción) que estén construidas de materiales de adobe, quincha o similares.
- * Se excluyen los siniestros ocurridos previo a la fecha de emisión de la presente póliza o a la fecha de inicio de la cobertura provisional otorgada, si la hubiera.
- * **LMA5394 - EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES**
No obstante cualquier disposición en contrario en el presente contrato de seguro, el presente contrato de seguro excluye cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación, coste o gasto de cualquier naturaleza, directa o indirectamente causado por, contribuido por, resultante de, derivado de, o en relación con una Enfermedad Transmisible o el temor o la amenaza (ya sea real o percibida) de una Enfermedad Transmisible, independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya de forma concurrente o en cualquier otra secuencia de la misma.
- 1. En el presente documento, por Enfermedad Transmisible se entiende cualquier enfermedad que pueda transmitirse por medio de cualquier sustancia o agente de cualquier organismo a otro organismo donde:
 1. La sustancia o agente incluye, pero no se limita a, un virus, una bacteria, un parásito u otro organismo o cualquier variación del mismo, ya sea que se considere vivo o no, y
 2. El método de transmisión, ya sea directo o indirecto, incluye pero no se limita a la transmisión por aire, la transmisión de fluidos corporales, la transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gaseoso o entre organismos, y
 3. La enfermedad, la sustancia o el agente pueden causar o amenazar con causar daños a la salud o al bienestar de las personas, o pueden causar o amenazar con causar daños, deterioro, pérdida de valor, comerciabilidad o pérdida de uso de los bienes.

En caso de inconsistencia con su original en inglés, la versión inglesa prevalecerá.

EVENTO SINIESTRAL - 72 HORAS:

1. ALCANCE:

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la póliza, en el caso de un eventual siniestro, cualquier pérdida o daño que sufran los bienes asegurados durante un período de 72 horas consecutivas, contados a partir de la ocurrencia del primer evento de daños registrado al bien asegurado, y que sea causado por un mismo fenómeno de la naturaleza, será considerado como un solo evento y por consiguiente constituirá un acontecimiento único para efectos de la aplicación del deducible. Con este propósito, la determinación de cualquier período de 72 horas quedará a juicio del asegurado. No obstante, se entiende que no deberán coincidir dos o más de dichos períodos, en el caso de que ocurran daños dentro de un período de tiempo mas extenso. Para la determinación del inicio del siniestro, la compañía tomará como base los reportes oficiales del evento catastrófico. la inundación a consecuencia de lluvia es el mismo evento solo si entre ellas hay una relación de causa a efecto.

2. DEFINICIONES:

Evento Es un siniestro o una serie de siniestros individuales que responden o se producen directamente por la misma causa en un lapso de tiempo determinado. Evento catastrófico Son todas las pérdidas o daños causados por un fenómeno natural, según se detallan en las coberturas B o C de la presente póliza, independiente de la voluntad del asegurado.

3. DEDUCIBLE:

Cuando a raíz de un evento se vean afectadas varias secciones de la póliza, se aplicará a cada una el deducible especificado en las condiciones particulares de la póliza.

4. APLICACIÓN:

Son de aplicación a esta cláusula las condiciones generales de contratación y las condiciones generales del seguro para contratistas, en cuanto no se hallen modificadas por este acuerdo. las

JOEL EFRAIM CHAUAPRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174543

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDALEON
Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2302115100039		4
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

condiciones particulares y especiales prevalecen sobre esta cláusula.

SUPLEMENTO 03:

MEDIANTE EL PRESENTE SUPLEMENTO SE DEJA CONSTANCIA DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DESDE 31/03/2021 AL 01/07/2022, EN LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE LA VIGENCIA ANTERIOR, A EXCEPCION DE LA SUMA ASEGURADA QUE SE INCREMENTA A :

MONTO DE LA OBRA: S/ 2'672,642.19

SUPLEMENTO 04:

Por medio del presente endoso, y sujeto a los términos y condiciones vigentes, a partir del 01/10/2021, se procede a incrementar el valor de la obra de S/ 2'672,642.19 a S/ 2'801,805.00

Asimismo, se modifican las siguientes coberturas:

Cobertura "A"

Suma Asegurada - S/ 2'801,805.00

Deducible - 10% del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00

Cobertura "B"

Suma Asegurada - S/ 2'801,805.00

Deducible - 10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00

Cobertura "C"

Suma Asegurada - S/ 2'801,805.00

Deducible - 10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00

Cobertura "D"

Suma Asegurada - S/ 2'801,805.00

Deducible - 10% del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00

Cobertura "HMCCDMVT"

Suma Asegurada - S/ 2'801,805.00

Deducible - 10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00


JOEL EFRAIN CHAVARRA GOTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

Todos los demás términos y condiciones de la póliza se mantienen inalterables



MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS

CONSORCIO MULTIPROYECTOS


RAUL MONTERO LARCA LEON
Representante Común

EL ASEGURADO

NOTA: Este documento contribuye a los movimientos de numeración y fecha anterior.

POLIZA ANTERIOR No:

GENERADO POR:

KREDREGA


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAUL MONTERO LARCA LEON
Representante Común



PÓLIZA 2302115100039	COLECTIVO	SUPLEMENTO 4
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 1 12:00 Hrs.	APLICACION 0

CESIÓN DE DERECHOS

RAMO: CONSTRUCCION	
DATOS DEL CONTRATANTE	
NOMBRE DEL CONTRATANTE CREACIONES HADASA SAC	
DATOS DEL ASEGURADO	
NOMBRE DEL ASEGURADO CREACIONES HADASA SAC	
NOMBRE DEL ENDOSATARIO	
NOMBRE DEL ENDOSATARIO PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA	
MATERIA ENDOSADA	SUMA ENDOSADA
SEGUN HOJA ANEXA	S/. 2,801,805.00

Se hace constar en la Póliza, que los derechos de indemnización que correspondan sobre ésta, quedan transferidos a favor del **ENDOSATARIO**, en su calidad de Acreedores del Asegurado, hasta por el importe que alcance la referida acreencia en la fecha de pago de la indemnización, la misma que en ningún caso excederá de la suma asegurada correspondiente a dichos bienes, de acuerdo a las condiciones de la Póliza. Consecuentemente, ningún otro endoso de cesión de derechos sobre los bienes descritos precedentemente podrá ser emitido en forma posterior a este endoso, sin el consentimiento previo del **ENDOSATARIO**.

Es entendido y convenido que ninguna modificación en cualquiera de las condiciones de la presente póliza, será introducida, en tanto no se haya cumplido con comunicarlo previamente al **ENDOSATARIO** en cuanto afecte sus intereses. Una vez recibida dicha comunicación, el **ENDOSATARIO** tendrá 20 (veinte) días calendario para manifestar su conformidad o no a dicha modificación y en caso de no pronunciarse en el plazo indicado, se tendrá por aceptada la modificación propuesta. Consecuentemente, se considerará como no inserta cualquier modificación que no cumpla con lo previsto en este párrafo.

Asimismo, si el Asegurado dejara de cumplir con el pago de la prima correspondiente a la Póliza de la cual forma parte este Endoso, la Compañía Aseguradora se obliga a enviar al asegurado y/o contratante y al BANCO, la comunicación a la cual se refiere el Art. 21 de la Ley N 29946 Ley del Contrato de Seguro y los Arts. 7 y 8 del Reglamento de Pago de Primas de Pólizas de Seguros, aprobado por Resolución SBS N 3198-2013. La comunicación al **ENDOSATARIO**, deberá entregarse como mínimo con 20 (veinte) días calendario de anticipación a la fecha en que se suspenda la cobertura. El **ENDOSATARIO** podrá evaluar hacerse cargo del pago de la prima. En caso transcurran 30 (treinta) días calendario contados desde el incumplimiento de pago, sin que la prima hubiera sido pagada, la cobertura de seguro quedará automáticamente suspendida, salvo que el asegurado haya cumplido con el pago pendiente, en cuyo caso la Compañía Aseguradora deberá reportar al **ENDOSATARIO** dicha situación. La Compañía Aseguradora no es responsable por los siniestros ocurridos durante el periodo en que la cobertura se mantuviera suspendida.

En caso la cobertura del seguro estuviera suspendida, la Compañía Aseguradora podrá optar por

Av. Veintiocho de Julio 823 Miraflores * Teléfonos: 213-7373 * Fax: 213-9142 * www.mapfreperu.com

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTENEGRO LANDA LEÓN
Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP Nº 150001



PÓLIZA 2302115100039	COLECTIVO	SUPLEMENTO 4
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 1 12:00 Hrs.	APLICACION 0

resolver el contrato de seguro, en cuyo caso se obliga a enviar al Asegurado y/o Contratante y al **ENDOSATARIO**, la comunicación a la cual se refiere el Art. 23 de la Ley N° 29946 Ley del Contrato de Seguro y los Arts. 9 y 10 del Reglamento de Pago de Primas de Pólizas de Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 3198-2013.

La póliza de la cual forma parte el presente endoso, quedará resuelta a los 30 (treinta) días calendarios desde la fecha en que el **ENDOSATARIO** reciba la comunicación descrita en el párrafo anterior.

Se hace constar que, en el caso que la prima se mantuviese impaga por 90 (noventa) días calendarios contados desde la fecha de cualquier incumplimiento de pago, la Póliza de Seguro y, consecuentemente, el presente endoso quedarán extinguidos. Para dicha extinción no será necesario que la Compañía Aseguradora remita al **ENDOSATARIO** ninguna comunicación adicional a la carta en donde se le informó acerca de la posibilidad de suspensión de la cobertura.

Esta póliza no podrá resolverse, extinguirse, anularse o suspenderse por motivos distintos a la falta de pago, sin previo aviso al **ENDOSATARIO**, 20 (veinte) días calendario antes de tal hecho.

En caso de siniestro parcial, que cuente con cobertura bajo la póliza, de la cual forma parte el presente endoso, la Compañía Aseguradora podrá compensar la prima pendiente de pago contra la indemnización debida al asegurado o al **ENDOSATARIO**, conforme al Art. 18 de la Ley N° 29946 Ley del Contrato de Seguro.

En caso de siniestro total que cuente con cobertura bajo la póliza, de la cual forma parte el presente endoso, la prima se entiende totalmente devengada, debiendo imputarse al pago de la indemnización correspondiente, conforme al Art. 18 de la Ley N° 29946 Ley del Contrato de Seguro. En caso que la póliza de la cual forma parte el presente endoso, fuera de vigencia multianual, la prima que se devengará y se imputará al pago de la indemnización correspondiente será solo la que corresponda a la anualidad que se encontrara en curso al momento de presentarse el siniestro total.

Es igualmente convenido que, en caso de pérdida indemnizable amparada por esta Póliza y donde quiera aparezcan los intereses del **ENDOSATARIO**, corresponderá al Asegurado probar de manera fehaciente la preexistencia del bien asegurado.

Se deja constancia que ante la ocurrencia de un siniestro, la responsabilidad de la Compañía Aseguradora frente a todos los endosatarios de la presente póliza estará limitada a la Suma Asegurada, siempre y cuando no sea aplicable el infraseguro, en cuyo caso la Compañía Aseguradora responderá sólo por el importe de la indemnización a que haya lugar. En este sentido, la cobertura, en aquellos casos en que exista más de un endosario, no excederá en ningún caso el límite de la suma asegurada indicada en la póliza, procediéndose a una repartición proporcional en el supuesto de que las sumas endosadas excedan el monto máximo asegurado.

Se deja constancia de que en caso de renovación de la póliza, el presente endoso se entenderá insertado automáticamente a favor de **ENDOSATARIO**, aun cuando no existiera comunicación escrita que así lo exprese. A efectos de la renovación, la Compañía Aseguradora se obliga a no variar las condiciones de la póliza original sin cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del presente Endoso, salvo que la variación se refiera al importe de la prima de seguro, al monto de los deducibles, del coaseguro, del valor declarado y/o de las sumas aseguradas y/o cualquier otra condición que no afecte los intereses del **ENDOSATARIO**, en cuyo caso no se requerirá ponerlo en conocimiento del

Av. Veintiocho de Julio 873 Miraflores * Teléfonos: 213-7373 * Fax: 213-9142 * www.mapfreperu.com

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MUJEROS LAMPA LEON
Representante Común


MAPFRE

PÓLIZA 2302115100039	COLECTIVO	SUPLEMENTO 4
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 1 12:00 Hrs.	APLICACION 0

ENDOSATARIO. La Compañía Aseguradora conviene específicamente en que esta póliza no se invalidará por el hecho que el Asegurado omita involuntariamente declarar cualquier circunstancia que deba considerarse de consecuencia para la estimación de la gravedad del riesgo, cuando dicha circunstancia haya estado probadamente fuera del control y conocimiento del Asegurado.

El presente endoso prevalecerá sobre cualquier otra condición establecida en la póliza

MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

ASEGURADO

Todos los términos y condiciones de dicha póliza con excepción de lo expresamente variado mediante este suplemento quedan en todo su vigor.

Queda anotado en los registros de esta compañía.

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

15. Póliza de Seguro de Accidentes Personales.



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS



.....
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común


MAPFRE

CAPITAL SOCIAL S/.360,374,769

PAG: 1

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 20202380621

Dirección: Av. Veintiocho de Julio 873, Miraflores -Teléfono: 213-3333

**SUPLEMENTO DE SEGURO
CONTRA ACCIDENTES
PERSONALES**

POLIZA 1012115100058	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 01/04/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

CODIGO SBS: AE0716100062

Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO	N°MOV.	F. EMISION	VIGENCIA DE POLIZA	FORMA DE PAGO	%PARTICIP.	RIESGOS	MONEDA
Renovacion 1		29/03/2022	01/04/2022 - 01/07/2022	Imeo	100 %	1	S/

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE CREACIONES HADASA SAC	RUC 20510862440
DIRECCION Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria	
EMAIL GERENCIA@INMOBILIARIAHADASA.COM	TELEFONO 998335065
ACTIVIDAD ECONOMICA Construcción De Edificios	

DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS

NOMBRE Angelita Pilar Ordoñez Rojas	NOMBRE
CODIGO SBS : N3264	CODIGO SBS :
CODIGO INTERNO : 626	CODIGO INTERNO :
IMPORTE DE LA COMISION	451.76

Los cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores, contratación de promotores, comercializadores y bancaseguros podrán considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en función al cumplimiento de metas de producción y resultados.

DATOS DE COBRO

DIRECCION DE COBRO Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima	 JOEL EFRAIM SHAVARRIA COTRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 174346
COBRADOR Jose Alexander Paredes Obregon	

PRIMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
Prima Comercial	1,861.23
Prima Comercial + I.G.V.	2,196.25

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159901

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común



POLIZA	COLECTIVO
1012115100058	
VIGENCIA DESDE	HASTA
01/04/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.

Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podrán formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificación en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observación, se tendrá por aceptada la póliza emitida.

En caso el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptación se presume solo cuando LA COMPAÑÍA advierte al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas.

Se adjuntan Cláusulas Generales de Contratación CGCACMP01122013 y Condiciones Generales de la póliza: CGAP01122013

que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de seguros del que son parte integrante y no tienen valor por separado.

\b DATOS PERSONALES\b0

El contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la emisión de la póliza, así como la actualización y cesión de los mismos para los fines detallados en el Artículo 18 de las Cláusulas Generales de Contratación cuyo texto declara conocer en su integridad.

\b COMUNICACIONES

\b0

las partes acuerdan como mecanismo de comunicación entre la compañía y el contratante y/o asegurado, el domicilio físico, electrónico y/o telefónico, a las direcciones y números telefónicos que aparecen en las presentes condiciones particulares.

las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa, en este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.

los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se consideran abonados a la empresa en la fecha de realización del pago, asimismo, la empresa debe prever que el comercializador lleve el control de dichos pagos.


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAY
Ingeniero Civil
CIP N° 150001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LAND
Representante Consul



Miraflores, 29 de Marzo del 2022

Señor(es):

Creaciones Hadasa Sac

Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

RUC 20510862440

Moneda: S/

Corredor 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En las fechas indicadas en la columna "obligación de pago" se inicia el plazo establecido para el pago de cada uno de los recibos. La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.
- b) En la columna "fecha límite de pago" se indica el plazo del que usted dispone para pagar la prima adeudada, la falta de pago podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
1012115100058	1	1,861.23		335.02	2,196.25

2,196.25

NRO. CUOTA	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE		SITUACION RECIBO
			OBLIGACION PAGO	LIMITE DE PAGO	

131011423	SOLES	2,196.25	01/04/2022	01/05/2022	PENDIENTE
-----------	-------	----------	------------	------------	-----------

2,196.25

TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

Ingresando en la WEB de su banco @

En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza

Afiliándose al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express

BBVA
BCP
SCOTIABANK
DE LA NACION (solo presencial)
FALABELLA
BIF
INTERBANK

Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfreperu.com/oim-clientes

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTISECTORIAL
RAÚL MORENO LANDA LEÓN
Representante Común


MAPFRE

Pag. 2

Miraflores, 29 de Marzo del 2022

Señor(a)(rta)(es):

*Creaciones Hadasa Sac**Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima*

Corredor: 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

RUC 20510862440

Moneda: S/

Atentamente,

FERNANDO PEDRAZA SORIANO
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LANDAY LEON
 Representante Común

CLIENTE ACEPTADO

.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174645

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LANDAY LEON
 Representante Común



POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
1012115100058		1
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
01/04/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

RAMO : Accidentes Colectivos

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

Contratante CREACIONES HADASA S.A.C.

RUC 20510862440

ACTIVIDAD: Ejecutará la obra que consiste en la Construcción del Laboratorio

de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Ate, que comprenden obras civiles.

VIGENCIA: 01/10/2021 - 31/03/2022

COBERTURAS:

Muerte por accidente S/ 50,000

Invalidez Parcial o Permanente S/ 50,000

Gastos por curación S/ 50,000


 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

SUPLEMENTO 01:

MEDIANTE EL PRESENTE SUPLEMENTO SE DEJA CONSTANCIA DE LA RENOVACION POR EL SIGUIENTE PERIODO 01/04/2022 AL 01/07/2022, EN LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE LA VIGENCIA ANTERIOR.


 JOSE LEONIDAS SOSA YAGHTIO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común

**MAPFRE**

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

PAG. 1

POLIZA 1012115100058	COLECTIVO	NRO. RIESGO 1
VIGENCIA DESDE 01/04/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.	

TIPO DE MOVIMIENTO Renovacion	NRO. SPTO. 1	FECHA ACTUALIZACION 29/03/2022	FECHA INICIAL DE POLIZA 01/10/2021	NUM. DE RIESGOS 1	MONEDA S/	PRIMA NETA TOTAL DE MOVIM. 1,861.23
---	------------------------	--	--	-----------------------------	---------------------	---

DATOS DEL ASEGURADO

NOMBRE DEL ASEGURADO : Creaciones Hadasa Sac
RUC20510862440

MODALIDAD

MODALIDAD : 1004 Grupal No Identificado

CONDICIONES PARTICULARES

NOMBRE DEL GRUPO : Obreros

OCUPACION : Construccion / Demolicion

BENEFICIARIOS

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE DOCUMENTO	NRO DE DOCUMENTO	PORCENTAJE
Programa De Desarrollo De Sanidad Agropecuaria -	RUC	20414251561	100.00

COBERTURAS CONTRATADAS

DESCRIPCION DE COBERTURA	SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLE DE COBERTURA		
		VARIABLE	MINIMO/ FIJO	MAXIMO

Muerte Accidental

50,000

Invalidez Permanente

50,000

Gastos De Curacion

50,000

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CLAUSULAS ADHERIDAS

020 - Cumulo

101 - Condiciones Gales. Del Seguro Contra Accidentes Personales

999 - Clausulas Generales De Contratacion - Cgcrvgg01122013

001 - Huelga, Connocion Civil, Vandalismo Y Terrorismo

JOSE LEONIDAS SOGA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 158001

CONSULTAS Y PAGOS
RAUL MONTE
Representante


MAPFRE

PAG: 2

POLIZA 1012115100058	COLECTIVO	NRO. RIESGO 1
VIGENCIA DESDE 01/04/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.	

**MAPFRE PERU COMPAÑIA
DE SEGUROS Y REASEGUROS**

 NOTA: Este documento sustituye a los
movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :

GENERADO POR :

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

EL ASEGURADO
JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 914543

 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 158001

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

16. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil frente a Terceros.



JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645



.....
JOSÉ LEONIDAS GOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAÚL MONTERO LAMDA LEON
Representante Común



POLIZA	COLECTIVO
2402115100121	
VIGENCIA DESDE	HASTA
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.

Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podrán formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificación en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observación, se tendrá por aceptada la póliza emitida.

En caso el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptación se presume solo cuando LA COMPAÑÍA advierte al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas.

Se adjuntan Cláusulas Generales de Contratación CGCRRGG01122013 y Condiciones Generales de la póliza: CGRCE01122013

que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de seguros del que son parte integrante y no tienen valor por separado.

\\b DATOS PERSONALES\\b0

El contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la emisión de la póliza, así como la actualización y cesión de los mismos para los fines detallados en el Artículo 23 de las Cláusulas Generales de Contratación cuyo texto declara conocer en su integridad.



 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001



 RAÚL MONTERO
 Representante Comercial

**MAPFRE**

POLIZA 2402115100121	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, desavenencia o reclamación relacionada o derivada del contrato de seguro, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, será resuelta por los jueces y tribunales de la ciudad de Lima o del lugar donde domicilia el CONTRATANTE, ASEGURADO O BENEFICIARIO, según corresponda de acuerdo a Ley. Adicionalmente las partes, una vez producido el siniestro, cuando se trate de controversias referidas al monto reclamado, podrán convenir el sometimiento a la jurisdicción arbitral siempre y cuando las diferencias superen los límites económicos por tramos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Sin perjuicio de lo antes indicado, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO podrán presentar su reclamo ante la Defensoría del Asegurado; su denuncia o reclamo según corresponda, ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, entre otros según corresponda.

COMUNICACIONES

Las partes acuerdan como mecanismo de comunicación entre LA COMPAÑÍA y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, el domicilio físico, electrónico y/o telefónico, a las direcciones y números telefónicos que aparecen en las presentes condiciones particulares.

Las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa. En este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.

Los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se consideran abonados a la empresa en la fecha de realización del pago. Asimismo, la empresa debe prever que el comercializador lleve el control de dichos pagos.

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CONSORCIO MULTIPROYECTOR
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

EL ASEGURADO

GENERADO POR : KBEDREGA

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174515

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOR
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común


MAPFRE

Pag. 1

Miraflores, 30 de Marzo del 2022

Señor(es):

Creaciones Hadasa Sac

Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

RUC 20510862440

Moneda: US\$

Corredor 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En las fechas indicadas en la columna "obligación de pago" se inicia el plazo establecido para el pago de cada uno de los recibos. La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.
- b) En la columna "fecha límite de pago" se indica el plazo del que usted dispone para pagar la prima adeudada, la falta de pago podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
2402115100121	1	81.49		14.67	96.16

96.16

NRO. CUOTA	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE		SITUACION RECIBO
			OBLIGACION PAGO	LIMITE DE PAGO	

131046413	DOLARES	96.16	31/03/2022	30/04/2022	PENDIENTE
-----------	---------	-------	------------	------------	-----------

96.16

TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %

JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 174545

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

Ingresando en la WEB de su banco @

En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza

Afiliándose al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express

 BBVA
BCP
SCOTIABANK
DE LA NACION (solo presencial)
FALABELLA
BIF
INTERBANK

 Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfreperu.com/oim-clientes

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO SUTEP
RAUL MONTES
Representante General

00011608-0016


MAPFRE

Pag. 2

Miraflores, 30 de Marzo del 2022

Señor(a)(rta)(es):

Creaciones Hadasa Sac

Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

Corredor: 626

Angelita Pilar Ordoñez Rojas

RUC 20510862440

Moneda: US\$

Atentamente,

FELIPE RIOS GAJATE
 DIRECTOR UNIDAD DE GENERALES

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común
CLIENTE ACEPTADO

 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común

**MAPFRE**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

PAG: 1

POLIZA 2402115100121	COLECTIVO	NRO. RIESGO 1
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.	

TIPO DE MOVIMIENTO Renovacion	NRO. SPTO. 1	FECHA ACTUALIZACION 30/03/2022	FECHA INICIAL DE POLIZA 01/10/2021	NUM. DE RIESGOS 1	MONEDA US\$	PRIMA NETA TOTAL MOVIM. 81.49
---	------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------	---

DATOS DEL ASEGURADO

NOMBRE DEL ASEGURADO

Creaciones Hadasa Sac

RUC

20510862440

ACTIVIDAD DEL ASEGURADO

Construccion

Edificios Hasta Dos Sotanos (C)

UBICACION DEL RIESGO

Ca Los Diamantes Sn Urb Los Topacios, Ate, Lima, Lima, Peru

DATOS DEL RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO : Construccion De Laboratorio De Crianza De Insectos Beneficos Y Hospederos

DESCRIPCION :

Valor De La Obra

BASE DE CALCULO :

COBERTURAS CONTRATADAS

DESCRIPCION DE COBERTURA	SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLE DE COBERTURA		
		VARIABLE	MINIMO FIJO	MAXIMO

- Rc Extracontractual (Rce)

50,000 10.00% Monto Indemnizable Us\$ 500

CLAUSULAS ADHERIDAS

- 240 - Cond. Grles. Seguro Contra Responsab. Civil Extracontractual
 999 - Clausulas Generales De Contratacion - Cgcragg01122013
 005 - R.C. Ascensores, Gruas, Montacargas Y Escaleras Mecanicas
 007 - R.C. Extracont. Por Actos De Contrat. Independ. Y/O Subcontr
 008 - Responsabilidad Civil De Trabajos Terminados
 010 - Responsabilidad Civil Durante Eventos Sociales Y Culturales
 011 - Responsabilidad Civil De Contratistas De Obras
 013 - Responsabilidad Civil Por Uso De Armas De Fuego
 014 - R.C. Incendio Y/O Explosion Y/O D. Por Agua Y/O D. Por Humo
 022 - Responsabilidad Civil Extracontractual Personal O Familiar
 027 - Responsabilidad Civil Por Uso De Maquinaria Pesada
 029 - Responsabilidad Civil Para Locales Y Operaciones
 255 - Limite Agregado Anual

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROVECTOR
RAUL MONTERO LAMPA
 Representante Consorcio



POLIZA	COLECTIVO	NRO. RIESGO
2402115100121		1
VIGENCIA DESDE	HASTA	
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	

CONSORCIO MULTIPROTECTOS
RAUL MONTERO LAMPA LEON
Representante Común

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

EL ASEGURADO

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :

GENERADO POR :

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROTECTOS
RAUL MONTERO LAMPA LEON
Representante Común



POLIZA	COLECTIVO	SEGURO
2402115100121		1
VENIDA/DESE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

Trabajo a realizar :

Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos – Ate

Lugar de Trabajo :

Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios, distrito Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima.

Vigencia : 01/10/2021a 31/03/2022

Suma asegurada:

US\$ 50,000.00

Límite Único y combinado y en Agregado Vigencia

Deducible:

10% del monto indemnizable, mínimo US\$ 500

Responsabilidad Civil por Contaminación: 20% del monto indemnizable, mínimo US\$ 5,000

Materia del Seguro:

Sujeto a todos los términos y condiciones que forman parte de la presente póliza la Compañía cubre al asegurado contra las reclamaciones de terceros por concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual, exclusivamente a consecuencia de daños personales y/o daños materiales causados involuntariamente a dichos terceros por un accidente ocurrido durante la vigencia de la póliza, como resultado directo de las actividades declaradas en las Condiciones Particulares y únicamente en la zona de trabajo.

Cláusulas y Condiciones Adicionales:

Clausulas Generales de Contratación.

Condicionado General de Responsabilidad Civil Extracontractual

Límite en Agregado Vigencia

Condición especial para Cables y tuberías subterráneas

Responsabilidad Civil de Ascensores, Grúas, Montacargas y Escaleras Mecánicas

Responsabilidad Civil Extracontractual por Actos de Contratistas Independientes y/o Subcontratistas

Responsabilidad Civil de Contratistas de Obras

Responsabilidad Civil por Incendio y/o Explosión y/o Daños por Agua y/o Daños por Humo

Responsabilidad Civil Extracontractual por Accidentes en la Ejecución de Contratos

Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones

Responsabilidad Civil Cruzada

Responsabilidad Civil Patronal

Responsabilidad Civil Contractual

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRILLA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

LMA5394 CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Condición de contaminación accidental, súbita e imprevista: Este seguro no cubre las responsabilidades derivadas de daños o gastos de retirada, limpieza o eliminación, directa o indirectamente causados por infiltración, polución, limpieza o contaminación, salvo que la misma sea consecuencia de un evento súbito, accidental e imprevisto, identificable en el tiempo y económicamente evaluable, que ocurra durante la vigencia de la póliza, ajeno al normal y/o habitual funcionamiento de las instalaciones del asegurado. Esta cobertura cubre las cantidades que el asegurado tenga legalmente que pagar a terceros serán fijadas mediante Sentencia Judicial ejecutoriada, o mediante transacción de acuerdo a Ley y con aprobación de la Aseguradora.

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

1/6

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDALEON
Representante Común



PÓLIZA 2402115100121	COLECTIVO	SUPLEMENTO 1
VALIDADORA 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.	APLICACIÓN 0

Otras Exclusiones:

Bienes en los cuales se esté realizando el trabajo

Responsabilidad Civil de vehículos

Cualquier reclamación que se fundamente en fallas, defectos, errores u omisiones en plano, diseño o especificación de los trabajos, así como la responsabilidad Civil Profesional.

Bienes bajo el cuidado, control y custodia del asegurado.

La responsabilidad Civil Contractual excluye incumplimientos contractuales

Condiciones Especiales:

- **Condición especial para Cables y tuberías subterráneas:**

Condición especial para Cables y tuberías subterráneas: En adición a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la **PÓLIZA** o a ella endosados, **LA COMPAÑÍA** sólo indemnizará al **ASEGURADO** con respecto a pérdida de o daño a cables o cualesquiera otros servicios subterráneos, si, antes de iniciarse los trabajos, **EL ASEGURADO** se ha cerciorado ante las autoridades correspondientes acerca de la posición exacta de dichos cables y tuberías. La indemnización, en todo caso, quedará restringida a los costos de reparación de dichos cables o servicios subterráneos. Cualquier penalidad, multa y demás daños consecuenciales quedan excluidos de la cobertura.

- **Responsabilidad Civil Cruzada**
1. Cobertura

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la Póliza, y sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares, todas las cantidades que el **ASEGURADO** tuviera legalmente que pagar por concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual proveniente de los accidentes que ocurran dentro de los lugares materia del Seguro indicados en las referidas Condiciones Particulares, que dañen a los contratistas de obras que prestan servicio al **ASEGURADO** como resultado de un daño entre ellos o hacia uno de ellos.

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645

2. Exclusiones

El Seguro otorgado bajo esta Cláusula no cubre la Responsabilidad derivada de:

2.1 Daños a la propiedad o bienes en los cuales los contratistas y/o sub-contratistas estén o hayan estado realizando trabajos.

2.2 Daños al equipo y/o maquinaria de construcción o montaje.

2.3 Lesiones corporales, fatales o no, o enfermedades contraídas por cualquier persona que esté trabajando en el lugar de la obra, que esté o hubiera podido estar asegurada bajo un seguro social u obligatorio de acuerdo con la legislación vigente o bajo la cobertura de responsabilidad civil patronal.

3. Aplicación

Son de aplicación a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula.

Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula.

- **LMA5394 CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES**

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



POLIZA	COLECTIVO	SUPLENTO
2402115100121		1
VALIDA DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

- Sin perjuicio de lo dispuesto en otro sentido en la presente póliza, este seguro excluye cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación, coste o gasto de cualquier naturaleza, directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o derivado de o en relación con una enfermedad transmisible o el temor o la amenaza (ya sea real o percibida) de una enfermedad transmisible con independencia de cualquier otra causa o evento que contribuya de manera simultánea o en cualquier otra secuencia a ello.

- Tal como se utiliza en el presente documento, se entiende por enfermedad transmisible toda enfermedad que pueda ser transmitida por medio de cualquier sustancia o agente desde un organismo cualquiera a otro organismo, en la presente definición:

- 2.1. la sustancia o el agente incluye, entre otros, un virus, una bacteria, un parásito u otro organismo o cualquier variación de estos, ya sea que se consideren vivos o no; y
- 2.2. el método de transmisión ya sea directo o indirecto, incluye, entre otros, la transmisión por aire, la transmisión por fluidos corporales, la transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gas o entre organismos; y,
- 2.3. la enfermedad, la sustancia o el agente pueden causar o amenazar con causar daños a la salud o al bienestar de las personas o pueden causar o amenazar con causar daños, deterioro, pérdida de valor, comerciabilidad o pérdida de uso de los bienes.

En caso de inconsistencia con su original en inglés, la versión inglesa prevalecerá.

• **Definición de Terceros: TERCEROS**

Cualquier persona, natural o jurídica distinta de:

A. El CONTRATANTE o el ASEGURADO.

B. Personas miembros de la familia del ASEGURADO y/o del CONTRATANTE considerándose como tales a: los cónyuges, los ascendientes, los descendientes, los hermanos y, en general, los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, incluyendo el padre adoptante o hijo adoptivo, así como la (o el) conviviente.

C. Personas, naturales o jurídicas, que sean socios o formen parte del accionariado del ASEGURADO y/o CONTRATANTE.

D. Personas que sean parte de la Administración, así como directivos, empleados y/o trabajadores, sea que estén en planilla o contratados o que, de hecho o de derecho, tengan alguna relación de dependencia con el ASEGURADO y/o CONTRATANTE.

Se incluye a PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA – PRODESA y/o compañías afiliadas y/o subsidiarias y/o asociadas, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados, como asegurados adicionales y como terceros en la eventualidad que se afecte su propiedad y/o a su personal, respecto a la Responsabilidad Civil cubierta por la presente póliza.

El Asegurado Adicional está cubierto solo por los daños causados por el Asegurado Principal que deriven de una demanda hacia el Asegurado Adicional por un tercero, no siendo esta una ampliación de la cobertura hacia responsabilidades y obligaciones particulares del asegurado adicional. Los daños causados por el Asegurado Adicional estarán excluidos de esta cobertura y deberán estar cubiertos por su propia póliza de Responsabilidad Civil.

La Compañía de Seguros no se subrogará en contra de PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA – PRODESA y/o compañías afiliadas y/o subsidiarias y/o asociadas, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados, por ser asegurados adicionales.

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

3/5

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



PÓLIZA 2402115100121	COLECTIVO	SUPLEMENTO 1
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.	APLICACION 0

- El asegurador deberá cursar notificación por escrito a PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA – PRODESA en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación de la presente póliza, por lo menos con treinta (30) días de anticipación de dicho cambio o cancelación.

- La presente póliza tiene carácter de primaria para lo que respecta a PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA – PRODESA sobre cualquier otro seguro suscrito por PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA – PRODESA, que ampare los mismos objetos de seguros contra los mismos riesgos aquí establecidos.

- Se excluyen los siniestros ocurridos previo a la fecha de emisión de la presente póliza o a la fecha de inicio de la cobertura provisional otorgada, si la hubiera.

- Responsabilidad Civil Contractual

1. COBERTURA

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la Póliza, y sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares, todas las cantidades que el ASEGURADO tuviere legalmente que pagar por concepto de Responsabilidad Civil derivada de cualquier contrato o convenio, como indemnización por lesiones corporales o enfermedades de terceras personas y/o daños a la propiedad de las mismas, siempre que haya cumplido con las Garantías indicadas en el numeral 3 siguiente.

2. EXCLUSIONES

La responsabilidad que asume la COMPAÑÍA mediante esta Condición, no es aplicable a:

- 2.1 La responsabilidad por cualquier garantía de mercaderías o productos.
- 2.2 Los daños determinados por arbitraje, cuando la COMPAÑÍA no tenga derecho a ejercer los derechos del asegurado en lo que respecta a la selección de los árbitros y en el procedimiento del arbitraje.
- 2.3 Lesión, enfermedad, muerte, daño o destrucción provenientes de defectos en mapas, planos, diseños o especificaciones preparadas, adquiridas o utilizadas por el ASEGURADO o indemnizado, en caso de que cualquiera de estos sea arquitecto, ingeniero o agrimensor.
- 2.4 La penalidad, multa o sanción que imponga cualquier ley o reglamento sobre la venta, donación, distribución o uso de cualquier bebida alcohólica al ASEGURADO en su calidad de persona y/u organización dedicada al negocio de manufacturar, vender o distribuir bebidas alcohólicas o como dueño o arrendador de locales utilizados para tales fines.
- 2.5 Cualquier obligación para la cual el ASEGURADO pudiera ser responsable bajo cualquier ley de trabajo, plan de seguro social, beneficios para desempleo, beneficios laborales, beneficios por incapacidad, ley de accidentes de trabajo u otra ley o plan similar.
- 2.6 El daño o destrucción de cualquier propiedad perteneciente al ASEGURADO u ocupada, alquilada o utilizada por él, o que esté bajo su dominio, control o custodia.
- 2.7 Los perjuicios puramente patrimoniales que no sean consecuencia directa de un daño corporal o material cubierto por la presente Condición, así como toda clase de perjuicios indirectos.

JOSE LEONOR SUSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTISERVICIOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COYRINA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 174545



POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2402115100121		1
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

2.8 La responsabilidad por lesiones corporales o daños a cosas causados directa o indirectamente por cualquier perturbación del estado natural del aire, las aguas, el suelo, el subsuelo y, en general del medio ambiente.

2.9 Cualquier responsabilidad causada por agentes contaminantes o que se traduzca en la contaminación del medio ambiente.

2.10 Los daños por derrame o infiltración de líquidos, combustibles o productos de cualquier naturaleza que no sean contaminantes.

2.11 Los daños corporales y/o materiales derivados de la Responsabilidad Civil Profesional.

2.12 Multas, moras, penalidades, sanciones, perjuicios y similares derivados del incumplimiento del contrato, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

2.13 Gastos de prevención de un evento que pudiera causar daños a terceros.

2.14 Daño moral.

3. GARANTÍAS

El contrato o convenio que genere Responsabilidad Civil del ASEGURADO deberá constar necesariamente por escrito. El ASEGURADO se compromete a enviar a la COMPAÑÍA una copia de los contratos por celebrar para fijar la prima correspondiente, con quince (15) días hábiles de anticipación a su fecha de iniciación.

La COMPAÑÍA, luego de haber analizado las condiciones del contrato en un plazo que no excederá de quince (15) días hábiles, notificará por escrito al ASEGURADO la aceptación del mismo, quedando invariables las exclusiones indicadas en párrafos anteriores. Transcurrido el plazo antes mencionado, si la COMPAÑÍA no hubiese notificado su aceptación al ASEGURADO, se entenderá que ha rechazado la cobertura de la Responsabilidad Civil que genere dicho Contrato.

La cobertura entrará en vigencia una vez que aceptadas tanto la inclusión del contrato por parte de la COMPAÑÍA, como la prima adicional por parte del ASEGURADO, se emita el endoso de pago de prima adicional y se suscriba el convenio de pago de la misma.

La Responsabilidad Civil que se genere de dicho Contrato o Convenio deberá obedecer a un hecho accidental y derivado de la propia ejecución del Contrato o convenio. Asimismo, deberá estar expresamente declarada así, mediante sentencia judicial firme y ejecutoriada, con carácter de cosa juzgada y cuya extensión alcanzará tanto lesiones corporales o enfermedades de terceras personas, así como daños a su propiedad y a propiedades adyacentes.

4. APLICACIÓN

Son de aplicación a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Condición.

Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Condición.

JOEL EFRAN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

SUPLEMENTO 01:

MEDIANTE EL PRESENTE SUPLEMENTO SE DEJA CONSTANCIA DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DESDE 31/03/2022 AL 01/07/2022, EN LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE LA

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Consón



VIGENCIA ANTERIOR.

POLIZA	COLECTIVO	SUPLENTO
2402115100121		1
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

EL ASEGURADO

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR No:

GENERADO POR: KBEDEGA

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

17. Seguro Complementario de Trabajo De Riesgo (SCTR).



JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 155001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

MP/2022/5562465



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CREACIONES HADASA SAC** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200006330 y contrato de Salud No. 7022200007345, con vigencia del 01/04/2022 hasta el 30/04/2022, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26780 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI	10111372	ALATA CURO, RICARDO
2 DNI	46551195	AMAYA MANYAVILCA, CINTHIA PAOLA
3 DNI	76177210	ARQUINIGO FIGUEROA, KEVIN YULINIO
4 DNI	43702842	BUSTOS CIRILO, AQUILES FLORENCIO
5 DNI	48563837	CABRERA LARA, ROGER
6 DNI	43150486	CARHUAS SALAZAR, WILMER LUIS
7 DNI	09684977	COMETIVOS ALVARADO, SEGUNDO EDWARD
8 DNI	48017710	COMETIVOS DAVILA, EDWARD MAYCOL
9 DNI	47952499	COMETIVOS DAVILA, WAGNER ARNOLD
10 DNI	09835823	CORTEZ MOREANO, MARCOS
11 DNI	21258799	COSME MOLINA, ANIBAL GEREMIAS
12 DNI	46619425	CUEVA CALDERON, JUAN GENARO
13 DNI	70413241	DÉ LA CRUZ LOPEZ, WILMAN GONZALO
14 DNI	40337002	ESPINOLA GRANDES, JULIO
15 DNI	45594685	ESPINOZA SOLORZANO, MANFRED JHON
16 DNI	43453385	ESPINOZA SOLORZANO, MILKER SILVINO
17 DNI	46851203	FASANANDO PINCHI, JHON
18 DNI	80055912	GALLEGOS MAMANI, JAIME
19 DNI	42283977	GALLEGOS MAMANI, LUIS ALBERTO
20 DNI	72191064	GALLEGOS NINACONDO, JHONEL
21 DNI	42092029	GARCIA MARTINEZ, HENRRY
22 DNI	22520767	GONZALES LOARTE, EULOGIO SANTOS
23 DNI	45734772	GRAUS CALDERON, TEDY IGNACIO
24 DNI	40529671	HARO HARO, JOSE LUIS
25 DNI	42200177	HUACCACHI CAHUANA, ROBERTO
26 DNI	73248729	HUAMAN AVILA, LIVARDO NILSON
27 DNI	44656055	INGA ROSALES, GABRIEL ANTONIO
28 DNI	09703841	JULIAN ALIAGA, NILTON JUVENAL
29 DNI	21111021	LANDA LEON, RAUL MONTERO
30 DNI	72875236	LANDA VENTURA, KEYLA
31 DNI	46410175	LANDA VENTURA, QBED ISAI
32 DNI	47482640	LOPEZ BERRU, ISAIAS
33 DNI	21869127	MAGALLANES PAUCAR, MANUEL FELIX
34 DNI	42576539	MARANZA RAMOS, EDIZON ORIEL
35 DNI	73520911	MARCHENA COTRINO, ELADIO ELI
36 DNI	73520912	MARCHENA COTRINO, SECEO CELESTINO

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciassctr.mapfre.com.pe/#/>

MP/2022/6562465



37 DNI	46086752	MARCHENA COTRINO, WILSON JOEL
38 DNI	43199360	MARIN VILLALOBOS, NOE
39 DNI	10010982	MENDOZA PONCE, JORGE LUIS
40 DNI	76630252	MONTERREY GONZALES, SHAUNA DESHIRA
41 CEX	002760540	MORA ROJAS, JESUS EDIGDIO
42 DNI	40761294	OCAÑA VELASQUEZ, CHRISTIAN JESUS
43 DNI	43695880	ORE QUIÑONES, HENRY ERNESTO
44 DNI	46481337	ORE QUIÑONES, MIGUEL ANGEL
45 CEX	076133392	PALOMINO OSORIO, FABIO EDWIN
46 DNI	45421292	PALOMINO ROMERO, HUMBERTO JUNIOR VICTOR RAUL
47 DNI	42194960	PARDO RAMOS, LUCIO ISRAEL
48 DNI	02831677	PEREZ MOLINA, WILLIAM
49 DNI	40598457	PEÑA LOARTE, ALEJANDRO
50 DNI	10870740	PEÑA LOARTE, RAUL ANTONIO
51 DNI	73331775	PEÑA MATA, ANTHONY ALEXIS
52 DNI	73385596	PEÑA PONCE, HENRY
53 DNI	75420542	POMATAY FERNANDEZ, LUIS FRANKLIN
54 CEX	080228853	PONCE GARCIA, TEODORO PAULINO
55 DNI	41185034	PONCE LOARTE, OSWALDO PABLO
56 DNI	76618884	PONCE PONCE, JUAN DANIEL
57 DNI	41007124	PUMARICRA ESPINOZA, TOMAS ELIAS
58 DNI	41871276	RAMOS ROBLEDO, JOSEPH MIGUEL
59 DNI	76413238	REMICIO MERINO, JAIME ALBERTO
60 DNI	08132732	RIVEROS CURI, EDGARD
61 CEX	045491776	RODRIGUEZ ACHO, EDA MIRLA
62 DNI	19690242	ROJAS CRUZ, FRANCISCO
63 DNI	19701210	ROJAS CRUZ, WILLIAM ALEXANDER
64 DNI	45112120	ROJAS YURIVILCA, MIGUEL JONATHAN
65 DNI	73628858	ROMERO MUÑOZ, FERNANDO ALBERTO
66 DNI	76206714	ROMERO MUÑOZ, GORGE EUGENIO
67 DNI	47136900	SALAZAR HUARCAYA, JHONATAN
68 DNI	10622194	SANCHEZ CCOPA, MARCOS ALBERTO
69 DNI	70235982	SANCHEZ MAMANI, RUBEN
70 DNI	48104078	SANTA CRUZ BEDRIÑANA, RUSVEL
71 DNI	70865751	SEGURA SANTIESTEBAN, JIMMY
72 DNI	07648824	SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS
73 DNI	47990252	TORRES QUISPE, HENRY EUSEBIO
74 DNI	42895992	VARGAS PARDO, CESAR AUGUSTO
75 DNI	72781451	VELASQUEZ YUCRA, ROSA LISBET
76 DNI	41028685	VILLANUEVA SALAS, HUGO EFRAIN
77 DNI	42322612	YAUURI BALDOCEDA, EDWIN




JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

31/03/2022 07:05:40 pm

FLORES ATENCIO, MAGDA JESSICA


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/>

MP/2022/6562465



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).



JOEL EFRAIM CHAVERRA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pa/#/>


MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

AVDA. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFs. 213-9151

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hadssa Snc

 DIRECCIÓN : Calle Luis Espejo Nro 848 Dpto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA/PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : PD12203806330

PRODUCTO : MAPFRE SCTR

R.U.C. N° 20418896915
FACTURA ELECTRONICA
N° F052-00653201

NRO DE DOCUMENTO : 20510862440

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO NRO. :

MONEDA : Soles

TIPO DE SEGURO :

VIGENCIA DE POLIZA
DESDE
HASTA
CORREDOR
OFICINA COMERCIAL

01/04/2022

30/04/2022

2270 Flores Alencio Magda Jessica

Escondo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 131131543, SEGURO DE SCTR PENSIONES	626.95	739.5	626.95
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001			 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 174645		
 CONSORCIO MULTIPROYECTOS RAÚL MONTERO LANDA LEÓN Representante Común					

Banc: Setecientos Treinta Y Nueve Y 60/100 Soles



Op. Gravada	SI	626.95
Op. Inafectas	SI	0.00
Op. Exoneradas	SI	0.00
Op. Gratuitas	SI	0.00
Op. Exportación	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	112.65
Importe Total	SI	739.60

Representación impresa de la Factura Electrónica, autorizada mediante Resolución de Intendencia N° 018-2015-0002889

Hash: RqXNtutubzba0mdeP=sDQy8N7U=

Página 1 de 1

Powered by


MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

AVDA. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFs: 213-9161

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2022

CONTRATANTE : Constructora Hualpa Snc

 DIRECCIÓN : Calle Luis Espejo Nro 869 Dpto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 7522000167346

PRODUCTO : MAPFRE SCTR SALUD

R.U.C. N° 20517182673
FACTURA ELECTRONICA
N° F052-00615066

NRO DE DOCUMENTO : 30510862440

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO NRO. :

MONEDA : Soles

VIGENCIA DE POLIZA
DESDE
HASTA
CORREDOR
OFICINA COMERCIAL

01/04/2022

30/04/2022

2270-Piura Alvaro Magda Jordán

Escudo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACIÓN RECIBO 131131545. SEGURO DE SCTR SALUD	806.00	718.25	806.00
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001			 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 174545		
			 CONSORCIO MULTIPROYECTOS RAÚL MONTERO LAMCA LEÓN Representante Común		

Ser: Seleccionar Decimales Y 25/100 Soles



Op. Gravada	SI	806.00
Op. Inafectas	SI	0.00
Op. Exoneradas	SI	0.00
Op. Gratuitas	SI	0.00
Op. Exención	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	109.56
Importe Total	SI	718.25

MP/2022/6569521



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CREACIONES HADASA SAC** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200006330 y contrato de Salud No. 7022200007345, con vigencia del 01/04/2022 hasta el 30/04/2022, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI	46835308	BEJARANO VALLE, ROGER JAVIER
2 DNI	04520515	CABRERA CONDORI, MOISES
3 DNI	48284257	CALDERON NAVARRO, JEAN CARLOS
4 DNI	48552082	CAÑO A POLINARIO, ELISEO
5 DNI	47417388	HUARACA GOMEZ, WILFREDO ESQUIVEL
6 DNI	72313354	OCHAVANO MACHOA, FAUSTINO
7 DNI	47886555	SALIRROSAS RAMIREZ, JHONATTAN DILMER

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

01/04/2022 04:17:31 pm

FLORES ATENCIO, MAGDA JESSICA

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRERA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

RAÚL MONTERO LAMPA LEÓN
Representante Común

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>


MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

AVDA. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF: 213-9161

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hadasa Snc

 DIRECCIÓN : Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 7022308007545

PRODUCTO : MAPFRE SCTR SALUD

R.U.C. N° 20517182673
FACTURA ELECTRONICA
N° F052-00615061

NRO DE DOCUMENTO : 25510892440

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 11

POLIZA GRUPO NRO. : 1

MONEDA : Soles

VIGENCIA DE POLIZA
DESDE
HASTA
CORREDOR
OFICINA COMERCIAL

01/04/2022

30/04/2022

2270 Flores Alencio Magda Jessica

Escondo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 131148664. SEGURO DE SCTR SALUD	55.33	55.29	55.33
 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 174545			 JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001		
			 RAUL MONTERO LAMDA LEON Representante Común		

Son: Sesenta Y Cinco Y 29/100 Soles

Op. Gravada	SI	55.33
Op. Isuaciones	SI	0.00
Op. Exonerados	SI	0.00
Op. Gratuitos	SI	0.00
Op. Exportacion	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
ICV 15%	SI	9.00
Importe Total	SI	64.29



MP/2022/6592773



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CREACIONES HADASA SAC** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200006330 y contrato de Salud No. 7022200007345, con vigencia del 01/04/2022 hasta el 30/04/2022, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

- | | | |
|-------|----------|---|
| 1 DNI | 70369569 | SARMIENTO CASTILLO, CRISTHIAN GEAN PAUL |
| 2 DNI | 70369572 | SARMIENTO CASTILLO, JOSEPH DAYVIS |

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

08/04/2022 06:24:09 pm

FLORES ATENCIO, MAGDA JESSICA

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

JOEL EFRAIM CERNA AGUIRRE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159201

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>


MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

AVDA. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFs. 213-4161

FECHA DE EMISIÓN : 20-04-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hedera Snc

 DIRECCIÓN : Calle Luis Espejo Nro 849 Depto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 791200006330

PRODUCTO : MAPFRE SCTR

R.U.C. N° 20418896915
FACTURA ELECTRONICA
N° F052-00653169

NRO DE DOCUMENTO : 20510002440

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO MRO. :

MONEDA : Soles

TIPO DE SEGURO :

VIGENCIA DE POLIZA
DESDE
HASTA
CORREDOR
OFICINA COMERCIAL

01/04/2022

30/04/2022

2270 Flores Alencio Magda Jessica

Escondo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	22	CT CANCELACION RECIBO 131297316. SEGURO DE SCTR PENSIONES	20.60	24.31	20.60
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001			 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 174545 CONSORCIO MULTIPROYECTOS  RAUL MONTERO LAMPA LEON Representante Común		

Son: Veinticuatro Y 31/100 Soles



Op. Gravada	SI	20.60
Op. Insuficiente	SI	0.00
Op. Exoneradas	SI	0.00
Op. Gratuitas	SI	0.00
Op. Exportación	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	3.71
Importe Total	SI	24.31


MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

AVDA. 38 DE JULIO 875 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF: 213-0161

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hacia el Soc

 DIRECCIÓN : Calle Luis Guejo Nro 545 Dpto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 792200097345

PRODUCTO : MAPFRE SCTR SALUD

R.U.C. N° 20517182673
FACTURA ELECTRONICA
N° F052-00615051

NRO DE DOCUMENTO : 20510662443

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO NRO :

MONEDA : Soles

VIGENCIA DE POLIZA
DESDE
HASTA
CORREDOR
OFICINA COMERCIAL

01/04/2022

30/06/2022

2270-Flores Alencio Magda Jessica

Escudo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 131287317. SEGURO DE SCTR SALUD	20.00	20.0	20.00
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001			 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 174545		
 CONSORCIO MULTIPROYECTOS RAÚL MONTERO LAMCA LEÓN Representante Común					

Gero: Veintidos Y 00/100 Soles



Op. Gravada	S/	20.00
Op. Inafectos	S/	0.00
Op. Exoneradas	S/	0.00
Op. Gratuitas	S/	0.00
Op. Exportación	S/	0.00
Total ISC	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
Descuento	S/	0.00
IGV 18%	S/	3.60
Importe Total	S/	23.60

MP/2022/6598244



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa CREACIONES HADASA SAC bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200008330 y contrato de Salud No. 7022200007345, con vigencia del 01/04/2022 hasta el 30/04/2022, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL.

ASEGURADO(S)

1 DNI	09694893	ARDINCO YUCRA, ATANACIO
2 DNI	10016624	CARDENAS CANO, HUGO MARIANO
3 DNI	46030206	CARRILO ROJAS, JOSE LUIS
4 DNI	23466455	LEON CCARAHUANCO, APOLONIO
5 DNI	71600028	MARIN SORIANO, SANDRO
6 DNI	06026752	MORENO QUINTO, MAXIMO
7 DNI	47351175	PACHO MATIAS, JORGE LUIS

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

11/04/2022 05:46:26 pm

FLORES ATENCIO, MAGDA JESSICA

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 171645

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciastr.mapfre.com.pe/#/>


MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

AVDA. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF. 213-8161

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hadasa Snc

 DIRECCIÓN : Calle Luis Espejo Nro 848 Dpto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 701226000330

PRODUCTO : MAPFRE SCTR

R.U.C. N° 20418896915
FACTURA ELECTRONICA
N° F052-00653200

NRO DE DOCUMENTO : 20510602442

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO NRO :

MONEDA : Soles

TIPO DE SEGURO :

VIGENCIA DE POLIZA
DESDE
HASTA
CORREDOR
OFICINA COMERCIAL

01/04/2022

30/04/2022

2278-Flores Atencia Magda Jactaya

Encanto

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 131187191, SEGURO DE SCTR PENSIONES	57.00	57.26	57.00

JOEL EFRAIM CHAZARRA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 155001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LAMPA LEÓN
 Representante Común

Son: Sesenta Y Siete Y 26/100 Soles



Op. Gravada	SI	57.00
Op. Inafectas	SI	0.00
Op. Exoneradas	SI	0.00
Op. Gratuitas	SI	0.00
Op. Exportación	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	10.26
Importe Total	SI	57.26


MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

AVDA. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF: 213-8161

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hadaaa Snc

 DIRECCIÓN : Calle Luis Espejo Nro 848 Dpto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA PE

ASESURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 7022200007345

PRODUCTO : MAPFRE SCTR SALUD

R.U.C. N° 20517182673
FACTURA ELECTRONICA
N° F052-00615063

NRO DE DOCUMENTO : 29510982440

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO NRO. :

MONEDA : Soles

VIGENCIA DE POLIZA

DESDE

HASTA

CORREDORES

OFICINA COMERCIAL

01/04/2022

31/04/2022

2270 Flores, Alencio Magda Jessica

Escardo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 13-1387192, SEGURO DE SCTR SALUD	55.34	55.3	55.34
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001			 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 174545 CONSORCIO MULTIPROYECTOS RAÚL MONTERO LANDA LEDN Representante Común		

Soles Sesenta Y Cinco Y 30/100 Soles



Op. Graveda	SI	55.34
Op. Inafectas	SI	0.00
Op. Exoneradas	SI	0.00
Op. Gratuitas	SI	0.00
Op. Exportación	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	0.00
Importe Total	SI	55.34

MP/2022/6606010



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CREACIONES HADASA SAC** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200008330 y contrato de Salud No. 7022200007345, con vigencia del 01/04/2022 hasta el 30/04/2022, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI 48548173 GIL MENDOZA, JEAN PIERRE

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

13/04/2022 06:49:19 pm

FLORES ATENCIO, MAGDA JESSICA



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

JOEL EFRAIN CHAVARRÍA CORDERA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LARRAÍN LEÓN
Representante Común

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/>


MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

AVDA. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF. 213-9161

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2022

CONTRATANTE : Ccesiones Hadesa Snc

 DIRECCIÓN : Calle Luis Elgueta Nro 848 Dpto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA PE

ASSEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 701235000330

PRODUCTO : MAPFRE SCTR

R.U.C. N° 20418896915
FACTURA ELECTRONICA
N° F052-00653166

NRO DE DOCUMENTO : 20810362440

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO NRO. :

MONEDA : Soles

TIPO DE SEGURO :

VIGENCIA DE POLIZA
DESDE
HASTA
CORREDOR
OFICINA COMERCIAL

01/04/2022

30/04/2022

2270-Floris Alencin Magda Jessica

Escondo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 131429387, SEGURO DE SCTR PENSIONES	20.80	24.31	20.80


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174615


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común

Son: Veinticuatro y 31/100 Soles



Op. Gravada	SI	20.80
Op. Inafectas	SI	0.00
Op. Exoneradas	SI	0.00
Op. Gratuitas	SI	0.00
Op. Exportacion	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	3.71
Importe Total	SI	24.31

Representación impresa de la Factura Electrónica, autorizada mediante Resolución de Intendencia N° 018-2005-0002999

Hash: 7WNYCLacGa7epkYy7Bsh2G7w

Página 1 de 1

Powered by XEROX


MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

AVDA. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFs. 213-9161

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hadasa Snc

 DIRECCIÓN : Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 702200007345

PRODUCTO : MAPFRE SCTR SALUD

R.U.C. N° 20517182673
FACTURA ELECTRONICA
N° F052-00615052

NRO DE DOCUMENTO : 20510862440

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO NRO :

MONEDA : Soles

VIGENCIA DE POLIZA

DESDE

HASTA

CORREDOR

OFICINA COMERCIAL

01/04/2022

30/04/2022

2270-Florencia Alencio Magda Jessica

Escribo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 131429388. SEGURO DE SCTR SALUD	20.00	23.6	20.00
 JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYG Ingeniero Civil CIP N° 159001			 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 174545		
 CONSORCIO MULTIPROYECTOS RAUL MONTERO LANCHA LEON Representante Común					

Son: Veintidos Y 03/100 Soles

Op. Gravada	S/	20.00
Op. Inafectas	S/	0.00
Op. Exoneradas	S/	0.00
Op. Gratuitas	S/	0.00
OP. Exportacion	S/	0.00
Total ISC	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
Descuento	S/	0.00
IGV 18%	S/	3.60
Importe Total	S/	23.60



Representación impresa de la Factura Electrónica, autenticada mediante Resolución de Intendencia N° 018-005-0002940

Hash: 108103A4891c1y8vao000aRm=

Página 1 de 1

Powered by XEROX

MP/2022/6610854



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CREACIONES HADASA SAC** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200006330 y contrato de Salud No. 7022200007345, con vigencia del 01/04/2022 hasta el 30/04/2022, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI	77018666	LEON CUNJO, LUIS OSWALDO
2 DNI	46839890	PERALTA OBLITAS, SARA LINDA
3 DNI	76518206	TAFUR CIEZA, RUTH MERCEDES

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

18/04/2022 05:05:16 pm

FLORES ATENCIO, MAGDA JESSICA



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRIM
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174543

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>


MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

AVDA. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFPS. 213-9181

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2022

CONTRATANTE : Creaciones Medusa Snc

 DIRECCIÓN : Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 301 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 7012000166330

PRODUCTO : MAPFRE SCTR

R.U.C. N° 20418896915
FACTURA ELECTRONICA
N° F052-00653232

NRO DE DOCUMENTO : 22510952440

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO NRO :

MONEDA : Soles

TIPO DE SEGURO :

VIGENCIA DE POLIZA

DESDE

HASTA

CORREDORES

OFICINA COMERCIAL

01/04/2022

30/04/2022

2273-Florencia Arencibia Magdo Jessica

Escudo

Cantidad	UN	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 131467024, SEGURO DE SCTR PENSIONES	26.43	26.83	26.43

JOEL EFRAIN CHAVARRIA CORTES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LAMPA LEON
Representante Común

Son: Veintisecho Y 83/100 Soles



Op. Gravada	SI	26.43
Op. Insuficiente	SI	0.00
Op. Exoneradas	SI	0.00
Op. Gratuitas	SI	0.00
OP. Exportacion	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	4.40
Importe Total	SI	28.83


MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

AVDA. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFs. 213-8161

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hadisa Snc

 DIRECCIÓN : Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA-PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 7022303007345

PRODUCTO : MAPFRE SCTR SALUD

R.U.C. N° 20517182673
FACTURA ELECTRONICA
N° F052-00615060

NRO DE DOCUMENTO : 20510862440

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO NRO. :

MONEDA : Soles

VIGENCIA DE POLIZA
DESDE
HASTA
CORREDOR
OFICINA COMERCIAL

01/04/2022

30/04/2022

2270 Flores Alencio Magda Jessica

Escudo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 131-487026. SEGURO DE SCTR SALUD	23.72	27.99	23.72
 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 174646					
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001					

Senc: Veintiseis Y 99/100 Soles

Op. Gravada	SI	23.72
Op. Inafectas	SI	0.00
Op. Exoneradas	SI	0.00
Op. Gratuitas	SI	0.00
Op. Exportacion	SI	0.00
Total IGC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
ISV 18%	SI	4.27
Importe Total	SI	27.99


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común

MP/2022/6631325



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa CREACIONES HADASA SAC bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200006330 y contrato de Salud No. 7022200007345, con vigencia del 01/04/2022 hasta el 30/04/2022, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI 44875359 HUAMAN AVILA EMERSON DANNY

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

26/04/2022 10:45:38 am

FLORES ATENCIO, MAGDA JESSICA



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COYRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTA PROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Condon

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>


MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

AVDA. 26 DE JULIO 673 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF. 213-8161

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hadas Snc

 DIRECCIÓN : Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 701220000330

PRODUCTO : MAPFRE SCTR

R.U.C. N° 20418896915
FACTURA ELECTRONICA
N° F052-00655572

NRO DE DOCUMENTO : 20510062440

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO NRO. :

MONEDA : Soles

TIPO DE SEGURO :

VIGENCIA DE POLIZA

DESDE

HASTA

CORREDOR

OFICINA COMERCIAL

01/04/2022

30/04/2022

2279-Flores Atencio Magda Jessica

Escario

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 131621595. SEGURO DE SCTR PENSIONES	20.60	24.31	20.60

JOEL EFRAIM CHAVAREZ CORDERA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

Son: Veinticuatro Y 31/100 Soles



Op. Gravada	SI	20.60
Op. Inafectas	SI	0.00
Op. Exoneradas	SI	0.00
Op. Gratuitas	SI	0.00
OP. Exportacion	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	3.71
Importe Total	SI	24.31



MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

AVDA. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF'S. 213-9181

FECHA DE EMISIÓN : 02-09-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hadasa Snc

DIRECCIÓN : Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 702200097045

PRODUCTO : MAPFRE SCTR SALUD

R.U.C. N° 20517182673

FACTURA ELECTRONICA

N° F052-00623223

NRO DE DOCUMENTO : 20510862440

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 18

POLIZA GRUPO NRO. :

MONEDA : Soles

VIGENCIA DE POLIZA

DESDE

01/04/2022

HASTA

30/04/2023

CORRECTOR

2270 Flores Atencio Magda Jessica

OFICINA COMERCIAL

Escudo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECISO 134821811. SEGURO DE SCTR SALUD	20.00	23.6	20.00

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 124545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 PAUL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

Sum: Veintres Y 60/100 Soles

Op. Gravada	SI	20.00
Op. Inspectas	SI	0.00
Op. Exoneradas	SI	0.00
Op. Gratuitas	SI	0.00
Op. Exportación	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	3.60
Importe Total	SI	23.60



18. Pago Sencico, Conafovicer, Sunat - Seguro Social



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174646



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

CREACIONES HADASA SAC**De:** Banca por Internet BCP [mailto:bcpalertasyavisos@bcp.com.pe]**Enviado el:** Ninguno**Para:** admin1@inmobiliariahadasa.com**Asunto:** Envío Automático - Constancia de Pago de Servicio - BCP**Constancia de Pago de Servicio - BCP**

Titular: CREACIONES HADASA S.A.C.

Fecha y hora: 27/04/2022 09:33

Número de operación: 00064987

Titular de servicio:

Servicio: APORTES

Empresa: CONAFOVICER

Código de usuario: 20510862440

Importe: S/ 118.00

Comisión: S/ 0.00


 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174646

Pagado desde: Corriente Soles ****.*****-041

Monto total: S/ 118.00

Tipo de cambio: S/ 0.000000

Monto pagado al cambio: \$ 0.00


 JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 150001

Puedes verificar tu operación a través de nuestros canales de atención:

Banca por Internet, Banca Móvil, Banca por Teléfono (311-9898), Cajeros Automáticos, Agente BCP o en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

El sistema de correo electrónico del Banco de Crédito BCP está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas del Banco.

Toda la información del negocio contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo del Banco de Crédito BCP. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Si Ud. ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente.


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común

CREACIONES HADASA SAC**Constancia de Pago de Servicio – BCP**

Puedes revisar tu pago en **Sunat - Operaciones En Línea**, utilizando tu **CLAVE SOL** con el Número de Orden: **773738618**

Titular: CREACIONES HADASA SAC

Fecha y hora: 29/03/2022 18:36:07 PM

Número de operación BCP: 00201774

Cuenta de origen: Corriente Soles 1912129217041

Nombre de empresa: SUNAT

Servicio: Guía de Pagos Varios - Formulario 1662 - Tributo

RUC: 20510862440

Razón social: CREACIONES HADASA S.A.C.

Periodo: 03/2022

Tributo pagado: 7031 SENCICO

Semana/Quincena:

Número de orden: 773738618

Monto total: S/ 702.00

Tipo de cambio: S/ 0.000000

Monto pagado al cambio: \$ 0.00


JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174646

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


JOSÉ LEONIDAS GOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONFORME CON LOS DATOS REGISTRADOS

Puedes verificar tu operación a través de nuestros canales de atención:

Banca por Internet, Banca Móvil, Banca por Teléfono (311-9898), Cajeros Automáticos, Agente BCP o en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

El sistema de correo electrónico del Banco de Crédito BCP está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas del Banco. Toda la información del negocio contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo del Banco de Crédito BCP. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Si Ud. ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente.

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0601
 Número de Orden : 999937010
 Fecha de presentación : 18/04/2022

Datos de la Declaración:

RUC : 20510862440
 Nombre o Razón Social : CREACIONES HADASA S.A.C.
 Período : 202203
 Semana : 0
 Tipo de Declaración : Original
 Número de Trabajadores : 17.00
 Número de Pensionistas : 0.00
 Personal Cuarta Categoría : 0.00
 Personal Modalidad Formativa : 0.00
 Terceros : 0.00
 Regímenes Especiales : 0.00

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3052 RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	S/. 382	S/. 382
5210 ESSALUD SEG REGULAR	S/. 1,866	S/. 1,866
5310 SNP - LEY 19990	S/. 971	S/. 971
Total a Pagar	S/. 3,219	S/. 3,219

Detalle de Pago:

Banco : Banco de la Nación
 Número de Operación : 00000000001595600672
 Medio de Pago : Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional
 Fecha de Pago : 18/04/2022 15:28:48


 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRIMA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174546


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

19. Carta fianza de fiel cumplimiento



JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

San Isidro, 08 de Abril de 2022

Señores :
PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA

Ciudad.-

CARTA FIANZA No. 4410087457.00

A solicitud de nuestro cliente CREACIONES HADASA S A C *****
Por la presente constituimos Fianza Solidaria, irrevocable, indivisible, incondicional, de realización automática a solo requerimiento de la entidad y sin beneficio de excusión a favor de ustedes, hasta por la suma de ***** S/ *****12.890,30 DOCEMIL*OCHOCIENTOS*NOVENTA**Y*30/100**SOLES.
PARA GARANTIZAR AL CONSORCIO MULTIPROYECTOS (INTEGRADO POR LAS EMPRESAS RIO BRAVO S.A.C. Y CREACIONES HADASA S.A.C.) POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA COMPARACION DE PRECIOS N° 003-2021-SENASA/PRODESA "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE" - ADICIONAL DE OBRA N° 02.

Dejamos constancia que en virtud de la presente fianza respaldamos exclusivamente el cumplimiento de las obligaciones descritas en el párrafo anterior, sin que nuestra responsabilidad en ningún caso exceda el importe de esta garantía. Hacemos presente que solamente pagaremos el importe de esta Carta Fianza al beneficiario indicado en el presente documento.

Esta Carta Fianza no podrá ser utilizada en respaldo de operaciones comprendidas en la prohibición indicada en el numeral 5 del Art. 217 de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de seguros, Ley 26702.

La presente Fianza no podrá exceder en ningún caso ni por ningún concepto el plazo de vigencia de 0180 días contados a partir del 07 de Abril de 2022 hasta el 04 de Octubre de 2022 a las 18:00 horas, momento en que vencerá indefectiblemente.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1898 del Código Civil, quedaremos libres de toda responsabilidad con respecto a esta garantía, si el beneficiario de la misma no nos exige notarial o judicialmente su honramiento, señalando el monto a pagar, dentro de los quince (15) días siguientes a la expiración del plazo de vencimiento de esta Carta Fianza en nuestra oficina principal ubicada en Avenida Rivera Navarrete N° 600, San Isidro, requerimiento que solo se considerará válido hasta el décimo quinto día a las 18:00 horas. De no señalarse el monto a pagar, se entenderá que el requerimiento es por la suma total. En caso de ejecutarse por monto menor al importe antes señalado, se entenderá que ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento v/o de ejecución de esta Fianza no hubieren vencido.

El pago se efectuará mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario que el Banco entregará contra devolución del original de la presente carta fianza y sus renovaciones.

Será facultad y no obligación del Banco/conceder la prórroga de la presente carta fianza, en caso sea requerida. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que sea concedida por el Banco lo libera de atender su pago.

La presente Fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario de la misma: salvo que la cesión de la acreencia a la que esta Fianza garantiza haya sido comunicada al Banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su Fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente Fianza no surtirá efecto, si la acreencia garantizada resultase un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Atentamente.

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS

MARJORIE GANAE SANCHEZ MARICHE
Jefe de Operaciones y Servicios
BANBIF

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

BANBIF

JOSE LEONIDAS SOSA VACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

20. Carta fianza de adelanto directo y de materiales



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRIMA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159111



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONDRAGON LANDALON
Representante Común

No aplica



JOEL EFRAIM CHAMARÁ COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

21. Revisión de penalidades



JOEL EFRAIM CHAVARIZA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANGA LEÓN
Representante Común

No aplica



JOEL EFRAIM CHAVARRIA C6TRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Com6n

22. Certificado de habilidad del ingeniero residente



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común



LEY N° 24868

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



Certificado de Habilidad

2022032413

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDASAdscrito al Consejo Departamental de: DEPARTAMENTAL DE LIMACon Registro de Matricula del CIP N°: 159001 Fecha de Incorporación: 2014-05-12
ING. CIVIL

Especialidad: _____

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO

VARIOS / OTROS

ENTIDAD
O
PROPIETARIO

VARIOS

LUGAR

VARIOS

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE
VIGENCIA HASTADÍA
31MES
05AÑO
2023

SANTISIMO, 25 de MARZO del 2022

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

ING. CP. JORGE REYNALDO CUEVA HOLBERIO
DIRECTOR SECRETARIO DEL COL. CPIng. María del Carmen Ponce Mejía
Decana Nacional
Colegio de Ingenieros del PerúConsejo Departamental
Colegio de Ingenieros del PerúJOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001CONSORCIO MULTI PROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

23. Panel fotográfico



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

PANEL FOTOGRÁFICO

Fecha de emisión: 30/04/2022

Mediante el presente panel fotográfico se evidencia los trabajos ejecutados durante el proyecto correspondiente al periodo de la VALORIZACION N° 01 del ADICIONAL DE OBRA N°02 correspondiente al periodo DEL 14 AL 30 ABRIL DEL 2022 para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE".



CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL ROMERO LANDA LEÓN
Representante Común


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

**TRABAJOS EJECUTADOS ABRIL
DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 30 DE ABRIL DEL 2022**



Fotografía N° 01
SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES (ALQ. 1 POR MES)



Fotografía N° 02
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

[Signature]
JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
RAUL MONTERO LERDA LEÓN
Representante Común

[Signature]
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



Fotografía N° 03
KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 MOLECULARES DE DESCARTE



Fotografía N° 04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA A UNA DISTANCIA PROMEDIO 30KM


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. GIP N° 174145


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
GIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Fotografía N° 05
SOLADO C:H 1:10 E=0.10M



Fotografía N° 06
CANALETA ANTI HORMIGAS $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRUHA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



Fotografía N° 07
CANALETA ANTI HORMIGAS - ACERO $FY = 4200 \text{ kg/cm}^2$



Fotografía N° 08
BASE DE MESAS DE CONCRETO - CONCRETO $PC = 210 \text{ kg/cm}^2$

JOEL EFRAIN SHIVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
MONTAÑO LANDA LEON
Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



Fotografía N° 09
CAMARAS DE INSPECCION

[Signature]
JOSE EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



Fotografía N° 10
SALIDA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100AMP.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
PAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

[Signature]
JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001
