

Lima, 05 de enero del 2024

CARTA N° 003-2024/FERUHUJA/ Prodesa: Juan Guerra/SSPR-GG

Sres.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SANIDAD AGROPECUARIA

Av. La Molina 1915, distrito La Molina, provincia y departamento de Lima

Presente.-

Atención : Sr. JORGE ANTONIO MANRIQUE LINARES
Jefe del PRODESA

**ASUNTO : PRESENTACION DE LA VALORIZACIÓN N° 02 DE ADICIONAL DE OBRA
POR EVENTO COMPENSABLE N° 08 PERIODO DEL 21 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2023.**

- **Obra:** “Construcción de la Sede para Vigilancia Sanitaria y Zona de Tratamiento Tipo II Juan Guerra – San Martín”

Referencia : a) Carta N° 002-MS/JG-CO/RH-2024/GG
b) Contrato N° 37-2022-SENASA-PRODESA FASE II (Supervisión)
c) Obras N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C., presenta **la Valorización N° 02 del Adicional por Evento Compensable N° 08: 21-31.Dic.2023**, correspondiente al Contrato de Obras N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II.

Al respecto, el Gerente de Obra, en el marco del contrato de la referencia b), ha emitido el Informe N° 002-2024-GDP-GO: “Informe de Revisión y Conformidad de Supervisión a la Valorización N° 02 del Adicional de obra por Evento compensable n° 08: 21-31.Dic.2023”, a través del cual muestra los resultados y emite opinión técnica favorable a la Valorización N° 02 de Adicional de obra por Evento Compensable N° 08 por S/. 159,124.46 inc igv, amortizando 30% por concepto de adelanto: no corresponde. Siendo el monto a facturar por el contratista de **S/. 159,124.46 (Ciento cincuenta y nueve mil ciento veinticuatro con 46/100 soles)**.

Dejo constancia que, de acuerdo a lo establecido en el contrato de referencia c), se retendrá el **5.00 %** de la valorización, que corresponde a S/. 7,956.22 soles, en concordancia con lo establecido en las condiciones especiales del contrato CEC 48.1.

En tal sentido, mi Representada –FERUHUJA SAC-, ratifica y emite conformidad a la Valorización N° 02 de adicional obra por Evento compensable N° 08: 21-31.Dic.2023, por lo que, en el plazo previsto, elevo los actuados para que en su calidad de Unidad Ejecutora, tenga a bien proceder a su revisión y de ser procedente continúe con los trámites y gestiones que correspondan para que efectivice el pago del monto valorizado.

FERUHUJA S.A.C.



SERGIO SEBASTIÁN FORRAS REYES
GERENTE GENERAL

Sin otro particular, esperando la atención debida al presente, me suscribo de usted.

Atentamente;

FERUHUJA S.A.C.

SERGIO SEBASTIAN PORRAS REYES
GERENTE GENERAL

Se adjunta link de la información:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/xaxjmsseyhbdjkt4qbp7u/h?rlkey=5hkoiaj3oey73gek3xeev415u&dl=0>



CHECKLIST VALORIZACION			
OBRA: 'CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN'			
VALORIZACIÓN N° 02 DEL COSTO ADICIONAL POR EVENTO COMPENSABLE N° 08; PERIODO 01 AL 20 DE DICIEMBRE			
ESPECIALISTA QUE REVISÓ: ING. GUILLERMO DIAZ PALOMINO - GERENTE DE OBRA			
	REQUISITOS	SI	NO
1	FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA	P	
2	INFORME DE RESIDENTE DE AVANCE DE OBRA	P	
3	HOJA DE RESUMEN DE PAGO	P	
4	FACTURA DE VALORIZACIÓN	CSE	
5	VALORIZACION	P	
6	CURVA 'S'	P	
7	RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES	P	
8	RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS - PLANILLA DE METRADOS	P	
9	SITUACION DE LA OBRA (incluido en el Informe del Residente de Obra, Item 10)	P	
10	TOTAL DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA	P	
11	CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA	P	
12	AMORTIZACION DE ANTICIPO - DEDUCCION DE OBRA		NC
13	COPIA DE FACTURAS U OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE EL USO DE ANTICIPO EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATO (SEGÚN CONTRATO)		NC
14	COPIA DE CUADERNO DE OBRA	P	
15	CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS REALIZADOS DE CORRESPONDER	P	
16	POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN (CAT)	P	
17	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		NC
18	POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS	P	
19	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	P	
20	SEGURO DE VIDA LEY	P	
21	PAGO SEMEJO, CONAFONICER, SUMAT - SEGURO SOCIAL	P	
22	VIGENCIA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	P	
23	VIGENCIA DE GARANTIA DE ADELANTO		NC
24	REVISION DE OTRAS PENALIDADES	P	
25	REVISION DE NOMBRE DEL ING RESIDENTE AUTORIZADO INICIAL Y VIGENTE	P	
26	CERTIFICADO DE HABILIDAD DE RESIDENTE	P	
27	PROGRAMA DE OBRA (CARGO DE PRESENTACIÓN) a partir de la segunda valorizacion 27. PROGRAMA ACTUALIZADO (verificar clausula de contrato de obra)	P	
28	PANEL FOTOGRAFICO	P	
29	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS COVID	P	
30	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	P	
31	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	P	
32	REPORTE DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL DE OBRA (FORMATO SOLICITADO POR BIDI)	P	

P: PRESENTO

NC: NO CORRESPONDE

NP: NO PRESENTO

CSE: SE PRESEÑARÁ CUANDO LO SOLICITE LA ENTIDAD



GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

Juan Guerra, 05 de enero de 2024

Informe N° 02-2024-FERUHUA/PRODESA: JUAN GUERRA/GDP-GO

PARA: Sergio Sebastián Porras Reyes
GERENTE GENERAL

DE: Ing. Guillermo Díaz Palomino
GERENTE DE OBRA

ASUNTO: REVISIÓN Y CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02 DEL COSTO ADICIONAL POR EVENTO COMPENSABLE N° 08, PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

REFERENCIA: a) CARTA N° 02-MS/JG-COIRH-2024/IGG
b) 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II
c) 37-2022-SENASA-PRODESA FASE II

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y en atención a la carta de la referencia a) mediante el cual el Contratista: CONSTRUCTORA INMOILIARIA RIOHUALLAGA S.A.C. presenta la Valorización de Obra N° 02 del Costo Adicional por evento compensable N° 08 correspondiente al periodo del 21 al 31 de diciembre de 2023 la cual, en concordancia a las obligaciones contraídas en el contrato de la referencia c) en mi calidad de Gerente de Obra y, previa conciliación de los metrados ejecutados, se ha procedido a realizar la revisión y conformidad de la Valorización de Obra N° 02 del Costo adicional N° 08

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02 DEL COSTO ADICIONAL POR EVENTO COMPENSABLE N° 08

• Avance mensual programado	31.12%
• Avance reprogramado acumulado:	65.07%
• Avance mensual ejecutado	21.93%
• Avance mensual ejecutado acumulado:	48.71%
• Situación de la obra	ATRASADA EN 18.60%
• Valorización Obra N° 02 del costo adicional N° 08:	S/ 159,124.46
• Reajuste:	NO SE APLICA CEC 47.1
• No tiene anticipo	S/ 0.00
• Monto a facturar:	S/ 159,124.46
• Retención CEC 48.1	S/ 7,956.22
• Total, a depositar al Contratista del Monto Facturado:	S/ 151,168.24

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 24/100 SOLES

El Gerente de obra **APRUEBA Y DA LA CONFORMIDAD A LA PRESENTE VALORIZACIÓN DE OBRA;** para su trámite correspondiente

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines respectivos.

Atentamente,



GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP 57086

Calle Juan Cruz Navarro N° 3364 y 4566, lote 17 Ms. Y, Urb. El Pacífico, Segunda Etapa, distrito San Martín de Porres, provincia y departamento de Lima

Email: feruhua.sac@gmail.com //// Tel: (01) 329-0528

DESCRIPCIÓN		Moneda Contractada	Val. Acum.				Saldo	
			Anuladas	Actual	Acumulada	%	Moneda	%
Evento compensable II								
CONSTRUCCION DEL SALDO DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL AL PROYECTO								
Proyecto	: LPN N° 012-2022-SERASA/PRODESA							
Contratante	: UNIDAD EJECUTORA 02: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SALUD AGROPECUARIA - PRODESA							
Modificación Contrato	: ADICIÓN N° 13 AL CONTRATO N° 048-2022-SERASA-PRODESA/FASE II							
Supervisión	: FERUHUJA							
Contratista	: CODIN SAC							
Gerente de Obra	: ING. GUILLERMO DÍAZ PALOMINO CIP N° 67006							
Residente	: ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL ÁCIMA CIP N° 56195							
1 Valorización Contractual (V)								
Costo Adicional por Evento Compensable N° 05		725,460.80	178,746.38	153,124.46	137,870.82	48.52%	367,589.98	53.43%
Valorización Bruta (VB I)		725,460.80	178,746.38	153,124.46	137,870.82		367,589.98	
% de Avance de la Obra a la Fecha			34.84%	21.93%	48.57%			
% de Avance de la Obra Programado			33.35%	31.12%	65.07%			
2 Reservas, Inc. Deduciones e I.R. "MÓDULO APLICAR" CEC 47.1								
3 Amortizaciones (A)								
3.1 No hay amortización posible que se haya anticipado								
Total de Amortizaciones (A)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A)			0.00	153,124.46	153,124.46			
Retención por Fondo de Garantía (Rn1)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Valorización Líquida (VL = VN - Rn)			0.00	153,124.46	153,124.46			
Retención condiciones especiales CEC 41		5%	0.00	7,558.22	7,558.22			
Valorización Líquida Total				151,188.24				
Impuesto General a las Ventas (IGV)			0.00	0.00				
Monto a Cancelar al Contratista en la Presente Valorización				151,188.24	100.00%			
SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 24/100 SOLES								


 GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67006

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Tarapoto, 02 de enero del 2024

CARTA N° 002- MS/JG-COIRH-2024/GG

Señores:
EMPRESA SUPERVISORA FERUHUJA S.A.C.
Ciudad. -

Atención:
Ing. Guillermo Díaz Palomino
Gerente de Obra

RECIBIDO
02/01/2024
07:23 PM


- Asunto** : **PRESENTA INFORME DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02 DEL EVENTO COMPENSABLE N° 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/12/2023 AL 31/12/2023**
- Referencia** : a) **CONTRATO N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II Ejecución de obra "Construcción de la Sede para Vigilancia Sanitaria y Zona de Tratamiento Tipo II Juan Guerra - San Martín"**
b) **Adenda N° 13 al Contrato N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II**

De mi especial consideración:

Mediante el presente me dirijo a usted para hacerle llegar mis cordiales saludos y al mismo tiempo presentarle el Informe de Valorización de Obra N° 02 (impreso y digital) del Evento Compensable N° 08, aprobado mediante documento de la Ref b), correspondiente al mes de diciembre 2023 (periodo del 21/12/2023 al 31/12/2023) de la obra del contrato principal de la referencia a), cuyo porcentaje de avance de obra en el mes es de 21.93% y un acumulado de 46.57%, resultando como monto neto, la suma de **S/ 159,124.46 (Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ciento Veinticuatro con 46/100 soles).**

Cabe indicar que la **Valorización de Obra N° 02 del Evento Compensable N° 08**, fue formulada y valorizada conjuntamente con el Gerente de Obra.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de Ud

Atentamente.

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
R.U.C. 20450278051


Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

Adjunta:

01 archivador con 01 tomo del Informe de Val. N° 02_Ad08_Dic 2023 - 01 Original (___ folios s/u)
02 archivadores con 02 tomos del Informe de Val. N° 02_Ad08_Dic 2023 - 02 Copias (___ folios s/u)



UNIDAD EJECUTORA 02: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA

EVENTO COMPENSABLE N° 08 : CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCTA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

CONTRATANTE : UNIDAD EJECUTORA 02: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA

UBICACION : JUAN GUERRA - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN

CONTRATISTA : COIRH SAC

RESIDENTE : ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL ÁGUILA CIP N° 56199

GERENTE DE OBRA : ING. GUILLERMO DÍAZ PALOMINO - EMPRESA FERUHUJA SAC




VALORIZACIÓN DE AVANCE N° 02 DEL EVENTO COMPENSABLE N° 08

DICIEMBRE DEL 2023


(DEL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023)


 Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC: 20456278051
 Abner Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL


 EMPRESA FERUHUJA SAC
 RUC: 20456278051
 Ing. Guillermo Díaz Palomino
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87086


 GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87086

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA


 Construcción Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC: 20430278037

Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


 CONSULTORA DE INGENIERIA
 CIVIL Y AMBIENTAL
 RUC: 20050278037

Guillermo Diaz Palomino
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87088


GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87088



EVEN TO COMPENSABLE N° 08: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA SAC


FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL EVENTO COMPENSABLE N° 08

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02

EVENTO COMPENSABLE N° 08	:	CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"
UBICACIÓN	-	SECTOR ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENTR DISTRITO JUAN GUERRA PROVINCIA SAN MARTÍN DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
CONTRATISTA Representante Común Domicilio Legal	:	COIBU S.A.C. SR. ABNER GUZMAN TEJADA AV. CRUCINVALEACIÓN N° 2283, TAPACHICO, SAN MARTÍN, SAN MARTÍN
ENTIDAD CONTRATANTE	:	UNIDAD EJECUTORA 017 PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA
RESIDENTE DE OBRA	:	ING. JULIO CÉSAR MENDOZA DE LA AGUILA CIP N° 56199
EMPRESA SUPERVISORA Gerente General Domicilio Legal	:	FERRETIJA S.A.C. SERGIO SEBASTIAN PORRAS REYES CALLE JUAN ORUS NAVARRO N° 3364 Y 3366, LOTE 17 M7 Y, URB. EL PACIFICO, SEGUNDA ETAPA, DISTRITO SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DELIMA
GERENTE DE OBRA	:	ING. GUILLERMO DÍAZ PALOMINO, CIP N° 67086
FINANCIAMIENTO	:	CONTRATO DE PRESTAMO NRO. 4457/OC-PE A LA REPÚBLICA DEL PERÚ (PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SANIDAD AGRARIA Y LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA FASE II)
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	A SUMA ALZADA
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	:	ADENDA N° 13 AL CONTRATO N° 188-2022-SENASA-PRODESA FASE II
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	:	08 DE DICIEMBRE DEL 2023
MÓNTO DEL PRESUPUESTO ADICIONAL	:	S/ 725,460.00
INICIO DE PLAZO DE EXEC. DE OBRA	:	09-Dic-23
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	:	35.00 DÍAS CALENDARIOS
TERMINO DE OBRA	:	12-Ene-24
% de Avance de la Obra a la Fecha	:	46.97%
% de Avance de la Obra Programado	:	65.97%



 GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67086


 Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC. 20450278051

 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


 Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC. 20450278051

 Sergio Sebastian Porras Reyes
 GERENTE GENERAL
 CIP N° 56199

INFORME DE RESIDENTE DE OBRA

Construcción Intercomunal Río Puzos S.A.C.
RUC: 20450270005

Abner Guzmán Tejada

Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION DEL CENTRO FILIAR
RUC: 20450270005

[Signature]

Ejec. Intercomunal de Obras de Agua
de Vigilancia de Obra
C/A N° 5419

[Signature]

GUILERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67006



EVENTO COMPENSABLE N° 08: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"



EVENTO COMPENSABLE N° 08
INFORME MENSUAL N° 02
(DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023)



Construtora Inmobiliaria Rio Fuyalaga S.A.C.
RUC: 20450778051

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

EJECUCIÓN DE LA OBRA:

INGENIERIA DE SUPERVISIÓN
RUI HUACACA
RUC: 20450778073

INGENIERO DE OBRAS
RUI HUACACA
CIP: 58130

EVENTO COMPENSABLE N° 08: "CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA; CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

DICIEMBRE 2023

	INFORME MENSUAL - VALORIZACIÓN Nº 02 DEL EVENTO COMPENSABLE Nº 08	<small>COIRH.OT.VAL.01.EC.08</small>
	<small>CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y JURAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRAFAMILINDO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN</small>	Fecha: 31/12/2023 Página 2 de 18

ÍNDICE

01 FICHA TÉCNICA	3
02 GENERALIDADES	5
02.01 DESCRIPCIÓN	5
03 ANTECEDENTES	6
04 ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA	10
04.01 Pagos a cuenta al contratista (Valorizaciones de Obra)	10
04.02 Adelantos Otorgados.....	10
04.03 Cartas Fierzas	10
05 DE LA EJECUCIÓN DE OBRA.....	10
05.01 PARTIDAS EJECUTADAS EN EL PRESENTE MES.....	[Error! Marcador no definido.]
05.02 METRADOS EJECUTADOS Y VALORIZADOS.....	10
06 AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.....	12
06.01 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO PRINCIPAL	12
06.02 CONTROL DEL AVANCE EN CURVA "S"	12
06.02.01 CONTROL DEL AVANCE FÍSICO EJECUTADO.....	12
07 CONTROL DE CALIDAD	13
08 RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS EN OBRA	13
09 RELACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN OBRA.....	14
10 SITUACIÓN DE LA OBRA	16
11 OCURENCIAS Y ASPECTOS IMPORTANTES DURANTE EL MES	17
12 CONCLUSIONES	17
13 RECOMENDACIONES.....	18
14. CÁLCULO DE LA VALORIZACIÓN DEL MES	
14.01 HOJA RESUMEN DE PAGO	14
14.02 VALORIZACIÓN DEL MES	14
14.03 CURVA S	14
14.04 RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES	14
14.05 RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS – PLANILLA DE METRADOS	14
14.06 TOTAL DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA	14
14.07 CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA	14
14.08 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	14

Constructora Inmobiliaria Río Huérfano S.A.C.
 RUC: 20150278051

 Alberto Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL


 GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67006


 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RÍO HUÉRFANO S.A.C.
 GERENTE GENERAL DE OBRA
 CIP. N° 66890

	INFORME MENSUAL - VALORIZACIÓN N° 02 DEL EVENTO COMPENSABLE N° 08	COIRH.OT.V.A.02.FC.08
	CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"	Fecha: 31/12/2023

01 FICHA TÉCNICA

- ❖ **EVENTO COMPENSABLE N° 08** : CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

- ❖ **UBICACIÓN** :
 - SECTOR : ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR
 - DISTRITO : JUAN GUERRA
 - PROVINCIA : SAN MARTÍN
 - DEPARTAMENTO : SAN MARTÍN

- ❖ **ENTIDAD CONTRATANTE** : UNIDAD EJECUTORA 002: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA

- ❖ **FINANCIAMIENTO** : CONTRATO DE PRÉSTAMO NRO. 4457/OC-PE A LA REPÚBLICA DEL PERÚ "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SANIDAD AGRARIA Y LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA FASE II"

- ❖ **CONTRATO DE OBRA** : ADENDA N° 13 AL CONTRATO N° 048-2022- SENASA-PRODESA FASE II

- ❖ **FECHA DE SUSCRIP. DEL CONTRATO** : 12 DE DICIEMBRE DEL 2023

- ❖ **MONTO CONTRATADO** : S/ 725,480.80 (SIN IGV)

- ❖ **SISTEMA DE CONTRATACIÓN** : A SUMA ALZADA

- ❖ **CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIO LEGAL** :
 - COIRH S.A.C.
 - ABNER GUZMÁN TEJADA
 - AV. CIRCUNVALACIÓN N° 2283 - TARAPOTO

- ❖ **FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN** : 09 DE DICIEMBRE DEL 2023

- ❖ **PLAZO DE EJECUCIÓN** : 35 DÍAS CALENDARIOS

- ❖ **FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA** : **12 DE ENERO DEL 2024**

- ❖ **ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMAS A LA FECHA DE INICIO DEL EVENTO COMPENSABLE N° 04** : 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (GARTA N° 165-MS/JG-COIRH-2023/GG)


 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67086

EMPRESA INGENIERIA Y CONSULTORIA
 S.A.C.
 RUC. 20450278051

 Ing. Guillermo Diaz Palomino
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 67086



**INFORME MENSUAL - VALORIZACIÓN Nº 02 DEL
EVENTO COMPENSABLE Nº 08**

COIRH-OT.VA-02ECL.08

CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS
ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL
INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA
VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA SAN
MARTÍN"

Fecha: 31/12/2023

Página 4 de 18

- ❖ RESIDENTE DE OBRA : ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL ÁGUILA
CIP Nº 56190
- ❖ EMPRESA SUPERVISORA : FERUHUJA S.A.C.
GERENTE GENERAL SERGIO SEBASTIAN PORRAS REYES
DOMICILIO LEGAL CALLE JUAN ORUS NAVARRO Nº 3364 Y 3366,
LOTE 17 MZ. Y, URB. EL PACÍFICO, SEGUNDA
ETAPA, DISTRITO SAN MARTÍN DE PORRES,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
- ❖ GERENTE DE OBRA : ING. GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
CIP Nº 67086

Constructora Feruhuja S.A.C.
(RUC: 20145027801)

Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR
ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA
RUC: 20145027801

ING. GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 67086

ING. GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

	INFORME MENSUAL - VALORIZACIÓN N° 02 DEL EVENTO COMPENSABLE N° 08	COIRH.OT.VA.01.EC.08
	CONSTRUCCIÓN DEL SALIDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"	Fecha: 31/12/2023

02 GENERALIDADES

02.01 DESCRIPCIÓN

La presente memoria tiene como finalidad describir la estructuración del Evento Compensable N° 08 de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN".

Los trabajos de acceso vial, que se ejecutarán en el derecho de vía corresponden a las actividades de la construcción del acceso a la Sede de Vigilancia y Zona de Tratamiento Tipo II Juan Guerra, a continuación, se detallan:

META FÍSICA GENERALES:

- ❖ CONSTRUCCIÓN DE 870.18 M2 DE RAMPA VEHICULAR DE PAVIMENTO FLEXIBLE.
- ❖ CONSTRUCCIÓN DE 127.00 M2 DE VEREDAS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=175 KG/CM2.
- ❖ CONSTRUCCIÓN 318.60 ML DE SARDINELES REFORZADOS AL LIMITE DE LA VÍA Y EN ÁREA VERDE.
- ❖ CONSTRUCCIÓN DE 184.73 ML DE TAPAS DE CONCRETO F'C=280KG/CM2 PARA CUNETAS TRIANGULARES EXISTENTES.
- ❖ SEMBRÍO DE 1,514.36 M2 DE ÁREAS VERDES.
- ❖ IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL.

La ejecución de los anteriores será ubicada dentro del derecho de vía cuyas características son las siguientes:

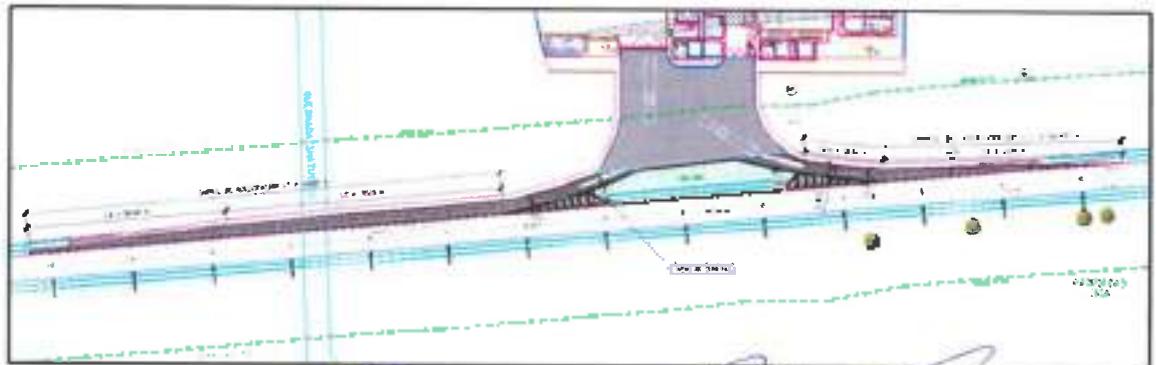
- **Categoría** : Red Vial Nacional. Construtora Inmobiliaria y Via S.A.S.
RUC. 2018027801
- **Ruta** : PE-5N. *Abner Guzman Tejada*
GERENTE GENERAL
- **Autoridad Competente** : Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) / PROVIAS Nacional.
- **Departamento** : San Martín.
- **Tramo Concesionado** : No presenta.





 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67088

CARRILES DE CAMBIO DE VELOCIDAD

- El ancho de vía será de 3.4 m y 1.5 m de vereda lado derecho
- La longitud del carril de aceleración será de $LT=100.00$ m.
- La longitud del carril de deceleración será de $LD=80.00$ m.
- El radio de curva será de 175 m.


 Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC. 2015827805

03 ANTECEDENTES

 GALLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
C.R. 67006


 Abel Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

1. Con fecha 03 de agosto del 2022, se suscribe el **CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II** para la ejecución de la Obra "Construcción de la Sede para la Vigilancia Sanitaria y Zona de Tratamiento Tipo II Juan Guerra - San Martín", por un monto de **S/. 14'500,000.00** (Catorce Millones Quinientos Mil con 00/100 Soles) y un plazo de ejecución de 360 días calendario, celebrado entre el PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SANIDAD AGROPECUARIA (el contratante) y la empresa **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C** (el contratista).
2. Con fecha 10 de agosto del 2022, mediante **Adenda N° 01 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II**, se modifica la forma y condiciones de pago en virtud a la aprobación del Adelanto a favor del Contratista.
3. Con fecha 16 de agosto del 2022, se recibe el terreno satisfactoriamente para la ejecución de la obra: "Construcción de la Sede para la Vigilancia Sanitaria y Zona de Tratamiento Tipo II Juan Guerra - San Martín", hecho registrado mediante **Acta de Entrega de Terreno**, suscrita por los representantes de **SENASA - SAN MARTÍN. PRODESA**, la empresa supervisora **FERUHUJA S.A.C** y la empresa contratista **COIRH S.A.C.**
4. Con fecha 05 de septiembre del 2022, se da inicio a las actividades para la ejecución de la obra: "Construcción de la Sede para la Vigilancia Sanitaria y Zona de Tratamiento Tipo II Juan Guerra - San


 LUMINIS
 4.0135-01-01
 01/03/2023
 01/03/2023

	INFORME MENSUAL - VALORIZACIÓN N° 02 DEL EVENTO COMPENSABLE N° 08	COIRH.OT.YA.02.EC.08
	CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA. CONSTRUCCIÓN DE LA NIDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA SAN MARTÍN	Fecha: 31/12/2023
		Página 7 de 18

Martín, hecho registrado mediante Acta de Inicio de Obra, suscrita por los representantes de la empresa supervisora FERUHUA S.A.C. y la empresa contratista COIRH S.A.C.

- Con fecha 27 de diciembre del 2022, mediante Adenda N° 02 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II, se modifica las condiciones y forma de pago del Contrato Principal, respecto al pago mensual del mes de diciembre 2022, dividido en 02 pagos: del 01 al 20 y del 21 al 31 de diciembre del 2022.


 GABRIEL ESCOBAR CALDERÓN
 INGENIERO CIVIL
 CIP 67000

Con fecha 31 de enero del 2023, mediante Adenda N° 03 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II, se modifica las condiciones del Contrato Principal respecto a la aprobación de costos adicionales por el Evento Compensable N° 01 y el Deductivo Vinculante N° 01.

- Con fecha 03 de agosto del 2023, mediante Adenda N° 04 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II, se modifica las condiciones del Contrato Principal respecto a la aprobación de costos adicionales por el Evento Compensable N° 02, por un monto de S/ 482,258.43 (Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Ocho con 43/100 Soles) y un plazo de ejecución de 60 días calendario.


 GABRIEL ESCOBAR CALDERÓN
 INGENIERO CIVIL
 CIP 67000

Con fecha 25 de agosto del 2023, mediante Adenda N° 05 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II, se modifica las condiciones del Contrato Principal respecto a la Aprobación del Presupuesto Deductivo de Obra N° 02 por la Suma de S/ 108,467.51 (Ciento Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete con 51/100 soles) y la Aprobación de Costos Adicionales por el Evento Compensable N° 04 por un monto de S/ 98,613.53 (Noventa y Ocho Mil Seiscientos Trece con 53/100 Soles) y un plazo de ejecución de 5 días calendario.

- Con fecha 25 de agosto del 2023, mediante Adenda N° 06 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II, se aprueba la solicitud de Prórroga N° 01 del Plazo de Ejecución de la Obra por treinta y tres (33) días calendario adicionales, prorrogando la fecha del término de ejecución al 02 de octubre del 2023.


 Alvaro Guzmán Tejeda
 GERENTE GENERAL
 Constructora Inmobiliaria Huallaga S.A.C.
 RUC. 2055027805

- Con fecha 25 de setiembre del 2023, mediante Adenda N° 07 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II, se modifica las condiciones del Contrato Principal respecto a la aprobación de costos adicionales por el Evento Compensable N° 05, por un monto de S/ 91,334.29 (Noventa y Uno Mil Trescientos Treinta y Cuatro con 29/100 Soles) y un plazo de ejecución de 31 días calendario y del Deductivo de Obra N° 03 por un monto de S/ 15,317.54 (Quince Mil Trescientos Diecisiete con 54/100 Soles).

	INFORME MENSUAL - VALORIZACIÓN N° 02 DEL EVENTO COMPENSABLE N° 08	COIRH.01.VA.02.RC.08
	<small>CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA CIUDA. CONSTRUCCION DE LA SEÑA PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO EL JUAN GUERRA - SAN MARTIN</small>	Fecha: 31/12/2023 Página 8 de 18

11. Con fecha 06 de octubre del 2023, mediante Adenda N° 08 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II, se aprueba la solicitud de Prórroga N° 02 del Plazo de Ejecución de la Obra por veintisiete (27) días calendario adicionales, prorrogando la fecha del término de ejecución al 29 de octubre del 2023.


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 8706

Con fecha 27 de octubre del 2023, mediante Adenda N° 09 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II, se modifica las condiciones del Contrato Principal respecto a la aprobación de costos adicionales por el Evento Compensable N° 06, por un monto de S/ 36,983.92 (Treinta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Tres con 92/100 Soles) y un plazo de ejecución de 19 días calendario y del Deductivo de Obra N° 04 por un monto de S/ 113,736.73 (Ciento Trece Mil Setecientos Treinta y Seis con 73/100 Soles).

13. Con fecha 13 de noviembre del 2023, mediante Adenda N° 10 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II, se aprueba la solicitud de Prórroga N° 03 del Plazo de Ejecución de la Obra por diecisiete (17) días calendario adicionales, prorrogando la fecha del término de ejecución al 15 de noviembre del 2023.


 JUAN CARLOS RODRIGUEZ
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 59329

14. Con fecha 30 de noviembre del 2023, mediante Adenda N° 11 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II, se modifica las condiciones del Contrato Principal respecto a la aprobación de costos adicionales por el Evento Compensable N° 07, por un monto de S/ 5,132.73 (Cinco Mil Ciento Treinta y Dos con 73/100 Soles) y un plazo de ejecución de 03 días calendario y del Deductivo de Obra N° 05 por un monto de S/ 13,854.08 (Trece Mil ochocientos Cincuenta y Cuatro con 08/100 Soles).

15. Con fecha 30 de noviembre del 2023, mediante Adenda N° 12 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II, se aprueba la solicitud de Prórroga N° 04 del Plazo de Ejecución de la Obra por veintitrés (23) días calendario adicionales, prorrogando la fecha del término de ejecución al 08 de diciembre del 2023.


 Abner Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL

16. Con fecha 02 de diciembre del 2023, mediante Carta N° 162-MS/JG-COIRH-2023/GG, se remite la Cotización por Evento Compensable N° 08 para la Construcción del Saldo de la Rampa de Acceso Vehicular, los Accesos de Ingreso de Entrada y Salida de Vehículos (Curva de Desaceleración) y Obras de Arte, por un monto adicional de S/ 725,460.80 (Setecientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Sesenta con 80/100 Soles) y un plazo de ejecución de 35 días calendario.

17. Con fecha 05 de diciembre del 2023, mediante CARTA N° 163-MS/JG-COIRH-2023/GG, el contratista presenta ante la Gerencia de Obra, la Solicitud N° 05 de Prórroga de la fecha de Término de la Obra



**INFORME MENSUAL - VALORIZACIÓN N° 02 DEL
EVENTO COMPENSABLE N° 08**

00-2477
COIRH.OT.VA.DZ.FC.08

CONSTRUCCIÓN DEL MALLO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO EL JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

Fecha: 31/12/2023

Página 9 de 18

para la Ejecución del Evento Compensable N° 08, según las recomendaciones emitidas por la Gerencia de Obras.

18. Con fecha 11 de diciembre del 2023, mediante CARTA N° 165-MS/JG-COIRH-2022/GG, el contratista presenta ante la Gerencia de Obra, la Programación de Ejecución de Obra y el Cronograma Valorizado de obra actualizados a la fecha de inicio del plazo de ejecución del Evento Compensable N° 08, para su revisión y posterior aprobación.
19. Con fecha 12 de diciembre del 2023, mediante CARTA N° 167-MS/JG-COIRH-2023/GG, el contratista presenta la Carta Fianza de fiel Cumplimiento para la ejecución del Evento Compensable N° 08, por un monto de S/ 72,546.08 (Setenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 08/100 Soles).
20. Con fecha 12 de diciembre del 2023, mediante Adenda N° 13 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II, se modifica las condiciones del Contrato Principal respecto a la aprobación de costos adicionales por el Evento Compensable N° 08, por un monto de S/ 725,460.80 (Setecientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Sesenta con 80/100 Soles) y un plazo de ejecución de 35 días calendario.
21. Con fecha 12 de diciembre del 2023, mediante Adenda N° 14 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II, se aprueba la solicitud de Prórroga N° 05 del Plazo de Ejecución de la Obra por treinta y cinco (35) días calendario adicionales, prorrogando la fecha del término de ejecución al 12 de enero del 2024.
22. Con fecha 15 de diciembre del 2023, mediante CARTA N° 171-MS/JG-COIRH-2022/GG, el contratista presenta ante la Gerencia de Obra, la Programación de Ejecución de Obra y el Cronograma Valorizado de obra actualizados según la modificación de la periodicidad de las valorizaciones de diciembre 2023, para su revisión y posterior aprobación.
23. Con fecha 18 de diciembre del 2023, mediante Adenda N° 15 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II, se modifica las condiciones y forma de pago del Contrato Principal respecto al pago mensual del mes de diciembre 2023, dividido en 02 pagos: del 01 al 20 y del 21 al 31 de diciembre del 2023
24. Con fecha 21 de diciembre del 2023, mediante CARTA N° 177-MS/JG-COIRH-2023/GG, el contratista presenta el Informe de Valorización de Obra N° 01 del Evento Compensable N° 08, correspondiente al periodo del 09 al 20 de diciembre del 2023, previa conciliación de metrados entre el Residente y Gerente de Obra.

GUILLELMO PALOMINO
INGENIERO CIVIL
C.P. 67088

Ing. Guillermo Palomino
C.P. 67088

Abner Guillermo Tejada
GERENTE GENERAL

Construcción e Inversión S.A.C.
RUC. 2005073805

	INFORME MENSUAL - VALORIZACIÓN N° 02 DEL EVENTO COMPENSABLE N° 08	<small>COIRH INT. Y A. 02, E. 08</small>
	<small>CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"</small>	Fecha: 31/12/2023
		Página 10 de 18

04 ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA

04.01 Pagos a cuenta al contratista (Valorizaciones de Obra)

Se está presentando la Valorización de Avance de Obra N° 02 del Evento Compensable N° 08, correspondiente al periodo comprendido entre el 21/12/2023 hasta el 31/12/2023.

04.02 Adelantos Otorgados

NO SE SOLICITARON ADELANTOS

04.03 Cartas Fianzas

El contratista de la CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA SAC ha presentado la siguiente Carta Fianza:

POR CONCEPTO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

- CARTA FIANZA N° E3693-00-2023 emitida por Secrex Cesco, como garantía de FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO con vigencia de 60 días calendario contados a partir de las 00:00 hrs del 06 de diciembre del 2023 hasta las 24:00 hrs del 03 de febrero del 2024, por la suma de S/ 72,546.08 (Setenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 08/100 Soles). (VIGENTE).

(Handwritten signature)
 GUILLERMO JIMÉNEZ PALOMAR
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67096

CUADRO RESUMEN DE CARTAS FIANZAS:

Banco y/o Financiera	Carta fianza N°	Garantiza	Monto	Fecha de Vencimiento
Secrex Cesco	E3693-00-2023	Fiel Cumplimiento del Contrato	S/ 72,546.08	03/02/2024

05 DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

05.01 METRADOS EJECUTADOS Y VALORIZADOS

Se han ejecutado en el mes de DICIEMBRE del 2023 (periodo del 21 al 31 de diciembre 2023), las siguientes partidas relacionadas con el contrato del Evento Compensable N° 08:

(Handwritten signature)
 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA SAC
 RUC: 20451278081

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC: 20451278081
(Handwritten signature)
 Alvaro Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL



**INFORME MENSUAL - VALORIZACIÓN N° 02 DEL
EVENTO COMPENSABLE N° 08**

00-24545
COIRH.CI.VA.02.EC.08

CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II SAN QUIRUA - SAN MARTÍN

Fecha: 31/12/2023

Página 11 de 18

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO VAL. ACTUAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.03	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO		
01.03.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	M2	483.23
01.04	SEGURIDAD Y SALUD		
01.04.01	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	UND	0.80
02	ESTRUCTURAS		
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL HASTA NIVEL DE CIMENTACIÓN TERRENO NORMAL	M3	178.82
02.01.03	RELLENO CONTROLADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3	410.28
02.01.04	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	214.58
02.01.05	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	12.50
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.01	VEREDAS		
02.02.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=175 KG/CM2 EN VEREDAS, ACABADO SEMIPULIDO, INCL. BRUÑAS	M3	8.89
02.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	M2	10.78
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.01	SARDINELES DE CONCRETO		
02.03.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I EN SARDINELES REFORZADOS	M3	35.00
02.03.01.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SARDINELES REFORZADOS	KG	500.00
02.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES REFORZADOS	M2	140.00
02.03.03	DADO DE CIMENTACIÓN PARA CUNETETA TRIANGULAR		
02.03.03.01	DADO DE CIMENTACIÓN PARA CUNETETA CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=175 KG/CM2	M3	39.80
02.03.03.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN DADOS	KG	1,336.40
02.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DADOS	M2	177.34
02.04	PAYMENTOS		
02.04.01	SUB BASE GRANULAR E=0.30 M CONEQUIPO	M2	70.18
02.05	VARIOS		
02.05.01	CURADO DE CONCRETO	M2	380.00

GUILLEMO DUAL PALOMINO

CONSTRUCCION SANITARIA
RTO. HUALA
RUC 20051778051

CONSTRUCCION SANITARIA
RTO. HUALA
RUC 20051778051

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC 20450278051

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

06 AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

06.01 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO PRINCIPAL

El Evento Compensable N° 08 del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN", tiene un porcentaje de avance físico menor a lo programado para el mes de diciembre 2023 (Del 21/12/2023 al 31/12/2023) de 21.93% (ver curva "S") y un acumulado de 46.57% referido al monto vigente del CONTRATO PRINCIPAL.

06.02 CONTROL DEL AVANCE EN CURVA "S"

06.02.01 CONTROL DEL AVANCE FÍSICO EJECUTADO

Habiéndose establecido la Valorización de Obra N° 02 del Evento Compensable N° 08, correspondiente al mes de diciembre 2023 (Del 21/12/2023 al 31/12/2023), corresponde realizar la evaluación del monto valorizado en obra, para lo cual es necesario determinar el avance físico hasta el día 31 del presente mes, del monto acumulado realmente ejecutado y se hará una comparación con el monto acumulado consignando en el calendario vigente de obra del Contrato del Evento Compensable N° 08, para establecer el porcentaje de avance físico de la obra al 31 de diciembre del 2023 obteniéndose un 46.57%.

MES	AVANCE PROGRAMADO			AVANCE EJECUTADO		
	PARCIAL \$.	ACUMULADO \$.	% ACUM.	PARCIAL \$.	ACUMULADO \$.	% ACUM.
Dic-2023 I	\$ 215,719.37	\$ 215,719.37	33.95%	\$ 156,567.16	\$ 156,567.16	24.61%
Dic-2023 II	\$ 197,742.75	\$ 413,462.12	65.97%	\$ 199,371.08	\$ 296,928.24	46.57%
Ene-2024	\$ 221,941.48	\$ 635,403.60	100.00%			
	\$ 635,403.60			\$ 296,928.24		

Fuente: Calendario de Avance de obra Valorizado del Contrato del Adicional de Obra vigente, según los términos de la Agenda N° 14 del Contrato Principal. Los montos indicados NO incluyen GG ofertados y Utilidad

Para mayor información ver curva "S" adjunto en el presente informe de valorización:

.....
GUILLELMO DIAZ BALDASSINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67386

CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR
Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA
RUC. 2005078051

.....
Abner Guzmán Tejada
INGENIERO GENERAL
CIP. 67386

CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR
Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA
RUC. 2005078051

.....
Abner Guzmán Tejada
INGENIERO GENERAL
CIP. 67386



INFORME MENSUAL - VALORIZACIÓN N° 02 DEL EVENTO COMPENSABLE N° 08

COIRH.OT.VA.02.EC.08

CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE IMPRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA. "CONSTRUCCIÓN DE LA SUBE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN"

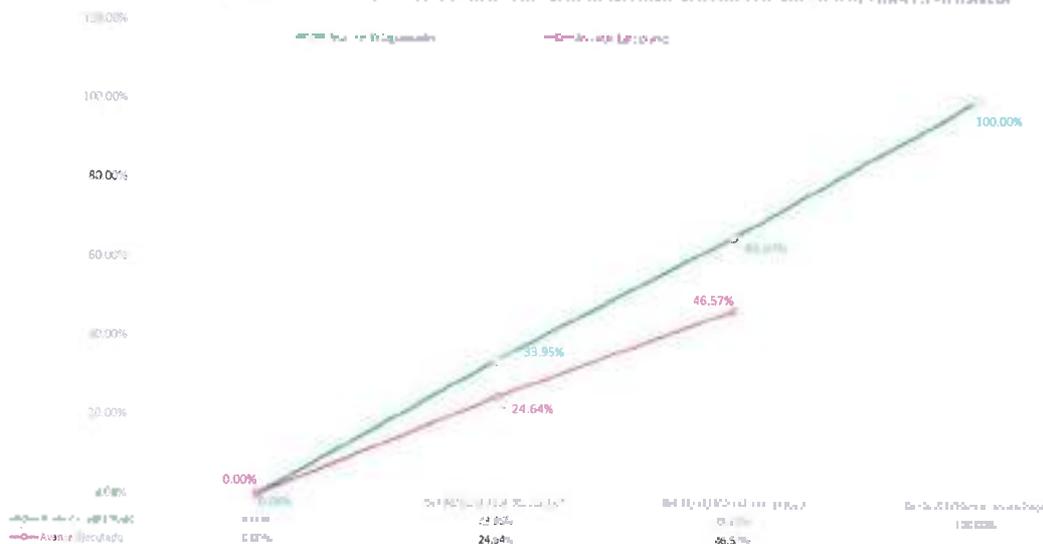
Fecha: 31/12/2023

Página 13 de 18

CURVA "S"

PROGRAMADO VS EJECUTADO

GRÁFICO DE COMPARACIÓN DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS EN LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE IMPRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA. "CONSTRUCCIÓN DE LA SUBE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN"



[Firma]
GABRIEL DAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67086

07 CONTROL DE CALIDAD

Se está efectuando el Control de Calidad de los Materiales, Equipos y Herramientas, así como de la Ejecución de obra, y los ensayos correspondientes, los cuales están detallados en los apartados de "Control de Calidad" adjunto al presente informe.

08 RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS EN OBRA

A la fecha el contratista cuenta con el siguiente listado de Equipos y Maquinaria en obra:

EQUIPOS Y MAQUINARIAS:

- Estación Total equipada (01)
- Nivel Topográfico (01)
- Prismas Óptico (01)
- Camión Volquete 15.00 m3 (02)
- Rodillo Vibratono Liso (01)
- Compactadora Vibr. Tipo Plancha (01)
- Vibrador de Concreto 6 HP 1'-1/2" (02)
- Mezcladora de Concreto Tipo T. (02)

[Firma]
 Constructora Inmobiliar Pro Huancayo S.A.C
 RUC: 20150278051

[Firma]
Alfonso Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

[Firma]
 CONSULTORA INGENIERIA S.A.C
 RUC: 20150278051

[Firma]
 Ing. Jorge C. ...
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 56179

- Camión bomba con pluma (01)
- Camión mixer (01)
- Camión Sistema 4X2, 122 HP (01)
- Retroexcavadora (01)
- Minicargador (01)
- Cortadora de Concreto (01)
- Herramientas Manuales



.....
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

09 RELACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN OBRA

El plantel profesional y técnico que participa en la ejecución del Evento Compensable N° 08, según los requerimientos de la obra y de acuerdo a la especialidad son las siguientes:

PERSONAL PROFESIONAL

- **Residente de Obra.** - Profesional encargado de realizar las siguientes funciones específicas:

- 
- CONSTRUCTORA ANTONIO GUERRA S.A.S.
RUC: 150233531
- M. Sc. Juan Manuel Guerra
Ingeniero Civil en Obra
CIP. 67086
- Ejercer la Dirección Técnica de la obra.
 - Ser responsable de la adquisición y verificación de la calidad de los materiales y Ejecución de obra.
 - Responsables de realizar las anotaciones de las ocurrencias importantes de la obra en el cuaderno de obra.
 - Velar por el estricto cumplimiento de los planes de trabajo.
 - Administrar los recursos transferidos para la obra, cautelando su buen uso.
 - Asistir a todas las reuniones necesarias para la buena gestión del proyecto y promover la participación de la Comunidad y de Los beneficiarios.
 - Aplicar técnicas de comunicación y habilidades interpersonales con valores y actitudes positivas como medio de resolución de conflictos generados en obra, producto de la Interacción propia entre personas y/o instituciones.

- **Ingeniero Asistente de Residente.** - Profesional encargado de realizar las siguientes funciones específicas:

- 
- CONSTRUCTORA ANTONIO GUERRA S.A.S.
RUC: 150233531
- Abner Guzmán Tejeda
Ingeniero Civil
CIP. 67086
- Coordinar y Supervisar el trabajo de los subcontratistas y personal obrero.
 - Informar al Ingeniero Residente de los avances o desviaciones en la ejecución del proyecto.
 - Realizar metrados, programaciones y reprogramaciones de ejecución de la obra.
 - Revisar las valorizaciones de los subcontratistas.

- Verificar que los materiales e insumos se almacenen apropiadamente.
- Verificación de los materiales e insumos antes de su ingreso a almacén.
- Coordinar, supervisar, controlar y asegurar las actividades de recepción, despacho, almacenamiento y distribución de materias primas.
- Supervisar los despachos de productos.
- Emitir y remitir en forma oportuna los reportes requeridos por la Gerencia.
- Realizar inventario, preparar informes y reportes sobre movimientos, estado e incidencias relacionadas al almacén.
- Coordinación con los Proveedores.
- Programación de los Pedidos,
- Coordinar con los operadores logísticos de transporte el envío de carga.
- Emitir y recibir guías, facturas, notas de crédito, notas de débito y letras de los clientes.
- Supervisar la preparación de la mercadería, programación de los despachos por zonas y destinar la carga a los vehículos.

PERSONAL OBRERO

En número aproximado de personal obrero calificado y no calificado, que participa en la ejecución de los trabajos del Adicional de Obra N° 01 actualizado al presente periodo, a cargo del contratista son:

- | | | |
|-------------------|---|------------------------------|
| ○ Maestro de Obra | | (01) |
| ○ Topógrafo | | (01) |
| ○ Operarios | Constructora Inmobiliaria Huallaga S.A.C.
RUC. 20160278051 | (06) (Variable según avance) |
| ○ Oficiales | Abner Quezma Tejada
GERENTE GENERAL | (03) (Variable según avance) |
| ○ Peones | | (10) (Variable según avance) |
| ○ Operadores | | (02) |

10 SITUACIÓN DE LA OBRA

.....
GUILERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CR. 57088

La valorización del Evento compensable N° 08 correspondiente al mes de **DICIEMBRE 2023**, representa la **20ª valorización** de obra según partidas contractuales del adicional de obra. A la fecha se dará trámite a la valorización mensual alcanzando un **avance físico acumulado real de 46.57%** referente al presupuesto total y **un avance físico acumulado programado del 65.07%**, por lo que el Evento Compensable N° 08 se encuentra **ATRASADO**.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
HUALLAGA S.A.C.
RUC. 20160278051

Ing. Luis Eduardo Andoza del Aguila
ENCARGADO DE OBRA
RUC. 20160278051

	INFORME MENSUAL - VALORIZACIÓN N° 02 DEL EVENTO COMPENSABLE N° 08	COIRH.OT.VA.02E.C.08
	CONSTRUCCIÓN DEL SALIDA DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE KATAMBINU (POU) JUAN GUERRA - SAN MARTÍN	Fecha: 31/12/2023
		Página 17 de 18

11 OCURRENCIAS Y ASPECTOS IMPORTANTES DURANTE EL MES

Los aspectos más importantes que se han generado durante el presente periodo son los siguientes:

- Con fecha 18 de diciembre del 2023, mediante Adenda N° 15 al CONTRATO DE OBRA N° 048-2022- SENASA-PRODESA FASE II, se modifica las condiciones y forma de pago del Contrato Principal, respecto al pago mensual del mes de diciembre 2023, dividido en 02 pagos: del 01 al 20 y del 21 al 31 de diciembre del 2023.
- Con fecha 21 de diciembre del 2023, mediante CARTA N° 177-MS/IG-COIRH-2023/IG, el contratista presenta el informe de Valorización de Obra N° 01 del Evento Compensable N° 08, correspondiente al periodo del 09 al 20 de diciembre del 2023, previa conciliación de metrados entre el Residente y Gerente de Obra.

12 CONCLUSIONES


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67686

- o La ejecución del Evento Compensable N° 08, se encuentra a cargo del equipo de profesionales conformado por el Ingeniero Residente, Ingeniero Asistente y el especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente. También se tiene personal de apoyo de profesionales en el área técnica y administrativa.
- o El monto ejecutado del 21 al 31 de diciembre del 2023 es de S/ 159,124.46 a nivel de Costo Total del Evento Compensable N° 08, el cual representa un 21.93% de avance en la ejecución contractual.
- o El porcentaje programado acumulado para el mes de diciembre 2023 según el Calendario de Avance del Adicional de Obra vigente es de 65.07% y el porcentaje ejecutado acumulado es del 46.57%, por lo que, el evento compensable se encuentra **ATRASADO**.
- o El monto neto a cancelar es de S/ 159,124.46 (Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ciento Veinticuatro con 46/100 soles).
- o La retención del pago según CEC 48.1 del Contrato de Obra, es de S/ 7,956.22 que representa el 21.93% del Total de Retenciones.
- o El monto líquido a favor del contratista a cancelar es de S/ 151,168.24 (Ciento Cincuenta y Un Mil Ciento Setenta y Ocho con 24/100 soles).

Constructora Inmobiliaria Huacayo S.A.S.
 RUC: 20430278051

 Amber Guzmán Tejeda
 GERENTE GENERAL

EL INGENIERO RESIDENTE
 DR. GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 RUC: 20430278051

 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67686


	INFORME MENSUAL - VALORIZACIÓN Nº 02 DEL EVENTO COMPENSABLE Nº 08	COIRH OT. Y AJECS
	CONSTRUCCIÓN DEL SALIDA DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO EN ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE AKTI PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO U JUAN GUERRA - SAN MARTIN"	Fecha: 31/12/2023
		Página 18 de 18

13 RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar el pago oportuno de las valorizaciones a efectos de garantizar el flujo económico y liquidez de la obra.

Es cuanto debo informar a usted para los fines pertinentes. Sin otro particular, me suscribo de usted aprovechando la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,


 Construcciones Inmobiliarias Rick Mulligan S.A.C.
 RUC. 20450274951

Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


 CONSTRUCIONES INMOBILIARIAS
 RICK MULLIGAN S.A.C.
 RUC. 20450274951

 ING. GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 GERENTE DE OBRA,
 TPR. 67088



GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67088

CALCULO DE LA VALORIZACIÓN DEL MES


 Construcción Inmobiliaria Ra Huajlega S.A.C.
 RUC - 20050278093

Abner Guzman Tejada
 DIRECTOR GENERAL


 CONSTRUCCION INMOBILIARIA
 RA HUJLEGA S.A.C.
 RUC 20050278093

 Ing. Guillermo Diaz Palomino del Acuña
 Ing. Civil N° 50-190




GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 63086





HOJA RESUMEN DE PAGO


 Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 R.U.C. 20450278091
 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67086


 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A.S.
 RUC 20450278091
 INGENIERO EN OBRAS
 LIC. N° 26695

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 02

PERIODO DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023

Evento Contable N° 06 CONSTRUCCIÓN DEL BALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA, Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

Contratante : UNIDAD EJECUTORA 02: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA
 Contratista : CORIN SAC
 Residente : ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL AGUILA CIP N° 68986
 Gerente de Obra : ING. GUILLERMO DIAZ PALOMINO - EMPRESA FERREYRA SAC

DESCRIPCIÓN	Monto Contratado	VAL. ADIC.				Saldo	
		Anterior	Actual	Acumulado	%	Monto	%
1 Valoración Contractual (V)							
1.1 Evento Compensable N° 06	725,460.80	178,748.36	159,124.46	337,870.82	48.57%	367,589.98	50.43%
Valoración Bruta (VB)	725,460.80	178,748.36	159,124.46	337,870.82		367,589.98	
Costo Directo	835,409.80		139,371.08				
Costo General (0.00%)	52,538.07		11,342.81				
Utilidad (5.9055%)	37,523.83		8,230.58				
% de Avance de la Obra a la Fecha		21.64%	21.99%	48.57%			
% de Avance de la Obra Programado		33.05%	31.12%	65.07%			
2 Retenciones (R)							
2.1 Mensaje Reconocido (NO APLICA)		0.00	0.00	0.00			
2.2 Deducivo de Retenciones que no corresponde (Anexo)		0.00	0.00	0.00			
Total de Retenciones (R)		0.00	0.00	0.00			
VALORIZACIÓN N° 01 (V = VB + R)	725,460.80	178,748.36	159,124.46	337,870.82			
3 Amortizaciones (A)							
3.1 Anticipo							
3.1.1 Anticipo	0%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total de Amortizaciones (A)		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB + A)	725,460.80	178,748.36	159,124.46	337,870.82			
4 Retenciones (R)							
4.1 5% un Cedo pago (Según DEC 48.1)	36,273.04	8,937.32	7,956.22	16,893.54	48.57%	19,379.00	53.43%
Total de Retenciones (R)	36,273.04	8,937.32	7,956.22	16,893.54	48.57%	19,379.00	53.43%
VALORIZACIÓN LÍQUIDA (VL = VN - R)	689,187.76	169,811.04	151,168.24	320,977.28			
Montos a pagar al Contratista							
En efectivo (VL)	689,187.76	169,811.04	151,168.24	320,977.28			
I.S.V	0.00	0.00	0.00	0.00			
Monto Total con IGV	689,187.76	169,811.04	151,168.24	320,977.28			
TOTAL A SOLICITAR A FAVOR DEL CONTRATISTA				320,977.28			
SON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 24/100 SOLES							

Construcción Inmobiliaria Huallaga S.A.C.
 RUC: 20150278051

[Firma]
 ADRIAN GUZMAN TEJADA
 GERENTE GENERAL

[Firma]
 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87046

CONSTRUCCION INMOBILIARIA HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 20150278051

ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL AGUILA
 GERENTE DE OBRA
 CIP N° 68986



VALORIZACIÓN DEL MES


 Construcciones Inmobiliarias Río Huálega S.A.C.
 RUC. 204301278051

 Abel Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67086


 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS
 RUC. 204301278051

 CONSTRUCIONES INMOBILIARIAS RÍO HUÁLEGA S.A.C.
 RUC. 204301278051
 CIP N° 56254

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTÍN"

**VALORIZACIÓN DE AVANCE N° 02 DE ADICIONAL DE OBRA N° 03
PERIODO DEL 21/12/2023 AL 31/12/2023**

Estado Compañía: CONSTRUCCIÓN DEL BALDIO DE LA PAMPA DE ASESADO VINCULAR LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y BALDIO Y CERRAS DE AIRE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRÁFICO TIPO II JUNTA GUERRA - SAN MARTÍN"

Unidad Ejecutora: PROGRAMA DE DESARROLLO DE BARRIO MORFOSOCIAL - PROCESA

Contrato: COBRI SAC

Responsable: MIGUEL GONZALEZ MORALES DEL AGUILAR CP N° 34199

Controlador: DR. GUILLERMO DIAZ MALDONADO - INGENIERO CIVIL

Supervisor: VARIO

SI 721.602.00 SH 16V
 .BILIPUNZO
 .35 d.c
 .18010204

Item	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
		Unid	Método	Unidades	Parcial	Método	%	Parcial	Método	%	Parcial	Método	%	Método	Parcial	%	
C7-05-01-07	AGERO DE REPUNZO F=1400 NICHOS EN SARDINILAS REFORZADOS	M2	1,874.77		7.47	13,641.30	103.66	8,24.42	85.00%	801.00	379.04	37.64%	1,587.86	1,185.82	725.11	1031.57	54.93%
C2-04-01-03	FINCERPTO Y REFORZADO MORRAL EN SARDINILAS REFORZADOS	M2	534.52		56.57	19,467.20	148.99	8035.92	42.84%	140.00	783.09	81.85%	786.89	80263.72	47.52	2661.52	85.70%
02-03-03	TAPA DE CUBIERTA TRIANGULAR	M2	84.21		718.46	67,407.70	0.02	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	84.21	67,697.70	100.00%
02-01-02-01	CONCRETO PREMEZCLADO DE F=1700 NICHOS CONCRETO TIPO I EN TAPAS	M2	7,044.05		7.47	58,340.03	0.02	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	7,044.05	58,340.03	100.00%
02-03-01-02	AGERO DE REFUERZO F=1400 NICHOS EN TAPAS	M2	85.42		93.56	5,517.82	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	85.42	5,517.82	100.00%
02-01-02-03	AGERO DE REFUERZO F=1400 NICHOS EN TAPAS	M2	48.00		629.86	11,148.08	0.00	0.00	0.00%	25.00	24916.86	75.96%	38.96	24916.86	0.00	42708.11	80.01%
02-03-01-01	CONCRETO PREMEZCLADO TIPO I EN TAPAS	M2	1,270.50		7.47	17,439.84	0.00	0.00	0.00%	1336.46	9882.91	85.65%	1336.46	9882.91	334.10	24180.73	20.00%
02-03-01-03	AGERO DE REFUERZO F=1400 NICHOS EN TAPAS	M2	281.68		58.67	12,562.61	0.00	0.00	0.00%	177.34	10649.36	84.98%	177.34	10649.36	44.34	2117.75	20.00%
02-03-04	CAMARAS DE INSPECCION	UNID	2.00		437.89	876.38	2.00	876.38	96.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	876.38	0.00	0.00	0.00%
02-03-01-01	CAMA DE REGISTRO LINEAL PLUMAL C=1700 NICHOS CON TAPA DE CONCRETO. INC. PAVIMENTOS	M2	871.16		27.83	24,043.27	886.00	2232.00	91.84%	70.18	1231.07	100.00%	870.18	24043.07	0.00	0.00	0.00%
C2-04-02	SUB BASE GRANULADA F=40 22 m CDM EQUIPO	M2	875.15		25.12	28,058.97	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	875.15	28,058.97	100.00%
C2-04-03	INFANTACION ASFALTICA C EQUIPO	M2	875.15		7.50	8,787.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	875.15	8,787.40	100.00%
02-24-04	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE F=47 (EQUIPO) VARIOS	M2	870.18		86.80	75,581.87	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	870.18	75,581.87	100.00%
02-25-01	CURADO DE CONCRETO	M2	842.42		2.84	1,897.32	187.26	473.96	28.04%	300.00	888.00	48.37%	487.26	1338.96	179.18	500.92	27.27%
C2-25-02	JUNTA DE ENLACE EN ASFALTICA EN VARIACIONES	ML	189.28		93.04	1,870.45	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	189.28	1,870.45	100.00%
03-01	JARDINERIA Y LIMPIEZA	M3	298.82		42.40	9,767.25	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	298.82	9,767.25	100.00%
03-01-01	REMBRADO DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA	M2	1,214.36		10.08	27,275.62	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,214.36	27,275.62	100.00%



 Guisela Jimenez Jimenez

 RUC: 201278053

 Ing. Guisela Jimenez Jimenez

 RUC: 201278053

 Ing. Guillermo Diaz Maldonado

 RUC: 201278053

 INGENIERO CIVIL

 CAP. BARRIO

VALORIZACIÓN DE AVANCE N° 02 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01
PERIODO DEL 21/12/2023 AL 31/12/2023

Este Contrato: CONSTRUCCIÓN DEL SALIDO DE LA BARRERA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE MARCHA DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PEATONAL DE LA OBRA "COMPLECIÓN DE LA
N° 01: SINI PARA LA VIGILANCIA, LA SEGURIDAD Y FORMA DE TRATAMIENTO TIPO I JUNTA QUENEA - SUAREZ/RIE
Contrato: UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMA DE DESARROLLO DE SAMPÓN AGROPECUARIO - PROESA
Contrato: COMH SAC
Fecha: 01/07/2023
Centro de Costo: INC. GUILLERMO DIAZ PALOMINO - EMPRESA FERRARIJA SAC
Subproyecto: VARIOS

SI: 75,400.00 **Se:** 100
Medio Contratado: : 08137881
Medio de Pago Contractual: : 35.62
Fecha Contractual: : 13/11/2024
Término de Pago Contractual:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRELIMINARES Y OBRAS		ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		BALUDO	
		Unid	Metrado	Unidades	Metrado	Partial	%	Metrado	Partial	%	Metrado
03.02	SISTEMA DE SERIALIZACIÓN										
03.02.01	SERIALIZACIÓN CON PINTURA OPACA EN PISO.	ML	270.69	11.00	4,385.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
03.02.02	LINEA COLOR AMARILLO Y BLANCO	UNID	4.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
03.02.03	SEÑAL REGULAMENTARIA	UNID	2.00	5,300.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
03.02.04	SEÑAL INFORMATIVA	UNID	4.00	75.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
03.02.24	POSTES DELINEADORES VERTICALES PLEMBLE	UNID	4.00	75.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	TOTAL OBRAS DE OBRA					19,547.48	34.66%	179,811.89	245,124.79	66.67%	318,275.49
	GASTOS GENERALES					1,943.71		11,942.31	31,942.31		43,884.62
	VIGILANCIA					1,548.99		8,398.57	23,948.57		31,942.31
	SUB TOTAL					21,040.18		199,752.77	279,015.67		394,102.42
	IMPORTE					0.00		0.00	0.00		0.00
	TOTAL VALORADO					21,040.18		199,752.77	279,015.67		394,102.42

Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INGENIERIA S.A.
 RUC: 199073001

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CUP: 87498



CURVA "S"

[Signature]
 Construcción Inmobiliaria Huancayo S.A.C.
 RUC: 20150278051

Abner Guayán Tejada
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 Construcción Inmobiliaria Huancayo S.A.C.
 RUC: 20150278051

 Ing. Julio Cesar Pacheco del Aguila
 INGENIERO EN SISTEMAS DE SANEAMIENTO
 CIP N° 56149

[Signature]

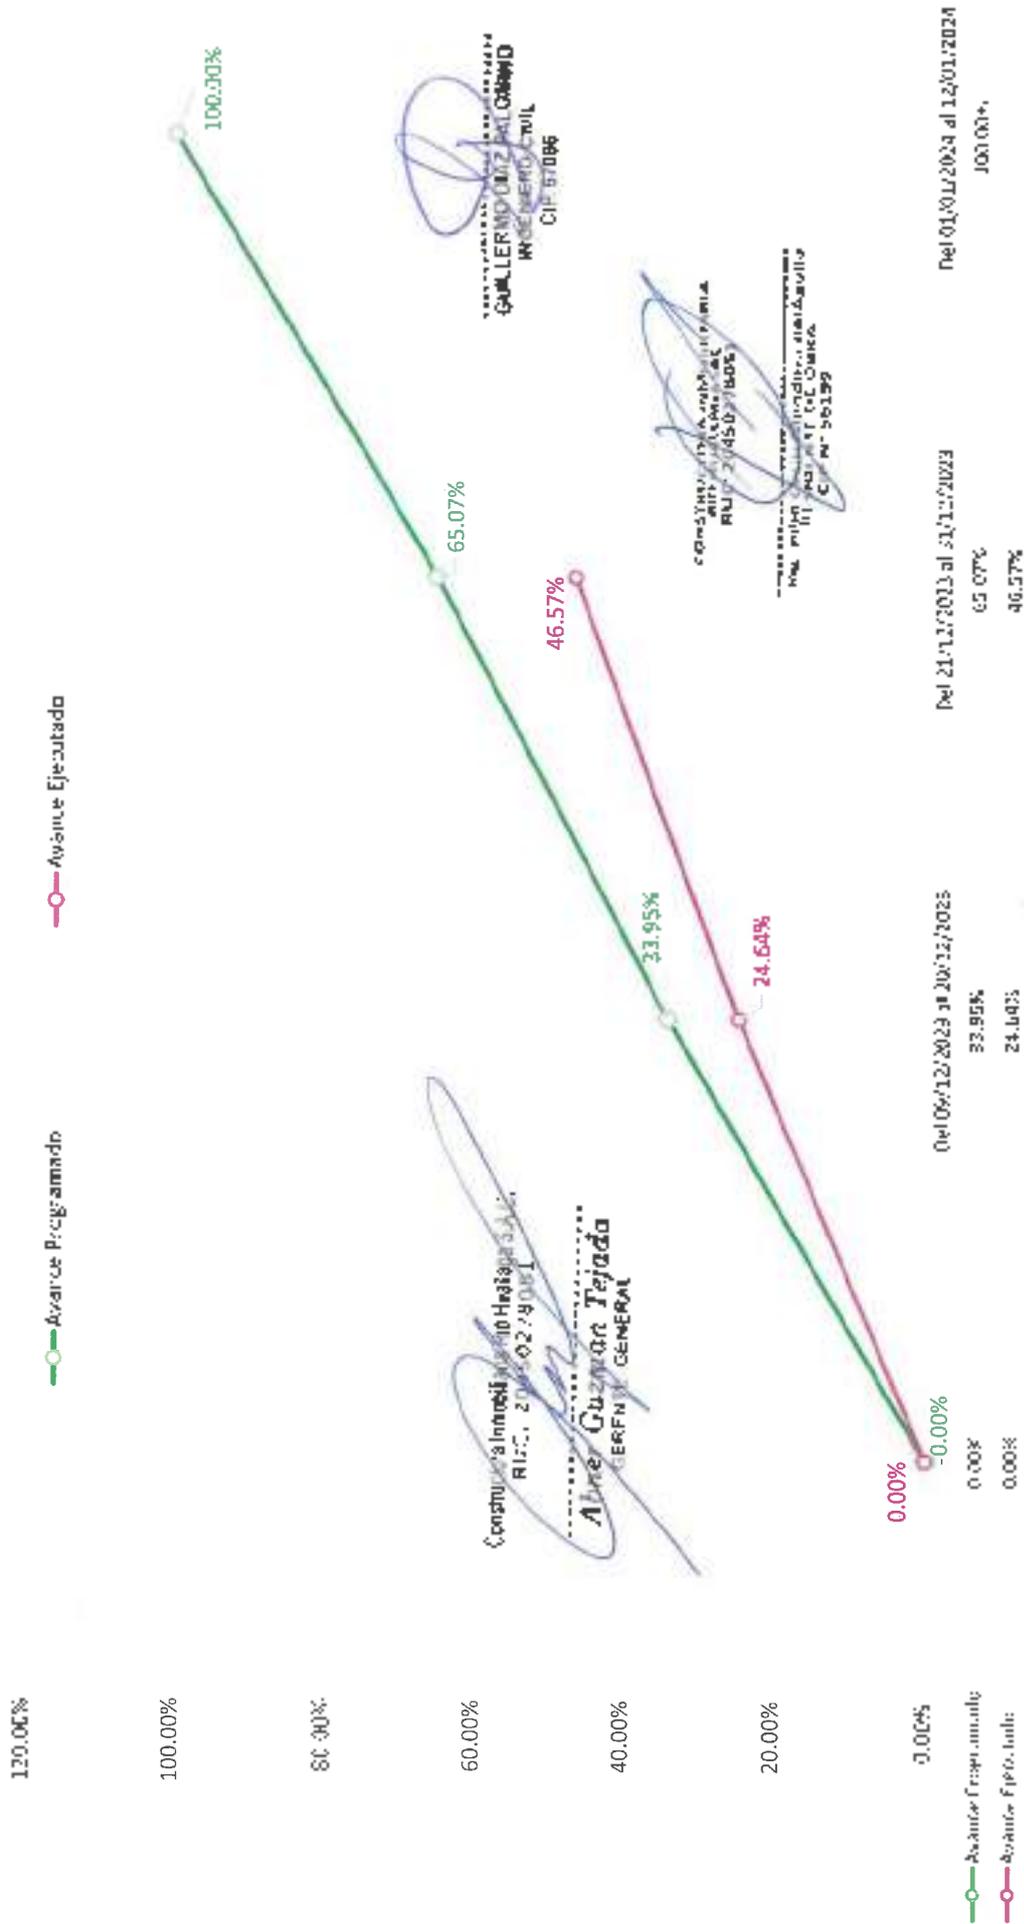
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67088

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

CURVA "S"

PROGRAMADO VS EJECUTADO

EVENTO COMPENSABLE N° 09: CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDER PARA LA VIGILANCIA



Consty. y Manten. de la Infraestructura de la Obra
R.I.C. 20150279001

Alfonso Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

GUILLERMO MUÑOZ DEL CORRAL
INGENIERO CIVIL
CIP 67086

COMANDANTE EN JEFE
MAYOR EN JEFE
RUIZ 204507805

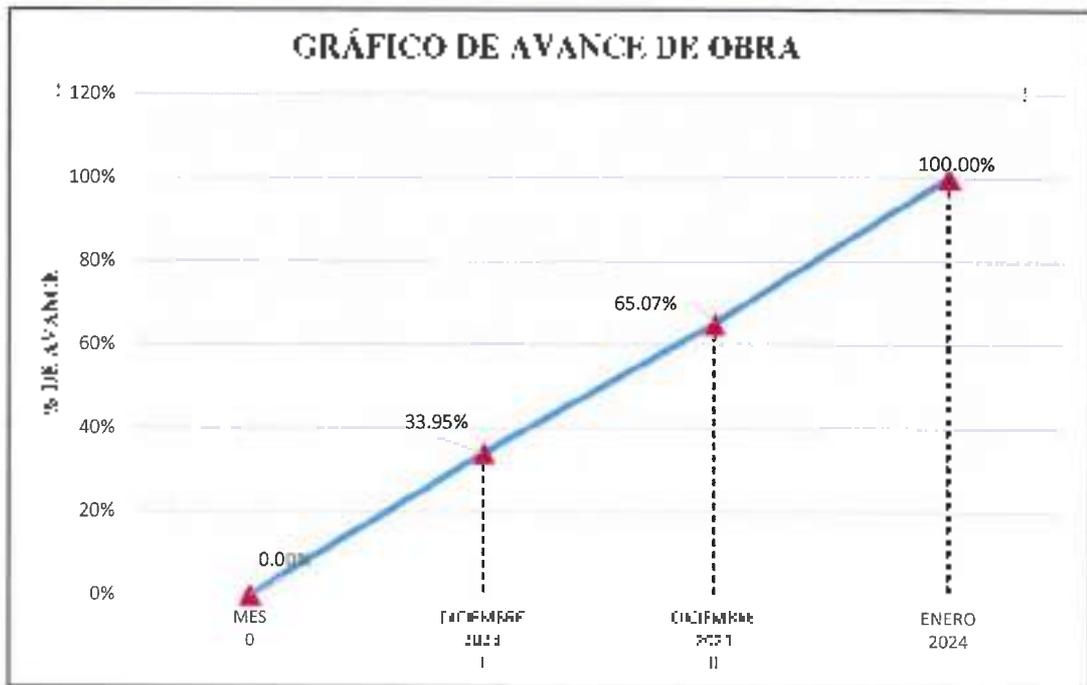
INGENIERO EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
CIP N° 50139

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO

Evento Compensable N° 08 **CONSTRUCCIÓN DEL SALIDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"**

Contratista : UNIDAD EJECUTORA 02: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA
 Residente : COIRH SAC
 Gerente de Obra : ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL ÁGUILA CIP N° 56199
 Subpresupuesto : ING. GUILLERMO DÍAZ PALOMINO - EMPRESA FERUHUJA SAC

DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE 2023			ENERO 2024	
	09	20	21	31	12
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA (C/D)		S/. 245,719.37	S/. 197,742.75		S/. 221,941.48
% AVANCE DE MES		33.95%		31.12%	34.93%
% AVANCE ACUMULADO MENSUAL		33.95%		65.07%	100.00%
GASTOS GENERALES	6.2677%	S/. 17,835.06	S/. 16,348.81		S/. 18,349.49
UTILIDAD	5.8055%	S/. 12,799.33	S/. 11,577.73		S/. 13,106.78
SUBTOTAL		S/. 248,293.77	S/. 225,769.27		S/. 253,397.75
IGV (18%)		S/. 0.00	S/. 0.00		S/. 0.00
TOTAL MENSUAL		S/. 248,293.77	S/. 225,769.27		S/. 253,397.75




 Constructora Inmobiliaria Rio Huataga S.A.C.
 RUC. 2083027805
Abel Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


 CONSTRUCION SANITARIA
 RIO HUATAGA S.A.C.
 RUC. 2083027805
 ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL ÁGUILA
 GERENTE DE OBRA
 CIP. 56199


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 87086

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO EJECUTADO

Evento Compensable N° 08 **CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"**

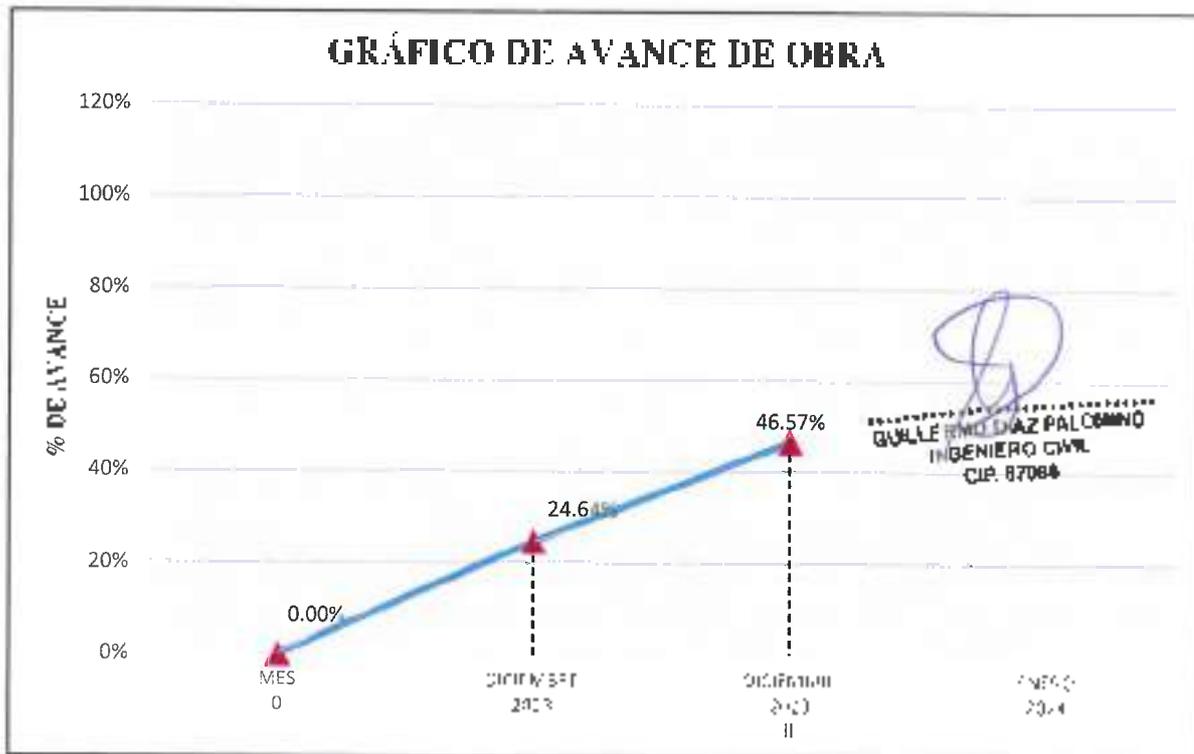
Contratista : UNIDAD EJECUTORA 02: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA


Residente : COIRH SAC

Gerente de Obra : ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL ÁGUILA CIP N° 56199

Subpresupuesto : ING. GUILLERMO DIAZ PALOMINO - EMPRESA FERUHUJA SAC

DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE 2023				ENERO 2024	
	09	20	21	31	01	12
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	S/. 168,567.18		S/. 139,371.06			
% AVANCE DE MES	24.64%		21.93%		0.00%	
↘ AVANCE ACUMULADO MENSUAL	24.64%		46.57%		46.57%	
GASTOS GENERALES	6.2677%	S/. 12,943.71	S/. 11,522.81	S/. 0.00		
UTILIDAD	5.9055%	S/. 9,245.50	S/. 8,230.57	S/. 0.00		
SUBTOTAL	S/. 178,746.37		S/. 159,124.46		S/. 0.00	
IGV (18%)	S/. 0.00		S/. 0.00		S/. 0.00	
TOTAL MENSUAL	S/. 178,746.37		S/. 159,124.46		S/. 0.00	




Abel Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


JULIO CESAR MENDOZA DEL ÁGUILA
 GERENTE DE OBRA



RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES

Construtora Inmobiliar Rio Huila S.A.C.
R.U.C. 2005027805

Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP 67086

CONSTRUTORA INMOBILIARIA
RIO HUILA S.A.C.
R.U.C. 2005027805

JULIA CARRERA
INGENIERA CIVIL
CIP 67086

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES

Evento Compensado: **CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"**

Contratante: **: UNIDAD EJECUTORA 02: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA**

Contratista: **: COIRH SAC**

Residente: **: ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL ÁGUILA CIP N° 56199**

Gerente de Obra: **: ING. GUILLERMO DÍAZ PALOMINO - EMPRESA FERUJILJA SAC**

N°	VALORIZACIÓN		Requiere Concedido	VALORIZACIÓN BRUTA		Amortización de Adiantos		VALORIZACIÓN NETA (VN) VN = VB - D	Otras Deduciones (E)		NETO A PAGAR S/.	
	MES	Monto (S/.)		(VB) VB = A + B	B	Anticipo D1	Materiales D2		Deductivo Vinculante	Muñita	EFFECTIVO VN - E	IOV
CONTRATO PRINCIPAL												
1	Dic-23	178,746.36	-	178,746.36	-	-	178,746.36	-	-	-	178,746.36	178,746.36
2	Dic-23	159,124.46	-	159,124.46	-	-	159,124.46	-	-	-	159,124.46	159,124.46
3	Ene-24											
SUB TOTAL				178,746.36			178,746.36				178,746.36	178,746.36


 Constitución Inmobiliaria Río Hato SAC
 RUC: 450278051
 Alberto Guzmán Tejeda
 GERENTE GENERAL


 EMPRESA EJECUTORA 02
 PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA
 RUC: 4000278003
 Guillermo Díaz Palomino
 Gerente de Obra


 GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 ING. EN INGENIERÍA CIVIL
 CIP: 57038



RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS – PLANILLA DE METRADOS

Construtora Inmobiliaria Pío Hualde S.A.C.
R.U.C. 20050278054

Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE OBRAS CIVILES S.A.C.
R.U.C. 20050278054

[Signature]
Ing. Julio César Méndez Palomino
Ingeniero Civil
C.P. 67086

[Signature]
GUILERMO GONZÁLEZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
C.P. 67086

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y
ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTÍN"

RESUMEN DE METRADOS - VALORIZACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 08

PERIODO DEL 21/12/2023 AL 31/12/2023

Evento **CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"**

Compensable N° 08

Contralista : COIRH SAC

Residente : ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL ÁGUILA CIP N° 58199

Gerente de Obra : ING. GUILLERMO DÍAZ PALOMINO - EMPRESA FERUHUJA SAC

Subpresupuesto : VARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO VAL. ACTUAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.03	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO		
01.03.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	M2	493.23
01.04	SEGURIDAD Y SALUD		
01.04.01	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA	UND	0.80
02	ESTRUCTURAS		
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.01	EXCAVACION MANUAL HASTA NIVEL DE CIMENTACION TERRENO NORMAL	M3	178.82
02.01.03	RELLENO CONTROLADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	410.28
02.01.04	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	214.58
02.01.05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	12.50
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.01	VEREDAS		
02.02.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=175 kg/cm ² EN VEREDAS, ACABADO SEMIPULIDO, INCL. BRUÑAS	M3	8.99
02.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	M2	10.78
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.01	SARDINELES DE CONCRETO		
02.03.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 210 KG/CM ² CEMENTO TIPO I EN SARDINELES REFORZADOS	M3	35.00
02.03.01.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM ² EN SARDINELES REFORZADOS	KG	500.00
02.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES REFORZADOS	M2	140.00

Construtora Inmobiliaria Rio Hualpa S.A.C.
RUC. 20250278054

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

EMPRESA FERUHUJA SAC
RUC. 20250278054

ING. GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

Guillermo Díaz Palomino
GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

RESUMEN DE METRADOS - VALORIZACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 08

PERIODO DEL 21/12/2023 AL 31/12/2023

Evento **CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"**

Compensable N° 08

Contralista : COIRH SAC

Residenta : ING. JULIO CÉSAR MENDOZA DEL ÁGUILA CIP N° 56199

Gerente de Obra : ING. GUILLERMO DÍAZ PALOMINO - EMPRESA FERUHUJA SAC

Subpresupuesto : VARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO VAL. ACTUAL
02.03.03	DADO DE CIMENTACION PARA CUNETETA TRIANGULAR		
02.03.03.01	DADO DE CIMENTACION PARA CUNETETA C/CONCRETO PRÉMEZCLADO DE $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$	M3	39.80
02.03.03.02	ACERO DE REFUERZO $FY=4200 \text{ KG/CM}^2$ EN DADOS	KG	1,336.40
02.03.03.03	ENCÓFRADO Y DESENCÓFRADO NORMAL EN DADOS	M2	177.34
02.04	PAVIMENTOS		
02.04.01	SUB BASE GRANULAR E=0.30 m CON EQUIPO	M2	70.18
02.05	VARIOS		
02.05.01	CURADO DE CONCRETO	M2	300.00

Constructora Inmobiliaria De Huancayo S.A.C.
RUC. 20150278051

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION INMOBILIARIA
DE HUANCAYO S.A.C.
RUC. 20150278051

ING. GUILLERMO DIAZ PALOMINO
GERENTE DE OBRA
CIP. 56199

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 57086

PLANILLA DE METRADOS

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN.

ENTIDAD : Servicio Nacional de Sanidad Agraria - PRODESA

LUGAR : SAN MARTIN - SAN MARTIN - JUAN GUERRA

Item	DESCRIPCION	Uvd.	Nº Vec.	Long (m)	Anch (m)	Alt (m)	Area (m2)	Longitud (m)	Volumen (m3)	Pierche	Total
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD										
01.03	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO										
01.03.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	M2					490.23			490.23	490.23
01.04	SEGURIDAD Y SALDO										
01.04.01	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	LMO	0.60							0.60	0.60
02	ESTRUCTURAS										
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
02.01.01	EXCAVACION MANUAL HASTA NIVEL DE CIMENTACIÓN TERRENO NORMAL	M3									
	SARCOMEL AL LIMITE DE VIA										
	LIMITE IZQUIERDO		1.00	140.00		0.9	0.50		23.63		
	LIMITE DERECHO		1.00	70.21		0.9	0.50		11.85		
	SARCOMEL AL LIMITE DE AREA VERDE								0.00		
	LIMITE CENTRO		1.00	108.38		0.9	0.50		18.29		
	DADES								0.00		
	EMPALME TAPA CUNETETA DE INGRESO		2.00	58.50		0.00	0.30		8.96		
	EMPALME TAPA CUNETETA SALIDA		2.00	118.23		0.00	0.30		15.96		
	CAMARAS DE INSPECCION								0.00		
	VEREDAS		2.00	0.90		0.90	0.90		0.55		
	VEREDAS		1.00	84.06		1.50	0.15		0.09		
	LIJAS		2.00	84.66		0.30	0.26		7.74		
	AREA VERDE								4.76		
	AREA VERDE CENTRAL (ISLA)		1.00			367.10	0.16		0.00		
	DESCONTAR CUNETETA		1.00			-1.20	0.150		29.65		
	AREA ACCESO EN DERECHO DE VIA								-1.09		
	AREA DE ACCESO		1.00			539.00	0.15		0.00		
	AREA LIBRE JARDIN IZQUIERDO		1.00			159.00	0.15		30.36		
	AREA LIBRE JARDIN DERECHO		1.00			547.78	0.15		8.96		
									30.81		

Construtora Inmobiliaria y Habitacional Hualde S.A.C.
 RUC. 201000278051

Guillermo Díaz Palomino
 GERENTE GENERAL

COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL
 RUC. 201000174005

Guillermo Díaz Palomino
 INGENIERO CIVIL

00-55421

PLANILLA DE METRADOS

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN.
 ENTIDAD : Servicio Nacional de Sanidad Agraria - PROCESA
 LUGAR : SAN MARTIN - SAN MARTIN - JUAN GUERRA

Item	DESCRIPCION	U'nd	Nº Vec.	Long (m)	Anch (m)	Alt (m)	Area (m ²)	Longitud (m)	Volumen (m ³)	Parcial	Total
02.01.03	RELLENO CONTROLADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PLATAFORMA (SUBRASANTE + BASE GRANULAR) VIA (SUBRASANTE + BASE GRANULAR)	M3	1.00			0.55	539.60		414.18	410.18	410.18
			1.00			0.55	330.52		155.73		
02.01.04	ACABADO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (EXC. MANUAL + EXC. MQUINA) X FACTOR ESPONJ.	M3	1.00						214.50		214.50
									214.50		
02.01.05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS CORTE DE CURBETA EXISTENTE PARA DENTACION DE DADO DE CONCRETO PARA TAPA TRIANGULAR (MANUAL)	M3								12.50	12.50
	Paralelo izquierdo		2.00		0.20	0.15	113.56			7.14	
	Paralelo derecho		2.00		0.20	0.15	66.19			3.87	
	CORTE DE PAVIMENTO PARA DENTACION DE DADO DE CONCRETO PARA TAPA TRIANGULAR Paralelo izquierdo		1.00		0.15	0.05	116.96			0.89	
	Paralelo derecho		1.00		0.15	0.05	66.19			0.50	
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE										
02.02.01	VEREDAS										
02.02.01.01	CONCRETO PREMECLADO DE 1 cm ³ kg/cm ² EN VEREDA 6, ACABADO SEMIPULIDO, INCL BRUJAS VEREDA AL LIMITE DE RAMPA Y VIA Derecho lateral	M3	1.00	7.03	1.50	0.12			1.18	10.78	10.78
	LINAS DE VEREDA Izquierdo y Derecho		2.00				0.06		9.60		
02.02.01.02	ENCOFRADO Y DEBENCOFRADO DE VEREDA VEREDA AL LIMITE DE RAMPA Y VIA Derecho lateral Bases y separaciones para juntas	M2	2.00	33.60	1.50	0.15			10.00		
			21.00				0.12		0.78		

Construccion Inmobiliaria Habla S.A.S.
 RUC: 20100278051
 Ing. Guzman Tejeda
 INGENIERO CIVIL
 INFRANTE CIVIL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HABLA
 RUC: 20100278051
 Ing. Guzman Tejeda
 INGENIERO CIVIL
 INFRANTE CIVIL

GUILLERMO DIAZ ARCUMIRIO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87086

PLANILLA DE METRADOS

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN.

ENTIDAD : Servicio Nacional de Sanidad Agraria - PROCESA

LUGAR : SAN MARTIN - SAN MARTIN - JUAN GUERRA

Item	DESCRIPCION	Und	Xº Vec.	Long (m)	Area (m²)	Alt (m)	Area (m²)	Longitud (ml)	Volumen (m³)	Parcial	Total
02.03.01	OBRA DE CONCRETO ARMADO										
02.03.01	SARDINELES DE CONCRETO										
02.03.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 214 NORMAS CEMENTO TIPO I EN SARDINELES REFORZADOS	M3								35.00	35.00
	SARDINELES PERALTADOS										
	LIMITE DERECHO		1.00	70.21	0.26				13.77		
	SARDINEL AL LIMITE DE AREA VERDE										
	LIMITE CENTRO		1.00	104.30	0.26				21.24		
02.03.01.02	ACERO DE REFUERZO FT=400R NORMAS EN SARDINELES REFORZADOS	KG									500.00
	SARDINELES		1.00							500.00	
02.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES REFORZADOS	M2									140.00
	SARDINELES PERALTADOS										
	SARDINEL AL LIMITE DE VIA										
	LIMITE DERECHO		1.00	70.21	1.05				54.96		
	SARDINEL AL LIMITE DE AREA VERDE										
	LIMITE CENTRO		1.00	108.30	1.05				85.01		
02.03.02	DADO DE CIMENTACION PARA CUNETAS TRIANGULAR										
02.03.02.01	DADOS DE CIMENTACION PARA CUNETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=214 Normas	M3									
	DADOS										
	Isolamiento y Drenaje		2.00	184.73	0.135				39.90		
02.03.02.02	ACERO DE REFUERZO FT=400R NORMAS EN DADOS	KG									1,336.40
	DADOS		2.00								1,336.40

CONSTRUCCION INMOBILIARIA HOHALGA S.A.C.
RUC: 20550278051
Abner Guzman Tejeda
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION INMOBILIARIA HOHALGA S.A.C.
RUC: 20550278051
Guillermo Ortiz Palomino
INGENIERO CIVIL
CIP 67086

PRODESA

PLANILLA DE METRADOS

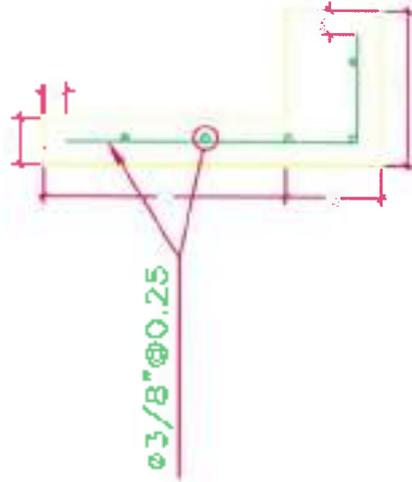
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN.
 ENTIDAD : Servicio Nacional de Sanidad Agraria - PRODESA
 LUGAR : SAN MARTIN - SAN MARTIN - JUAN GUERRA

DESCRIPCION	02.03.01 SARDINELES DE CONCRETO				LONGITUD TOTAL	PESO KG/ML			KG/ ML ACERO
	ELEMENTO	N° veces	Ø	LONG. ACERO		3/8"	5/8"	3/4"	
					PESO (KG/ML):	0.25	1.552	2.235	
					% DESPERDICIO	3.00%	7.00%	8.00%	

SARDINEL TIPO I	1.00	1298.20	3/8"	1.33	1,644.15	0.58			320.72
Acero transversal	1.00	5.00	3/8"	318.59	1,692.89	0.58			882.03

TOTAL KG 300.33

TOTAL KG 500.33



Construcción Inmobiliaria Río Huallaga S.A.C.
 U.I.C. 20050278051
 Alberto Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL

Guillermo Diaz Alconini
 INGENIERO CIVIL
 CIP 67046

CONSTRUCCION INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 U.I.C. 20050278051
 Ing. Jorge Luis Torres Aguilera
 GERENTE GENERAL

DETALLE DE SARDINEL TIPO 1
 ESC: 1/25



TOTAL DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA

Construtora Inmobiliar Rio Huallaga S.A.S.
RUC. 20750278051
[Signature]
Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

COMPTON S.A. INGENIERIA
NICKY ALBA
RUC. 20050278051
[Signature]
M: Julio Cesar Marmoles Alvarado
PRESIDENTE DE COMPTON
DIP N° 56349

[Signature]
GALLERINO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 6708E

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

TOTAL DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA

Evento Compensable N° 08 : CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO B JUAN GUERRA - SAN MARTIN"
Contratante : UNIDAD EJECUTORA 02: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PROCESA
Contabilista : COIRH SAC
Residente : ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL ÁGUILA CPN N° 58189
Gerente de Obra : ING. GUILLERMO DÍAZ PALOMINO - EMPRESA FERUMILIA SAC

VALORIZACION		Mes		Folio de Concepto	VALORIZACION BRUTA (VB)	Anticipos (D)			VALORIZACION NETA (VN)	Otras Dedicaciones (E)		NETO PAGADO SI.			Retención 10% Fiel Cumplimiento	Comprobante de Pago		
		A	B			Anticipo	D1	D2		D3	Declaración Vinculante	Multa	Efectivo	IGV		SUB TOTAL	N°	Fecha de Cobranza
CONTRATO PRINCIPAL																		
1	04-23	178,746.36			178,746.36				178,746.36				178,746.36					
2	04-23	159,124.46			159,124.46				159,124.46				159,124.46					
3	05-24																	
SUB TOTAL 1		178,746.36			178,746.36				178,746.36				178,746.36					2012/02/23

ADELANTOS		NETO PAGADO SI.			Comprobante de Pago		
		Anticipo	IGV	SUB TOTAL	Fecha	N°	Referencias
1	Anticipo (30 DÍAS)						
SUB TOTAL 2							
TOTAL PAGADO		S/.	178,746.36				178,746.36

Constructora Inmóvil para Sio-Hidalgo S.A.S.
 RUC: 2045027895

Abner Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL

CONSTRUCION SANITARIA
 RUC: 2045027895

Guillermo Díaz Palomino
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 47018



CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA

Construcción Inmobiliaria San Agustín S.A.C.
RUC. 20790276051

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA
Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA
RUC. 20790276051

VIC. INGENIERIA CIVIL
INSTRUMENTACIÓN DE OBRAS
CIP N° 26199

Gullermo Diaz Palomino
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"



CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - EVENTO COMPENSABLE N° 08

ACTUALIZADO SEGÚN PERIODICIDAD DE VALORIZACIONES DEL MES DICIEMBRE 2023

Obra : CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO H JUAN GUERRA - SAN MARTÍN
Proceso : CALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 018-2023-SENASA-PRODESA
Dirección : SENASA-PRODESA
Contratista : CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ROMULLAGA SAC
Mediación : JUAN GUERRA - SAN MARTÍN
Garantía : ING. AULO CÉSAR MENDOZA DEL ÁGUILA C.P.N° 66199

Monte Operado (BUSD) : S/ 14.590.090,50
Calificación de Evento Compensable N° 08 : S/ 739.488,84
Plazo de Ejecución : 36 d/c
Inicio de Plazo de Ejecución : 08/12/2023
Fin de Plazo de Ejecución : 12/01/2024

Código	Detalle	Unid.	Cantidad	Precio (S/.)	Partida (M.)	PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA = 0 4 4.	
						08-23	09-24
	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO H JUAN GUERRA - SAN MARTÍN					08/12/23 - 30/01/24	01/01/24 - 12/01/2024
						12 d.c.	11 d.c.
01	OBRAS ADICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				29.002,70		
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				9.929,80		
01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	2.486,16	1,72	4.241,80	4.241,80	
01.01.02	ELIMINACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS	M2	392,09	10,77	4.200,30	4.200,30	
01.01.03	PROYECCIÓN DE TUBERÍA DE OREOQUE UNOS*	ML	83,18	50,00	1.487,70	1.487,70	
01.02	MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES				1.363,78		
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	GLB	0,26	5.465,10	1.383,76	1.383,76	
01.03	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO				10.298,30		318,22
01.03.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	2.468,18	1,26	3.307,38	3.307,38	
01.03.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	M2	3.469,10	2,84	7.802,54	7.802,54	
01.04	SEGURIDAD Y SALUD				7.499,22		
01.04.01	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	UNO	1,50	2.632,20	3.948,30	1.184,40	2.763,84
01.04.02	ARTÍCULOS DE PREVENCIÓN Y DESARRO DE TRANSITO	UNO	4,00	381,82	3.550,92	1.090,28	2.460,64
02	ESTRUCTURAS				547.744,45		
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				118.103,26		
02.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL HASTA NIVEL DE CIMENTACIÓN TERRENO NORMAL	M3	478,88	43,24	20.142,67	20.142,67	
02.01.02	EXCAVACIÓN MÁQUINA CON ESCAVADORA	M3	999,10	11,21	14.076,60	14.076,60	
02.01.03	RELLENO CONTROLADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	482,80	79,68	36.459,94	8.463,06	28.996,89

Constructora Inmobiliaria Romullaga S.A.C.
 RUC. 20450278037

Abner Guzmán Tejedor
 GERENTE GENERAL

INGENIERO CIVIL
 CIP. 87038

GUILERMO PALOMAR




CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - EVENTO COMPENSABLE N° 08


ACTUALIZADO SEGUN PERIODICIDAD DE VALORIZACIONES DEL MES DICIEMBRE 2023

Obra : CONSTRUCCIÓN DE LA BEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO B JUAN GUERRA - SAN MARTIN
Proyecto : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 012-2023-SE/SAUP/PRODESA
Cuanta : SE/SAUP/PRODESA
Contratista : CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA SAC
Ubicación : JUAN GUERRA - SAN MARTIN
Realizante : ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL ÁGUILA CIP N° 95196

Monto Original (S/000) : S/ 54,500,000.00
Contrato de Evolución Compensable N° 08 : S/ 725,460.80
Plazo de Ejecución : 35 d.e.
Inicio de Plazo de Ejecución : 04/12/2023
Fin de Plazo de Ejecución : 10/01/2024

Item	Descripción	Unid.	Monto	Procto (%)	Parcial (S/)	PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA + 0 d.e.	
						04-23	05-24
		04/12/23 - 20/12/23	21/12/23 - 31/12/23			01/01/24 - 10/01/2024	
		12 d.e.	11 d.e.			13 d.e.	
CONSTRUCCIÓN DE LA BEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO B JUAN GUERRA - SAN MARTIN							
02.01.04	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	1,850.00	25.56	47,476.13		47,476.13
02.01.05	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	15.70	62.37	949.02		949.02
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				17,586.70		
02.02.01	VEREDAS				17,586.70		
02.02.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE Fc=175 kg/cm2 EN VEREDAS, ACABADO SEMIFLUIDO INCL. BRILAS	M3	23.40	870.46	15,981.29		15,981.29
02.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	M2	30.80	30.02	4,725.42		4,725.42
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				280,025.71		
02.03.01	BARDINELES DE CONCRETO				90,603.65		
02.03.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE Fc=240 kg/cm2 CEMENTO TIPO I EN BARDINELES REFORZADOS	M3	69.78	693.46	48,405.01		48,405.01
02.03.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 EN BARDINELES REFORZADOS	KG	1,812.77	7.47	13,541.39		13,541.39
02.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN BARDINELES REFORZADOS	M2	504.52	96.87	18,957.25		18,957.25
02.03.02	TAPA DE CUNETAS TRIANGULAR				132,357.37		
02.03.02.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE Fc=240 kg/cm2 CEMENTO TIPO I EN TAPAS	M3	34.21	716.49	27,497.70		27,497.70
02.03.02.02	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 EN TAPAS	KG	7,944.05	7.47	59,342.05		59,342.05
02.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TAPAS	M2	55.42	59.58	3,517.92		3,517.92
02.03.03	DAPO DE CIMENTACION PARA CUNETAS TRIANGULAR				56,169.31		
02.03.03.01	DAPO DE CIMENTACION PARA CUNETAS CONCRETO PREMEZCLADO DE Fc=175 kg/cm2	M3	67.89	828.48	31,148.08		31,148.08
							85,933.25


 Humberto Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


 Guillermo Diaz Pacheco
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67028

COMPROBANTE DE PAGO
 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
 C/C 20050278051

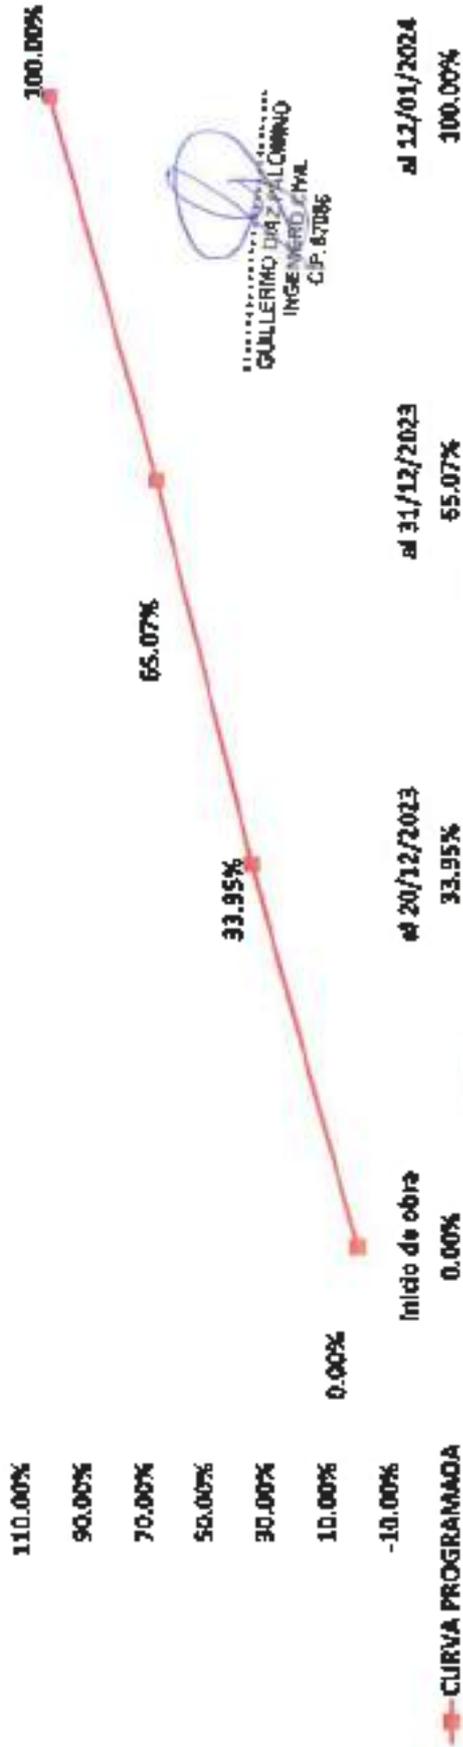
CURVA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA ACUMULADA - EVENTO COMPENSABLE N° 08


ACTUALIZADO SEGÚN PERIODICIDAD DE VALORIZACIONES DEL MES DICIEMBRE 2023


Obra : CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN
 Proceso : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 012-2022-SENASA/PRODESA
 Cliente : SENASA/PRODESA,
 Contratista : CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA SAC
 Ubicación : JUAN GUERRA - SAN MARTIN
 Residente : ING. JULIO CÉSAR MENDOZA DEL ÁGUILA C.I.P N° 58189

PERIODO DIAS CALENDARIOS	Inicio de obra	al 20/12/2023	al 31/12/2023	al 12/01/2024
AVANCE PROGRAMADO MENSUAL	0.00%	33.95%	31.92%	34.93%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	0.00%	33.95%	65.07%	100.00%

CURVA DE AVANCE VALORIZADA PROGRAMADA ACUMULADA




 Alvaro Guzmán Tejada
 INGENIERO GENERAL
 RUC. 20042027805


 Ing. Julio César Mendoza del Águila
 INGENIERO CIVIL
 RUC. 200420278051



AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (No corresponde)

[Signature]
Construtora Inmobiliaria Rio Pucallpa S.A.C.
RUC. 20450278051

Almer Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

[Signature]
CONSTRUTORA INMOBILIARIA
RIO PUCALLPA S.A.
RUC. 20450278051

VIC. ENLACE Y RELACIONES DEL MUNICIPIO
DE GUANALI EN CHIRI
CIP N° 50310

[Signature]

GUILHERMO RUIZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67048

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTÍN"



DEDUCCIÓN DE OBRA (No corresponde)


 Construcción Inmobiliaria Hualpa S.A.C.
 RUC: 20150278051

 Abner Guzmán Tejado
 GERENTE GENERAL


 CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA
 HUALPA S.A.C.
 RUC: 20150278051

 Abner Guzmán Tejado
 GERENTE GENERAL
 CIP N° 96309



 GUILLERMO PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 47088

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

ANEXOS

Construtora Inmobiliaria y Puertos S.A.C.
RUC. 20150278051

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION CONTROL S.A.
RUC. 20150278051

INGENIERO CIVIL
CIP. 67005

Guillermo del Palomino
GUILLERMO DEL PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67005



EVENTO COMPENSABLE N° 08: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"



COPIA DE FACTURAS / DOCUMENTOS DEL SUSTENTO DEL USO DEL ANTICIPO (No corresponde)

.....
Constudora Inmobiliaria Arehuallaga S.A.C.
RUC. 20450278051
.....
Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

.....
CONSTRUCCION AERONAUTICA
AREHUALLAGA S.A.C.
RUC. 20450278051
.....
Ing. GUILLERMO RUIZ PALOMINO
CIP. 67086

.....
Guillermo Ruiz Palomino
GUILLERMO RUIZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"



COPIA DE LOS ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA


 Constructora Inmobiliaria de Hualgayuta S.A.C.
 RUC. 2049027805

 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


 FUNDACIÓN PARA INVERSIÓN Y REHABILITACIÓN
 DE HUALGAYUTA S.A.
 RUC. 2049027805

 Juan Carlos Palomino
 INGENIERO CIVIL



 GUILLERMO Z PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 87088

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTÍN"



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA
 Obra: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II - JUAN GUERRA SAN MARTIN
 Contratista: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C

Número de asiento: 750

Título: CONSTATAción DE ACTIVIDADES

Fecha y Hora: 21/12/2023 18:17

Usuario: DIAZ PALOMINO, GUILLERMO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se constata la excavación para el dado de concreto y corte del pavimento para demoliciones, actividades que pertenecen al costo adicional por evento compensable N° 08

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


 Constructoria Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC: 204450278051

 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 204450278051

 Guillermo Diaz Palomino
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67086



 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67086

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II - JUAN GUERRA SAN MARTIN

Contratista: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C

Número de asiento: 751

Título AVANCE DE OBRA AL 21-12-2023

Fecha y Hora 21/12/2023 18:45

Usuario: MENDOZA DEL AGUILA, JULIO CÉSAR

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Con fecha 21.12.2023, se continuaron los trabajos de Resane de Estructuras, Repintado y acabados finales para los Sistemas Eléctricos, de Comunicaciones y Sanitarios.

ADICIONAL DE OBRA N° 08

Con fecha 21.12.2023, se continuaron los trabajos de Colocación de Acero de Refuerzo $F_y=4200$ kg/cm², el Encofrado Normal y el vaciado de Concreto Premezclado de $f'c=210$ kg/cm² cimiento tipo I de las zapatas y muros de los Sardineras Peraltados (Margen Derecha) de protección de la Rampa de Acceso Vehicular del Ingreso Principal.

Con fecha 21.12.2023, se continuaron los trabajos de Trazo y Replanteo, descolmatación, excavación y corte de las Cunetas Triangulares y pavimento existente en el área del Ingreso (Margen Izquierdo) de la Carretera Principal.

Con fecha 21.12.2023, se continuaron los trabajos de Excavación Manual para la Cimentación de Sardineras (tala central) del área del Ingreso principal a las instalaciones de la Sede de Vigilancia y Zona de Tratamiento.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC: 20450278051

Ahner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 20450278051

GUILTERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 67086



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA
 Obra: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II - JUAN GUERRA SAN MARTIN
 Contratista: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C

Número de asiento: 752

Título AVANCE DE OBRA AL 21-12-2023

Fecha y Hora 22/12/2023 19:10

Usuario: MENDOZA DEL AGUILA, JULIO CÉSAR

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Con fecha 22.12.2023, se continuaron los trabajos de Resane de Estructuras, Replintado y acabados finales para los Sistemas Eléctricos, de Comunicaciones y Santarios.

ADICIONAL DE OBRA N° 08

Con fecha 22.12.2023, se continuaron los trabajos de Trazo y Replanteo, descolmatación, excavación y corte de las Cunetas Triangulares y pavimento existente en el área del Ingreso (Mergén Izquierdo) de la Carretera Principal.

Con fecha 22.12.2023, se continuaron los trabajos de Colocación de Acero de Refuerzo $F_y=4200 \text{ kg/cm}^2$, el Encofrado Normal y el vaciado de Concreto Premezclado de $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ c/cemento tipo I de las zapatas y muros de los Sardineros Peraltados (Isla central) del área del ingreso principal a las instalaciones de la Sede de Vigilancia y Zona de Tratamiento.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C
 RUC - 20400278051

 Abner Guzman Tejada
 REPRESENTANTE

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C
 RUC - 20400278051

 JULIO CÉSAR MENDOZA DEL AGUILA
 RESIDENTE DE OBRA
 C.I. N° 56190

 GUILLERMO DÍAZ PASCARINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 57688



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II - JUAN GUERRA SAN MARTIN

Contratista: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C

Numero de asiento: 753

Titulo: CONSTATAACION DE ACTIVIDADES

Fecha y Hora: 22/12/2023 23:23

Usuario: DIAZ PALOMINO, GUILLERMO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se constata la ejecución de actividades descritas en el Asiento de Cuaderno de Obra N° 752

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC: 20450278051

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 20450278051

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 20450278051

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 67086

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II - JUAN GUERRA SAN MARTIN

Contralista: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C

Número de asiento: 754

Título AVANCE DE OBRA AL 26-12-2023

Fecha y Hora 27/12/2023 10:08

Lugar: MENDOZA DEL AGUILA, JULIO CÉSAR

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: En el periodo del 23 al 26 de diciembre, se continuaron los trabajos de Resane de Estructuras, Replido y acabados finales para los Sistemas Eléctricos, de Comunicaciones y Sanitarios.

ADICIONAL DE OBRA N° 08

Con fecha 23.12.2023, se continuaron los trabajos de Colocación de Acero de Refuerzo $F_y=4200$ kg/cm², el Encofrado Normal y el vaciado de Concreto Premezclado de $f'c=210$ kg/cm² cemento tipo I de los muros de los Sardineros Peraltados (sardinel central) del área del Ingreso principal a las Instalaciones de la Sede de Vigilancia y Zona de Tratamiento.

Con fecha 23.12.2023, se continuaron los trabajos de Colocación de Acero de Refuerzo $F_y=4200$ kg/cm², el Encofrado Normal y el vaciado de Concreto Premezclado de $f'c=210$ kg/cm² cemento tipo I de las zapatas de los Dados para la cimentación de las Tapas Prefabricadas de las cunetas existentes (Margen Izquierda) del Ingreso Vehicular.

Con fecha 26.12.2023, se continuaron los trabajos de Colocación de Acero de Refuerzo $F_y=4200$ kg/cm², el Encofrado Normal y el vaciado de Concreto Premezclado de $f'c=210$ kg/cm² cemento tipo I de las zapatas y muros de los Dados para la cimentación de las Tapas Prefabricadas de las cunetas existentes (Margen Izquierda) del Ingreso Vehicular.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC: 20450278051

Abner Guzmán Tejada
Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

Guillermo Díaz Palomino
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 57006

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 20450278051

Guillermo Díaz Palomino
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 57006



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II - JUAN GUERRA SAN MARTIN

Contratista: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C

Número de asiento: 755

Título ENERGIZACIÓN DE LA MEDIA TENSIÓN

Fecha y Hora 27/12/2023 21:11

Usuario: DIAZ PALOMINO, GUILLERMO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: El día de ayer 26/12/2023 se realizó la energización de la media tensión. Se constata el vaciado de las zapatas de los dados del Costo Adicional del Evento Compensable N° 08.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Otros anexos: 00

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C
 RUC. 20150278034

Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C
 RUC. 20150278034

[Signature]

[Signature]

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67086



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA
 Obra: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II - JUAN GUERRA SAN MARTIN
 Contratista: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C

Número de asiento: 756
 Título AVANCE DE OBRA AL 27-12-2023
 Fecha y Hora 28/12/2023 12:38
 Usuario: MENDOZA DEL AGUILA, JULIO CÉSAR
 Rol: RESIDENTE DE OBRA
 Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
 Descripción: Con fecha 27.12.2023, se continuaron los trabajos de Resane de Estructuras, Replintado y acabados finales para los Sistemas Eléctricos, de Comunicaciones y Sanitarios.
 ADICIONAL DE OBRA N° 02
 Con fecha 26.12.2023, se realizó la conexión del empalme de Energía Eléctrica de la Red Pública para la puesta en marcha del Servicio de Energía Eléctrica a la Obra, y con el mismo se procederá a realizar las pruebas finales para los Sistemas de Instalaciones del proyecto.
 ADICIONAL DE OBRA N° 08
 Con fecha 27.12.2023, se continuaron los trabajos de Habilitación de Acero de Refuerzo $F_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ para las Tapas Prefabricadas de las cunetas triangulares existentes paralelas a la carretera principal.
 Con fecha 27.12.2023, se continuaron los trabajos de Colocación de Acero de Refuerzo $F_y=4200 \text{ kg/cm}^2$, el Encofrado Normal y el vaciado de Concreto Promezclado de $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$ c/cemento tipo I de las zapatas de los Dardos para la cimentación de las Tapas Prefabricadas de las cunetas existentes (Margen Izquierda) del Ingreso Vehicular.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC. 20450278081
 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC. 20450278081
 ING. JULIO CÉSAR MENDOZA DEL AGUILA
 RESIDENTE DE OBRA
 CP N° 56299

GUILLELMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CP. 67086



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II - JUAN GUERRA SAN MARTIN

Contratista: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C

Número de asiento: 757

Título: CONSTATAION DE ACTIVIDADES

Fecha y Hora: 28/12/2023 18:46

Usuario: DIAZ PALOMINO, GUILLERMO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se constata la ejecución de actividades descritas en el Asiento de Cuaderno de Obra N° 756

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexo: 00


 Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC: 20150278051

 Abel Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL


 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 20150278051

 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67686



 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67686

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II - JUAN GUERRA SAN MARTIN

Contratista: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C

Número de asiento: 758

Título: AVANCE DE OBRA AL 28-12-2023

Fecha y Hora: 28/12/2023 08:10

Usuario: MENDOZA DEL AGUILA, JULIO CÉSAR

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Con fecha 28.12.2023, se continuaron los trabajos de Reasno de Estructuras, Repintado y acabados finales para los Sistemas Eléctricos, de Comunicaciones y Sanitarios.

ADICIONAL DE OBRA N° 08

Con fecha 28.12.2023, se continuaron los trabajos de Trazo, Relleno Controlado y Compactación de Material de Préstamo para Base Granular de la Vereda Lateral (Margen Derecho) del Ingreso Principal a la Sede de Vigilancia y Zona de Tratamiento.

Con fecha 28.12.2023, se continuaron los trabajos de Encofrado Normal y Excavación manual para las urnas de la Vereda Lateral (Margen Derecho) del Ingreso Principal a la Sede de Vigilancia y Zona de Tratamiento.

Con fecha 28.12.2023, se continuaron los trabajos de Colocación de Acero de Refuerzo $F_y=4200 \text{ kg/cm}^2$, el Encofrado Normal y el vaciado de Concreto Premezclado de $f'_{c}=210 \text{ kg/cm}^2$ cemento tipo I de los muros de los Sardineros Paralelos (Margen Izquierda) del área del ingreso principal a las instalaciones de la Sede de Vigilancia y Zona de Tratamiento.

Con fecha 28.12.2023, se continuaron los trabajos de Demolición parcial de la parte superior de las cunetas triangulares existentes para el empalme y asentado de las Tapas de Concreto Prefabricado.

Con fecha 28.12.2023, se continuaron los trabajos de Excavación Manual hasta el fondo de cimentación de las Zapatas de los Dados para el asentado de las Tapas Prefabricadas de las cunetas existentes (Margen Izquierda) del Ingreso Vehicular.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC. 20450278051

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

GULLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC. 20450278051

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II - JUAN GUERRA SAN MARTIN

Contratista: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C

Número de asiento: 759

Título: AVANCE DE OBRA AL 28-12-2023

Fecha y Hora: 30/12/2023 08:49

Usuario: MENDOZA DEL AGUILA, JULIO CÉSAR

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Con fecha 29.12.2023, se continuaron los trabajos de Resane de Estructuras, Repintado y acabados finales para los Sistemas Eléctricos, de Comunicaciones y Sanitarios.

ADICIONAL DE OBRA N° 08

Con fecha 29.12.2023, se continuaron los trabajos de Trazo, Relleno Controlado y Compactación de Material de Préstamo para Base Granular y el respectivo y el vaciado de Concreto Premezclado de $f'c=175$ kg/cm² cemento tipo I de la Vereda Lateral (Margen Derecho) del Ingreso Principal a la Sede de Vigilancia y Zona de Tratamiento.

Con fecha 29.12.2023, se continuaron los trabajos de Colocación de Acero de Refuerzo $Fy=4200$ kg/cm², el Encofrado Normal y el vaciado de Concreto Premezclado de $f'c=210$ kg/cm² cemento tipo I de las zapatas de los Sardinales Peraltados (Margen Izquierda) del área del Ingreso principal a las instalaciones de la Sede de Vigilancia y Zona de Tratamiento.

Con fecha 29.12.2023, se continuaron los trabajos de Vaciado de Concreto Premezclado de $f'c=210$ kg/cm² cemento tipo I de las zapatas de los Sardinales Peraltados (sardinel central) del área del Ingreso principal a las instalaciones de la Sede de Vigilancia y Zona de Tratamiento.

Con fecha 29.12.2023, se continuaron los trabajos de Demolición parcial de la parte superior de las cunetas triangulares existentes para el empalme y asentado de la Tapas de Concreto Prefabricado.

Con fecha 28.12.2023, se continuaron los trabajos de Colocación de Acero de Refuerzo $Fy=4200$ kg/cm² y el Encofrado Normal para las zapatas de los Dados para el asentado de las Tapas Prefabricadas de las cunetas existentes (Margen Izquierda) del Ingreso Vehicular.

Con fecha 28.12.2023, se continuaron los trabajos de Habilitación de Acero de Refuerzo $Fy=4200$ kg/cm² para las Tapas Prefabricadas de las cunetas triangulares existentes paralelas a la carretera principal.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexo: 00

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC: 2045027803

Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

GULLERMO BILIZPALOMINO
INGENIERO CIVIL
SR-67025

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 2045027803

Miguel Ángel Mendoza Huallaga
RESIDENTE DE OBRA
SR-67025



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II - JUAN GUERRA SAN MARTIN

Contractista: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C

Número de asiento: 780

Título: CONSTATAACION DE ACTIVIDADES

Fecha y Hora: 30/12/2023 15:24

Usuario: DIAZ PALOMINO, GUILLERMO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se constata la ejecución de actividades descritas en el Asiento de Cuaderno de Obra N° 758 y N° 759.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anejos: 00

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC: 20450278051

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 20450278051

Ing. Guillermo Diaz Palomino
INGENIERO EN LA ESPECIALIDAD DE
INGENIERIA CIVIL
CIP. 67045

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67045

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II - JUAN GUERRA SAN MARTIN

Contratista: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C

Número de asiento: 761

Título METRADOS CONCILIADOS - PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha y Hora 31/12/2023 20:58

Usuario: MENDOZA DEL AGUILA, JULIO CÉSAR

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: VALORIZACIONES Y METRADOS

Descripción: Al cierre del presente periodo de valorización, se verifican los trabajos ejecutados en campo y se procede a realizar la conciliación de los metrados ejecutados, conjuntamente con el Gerente de Obra para la obra "Construcción de la Sede para Vigilancia Sanitaria y Zona de Tratamiento tipo II - Juan Guerra, San Martín" de los Eventos Compensables N° 02 y 08, correspondiente al periodo del 21 al 31 de diciembre. En base a los metrados conciliados, se procederá a elaborar el Informe de Valorización de Obra N° 04 del Evento Compensable N° 02 y el Informe de Valorización de Obra N° 02 del Evento Compensable N° 08; se adjunta los metrados conciliados para cada valorización al presente asiento del cuaderno de obra digital.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 02

Val 02_Adicional08_Dic2023.pdf

Hash 256: c5ed5cb311d4773702f3d1b1fac8da13472b54efcb21e927b9625ccccc5466

Val 04_Adicional02_Dic2023.pdf

Hash 256: b883403cef84801aa78ae6f78dca378474b557edc406e31b3f2f227749e4b3a

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
R.U.C. 20450276051

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
R.U.C. 20450276051

Ing. Julio Mendoza del Aguila
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 67006

GULLERMO DIAZ BACOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67006

RESUMEN DE METRADOS - VALORIZACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 08

PERIODO DEL 21/12/2023 AL 31/12/2023

Evento: CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

Compensable N° 08

Contratista: COBH SAC

Residente: ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL ÁGUILA CIP N° 56199

Gerente de Obra: ING. GUILLERMO OÍAZ PALOMINO - EMPRESA FERUHUJA SAC

Subpresupuesto: VARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO VAL. ACTUAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.03	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO		
01.03.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	M2	493.23
01.04	SEGURIDAD Y SALUD		
01.04.01	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	UND	0.50
02	ESTRUCTURAS		
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.01	EXCAVACION MANUAL HASTA NIVEL DE CIMENTACION TERRENO NORMAL	M3	178.62
02.01.03	RELLENO CONTROLADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	410.28
02.01.04	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	214.58
02.01.05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	12.60
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.01	VEREDAS		
02.02.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE f'c=175 kg/cm ² EN VEREDAS. ACABADO SEMIPULIDO. INCL. BRUÑAS	M3	8.89
02.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	M2	10.78
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.01	SARDINELES DE CONCRETO		
02.03.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I EN SARDINELES REFORZADOS	M3	35.00
02.03.01.02	ACERO DE REFUERZO FY#4200 KG/CM2 EN SARDINELES REFORZADOS	KG	500.00
02.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES REFORZADOS	M2	140.00

Construtora Empresa de Ingeniería S.A.S.
RUC: 20150278053

Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

EMPRESA FERUHUJA S.A.S.
RUC: 20150278053

ING. GUILLERMO OÍAZ PALOMINO
CIP: 67086

GUILLERMO OÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 67086

RESUMEN DE METRADOS - VALORIZACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 08

PERIODO DEL 21/12/2023 AL 31/12/2023

Evento **CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LOS ACCESOS DE INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA Y OBRAS DE ARTE PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"**

Compensable N° 08

Contratista : COIRH SAC

Residente : ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL ÁGUILA CIP N° 56199

Gerente de Obra : ING. GUILLERMO DÍAZ PALOMINO - EMPRESA FERUMUJA SAC

Subpresupuesto : VARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO VAL. ACTUAL
02.03.03	DADO DE CIMENTACION PARA CUNETAS TRIANGULAR		
02.03.03.01	DADO DE CIMENTACION PARA CUNETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 1 ^a = 175 kg/cm ²	M3	38.80
02.03.03.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN DADOS	KG	1,338.40
02.03.03.03	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL EN DADOS	M2	177.34
02.04	PAVIMENTOS		
02.04.01	SUB BASE GRANULAR E=0.30 m CON EQUIPO	M2	70.18
02.05	VARIOS		
02.05.01	CURADO DE CONCRETO	M2	300.00

Constructora Inmobiliaria Río Huastiga S.A.
RUC: 2045027005

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR
RUC: 2045027005

ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL ÁGUILA
CIP N° 56199

GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67008



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II - JUAN GUERRA SAN MARTIN

Contratista: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C

Número de asiento: 762

Título AVANCE DE OBRA AL 30-12-2023

Fecha y Hora 02/01/2024 08:08

Usuario: MENDOZA DEL AGUILA, JULIO CÉSAR

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Con fecha 30.12.2023, se continuaron los trabajos de Resane de Estructuras, Repintado y acabados finales para los Sistemas Eléctricos, de Comunicaciones y Sanitarios.

ADICIONAL DE OBRA N° 08

Con fecha 30.12.2023, se continuaron los trabajos de Encofrado Normal y Excavación manual para las uñas de la Vareda Lateral (Margen Derecho) del Ingreso Principal a la Sede de Vigilancia y Zona de Tratamiento.

Con fecha 30.12.2023, se continuaron los trabajos de Vaciado de Concreto Premezclado de $f'c=210$ kg/cm² cemento tipo I de los muros de los Sardineros Peraltados (sardiner central) del área del ingreso principal a las Instalaciones de la Sede de Vigilancia y Zona de Tratamiento.

Con fecha 30.12.2023, se continuaron los trabajos de Demolición parcial de la parte superior de las cunetas triangulares existentes para el empalme y asentado de la Tapas de Concreto Prefabricado.


Con fecha 30.12.2023, se continuaron los trabajos de Colocación de Acero de Refuerzo $Fy=4200$ kg/cm², Encofrado Normal y el Vaciado de Concreto Premezclado de $f'c=210$ kg/cm² cemento tipo I de las zapatas de los Dadoes para el asentado de las Tapas Prefabricadas de las cunetas existentes (Margen Izquierda) del Ingreso Vehicular.

Con fecha 30.12.2023, se continuaron los trabajos de Habitación de Acero de Refuerzo $Fy=4200$ kg/cm² para las Tapas Prefabricadas de las cunetas triangulares existentes paralelas a la carretera principal.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


 Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC: 20150279051
 Abner Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL


 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 20150279051
 Guillermo Ortiz Palomino
 GERENTE GENERAL


 GUILLERMO ORTIZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 C.P. 67086



CONTROL DE CALIDAD – ENSAYOS


 Construcción Intersectorial Palomino S.A.C.
 RUC: 201502710017

Adolfo Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL



GUILLERMO GUZMÁN PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87085


 CONSTRUCCIÓN INTERSECTORIAL
 RUC: 201502710017

CONCEPCIÓN GUZMÁN PALOMINO
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 87085

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTÍN"



• ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LOS MUSEOS" S.A.S.
 RUC. 20140278051
 Abner Guzman Tejada
 DIRECTOR GENERAL


 COMISIÓN ORGANIZADORA DE INGESTA DE ALIMENTOS
 EN PASTILLAS S.A.S.
 RUC. 20140278051
 Mg. Julio César Guerrero del Aguila
 INGENIERO DE OBRA
 CIP. N° 56116


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67088

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"



PROYECTOS & SERVICIOS GENERALES J.R. SAC

Estudio de Suelos, Concreto, Asfalto (Edificaciones, Saneamiento, Carreteras, Electrificación),
Proyectos de Habilitación Urbana, Pasadizos, Alquiler de Equipos y Topografía.

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Tarapoto, 30 de Diciembre del 2023

CARTA N° 154-2023-TPP/PS.G./R.SAC.

SEÑORES:
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
PRESENTE.-

ASUNTO: **ENTREGA DE CERTIFICADOS**

Me es sumamente grato dirigirme a Uds. con la finalidad de hacerles llegar a su Despacho el Certificado de Densidad de Campo (Pruebas de Compactación), OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN".

Sin otro particular me suscribo de Ustedes.

Atestamento.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC. 20450278054
Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

PROYECTOS & SERVICIOS GENERALES J.R. SAC
Renan Yaminza Huazegui
GERENTE GENERAL

Gillermo Diaz Palomino
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC. 20450278054
[Signature]



PROYECTOS & SERVICIOS GENERALES J.R. SAC
 Estudio de Suelos, Concreto, Asfalto (Edificaciones, Saneamiento, Carreteras, Electrificación),
 Proyectos de Habilitación Urbana, Tasaciones, Alquiler de Equipos y Topografía.

DETERMINACION DE LA DENSIDAD EN EL CAMPO

Obras : CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA-SAN MARTÍN
Uso : Relleno
Fecha : Diciembre del 2023

DATOS DEL ENSAYO DE PROCTOR - PESO ESPECÍFICO					
DENSIDAD DE ARENA:	1.41	g/cc	MAJORA DENSIDAD SECA :	2.194	g/cc
P.E. DE GRAVA :	2.62	g/cc	HUMEDAD OPTIMA :	5.80	%
Fecha	30/12/2023				
Ubicación	Área de Acceso de Dirección Mg				
Huecos de Prueba N°	1	2			
1. Peso Suelo húmedo del hueco + d.	4830	4420			
2. Peso del Depósito	4	4			
3. Peso del suelo húmedo del hueco(1-2)	4826	4416			
4. Peso de la Arena + frasco	7342	7252			
5. Peso de Arena que queda en frasco	3032	3214			
6. Peso Arena hueco + arena peso cada	4310	4038			
7. Peso Arena del cono	1432	1432			
8. Peso Arena del hueco (6-7)	2878	2606			
9. Densidad de la Arena	1.41	1.41			
10. Volumen del hueco (8-9)	2041	1848			
11. Peso de grava secada al aire	1736	1820			
12. Peso Específico de grava	2.62	2.62			
13. Volumen grava por desplazamiento	663	695			
14. Peso del suelo (3 - 11)	3090	2596			
15. Volumen del suelo (10-13)	1378	1154			
16. Densidad húmeda (14 : 15)	2.242	2.250			
17. Humedad contenida del suelo	6.00	6.10			
18. Densidad seca (16)/(17)*100	2.115	2.121			
19. Méc. densidad determinada en curva	2.194	2.194			
20. Grado de Compactación (18:19)	96.36%	96.7%			

[Signature]
GUILERMO RIVERA PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67086

PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES J.R. SAC
 ROLANDO RIVERA PALOMINO
 TEC. LABORATORIO DE SUELOS
 CONCRETO Y ASFALTO

PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES J.R. SAC
 RUC. 20450278051
[Signature]
Amor Guzman Pejada
 TECNICO GENERAL

PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES J.R. SAC
 RUC. 20450278051
[Signature]
Ronald RIVERA PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 67.086



PROYECTOS & SERVICIOS GENERALES J.R. SAC

Estudio de Suelos, Concreto, Asfalto (Edificaciones, Saneamiento, Cameteras, Electrificación),
Proyectos de Habilitación Urbana, Trazamientos, Alquiler de Equipos y Topografía.

Panel Fotográfico




GUILERMO ORTIZ BALBOA
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

PROYECTOS & SERVICIOS GENERALES J.R. SAC
Rafael Ramírez Redegui
C.C. LABORATORIO DE SUELOS
CONCRETO Y ASFALTO


Rafael Ramírez Redegui
INGENIERO CIVIL
Reg. 225 N° 7349

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.
RUC. 20550278051

Abner Guzman Tejada
INGENIERO CIVIL

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.
RUC. 20550278051

INGENIERO CIVIL



INFORME DE VERIFICACIÓN
MC030 - IV - 2023

Metrología & Calibración
Laboratorio de Control

Página 2 de 2

8. Método de Verificación

La verificación se realizó tomando las medidas del instrumento a verificar, utilizando como referencia la norma internacional ASTM D1556-07 "Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by Sand-Cons Method."

9. Patrones de referencia

Table with 3 columns: Tracería, Patrón utilizado, Certificado de calibración. Includes items like 'Bloque patrón (Grado 0) LLA-200-2021 / INACAL-DM' and 'Pie de Rey 300 rpm con incertidumbre de medición de 10 um'.

10. Condiciones Ambientales

Table with 3 columns: Condición, Inicial, Final. Rows for 'Temperatura' and 'Humedad Relativa'.

Handwritten signature and blue circular stamp of METCAL S.A.C LABORATORIO PERU.

11. Resultados de Medición

Table with 4 columns: DIÁMETRO MENOR (mm), DIÁMETRO MAYOR (mm), ALTURA BASE-VALVULA (mm), VOLUMEN (cc). Values: 12,81, 105,70, 130,40, 1093,71.

Nota .- Se calculó el volumen por el método de medición lineal.

12. Observaciones

Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación de VERIFICADO

Handwritten signature and stamp of the control engineer.

Fin de Documento

Handwritten signature of Guzmán Tejada and printed name 'Guzmán Tejada'.



• ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CONCRETO

Construcción Tecnológica Rio Hualde S.A.S.
RUC. 2009122053

Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

GALLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 87086

CONSTRUCCION TECNOLÓGICA RÍO HUÁLDE S.A.S.
RUC. 2009122053

Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"



PROYECTOS & SERVICIOS GENERALES J.R. SAC

Estudio de Suelos, Concreto, Asfalto (Edificaciones, Saneamiento, Caméras, Electrificación),
Proyectos de Habilitación Urbana, Tasaciones, Alquiler de Equipos y Topografía.

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Tarapoto, 30 de Diciembre del 2023

CARTA N° 150-2023-TPP/PPS G.J.R. SAC.

**SEÑORES:
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
PRESENTE.**

ASUNTO: ENTREGA DE CERTIFICADOS

Me es sumamente grato dirigirme a Uds. con la finalidad de hacerles llegar a su Despacho el Certificado de Resistencia a la Compresión de Concreto $F_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$, OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTÍN".


Laboratorio se responsabiliza por la Roturas, muestras fueron tomadas por el Peticionario.

Sin otro particular me suscribo de Ustedes.

Atentamente.


GUILLENMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP 87086


Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC: 2075027805
Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL


PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES J.R. SAC
Ramon Ramirez Rodriguez
GERENTE GENERAL


CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 2075027805
Guillermo Diaz Palomino
INGENIERO CIVIL
CIP N° 87086



PROYECTOS & SERVICIOS GENERALES J.R. SAC

Estudio de Suelos, Concreto, Asfalto (Edificaciones, Saneamiento, Carreteras, Electrificación),
Proyectos de Habilitación Urbana, Tasaciones, Alquiler de Equipos y Topografía.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO.

Obras : "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO
TIPO H JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

N° PROB	FECHA		EDAD Días	Estructura Elemento	ASENT Cm.	Tipo de Concreto : 210 Kg/cm ² .				
	Moldado	Rotura				V cm ³	AREA cm ²	CARGA Dial	RESISTENCIA Kg/cm ²	%
1	22/12/2023	29/12/2023	7	Zapata Sardinel Carril de Desaceleracion		15.20	181.50	27153	149.6	71.24
1	22/12/2023	29/12/2023	7	Zapata Dado Carril de Aceleracion		15.20	181.50	26590	146.5	69.76
1	23/12/2023	30/12/2023	7	Muro Sardinel Carril de Desaceleracion		15.20	181.50	26863	148.0	70.48

PROYECTOS & SERVICIOS GENERALES J.R. SAC.
Ronal Ramírez Rosado
INGENIERO CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS
CONCRETO Y ASFALTO

GUILLELMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67006

Ronal Ramírez Rosado
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 73439

Constructora Informativa S. de Ingeniería S.A.C.
RUC. 20450278051

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INFORMATIVA S. DE INGENIERIA S.A.C.
RUC. 20450278051

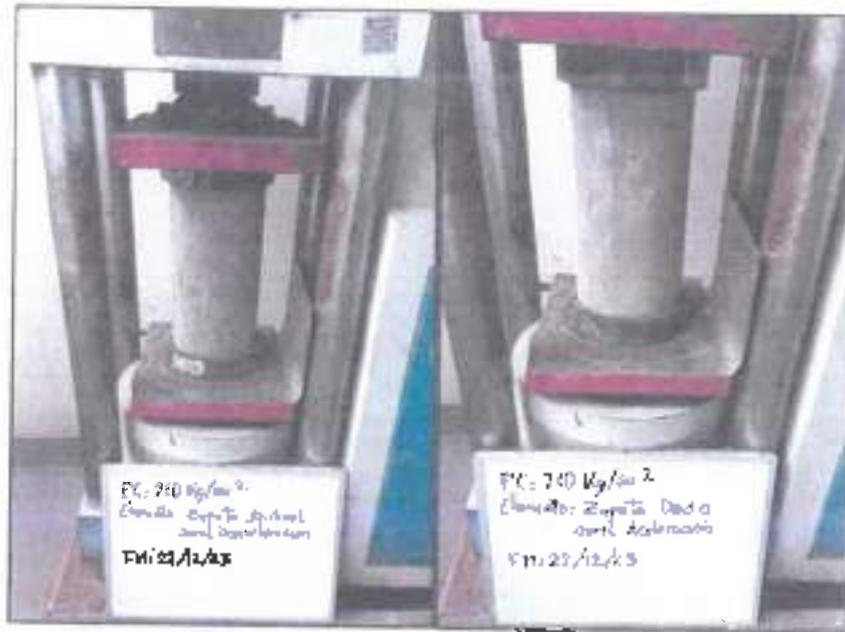
CONSTRUCTORA INFORMATIVA S. DE INGENIERIA S.A.C.
RUC. 20450278051



PROYECTOS & SERVICIOS GENERALES J.R. SAC

Estudio de Suelos, Concreto, Asfalto (Edificaciones, Saneamiento, Carreteras, Electrificación),
Proyectos de Habilitación Urbana, Tasaclones, Alquiler de Equipos y Topografía.

Panel Fotográfico



[Signature]
GUILLEMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 67086

[Signature]
CASA INGENIERIA INNOVACION
S.R.L.
RUC: 2050278051
INGENIERO CIVIL
CIP: 52149

CONSTRUCCIONES INNOVACION S.R.L.
RUC: 2050278051

[Signature]
Abel Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

PROYECTOS & SERVICIOS GENERALES J.R. SAC
Renán Ramírez Rodríguez
TEC. LABORATORIO DE SUELOS
CONCRETO Y ASFALTO

[Signature]
Renán Ramírez Rodríguez
INGENIERO CIVIL
RUC: 2050278051



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
MC014 - F - 2023

Metrología & calibración
Laboratorio de Fuerza

Página 1 de 3

1. Expediente:	230022
2. Solicitante:	PROYECTOS & SERVICIOS GERALES J.R S.A.C.
3. Dirección:	Av. Circunvalacion Nro 2332 Tarapoto - SAN MARTIN
4. Equipo:	PRESNA DE CONCRETO
Capacidad:	2000 KN
Marca:	A&A INSTRUMENTS
Modelo:	STVE-2000
Número de Serie:	130711
Procedencia:	CHINA
Identificación:	NO INDICA (*)
Indicación:	DIGITAL
Marca:	MC
Modelo:	LM-02
Número de Serie:	NO INDICA
Resolución:	0,01 / 0,1 KN (*)
Ubicación:	LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO - PROYECTOS & SERVICIOS GERALES J.R S.A.C.
5. Fecha de Calibración:	2023-02-22
6. Fecha de Emisión:	2023-02-28

Este certificado de calibración documenta la conformidad a los patrones nacionales o internacionales, que realicen las unidades de la medición de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o el reglamento vigente.

METROLOGÍA & CALIBRACIÓN S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que puede ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente en la impresión, por escrito del laboratorio que lo emite.

El certificado de calibración sin firma y sello carece de validez.

GUILERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 67066

Sello



Firmado digitalmente por
Angel Perez
Fecha: 2023.02.25
10:46:00 -05'00'

Jefe del Laboratorio
Consultores Ingeniería Río Huancayo S.A.C.
RUC: 20150278851

Angel Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

METROLOGÍA & CALIBRACIÓN S.A.C
Cra. Puyallup 558B - Lima Centro - Perú
Tel.: 998 700 9211; 912 480 374

CONSULTORES INGENIERIA RIO HUANCAYO S.A.C.
RUC: 20150278851

Guillermo Diaz Palomino
INGENIERO CIVIL
CIP: 67066

OTRO: VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE CALIBRACIÓN

OTRO: VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MC014 - F - 2023

Metrología & calibración Laboratorio de Fuerzas

Página 2 de 2

7. Método de Calibración

La calibración se realizó por el método de comparación directa utilizando patrones trazables al SI calibrados en las instalaciones del LEMA-PUCP tomando como referencia el método descrito en la norma UNE-EN ISO 7500-1 "Verificación de máquinas de ensayo universales Estático Parte 1. Máquinas de ensayo de tracción-compresión. Verificación y calibración del sistema de medida de fuerza." - Julio 2006.

8. Lugar de calibración

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO - PROYECTOS & SERVICIOS GENERALES J R S.A.C. Av. Circunvalación Nro. 2332 Tarma - SAN MARÍN

9. Condiciones Ambientales

Table with 3 columns: Parameter, Initial, Final. Rows: Temperatura (17,5 °C), Humedad Relativa (50 % HR).



10. Patrones de referencia

Table with 3 columns: Trazabilidad, Patrón utilizado, Informes/Certificados de calibración. Row: Celdas patrón calibradas en HOTTINGER BALDWIN MEBBTECHNIK GmbH - Alemania.

11. Observaciones

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación CALIBRADO.
- Durante la realización de cada secuencia de calibración la temperatura del equipo de medición fuerza permanece estable dentro de un intervalo de ± 2,0 °C
- El equipo no indica clase aun embargo cumple con el criterio para máquinas de ensayo universales de clase de 1,0 según la norma UNE-EN ISO 7500-1.
- (*) La resolución del indicador es 0,01 kN para lecturas menores a 1N y 0,1 kN para lecturas fuera de este rango.

GULLERMO GUILFALONDO INGENIERO CIVIL

Constructora Inmobiliar y Almacén S.A.C. RUC: 20190278053
Ibarr Guzman Tejada GERENTE GENERAL

INGENIERO CIVIL GULLERMO GUILFALONDO RUC: 20190278053



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
MC014 - F - 2023

Metrología & calibración
Laboratorio de Fuerza

Página 3 de 3

12. Resultados de Medición

Indicación del Equipo		Indicación de Fuerza (Ascenso) Patrón de Referencia			
%	F ₁ (kN)	F ₁ (kN)	F ₂ (kN)	F ₂ (kN)	F _{Indicada} (kN)
10	100,0	88,8	99,9	100,0	88,8
20	200,0	198,7	199,8	198,8	198,8
30	300,0	299,8	299,9	299,8	299,8
40	400,0	398,8	399,8	399,8	398,8
50	500,0	498,8	499,9	498,8	498,8
60	600,0	599,7	599,8	599,7	599,7
70	700,0	698,7	699,8	698,7	698,8
80	800,0	798,8	799,8	798,8	798,8
90	900,0	898,8	899,8	898,8	898,8
100	1000,0	998,9	1000,0	1000,0	1000,0
Relativo a Cero		0,0	0,0	0,0	

Indicación del Equipo F (kN)	Errores Encontrados en el Sistema de Medición				Incertidumbre U (k=2) (%)
	Exactitud e (%)	Repetibilidad r (%)	Reversibilidad v (%)	Rand. Relativa a (%)	
100,0	0,06	0,08	—	0,01	0,18
200,0	0,11	0,04	—	0,01	0,16
300,0	0,08	0,01	—	0,00	0,18
400,0	0,04	0,02	—	0,00	0,16
500,0	0,03	0,02	—	0,00	0,16
600,0	0,05	0,02	—	0,00	0,18
700,0	0,03	0,02	—	0,00	0,18
800,0	0,02	0,01	—	0,00	0,16
900,0	0,01	0,01	—	0,00	0,18
1000,0	0,00	0,02	—	0,00	0,18

MÁXIMO ERROR RELATIVO DE CERO (e) 0,00 %



13. Incertidumbre

La incertidumbre expandida de medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura k=2, el cual corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95%. La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo.

Comercio e Inmobiliaria Boinvalaga S.A.C.
RUC: 7015027805

Abner Guzman Tejeda
GERENTE GENERAL

Gullermo Diaz Palomino
INGENIERO CIVIL
CIP: 67986



PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONTRUCCIÓN (CAR)

Construcción Inmobiliaria Rio Huayanga S.A.C.
RUC: 20150278021

[Signature]
Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION INMOBILIARIA RIO HUAYANGA S.A.C.
RUC: 20150278021

ING. GUILLERMO DIAZ PALCHINO
MEMBRADO DE OBRA
CIP: 67066

[Signature]
GUILLERMO DIAZ PALCHINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67066

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTÍN"



MAPFRE

CAPITAL SOCIAL S/ 501,949,792

PAG: 1

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 20418896915
Direccion: Av. Armendáriz N° 345, Miraflores -Telefono: 213-3333

**SUPLEMENTO DE
CONSTRUCCION**

POLIZA 2302210800136	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 15/12/2023 12:00 Hrs.	HASTA 15/01/2024 12:00 Hrs.

CODIGO SBS: RG0743110039

Adecuado a la Ley N° 29946 y sus normas reglamentarias.

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO	N° MOV.	F. EMISION	VIGENCIA DE POLIZA	FORMA DE PAGO	%PARTICIP.	RIESGOS	MONEDA
Renovacion 5		26/12/2023	15/12/2023 - 15/01/2024	Imeo	100 %	I	S/

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.	RUC 20450278051
DIRECCION Circunvalación Nro 2283 Tarapoto	
EMAIL recursoshumanos@grupocumbaza.com.pe	TELEFONO 998917473
ACTIVIDAD ECONOMICA Construcción De Edificios	

DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS

NOMBRE Arso Corredores De Seguros Sa	NOMBRE
CODIGO SBS : 30395	CODIGO SBS :
CODIGO INTERNO : 1305	CODIGO INTERNO : GUILLELMO DIAZ PALOMINO INGENIERO CIVIL C.P. 87086
IMPORTE DE LA COMISION	485.06

Los cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores, contratación de promotores, comercializadores y bancaseguros podrán considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en función al cumplimiento de metas de producción y resultados.

DATOS DE COBRO

DIRECCION DE COBRO Avda. Circunvalación Nro 2283 Tarapoto San Martin San Martin	Construcción Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C. RUC: 20450278051
COBRADOR Maria Elizabeth Gamarra Lopez	 Abner Guzmán Tejeda GERENTE GENERAL

PRIMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
Prima Comercial	2,498.02
Prima Comercial + I.G.V.	2,947.66

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 20450278051

INGENIERO CIVIL
C.P. 87086



POLIZA	COLECTIVO	
2302210800136		
VIGENCIA DESDE	HASTA	
15/12/2023 12:00 Hrs.	15/01/2024 12:00 Hrs.	

Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podrán formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificación en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observación, se tendrá por aceptada la póliza emitida.


En caso el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptación se presume solo cuando LA COMPAÑÍA advierta al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas.

Se adjuntan Cláusulas Generales de Contratación CGCRRGG01122013 y Condiciones Generales de la póliza: CGRC01122013

que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de seguros del que son parte integrante y no tienen valor por separado.

DATOS PERSONALES:

El contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la emisión de la póliza, así como la actualización y cesión de los mismos para los fines detallados en el Artículo 23 de las Cláusulas Generales de Contratación cuyo texto declara conocer en su integridad,


 Construcciones Inpa Inpa S.A.C.
 RUC: 2045027803

 Abner Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL


 CONSTRUCCIONES INPA INPA S.A.C.
 RUC: 2045027803

 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CAP. 67065


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CAP. 67065



MAPFRE

POLIZA 2302210800136	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 15/12/2023 12:00 Hrs.	HASTA 15/01/2024 12:00 Hrs.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, desavenencia o reclamación relacionada o derivada del contrato de seguro, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, será resuelta por los jueces y tribunales de la ciudad de Lima o del lugar donde domicilia el CONTRATANTE, ASEGURADO O BENEFICIARIO, según corresponda de acuerdo a Ley. Adicionalmente las partes, una vez producido el siniestro, cuando se trate de controversias referidas al monto reclamado, podrán convenir el sometimiento a la jurisdicción arbitral siempre y cuando las diferencias superen los límites económicos por tramos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Sin perjuicio de lo antes indicado, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO podrán presentar su reclamo ante la Defensoría del Asegurado; su denuncia o reclamo según corresponda, ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, entre otros según corresponda.

COMUNICACIONES

Las partes acuerdan como mecanismo de comunicación entre LA COMPAÑIA y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, el domicilio físico, electrónico y/o telefónico, a las direcciones y números telefónicos que aparecen en las presentes condiciones particulares.

Las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa. En este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.

Los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se consideran abonados a la empresa en la fecha de realización del pago. Asimismo, la empresa debe prever que el comercializador lleve el control de dichos pagos.

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Consorcio Inmobiliaria Río Huallaga S.A.C.
RUC: 20150278051

Abner Guzmán Trujada
ASEGURADO

GENERADO POR : KATTYAL

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67006

CONSORCIO INMOBILIARIA RÍO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 20150278051



MAPFRE

Miraflores, 27 de Diciembre del 2023

Señor(a)(rtá)(es):

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.

RUC 20450278051

Avda. Circunvalacion Nro 2283 Tarapoto San Martín San Martín

Moneda: S/

Corredor 1305 Arsa Corredores De Seguros Sa

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En la columna "Fecha de Obligación de Pago" se indica el día establecido para el pago de cada uno de los recibos. La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.
- b) Transcurridos 30 días calendario, contados desde la "Fecha de Obligación de Pago", si la prima se mantiene impaga; la cobertura del seguro podrá suspenderse, lo cual podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
2302210800136	5	2,498.02		449.64	2,947.66
					2,947.66

CRONOGRAMA DE PAGO				
NRO. RECIBO	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE OBLIGACIÓN DE PAGO	SITUACIÓN DE RECIBO
147419849	SOLES	2,947.66	15/12/2023	PENDIENTE

TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %

GUILHERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 87088

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC. 20450278051

Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

- Ingresando en la WEB de su banco
- En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza
- Afiliándose al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express
- Para pagos en agentes, indicar los siguientes códigos. BCP (Código 01866), BBVA (Código 206), SCOTIABANK (Código 102), INTERBANK (Código 0200204)

BBVA
 BCP
 SCOTIABANK
 INTERBANK
 BIF

Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfre.com.pe/oim-clientes

D091010 - 0501



MAPFRE

Miraflores , 27 de Diciembre del 2023

Señor(a)(rta)(es):

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A. C.

RUC: 20450278051

Avda. Circunvalacion Nro 2283 Tarapoto San Martin San Martin

Moneda: S/

Corredor: 1305 Arsa Corredores De Seguros Sa

Atentamente ,

LAURA ARBOLEDA MORALES
DIRECTOR UNIDAD DE GENERALES

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC: 20450278051

Abdo Guzman Triada
CLIENTE ACEPTADO

CONSTRUCION INMOBILIARIA
RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 20450278051

.....
Abdo Guzman Triada
CLIENTE ACEPTADO

Guillermo Diaz Palomino
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
NIP: 57008



**RESUMEN:
SUPLEMENTO DE
CONSTRUCCION**

El siguiente texto es un resumen informativo de las Condiciones Generales del riesgo contratado.
Las condiciones aplicables a cada póliza serán las detalladas en las Condiciones Particulares correspondientes.

1. RIESGOS CUBIERTOS

Las coberturas y sus alcances están descritas en el Artículo 1º, 2º y 3º del Condicionado del Seguro contra todo riesgo para contratistas.

2. EXCLUSIONES

Las exclusiones están descritas en el Artículo 4º del Condicionado del Seguro de Seguro contra todo riesgo para contratistas.

Construtora Perifoneira Permutado S.A.S.
RUC: 20410278051

3. LUGAR Y FORMA DE PAGO

Ingresando a la página web de los siguientes bancos: Banco de Crédito, Banco Continental, Scotiabank, Interbank, Banco Falabella y Banco Interamericano de Finanzas.

Abner Guzmán Tejeda

Acercándose a cualquiera de los siguientes bancos: Banco de Crédito, Banco Continental, Scotiabank, Interbank, Banco de la Nación, Banco Falabella y Banco Interamericano de Finanzas, indicando el número de DNI, RUC o Carnet de Extranjería del contratante de la póliza.

Afiliándose al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito Mastercard, Visa, Diners, y American Express.

En cualquiera de nuestras oficinas ubicadas en Lima y provincias, detalladas en nuestra página web: <http://www.mapfre.com.pe/contactanos>.

4. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Según lo establecido en el numeral 8.1 del Artículo 8, y 9.1, 9.2 y 9.3 del Artículo 9º de las Cláusulas Generales de Contratación.

GUILHERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 8788

5. DERECHO DE ARREPENTIMIENTO

Según lo establecido en el numeral 9.3 del Artículo 9º de las Cláusulas Generales de Contratación.

6. VIGENCIA DEL SEGURO

Inicia el 15/12/2023 a las 12:00 hrs. y finaliza el 15/01/2024 a las 12:00 hrs.

7. MONTO DE LA PRIMA

Moneda: S/ Prima Comercial: 2,498.02

CONSEJO REGULADOR DE SEGUROS
RUC: 20410278051

8. PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD

Según lo establecido en el Artículo 11º, de las Condiciones Generales del Seguro contra todo riesgo para contratistas. Además de lo detallado en el Artículo 10º de las Cláusulas Generales de Contratación.

9. MEDIO Y PLAZO PARA EL AVISO DEL SINIESTRO

Comunicarse de inmediato con nuestro servicio de Atención al Cliente 24 Horas al teléfono 213-3333 (Lima) y 0801-1-1133 (provincia) o al WhatsApp 999-919-133. El asegurado o contratante deberán regularizar dicho aviso dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes, mediante declaración escrita y veraz, debiendo presentar copia certificada de la denuncia policial correspondiente.

0001677

10. LUGARES PARA SOLICITAR LA COBERTURA DEL SEGURO

1. Unidad de Riesgos Generales.
Área de Siniestros Av. Armendáriz N° 345, Miraflores

2. Oficinas de LA COMPAÑÍA ubicadas en Lima y provincias, detalladas en nuestra página web:
<http://www.mapfre.com.pe/contactanos>

11. MEDIOS HABILITADOS POR LA EMPRESA PARA PRESENTAR

Los usuarios y/o consumidores, entendiéndose estos como la persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta de los productos o servicios ofrecidos por el Grupo MAPFRE PERÚ; así como, los no asegurados, podrán presentar consultas, reclamos y/o quejas a las Compañías precitadas en los siguientes canales:

Consultas

Carta dirigida al Presidente del Grupo MAPFRE PERÚ (en papel membretado en caso de ser persona jurídica), indicando: tipo de solicitante, nombre completo, documento de identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, número de póliza, número de siniestro de ser el caso, nombre del producto/servicio afectado, una breve explicación clara y precisa de la consulta. A través de la página web de MAPFRE PERÚ, enlazándose al link de "Contáctenos" (Central de Consultas).

Reclamos y/o quejas

Carta dirigida al Presidente del Grupo MAPFRE PERÚ (en papel membretado en caso de ser persona jurídica), indicando: tipo de solicitante, nombre completo, documento de identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, número de póliza, número de siniestro de ser el caso, nombre del producto/servicio afectado, una breve explicación clara y precisa del hecho reclamado y documentos que adjunta, "Libro de Reclamaciones Virtual", que estará al alcance del consumidor o usuario, siendo asesorado por una Ejecutiva de Atención al Cliente en las oficinas a nivel nacional de las compañías precitadas. Podrá adjuntar, de ser el caso, documentos que sustenten su reclamo y/o queja. A través de la página web de MAPFRE PERÚ, enlazándose al link de "Libro de Reclamaciones" (Reclamos y/o Quejas)

12. INSTANCIAS HABILITADAS PARA PRESENTAR RECLAMOS

1. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (solo denuncias)
Departamento de Servicios al Ciudadano
Lima: Av. Dos de Mayo N° 1475, San Isidro
A nivel nacional se cuentan con otras oficinas de la SBS
Teléfonos: 0800-10840 | 630-9000
www.sbs.gob.pe

CONSTRUCIONES INMOBILIARIAS RIO NEGRAS S.A.C.
RUC: 20450278051

Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

2. INDECOPI
Calle de la Prosa N° 104, San Borja
Teléfonos: 224-7777 (Lima) o 0800-4-4040 (provincias)
www.indecopi.gob.pe

3. Defensoría del Asegurado
Calle Anjador Merino Reyna N° 307, piso 9 San Isidro, Lima, Perú
Telefax: 421-0614
www.defasag.com.pe

CONSTRUCIONES INMOBILIARIAS RIO NEGRAS S.A.C.
RUC: 20450278051

CIP: 17.46.189


GUILLERMO DIAS PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 67086

13. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todo litigio, controversia, desavenencia o reclamación resultante, relacionada o derivada de este acto jurídico o que guarde relación con él, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, incluso las del convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho, cuando los daños o pérdidas reclamadas a LA COMPANÍA sean iguales o superiores a 20 UIT, o a los límites económicos vigentes que hubiere fijado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

El tribunal arbitral estará conformado por tres árbitros los cuales deberán ser abogados con no menos de cinco años de reconocida experiencia en materia de seguros. El laudo será definitivo e inapelable, de conformidad con los reglamentos arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. Los costos y gastos de arbitraje serán de cargo de la parte vencida. El laudo arbitral podrá ser revisado por el Poder Judicial, con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente.

En caso el monto reclamado por EL ASEGURADO no excediera los límites económicos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, este podrá acudir a la vía judicial.

NOTA IMPORTANTE:

Las Condiciones Especiales del contrato prevalecen sobre las Condiciones Generales y Particulares.

Construcción Remolca y Bv. Huallata S.A.C.
RUC: 20450178021

Abn. Guzmán Tejada
DEPENTE EMERRE

COMPAÑIA DE SEGUROS LA AVIA S.A.
RUC: 20450178021

Ing. Hugo Víctor Rodríguez del Aguila
INGENIERO DE CAMERA
CIP: 46190

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 67088



PÓLIZA		COLECTIVO	SUFICIENCIA
230221080013B			5
VIGENCIA DESDE		HASTA	APLICACION
15/12/2023 12:00 Hrs.		15/01/2024 12:00 Hrs.	0

CÓNDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

Contratante	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
Asegurados	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C. y/o Contratistas y/o Subcontratistas de cualquier nivel y/o Arquitectos y/o Ingenieros y/o Proveedores y/o funcionarios y/o dependientes, en relación con la ejecución del Contrato y las obras en el lugar del proyecto y/o Entidades Financiadoras cuando así se requiera.
Tipo de Póliza	Todo Riesgo Construcción CAR
Obras a Ejecutar y Lugar de la Obra	<p>"CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTIN".</p> <p>Construcción de catorce (14) bloques de concreto armado (trece de 1 nivel y uno de tres niveles)</p> <p>Área: 10,269.44m²</p> <p>Departamento: San Martín Provincia: San Martín Distrito: Juan Guerra Sector: Estación experimental Agraria el Provenir</p>
Periodo de la Obra	<p>365 días</p> <p>No obstante, el periodo de vigencia de cobertura arriba definido, se acuerda que la misma se extenderá durante todo el tiempo de ejecución de obra, incluyendo paralizaciones, demoras, huelgas, prórrogas durante el plazo de ejecución del Proyecto</p>
Moneda	S/. Soles



 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67086

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC. 20150278057

 Abn. Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC. 20150278057

 Inc. Insa C.A. - Insa - Oficina de Seguros
 de Río de la Plata S.A.
 CIP. 67.102



POLIZA		COLECTIVO	SUPLEMENTO
23D2210900138			5
VIGENCIA DESDE		HASTA	APLICACION
15/12/2023 12:00 Hrs.		15/01/2024 12:00 Hrs.	0

Valor del Contrato S/. 14,500,000

CONDICIONES PARTICULARES

Sección 1: Daño Material

COBERTURAS	SUMAS ASEGURADAS Por evento	DEDUCIBLES
Cobertura A - Principal	S/. 14,500,000	10% monto indemnizable, mínimo S/. 10,000
Cobertura B - Terremoto	S/. 14,500,000	10% monto indemnizable, mínimo S/. 20,000
Cobertura C - Lluvia e Inundación	S/. 14,500,000	<p>Para siniestros en los meses de: Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y/o Abril:</p> <p>20% del monto indemnizable, mínimo 2% del valor de la obra al momento del siniestro o S/300,000 el que resulte mayor.</p> <p>Para siniestros en los meses de: Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y/o Noviembre:</p> <p>15% del monto indemnizable, mínimo 1% del valor de la obra al momento del siniestro o S/150,000 el que resulte mayor.</p>
Cobertura D - Mantenimiento amplio 12 meses "E" y "F"	S/. 14,500,000 S/ 3,500,000	10% monto indemnizable, mínimo S/. 16,000 10% del monto


GUILHERMO PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87084


 Constructora Inmobiliaria Rio Tinto S.A.C.
 R.I.C. 20450278051
Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RÍO TINTO S.A.C.
 R.I.C. 20450278051



POLIZA 2302210800138	COLECTIVO	IMPORTE 5
VIGENCIA DESDE 15/12/2023 12:00 Hrs.	HASTA 15/01/2024 12:00 Hrs.	APLICACION 0

Responsabilidad Civil incluyendo Responsabilidad Civil Cruzada	(Por evento/vigencia)	indemnizable, mínimo S/. 10,000
Cobertura G - Remoción de Escombros	S/. 2,900,000	El del riesgo afectado
Huelga, Motín y Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo	S/. 14,500,000 por evento y en el agregado vigencia	15% monto indemnizable, mínimo S/. 20,000
Riesgo de Diseño Endoso 115	S/10,875,000.00	15% monto indemnizable, mínimo S/. 15,000
Riesgo de Diseño LEG 3	S/. 2,000,000.00	10% monto indemnizable, mínimo S/. 15,000
Gastos Extraordinarios (Horas extras, trabajos nocturnos, trabajos en días feriados y fiesta expreso). Incluyendo honorarios profesionales	S/. 1,000,000.00	El de la cobertura afectada
Flete aéreo	S/. 1,000,000.00	El de la cobertura afectada
Propiedad adyacente (OPA)- Daños a propiedades que estén bajo responsabilidad del Asegurado (no de terceros)	S/. 4,000,000.00	10% monto indemnizable, mínimo S/. 7,500
Vibración y Debilitamiento de Bases	S/. 4,000,000.00	10% monto indemnizable, mínimo S/. 7,500
Bienes almacenados fuera del sitio de la obra	S/. 1,200,000.00	10% monto indemnizable, mínimo S/. 7,500
Campamentos y almacenes de materiales de construcción	S/. 1,200,000.00	10% del monto indemnizable, mínimo S/. 7,500
Transporte Nacional (solo para suministros locales)	S/. 1,200,000.00	10% del monto indemnizable, mínimo S/. 5,000
Subsuelos y masas de tierra	10% de daño material, máximo S/.	10% monto indemnizable, mínimo S/.


GUILLERMO TRÁZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 C.P. 67088


 Constructora Inmobiliaria Ric Huérfano S.A.C.
 RUC: 20450270057
Abel Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL


 CONSEJO DE INGENIERIA
 NO REGISTRADO
 NÚM. 20196278013



POLIZA	COLECTIVO	IMPORTE
2302210800136		\$
VEHICULO DESDE	HASTA	APLICACION
15/12/2023 12:00 Hrs.	15/01/2024 12:00 Hrs.	0

	2,500,000.00	20,000
--	--------------	--------

Sección 2: Responsabilidad hacia Terceros

Construcción Inmobiliaria Huasteca S.A.C.
RUC: 20050270051

[Handwritten Signature]

Abner Guzman Tejeda
PERITO SEÑOR

CONSTRUCCION INMOBILIARIA
RUC: 20050270051

[Handwritten Signature]

Abner Guzman Tejeda
PERITO SEÑOR



GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 47086



POLIZA	COLECTIVO	SUPERVENIO
2302210800136		5
VENIDA COME	HASTA	APURACION
15/12/2023 12:00 Hrs.	15/01/2024 12:00 Hrs.	0

CONDICIONADOS Y CLAUSULAS

-

Sección 1: Daño Material

- Cláusulas Generales de Contratación
 - Condicionado General contra Todo Riesgo para Contratistas (CAR)
 - Huelga, Motín y Comociones Civiles
 - Terrorismo
 - Condiciones Especiales concernientes al Cronograma de Construcción y/o Montaje (12 semanas)
 - Gastos Extraordinarios (Horas extras, trabajos nocturnos, trabajos en días feriados y flete expreso)
 - Flete aéreo
 - Cables y tuberías subterráneas
 - Estructuras en Zonas Sísmicas
 - Campamento y Almacenes de Materiales de Construcción:
- Obligación relativa al Almacenaje de materiales de construcción**
- Medidas de Seguridad contra Precipitación, Avenida e Inundación (Periodo de Recurrencia: 20 años)
 - Cobertura de obras civiles existentes y/o propiedades adyacentes
 - Riesgo de diseño endoso 115 y LEG3
 - Mantenimiento amplio (12 meses)
 - Equipos Extinguidores de Incendio
 - Vibraciones, eliminación o debilitamiento de elementos portantes
 - Evento Sísmico - 72 horas
 - Bienes Almacenados fuera del sitio de la obra
 - Transporte Nacional (solo suministros locales)
- Medidas de Seguridad contra Precipitación, Avenida e Inundación. La Compañía de Seguros solo indemnizará los siniestros de lluvia y/o inundación y/o precipitación y/o avenida en caso el asegurado demuestre que las lluvias que dieron origen al siniestro, superaron en el sitio de la obra el nivel máximo de lluvias ocurridas en los últimos 20 años.**


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67086


 CONSTRUCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.
 RUC: 201250278051

Abra Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL

Sección 2: Responsabilidad hacia Terceros

- Responsabilidad Civil Cruzada


 CONSTRUCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.
 RUC: 201250278051

Abraham Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL

Cláusula - Sub Suelos y Masas de Tierra

Sujeto a los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones contenidas en la póliza u cualquier otro endoso, el asegurador indemnizará al asegurado los gastos adicionales debido al reemplazo y/o consolidación del sub suelo y/o masas de tierra y/o superficies y/o cortes y/o estabilización de taludes del trazo del proyecto que sean necesarios de incurrir luego de la ocurrencia de un siniestro cubierto bajo esta póliza.

Límite

El límite asegurado establecido para esta cobertura es 10% del monto del siniestro, máximo \$ 2,500,000 y constituyen un límite agregado para la vigencia del seguro



POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2302210800136		5
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
15/12/2023 12:00 Hrs	15/01/2024 12:00 Hrs.	0

El costo unitario de la sección de la vía afectada se establecerá de acuerdo al presupuesto de construcción y/o valorización del proyecto.

Asimismo, los aseguradores indemnizarán al asegurado sólo aquellas pérdidas o daños que surjan de la caída de los taludes siempre y cuando se hayan tomado las medidas de seguridad adecuadas en el diseño y ejecución de la protección del talud en todo momento durante el período de este seguro. Para los efectos de esta cláusula las medidas de seguridad adecuadas significará que se cumplan con los siguientes requerimientos:

- 1) protección de la superficie del talud contra erosión causada por la precipitación y/o inundación
- 2) drenaje y/o estabilización del subsuelo con relación a precipitaciones y/o inundación
- 3) remoción de árboles dentro o alrededor del lugar del proyecto.
- 4) Medidas que sean o se están convirtiendo necesarias para la mejora o la estabilización de las condiciones del subsuelo para impermeabilizar la entrada y salida del agua.

Deducible

El monto indemnizable que corresponda según el alcance de cobertura otorgada por esta cláusula está sujeta a la aplicación del deducible establecido en las Condiciones Particulares.

Cláusula - LEG 3

El(Los) Asegurador(es) no tendrá(n) la obligación de indemnizar:

Construcción y Mantenimiento Aduales S.A.C.
RUC. 20140278051

Abner Guzman Tejada
EN FRENTE AL SEÑOR

Los costes en los que sea necesario incurrir como consecuencia de defectos de material, proceso de fabricación, diseño, plano o especificación. En caso de daño en cualquier parte de los bienes asegurados que padeciesen cualquiera de dichos defectos, los costes en los que sea necesario incurrir para la reposición o rectificación que se excluyen en virtud de la presente cláusula son aquellos costes en los que se incurriera para la realización de mejoras en el material, el proceso de fabricación, el diseño, los planos o las especificaciones originales.

A efectos de la Póliza y no únicamente de la presente exclusión, se entiende y se acuerda que cualquier parte de los Bienes Asegurados no se considerará dañada tan solo por el hecho de la existencia de cualquier defecto de material, proceso de fabricación, diseño, plano o especificación.

OTRAS CONDICIONES Y CLÁUSULA APLICABLES

Reconstrucción de documentos, planos, modelos hasta S/. 100,000.

GUILLERMIO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 87086

CONTRATACION DE INGENIERIA
MO. 00000000000000000000
RUC. 20000278051

CONDICIONES ESPECIALES

Las Condiciones Generales, Particulares, Cláusulas y demás términos de la presente cotización se sujetan a las condiciones especiales que se detallan a continuación y que forman parte integrante de la póliza:

- a. En caso de la ocurrencia de un siniestro, la indemnización deberá considerar la utilidad y gastos generales del proyecto, incluyendo servicios administrativos y de la oficina central en conexión con la reparación, rehabilitación o reemplazo de la propiedad asegurada, los cuales se encuentran incluidos en la Suma



PÓLIZA		COLECTIVO	SUPERVENIO
2302210600138			6
VIGENCIA DESDE		HASTA	IMPUGNACION
15/12/2023 12:00 Hrs.		15/01/2024 12:00 Hrs.	0

Asegurada, más allá de su exteriorización o no en los documentos contractuales

- b. De ocurrir un siniestro, se indemnizará de acuerdo a los precios unitarios que genere el presupuesto de reparación, o sea el costo real de reposición de las obras. Los precios unitarios presupuestados al inicio de la obra serán referenciales.
- c. La póliza ampara los gastos incurridos para la demostración y sustento de la cobertura del siniestro hasta \$/. 50,000 por evento. Se excluyen peritos.
- d. Bajo la cobertura, otras propiedades existentes también están cubiertos los bienes de terceros que se encuentren bajo custodia y/o control del Asegurado y bienes dañados en locales de terceros donde el asegurado esté efectuando trabajos.
- e. Si en un solo evento se activarán varias coberturas, sólo se tomará el deducible mayor
- f. Están cubiertos los costos y gastos para efectuar trabajos de defensa y prevención, con el fin de evitar la ocurrencia de un daño que afecte los bienes asegurados, así como los gastos necesarios para la reconstrucción y rehabilitación de la obra que no existieron durante la construcción original o existieron en proporción menor a la obra de reconstrucción, pero que son necesarias para la reparación de los daños hasta \$/. 100,000 por evento.
- g. La póliza ampara las reparaciones provisionales y modificaciones a consecuencia de una pérdida indemnizable o daño bajo la sección 1 de la póliza. Por su parte el asegurado se obliga a declarar dichos gastos adicionales para el ajuste del valor declarado.
- h. El asegurador deberá cursar notificación por escrito a CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLACA S.A.C. en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación de la presente póliza, por lo menos con treinta (30) días de anticipación de dicho cambio o cancelación.

EXCLUSIONES

Adicionalmente a las indicadas en el condicionado general, queda excluido:

- Maquinaria de construcción y/o montaje, responsabilidad civil patronal, responsabilidad civil de vehículos, accidentes de trabajo, 'Pruebas para Maquinaria, Equipos y Usadas y/o refaccionados', Transporte Internacional.
- Los gastos incurridos por las actividades necesarias para restituir el nivel freático en las zonas adyacentes al proyecto de construcción, tampoco se cubren los gastos para estabilizar el terreno y/o aumentar el factor de seguridad del proyecto, por situaciones no contempladas en el estudio de suelos.
- Los daños causados por deficiente compactación y/o estabilización del terreno o por la falta de las mismas, asimismo, quedan excluidos daños causados por asentamientos previsibles del terreno (se disponga o no de estudio geotécnico previo) según el sub suelo, los materiales y los métodos de construcción empleados.
- Pérdidas Financieras Puras.
- Bosques y cultivos..
- Toxic Mould.

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaca S.A.C.
RUC: 20150278051

16/01/2024
Guillermo Díaz Palomino
INGENIERO CIVIL

16/01/2024
Guillermo Díaz Palomino
INGENIERO CIVIL
CIP 67086

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLACA S.A.C.
RUC: 20150278051

16/01/2024
Guillermo Díaz Palomino
INGENIERO CIVIL
CIP 67086

PRIMA NETA VIGENCIA:

\$/25,375.00 (Tasa Neta 1.75%)

Exclusión Limitada de Pérdida cibernética:



POLIZA	COLECTIVO	EFUENEFIO
2302210000136		5
VEGINDAD/DESC	HASTA	AFUENACION
16/12/2023 12:00 Hrs.	15/01/2024 12:00 Hrs.	0

1. Sin perjuicio de alguna disposición en contrario contenida en el presente Contrato, se excluye cualquier pérdida, daño, responsabilidad, coste o gasto de cualquier naturaleza, directa o indirectamente ocasionado por, facilitado por, resultado de, originado por o en conexión con:

- 1.1. Cualquier pérdida de, alteración de, daño o reducción en la funcionalidad, disponibilidad u operación de un Sistema Informático;
- 1.2. Cualquier pérdida, reducción en funcionalidad, reparación, reemplazo, restauración o reproducción de cualquier tipo de Datos, incluyendo cualquier monto asociado al valor de dichos Datos.

Definiciones


2. Sistema informático significa cualquier ordenador, hardware, software, sistema de comunicaciones, equipo electrónico (incluyendo, pero sin limitarse a, teléfono inteligente, ordenador portátil, tablet, dispositivo portátil), servidor, nube o microcontrolador incluyendo cualquier sistema similar o cualquier configuración de éstos o incluyendo entrada, salida, dispositivo de almacenamiento de datos, dispositivos de red o instalación de backup.
3. Datos significa información, hechos, conceptos, códigos o cualquier otra información de cualquier tipo que sea registrada o transmitida en un medio para ser usado, accedido, procesado, transmitido o archivado por un Sistema de Cómputo.

LMA8410 Traducción libre


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 17086

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS HUAYLAS S.A.S.
 R.M.C. 20130278001

CLAUSULA EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.


 Abner Guzmán Fejada
 ALFRENTE GENERAL

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en otro sentido en la presente póliza, este seguro excluye cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación, coste o gasto de cualquier naturaleza, directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o derivado de o en relación con una enfermedad transmisible o el temor o la amenaza (ya sea real o percibida) de una enfermedad transmisible con independencia de cualquier otra causa o evento que contribuya de manera simultánea o en cualquier otra secuencia a ello.
2. Tal como se utiliza en el presente documento, se entiende por enfermedad transmisible toda enfermedad que pueda ser transmitida por medio de cualquier sustancia o agente desde un organismo cualquiera a otro organismo, en la presente definición:
 - 2.1. la sustancia o el agente incluye, entre otras, un virus, una bacteria, un parásito u otro organismo o cualquier variación de estos, ya sea que se consideren vivos o no; y
 - 2.2. el método de transmisión ya sea directo o indirecto, incluye, entre otros, la transmisión por aire, la transmisión por fluidos corporales, la transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gas o entre organismos; y,
 - 2.3. la enfermedad, la sustancia o el agente pueden causar o amenazar con causar daños a la salud o al bienestar de las personas o pueden causar o amenazar con causar daños, deterioro, pérdida de valor, comerciabilidad o pérdida de uso de los bienes.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS HUAYLAS S.A.S.
 R.M.C. 20130278001


 Abner Guzmán Fejada
 ALFRENTE GENERAL



POLIZA	NUMERO	SEGURIDAD
2302210800138		5
VALIDACION	HASTA	APLICACION
15/12/2023 12:00 Hrs.	15/01/2024 12:00 Hrs.	3

SUPLEMENTO 01:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE DEJA CONSTANCIA LO SIGUIENTE:

Se Incluye a UE 002 PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGRARIA Y LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA FASE II con RUC 20414251561 y compañías afiliadas y subsidiarias y asociadas, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados, como asegurados adicionales y como terceros en la eventualidad que se afecte su propiedad y/o a su personal, respecto a la Responsabilidad Civil cubierta por la presente póliza.


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CP. 67086

Asi mismo se deja constancia la siguiente actualización:
dice:

El asegurador deberá cursar notificación por escrito a CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C. en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación de la presente póliza, por lo menos con treinta (30) días de anticipación de dicho cambio o cancelación

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC: 2041422750


 Abel Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

Debe decir:

El asegurador deberá cursar notificación por escrito a UE 002 PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGRARIA Y LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA FASE II en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación de la presente póliza, por lo menos con treinta (30) días de anticipación de dicho cambio o cancelación.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 2041422750


 Ing. Julio Cesar Palomino de la Aguirre
 REPRESENTANTE GENERAL
 CP N° 36190

UBICACIÓN DEL RIESGO:

Distrito: Juan Guerra

SUPLEMENTO 02:

POR MEDIO DEL PRESENTE SUPLEMENTO SE DEJA CONSTANCIA ENDOSO A FAVOR DE:
RUC 20414251561 Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria-



POLIZA	COLECTIVO	SUPLENTO
2302210800136		5
VALIDA DESDE	HASTA	EFECTOS
15/12/2023 12:00 Hrs.	15/01/2024 12:00 Hrs.	0

PRODESA.

SUPLEMENTO 03:

Mediante el presente endoso, se deja constancia que se procede a prorrogar la vigencia de la póliza desde el 01/09/2023 hasta el 30/11/2023.

SUPLEMENTO 04:

Mediante el presente endoso, se deja constancia que se procede a prorrogar la vigencia de la póliza desde el 30/11/2023 hasta el 15/12/2023.

SUPLEMENTO 05:

Mediante el presente endoso, se deja constancia que se procede a prorrogar la vigencia de la póliza desde el 15/12/2023 hasta el 15/01/2024.

CONSTITUCION INMOBILIARIA RIG HUALPA S.A.C.
RUC: 20457278051

CONSTITUCION INMOBILIARIA RIG HUALPA S.A.C.
RUC: 20457278051

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67886

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

CONSTITUCION INMOBILIARIA RIG HUALPA S.A.C.
RUC: 20457278051

Abner Quiroga Tejada
GERENTE GENERAL



POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2302210800136		5
VISION DESDE	HASTA	AFICION/COM
15/12/2023 12:00 Hrs.	15/01/2024 12:00 Hrs.	0

REASEGUROS

NOTA: Este documento constituye a los asegurados de suscripción y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR No:

GENERADO POR: KATLYA

Constructora Inmobiliaria Pac Huancayo S.A.C.
RUC: 20450278451

Abel Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCIONES PALOMINO S.A.C.
RUC: 20450278451

ING. Guillermo Díaz Palomino
RESIDENTE DE OBRA
CIP 57066

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 57066



(Signature)
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67098

PÓLIZA 2302240600136	COLECTIVO	SUPLEMENTO 5
VIGENCIA DESDE 16/12/2023 12:00 Hrs.	HASTA 15/01/2024 1 12:00 Hrs.	APLICACION 0

CESIÓN DE DERECHOS

RAMBO **CONSTRUCCION**

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.

(Signature)
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC. 20450278951

DATOS DEL ASEGURADO

NOMBRE DEL ASEGURADO
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.

(Signature)
Abner Guzman Tojoda
GERENTE GENERAL

NOMBRE DEL ENDOSATARIO

NOMBRE DEL ENDOSATARIO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA

(Signature)
RUC: 201507805

MATERIA ENDOSADA	SUMA ENDOSADA
CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRA	S/. 14,500,000.00

Se hace constar en la Póliza, que los derechos de indemnización que correspondan sobre ésta, quedan transferidos a favor del **ENDOSATARIO**, en su calidad de Acreedores del Asegurado, hasta por el importe que alcance la referida acreencia en la fecha de pago de la indemnización, la misma que en ningún caso excederá de la suma asegurada correspondiente a dichos bienes, de acuerdo a las condiciones de la Póliza. Consecuentemente, ningún otro endoso de cesión de derechos sobre los bienes descritos precedentemente podrá ser emitido en forma posterior a este endoso, sin el consentimiento previo del **ENDOSATARIO**.

Es entendido y convenido que ninguna modificación en cualquiera de las condiciones de la presente póliza, será introducida, en tanto no se haya cumplido con comunicarlo previamente al **ENDOSATARIO** en cuanto afecte sus intereses. Una vez recibida dicha comunicación, el **ENDOSATARIO** tendrá 20 (veinte) días calendario para manifestar su conformidad o no a dicha modificación y en caso de no pronunciarse en el plazo indicado, se tendrá por aceptada la modificación propuesta. Consecuentemente, se considerará como no inserta cualquier modificación que no cumpla con lo previsto en este párrafo.

Asimismo, si el Asegurado dejara de cumplir con el pago de la prima correspondiente a la Póliza de la cual forma parte este Endoso, la Compañía Aseguradora se obliga a enviar al asegurado y/o contratante y al BANCO, la comunicación a la cual se refiere el Art. 21 de la Ley N 29946 Ley del Contrato de Seguro y los Arts. 7 y 8 del Reglamento de Pago de Primas de Pólizas de Seguros, aprobado por Resolución SBS N 3198-2013. La comunicación al **ENDOSATARIO**, deberá entregarse como mínimo con 20 (veinte) días calendario de anticipación a la fecha en que se suspenda la cobertura. El **ENDOSATARIO** podrá evaluar hacerse cargo del pago de la prima. En caso transcurran 30 (treinta) días calendario contados desde el incumplimiento de pago, sin que la prima hubiera sido pagada, la cobertura de seguro quedará automáticamente suspendida, salvo que el asegurado haya cumplido con el pago pendiente, en cuyo caso la Compañía Aseguradora deberá reportar al **ENDOSATARIO** dicha situación. La Compañía Aseguradora no es responsable por los siniestros ocurridos durante el periodo en que la cobertura se mantuviera suspendida.

En caso la cobertura del seguro estuviera suspendida, la Compañía Aseguradora podrá optar por



[Handwritten Signature]
GUILLELMO DE ZALONINO
INGENIERO CIVIL

POLIZA 2302210000136	COLECCION	SUPLEMENTO 5
VIGENCIA DESDE 15/12/2023 12:00 Hrs.	HASTA 15/01/2024 1 12:00 Hrs.	APLICACION 0

resolver el contrato de seguro, en cuyo caso se obliga a enviar al Asegurado y/o Contratante y al **ENDOSATARIO**, la comunicación a la cual se refiere el Art. 23 de la Ley N 29946 Ley del Contrato de Seguro y los Arts. 9 y 10 del Reglamento de Pago de Primas de Pólizas de Seguros, aprobado por Resolución SBS N 3198-2013.

La póliza de la cual forma parte el presente endoso, quedará resuelta a los 30 (treinta) días calendario desde la fecha en que el **ENDOSATARIO** reciba la comunicación descrita en el párrafo anterior.

Se hace constar que, en el caso que la prima se mantuviese impaga por 90 (noventa) días calendario contados desde la fecha de cualquier incumplimiento de pago, la Póliza de Seguro y, consecuentemente, el presente endoso quedarán extinguidos. Para dicha extinción no será necesario que la Compañía Aseguradora remita al **ENDOSATARIO** ninguna comunicación adicional a la carta en donde se le informó acerca de la posibilidad de suspensión de la cobertura.

Esta póliza no podrá resolverse, extinguirse, anularse o suspenderse por motivos distintos a la falta de pago, sin previo aviso al **ENDOSATARIO**, 20 (veinte) días calendario antes de tal hecho.

Construcción Mutual de Fomento S.A.C.
[Handwritten Signature]
Abner Guzmán Tejada
FRONTE GENERAL

En caso de siniestro parcial, que cuente con cobertura bajo la póliza, de la cual forma parte el presente endoso, la Compañía Aseguradora podrá compensar la prima pendiente de pago contra la indemnización debida al asegurado o al **ENDOSATARIO**, conforme al Art. 18 de la Ley N 29946 Ley del Contrato de Seguro.

En caso de siniestro total que cuente con cobertura bajo la póliza, de la cual forma parte el presente endoso, la prima se entiende totalmente devengada, debiendo imputarse al pago de la indemnización correspondiente, conforme al Art. 18 de la Ley N 29946 Ley del Contrato de Seguro. En caso que la póliza de la cual forma parte el presente endoso, fuera de vigencia multianual, la prima que se devengará y se imputará al pago de la indemnización correspondiente será solo la que corresponda a la anualidad que se encontrara en curso al momento de presentarse el siniestro total.

Es igualmente convenido que, en caso de pérdida indemnizable amparada por esta Póliza y donde quiera aparezcan los intereses del **ENDOSATARIO**, corresponderá al Asegurado, de la manera que se indica, sin perjuicio de la preexistencia del bien asegurado.

FRONTE GENERAL
[Handwritten Signature]
Ing. Juan Carlos Rodríguez
FRONTE GENERAL

Se deja constancia que ante la ocurrencia de un siniestro, la responsabilidad de la Compañía Aseguradora frente a todos los endosarios de la presente póliza estará limitada a la Suma Asegurada, siempre y cuando no sea aplicable el Infraseguro, en cuyo caso la Compañía Aseguradora responderá sólo por el importe de la indemnización a que haya lugar. En este sentido, la cobertura, en aquellos casos en que exista más de un endosario, no excederá en ningún caso el límite de la suma asegurada indicada en la póliza, procediéndose a una repartición proporcional en el supuesto de que las sumas endosadas excedan el monto máximo asegurado.

Se deja constancia de que en caso de renovación de la póliza, el presente endoso se entenderá insertado automáticamente a favor de **ENDOSATARIO**, aun cuando no existiera comunicación escrita que así lo exprese. A efectos de la renovación, la Compañía Aseguradora se obliga a no variar las condiciones de la póliza original sin cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del presente Endoso, salvo que la variación se refiera al importe de la prima de seguro, al monto de los deducibles, del coaseguro, del valor declarado y/o de las sumas aseguradas y/o cualquier otra condición que no afecte los intereses del **ENDOSATARIO**, en cuyo caso no se requerirá ponerlo en conocimiento del



MAPFRE

PÓLIZA 2302210800138	COLECTIVO	SUPLEMENTO 5
VIGENCIA DESDE 15/12/2023 12:00 Hrs.	HASTA 15/01/2024 1 12:00 Hrs.	APLICACIÓN 0

ENDOSATARIO. La Compañía Aseguradora conviene específicamente en que esta póliza no se invalidará por el hecho que el Asegurado omita involuntariamente declarar cualquier circunstancia que deba considerarse de consecuencia para la estimación de la gravedad del riesgo, cuando dicha circunstancia haya estado probadamente fuera del control y conocimiento del Asegurado.

El presente endoso prevalecerá sobre cualquier otra condición establecida en la póliza

MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES P & M UGUA S.A.C.
RUC. 20450278051

Abner Guzmán Tejada
ABSEGURADO
GERENTE GENERAL

Todos los términos y condiciones de dicha póliza con excepción de lo expresamente variado mediante este suplemento quedan en todo su vigor.

Queda anotado en los registros de esta compañía.

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES P & M UGUA S.A.C.
RUC. 20450278051

MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC. 20000000000

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67006



PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES (No corresponde)

Construcción Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC: 2015077805

[Handwritten Signature]

Abner Guzman Tejeda
GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]

GUILHERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67088

[Handwritten Signature]

JULIO CESAR BARRERA
INGENIERO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD
CIP. 67199

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"



PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS

[Handwritten Signature]
 Construcción Inmobiliaria Fco. Healy S.A.
 RUC. 20450278053

 Sr. Juan Guerra Tejada
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
 GUILLERMO BARRAL PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIR-67086

[Handwritten Signature]
 SANTIAGO PALOMINO
 RUC. 2040278053

 Sr. Juan Guerra Tejada
 GERENTE GENERAL

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"



MAPFRE

CAPITAL SOCIAL S/ 501,949,792

PAG: J

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 20418896915
Dirección: Av. Armendáriz N° 345, Miraflores -Teléfono: 213-3333

**SUPLEMENTO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL**

2402210800487

POLIZA 2402210800487	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 15/12/2023 12:00 Hrs.	HASTA 15/01/2024 12:00 Hrs.

Adecuado a la Ley N° 29946 y sus normas reglamentarias.

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO	N° MOV.	F. EMISION	VIGENCIA DE POLIZA	FORMA DE PAGO	%PARTICIP.	RIESGOS	MONEDA
Renovacion 4		26/12/2023	15/12/2023 - 15/01/2024	Imeo	100 %	I	S/

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.	RUC 20450278051
DIRECCION Circunvalacion Nro 2283 Tarapoto	
EMAIL recursoshumanos@grupocumbaza.com.pe	TELEFONO 998917473
ACTIVIDAD ECONOMICA Construcción De Edificios	

DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS

NOMBRE Arsa Corredores De Seguros Sa	NOMBRE
CODIGO SBS : J0395	CODIGO SBS :
CODIGO INTERNO : 1305	CODIGO INTERNO : GUILLERMO DIAZ PALOMINO INGENIERO CIVIL CIP: 67086

IMPORTE DE LA COMISION 46.58

Los cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores, contratación de promotores, comercializadores y bancaseguros podrán considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en función al cumplimiento de metas de producción y resultados.

DATOS DE COBRO

DIRECCION DE COBRO Avda. Circunvalacion Nro 2283 Tarapoto San Martín San Martín	Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A. RUC: 20450278051
COBRADOR Maria Elizabeth Gamarra Lopez	 Abner Guzman Tejado GERENTE GENERAL

PRIMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
Prima Comercial	239.88
Prima Comercial + I.G.V.	283.06

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RIO HUALLAGA S.A.
RUC: 20450278051

Miguel Ángel Gamarra López
Gerente General



POLIZA 2402210800487	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 15/12/2023 12:00 Hrs.	HASTA 15/01/2024 12:00 Hrs.

Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podrán formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificación en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observación, se tendrá por aceptada la póliza emitida.

En caso el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptación se presume solo cuando LA COMPAÑÍA advierte al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas.

Se adjuntan Cláusulas Generales de Contratación CGCRRGG01122013 y Condiciones Generales de la póliza: CGRCE01122013

que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de seguros del que son parte integrante y no tienen valor por separado.

▫ DATOS PERSONALES:

El contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la emisión de la póliza, así como la actualización y cesión de los mismos para los fines detallados en el Artículo 23 de las Cláusulas Generales de Contratación cuyo texto declara conocer en su integridad.

Construcción Inmobiliaria Rio Pardo S.A.C.
RUC- 20150278051
[Signature]
Ahmed Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

LUIS FLORES DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
RUC- 70450178051
[Signature]
Ing. Flores Díaz Palomino
Calle 10 de Agosto 1236 CHIMBA
Lima - Perú

[Signature]
QUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP- 67006



POLIZA 2402210800487	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 15/12/2023 12:00 Hrs.	HASTA 15/01/2024 12:00 Hrs.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, desavenencia o reclamación relacionada o derivada del contrato de seguro, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, será resuelta por los jueces y tribunales de la ciudad de Lima o del lugar donde domicilia el CONTRATANTE, ASEGURADO O BENEFICIARIO, según corresponda de acuerdo a Ley. Adicionalmente las partes, una vez producido el siniestro, cuando se trate de controversias referidas al monto reclamado, podrán convenir el sometimiento a la jurisdicción arbitral siempre y cuando las diferencias superen los límites económicos por tramos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Sin perjuicio de lo antes indicado, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO podrán presentar su reclamo ante la Defensoría del Asegurado; su denuncia o reclamo según corresponda, ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, entre otros según corresponda.

COMUNICACIONES

Las partes acuerdan como mecanismo de comunicación entre LA COMPAÑIA y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, el domicilio físico, electrónico y/o telefónico, a las direcciones y números telefónicos que aparecen en las presentes condiciones particulares.

Las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa. En este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.

Los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se consideran abonados a la empresa en la fecha de realización del pago. Asimismo, la empresa debe prever que el comercializador lleve el control de dichos pagos.

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

INSTITUCION COMPLEMENTARIA DE FIANZAS S.A.C.
RUC: 20450278051
Almer Guzman Tejada
EF ASEGURADO

GENERADO POR KATTYAL

PERU SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RUC: 20450278051
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
GUILLE RMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 87086



MAPFRE

Miraflores, 27 de Diciembre del 2023

Señor(a)(rtá)(es):

Constructora Inmobiliaria Rio Hauluga S.A.C.

RUC 20450278051

Avda. Circunvolacion Nro 2283 Tayapoto San Martín San Martín

Moneda: S/

Corredor 1305 Arsa Corredores De Seguros Sa

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s) que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En la columna "Fecha de Obligación de Pago" se indica el día establecido para el pago de cada uno de los recibos. La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.
- b) Transcurridos 30 días calendario, contados desde la "Fecha de Obligación de Pago", si la prima se mantiene impaga, la cobertura del seguro podrá suspenderse, lo cual podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
2402210800487	4	239.88		43.18	283.06
					283.06

CRONOGRAMA DE PAGO				
NRO. RECIBO	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE OBLIGACIÓN DE PAGO	SITUACIÓN DE RECIBO

147419842	SOLES	283.06	19/12/2023	PENDIENTE
-----------	-------	--------	------------	-----------


TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %



GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CP. 63088

.....
 Constructora Inmobiliaria Rio Hauluga S.A.C.
 RUC: 20450278051



Abel Guzman Tejado
 GERENTE GENERAL

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

- Ingresando en la WEB de su banco
- En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza
- Afiliándose al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express
- Para pagos en agentes, indicar los siguientes códigos. BCP (Código 01866), BBVA (Código 206), SCOTIABANK (Código 102), INTERBANK (Código 0200204)

BBVA
 BCP
 SCOTIABANK
 INTERBANK
 BIF



 Constructora Inmobiliaria Rio Hauluga S.A.C.
 RUC: 20450278051

Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (S24) llamando a los teléfonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfre.com.pe/oim-clientes

D0911010 - 05/01



MAPFRE

Miraflores , 27 de Diciembre del 2023

Señor(a)(rta)(es):

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.

Avda. Circunvalacion Nro 2283 Tarapoto San Martin San Martin

Corredor: 1305 Arsa Corredores De Seguros Sa

RUC 20450278051

Moneda: S/

Atentamente ,

LAURA ARBOLEDA MORALES
DIRECTOR UNIDAD DE GENERALES

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC. 20450278051

ACCIDENTE ACEPTADO
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION INMOBILIARIA
RUC. 20450278051

ING. JUAN CARLOS
Nº 44191

GUILLERMO DIAZ PALCARINO
INGENIERO CIVIL
CR-47086



**RESUMEN:
SUPLEMENTO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL**

El siguiente texto es un resumen informativo de las Condiciones Generales del riesgo contratado. Las condiciones aplicables a cada póliza serán las detalladas en las Condiciones Particulares correspondientes.

1. RIESGOS CUBIERTOS

Las coberturas y sus alcances están descritas en el Artículo 1º y 2º del Condicionado del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

2. EXCLUSIONES

Las exclusiones están descritas en el Artículo 2º del Condicionado de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

3. LUGAR Y FORMA DE PAGO

Ingresando a la página web de los siguientes bancos: Banco de Crédito, Banco Continental, Scotiabank, Interbank, Banco Falabella y Banco Interamericano de Finanzas.

Acercándose a cualquiera de los siguientes bancos: Banco de Crédito, Banco Continental, Scotiabank, Interbank, Banco de la Nación, Banco Falabella y Banco Interamericano de Finanzas, indicando el número de DNI, RUC o Carnet de Extranjería del contratante de la póliza.

Afiliándose al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito Mastercard, Visa, Diners, y American Express.

En cualquiera de nuestras oficinas ubicadas en Lima y provincias, detalladas en nuestra página web: <http://www.mapfre.com.pe/contactanos>.

4. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Según lo establecido en el numeral 8.1 del Artículo 8, y 9.1, 9.2 y 9.3 del Artículo 9º de las Cláusulas Generales de Contratación.

5. DERECHO DE ARREPENTIMIENTO

Según lo establecido en el numeral 9.3 del Artículo 9º de las Cláusulas Generales de Contratación.

6. VIGENCIA DEL SEGURO

Inicia el 15/12/2023 a las 12:00 hrs. y finaliza el 15/01/2024 a las 12:00 hrs.

7. MONTO DE LA PRIMA

Moneda: S/ Prima Comercial: 239.88

8. PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD

Según lo establecido en el Artículo 6º, de las Condiciones Generales del Seguro de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. Además de lo detallado en el Artículo 10º de las Cláusulas Generales de Contratación.

9. MEDIO Y PLAZO PARA EL AVISO DEL SINIESTRO

Comunicarse de inmediato con nuestro servicio de Atención al Cliente 24 Horas al teléfono 213-3333 (Lima) y 0801-1-1133 (provincia) o al WhatsApp 999-919-133. El asegurado o contratante deberán regularizar dicho aviso dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes, mediante declaración escrita y veraz, debiendo presentar copia certificada de la denuncia policial correspondiente.

GUILLERMO MAZ PALOMBO
INGENIERO CIVIL
CIP 87005

Construtora Simobil Rio Huancayo S.A.C.
RUC: 20152271051

Abner Guzman Tejeda

COMERCIO EXTERNO INDEPENDIENTE
RUC: 20050771091

COMERCIO EXTERNO INDEPENDIENTE
RUC: 20050771091

10. LUGARES PARA SOLICITAR LA COBERTURA DEL SEGURO

1. Unidad de Riesgos Generales.

Área de Sinistros Av. Armendáriz N° 345, Miraflores

2. Oficinas de LA COMPAÑÍA ubicadas en Lima y provincias, detalladas en nuestra página web:

<http://www.mapfre.com.pe/contactanos>

11. MEDIOS HABILITADOS POR LA EMPRESA PARA PRESENTAR

Los usuarios y/o consumidores, entendiéndose estos como la persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta de los productos o servicios ofrecidos por el Grupo MAPFRE PERÚ; así como, los no asegurados, podrán presentar consultas, reclamos y/o quejas a las Compañías precitadas en los siguientes canales:

Consultas

Carta dirigida al Presidente del Grupo MAPFRE PERÚ (en papel membretado en caso de ser persona jurídica), indicando: tipo de solicitante, nombre completo, documento de identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, número de póliza, número de siniestro de ser el caso, nombre del producto/servicio afectado, una breve explicación clara y precisa de la consulta. A través de la página web de MAPFRE PERÚ, enlazándose al link de "Contáctenos" (Central de Consultas).

Reclamos y/o quejas

Carta dirigida al Presidente del Grupo MAPFRE PERÚ (en papel membretado en caso de ser persona jurídica), indicando: tipo de solicitante, nombre completo, documento de identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, número de póliza, número de siniestro de ser el caso, nombre del producto/servicio afectado, una breve explicación clara y precisa del hecho reclamado y documentos que adjunta. "Libro de Reclamaciones Virtual", que estará al alcance del consumidor o usuario, siendo asesorado por una Ejecutiva de Atención al Cliente en las oficinas a nivel nacional de las compañías precitadas. Podrá adjuntar, de ser el caso, documentos que sustenten su reclamo y/o queja. A través de la página web de MAPFRE PERÚ, enlazándose al link de "Libro de Reclamaciones" (Reclamos y/o Quejas).

12. INSTANCIAS HABILITADAS PARA PRESENTAR RECLAMOS

1. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (solo denuncias)

Departamento de Servicios al Ciudadano

Lima: Av. Dos de Mayo N° 1475, San Isidro

A nivel nacional se cuentan con otras oficinas de la SBS

Teléfonos: 0800-10840 | 630-9000

www.sbs.gob.pe

2. INDECOPI

Calle de la Prosa N° 104, San Borja

Teléfonos: 224-7777 (Lima) o 0800-4-4040 (provincias)

www.indecopi.gob.pe

3. Defensoría del Asegurado

Calle Amador Merino Reyna N° 307, piso 9 San Isidro, Lima, Perú

Teléfono: 421-0614

www.defaseg.com.pe

Consultora Inmobiliaria Higueras S.A.C.
RUC. 20150278057
Abel Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

CONSULTORA INMOBILIARIA
HIGUERAS S.A.C.
RUC. 2002078057
Abel Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

Guillermo Díaz Paolotto
GUILLERMO DIAZ PAOLOTTO
INGENIERO CIVIL
CIP. 87088

13. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todo litigio, controversia, desavenencia o reclamación resultante, relacionada o derivada de este acto jurídico o que guarde relación con él, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, incluso las del convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho, cuando los daños o pérdidas reclamadas a LA COMPAÑÍA sean iguales o superiores a 20 UIT, o a los límites económicos vigentes que hubiere fijado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

El tribunal arbitral estará conformado por tres árbitros los cuales deberán ser abogados con no menos de cinco años de reconocida experiencia en materia de seguros. El laudo será definitivo e inapelable, de conformidad con los reglamentos arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. Los costos y gastos de arbitraje serán de cargo de la parte vencida. El laudo arbitral podrá ser revisado por el Poder Judicial, con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente.

En caso el monto reclamado por EL ASEGURADO no excediera los límites económicos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, este podrá acudir a la vía judicial.

NOTA IMPORTANTE:

Las Condiciones Especiales del contrato prevalecen sobre las Condiciones Generales y Particulares.

Constructora Simulacra Rio Huallaga S.A.C.
RUC. 20450278051

Abner Quiroz Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCIONES Y MANO DE OBRA
RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC. 20450278051

MICROEMPRESA DE INGENIEROS DEL PERU S.A.
RUC. 201000000000000
CIP. 100000000000000

G
GULLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086



POLIZA 2402210800487	COLECTIVO	SUPERSEDES 4
VALIDA DESDE 15/12/2023 12:00 Hrs.	HASTA 15/01/2024 12:00 Hrs.	PLUGUICH 0

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

ASEGURADO:

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C., y/o empresas conexas y/o subsidiarias y/o empresas con accionariado común que formen parte del grupo del Asegurado principal.

ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO:

"CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN".

Construcción de catorce (14) bloques de concreto armado (trece de 1 nivel y uno de tres niveles

UBICACIÓN DEL RIESGO:

Distrito: Juan Guevara
Sector: Estación Experimental Agraria El Porvenir
Provincia: San Martín
Departamento: San Martín

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC: 20450278001

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

Valor de la obra : S/ 14,500,000

Guillermo Diaz Pacheco
GUILLERMO DIAZ PACHECO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67065

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 20450278001
Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

MATERIA DEL SEGURO:

Sujeto a todos los términos y condiciones que forman parte de la presente Póliza, la COMPAÑÍA cubre al ASEGURADO contra las reclamaciones de Terceros por concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual, exclusivamente a consecuencia de Daños Personales y/o Daños Materiales causados involuntariamente a dichos Terceros por un accidente ocurrido durante la vigencia de la Póliza, como resultado directo de las actividades o negocios declarados en las Condiciones Particulares.

Coberturas básicas	Suma Asegurada
Responsabilidad Civil Extracontractual	S/ 1,500,000
Sub-límites	Sublímites



POLIZA	COLECTIVO	EFECTIVO
2402210B00487		4
VIGENCIA DESDE	HASTA	AFUCCION
15/12/2023 12:00 Hrs.	15/01/2024 12:00 Hrs.	0

	Asegurados
Responsabilidad Civil Patronal	S/ 1,500,000
Responsabilidad Civil Contractual (Limitado a S/500,000 por evento)	S/ 1,500,000
Responsabilidad Civil en Exceso para Vehículos de propiedad del Asegurado (En exceso de S/ 400,000.00 o de la suma asegurada de la póliza de vehículos, lo que sea mayor).	S/ 1,000,000
Todas las sumas aseguradas son en Límite único combinado y en LAV.	

DEDUCIBLES (POR TODO Y CADA EVENTO):

10% del monto indemnizable, mínimo S/10,000 excepto:

Responsabilidad Civil por contaminación y/o polución súbita, imprevista y accidental

20% del monto indemnizable, mínimo S/10,000

CLÁUSULAS Y CONDICIONES ADICIONALES:

Condicionado general de contratación

Condicionado General de Responsabilidad Civil Extracontractual

Responsabilidad Civil Patronal

Responsabilidad Civil Contractual

Responsabilidad Civil de Vehículos Ajenos al Servicio del Asegurado (En exceso de S/ 400,000.00 o de la suma asegurada de la póliza de vehículos, lo que sea mayor).

Responsabilidad Civil Extracontractual por Actos de Contratistas Independientes y/o Subcontratistas

Responsabilidad Civil de Ascensores, Grúas, Montacargas y Escaleras Mecánicas

Responsabilidad Civil por Incendio y/o Explosión y/o Daños por Agua y/o Daños por Humo

Responsabilidad Civil para Carga

Responsabilidad Civil Cruzada

Responsabilidad Civil para Transporte de Personal

Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones

Construcción Inmobiliaria Rio Huancayo S.A.C.
RUC: 20150210081

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

Guillermo Díaz Palomino
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 87068

CONSTRUCION INMOBILIARIA
RUC: 20150210081
Ing. Julio...
INGENIERO CIVIL
CIP: 87068



PÓLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2402210600487		4
VIGENCIA/DESDE	HASTA	APLICACIÓN
15/12/2023 12:00 Hrs.	15/01/2024 12:00 Hrs.	0

Responsabilidad Civil por contaminación y/o polución súbita, imprevista y accidente

Gastos Admitidos – hasta S/ 20,000 por evento y limitado en LAA

Asesoramiento de defensa Penal – hasta S/ 10,000 y limitado en LAA

Límite Agregado Vigencia

CONDICIONES ESPECIALES:

Construcción Inmobiliaria Río Huallaga S.A.C.
RUC: 20550278054

Abner Guzmán Tejada
FRONTIERAS

- La presente póliza también se extiende a cubrir la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurran los practicantes, vigilantes y trabajadores temporales o permanentes que pertenezcan a personas jurídicas distintas del Asegurado, profesionales o especialistas, cuyos servicios sean cancelados mediante honorarios profesionales, siempre que preste servicios al Asegurado y que tenga una relación continua de dependencia y al que el asegurado tenga el derecho de dirigir permanentemente mientras desempeñe sus labores.
- El plazo de aviso de resolución de contrato por parte de la Compañía será mediante comunicación escrita que se cursará con no menos de 30 días calendario de anticipación.
- La presente póliza se extiende a cubrir la Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del uso de montacargas y/u otros equipos móviles, cuando por operaciones propias del giro del negocio salgan fuera de los predios.
- Definición de Terceros: Cualquier persona, natural o jurídica distinta de:
 - o El CONTRATANTE o el ASEGURADO.
 - o Personas miembros de la familia del ASEGURADO y/o del CONTRATANTE considerándose como tales a: los cónyuges, los ascendientes, los descendientes, los hermanos y, en general, los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, incluyendo el padre adoptante o hijo adoptivo, así como la (o el) conviviente.
 - o Personas, naturales o jurídicas, que sean socios o formen parte del accionariado del ASEGURADO y/o CONTRATANTE.
 - o Personas que sean parte de la Administración, así como directivos, empleados y/o trabajadores, sea que estén en planilla o contratados o que, de hecho, o de derecho, tengan alguna relación de dependencia con el ASEGURADO y/o CONTRATANTE.
 - o Clientes del ASEGURADO y/o CONTRATANTE.
- Por LAV se entenderá Límite agregado vigencia.

GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 67086

CONSTRUCCION INMOBILIARIA
RUC: 20550278054

Se incluye a UE 002 PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA – PRODESA PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGRARIA Y LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA FASE II y/o compañías afiliadas y/o subsidiarias y/o asociadas, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados, como asegurados adicionales y como terceros en



POLIZA	COLECTIVO	SUFICIENTE
2402210800487		4
VALIDA DESDE	HASTA	AFILIACION
15/12/2023 12:00 Hrs.	15/01/2024 12:00 Hrs.	0

la eventualidad que se afecte su propiedad yo a su personal, respecto a la Responsabilidad Civil cubierta por la presente póliza.

El Asegurado Adicional está cubierto solo por los daños causados por el Asegurado Principal que deriven de una demanda hacia el Asegurado Adicional por un tercero, no siendo esta una ampliación de la cobertura hacia responsabilidades y obligaciones particulares del asegurado adicional. Los daños causados por el Asegurado Adicional estarán excluidos de esta cobertura y deberán estar cubiertos por su propia póliza de Responsabilidad Civil.

La Compañía de Seguros no se subrogará en contra de UE 002 PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA – PRODESA PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGRARIA Y LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA FASE II y/o compañías afiliadas y/o subsidiarias y/o asociadas, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados por ser asegurados adicionales.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 4502 4502 1

Abner Guzman Tejada

El asegurador deberá cursar notificación por escrito a CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C. en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación de la presente póliza, por lo menos con treinta (30) días de anticipación de dicho cambio o cancelación.

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL

Abner Guzman Tejada
 Representante Legal

EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (REASEGURO DE DAÑOS) –

Traducción libre

1. No obstante cualquier disposición en contrario en el presente contrato de reaseguro, el presente contrato de reaseguro excluye cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación, coste o gasto de cualquier naturaleza, directa o indirectamente causado por, contribuido por, resultante de, derivado de, o en relación con una Enfermedad Transmisible o el temor o la amenaza (ya sea real o percibida) de una Enfermedad Transmisible, independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya de forma concurrente o en cualquier otra secuencia de la misma.
2. En el presente documento, por Enfermedad Transmisible se entiende cualquier enfermedad que pueda transmitirse por medio de cualquier sustancia o agente de cualquier organismo a otro organismo donde:
 1. La sustancia o agente incluye, pero no se limita a, un virus, una bacteria, un parásito u otro organismo o cualquier variación del mismo, ya sea que se considere vivo o no, y
 2. El método de transmisión, ya sea directo o indirecto, incluye pero no se limita a la transmisión por aire, la transmisión de fluidos corporales, la transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gaseoso o entre



POLIZA	2402210800487	COLECTIVO		EMPLAZADO	4
VALIDA DESDE	15/12/2023 12:00 Hrs.	HASTA	15/01/2024 12:00 Hrs.	APLICACION	0

organismos, y

3. La enfermedad, la sustancia o el agente pueden causar o amenazar con causar daños a la salud o al bienestar de las personas, o pueden causar o amenazar con causar daños, deterioro, pérdida de valor, comerciabilidad o pérdida de uso de los bienes.

En caso de inconsistencia con su original en inglés, la versión inglesa prevalecerá.

EXCLUSIONES:

- Responsabilidad Civil de vehículos
- Cualquier reclamación que se fundamente en fallas, defectos, errores u omisiones en plano, diseño o especificación de los trabajos, así como la responsabilidad Civil Profesional.
- Bienes bajo el cuidado, control y custodia del asegurado.
- Daños causados a personas o animales por la ingestión de alimentos o bebidas, o por cuerpos extraños o perniciosos contenidos en los mismos.
- Vibraciones y Debilitamiento de Bases.
- Actos de Dios / Fuerza Mayor / Actos de la Naturaleza / Caso Fortuito.
- Bienes bajo Cuidado Custodia y Control del Asegurado.
- Daño moral puro (sin daño físico), angustia mental.
- Daños como consecuencia de incumplimiento de los requisitos legales administrativos y/o violación de medidas de seguridad impuesta por las autoridades que rigen esta actividad.
- Daños derivados de actos de autoridad.
- Daños o pérdida de dinero, documentos, valores, joyas y obras de arte.
- Secuestros y desaparición de personas.
- Pérdidas consecuenciales que no provengan de un daño material o lesión corporal.
- RC derivada de errores informáticos, virus, internet
- Se excluye prueba de operación y puesta en marcha de la obra.
- Trabajos en muelles
- Riesgos relacionados a productos químicos o explosivos
- Riesgos asegurables bajo el producto de RC de Hidrocarburos
- Minería subterránea y/o Exploración Minera

Consorcio Inmobiliaria Rio Huachipa S.A.C.
RUC: 2010278051

Abner Guzman Tejada
CORRENTE FRENTE

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 87046

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 87046



PERIODO 2402210000487	COLECTIVO	SUPLENTO 4
VIGENCIA DESDE 15/12/2023 12:00 Hrs.	HASTA 15/01/2024 12:00 Hrs.	APLICACION 0

- **Riesgos relacionados a basurales y/o manejo de residuos**
- **Eventos deportivos, conciertos, fiestas, etc**
- **Riesgo OFF SHORE (en el mar, alejado de la costa, riesgos marítimos)**
- **Obras de construcción de túneles y/o puentes.**
- **Demoliciones**
- **Maquinaria**
- **Pólizas anuales para todos los trabajos que realice la empresa.**
- **Construcción de muros pantalla**
- **Parte de obras CAR no aseguradas con Mapfre**

GARANTÍAS:

- **Todos los trabajadores y personal autorizados deberán usar los equipos de protección apropiados y estar informados sobre las prácticas de seguridad y los procedimientos de emergencia.**
- **El incumplimiento de estas condiciones especiales liberará a la compañía de toda responsabilidad en caso de siniestro.**

Constructora Inmobiliaria Rio Hual S.A.C.
RUC. 20150278051

Abn. Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

PRIMA NETA VIGENCIA:

S/ 2,672.00

GUILLERMO BLAZ BALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC. 20150278051

SUPLEMENTO 01:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE DEJA CONSTANCIA LA SIGUIENTE ACTUALIZACION:

dice:

El asegurador deberá cursar notificación por escrito a CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C. en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación de la presente póliza, por lo menos con treinta (30) días de anticipación de dicho cambio o cancelación.



POLEA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2402210800487		4
VALIDACIONES	HASTA	APLICACION
15/12/2023 12:00 Hrs.	15/01/2024 12:00 Hrs.	0


Debe decir:

El asegurador deberá cursar notificación por escrito a UE 002 PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGRARIA Y LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA FASE II en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación de la presente póliza, por lo menos con treinta (30) días de anticipación de dicho cambio o cancelación.

Dirección del riesgo

DICE :JUAN GUEVARA

DEBE DECIR : JUAN GUERRA


 Constructora Inmobiliaria Rio Hualqui S.A.S.
 (RUC. 201450276051)
 Abner Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL

SUPLEMENTO 02

Mediante el presente endoso, se deja constancia que se procede a prorrogar la vigencia de la póliza desde el 01/09/2023 hasta el 30/11/2023.

Todos los demás términos y condiciones de la póliza se mantienen inalterables

SUPLEMENTO 03

Mediante el presente endoso, se deja constancia que se procede a prorrogar la vigencia de la póliza desde el 30/11/2023 hasta el 15/12/2023.


Todos los demás términos y condiciones de la póliza se mantienen inalterables

SUPLEMENTO 04

Mediante el presente endoso, se deja constancia que se procede a prorrogar la vigencia de la póliza desde el 15/12/2023 hasta el 15/01/2024.

Todos los demás términos y condiciones de la póliza se mantienen inalterables


 GERMAN ERMIQUEL PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CP. 57085



 Constructora Inmobiliaria Rio Hualqui S.A.S.
 (RUC. 201450276051)
 Abner Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL



POLIZA 2402210800487	COLECTIVO	SUPLENTO 4
VENIDA DESDE 15/12/2023 12:00 Hrs.	HASTA 15/01/2024 12:00 Hrs.	APLICACION 0



 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS



 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTIGÜEDAD:
GENERADO POR: NATYAL



 ING. JUAN CARLOS GONZALEZ DELAGUERRA
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 87086



 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 87086



SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Construcción Inmobiliaria y Fuzilega S.A.S.
RUC: 20150278051

[Handwritten Signature]
Abner Guzman Mejada
GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 87086

CONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN
RIO FRÍO - TAMBORA
RUC: 20150278051

[Handwritten Signature]
RUBEN GONZALEZ
RUC: 20150278051

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y
ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTÍN"

Nro. De Constancia MP/2023/8633960



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que tele(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **QUINCO SELVA SAC** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012300117845 y contrato de Salud No. 7022300139813, con vigencia del 19/12/2023 hasta el 31/01/2024, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : OBRAS CIVIL

ASEGURADO(S)

1	DNI	73706794	ALEX JUNIOR CAMPOVERDE GAMONAL
2	DNI	48873045	ANDERSON GUZMÁN GRÁNDEZ
3	DNI	77031488	ANTONY DANIEL GOMEZ
4	DNI	72785084	BRYAN DANILO TUANAMA NOLORBE
5	DNI	46620918	CARLOS ENRIQUE SANGAMA GUERRA
6	DNI	42410069	CARLOS MAGNO GARCIA LINARES
7	DNI	48842672	DANIEL SANGAMA SANGAMA
8	DNI	43410580	FELIX ARMANDO REYNA GONZALES
9	DNI	70161768	GELMAN ALEGRIA TUANAMA
10	DNI	70180376	JOSÉ LUIS AMASIFUEN GARCIA
11	DNI	72533133	JULIO ALFREDO SOPLOPUJO VERA
12	DNI	74985208	LEOVIGILDO GUZMÁN GÓMEZ
13	DNI	71087281	LUIS HERMINIO RIVERA ROBLEDO
14	DNI	39962462	MANUEL GUZMÁN CHÁVEZ
15	DNI	46147885	MARCOS ANTONIO SANDOVAL DIAZ
16	DNI	72160240	MILSER FACUNDO ISUIZA
17	DNI	60029808	OSCAR CRISTIAN TAPAYURI TAPULLIMA
18	DNI	74301436	ROYSER GUZMÁN GRÁNDEZ
19	DNI	77498314	TITO ANSELMO CACHIQUE PEREZ

[Signature]
 GUILLELMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67088

Constancia emitida por Quinco Selva SAC
 RUC: 20550778051
[Signature]
 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

Se expide la presente, para fines que consideren convenientes.

19/12/2023 05:04:53 pm

GONZALES SILVA, DORA MARIA

[Signature]

DIANA CAROLINA NIETO LUQUE
UNIDAD DE VIDA, DECESOS Y ACIDENTES

UNIDAD DE VIDA, DECESOS Y ACIDENTES
 RUC: 20550778051
[Signature]
 ING. CAROLINA NIETO LUQUE
 CIP. 56109

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

Nro. De Constancia MP/2023/8633960



Construtora Inmobiliaria Rio Hondo S.A.C.
RUC. 20450278051

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

GUILLERMO DEL Z PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIF: 87086

Construtora Inmobiliaria Rio Hondo S.A.C.
RUC. 20450278051

Ing. Walter C. Soto Sotillo del Aguila
INGENIERO CIVIL
CIF: 54119

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Conforme al art. 24.2 del D.S. N° 003-98-SA, si el contratante declara remuneraciones menores a las consignadas en las planillas y boletas de pago de sus trabajadores (incluidas gratificaciones de Julio y Diciembre), para el cálculo de la prima, incurrirá en un supuesto de cobertura insuficiente, y facultará a la aseguradora a solicitar el reembolso de la diferencia entre el importe de la pensión calculada con información declarada por el empleador para el cálculo de la prima, y el monto de la pensión que corresponda a lo efectivamente percibido por el trabajador.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <http://constancias.mapfre.com.pe/>

Validación en línea, a través de nuestro WhatsApp +51 999919133



SEGURO DE VIDA LEY (No Corresponde)

Construcción Inmobiliaria Rio Mualaga S.A.C.
RUC. 20150278051
Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

Guillermo Diaz Palomino
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
C.M. 62968

CONSTRUCCION INMOBILIARIA RIO MUALAGA S.A.C.
RUC. 20150278051
[Signature]
GERENTE GENERAL

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTÍN"



PAGO DE TRIBUTOS Y SOCIALES


 Construcción Inversión y Rehabilitación de Huasos S.A.
 RUC. 2015027805
 Abner Guzmán Tejada
 REPRESENTANTE LEGAL


 CONSTRUCCION INVERSION Y REHABILITACION DE HUASOS S.A.
 RUC. 2015027805
 Calle: ...
 ...


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIR-67066

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

Constancia de Pago

Pago de valores - Formulario 1662

Número de orden : 783700564

10/11/2023

RUC : 20450278051
 Razón social : CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C
 Período : 09/2023
 Tipo de pago : 1 Valor
 Número de documento : 1810010027014
 Tributo : 052100 ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
 Importe pagado : S/. 73,251

Número de operación SUNAT: 000187945476
 Tipo de pago: Pago con cargo en cuenta bancaria
 Banco: BBVA BANCO CONTINENTAL
 Número de operación bancaria: 0
 Fecha de operación bancaria: 01/01/0001 00:00:00

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 20450278051

 Abner Guzmán Tejada
 REPRESENTANTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 20450278051

 Juan Manuel Díaz Palomino
 INGENIERO CIVIL
 CN: 87088

 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CN: 87088

Constancia de Pago

Pago de valores - Formulario 1662

Número de orden : 783700560

10/11/2023

RUC : 20450278051
 Razón social : CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C
 Período : 09/2023
 Tipo de pago : 1 Valor
 Número de documento : 1810010027015
 Tributo : 053100 SNP - LEY 19990
 Importe pagado : S/. 6,025

Número de operación SUNAT: 000187945476
 Tipo de pago: Pago con cargo en cuenta bancaria
 Banco: BBVA BANCO CONTINENTAL
 Número de operación bancaria: 0
 Fecha de operación bancaria: 01/01/0001 00:00:00

Castro, Pedro Pablo
 RUC: 20450278051

[Signature]

Abel Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C
 RUC: 20450278051

[Signature]

ING. GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67086

[Signature]

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67086



• SENCICO

Construcción Inmobiliaria Río Huallaga S.A.C.
RUC: 20450278001

[Signature]
Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION INMOBILIARIA RIO HUALLAGA
S.A.C.
RUC: 20450278001

[Signature]
Ing. Julio Cesar Palomino del Aguado
INGENIERO EN EL OBRA
CIP: 62086

[Signature]
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 62086

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario: 1662
Número de Orden: 1060679090
Fecha de Presentación: 03/11/2023 08:54:21

Datos Generales:

RUC: 20450278051
Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C
Periodo: 202308
Tipo Pago: 1 Tributo
Tributo: 7031 SENCICO
Importe Pagado: S/. 2,670

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT : 1935352144
Medio de Pago : Cargó en cuenta bancaria (bancos comerciales TI)
Banco : Banco Continental
Número de Operación : 00000000000000031776
Fecha de Pago : 03/11/2023 08:54:21

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC: 20450278051

Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 20450278051

ING. GUILLERMO ORAZ PALOMINO
CIP. 67086

GUILLERMO ORAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086



• RENTAS


 Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC. 20450278051

 Abner Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL


 PANATH CONSTRUCCIONES S.A.C.
 RUC. 20450278051

 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL



 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIF: 67086

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0601
 Número de Orden : 1058633769
 Fecha de presentación : 17/10/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20450278051
 Nombre o Razón Social : CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C
 Periodo : 202309
 Semana : 0
 Tipo de Declaración : Original
 Número de Trabajadores : 272.00
 Número de Pensionistas : 0.00
 Personal Cuarta Categoría : 123.00
 Personal Modalidad Formativa : 0.00
 Terceros : 0.00
 Regímenes Especiales : 0.00


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CP. 57089

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3042 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	S/. 15,427	S/. 0
3052 RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	S/. 30,910	S/. 0
5210 ESSALUD SEG REGULAR	S/. 72,727	S/. 0
5310 SNP - LEY 19990	S/. 5,982	S/. 0
Total a Pagar	S/. 125,046	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202309	3042 RENTA 4TA. CATEG.	S/. 15,427
202309	3052 RENTA 5TA. CATEG.	S/. 30,910
202309	5210 ESSALUD SEG REGULAR	S/. 72,727
202309	5310 SNP - LEY 19990	S/. 5,982

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 20450278051


 Guzman Tejeda
 GERENTE GENERAL


 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 20450278051

Constancia de Pago

Pago de valores - Formulario 1662

Número de orden : 783700561

10/11/2023

RUC : 20450278051
 Razón social : CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C
 Período : 09/2023
 Tipo de pago : 1 Valor
 Número de documento : 1810010027012
 Tributo : 030402 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES
 Importe pagado : S/. 15,538

Número de operación SUNAT: 000187945476
 Tipo de pago: Pago con cargo en cuenta bancaria
 Banco: BBVA BANCO CONTINENTAL
 Número de operación bancaria: 0
 Fecha de operación bancaria: 01/01/0001 00:00:00

Constructora Inmobiliaria Rio Hualaga S.A.C.
 RUC: 20450278051

Abner Guzman Tejada
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 20450278051

ING. GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CP. 67086

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CP. 67086

Constancia de Pago

Pago de valores - Formulario 1662 10/11/2023
Número de orden : 783700563

RUC : 20450278051
 Razón social : CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C
 Período : 09/2023
 Tipo de pago : 1 Valor
 Número de documento : 1810010027013
 Tributo : 030502 RENTA STA. CATEG. RETENCIONES
 Importe pagado : S/. 91,132

Número de operación SUNAT: 000187945478
 Tipo de pago: Pago con cargo en cuenta bancaria
 Banco: BBVA BANCO CONTINENTAL
 Número de operación bancaria: 0
 Fecha de operación bancaria: 01/01/0001 00:00:00

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 20450278051


Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 20450278051


Ing. Jorge ...
EL ...


GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 87086



• CONAFOVICER


 Constructora Inmobiliaria P.º del Valle S.A.C.
 RUC. 20450278051

 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


 Constructora Inmobiliaria P.º del Valle S.A.C.
 RUC. 20450278051

 Guillermo Diaz Palomino
 INGENIERO CIVIL



 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 87086

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"



CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA SAC

2023/11/03 08:53:20

Ejecutivo: LUIS MIGUEL MONTENEG - LUIS.MONTENEGRO@BBVA.COM

Pago de Instituciones

SU OPERACION HA SIDO REALIZADA

Número de Operación	290497-0
Operación	Pago de Instituciones
Usuario(s) que autoriza(n)	HENRY GUZMAN TEJADA
Número de Cuenta de Cargo	0011-0310-0100122605
Nombre de la Entidad	CONAFOVICER APOORTE REGULAR
RUC O DNI	20450278051
MES Y AÑO - MMAAAA	092023
NOMBRE APELLIDO O RAZON SOCIAL	COMRH SAC
Monto a Pagar	1,998.81 SOLES
Monto a Cargar	1,998.81 SOLES
Fecha / Hora de Tra Firma	03/11/2023 - 08:54:07

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada por favor como nota del Número de Operación

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC: 20450278051


Henry Guzman Tejada
GERENTE GENERAL


QUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CAR. 67086


Luis Miguel Montenegro
Ejecutivo



Seguros de tu éxito

Confirme y/o certifique esta garantía al instante mediante la lectura de nuestro código QR



De nuestra consideración:
Señores:

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 3045027051

CARTA FIANZA
N° E3693-00-2023

PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA * * * * *

*** S/72,546.08 ***

SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, otorga por el presente documento garantía incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al sólo requerimiento de ustedes como beneficiarios, a solicitud de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C * * * * *

Que se hará efectiva por el motivo garantizado de FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO * * * Correspondiente a Licitación Pública Nacional N°012-2022-SENASA/PRÓDESA "Construcción de la Sede para Vigilancia Sanitaria y Zona de Tratamiento Tipo II Juan Guerra- San Martín" - EVENTO COMPENSABLE N°8 - ADICIONAL * * * * *

La presente Garantía tiene una vigencia de 60 días contados a partir de las 00:00 m. 06 de Diciembre del 2023 hasta las 24:00 m. 03 de Febrero del 2024 fecha de su vencimiento y por la suma de S/*72,546.08*, (Setenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 08/100 Soles), sin que nuestra responsabilidad exceda el importe expresamente señalado.

Su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley No. 30225, su reglamento y normas complementarias, modificatorias y ampliatorias.

SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías quedará liberada de toda responsabilidad si no se exigiera notarialmente el cumplimiento de la obligación dentro de los quince (15) días siguientes después de su vencimiento, en concordancia con el Artículo 1898 del Código Civil.

San Isidro, 06 de diciembre del 2023

[Signature]
Luis Aayo Santos
Jefe de Operaciones
FIRMA AUTORIZADA

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC: 3045027051
[Signature]
Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

[Signature]
Amadeo Garcia
Gerente Titular
FIRMA AUTORIZADA

Nro 639765359



VIGENCIA DE GARANTÍA DE ANTICIPO (No corresponde)

Construcción Inmobiliaria y Sublogu S.A.C.
RUC: 2010278051

Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

CONSEJO REGULADOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RUC: 2010278053

COMITÉ DE VIGILANCIA DE LA OBRA
CIVIL

Guillermo Díaz Palomino
INGENIERO CIVIL
CIR 67086

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"



REVISIÓN DE OTRAS PENALIDADES (No corresponde)

Constructora Inmobiliaria Rio Hagata S.A.C.
RUC. 20150278053

[Handwritten Signature]

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION PARA INMOBILIARIA
RIO HAGATA S.A.C.
RUC. 20150278053

[Handwritten Signature]

ING. JUAN GUERRA MORALES
CIP. N° 56199

[Handwritten Signature]

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67084

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"



REVISIÓN DEL NOMBRE DEL ING. RESIDENTE AUTORIZADO INICIAL Y VIGENTE

CONSTRUCIONES MOBILIARIAS Y OBRAS S.A.S.
RUC: 201450278051
Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL


CONSTRUCCIONES INGENIERIA
RESIDENTES S.A.S.
RUC: 201450278051
Juan Carlos Guzman Tejada
INGENIERO EN OBRAS
RESIDENTES

Guillermo Diaz Palomino
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 17096

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"



CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE


 Constructora Inmobiliaria Rio Palomina S.A.C.
 RUC. 70450279051

 Abel Guzman Tejada
 REPRESENTANTE GENERAL


 Constructora Inmobiliaria Rio Palomina S.A.C.
 RUC. 70450279051

 Ing. Guillermo Diaz Palomino
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67086



 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67086

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Certificado de Habilidad

00-109
00109



El Ingeniero (a): JULIO CÉSAR MENDOZA DEL AGUILA
Adscrito al Consejo Departamental de: SAN MARTÍN - TARAPOTO Registro CIP N°: 58189
Fecha de Incorporación: 1988-04-30 Especialidad: INGENIERO CIVIL

EL INGENIERO SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, para el siguiente detalle:

ASUNTO ENTIDAD O PROPIETARIO LUGAR	EJERCICIO PROFESIONAL	EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA
	ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS	
	A NIVEL NACIONAL	

TARAPOTO, 23 de Marzo del 2023



LEY N° 28040

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Certificado de Habilidad



Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a) JULIO CÉSAR MENDOZA DEL AGUILA
Adscrito al Consejo Departamental de: SAN MARTÍN - TARAPOTO
Con Registro de Matrícula del CIP N°: 58189 Fecha de Incorporación: 1988-04-30
Especialidad: INGENIERO CIVIL

[Signature]
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CTR. 67086

De conformidad con la Ley N° 28058, Ley que complementa a la Ley N° 18053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a)

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PROPIETARIO	ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS
LUGAR	A NIVEL NACIONAL

[Signature]
Construtora Intermare Rie Hojalata S.A.C.
R.U.C. 20450275051
Alfonso Guzman Pejada
GERENTE GENERAL

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DIA	MES	AÑO
31	03	2024

TARAPOTO, 23 de Marzo del 2023

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

[Signature]
Ing. Maria del Carmen Ponce Mejia
Decana Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

[Signature]
Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú



NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA PRESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

N° - A - 0116892
PC-F001-8839

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): LUIS ALBERTO SANCHEZ PINEDO

[Signature]
GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67686

Acreditado al Consejo Departamental de: SAN MARTIN - TARAPOTO

Con Registro de Matricula del CIP N°: 116382

Fecha de Incorporación: 2010-04-29

Especialidad: INGENIERO CIVIL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL	<i>[Signature]</i> RUC: 20890278051
ENTIDAD O PROPIETARIO	ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS	Ing. Julián José Rodríguez del Aguila RUC: 20890278051 CIP N° 54396
LUGAR	A NIVEL NACIONAL	

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VALENCIA HASTA:		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2024

Contratada por: *[Signature]*
RUC: 20150274851
[Signature]
AGENTE GENERAL

TARAPOTO, 02 de Agosto del 2023

VÁLIDO SOLO ORIGINAL




[Signature]
Ing. María del Carmen Ponce Mejía
Decana Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

[Signature]
Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú
Ing. Juan José Segundo Flores Flores
SECRETARIO



PROGRAMA DE OBRA (CARGO)


 Construcción Inmobiliaria S.A.
 RUC. 2015027051

 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


 INGENIERIA CIVIL
 RUC. 2015027051

 Ing. Jorge ...
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67217


 INGENIERIA CIVIL
 GUILLERMO ...
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67216

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTÍN"



CARGO

Tarapoto, 15 de diciembre del 2023

CARTA N° 171-MS/JG-COIRH-2023/GG

Recibido
15/12/2023
10:10a.m.

Señores:
EMPRESA SUPERVISORA FERUHUJA S.A.C.
Ciudad. -

Atención:
Ing. Guillermo Díaz Palomino
Gerente de Obra

Asunto : REMITE PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA DEL EVENTO COMPENSABLE N° 08 ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS VALORIZACIONES DE DICIEMBRE 2023.

Ref. : a) CONTRATO N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II
Ejecución de obra "Construcción de la Sede para Vigilancia Sanitaria y Zona de Tratamiento Tipo II Juan Guerra - San Martín"
b) Adenda N° 15 al Contrato N° 048-2022-SENASA-PRODESA FASE II

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para hacerle llegar mis cordiales saludos y a la vez indicarle que, con la aprobación de la modificación de la periodicidad y el pago de valorizaciones correspondientes al mes de diciembre de 2023, según documento de la Ref. b), del Contrato de ejecución de la obra "Construcción de la Sede para Vigilancia Sanitaria y Zona de Tratamiento Tipo II Juan Guerra - San Martín", se está remitiendo la Programación actualizada que refleja los avances reales logrados, la nueva fecha de terminación de la obra y sus efectos en el calendario de ejecución de las tareas restantes, en cumplimiento a la Subcláusulas 27.2 y 27.3 de las CGC del contrato de la Ref. a).

Los cronogramas actualizados se están remitiendo para su revisión y de encontrarse conforme se le dé el trámite correspondiente, recomendando se nos devuelva un ejemplar en original debidamente suscrito y visado por la Entidad una vez aprobados.

Sin otro particular y reiterándole mis saludos, quedo de Ud.

Atentamente,

Constructora Inmobiliaria Río Huallaga S.A.C.
RUC. 2045027805


Abner Cruzman Tejada
INGENIERO CIVIL

CONYTHA NET S.A. PHARACORBA S.A.C.
RUC. 2045027805

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67085



PANEL FOTOGRÁFICO


 Construcción y Mantenimiento de Obras
 RUC: 204027051

Abner Guzman Tejada
 JEFE GENERAL


 Construcción y Mantenimiento de Obras
 RUC: 205027051

Guillermo Diaz Pacomino
 JEFE GENERAL


 Construcción y Mantenimiento de Obras
GUILLERMO DIAZ PACOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87086

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

	PANEL FOTOGRÁFICO - VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02 DEL EVENTO COMPENSABLE N° 08 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES ESPECIALIDAD: OBRAS PONTONARIAS, TRABAJOS PREVENTIVOS, SEGURIDAD Y SALUD, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	MES
		Dic-23

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN"



FOTOGRAFIA 01: TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO.



FOTOGRAFIA 02: EXCAVACIÓN MANUAL HASTA NIVEL DE CIMENTACIÓN PARA SARDINELES



FOTOGRAFIA 03: RELLENO CONTROLADO CON MATERIAL DE PRESTAMO.



FOTOGRAFIA 04: ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE.

FIRMA:


 Construcción Pontonaria Rio Palomino S.A.C.
 RUC: 20450278051
Abner Garmun Tejada
 GERENTE GENERAL


 CONSORCIO PARA EL DESARROLLO
 RUC: 20450278051
 Ing. Guillermo Diaz Palomino
 INGENIERO CIVIL


GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87086

	PANEL FOTOGRÁFICO - VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02 DEL EVENTO COMPENSABLE N° 08 ACTIVIDADES PLANIARIAS EN S. MES ESPECIAL 040, 091 OBRAS PORVINCIONALES, FRAGALOS PERFORACIONES, SEGURIDAD Y SALUD EN ESTRUCTURAS	MES
		Dic-23

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN



FOTOGRAFIA 05: DEMOLICIÓN PARCIAL DE CUNETAS EXISTENTES PARA LA CIMENTACIÓN DE DADOS



FOTOGRAFIA 06: CONCRETO PREMEZCLADO DE $f_c=175$ kg/cm² EN VEREDAS. ACABADO SEMIPULIDO



FOTOGRAFIA 07: ENCOFRADO NORMAL DEL SARDINEL REFORZADO.



FOTOGRAFIA 08: ACERÓ DE REFUERZO EN SARDINEL REFORZADO.

FIRMA:

Constructora Inmóviliana Río Huasteca S.A.C.
RUC: 20450238051

Almer Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION INMOBILIARIA
RUC: 20450238051

[Signature]
Inic. Julio 14 2023
HE N° 18.001.141.13882
DPTO. 50144

[Signature]
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

	PANEL FOTOGRÁFICO - VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL EVENTO COMPENSABLE N° 08 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 SERVICIOS PRELIMINARES, DESARROLLO Y SALUD DE LAS ESTRUCTURAS	MES Dic-23
	PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN"	

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN"



FOTOGRAFÍA 09: VACIADO DE CONCRETO PRÉMEZCLADO DE F'c=210 KG/CM2 EN SARDINELES REFORZADOS.



FOTOGRAFIA 10: COLOCACION DE LA SUB BASE GRANULAR E=0.30 M CON EQUIPO EN LA RAMPA DE INGRESO VEHICULAR.



FOTOGRAFIA 11: VACIADO DE CONCRETÓ PRÉMEZCLADO DE F'c=210 KG/CM2 PARA DADO DE CIMENTACION PARA CUNETETA


GULL EMANO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67086

FOTOGRAFIA 12:

FIRMA:


Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


GULL EMANO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67086

**INFORME DE
ESPECIALISTAS
(La ejecución del
Adicional 08 esta a
cargo del Residente)**

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 67085

Constructora Inmobiliaria Rio Hualala S.A.C.
RUC: 2045027805

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION INMOBILIARIA
RIO HUALALA S.A.C.
RUC: 2045027805

INGENIERO CIVIL
CIP: 67085





INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS COVID 19

Construcción y Mantenimiento Rodrialta S.A.C.
RUC: 2045027800
Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RODRIALTA S.A.C.
RUC: 2045027800
[Signature]

[Signature]
GULLERMO DIAZ BALOMMO
INGENIERO CIVIL
CIP 87086

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

 COIRH	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"	ELABORADO: PCSIMO
	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID EN EL TRABAJO - JUNIO 2023	REVISADO: ROMAOS
		Página 1


PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID EN EL TRABAJO

Mediante Decreto Supremo N° 003-2023-SA, publicado el 24 de febrero de 2023, se promulgó la Emergencia Sanitaria hasta el 25 de mayo de 2023. En este sentido, al no haberse emitido norma alguna que extienda nuevamente dicho estado, la Emergencia Sanitaria, ha llegado a su fin. Además, se precisa que, mediante Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, publicado el 27 de octubre de 2022, el Gobierno Peruano oficializó el fin del Estado de Emergencia Nacional que se declaró en el año 2020 por las circunstancias que venían afectando la vida y la salud de las personas como consecuencia de la COVID-19 además, con fecha 05 de mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el fin de Emergencia Sanitaria Internacional por la COVID-19.

Por lo tanto, ya no correspondería su aplicación durante la ejecución de la Obra.

Constructora Inmobiliaria Hualpa S.A.S.
 RUC. 20150278051

 Abel Guzman Tejada
 REPRESENTANTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 HUALPA S.A.S.

 Pastor B. Villar Acero
 ING. DE SISTEMAS DE SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 HUALPA S.A.S.

 Guillermo Diaz Palomino
 INGENIERO CIVIL


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67085



INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Construcción Limpia y Saludable S.A.C.
RUC: 20450278051

Abner Guzman Tejada
Abner Guzman Tejada
INGENIERO CIVIL

CONSTRUCCIÓN LIMPIA Y SALUDABLE S.A.C.
RUC: 20450278051

Guillermo Jaz Palomino
Guillermo Jaz Palomino
INGENIERO CIVIL

Guillermo Jaz Palomino
GUILLEIRMO JAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"



• EQUIPO TOPOGRÁFICO


 Cotacachi - Bolívar - P. 11021
 RUC: 20100220081

Abner Guzman Tejada
 SECRETARÍA GENERAL



GUILLEMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP 57085




GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP 57085

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"



AÑO: 2023
N° 041 - 27027

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



OTORGADO A: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
EQUIPO: Nivel Automático Marca LEICA Modelo NA-720
SERIE: 0080670

RUC: 2045078051

FECHA DE EMISIÓN: 2023-07-21

GEOTOP SAC, CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DIN 18723, SEGÚN LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ESTABLECIDOS

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
Constante Estadística: 100m
Telescopio Imagen directa: 20X
Frecuencia de medición doble a 1km: 2.5 seg.

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO

BASE	CALIBRACIÓN	APARÉNCIA VISIBLE
CONDICION FÍSICA: OK	HORIZONTAL: OK	COLOR: OK
MUEL: OK		LIMPIEZA: OK
NOVIJILLOS: OK		

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN			
NIVEL CIRCULAR: OK	VALOR DEL PATRÓN: 90°00'00"	VALOR LÍMITE EN EL DISTRIBUIDO: 90°00'00"	ERROR: 0 mm.
COMPENSADOR: OK			ACCENTUACIÓN: 2.8 mm
ALINEACIÓN DE NIVEL: OK			

CONDICIONES AMBIENTALES DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN

LUGAR: Laboratorio de Servicio Técnico GEOTOP S.A.C.
TEMPERATURA: Promedio de 20°C con variación de +/- 0.5°C. Humedad Relativa de 66%.

TRAZABILIDAD DE LA VERIFICACIÓN

EQUIPO PATRÓN: Equipo Patrón Estación Total Marca LEICA Modelo TS11 1" R500 - Serie: 1853736, con certificación N° 81-A23-089 - 31012023

Colimador marca LEICA con telescopio cuyo retículo es enfocado al infinito, el grosor de sus brazos está dentro de 1" y consta 4 colimadores. El colimador principal HZ1 consta de 4 retículos en platina tipo 2 colimadores verticales V1 y V2 constan de un solo retículo y el segundo colimador HZ2 incluye vista de cámara con distancia de enfoque infinito y una distancia focal de 250mm, apertura efectiva de 60mm y 2" de campo de visión, que es revisado periódicamente con el equipo patrón Estación Total Marca LEICA Modelo TS11 1" R500 - Serie: 1853736 con retículo de lectura directa inversa.

FECHA DE CALIBRACIÓN: 2023-07-21
PRÓXIMA CALIBRACION: 2024-01-21

GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
DIP. 67086

DATOS: ESTE EQUIPO ANTES DE SALIR DE ALMACEN HA SIDO REVISADO Y SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO. ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE EL ADECUADO CUIDADO. LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR POSIBLES DAÑOS CAUSADOS POR UNA MALA MANIPULACIÓN Y/O TRANSPORTE INAPROPIADO.

ENTREGUÉ CONFORME:

Ahner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL
Coordinador de Servicio Técnico

John Sambrino Muñoz
Jefe de Servicio Técnico

FERNANDO DÍAZ PALOMINO
RUC: 4150278051

Certificación ISO 9001:2015 Nro. 031-0325-21



Servicio Técnico autorizado
- when it has to be right

TOPOCAJ

SOMOS MAS QUE TOPOGRAFOS



SERVICIOS DE INGENIERIA Y TOPOGRAFIA - VENTA - ALQUILER - SERVICIO TECNICO DE ESQUIPOS TOPOGRAFICOS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

N° CE-56910/2023

Otorgado A:

LUIS ALBERTO CASTREJON RAMIREZ

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
ESTACION TOTAL	TOPCON	ES-105	GZ5124

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Ángulos	Valor del Patrón	Valor Obtenido	Error	Precisión Angular
DIRECTO	00°00'00"	00°00'00"	00°00'00"	± 00°00'05"
INVERSO	180°00'00"	180°00'00"	00°00'00"	± 00°00'05"

PATRON UTILIZADO

SET COLIMADOR MODELO W550 - 3. Se hace una línea al horizonte enfocado al infinito con un grosor de 01" del trazo del retículo, este colimador es patrocinado periódicamente por un teodolito WILD modelo T2 de precisión al 01" con el método de lectura DIRECTA – INVERSA.

TOPOCAJ SRL, a través de su servicio técnico CERTIFICA que el equipo en mención se encuentra totalmente revisado, controlado, calibrado y 100% operativo, cumpliendo con las especificaciones técnicas de fábrica y los estándares internacionales establecidos (DIN 18723), sugiriéndose una recalibración en un periodo máximo de 06 meses, aproximada al 26 DE ABRIL DE 2024.

Nota: TOPOCAJ SRL no se responsabiliza por desajustes en los equipos causados por un inadecuado transporte del mismo.

FECHA DE EMISION	PROXIMA CALIBRACION	Validez de Certificado
26 - OCTUBRE - 2023	26 - ABRIL - 2024	06 Meses

Construtora Inmobiliar Rio Huancayo S.A.C.
RUC: 20450275053

ADRIAN GUZMAN TEJADA
GERENTE GENERAL

Joseluis R. Espinosa Bordaño
GERENTE GENERAL
TOPOCAJ SERVICIOS CIVILES S.R.L.
RUC: 20808174022




CONSTRUTORA INMOBILIARIA RIO HUANCAYO S.A.C.
RUC: 20450275053

LUIS ALBERTO CASTREJON RAMIREZ
INGENIERO CIVIL
CIP: 57086

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 57086



• FICHAS TÉCNICAS


 Constructora Inmobiliaria Rio Chiriquipe S.A.S.
 RUC: 2005017884

 Abner Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL


 CONSULTORA DE INGENIERIA
 RIO CHIRIQUIPE S.A.S.
 RUC: 2005017884

 Ing. [Illegible]
 INGENIERO CIVIL



 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67036


EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTÍN"


GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 61006



CONSTRUCCIONES INKA FERRO S.A.S.
RUC. 30450274081
Ing. Fulvio Castro Palomino
CIP. 61191

ArcelorMittal

Construcciones Inka Ferro S.A.S.
RUC. 30450274081

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL



¡Construye con el mejor acero del mundo!

Cumple 02 normas a la vez:
NTP341.031/Norma Americana ASTM A615 y
NTP339.186/Norma Americana ASTM A706.

FICHA TÉCNICA

Representante oficial de barras corrugadas:

Inkaferro

SOLUCIONES EN ACERO

 /inkaferro  /inkaferroperu  /inkaferroperu  Inkaferro Perú

www.inkaferro.com.pe



Composición Química



DATOS:
 NTP Norma Técnica Peruana
 ASTM American Society of Testing Materials (Asociación Americana de Ensayo de Materiales).

- NTP 341031 / ASTM A615, grado 60
 Elemento químico y su valor máximo permitidos según norma técnica
- NTP 339186 / ASTM A706, grado 60
 Elemento químico y su valor máximo permitidos según norma técnica

La NTP 341031 grado 60 (equivalente a la ASTM A615 grado 60), no limita la composición química de los aceros, únicamente establece el nivel máximo permitido de fósforo (P).

La NTP 339186 grado 60 (equivalente a la ASTM A706 grado 60), limita la composición química, restringiendo el porcentaje de carbono (menor que 0.33%).

Las barras corrugadas de ArcelorMittal cumplirán ambas normas a la vez.

Propiedades Mecánicas

Ensayo realizado - primer semestre 2022 en colaboración de la pulpería de destino*

CONSTRUCIONES S.A.
 RUC: 20450278154

Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

GULLERMO DÍAZ BALAMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87086

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



La NTP 341031 / Norma Americana ASTM A615 grado 60 y la NTP 339186 / Norma Americana ASTM A706 grado 60 exigen una resistencia mínima a la tracción de 550 Mega Pascales (Mpa).

Las barras corrugadas de ArcelorMittal están por encima de los valores mínimos permitidos por ambas normas técnicas.

LÍMITE DE FLUENCIA



La NTP 339186 / Norma Americana ASTM A706 y NTP 341031 / Norma Americana ASTM A615 exigen un límite de fluencia comprendido entre el rango mínimo 420Mpa y máximo 540Mpa.

La barra corrugada ArcelorMittal tiene un límite de fluencia dentro del rango establecido por ambas normas técnicas.

ALARGAMIENTO (Índice de ductilidad)



El alargamiento mínimo según norma es de 11% y 12%.

Para la barra corrugada, el alargamiento es un indicador de la ductilidad. Los valores que exigen las normas (NTP 341031 / Norma Americana ASTM A615 y NTP 339186 / Norma Americana ASTM A706) se especifican en la tabla de requisitos técnicos.

La barra corrugada ArcelorMittal de T° de diámetro, supera el valor mínimo de 18.0% establecidos por ambas normas técnicas.

Requisitos técnicos de la barra corrugada ArcelorMittal grado 60

Normas	Díametro de barra	Sección (mm ²)	Perímetro mm	Peso Kg/m	Alargamiento en 200mm	Resistencia a la tracción R	Límite de fluencia (σ _y)	Relación (R _t /σ _y)	Díametro del Rn
Cumple la Norma NTP 341031 Grado 60 / ASTM A 615 Grado 60	6 mm	28	16.9	0.322	11%	CONSTRUCIONES S.A. RUC: 20450278154 GERENTE GENERAL	550 Mpa (5,408.34 Kg/cm ²) mínimo	420 Mpa (4,280 Kg/cm ²) mínimo 540 Mpa (5,300 Kg/cm ²) máximo	≥1.25
Cumple simultáneamente con las Normas NTP 341031 Grado 60 / ASTM A615 Grado 60 y NTP 339186 Grado 60 / ASTM A706 Grado 60	8 mm	50	28.9	0.398	14% mínimo				
	3/8"	71	29.9	0.560					
	12 mm	103	37.9	0.638					
	1/2"	129	39.9	0.914					
	5/8"	199	49.9	1.052					
	3/4"	224	59.8	2.295					
	7"	816	79.8	3.973					
1 3/4"	1004	102.8	7.907						

*d - diámetro nominal de la barra, establecido por la Norma Técnica.

*Excepción la barra de 6 mm que cumple únicamente con la norma NTP 341031 Grado 60 / ASTM A615 Grado 60.

CEMENTO TIPO I

“ESTRUCTURAL”



DESCRIPCIÓN

Cemento Portland Tipo I. Gracias a su nuevo diseño de Clinker, se logra un concreto más durable brindando alta resistencia a todas las edades.



USOS

- Cemento de uso general.



ATRIBUTOS

Diseño supera los requisitos de la normas nacionales

Altas resistencias a todas las edades

- Desarrolla altas resistencias iniciales que garantiza un adecuado avance de obra.
- El diseño correcto en concreto garantiza un menor tiempo de desencofrado.

RECOMENDACIONES



Mantener el cemento en un lugar seco bajo techo, protegido de la humedad.



Almacenar en pilas de menos de 10 sacos



Utilizar agregados y materiales certificados y de buena calidad.



A mayor sea la humedad de los agregados, se debe cosificar menor cantidad de agua

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN



Resistencia a la compresión (PSI)

Resultado Promedio ■ Requisito NTP334.090 / ASTM C150

CONSTRUCTORA INNOVACIÓN PIC FUJIRAY S.A.C.
RUC. 20550770057
Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INNOVACIÓN PIC FUJIRAY S.A.C.
RUC. 20550770057
[Signature]
GERENTE GENERAL

Cemento Portland tipo I

Requisitos Normalizados

NTP 334.009 Tablas 1 y 3

Resultado promedio de nuestros productos.

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 87686

Propiedades Químicas

QUÍMICOS	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO DE ENSAYOS
MgO (%)	6.0 máx.	2.2
SO ₃ (%)	3.0 máx.	2.7
Pérdida por ignición (%)	3.5 máx.	3.1
Residuo insoluble (%)	1.5 máx.	0.7

Propiedades Físicas

REQUISITOS	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO DE ENSAYOS
Contenido de arena del mortero (Volúmen %)	12 máx.	6
Superficie específica (cm ² /g)	2600 mín.	3810
Expansión en autodesecado (%)	0.90 máx.	0.12
Densidad (g/ml)	A	3.12
Resistencia a la compresión mín. (MPa)		
1 día	A	15.8
3 días	12.0	30.3
7 días	19.0	37.0
28 días ⁽¹⁾	29.0	42.1
Tiempo de fraguado, minutos, Vicat		
Inicial, no menor que:	45	110
Final, no mayor que:	375	238

A No específicas.
 (1) Requisito opcional.

CONSTRUCCIONES Y MOBILIARIO S.A.S.
 RUC. 2040274081
 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

VENTAJAS



Presentaciones: Bolsas de 42.5 kg, granel y big bag de 1TM.



Fecha y hora de envasado garantiza máxima frescura.

Confiamos que el cemento descrito en las tablas, al tiempo del envío, cumple con los requisitos químicos y físicos de la NTP 334.009.2016



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Antisol® S

Agente de curado de concreto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Antisol® S es un agente de curado líquido aplicado con aerosol y listo para usar para prevenir la pérdida de agua de la superficie del concreto recién colocado. Forma un sello microcristalino en los poros del concreto que reduce la tasa de evaporación de la humedad de la mezcla de concreto. La adhesión de los tratamientos posteriores a la superficie del hormigón no se ve afectada.

USOS

- Edificios
- Industrias manufactureras
- Hangares y áreas de carga
- Muro de contención
- Estructuras pretensadas
- Canales de irrigación
- Estructuras de Ingeniería civil

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Generalmente mejora la apariencia de la superficie.
- Reduce el agrietamiento
- Ayuda a alcanzar las fortalezas requeridas.
- Reduce el encogimiento
- Controla la hidratación del cemento
- Reduce la formación de polvo.
- Permeabilidad del hormigón reducida.
- Alivia otros costosos métodos de curado.
- La adhesión de los tratamientos posteriores a la superficie del hormigón no se ve afectada.

CERTIFICADOS / NORMAS

Cumple con la Norma U.N.I. 8656 bajo la clase tipo 1.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques	<ul style="list-style-type: none"> • Envase plástico x 1gal • Balde x 18 L • Cilindro x 200 L
Apariencia / Color	Líquido transparente
Vida Útil	24 meses desde la fecha de producción.
Condiciones de Almacenamiento	Sika® Antisol® S puede ser almacenado en un sitio libre de congelamiento a temperaturas sobre los +5 °C
Densidad	~1.11±0,01 kg/l

Construcciones Inmobiliarias Huallaga S.A.C.
R.U.C. 20450278051
Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

Guillermo Díaz Palomino
GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

CONSTRUYENDO CONFIANZA
CONSTRUYENDO CONFIANZA
R.U.C. 20450278051
Benigno...
Benigno...
CIP. 54189

Hoja De Datos Del Producto
Sika® Antisol® S
Septiembre 2021, Versión 01.04
07141904300000008

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	0,20 L/m ²
Rendimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Envase x 1gal rinde 19 m². • Balde x18 l rinde 90 m². • Cilindro x200L rinde 1,000 m²
Equipo	Aplicación <ul style="list-style-type: none"> • Mochila tipo mano o pulverizadores motorizados que garantice un aspersión uniforme. • La idoneidad del equipo debe ser aprobada antes de usar para una aplicación completa.

NOTAS

Cualquier duda o consulta favor de contactar con el servicio técnico de Sika.

LIMITACIONES

- Se recomienda que Sika® Antisol® S se aplique lo antes posible después de que la superficie de concreto esté lista para recibir el compuesto de curado.
- Después de la aplicación, protéjase de la luz solar directa, el viento seco intenso o la lluvia durante al menos 2 a 3 horas, dependiendo de las condiciones ambientales.
- Cuando se requiere una superficie resistente a la abrasión altamente duradera, es decir, en condiciones de exposición severa, aplique una capa adicional de Sika® Antisol® S después de 3 días. Los sistemas de revestimiento posteriores se pueden aplicar después de 7 días.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie de concreto debe estar libre de agua superficial. La evaporación de la superficie del agua puede tomar de 30 minutos a 2 horas, dependiendo de la temperatura y la relación agua / cemento.

APLICACIÓN

Superficies Verticales luego de remover el encofrado, humedezca el concreto con agua, luego cuando esté saturado con la superficie seca rocíe el producto cubriendo uniformemente la superficie de concreto.

Superficies Horizontales coloque el producto en una niebla fina para cubrir completamente la superficie de concreto. Mantenga la presión en el equipo de aplicación para garantizar una aspersión uniforme.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los sitios de aplicación del producto.

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita u de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de las Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en In-

Constructora Inmobiliaria del Perú S.A.C.
RUC: 20440278054

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

Guillermo Díaz Palomino
GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 67025

CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS DEL PERU S.A.C.
RUC: 20440278054
Guillermo Díaz Palomino
GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 67025

Hoja De Datos Del Producto
Sika® Antisol® S
Septiembre 2021, Versión 01.01
0214026111000000008

CONSTRUYENDO CONFIANZA



leer a través de nuestra página web
www.sika.com.pe. La presente edición anula y reempla-
za la edición anterior, misma que deberá ser des-
truida.

00-8787

COMERCIALIZADORA PERUANA S.A.C.
RUC: 20450278051

Adner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

GUILBERTO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 87086

COMERCIALIZADORA PERUANA S.A.C.
RUC: 20450278051

Ing. **Roberto Rodríguez de la Cruz**
MAGISTER EN CONSTRUCCION
CIP: 56190

Sika Perú
República Industrial
E. Túncup Me. "B" lote B
Lima, Lima
Tel: (511) 610-8090

Hoja De Datos del Producto
Sika Anchor® S
Tipo: M30, Modulo: 01.04
C0140501000005076

C:\Users\user\PE-009-002\1-1_1.pdf





FICHA ESTÁNDAR DE FAMILIA DEL CATÁLOGO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEL MEF

FICHA ESTÁNDAR N° 87 FAMILIA 20720003 MADERA TOLLO

GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 67086

Dirigido a Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local

Consultora Informática Andina S.A.C.
RUC: 20450278851

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
MARÍA OSHIRO
CIP: 67086

Elaborado por: María Oshiro - Chinen
Oficina General de Tecnologías de la Información - Ministerio de Economía y Finanzas - Catalogación

8 de marzo de 2016

OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 67086

GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 67086

FICHA ESTÁNDAR Nº 82

CODIGO	20720003 - MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis)
TIPO	SUMINISTRO
GRUPO	20 CONSTRUCCIONES: MATERIALES, RPTOS Y ACC. INCLUYE SANITARIOS
CLASE	72 MADERAS Y ACCESORIOS DE MADERA EN GENERAL
FAMILIA	0003 - MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis)
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

I. ALCANCE:

La familia Madera tornillo (Cedrelinga cateniformis), llamado también aguano, incluye las maderas aserradas y las rolizas. También las piezas cortadas de esta madera, tales como tablas, tablones, etc. Excluye a los tableros contrachapados (triplay) de este material así como a los postes.

II. DETALLE TÉCNICO:

Esta madera pertenece a la familia Fabaceae.

Nombre común, regional o vernacular: tornillo (Tingo María), aguano (Cuzco y Puno), huancaespí (Iquitos y Satipo), cedro masha, cedro mayna (Pozuzo y Oxapampa), Isaik.

Nombre comercial: Huarango, Tornillo

Nombre científico: Cedrelinga cateniformis

Sinónimos: Piptadenia cateniformis Ducke, Pithecellobium cateniformis (Ducke) L. Cárdenas

Símbolo: CEDC (según NTP 261.006)

CONSTITUCIÓN INMOBILIARIA
RUC: 20450278051

Ing. Julio César Sánchez Rodríguez
Ingeniero de OBRAS
Estructurales

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

Distribución Geográfica: La distribución de la especie fue obtenida de la literatura y de repertorios de herbario e inventarios, se encuentra en los departamentos de Junín, Madre de Dios, Loreto y Ucayali, entre 0 y 500 msnm. La especie existe en cantidades altas en la amazonía norte y en cantidades medias en la amazonía sur del Perú.

Árbol: Alcanza 40 m de altura y hasta 120 cm de diámetro; tronco recto cilíndrico; alatones poco o medianamente desarrollados, gruesos. La corteza superficial del tronco es de color pardo oscuro, apariencia rugosa, ritidoma coriáceo; la corteza muerta se desprende en placas rectangulares, por encima de los alatones; corteza muerta leñosa, cortchosa, de 1 cm de espesor. Corteza viva de 0.5 cm de espesor, de color rosado, textura arenosa y de sabor dulce.

Constitución Inmobiliaria Río Huallaga S.A.C.
RUC: 20450278051
Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA

Color: El tronco recién cortado presenta las capas externas de madera (albura) de color rosado y las capas internas (duramen) de color rojizo claro y de forma regular, observándose entre ambas capas un gradual contraste de color. En la madera seca al aire la albura se torna de color rosado HUE 7/4 5YR y el duramen marrón rojizo HUE 5/4 5YR. (Munsell Soil Color Charts).

Olor Distintivo: urticante al aserrarse.

Lustre o brillo: Moderado a brillante.

Grano: Entrecruzado.

Textura: Gruesa.

Veteado o figura: Poco definido en el corte tangencial, arcos superpuestos ligeramente diferenciados con líneas vasculares oscuras pronunciadas y en el corte radial bandas angostas, paralelas, salnadas

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

El Tornillo es una madera medianamente pesada, presenta contracciones lineales media y contracción volumétrica estable. La resistencia mecánica se sitúa en el límite de la categoría media. La madera, es moderadamente fácil de aserrar por su mediana resistencia mecánica. Presenta buena trabajabilidad y acabado apropiado para la producción de piezas estructurales para construcción de viviendas, puertas y ventanas. Seca en forma rápida, puede soportar horario fuerte en secado artificial demorando aproximadamente 55 horas, es estable con bajo riesgo de alabeo. La albura es susceptible al ataque biológico, las piezas con albura requieren ser preservada por sistema de vacío presión; el duramen es resistente y por ello las piezas enteramente de duramen no requieren de preservación.

UTILIDAD

Actualmente es usada en pisos, estructuras de casas, armaduras, vigas, columnas, carpintería de interiores, artesanía y en la fabricación de puertas, ventanas y carrocerías.

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM**a.- ATRIBUTOS BÁSICOS:**

Descripción	Atributo básico
MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis)	Medidas (expresado en mm y m) Si es madera rolliza, preciso


GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

Constructora Inmobiliaria Río Huataga S.A.C.
RUC 2045000501


Abner Guzman Tejada
EFREN E. GARCIA

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN

La familia 20720003 MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) quedaría estandarizada de la siguiente manera:

MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) XX YY ZZ

- Siendo XX el espesor (expresado en mm)
- Siendo YY el ancho (expresado en mm)
- Siendo ZZ el largo (expresado en m)

V. OBSERVACIONES

Nombres y familia:

Familia: Familia botánica a la cual pertenece la especie maderable.

Nombres comunes o regionales: son los nombres adoptados en cada zona de extracción para identificar una especie forestal

Nombre comercial: es el nombre adoptado para el uso en el comercio.

Nombre científico: Nombre que identifica exactamente la especie maderable a nivel botánico. El nombre del autor (es) de la especie se indican entre paréntesis o abreviados.

Sinónimo: Nombre(s) científico(s) anteriormente usado(s).

Codificación: Es la determinación de las letras que identifican la pieza de madera aserrada de acuerdo con su nombre botánico (científico).

De acuerdo con la Norma Técnica Peruana 261.003: 2015, las medidas estarán dadas en milímetros para el espesor y el ancho, siendo la medida del largo expresada en metros. Para el caso del área, se expresará en metros cuadrados y el volumen en metros cúbicos.

El área se expresa en metros cuadrados, se usa la siguiente fórmula según la NTP:

$$A = \frac{a \cdot l}{1000}$$

Donde:

a = ancho en milímetros

l = longitud en metros

CONSULTORA DEL NOROCCIDENTE
S. R. L. C. S. R. L.
RUC: 2045077002

CONSEJO REGULADOR DE LA INGENIERÍA CIVIL
M. P. 14
M. P. 14
M. P. 14

Consultora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC: 2045077002
Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

Gullermo Diaz Palomino
GULLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 57085

El volumen se expresa en metros cúbicos, se usa la siguiente fórmula:

$$V(m^3) = \frac{e \cdot a \cdot l}{10^6}$$

Donde:

e = espesor en milímetros

a = ancho en milímetros

l = longitud en metros

VI. BIBLIOGRAFIA

Norma Técnica Peruana 251.006: 2003 MADERA. Nomenclatura de las especies forestales más importantes del Perú, sistema de codificación y marcado de madera aserrada. Indecopi 2ª edición. 2003, Lima.

Norma Técnica Peruana 251.003: 2015 MADERA ASERRADA. Dimensiones. Métodos de medición. Inacal. 2ª edición. 2015, Lima

Distribución de las especies forestales del Perú. Osinfor. 2013, disponible en <http://www.osinfor.gob.pe/portal/destacados.php?id=23>.

Guía Técnica: Verificación de Maderas en el Puesto de Control "La Pastora", Ing. Lalf Armando Portal Cahuana. Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – Ingeniería Forestal y medio ambiente, 2010, Puerto Maldonado.

[http://cedinfor.lamolina.edu.pe/Articulos_RFP/vol10_no1-2_80-81_\(14\)/vol10_art10.pdf](http://cedinfor.lamolina.edu.pe/Articulos_RFP/vol10_no1-2_80-81_(14)/vol10_art10.pdf)

<http://www.maderasperu.com/tornillo>

<http://ecuadorforestal.org/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/ficha-tecnica-no-5-cedro/>

VII. FOTO DE REFERENCIA



COMPROBADO EN EL PUESTO DE CONTROL
 N° 001 2951 2051
 Ing. Guillermo Díaz Palomino
 INEF

Consorcio Inmobiliario Ric Huayaga S.A.C.
 RUC. 205122051

Abner Cruzan Tejada
 GERENTE GENERAL

Lima, 6 de marzo de 2016

GULLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CP. 57134



• CERTIFICADOS DE CALIDAD

Construcción Integrada de Aguas S.A.C.
 RUC: 20450278051

[Handwritten Signature]

Abner Guzmán Tejada
 Gerente General

Construcción Integrada de Aguas S.A.C.
 RUC: 20450278051

[Handwritten Signature]

Ing. Jorge P. Hernández del Aguila
 Ing. Civil No. 10000

[Handwritten Signature]

GALLERMO DIAZ BALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 87086

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTÍN"

INKAFERRO PERU S.A.C.
Av. Argentina Nro. 3441 (Cesado de Mirña) Prov. Const. del Callao - Prov. Const. del Callao - Peru
Teléfono: 01 651 1574
Email: facturaciones@inkaferro.com.pe
Web: https://www.inkaferro.com.pe

DATOS DEL TRASLADO

FECHA DE EMISION: 15/12/2023 FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 15/12/2023
MOTIVO DE TRASLADO: MODALIDAD DE TRASLADO: Transporte Privado
VENDEDOR: FRANCIS YRELLA SANCHEZ PANGFO PISO BALANZA: 0
PEJUDO: 4800650
PUNTO DE PARTIDA: AV. VIA DE EVITAMIENTO CDRA. 21 - Tarapoto - San Martin
PUNTO DE LLEGADA: AV. VIA DE EVITAMIENTO CDRA 21-LA BANDA DE SHILCAYO-SAN MARTIN

DATOS DEL COMPRADOR

Apellido y Nombre / Razón Social: SUNCO SIDA S.A.C.
Tipo y Nro. Doc. Identidad: RUC 20605649017

DATOS DEL CONDUCTOR Y DEL VEHICULO

Transportista: Unidad Marca:
RUC Transportista: Unidad Placa:
Nombre Conductor: DARWIN GUZMAN TEJADA Unidad Tole: Licencia Conductor: B0081515

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD
1	2018ACORAMC0R1309	BARRA CORRUGADA AMBO BRASH 1/2 x 09 Hts.	BARRA	468

CONSTRUCION INDUSTRIAL Y OBRAS S.A.C.
RUC: 20450278051
[Signature]
Abner Guzman Tejada
INGENIERO CIVIL

CONSTRUCION INDUSTRIAL Y OBRAS S.A.C.
RUC: 20450278051
[Signature]
INGENIERO CIVIL
CIP: 87086

[Signature]
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 87086

Comentarios: Basado en Pedidos de cliente 17-rendercar-196.

INKAFERRO PERÚ S.A.C.

Av. Argentina Nro. 7441 (Costado de Miraflores) Prov. Const. del Callao - Prov. Const. del Callao - Perú

Teléfono: 01 631 1974

Email: facturaciones@inkaferro.com.pe

Web: https://www.inkaferro.com.pe

DATOS DEL TRASLADO

FECHA DE EMISION: 16/12/2023
 MOTIVO DE TRASLADO: Venta
 VEHICULADOR: FRANCIS YRELLA SANCHEZ RENGIFO
 PUNTO DE PARTIDA: AV. VIA DE EVITAMIENTO CDRA. 21 - Tarapoto - San Martin
 PUNTO DE LLEGADA: AV. VIA DE EVITAMIENTO CDRA 21-LA BANDERA DE SHILCAYO-SAN MARTIN

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 16/12/2023
 MODALIDAD DE TRASLADO: Transporte Privado
 PESO BALANZA: 0
 MEDIO: 4800650

DATOS DEL COMPRADOR

Apellido, y Moned. / Razón Social: SUNCO SELVA S.A.C.
 Tipo y Nro. Doc. Identidad: RUC 20605641017

DATOS DEL CONDUCTOR Y DEL VEHICULO

Transportista: INKAFERRO PERÚ S.A.C.
 RUC Transportista: 20519305098
 Nombre Conductor: MEISTER WILDORO VASQUEZ ROJAS
 Licencia Conductor: 320447666

Unidad Marca: HINO
 Unidad Placa: D6Q726
 Unidad Tolva:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	LIMD.	CANTIDAD
1	2018ACORAME08R1009	BARRA CORRUGADA AM60 BRASIL 3/8 x 09 Mts.	BARRA	632
2	2018ACORAM40BR1309	BARRA CORRUGADA AM60 BRASIL 1/2 x 09 Mts.	BARRA	206

INKAFERRO PERÚ S.A.C.
 RUC: 20519305098

Gustavo Tejado
 REPRESENTANTE GENERAL

GULLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67086

EMPRESA INKAFERRO PERU S.A.C.
 RUC: 20519305098

Comentarios: Basado en Pedidos de Cliente 17-ver01ca-296.



CERTIFICADO DEL CALIDADE

Ref. N°.: 036977/2022
Pag.: 01

Cliente: INKATERO PERU SAC

Materia: ACERO GR60 NTP 339/341 N° 3 3,03M 2T HE

Pedido de Compra: V061C622

Diámetro: 3/8"

Orden de Venta: 197231814

GRAM: GRADO 60-NS-NTP 339/341

Colada N°.	Mesa (°C)	LF	LR	LR/LF	% A	Deb.	% C	% Mn	% Si	% P	% S	% Cr	% Ni	% Cu	% Mo	% V	% Nb	% Ti	% CE
Atados		MFA	MFA	MFA															
G069300	14	28,159	474	628	1.32	14.90	OK	0.29	1.06	0.22	0.020	0.034	0.07	0.06	0.17	0.013	0.003	0.003	0.503
G069300	14	28,149	482	626	1.30	14.90	OK	0.29	1.06	0.22	0.020	0.034	0.07	0.06	0.17	0.013	0.003	0.003	0.503
G069300	14	28,209	483	627	1.30	14.50	OK	0.29	1.06	0.22	0.020	0.034	0.07	0.06	0.17	0.013	0.003	0.003	0.503
G069300	8	16,132	476	626	1.31	14.00	OK	0.29	1.06	0.22	0.020	0.034	0.07	0.06	0.17	0.013	0.003	0.003	0.503
TOTAL	50	100,649																	

Observaciones: Certificamos que el material contenido fue producido, ensayado y está de acuerdo con los requisitos descriptos en la especificación técnica y sus resultados están satisfactorios.

ORIGIN: BRAZIL

Fecha: 30/AGO/2022

Aprobado por:

ArcelorMittal Brasil S/A

Abel Guzman Tejeda
GERENTE GENERAL

ING. JULIO CESAR MONTAÑA RAMIREZ
RESERVA DE OCHOA
CALLE DE ANTONIO

Leonilda Huamán
Gerente de Logística
INGENIERIA PRODUCCION

GUILLEMO SÁEZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP 67096



CERTIFICADO DEL CALIDADE

Ref. Nr.: 037615/2023
Pag.: 01

Cliete: INVAFERO PIRU SAC
Material: ACERO GR60 NTP 339/341 Nr. 3 9,00M 2T ME
Pedido de Compr.: V0110123

Diametro: 3/8"
Orden de Venda: 198121963
Grau: GR60 60-NS-NTP 339/341

Coleta Nr.	Massa (t)	LP	LR	LR/LP	A	Deb.	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	V	CE	
Atada		MPa	MPa															
G430000	13	26,231	486	627	1.29	14.00	OK	0.28	1.05	0.21	0.024	0.039	0.07	0.05	0.16	0.006	0.002	0.485
G430000	6	12,111	487	630	1.29	14.00	OK	0.28	1.05	0.21	0.024	0.039	0.07	0.05	0.16	0.006	0.002	0.485
G430100	13	26,239	483	638	1.32	15.00	OK	0.30	1.05	0.21	0.026	0.032	0.08	0.06	0.17	0.009	0.003	0.507
G430100	13	26,495	494	631	1.28	14.50	OK	0.30	1.05	0.21	0.026	0.032	0.08	0.06	0.17	0.009	0.003	0.507
G430100	13	26,793	490	634	1.29	15.00	OK	0.30	1.05	0.21	0.026	0.032	0.08	0.06	0.17	0.009	0.003	0.507
G430100	13	26,603	480	632	1.29	14.00	OK	0.30	1.05	0.21	0.026	0.032	0.08	0.06	0.17	0.009	0.003	0.507
G430100	13	26,682	486	627	1.29	15.00	OK	0.30	1.05	0.21	0.026	0.032	0.08	0.06	0.17	0.009	0.003	0.507
G430100	2	4,113	449	627	1.40	15.00	OK	0.30	1.05	0.21	0.026	0.032	0.08	0.06	0.17	0.009	0.003	0.507
G430200	11	22,637	493	628	1.27	15.00	OK	0.28	1.06	0.22	0.035	0.033	0.06	0.06	0.15	0.008	0.003	0.488
G430200	1	2,080	493	628	1.27	15.00	OK	0.28	1.06	0.22	0.035	0.033	0.06	0.06	0.15	0.008	0.003	0.488
G430200	14	28,426	489	623	1.27	15.00	OK	0.28	1.06	0.22	0.035	0.033	0.06	0.06	0.15	0.008	0.003	0.488
G430200	15	30,624	485	626	1.29	15.50	OK	0.28	1.06	0.22	0.035	0.033	0.06	0.06	0.15	0.008	0.003	0.488
TOTAL	127	258,964																

Observaciones: Certificamos que el material contenido fue producido, ensayado y está de acuerdo con los requisitos descritos en la especificación técnica y sus resultades están satisfactorios.

ORIGIN: BRAZIL

Fecha: 07/MAR/2023
 Assinado digitalmente
 Guilherme Augusto
 Engenharia Civil

Construtora Imbituba S/A
 RUC: 204.687.780-0001
 Assinado digitalmente
 Abner Guzman Tejada
 Engenharia Civil

Aprovado por:
 Assinado digitalmente
 RUC: 048.182.0051
 Engenharia Civil

ArcelorMittal Brasil S/A

Assinado digitalmente
 Guilherme Augusto
 Engenharia Civil
 CIP: 67046



CERTIFICADO DEL CALIDADE

Ref. Nr.: 037225/2022
Pag.: 01

Cliente: INIAZERRO FERRO SAC
Material: ACERO GR60 NTP 339/341 N2 + 5,00M 2T 3B
Pedido de Compra: VC990922
Diametro: 1/2"
Orden de Venda: 197667527
Grav: GRADO 60-MS-NTP 339/341

Coleta	Nr.	Mesa (t)	LF	LR	LR/LF	% A	Deb.	% C	% Mn	% Si	% P	% S	% Cr	% Ni	% Cu	% Mo	% V	% Nb	% Ti	% CE
		Atados	MPa	MPa	MPa															
G247200	12	24,266	500	641	1.28	16.50	OK	0.29	1.06	0.22	0.024	0.026	0.09	0.06	0.15	0.010	0.004			0.501
G247200	14	28,340	497	636	1.28	15.50	OK	0.29	1.06	0.22	0.024	0.026	0.09	0.06	0.15	0.010	0.004			0.501
G247200	14	28,751	482	633	1.31	15.00	OK	0.29	1.06	0.22	0.024	0.026	0.09	0.06	0.15	0.010	0.004			0.501
G247200	14	28,306	474	628	1.32	16.50	OK	0.29	1.06	0.22	0.024	0.026	0.09	0.06	0.15	0.010	0.004			0.501
G247200	9	18,248	469	617	1.31	15.50	OK	0.29	1.06	0.22	0.024	0.026	0.09	0.06	0.15	0.010	0.004			0.501
G247300	14	28,385	481	619	1.29	16.00	OK	0.28	1.05	0.20	0.028	0.029	0.07	0.05	0.14	0.011	0.005			0.487
G247300	14	28,298	476	620	1.30	18.00	OK	0.28	1.05	0.20	0.028	0.029	0.07	0.05	0.14	0.011	0.005			0.487
G247300	14	28,291	473	611	1.29	15.50	OK	0.28	1.05	0.20	0.028	0.029	0.07	0.05	0.14	0.011	0.005			0.487
G247300	14	28,358	469	616	1.32	17.00	OK	0.28	1.05	0.20	0.028	0.029	0.07	0.05	0.14	0.011	0.005			0.487
G247300	14	28,406	504	633	1.26	15.50	OK	0.28	1.05	0.20	0.028	0.029	0.07	0.05	0.14	0.011	0.005			0.487
G247300	2	4,053	500	641	1.28	16.50	OK	0.28	1.05	0.20	0.028	0.029	0.07	0.05	0.14	0.011	0.005			0.487
G247401	14	28,228	490	639	1.31	14.50	OK	0.28	1.09	0.20	0.035	0.031	0.07	0.05	0.14	0.008	0.004			0.493
G247401	14	28,317	474	632	1.33	17.50	OK	0.28	1.09	0.20	0.035	0.031	0.07	0.05	0.14	0.008	0.004			0.493
G247401	11	22,242	470	628	1.34	16.00	OK	0.28	1.09	0.20	0.035	0.031	0.07	0.05	0.14	0.008	0.004			0.493
G247500	14	28,157	487	634	1.30	17.50	OK	0.30	1.05	0.20	0.035	0.031	0.07	0.05	0.14	0.008	0.004			0.500
G247500	14	28,256	482	628	1.30	16.50	OK	0.30	1.05	0.20	0.035	0.031	0.07	0.05	0.14	0.008	0.004			0.500
G247500	14	28,323	489	639	1.31	15.50	OK	0.30	1.05	0.20	0.035	0.031	0.07	0.05	0.14	0.008	0.004			0.500
G247500	3	6,062	489	639	1.31	15.50	OK	0.30	1.05	0.20	0.035	0.031	0.07	0.05	0.14	0.008	0.004			0.500
G247500	11	22,224	490	639	1.30	14.00	OK	0.30	1.05	0.20	0.035	0.031	0.07	0.05	0.14	0.008	0.004			0.500
G247500	14	28,254	490	639	1.31	14.50	OK	0.30	1.05	0.20	0.035	0.031	0.07	0.05	0.14	0.008	0.004			0.500
TOTAL	244	493,262																		

Observaciones: Certificamos que el material contenido fue producido, ensayado y está de acuerdo con los requisitos descriptos en la especificación técnica y sus resultados están satisfactorios.

ORIGEM: BRAZIL



 Arthur Guzman Tejada

 RUC: 2015092805

 Fecha: 16/NOV/2022



 Guilherme Mazza

 INIAZERRO FERRO SAC

 RUC: 2015092805

 ArcelorMittal Brasil S/A



CERTIFICADO DEL CALIDADE

Ref. Nr.: 037225/2022
Pag.: 01

Diame: 011/2"
Ordem de Venda: 197667527
Grau: GRADO 60-NS-NTP 339/341

Cliente: INDAFERRO FERRO SMC
Material: AÇERO GR60 NTP 339/341 NC 4 9,00M 2T ME
Pedido de Compra: V0390922

Colada	Nr.	Mesa (t)	LF	LR	LR/LF	% A	Dob.	% C	% Mn	% Si	% P	% S	% Cr	% Ni	% Cu	% Mo	% V	% Nb	% Ce	
Atxidos			Mts	Mts																
G247500	1	2,017	490	639	1,31	14,50	OK	0,30	1,05	0,20	0,029	0,028	0,08	0,05	0,12	0,008	0,004			0,500
G247602	13	26,243	484	618	1,28	18,00	OK	0,28	1,05	0,21	0,027	0,030	0,08	0,04	0,12	0,007	0,004			0,487
G247801	5	10,104	469	617	1,31	15,50	OK	0,28	1,07	0,21	0,029	0,040	0,07	0,06	0,12	0,008	0,004			0,494
G247801	14	28,497	475	615	1,30	14,50	OK	0,29	1,07	0,21	0,029	0,040	0,07	0,06	0,12	0,008	0,004			0,494
G247801	14	28,414	482	616	1,28	15,00	OK	0,29	1,07	0,21	0,029	0,040	0,07	0,06	0,12	0,008	0,004			0,494
G247801	14	28,498	487	630	1,29	15,50	OK	0,29	1,07	0,21	0,029	0,040	0,07	0,06	0,12	0,008	0,004			0,494
G247801	9	18,291	484	622	1,29	15,50	OK	0,29	1,07	0,21	0,029	0,040	0,07	0,06	0,12	0,008	0,004			0,494
G248801	14	28,208	493	618	1,25	15,50	OK	0,28	1,07	0,20	0,033	0,040	0,06	0,05	0,12	0,010	0,003			0,483
G248801	14	28,211	493	628	1,27	15,00	OK	0,28	1,07	0,20	0,033	0,040	0,06	0,05	0,12	0,010	0,003			0,483
G248801	11	22,136	484	618	1,28	18,00	OK	0,28	1,07	0,20	0,033	0,040	0,06	0,05	0,12	0,010	0,003			0,483
G248903	14	28,282	495	636	1,29	14,00	OK	0,28	1,06	0,20	0,031	0,043	0,06	0,05	0,13	0,009	0,004			0,481
G248903	14	28,230	496	651	1,31	15,00	OK	0,28	1,06	0,20	0,031	0,043	0,06	0,05	0,13	0,009	0,004			0,481
G248903	3	6,049	493	618	1,25	15,50	OK	0,28	1,06	0,20	0,031	0,043	0,06	0,05	0,13	0,009	0,004			0,481
G249001	14	28,225	502	642	1,28	14,50	OK	0,29	1,06	0,21	0,030	0,035	0,10	0,09	0,13	0,020	0,006			0,503
G249001	6	12,072	495	638	1,29	14,00	OK	0,29	1,06	0,21	0,030	0,035	0,10	0,09	0,13	0,020	0,006			0,503
G250101	14	28,152	501	648	1,29	14,50	OK	0,29	1,05	0,21	0,030	0,035	0,10	0,09	0,12	0,020	0,006			0,504
G250101	1	2,029	502	642	1,28	14,50	OK	0,29	1,05	0,21	0,030	0,035	0,10	0,09	0,12	0,020	0,006			0,504
G250201	14	28,383	494	629	1,27	14,50	OK	0,29	1,05	0,21	0,026	0,032	0,08	0,07	0,12	0,014	0,004			0,497
G250201	14	28,455	491	625	1,27	16,00	OK	0,29	1,05	0,21	0,026	0,032	0,08	0,07	0,12	0,014	0,004			0,497
G250201	14	28,101	499	642	1,29	16,50	OK	0,29	1,05	0,21	0,026	0,032	0,08	0,07	0,12	0,014	0,004			0,497
TOTAL	217	438,597																		

Observaciones: Certificamos que el material mencionado fue producido, ensayado y está de acuerdo con los requisitos descriptos en la especificación técnica y sus resultados están satisfactorios.

ORIGEN: BRAZIL

Indústria de Aço
RUA JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE, 100
Cidade de Lages - SC
CEP: 24040-000
FONE: (51) 3333-1000

Abner Guzman Tejada
Gerente de Qualidade

Indústria de Aço
RUA JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE, 100
Cidade de Lages - SC
CEP: 24040-000
FONE: (51) 3333-1000

GUILHERMO DIAZ PALOMARO
Ingeniero Civil
C.R. 67088

Indústria de Aço
RUA JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE, 100
Cidade de Lages - SC
CEP: 24040-000
FONE: (51) 3333-1000

Leonardo J. J. J.
Gerente de Qualidade

Indústria de Aço
RUA JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE, 100
Cidade de Lages - SC
CEP: 24040-000
FONE: (51) 3333-1000

*COMPANHIA SIDERURGICA
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.*
RUA JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE, 100
Cidade de Lages - SC
CEP: 24040-000
FONE: (51) 3333-1000

Fecha: 16/NOV/2022

Aprovado por:

ArcelorMittal Brasil S/A



CERTIFICADO DEL CALIDADE

Ref. Nr.: 037166/2022
Pag.: 01

Cliente: INKA FERRO PERU SAC

Material: ACERO GR60 NTP 339/341 Nr. 4 9,00M 2T ME
Pedido de Compra: VC850822

Diametro: 1/2"
Ordem de Venda: 197513959
Grua: GRADO 60-MS-NTP 339/341

Colada Nr.	Masa (t)	LF	LR	LR/LF	A	Dob.	% C	% Mn	% Si	% P	% S	% Cu	% Mo	% V	% CE	
Atadoz		MPa	MPa													
GL90820	1	2,050	467	603	1.29	17.50	OK	0.29	1.06	0.21	0.035	0.026	0.07	0.07	0.003	0.503
TOTAL	1	2,050														

Observaciones: Certificamos que el material contenido fue producido, ensayado y está de acuerdo con los requisitos descriptos en la especificación técnica y sus resultados están satisfactorios.

ORIGIN: BRAZIL

[Signature]
Antonio B. B. B.
Gerente de Laboratorio
ArcelorMittal Peru S.A.

Fecha: 05/OCT/2022

Aprobado por: _____
ArcelorMittal Brasil S/A

[Signature]
Construtora Peruliana y Maqui S.A.C.
RUC: 2045007805
Abner Guzman Tejada
Gerente de NTPRAI

[Signature]
GUILLERMODOVALCARRANO
INGENIERO CIVIL
C.R. 37086

[Signature]
RUC: 2045007805
Ing. Ruy...
Ingeniero de Control
C.R. 37086



CERTIFICADO DEL CALIDADE

Ref. Nr.: 0316977/2022
Pag.: 01

Cliente: INRAFERRO PERU SAC

Material: ACERO GR60 NTP 333/341 Nr 4 3,00M 2T ME

Pedido de Compra: V0610622

Diametro: 11/2"

Ordem de Venda: 197231814

Gravado: 60-N5-NTP 339/341

Colada Nr.	Mesa (t)	LF	LR	LR/LF	% A	Deb.	% C	% Mn	% Si	% P	% S	% Cr	% Ni	% Cu	% Mo	% V	% Nb	% CE	
Atados		MPa	MPa	MPa															
G066300	1	2,083	498	1,30	17,00	OK	0,29	1,05	0,21	0,034	0,032	0,08	0,07	0,19	0,020	0,002		0,503	
G066300	1	2,087	498	1,30	17,00	OK	0,29	1,05	0,21	0,034	0,032	0,08	0,07	0,19	0,020	0,002		0,503	
G066300	1	2,083	514	1,31	15,50	OK	0,29	1,05	0,21	0,034	0,032	0,08	0,07	0,19	0,020	0,002		0,503	
G066300	13	26,569	514	1,31	15,50	OK	0,29	1,05	0,21	0,034	0,032	0,08	0,07	0,19	0,020	0,002		0,503	
G066300	1	2,089	523	1,32	15,50	OK	0,29	1,05	0,21	0,034	0,032	0,08	0,07	0,19	0,020	0,002		0,503	
G066300	13	25,528	523	1,32	15,50	OK	0,29	1,05	0,21	0,034	0,032	0,08	0,07	0,19	0,020	0,002		0,503	
G066300	6	12,275	515	1,31	15,50	OK	0,29	1,05	0,21	0,034	0,032	0,08	0,07	0,19	0,020	0,002		0,503	
G066500	1	2,083	512	1,28	16,50	OK	0,30	1,08	0,21	0,025	0,044	0,06	0,07	0,20	0,015	0,003		0,511	
G066500	11	22,466	512	1,28	16,50	OK	0,30	1,08	0,21	0,025	0,044	0,06	0,07	0,20	0,015	0,003		0,511	
G066500	2	4,261	512	1,28	16,50	OK	0,30	1,08	0,21	0,025	0,044	0,06	0,07	0,20	0,015	0,003		0,511	
G066500	1	2,105	522	1,27	16,00	OK	0,30	1,08	0,21	0,025	0,044	0,06	0,07	0,20	0,015	0,003		0,511	
G066500	1	2,094	522	1,27	16,00	OK	0,30	1,08	0,21	0,025	0,044	0,06	0,07	0,20	0,015	0,003		0,511	
G066500	11	22,552	522	1,27	16,00	OK	0,30	1,08	0,21	0,025	0,044	0,06	0,07	0,20	0,015	0,003		0,511	
G066500	4	8,253	512	1,29	14,50	OK	0,30	1,08	0,21	0,025	0,044	0,06	0,07	0,20	0,015	0,003		0,511	
G066500	1	2,061	512	1,29	14,50	OK	0,30	1,08	0,21	0,025	0,044	0,06	0,07	0,20	0,015	0,003		0,511	
G066600	7	14,316	512	1,29	14,50	OK	0,29	1,06	0,21	0,018	0,037	0,06	0,07	0,20	0,014	0,002		0,501	
G066600	1	2,093	512	1,29	14,50	OK	0,29	1,06	0,21	0,018	0,037	0,06	0,07	0,20	0,014	0,002		0,501	
G066600	1	2,129	511	1,31	14,50	OK	0,29	1,06	0,21	0,018	0,037	0,06	0,07	0,20	0,014	0,002		0,501	
G066600	1	2,087	511	1,31	14,50	OK	0,29	1,06	0,21	0,018	0,037	0,06	0,07	0,20	0,014	0,002		0,501	
G066600	12	24,508	511	1,31	14,50	OK	0,29	1,06	0,21	0,018	0,037	0,06	0,07	0,20	0,014	0,002		0,501	
TOTAL	90	184,722																	

Observaciones: Certificamos que el material mencionado fue producido, ensayado y está de acuerdo con los requisitos descriptos en la especificación técnica y sus resultados están satisfactorios.

ORIGIN: BRAZIL

Constiutur Ingombril S.L.L.C.
RUC: 20150278053

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL

CIP: 67066
Fecha: 30/AGO/2022

Aprobado por:

ArcelorMittal Brasil S/A

Constiutur Ingombril S.L.L.C.
RUC: 20150278053

Ing. Luis Enrique Cabrera
CIP: 101110



• PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD

CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.
R.U.C. 1450237131

Alfonso Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.
R.D.N. 1450237131
R.U.C. 1450237131

Guillermo Díaz Palomero
GUILLERMO DIAZ PALOMERO
INGENIERO CIVIL
CIP. 87086

CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.
R.D.N. 1450237131
R.U.C. 1450237131

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTÍN"

CONTROL DE CALIDAD							
PROTOCOLO DE LIBRACION PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO							
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA REDE PARA TOLAMAZA BANTARA Y ZONA DE TRATAMIENTO TPO: JUAN GUERRA - SAN MARTIN	Avances Pz: 175.89/m ³ Fecha de muestreo: 29/12/22 Pz de muestreo: 2-01 ; DE-01						
ELEMENTO ESTRUCTURAL: VEREDA							
MODALIDAD DE USO: RAMPA DE ACCESO Y CARRIL DE DECELERACION							
CHECK LIST - AUTORIZACION PARA USADO							
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES				COMENTARIOS		
1	Preparación de planos	✓					
2	Verificación de planos	✓					
3	Verificación de la mezcla	✓					
4	Verificación del vaciado	✓					
5	Verificación de cura y desmoldar	✓					
6	Verificación de juntas de trabajo y embotados	✓					
7	Inspección sobre segregación, aflora, agua, etc.	✓					
8	Desmoldado de vaciado	✓					
9	Examen operativo (desplaza, muestreo, etc.)	✓					
10	Otros: Fines de autorización	✓					
DATOS DE COLOCACION DE CONCRETO FRESCO							
Item	TIPO DE MEZCLADORA	HORA INICIO DE VACIADO	HORA FINAL DE VACIADO	VOL. (M ³)	CUMPL. (M ³)	T° Ambiente	T° Cercado
1	MEZCLADORA 21 P ³	8:00 am	11:00 am	12.40	4"		
ESTRUCTURA VACIADA							
<p style="text-align: center;">SECCION 1 ENCUENTRO: ACCESO VIAL - SARDINEL - VEREDA</p>							
Construcción y Mantenimiento Río Maungo S.A.C. RUC: 20450278053 <i>Alfonso Guzman Tejada</i> GERENTE GENERAL							
GALLERMO DIAZ PALOMINO INGENIERO CIVIL CIP. 67086							
CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. RUC: 20050278053 <i>[Signature]</i>							
CONTRATADA				CLIENTE DE OBRA			
PRESIDENTE DE OBRA		CONTROL DE CALIDAD		PRES. SECTORA, SECT. OBRAS			
FIRMAR:		FIRMAR:		FIRMAR:		FIRMAR:	

COIRH CONTROL DE CALIDAD
PROTOCOLO DE LIBERACION PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO

OBRA: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA INGENIERIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO
 TIPO: ALBAQUERRA - SAN MARTIN
 Revisión No: 210 kg/cm² Fecha de emisión: 29/12/23
 Rincón de trabajo: 0.03 ; DE -0.1

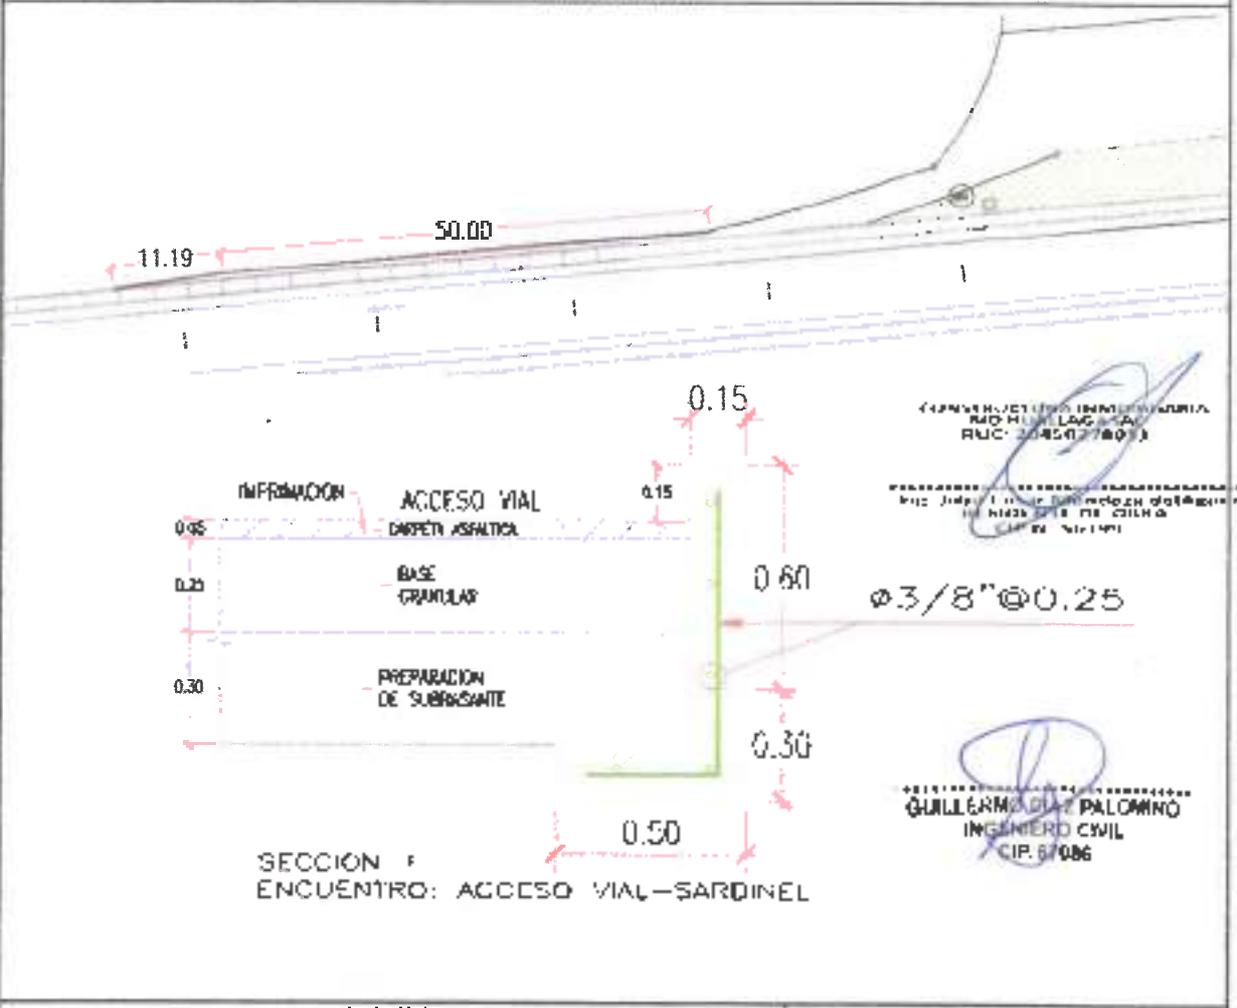
ELEMENTO/ESTRUCTURA: ZAPATA DE SARDINEL
 MONEDOLÓGICO: CARRIL DE ACCELERACION

CHECA LIMT - AUTORIZACION PARA VACIADO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CONFORME			COMPLETADO
		M	En	Me	
1	Revisión de planos	✓			
2	Verificación de albanilería	✓			
3	Verificación de la estructura	✓			
4	Verificación del concreto	✓			
5	Verificación de agua y demarcación	✓			
6	Verificación de estado de armar y encofrado	✓			
7	Revisión sobre topografía, niveles, agua, etc.	✓			✓
8	Calificación de estado	✓			
9	Equipos operativos (vibrador, nivelador, levante, etc.)	✓			
10	Otros: Faltas de cumplimiento	✓			✓

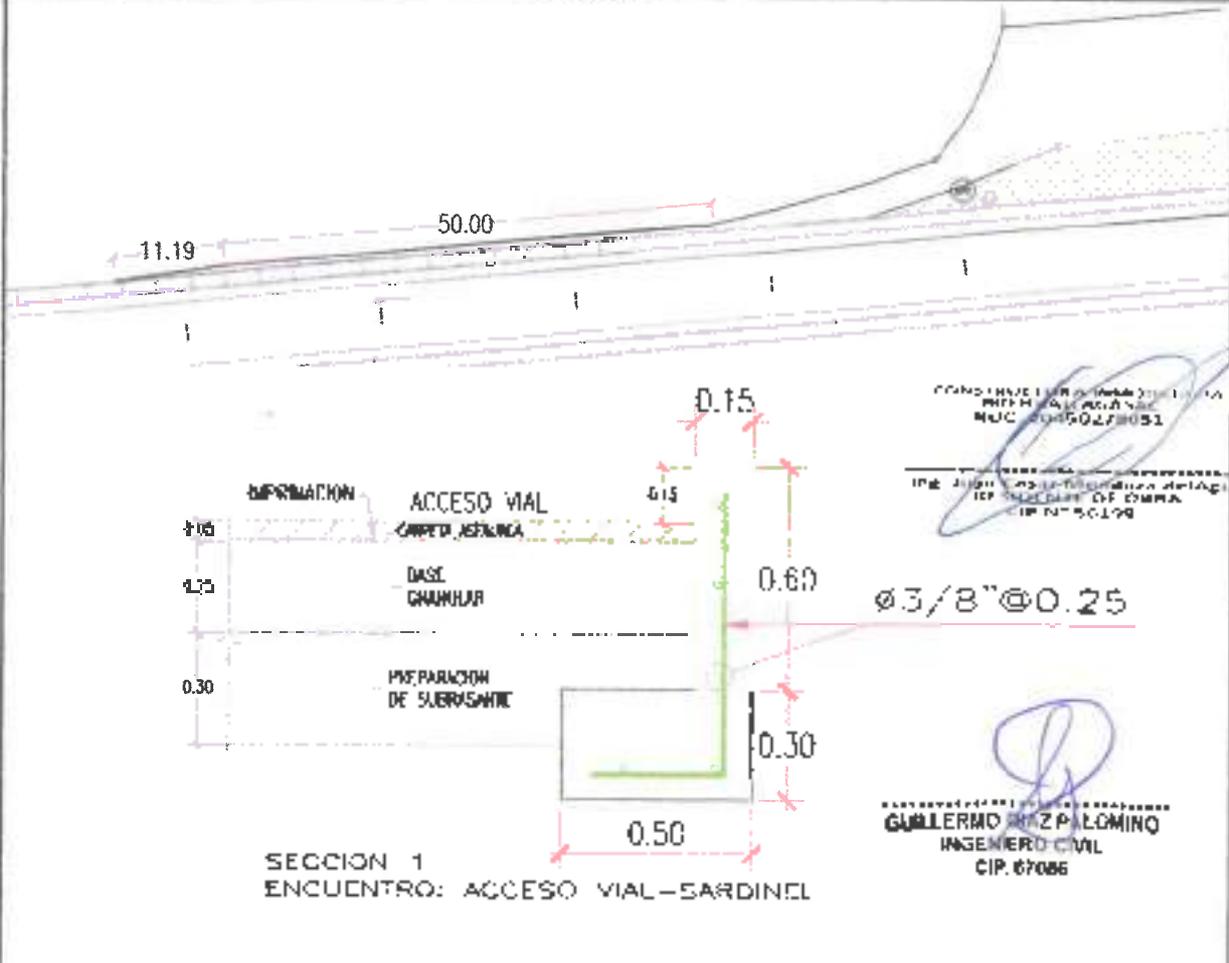
DATOS DE COLOCACION DE CONCRETO FRESCO

Item	TIPO DE MEZCLADORA	HORA INICIO DE VACIADO	HORA FINAL DE VACIADO	VOL. M ³	SLUMP (cm)	T° Ambiente	T° Concreto
1	Mezcladora 110 ³	3:00 PM	5: PM	10.71	5"		



CONSTRUYTORA	GERENTE DE OBRA
RESPONSABLE DE OBRA	RESPONSABLE DE CALIDAD
FECHA:	FECHA:

Construtora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.S.
 RUC: 2045077803
 Abner Guzman Mejada
 GERENTE GENERAL

 <p>COIRH CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.C.</p>	<p>CONTROL DE CALIDAD</p> <p>PROTOCOLO DE LIBERACION PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO</p>																																																																					
OBRA: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIALIDAD MAZAMBA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO: MURO GUERRA - BARRILETE	Ponderacion: 210kg/m³ Fecha de muestra: 30/12/23 Ponderacion: P.02 ; PG-02																																																																					
ELEMENTO/ESTRUCTURA: MURO SARDINEL METODOLOGIA: CARRIL DE ACELERACION																																																																						
CHECK LIST - AUTORIZACION PARA VACIADO																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ORDEN</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION DE ACTIVIDADES</th> <th colspan="3">COMPROBACION</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>NA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Revisión de planos</td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Revisión de orden</td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Revisión de la estructura</td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Revisión de materiales</td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Revisión de agua y alimentación</td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>Revisión de punto de vaciado / vertido</td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>Revisión de estado (hacer agua, sacar agua etc.)</td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>Ubicación de apoyo</td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>Equipos operativos (barbotas, nivelación, bombas, etc.)</td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>Otros Puntos de preferencia</td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	ORDEN	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	COMPROBACION			OBSERVACIONES	SI	NO	NA	1	Revisión de planos	✓				2	Revisión de orden	✓				3	Revisión de la estructura	✓				4	Revisión de materiales	✓				5	Revisión de agua y alimentación	✓				6	Revisión de punto de vaciado / vertido	✓				7	Revisión de estado (hacer agua, sacar agua etc.)	✓				8	Ubicación de apoyo	✓				9	Equipos operativos (barbotas, nivelación, bombas, etc.)	✓				10	Otros Puntos de preferencia	✓				
ORDEN			DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	COMPROBACION			OBSERVACIONES																																																															
	SI	NO		NA																																																																		
1	Revisión de planos	✓																																																																				
2	Revisión de orden	✓																																																																				
3	Revisión de la estructura	✓																																																																				
4	Revisión de materiales	✓																																																																				
5	Revisión de agua y alimentación	✓																																																																				
6	Revisión de punto de vaciado / vertido	✓																																																																				
7	Revisión de estado (hacer agua, sacar agua etc.)	✓																																																																				
8	Ubicación de apoyo	✓																																																																				
9	Equipos operativos (barbotas, nivelación, bombas, etc.)	✓																																																																				
10	Otros Puntos de preferencia	✓																																																																				
DATOS DE COLOCACION DE CONCRETO FRESCO																																																																						
ORDEN	TIPO DE MEZCLADORA	HORA INICIO DE VACIADO	HORA FIN DE VACIADO	VOL. (M ³)	SLUMP (Pulg)	T° Ambiente	T° Concreto																																																															
1	Mezcladora HP	3:00pm	5:00pm	5.50	6"																																																																	
ESTRUCTURA VACIADA																																																																						
																																																																						
CONTRALISTA				GERENTE DE OBRA																																																																		
RESPONSABLE DE OBRA		CONTROL DE CALIDAD		RESP. CONTROL DE CALIDAD																																																																		
NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:																																																																		


 Construcción y Obras S.A.C.
 RUC: 0150278051
 Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

COIRH CONTROL DE CALIDAD
 PROTOCOLO DE LIBERACION PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO

OPERA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO
 TIPO II AJUA GUERRA - SAN MARTIN
 ELEMENTO/ESTRUCTURA: DADO DE CONCRETO ARMADO
 MODELO/ESQUEMA: CARRIL DE ACERADO

Resistencia f'cd: 175 kg/cm² Fecha de liberación: 30/12/23
 Plano de liberación: P-01 ; PE-02

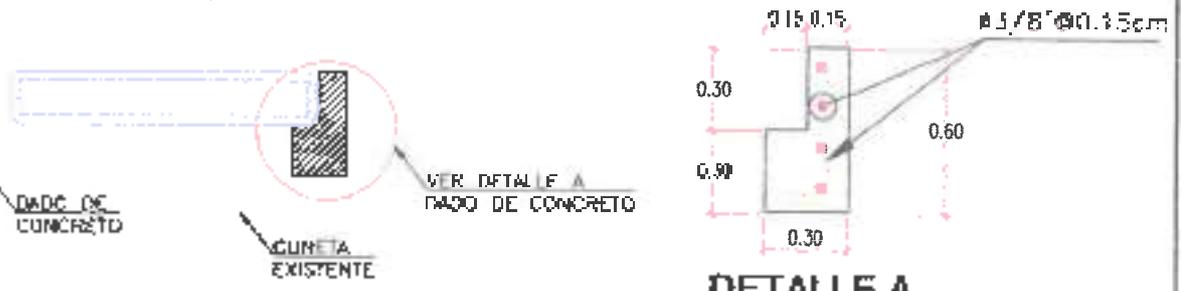
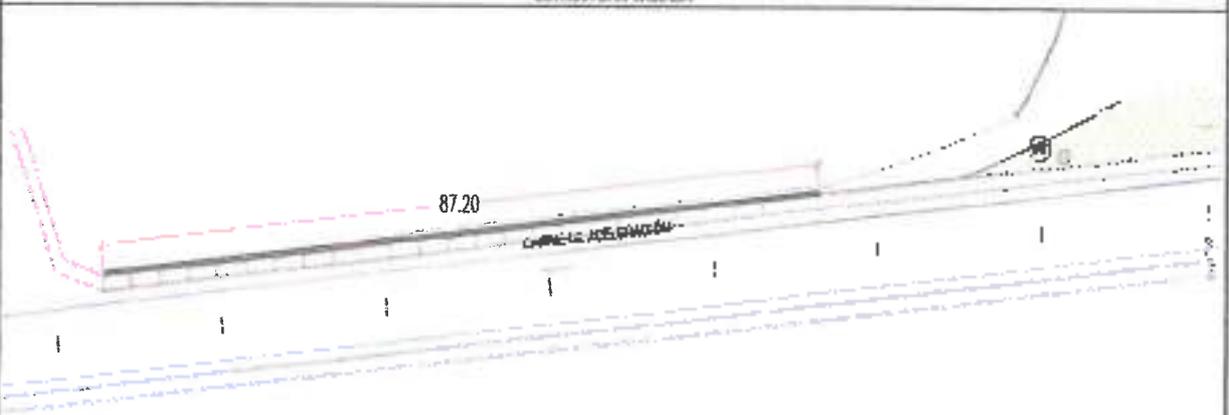
CHECK LIST - AUTORIZACION PARA VACIADO

PUNTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	COMPLETADO			OBSERVACIONES
		S	No	NA	
1	Verificación de estructura				
2	Verificación de niveles				
3	Verificación de la topografía				
4	Verificación del acedente				
5	Calificación de agua y agregados				
6	Verificación de puntos de anclaje y varillas				
7	Inspección sobre impermeabilización, agua, etc.				
8	Control de mezcla				
9	Pruebas especiales (fibra, resinas, testigos, etc.)				
10	Otros. Firma de autorización				

ENTOS DE COLOCACION DE CONCRETO FRESCO

Orden	TIPO DE MEZCLADORA	HORA INICIO DE VACIADO	HORA FINAL DE VACIADO	VOL. (M ³)	SUMF. (cm)	T° Ambiente	T° Concreto
1	MEZCLADORA SP3	7:00 am	11:00 am	11.77	4.5"		

ESTRUCTURA VACIADA



Construcción Inmobiliaria y Habitacional S.A.C.
 RUC: 70930278051
 Alvaro Guerra Tejada
 GERENTE GENERAL

GUILLE RMO RUIZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67096

CONSTRUCCION INMOBILIARIA Y HABITACIONAL S.A.C.
 RUC: 70930278051
 Ing. Alvaro Guerra Tejada GERENTE GENERAL
 CIP. 67096

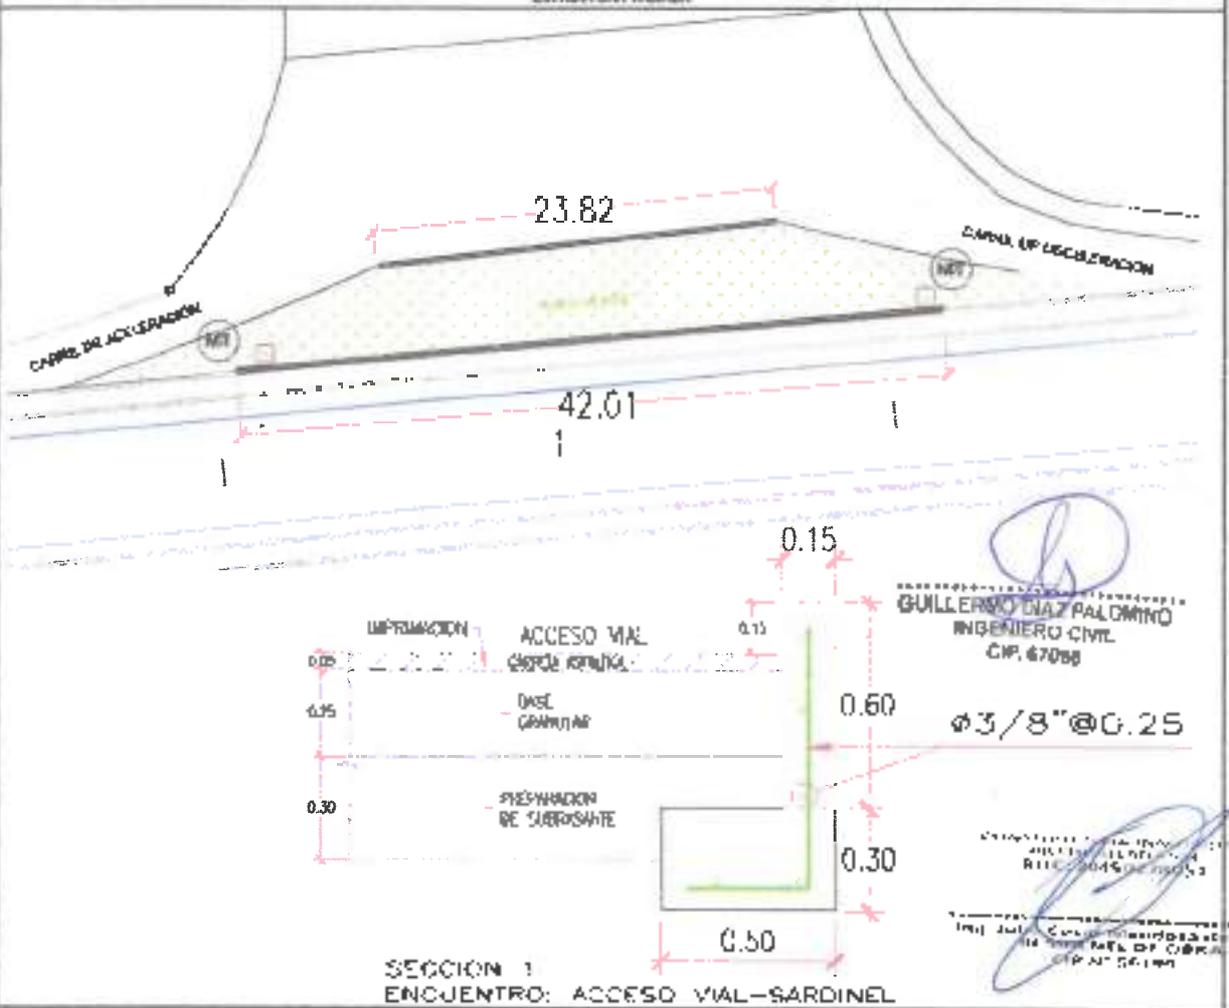
RESPONSABLE DE OPERA	RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD
NOMBRE:	NOMBRE:


CONTROL DE CALIDAD																																																																						
PROTOCOLO DE LIBERACION PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO																																																																						
OBJ: CONSTRUCCIÓN DE LA EPDF PARA VIGILANCIA DE AGUAS Y DURA DE TRATAMIENTO TPO: AJAL QUEBEN - DAN MARTIN	Presión (PC): 210kg/cm ² Plano de referencia: V-01 ; DE-01																																																																					
ELEMENTO ESTRUCTURAL: ZAPATA DE SARDINEL MODALIDAD: SARDINEL CENTRAL																																																																						
CHECK LIST - AUTORIZACION PARA VACIADO																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ITEM</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION DE ACTIVIDADES</th> <th colspan="3">CONFORME</th> <th rowspan="2">COMPROBACION</th> </tr> <tr> <th>B</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Logística del sitio</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Verificación de planos</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Verificación de la estructura</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Mediciones del acortado</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Verificación de agua y drenaje</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>Verificación de puntos de anclaje y estribos</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>Inspección visual de la estructura (verificar agua, etc.)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>Calificación de mano de obra</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>Verificar condiciones climáticas (temperatura y humedad, etc.)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>Otras tareas de verificación</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CONFORME			COMPROBACION	B	SI	NO	1	Logística del sitio	✓				2	Verificación de planos	✓				3	Verificación de la estructura	✓				4	Mediciones del acortado	✓				5	Verificación de agua y drenaje	✓				6	Verificación de puntos de anclaje y estribos	✓				7	Inspección visual de la estructura (verificar agua, etc.)	✓				8	Calificación de mano de obra	✓				9	Verificar condiciones climáticas (temperatura y humedad, etc.)	✓				10	Otras tareas de verificación				✓	
ITEM			DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CONFORME			COMPROBACION																																																															
	B	SI		NO																																																																		
1	Logística del sitio	✓																																																																				
2	Verificación de planos	✓																																																																				
3	Verificación de la estructura	✓																																																																				
4	Mediciones del acortado	✓																																																																				
5	Verificación de agua y drenaje	✓																																																																				
6	Verificación de puntos de anclaje y estribos	✓																																																																				
7	Inspección visual de la estructura (verificar agua, etc.)	✓																																																																				
8	Calificación de mano de obra	✓																																																																				
9	Verificar condiciones climáticas (temperatura y humedad, etc.)	✓																																																																				
10	Otras tareas de verificación				✓																																																																	
DATOS DE COLOCACION DE CONCRETO FRESCO																																																																						
Item	TIPO DE MEZCLAJA	HORA INICIO DE VACIADO	HORA FINAL DE VACIADO	VOL. (m ³)	SLUMP (Pulg.)	1° Acabado	1° Control																																																															
1	H2CLADOP 11 P ²	2:00pm	5:00pm	9.87	4"																																																																	
ESTRUCTURA VACIADA																																																																						
SECCION I ENCUENTRO: ACCESO VIAL - SARDINEL																																																																						
CONTRATISTA				JEFE DE OBRA																																																																		
RESORTE DE OBRA NOMBRE:		CONTROL DE CALIDAD NOMBRE:		RESP. CONTROL DE CALIDAD NOMBRE:																																																																		

Construcción Limpia Pá Huaspa S.A.C.
 RUC: 1045017835

 Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 57086
 3/8" @ 0.25
 CONTROL DE OBRA

		CONTROL DE CALIDAD					
PROTOCOLO DE LIBERACION PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO							
OBRA: CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA BARRERA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO: JARRA GUERRA - SAN MARTIN		Presencia FO: 210 Kg / CM ²		Fecha de emisión: 26/12/27			
ELEMENTO/ESTRUCTURA: MURO DE SARDINEL CENTRAL		Plano de liberación: D-02 ; DE-02					
CHECK LIST - AUTORIZACION PARA VACIADO							
ITEM	DESCRIPCION DE ACCIONES	CONDICIONES			OBSERVACIONES		
		SI	NO	NA			
1	Comprobación de estructuras	<input checked="" type="checkbox"/>					
2	Verificación de niveles	<input checked="" type="checkbox"/>					
3	Verificación de dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/>					
4	Verificación del acortado	<input checked="" type="checkbox"/>					
5	Verificación de tipo y diámetro	<input checked="" type="checkbox"/>					
6	Verificación de puntos de anclaje y estribos	<input checked="" type="checkbox"/>					
7	Revisar otros requisitos (alfileras, juntas, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>					
8	Calificación de mezcla	<input checked="" type="checkbox"/>					
9	Equipos operarios (liberados, vacacionados, licencias, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>					
10	Otros. Firmas de autorización	<input checked="" type="checkbox"/>					
DATOS DE COLOCACION DE CONCRETO FRESCO							
Item	TIPO DE MEZCLADORA	HORA INICIO DE VACIADO	HORA FINAL DE VACIADO	VOL. (M ³)	SLUMP (Pulg)	T° Ambiente	T° Concreto
1	MEZCLADORA HP ³	2:00 pm	4:00 pm	6.00	5"		
ESTRUCTURA VACIADA							
							
GUILLERMO DIAZ PALOMINO INGENIERO CIVIL CIP. 67088				3/8" @ 0.25			
SECCION 1 ENCUENTRO: ACCESO VIAL-SARDINEL				GERENTE DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA		CONTROL DE CALIDAD		RESP. CONTROL DE CALIDAD			
NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:			

CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA VIGILANCIA BARRERA Y ZONA DE TRATAMIENTO
 RUC. 201027833

 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Construcción Inmobiliaria S.p.A. S.A.C.
RUC: 204511278051
Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA
S.P.A. S.A.C.
RUC: 204511278051
[Signature]
ING. JUAN GUERRA PALOMINO
INGENIERO CIVIL
C.P. 87086

[Signature]
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
C.P. 87086

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTÍN"



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Certificado de Habilidad

006464



El Ingeniero (a): PASTEUR RONALD VENA AZANG
Adscrito al Consejo Departamental de: SAN MARTIN - TARAPOTO Registro CIP N°: 80806
Fecha de Incorporación: 2005-02-08 Especialidad: INGENIERIA AMBIENTAL

EL INGENIERO SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, para el siguiente detalle:

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL	
ENTIDAD O PROPIETARIO	VARIOS	
LUGAR	A NIVEL NACIONAL	



TARAPOTO, 18 de Abril del 2023



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Certificado de Habilidad



Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): PASTEUR RONALD VENA AZANG
Adscrito al Consejo Departamental de: SAN MARTIN - TARAPOTO
Con Registro de Matricula del CIP N°: 80806 Fecha de Incorporación: 2005-02-08
Especialidad: INGENIERIA AMBIENTAL

Guillermo Díaz Palomino
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 87086

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PROPIETARIO	VARIOS
LUGAR	A NIVEL NACIONAL



Constancia Interoftalme Hualpa S.A.C.
RUC: 2035078051

Abner Guzmán Tejada
Abner Guzmán Tejada
GERENTE GENERAL

TARAPOTO, 18 de Abril del 2023

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

María del Carmen Ponca Mejía
Ing. María del Carmen Ponca Mejía
Decana Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

[Signature]
Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

NO VALIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PUBLICAS. BILICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PUBLICAS





INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBRA:


"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTIN"


GUILERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 87086

EVENTO COMPENSABLE N° 08

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
RUC - 20450278053

Abner Guzman Tejada
INGENIERO GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.

JOSE R. VIQUEZ AZONG
ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CIP N° 20886

Del 21 al 31

DICIEMBRE - 2023

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC - 20450278053

ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CIP N° 20886

ELABORADO POR:

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.

	<small>OBRA</small> CONSTRUCCIÓN DE LA S.FDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO I JUAN GUERRA - SAN MARTIN	ELABORADO PYA/EST
		REVISADO FOM/DB
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023 - II	Página 2 de 14

ÍNDICE


I. INTRODUCCIÓN.....	4
II. OBJETIVO.....	4
III. ALCANCE.....	4
IV. COMPONENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	5
4.1. SEGURIDAD Y SALUD.....	5
4.1.1. Implementación de Equipos de Protección Individual y Colectiva ..	5
4.1.2. Avisos de prevención y desvío de tránsito.....	8
V. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS.....	11
VI. VALORIZACIÓN.....	14
VII. ANEXOS.....	14

ÍNDICE DE CUADROS


Cuadro N°. 1: Colores de cascos según su cargo.....	6
Cuadro N°. 2: Listado de temas de las charlas rápidas de SST.....	11


 GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 87086

Constructora Inmobiliaria Río Huallaga S.A.C.
 RUC. 30450278031


 Abner Guzman Pejada
 REPRESENTANTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.


 Pastor R. Viana Arango
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP N° 87086

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC. 30450278031


 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP N° 87086

	OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN	ELABORADO PVAE8ST REMBADO ADIACIS
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023 - II	Página 3 de 14

ÍNDICE DE FOTOS

Foto N° 1: Se muestra al personal operativo, haciendo uso de su uniforme de trabajo..... 6

Foto N° 2: Se muestra al personal operativo y de staff, haciendo uso de su uniforme de trabajo. ¡Error! Marcador no definido.

Foto N° 3: Se muestra la instalación de conos de seguridad, para delimitación de la zona de trabajo..... 8

Foto N° 4: Se muestra la instalación de señalización de prohibición en la zona de trabajo..... 9

Foto N° 5: Se muestra la instalación de la señalización preventiva en la zona de trabajo..... 10

Foto N° 6: Se muestra la instalación de la señalización preventiva en la zona de trabajo..... 10


Foto N° 7: Se muestra la instalación de la señalización preventiva en la zona de trabajo. 11

Foto N° 8: Se muestra el desarrollo de la charla rápida de Seguridad y salud en el trabajo..... 12

Foto N° 9: Se evidencia punto de hidratación, ubicado en las instalaciones exteriores de la obra..... 13


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIR. 87086


 Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC. 20450278051
 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.

 PASTOR A. VIANA ALENC
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIR. 24399

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC. 20450278051

 PASTOR A. VIANA ALENC
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIR. 24399

	Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN"	ELABORADO: PVA/SET
		REVISADO: ROK/28
	INFORME SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023 - II	Página 4 de 14

I. INTRODUCCIÓN

La ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN", es ejecutado por Constructora Inmobiliaria Río Huallaga S.A.C., en adelante COIRH S.A.C., por encargo de la Unidad Ejecutora 002: Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria - PRODESA.

La empresa COIRH, en cumplimiento de su Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se desarrollan diversas actividades como parte del proceso productivo generando peligros de diversas magnitudes, que pueden afectar a la integridad física, salud y mental de los trabajadores y terceros. Así como también a la propiedad (Equipos pesados y livianos, herramientas, entre otros).

Por tal razón, se lleva a cabo la ejecución de una serie de medidas destinadas a prevenir, mitigar, los riesgos durante la ejecución de la obra.

II. OBJETIVO

Dar a conocer la ejecución de actividades en materia seguridad y salud en el trabajo, durante el periodo del 21 al 31 de diciembre de 2023, para prevenir, minimizar y/o mitigar los peligros y riesgos que pudieran resultar de las actividades constructivas de la obra, y a su vez garantizar la integridad física, la salud y mental de los trabajadores y de terceros.


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CP: 47016

III. ALCANCE


El alcance temporal comprende las actividades de la etapa constructiva de la obra y por las características de los peligros y riesgos identificados; el alcance espacial comprende el área de influencia directa de la obra (Edificación) que representen fuentes de peligro para el personal y terceros.

Constructora Inmobiliaria Río Huallaga S.A.C.
 RUC: 20450278051

 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 20450278051

 Posteur R. Viera Azeg
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.

 Posteur R. Viera Azeg
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	<small>OBRA</small> CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA MOBILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN	ELABORADO: PMA/ESST
		REVISADO: RCV/AGB
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023 - II	Página 5 de 14

IV. COMPONENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Según el Expediente Técnico del proyecto y el presupuesto del (Evento Compensable N° 08, las actividades valorizables en materia de Seguridad y salud en el trabajo son las siguientes:

4.1. SEGURIDAD Y SALUD

4.1.1. Implementación de Equipos de Protección Individual y Colectiva

4.1.1.1. Implementación de Equipos de Protección Personal

> Uniforme de trabajo

El uniforme de trabajo para el personal operativo consiste en:

- Pantalón drill color azul con cintas reflectivas de 2° tipo 3.
- Polo manga larga color plomo con cintas reflectivas de 2° tipo 3.

El uniforme de trabajo para el personal de staff consiste en:

- Camisa manga larga color celeste.
- Chaleco color anaranjado, amarillo fluorescente y rojo, con cintas reflectivas de 2° tipo 2.


El personal operativo y de staff, usa el uniforme de trabajo durante la ejecución de sus labores.

Se procede con la renovación oportuna y adecuada del uniforme de trabajo teniendo en cuenta, principalmente, el tipo de actividad que desempeña el trabajador.

Construtora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 R.U.C. 20450273003

Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


 GUILLELMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87085

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA SAC

 Pastor R. Viquez Arango
 CO. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA SAC
 R.U.C. 20450273003

CO. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 C/ CALLES 107 DE CAMRA
 LIMA N° 50100

 COIRH	OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN"	ELABORADO: P.VESST
		REVISADO: ROWDS
	INFORME SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023	Página 7 de 14

- Protección de los ojos (Lentes de seguridad transparentes y oscuros).
- Protección de las vías respiratorias (Respiradores simples y especiales).
- Protección de los pies (Zapatos de seguridad y/o botas de jebe con punta de acero).
- Protección de las manos (Guantes de cuero, nitrilo, multipropósito, entre otros).

El personal operativo y de staff, usa los respectivos Equipos de Protección Personal - EPPs durante la ejecución de sus labores.



Foto N° 2: Se muestra al personal operativo haciendo uso de su EPPs.

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 87086


CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC. 20450278053


Alnor Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
RUC. 20450278053



CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.


Pastor R. Viana Azop
ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CIP. 87086

 COIRH	OBRA	ELABORADO: PVA/ESST
	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN"	REVISADO: ROM/GB
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023 - R	Página 4 de 14.

4.1.2. Avisos de prevención y desvío de tránsito

4.1.2.1. Equipos de protección colectiva

Los equipos de protección colectiva son aquellos que están dirigidos a proteger a varios trabajadores al mismo tiempo, dando las condiciones adecuadas para que los trabajadores realicen sus diversas actividades con la mejor seguridad posible.

En nuestras instalaciones contamos con diversas actividades desarrollándose para proteger a nuestros trabajadores, haciendo uso de materiales de seguridad como delimitadores de zonas de riesgo, siendo los siguientes; conos de seguridad, barras de seguridad, cintas peligro (rojo y amarillo), entre otros.



Foto N° 2: Se muestra la instalación de conos de seguridad, para delimitación de la zona de trabajo.

Constructora Inmobiliaria Río Huallaga S.A.C.
RUC: 20450276851

Abner Guzman Tejeda
GERENTE GENERAL

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

INSTITUCIÓN HUANOBUENA
RIO HUALLAGA S.A.C.
Pastor A. Viana Araya
ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Constructora Inmobiliaria Río Huallaga S.A.C.
RUC: 20450276851

Miguel Ángel Mendoza Aguirre
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 56394

	OERA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN	ELABORADO: FVNESST REVISADO: ROMGB
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023 . II	Página 4 de 14

4.1.2.2. Señalización temporal de seguridad

Para la ejecución de los trabajos se instalaron señales de tipo preventivas, restrictivas e informativas, en las distintas zonas de trabajo, con la finalidad de advertir e informar acerca de los peligros y riesgos existentes, y así poder salvaguardar la integridad física de los trabajadores y visitantes.

Para la señalización temporal de las zonas de trabajo se utilizó paneles de material tipo banner, con marcos y soportes de madera, conos de plástico de 28" color anaranjado, cintas señalizadores color rojo y amarillo, mallas de señalización color anaranjado y tranqueras portables, según sea el caso.



Foto N° 3: Se muestra la instalación de señalización de obligación en la zona de trabajo.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO MAJAGA S.A.C.
RUC. 20450278051

Abner Guzman Tejada
GERENTE GENERAL

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67086

POSTEUR R. VIANO ACANG
ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RIO MAJAGA S.A.C.
RUC. 20450278051

M. MENDOZA DEL AGUILA
INGENIERO DE CIVIL
CIP N° 56194

 COIRH	OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN	ELABORADO PVAESBT
		REVISADO ROVAOS
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023 - II	Página 10 de 14



Foto N° 4: Se muestra la instalación de la señalización preventiva en la zona de trabajo.



Foto N° 5: Se muestra la instalación de la señalización de advertencia en la zona de trabajo.

.....
 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP 67066

.....
 Construtora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC/20450278051

.....
Almer Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

.....
 CONSTRUCCION INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC 20450278051

.....
 ING. JUAN GUERRA PALOMINO
 INGENIERO DE OBRA
 RUC 20450278051

.....
 CONSTRUCCION INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.


.....
Positor R. Viera Azua
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP 67066

	DBA	ELABORADO: PVA/ESST
	"CONSTRUCCION DE LA BEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN"	REVISADO: ROMQB
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023 - I	Página 11 de 14




GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67086

Foto N° 6: Se muestra la instalación de la señalización de advertencia en la zona de trabajo.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.

Ponce A. Viana Arango
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP N° 40846

V. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS


5.1. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

Se realizaron capacitaciones, inducciones a todo personal que se incorporó al equipo de trabajo, en temas de seguridad y salud, capacitaciones específicas, entre otros. Así como también se realizó todos los días mediante las charlas diarias de 5 minutos, antes del inicio de jornada.

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC. 2045077805-1

5.1.1. Charlas rápidas de seguridad

Las charlas diarias de seguridad se desarrollaron al inicio de la jornada laboral, en las instalaciones de la obra, se incluyen temas de acuerdo con el nivel de riesgo de los trabajos a realizar, de igual forma se tratan conceptos generales de acuerdo con las actividades desarrolladas.


Abner Guzman Tejada
 CIP 86115 GINEBRA

Cuadro N° 2: Listado de temas de las charlas rápidas de SST.

N°	Fecha	Tema tratado
01	21.12.2023	Protección de los pies.
02	22.12.2023	Manejo de gasolina.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC. 2045077805-1

ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP N° 50149

	<small>OBRA</small> CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN	ELABORADO: PMA155T
		REVISADO: ROMAGB
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023 - 8	Página 12 de 14

04	23.12.2023	Orden y limpieza.
05	26.12.2023	Cuidado con el cemento.
06	27.12.2023	Los peligros de una mala postura.
07	28.12.2023	Contaminación del suelo.
08	29.12.2023	Peligros eléctricos.

Fuente: Elaboración propia, 2023.




 FERMÍN DIAZ PALOMAR
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67085

Foto N° 7: Se muestra el desarrollo de la charla rápida de Seguridad y salud en el trabajo.


El registro de participantes de la charla rápida de Seguridad se presenta en el Anexo N° 01, del presente Informe.

5.2. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SCTR

El personal de obra cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo –SCTR, a través de la aseguradora MAPFRE y la renovación se realiza de manera mensual.

En el Anexo N° 02, del presente informe a manera de muestra se presenta la Constancia de Aseguramiento.

Constructora Inmobiliaria Río Huallaga S.A.C.
 RUC. 20190278851


 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA SAC


 Pastor R. Viera Arango
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP. 67085

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA SAC
 RUC. 20190278851

 PASTOR R. VIERA ARANGO
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP. 67085

 COIRH	<small>OBRA</small> "CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN"	ELABORADO: PVA/ESST
		REVISADO: ROMQB
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023 . II	Página 13 de 14

5.3. SUMINISTRO DE AGUA TRATADA AL PERSONAL

Se suministró agua tratada al personal de obra, a fin de mantener los niveles óptimos de hidratación del personal, así mismo, se cuenta con stock para garantizar el abastecimiento continuo de agua tratada en los diferentes puntos de uso.

A la fecha se cuenta con 1 puntos de hidratación, ubicado en las instalaciones exteriores de la obra.



(Signature)
 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67816

Foto N° 6: Se evidencia punto de hidratación, ubicado en las instalaciones exteriores de la obra.

5.4. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

En el presente mes se realizó la identificación de peligros y evaluación de riesgos en cada etapa de los trabajos y tareas en el desarrollo de las actividades durante la ejecución de la obra, y así generar controles que en alguna forma se pueda eliminar o minimizar los riesgos y peligros.

En el Anexo N° 03 del presente informe, se adjunta el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) generados en los frentes de trabajo, durante el presente mes.

Construtora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC: 30450278051
(Signature)
Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 30450278051
(Signature)
 ING. JULIO CESAR RODRIGUEZ BOLAÑOS
 CIP: N° 36199

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
(Signature)
Pasteur R. Viana Azing
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP: N° 38694

 COIRH	OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN"	ELABORADO: FVWEEST
		REVISADO: RQWQB
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023 - II	Página 14 de 14

VI. VALORIZACIÓN

El metrado y el monto valorizado correspondiente a las actividades en materia de Seguridad y salud en el trabajo, ejecutadas durante en el periodo del 21 al 31 de diciembre de 2023, se presenta en el Anexo N° 04, del presente informe.

VII. ANEXOS

- Anexo N° 01: Registros de participantes (Varios).
- Anexo N° 02: Constancia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR.
- Anexo N° 03: Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
- Anexo N° 04: Metrado y valorización – del 21 al 31 de diciembre de 2023.


 Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC: 20450278051

Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL



GUILLEMO OLAY PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67086


 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 20450278051

Pastor A. Viana Araya
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP. 67498

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.


Pastor A. Viana Araya
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP. 67498

 COIRH	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO I JUAN GUERRA - SAN MARTIN"	ELABORADO: P.VNESST REVISADO: RODRIGUA
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023 -I-	Página 1 de 5

ANEXOS


 Constructora Inmobiliaria Rio Mallaqa S.A.C.
 RUC. 20150278051


Abner Guzman Tejada
 REPRESENTANTE GENERAL


 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO MALLAQA S.A.C.
 RUC. 20150278051

 Ing. **Pastor R. Viana Azeng**
 INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP. 02085



GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 02085

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO MALLAQA S.A.C.


Pastor R. Viana Azeng
 INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP. 02085

 COIRH	OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN"	ELABORADO: PYWEGBT
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023	REVISADO: ROLANDO
		Página 2 de 5

Anexo N° 01

Registros de participantes (Varios)



 Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC: 20450178051

Abner Guzman Tejada
 INGENIERO CIVIL


 Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC: 20450178051

Rolando
 INGENIERO CIVIL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.



 Rolando R. Viana Areng
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP. 67086


 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 67086

		REGISTRO DE CHARLA, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y EVALUACIÓN			CÓDIGO PEC-3 VERSIÓN	1-2011 01 02
OBJETO: Capacitación de la sede local de Vigilancia Ambiental y Zona de Tratamiento Para el uso Doméstico - San Marcos						
RAZÓN SOCIAL CONSTRUCORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.		RUC 2045078051	DIRECCIÓN AV. CIRCUNVALACION N° 3283 - TAMBAYTO		ACTIVIDAD ECONÓMICA CONSTRUCCIÓN	N° TRABAJADORES
ACTIVIDAD EDUCACIÓN						
TIPO DE CHARLA PELIGROS ELÉCTRICOS						
FECHA 29/12/2013						
EXPONENTES / INSTRUCTOR(ES) JUAN ALBERTO SOROPUJO VERA						
N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DN	CARGO	FECHA	OBSERVACIONES	
1	Campanal Bonaventura Alvarado	7100374	Peon	29/12/13		
2	Chavez Fajuri Antonio Carlos	4431456	Peon	29/12/13		
3	Yupari Danilo Roman Wlorbe	71287024	OB	29/12/13		
4	Daniel Sanyana Sanyana	448611612	Peon	29/12/13		
5	Sanyana Carlos E.	446610914	OB	29/12/13		
6	FELIX MARIANO REYNE GENTILES	43410180	Operario	29/12/13		
7	Gelanova Alessia Roman	10161768	Madrina	29/12/13		
8	José Luis Amador Uscá	70180318	Peon	29/12/13		
9	Luis Rivera Roberto	11021791	Operario	29/12/13		
10	Sandoval Diaz Henry Jofre	46141965	OB	29/12/13		
11	NIEFER FAUCON NUNTA	71160140	Peon	29/12/13		
12	JHO ANTONIO GARCIA PEREZ	12451014	OB	29/12/13		
13	Fajuri Epifanio Oscar Cristian	6061912	Peon	29/12/13		
14						
15						
16	GUILERMO DIAZ PALOMINO INGENIERO CIVIL CIP. 57085		CONSTRUCORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C. Posteur R. Viera Alena ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Construtora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C. RUC. 2045078051 Abner Guzman Tejada GERENTE GENERAL	
17						
RESPONSABLE DEL REGISTRO						
NOMBRE JUAN ALBERTO SOROPUJO VERA		CARGO O.P. / S.			FIRMA	
FECHA 29/12/2013						

CONSTRUCORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC. 2045078051

CONSTRUCORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC. 2045078051

		RESUMEN DE OBRAS DE CARÁCTER DE ENTREGA DE SERVICIOS			CÓDIGO: P.06.14 FECHA: 07/03/22 OPERACIÓN: 1
OBRAS: "CONSTRUCCIÓN DE 08 CASAS EN EL VILLAGE GOLF DE ZONA DE FERIA DEL TUPAC KATIPATI EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN"					
RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.		RUC: 20450278051	DIRECCIÓN: AV. CIRCUNVALACIÓN N° 2251 - TUPAC KATIPATI	ACTIVIDAD ECONÓMICA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	PARTICIPACIONES:
ACTIVIDAD: 2.1.1					
INDUCCIÓN:	OBRAS:	LOCALIZACIÓN:	ENTREGA DE SERVICIOS:	SERVICIO:	
TÍTULO DE: CONTAMINACION DEL SUELO					
FECHA: 28/12/2021					
EXPOSITORES/INSTRUCIONES: JUVA ALVARADO TOROPILO VERD					
N°	APellidos y Nombres	N° ON	CARGO	FIRMA	Observaciones
1	Juan Toropillo Toropillo David	27031456	Psicólogo		
2	Orlando Cristian Toropillo Toropillo	60282608	Psicólogo		
3	Alfonso Junior Campoverde Campoverde	23206834	Psicólogo		
4	Carla E. Vargas Escobar	61270718	Psicóloga		
5	Juvenal Alvarado Medina Seminario	43444552	OP		
6	Rayan Danilo Pacheco Pacheco	21286062	OP		
7	Diego David Huerta Huerta	20060216	OP		
8	Yuri Alvarado Pulveda	21282718	OP		
9	Geoffrey Alejandro Toropillo	20161948	OP		
10	José Luis Huerta Huerta	20060216	OP		
11	Andrés Del Carmen Martínez	61270718	OP		
12	Yuri Alvarado Pulveda	21282718	OP		
13	Ricardo Toropillo Toropillo	61270718	Psicólogo		
14					
15	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.  Pastor A. Viana Arellano ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (CIP N° 28886)			 GUILLERMO DIAZ PALOMINO INGENIERO CIVIL CIP. 87886	
16					
17					

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRE: JUVA ALVARADO TOROPILO VERD CARGO: OP. OP FECHA: 28/12/2021	FIRMA: 
---	--

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 20450278051


 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 20450278051
 Vía: Juvá Calle 10, Miraflores del Valle
 15108 432 DE PERÚ
 CIP N° 87886

COIRH		REGISTRO DE CHARLA CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO Y BRIGADAJEO				FORMA	FECHA					
COPIA		Se informa de la realización de la capacitación y/o de la formación para el caso de emergencias - Evacuación										
Razón social	RUC	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD ECONOMICA	N° TRABAJADORES								
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUANCA S.A.C.	2045077805	AV. CIRCUNVALACIÓN N° 2885 - TARIAPATA	CONSTRUCCIÓN									
FECHA	ORIENTADOR	ENTRENADOR	EMPLEADOS									
FECHA:	LUNES 11 DE JUNIO DEL 2023											
RESPONSABLE INSTRUCTORES	JULIO ALBERTO TAPAYARI VERA											
N°	APELLIDOS Y NOMBRES	ID DNI	CATEG	FIRMA	OBSERVACIONES							
1	Companent General Alex Jarama	73710734	Peon	[Firma]								
2	Kotony General Gans Tapayari	77021416	Peon	[Firma]								
3	Bryen Paulo Tvarona Polanco	72725061	OP.	[Firma]								
4	Ramón Sangua Sangua	4852140	Peon	[Firma]								
5	Carlos E. Sangua Sangua	4852148	OP.	[Firma]								
6	Bilman A. Tvarona Al	70161765	Operario	[Firma]								
7	PELUS ALBERTO PEYUN ALBERTO	70341116	OP.	[Firma]								
8	José Luis Amalpan Cardón	70160316	Peon	[Firma]								
9	Rivera Roble de Luis	71037191	Operario	[Firma]								
10	MILDER PALUNDO UVEDO	77160140	Peon	[Firma]								
11	Sandoval Dora Mercedes Andino	46141428	OP	[Firma]								
12	Dora Cecilia Tapayari Tapayari	4618606	Peon	[Firma]								
13	DR. ALBERTO CALMUCHI VERGARA	7349347	OT	[Firma]	BULLERMO DIAZ PALOMINO INGENIERO CIVIL CIP. 67094							
14	<p>CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUANCA S.A.C. RUC. 2045077805</p> <p>Abner Guzman Tejada GERENTE GENERAL</p> <p>CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUANCA S.A.C. RUC. 2045077805</p> <p>POSTEMI S. VIENTE AZABO ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CIP. 67094</p>											
15												
16												
17	RESPONSABLE DEL REGISTRO											
NOMBRE	JULIO ALBERTO TAPAYARI VERA					FIRMA	[Firma]					
LUGAR	TARIAPATA											
FECHA	11/06/2023											

COIRH		REGISTRO DE CHARLA CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS			CÓDIGO	FOLIO
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA OLA PARA EL SEGURO DE LA VIDA Y SALUD EN EL TRABAJO - 2da Etapa - 2da Sesión"					FECHA	3-08-23
RAZÓN SOCIAL		RUC	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD ECONÓMICA	N° TRABAJADORES	
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.S.		20450278051	AV. CIRCUNVALACIÓN N° 2083 - TARIPOYO	0362 Construcción		
ACTIVIDAD						
INDICACIÓN	ÁREA	CATEGORÍA	ENTRENAMIENTO	EMERGENCIAS		
TÍTULO		DROGA Y LIMPRESA				
FECHA		23/12/2023			N° DE HORAS	
EXPOSITORES/INSTRUCTORES		JULIO BURNIÑO TORRES y LUIS RIVERA				
N°	APellidos y Nombres	N° DOC	CARGO	Firma	Observaciones	
1	Antonio David Gomez Tapayari	400146	Peón			
2	Tapayari Tupullino Oscar Guillen	6002368	Peón			
3	Alex Junior Campoverde Gonzalez	237061	Peón			
4	Sergio Oscar Cortez B.	46620918	OP			
5	FRANCISCO ARMANDO REYES GONZALEZ	43410800	OP			
6	WALTER FACUNDO HUATA	42162403	Peón			
7	Bryan David Guzman Nolasco	2278206	OP			
8	Luis Rivera Lobledo	21082191	PROFESOR			
9	Andres Emilio José Luis	20120326	Peón			
10	Gelman Alexis Trujano	10001360	Peón			
11	CARLOS ROQUE HINOJOSA	27493014	OP			
12	Ronald Jairo Sangua	4354200	Peón			
13	Juan Carlos Rojas Torres	4314448	OP			
14						
15	Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.S. RUC: 20450278051 				CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.S. 	
16	Abner Quiroz Telada INGENIERO GENERAL				POSTEUS A. VIEIRA ATENG ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (C) 03086	
17						

RESPONSABLE DEL REGISTRO		FIRMA	
NOMBRE	JULIO BURNIÑO TORRES		
CARGO	OP - JEF.		
FECHA	23/12/2023		

COIRH		REGISTRO DE CHEQUEO, CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO			OCORR	P. 08-14
FORMA		FECHA	VERIFICAR		1	
Descripción: a) obra para el edificio San José y Torre de Tránsito Torre A y Torre B - San José						
RAZÓN SOCIAL		RUC	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD ECONÓMICA	N° DE PLANIFICACIÓN	
CONSTRUCION HUALLAGA RUC		20450278051	N. CIRCUNVALACION N° 2200 TAYANTO	CONSTRUCCION		
ACTIVIDAD						
REUNION	CHEQUEO	CAPACITACION	ENTRENAMIENTO	DESARROLLO		
Tema de:		MANTENIMIENTO DE OBRAS				
FECHA		21/11/2013			N° DE HORAS	
EXPOSICION Y/O INSTRUCCIONES		TRABAJO REALIZADO EN OBRAS				
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DNI	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES	
1	Guillermo Gonzales	3320011	Proa	[Firma]		
2	Donato Tapayuni	3301140	Proa	[Firma]		
3	Trinidad Nolasco	3323100	OP	[Firma]		
4	Antonio Sanguino	4100011	Proa	[Firma]		
5	Esteban E. Sanguino	4102000	OP	[Firma]		
6	RODRIGO GONZALEZ	4101010	OP	[Firma]		
7	Edith Sanguino	3301200	Mecanico	[Firma]		
8	Amelinda Cruz	3301010	Proa	[Firma]		
9	Yolanda Sanguino	3301010	OP	[Firma]		
10	Santiago Sanguino	3301010	OP	[Firma]		
11	Florencia Sanguino	3301010	Proa	[Firma]		
12	Yolanda Sanguino	3301010	OP	[Firma]		
13	Yolanda Sanguino	3301010	OP	[Firma]		
14	CONSTRUCION HUALLAGA RUC 20450278051			CONSTRUCION HUALLAGA RUC		
15	[Firma]			[Firma]		
16	Abner Guzman Tejada GERENTE GENERAL			Pastor R. Wena Areng ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
17	[Firma]			[Firma]		
Nombre y Apellido del Encargado: JUAN ALFREDO SANGUINO						
Firma: [Firma]						
Fecha: 21/11/2013						



 GUILLERMO GUZMAN
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 57885

CONSTRUCION HUALLAGA RUC
 [Firma]
 Pastor R. Wena Areng
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP. 100000

CDIRH		REGISTRO DE CARTA CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y GALAARDOS				ORGANO	FECHA
OBJETO		"CONSTRUCCIÓN DE UNAS PISCINAS COMUNALES PARA LA COMUNIDAD DEL BARRIO - SAN JUAN"				MINSA	01/08/23
RAZÓN SOCIAL		RUC	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD ECONÓMICA	OTRAS NOTAS		
CONSTRUCION INMOBILIARIA Y SERVICIOS		20450278051	AV. CIRCUNVALACION N° 2201, TAMBAYTESO	CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD							
INDICACION	CARTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	CAPACITACION	<input type="checkbox"/>	ENTRENAMIENTO	<input type="checkbox"/>	GALAARDOS
TEMÁTICA	PROTECCIÓN DE LOS PLUGS						
FECHA	21/12/2023					PERIODO	
RESPONSABLE DEL ACTUADOR	JULIO ALBERTO JORJANO VERA						
N°	APellidos y Nombres	N. DE	CARGO	FECHA	OBSERVACIONES		
1	RODRIGO GONZALEZ FELIX ALVARADO	41341255	OP	AP			
2	Osorio Tapayuni Anthony David	77051472	Peón	AP			
3	Isayana Saucan David	9824652	Peon	AP			
4	Camacho Camacho Alex Javier	73706734	Peon	AP			
5	Lucrecia Polanco Bryan David	12961027	OP	AP			
6	Coria E. Anyana Cesar	44020718	OP	AP			
7	Bolanos Algoria Lucrecia	1021165	Peon	AP			
8	Rivero Polanco Luis	3100741	OP	AP			
9	Andresen Garcia Jose Luis	70780376	Peon	AP			
10	Santoval Crat Marcos Antonio	12147067	Operario	AP			
11	FLORENS ISUIBA ALICIA	7120140	Peon	AP			
12	Tapayuni Tapayuni Oscar Cristian	64051960	Peon	AP			
13	ALMAYE PEREZ HIRSH ANDRES	31495711	OP	AP			
14							
15	Construtora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A. RUC: 20450278051 Abner Guzman Pejora GERENTE GENERAL						
16					CONSTRUCION INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C. RUC: 20450278051 POSTOR R. VILHO AZURO ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CIP. 67086		
17					GABRIEL DIAZ PALOMINO INGENIERO CIVIL CIP. 67086		
RESPONSABLE DEL ACTUADOR							
NOMBRE	JULIO ALBERTO JORJANO VERA						
CARGO	CIP. 411						
FECHA	21/12/2023						


	OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN"	ELABORADO: PYNESST REVISADO: RODRIGUA
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023 - II	Página 3 de 3

Anexo N° 02

Constancia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR


 Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.L.C.
 RUC. 2045027805

Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


 CONSTRUCIONA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC. 2045027805

ING. JULIO ALBERTO DIAZ PALOMINO
 RUC. 2045027805

CONSTRUCIONA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.

PASTOR R. VIANA AZERO
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP. 87086


GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 87086

Nro. De Constancia MP/2023/8634421



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que bajo persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C. bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200084527 y contrato de Salud No. 7022200100704, con vigencia del 01/12/2023 hasta el 31/12/2023, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26780 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)

1	DNI	73849325	AMASIFUEN SANGAMA, SANDRO PAWELL
2	DNI	41873846	ARCE NOLORBE, JOHN JESUS
3	DNI	43576678	CUBAS HURTADO, AMOS
4	DNI	75955688	GAYDIA SANCHEZ, NILTON
5	DNI	77276702	MARCOS SANTOS, LENIN
6	DNI	45547435	PINCHI PAREDES, SEGUNDO ANTONIO
7	DNI	47878486	ROJAS TUANAMA, LUIS
8	DNI	73468618	ZULUETA ALARCON, MARCOS


 GUILLELMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67085

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

19/12/2023 07:19:49 pm


CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.

 Pasteur R. Viena Alzola
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP N° 57898



 DIANA CAROLINA NIETO LUQUE
 UNIDAD DE VIDA, DECESOS Y ACIDENTES

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 2045027801

 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Conforme al art. 24.2 del D.S. N° 003-89-SA, si el contratante declara remuneraciones menores a las consignadas en las planillas y boletas de pago de sus trabajadores (incluidas gratificaciones de Julio y Diciembre), para el cálculo de la prima, incurrirá en un supuesto de cobertura insuficiente, y facturará a la aseguradora a solicitar el reembolso de la diferencia entre el importe de la pensión calculada con información declarada por el empleador para el cálculo de la prima, y el monto de la pensión que corresponde a lo efectivamente percibido por el trabajador.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constancias.mapfre.com.pe/>

Validación en línea, a través de nuestro WhatsApp +51 989919133

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 2045027801

 Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL


 COIRH	OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA - SAN MARTIN	ELABORADO: PVA/ESST REVISADO: ROY/CMBDA
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICIEMBRE 2023	Página 4 de 5

Anexo N° 03

Análisis de Trabajo Seguro (ATS)



GUILERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CP. 67086

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C

Pastor R. Viana Azang
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CP. 67086

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C
 RUC. 20450278051


Abner Guzman Tejada
 GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C
 RUC. 20450278051


INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CP. 67086

PASES DE LA ACTIVIDAD / TAREA A REALIZAR	REPORTE ASOCIADO	FECHA DE REALIZACION	INDICADOR DE RIESGO	MEASURAS CONTROL
1) Inspección de área de trabajo y limpieza	- Limpieza y limpieza	10/04	4	4 - CAMBIAR CON CAMBIO
2) Inspección y traslado de equipos y herramientas	- Limpieza, limpieza y limpieza	04/04	18	- Limpieza por Españoles con utensilios con EPO's.
3) Ejecución de tareas	- Limpieza y limpieza	10/05	24	- PAUSA (PUNTA), (CAMBIO DE AB) Y CARGAS DIARIAS
4) Limpieza de trabajo	- Limpieza y limpieza	05/05	24	- JERARIZACION, CAMBIO Y
	- Limpieza y limpieza			CONSULTA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (C.S.S.T.)
				CONSEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (C.S.S.T.)

VERIFICACION EN CAMPO DURANTE LA EJECUCION DE LA TAREA (DESDE EL MOMENTO DE EMPEZAR EL TRABAJO)		Nivel de Evaluación de Riesgo	
Nº	CONDICIONES DE TRABAJO	SEVERIDAD	FECHA
1	Edif. 187	1 2 3 4 5	11
2		1 2 3 4 5	11
3		1 2 3 4 5	11
4		1 2 3 4 5	11
5		1 2 3 4 5	11

INGENIERO EN SEGURIDAD CIVIL
OUTLETTING PASCALINO
 C.R. 1186
INGENIERO EN SEGURIDAD CIVIL
OUTLETTING PASCALINO
 C.R. 1186
INGENIERO EN SEGURIDAD CIVIL
OUTLETTING PASCALINO
 C.R. 1186

COIRH		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - A.S.T.					REGIÓN CONTROL	
FASOR DE LA ACTIVIDAD / TAREA A REALIZAR		PLAZO/ESPECIFICADO	RIESGOS/ACTO ASOCIADO	SEVERIDAD	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE CONTROL	FECHA DE CONTROL	FECHA DE CONTROL
1) INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO		TERMINAL, ZONA DE CARGA	CAÍDOS Y HEMORRAGIAS	4	11	11	- CAUTIVIDAD CON INTERVENCIÓN	
2) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS		ZONA DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS	DERIBES, HEMORRAGIAS, CAÍDAS, EQUIPOS	4	16	16	- CIRCULAR POR ESPALDAS - BARRERAS CON (O SIN)	
3) MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA CARGAS		OPERACIÓN DE MAQUINARIA	DERIBES, HEMORRAGIAS, CAÍDAS, EQUIPOS	5	24	24	- DAÑOS A ACTIVAS, (CERROS DE PIS Y CHAVILAS) CARGAS	
4) CARGA DE BARRAS		CARGA DE BARRAS	CAÍDAS, HEMORRAGIAS, EQUIPOS	5	24	24	- SEÑALIZACIÓN, BARRERAS	

VERIFICACIÓN DE CAMPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA (INDICAR EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL TURNO DE TRABAJO)		MATE 94 - Evolución de riesgo												
Nº	INDICADOR / ACTIVIDAD	CARGO	SEVERIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TERMINAL, ZONA DE CARGA	OP. / JIF	4	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2	ZONA DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS	OP. / JIF	4	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
3	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA CARGAS	OP. / JIF	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

COIRH
GULLERMO ZALACAMA
INGENIERO CIVIL
DIR. 07086

Posteur R. Vico Azop
MG OF MANTENIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO
C.A.P. - S.I.E.T.

[Handwritten Signature]
 PABLO ERIC PALOMAR
 INGENIERO CIVIL
 CIR 67088

COIRH		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - A.S.T.					MEDIDAS CORRECTIVAS	
PASOS DE LA ACTIVIDAD (TAREA A REALIZAR)		MATERIAL/PROYECTO		RECURSOS/HOJAS APLICADAS		NIVEL DE RIESGO		
						Medio		
						Alto		
1) Inspección de obra de concreto	FERRENO, DANDON y CUBETA	CAJAS, HERRAJES	C	3	13			
2) Inspección y medición de equipos y componentes	CAJAS DE CONCRETO EQUIPOS Y HERRAJES	CONCRETO, HERRAJES, CAJAS DE CONCRETO	C	4	16			
3) Equipos de concreto de sistema	PARTE MEXICANA DE OPERACIÓN DE BOMBAS (MEXICANA)	CONCRETO, BOMBAS, HERRAJES	D	5	24			
4) Ferreno de concreto	HERRAJES DE CONCRETO	CONCRETO, HERRAJES	D	5	24			

VERIFICACIÓN EN CAMPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA (SECCIÓN EN CUMPLIMIENTO DURANTE EL TIEMPO DE TRABAJO)		Métricas de Evaluación de Riesgo												
#	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	CATEGORÍA	NIVEL DE RIESGO	SEVERIDAD					PROBABILIDAD					
				1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	
1	TRABAJO DE CONCRETO	ALTO	ALTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		ALTO	ALTO	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		ALTO	ALTO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4		ALTO	ALTO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5		ALTO	ALTO	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

PABLO ERIC PALOMAR
 INGENIERO CIVIL
 CIR 67088
 PABLO ERIC PALOMAR
 INGENIERO CIVIL
 CIR 67088
 PABLO ERIC PALOMAR
 INGENIERO CIVIL
 CIR 67088

COIRH (Logo) | **ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - A.B.T.**

Objetivo: Identificar los riesgos de los trabajos y evaluarlos para determinar las medidas de control necesarias.

Fecha: 14/11/2013

Lugar: Oficina de Ingeniería

Actividad: Análisis de Seguridad en el Trabajo (A.B.T.)

Responsable: [Firma]

Participantes: [Firma]

Objetivo de la actividad: Realizar el análisis de seguridad en el trabajo para identificar los riesgos y determinar las medidas de control necesarias.

Alcance: Toda la actividad de trabajo.

Metodología: Método de Análisis de Seguridad en el Trabajo (A.B.T.)

Resultados: [Firma]

Conclusiones: [Firma]

Recomendaciones: [Firma]

Actividad	Identificación de riesgos	Evaluación de riesgos	Medidas de control
1. Análisis de riesgos	Identificación de riesgos	Evaluación de riesgos	Medidas de control
2. Análisis de riesgos	Identificación de riesgos	Evaluación de riesgos	Medidas de control
3. Análisis de riesgos	Identificación de riesgos	Evaluación de riesgos	Medidas de control
4. Análisis de riesgos	Identificación de riesgos	Evaluación de riesgos	Medidas de control
5. Análisis de riesgos	Identificación de riesgos	Evaluación de riesgos	Medidas de control
6. Análisis de riesgos	Identificación de riesgos	Evaluación de riesgos	Medidas de control
7. Análisis de riesgos	Identificación de riesgos	Evaluación de riesgos	Medidas de control
8. Análisis de riesgos	Identificación de riesgos	Evaluación de riesgos	Medidas de control
9. Análisis de riesgos	Identificación de riesgos	Evaluación de riesgos	Medidas de control
10. Análisis de riesgos	Identificación de riesgos	Evaluación de riesgos	Medidas de control

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DE DNI	FECHA	HORA IN	HORA FIN	Nº DE DÍAS	FECHA	HORA
1	Pastor A. Muñoz Santaló	40147165	[Firma]	17				
2	Oron Luciano Tapayán Yaguelino	68020808	[Firma]	17				
3	Cody E. Layman Giviera	46020808	[Firma]	17				
4	José Rivera Ballester	71071991	[Firma]	17				
5								
6								
7								
8								
9								
10								

COIRH (Logo) | **ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - A.B.T.**

Objetivo: Identificar los riesgos de los trabajos y evaluarlos para determinar las medidas de control necesarias.

Fecha: 14/11/2013

Lugar: Oficina de Ingeniería

Actividad: Análisis de Seguridad en el Trabajo (A.B.T.)

Responsable: [Firma]

Participantes: [Firma]

Objetivo de la actividad: Realizar el análisis de seguridad en el trabajo para identificar los riesgos y determinar las medidas de control necesarias.

Alcance: Toda la actividad de trabajo.

Metodología: Método de Análisis de Seguridad en el Trabajo (A.B.T.)

Resultados: [Firma]

Conclusiones: [Firma]

Recomendaciones: [Firma]

COIRH (Logo) | **ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - A.B.T.**

Objetivo: Identificar los riesgos de los trabajos y evaluarlos para determinar las medidas de control necesarias.

Fecha: 14/11/2013

Lugar: Oficina de Ingeniería

Actividad: Análisis de Seguridad en el Trabajo (A.B.T.)

Responsable: [Firma]

Participantes: [Firma]

Objetivo de la actividad: Realizar el análisis de seguridad en el trabajo para identificar los riesgos y determinar las medidas de control necesarias.

Alcance: Toda la actividad de trabajo.

Metodología: Método de Análisis de Seguridad en el Trabajo (A.B.T.)

Resultados: [Firma]

Conclusiones: [Firma]

Recomendaciones: [Firma]

COIRH (Logo) | **ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - A.B.T.**

Objetivo: Identificar los riesgos de los trabajos y evaluarlos para determinar las medidas de control necesarias.

Fecha: 14/11/2013

Lugar: Oficina de Ingeniería

Actividad: Análisis de Seguridad en el Trabajo (A.B.T.)

Responsable: [Firma]

Participantes: [Firma]

Objetivo de la actividad: Realizar el análisis de seguridad en el trabajo para identificar los riesgos y determinar las medidas de control necesarias.

Alcance: Toda la actividad de trabajo.

Metodología: Método de Análisis de Seguridad en el Trabajo (A.B.T.)

Resultados: [Firma]

Conclusiones: [Firma]

Recomendaciones: [Firma]

COPIR		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - A.B.T.				MEDIDAS CONTROL	
PASOS DE LA ACTIVIDAD / TAREA A REALIZAR		PELIGRO/SUJETO	RIESGO/IMPACTO ASOCIADO	SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO	FECHA	REALIZADO
1/ Inspección de área de trabajo	- tener en cuenta y limpiar	- Caídas y hemorragias		4	Alto	11	- CAMARON CON APLICACION
2/ Inspección y revisión de equipos y herramientas	- tener en cuenta y limpiar	- golpes, heridas, esguince y laceración		4	Alto	18	- CARGA INAPROPIADA CON LOS EQUIPOS
3/ Ejecución de obra de concreto	- posición de los elementos de concreto	- UNGUALDIA		5	Alto	24	- PAVAS ACTUALES, LLENARLO DE AG Y CHORRAS DIFERENTES
4/ Ejecución de jornada laboral	- UNGUALDIA	- CAÍDA DE OBJETOS		5	Alto	24	- JEFA OPERACIÓN OPERA Y LIMPIEZA

GUILLERMO DIAZ PALOMINO
INGENIERO CIVIL
CIP: 47088

VERIFICACIÓN EN CAMPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA (PREVENIR EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL TURNO DE TRABAJO)		NIVEL DE EVALUACIÓN DE RIESGO	
SEVERIDAD	CAUSAS	IMPACTO	SEVERIDAD
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

INGENIERO CIVIL
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
CIP: 47088

COMISIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
C.O.S.T. S.A.
C/O S.F. S.A.
C/O S.F. S.A.

INGENIERO CIVIL
GUILLERMO DIAZ PALOMINO
CIP: 47088



ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - A.S.T.

FECHA	08/11/2023
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA
ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

Objetivo de la actividad: Construcción de muros de contención.

Ubicación de la actividad: Calle 100 A, Barrio San Antonio, Municipio de Barranquilla.

Fecha de la actividad: 08/11/2023

Horario de la actividad: 05:00 PM - 07:00 PM

Responsable de la actividad: Belson Alejandro Jimenez

Supervisor de la actividad: Roberto Giguere Giron

Identificación de la actividad	Descripción de la actividad	Identificación del trabajador	Descripción del trabajo	Identificación del supervisor	Descripción del control
1	Construcción de muros de contención	Carlos E. Jarama Jimenez	4661010	08/11/2023	05:00 PM - 07:00 PM
2	Construcción de muros de contención	Orlando Cortes Jimenez	6207106	08/11/2023	05:00 PM - 07:00 PM
3	Construcción de muros de contención	Zeris Rufae Robledo	7083191	08/11/2023	05:00 PM - 07:00 PM
4	Construcción de muros de contención	Alma Andrea Sarmiento Diaz	4114181	08/11/2023	05:00 PM - 07:00 PM

Identificación del trabajador	Descripción del trabajo	Identificación del supervisor	Descripción del control
1	Construcción de muros de contención	Orlando Cortes Jimenez	6207106
2	Construcción de muros de contención	Zeris Rufae Robledo	7083191
3	Construcción de muros de contención	Alma Andrea Sarmiento Diaz	4114181

Observaciones: Se verificó el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, se observó el uso correcto de los EPP y se verificó el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo.

Observaciones: Se verificó el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, se observó el uso correcto de los EPP y se verificó el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo.

Observaciones: Se verificó el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, se observó el uso correcto de los EPP y se verificó el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo.

CONSTRUCTORA MAJOLARMA
ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CIP N° 00085

CONSTRUCTORA MAJOLARMA
ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CIP N° 00085

COIRH		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - A.S.T.					MIRADAS CONTRA...	
FASES DE LA ACTIVIDAD / TAREA A REALIZAR		PELIGRO/SUBJECTO	RIESGO/IMPACTO ADECUADO	SEVERIDAD	VALOR DE RIESGO	Medidas	Fecha	
1/ Inspección de datos de trabajo		Resaca, orden limpieza	- Caídas, heridas	10	4	24	- Caminar con cuidado	
2/ Inspección y manejo de equipos y mantenimiento		- Área de trabajo Equipos y herramientas	- Condit, Heridas caídas a nivel y aer nivel	10	4	24	- Circular por espacios ciegos usando los EDDI.	
3/ Mantenimiento de maquinaria		- Partidas prolongadas - Operación de equipos (Llaves)	- Choques - Condit, Heridas	10	4	24	- Ausas activas, controladas operacionales. (Energía de air, energía eléctrica)	
4/ Limpieza		- Limpieza general - Limpieza	- Caídas a nivel - Choques	10	4	24	- Señalización, orden y limpieza	

GUILLERMO DIAZ BACCOMINO
INGENIERO CIVIL

VERIFICACIÓN EN CAMPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA PREVIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL TURNO DE TRABAJO		Módulo de Evaluación de Riesgo							
Nº	MOMENTO / ANÁLISIS	CARGO	RIESGO CORRECTIVO / RECOMENDACIONES	FECHA	SEVERIDAD	Grado de Exposición	Grado de Frecuencia	Grado de Impacto	Grado de Exposición Total
1	Trabajo de limpieza y mantenimiento	J.P.		11/11	10	4	24	10	10
2	Inspección y mantenimiento de equipos	J.P.		11/11	10	4	24	10	10
3	Mantenimiento de maquinaria	J.P.		11/11	10	4	24	10	10
4	Limpieza	J.P.		11/11	10	4	24	10	10
5	Inspección y mantenimiento de equipos	J.P.		11/11	10	4	24	10	10
6	Mantenimiento de maquinaria	J.P.		11/11	10	4	24	10	10

CONSTRUCCIONES MARQUELLA S.A.C.
RUC: 20150278051

Ing. R. VERA AZARO
INGENIERO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

COIRH		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - A.S.T.					NIVEL DE RIESGO	
PESOS DE LA ACTIVIDAD / TAREA A REALIZAR		FILAS/RECORRIDO	RECORRIDO/ACTO ASOCIADO	SEÑALES	SEÑAL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO		
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA		FECHA DEL FOTOGRAFADO	FECHA DEL FOTOGRAFADO	SEÑALES	SEÑAL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO		
1	IMPRESIÓN DE LETRA DE TRABAJO	- VERIFICAR, DISEÑAR Y LIMPIAR	- BAÑAS, LINDAS	0	U	U	U	RECOMENDACION DE COMANDANTE
2	IMPRESIÓN Y TRANSFERENCIA DE LETRA	- FONOS DE TRABAJO	- LINDAS, HONDAS	U	U	U	U	- CAMINAR PARA TRABAJAR UNDES USANDO CORTAJES
3	CONFECCIONADO DE ACEÑO	- ACOSTUMBRADO A LOS TRABAJOS	- (LINDAS) (LINDAS)	0	U	U	U	- EXTINTOR USANDO
4	APRENDIZAJE DE TRABAJO	- (LINDAS) (LINDAS)	- (LINDAS) (LINDAS)	0	U	U	U	- (LINDAS) (LINDAS)
5	TRABAJO (LINDAS)	- (LINDAS) (LINDAS)	- (LINDAS) (LINDAS)	0	U	U	U	- (LINDAS) (LINDAS)

GUILLERMO DOMESTICO
INGENIERO CIVIL
CIP. 67808

Matriz de Evaluación de Riesgo

SEVERIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
5	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

VERIFICACIÓN EN CAMPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA (PREVIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL TIEMPO DE TRABAJO)

Nº	INDICACIONES	CAUSA	EFECTOS (EN RECOMENDACION)	FECHA	USO
1	TRABAJO A BARRERAS	E.P.	-	7-16	
2	CONSTRUCCIÓN DE TRABAJO	RUC. 201502780			
3	CONSTRUCCIÓN DE TRABAJO	RUC. 201502780			

Abner Guzmán Tejeda
INGENIERO CIVIL

POSCOR R. WILSON AZEVEDO
INGENIERO CIVIL

CONSTRUCCIÓN DE TRABAJO
RUC. 201502780

PAISAJE DE LA ACTIVIDAD / TAREA A REALIZAR	POSICIÓN/POSTURA	MEDICIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN	MOVILIDAD DEL ABOGADO	MOVILIDAD DEL TRABAJADOR					
1) MISIONES CON PELIGRO DE CAÍDAS	TIEMPO, FALTA DE CORDÓN Y CERRAJES	3	CAÍDAS, CERRAJES	1)					- Chorrera con cascara
2) INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	APARTE TRABAJOS FUERA Y HERRAMIENTAS (ALTA PRESIÓN)	4	CONOCI, HERRAJES	19					COMUNICAR CON PASAJEROS CON VIBRACIONES (PPA).
3) OPERACIONES DE MONTAJE DE EQUIPOS	FATIGA MUSCULAR, CERRAJES, CERRAJES, CERRAJES, CERRAJES, CERRAJES	5	UNAJERIA, CONOCI, CERRAJES, CERRAJES, CERRAJES	24					MUJERES DE ALTA Y CERRAJES ALTA.
4) FÉRMENOS NO TORNADOS	CINTA DE SEGURIDAD, CERRAJES, CERRAJES, CERRAJES, CERRAJES	8	CAÍDAS, CERRAJES, CERRAJES, CERRAJES	24					SEÑALIZACION, CERRAJES Y CERRAJES

VERIFICACIÓN EN CASO DE CAMBIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA (REVISIÓN DE CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL TIEMPO DE TRABAJO)		MUESTRA DE DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS	
Nº	TIPO DE ACTIVIDAD	SEVERIDAD	INDICADOR DE RIESGO
1	TRABAJO A ALTURA	3	11
2	TRABAJO CON EQUIPOS	4	12
3	TRABAJO CON HERRAMIENTAS	5	13
4	TRABAJO CON EQUIPOS	6	14
5	TRABAJO CON EQUIPOS	7	15
6	TRABAJO CON EQUIPOS	8	16
7	TRABAJO CON EQUIPOS	9	17
8	TRABAJO CON EQUIPOS	10	18
9	TRABAJO CON EQUIPOS	11	19
10	TRABAJO CON EQUIPOS	12	20
11	TRABAJO CON EQUIPOS	13	21
12	TRABAJO CON EQUIPOS	14	22
13	TRABAJO CON EQUIPOS	15	23
14	TRABAJO CON EQUIPOS	16	24
15	TRABAJO CON EQUIPOS	17	25
16	TRABAJO CON EQUIPOS	18	26
17	TRABAJO CON EQUIPOS	19	27
18	TRABAJO CON EQUIPOS	20	28
19	TRABAJO CON EQUIPOS	21	29
20	TRABAJO CON EQUIPOS	22	30
21	TRABAJO CON EQUIPOS	23	31
22	TRABAJO CON EQUIPOS	24	32
23	TRABAJO CON EQUIPOS	25	33
24	TRABAJO CON EQUIPOS	26	34
25	TRABAJO CON EQUIPOS	27	35
26	TRABAJO CON EQUIPOS	28	36
27	TRABAJO CON EQUIPOS	29	37
28	TRABAJO CON EQUIPOS	30	38
29	TRABAJO CON EQUIPOS	31	39
30	TRABAJO CON EQUIPOS	32	40
31	TRABAJO CON EQUIPOS	33	41
32	TRABAJO CON EQUIPOS	34	42
33	TRABAJO CON EQUIPOS	35	43
34	TRABAJO CON EQUIPOS	36	44
35	TRABAJO CON EQUIPOS	37	45
36	TRABAJO CON EQUIPOS	38	46
37	TRABAJO CON EQUIPOS	39	47
38	TRABAJO CON EQUIPOS	40	48
39	TRABAJO CON EQUIPOS	41	49
40	TRABAJO CON EQUIPOS	42	50
41	TRABAJO CON EQUIPOS	43	51
42	TRABAJO CON EQUIPOS	44	52
43	TRABAJO CON EQUIPOS	45	53
44	TRABAJO CON EQUIPOS	46	54
45	TRABAJO CON EQUIPOS	47	55
46	TRABAJO CON EQUIPOS	48	56
47	TRABAJO CON EQUIPOS	49	57
48	TRABAJO CON EQUIPOS	50	58
49	TRABAJO CON EQUIPOS	51	59
50	TRABAJO CON EQUIPOS	52	60
51	TRABAJO CON EQUIPOS	53	61
52	TRABAJO CON EQUIPOS	54	62
53	TRABAJO CON EQUIPOS	55	63
54	TRABAJO CON EQUIPOS	56	64
55	TRABAJO CON EQUIPOS	57	65
56	TRABAJO CON EQUIPOS	58	66
57	TRABAJO CON EQUIPOS	59	67
58	TRABAJO CON EQUIPOS	60	68
59	TRABAJO CON EQUIPOS	61	69
60	TRABAJO CON EQUIPOS	62	70
61	TRABAJO CON EQUIPOS	63	71
62	TRABAJO CON EQUIPOS	64	72
63	TRABAJO CON EQUIPOS	65	73
64	TRABAJO CON EQUIPOS	66	74
65	TRABAJO CON EQUIPOS	67	75
66	TRABAJO CON EQUIPOS	68	76
67	TRABAJO CON EQUIPOS	69	77
68	TRABAJO CON EQUIPOS	70	78
69	TRABAJO CON EQUIPOS	71	79
70	TRABAJO CON EQUIPOS	72	80
71	TRABAJO CON EQUIPOS	73	81
72	TRABAJO CON EQUIPOS	74	82
73	TRABAJO CON EQUIPOS	75	83
74	TRABAJO CON EQUIPOS	76	84
75	TRABAJO CON EQUIPOS	77	85
76	TRABAJO CON EQUIPOS	78	86
77	TRABAJO CON EQUIPOS	79	87
78	TRABAJO CON EQUIPOS	80	88
79	TRABAJO CON EQUIPOS	81	89
80	TRABAJO CON EQUIPOS	82	90
81	TRABAJO CON EQUIPOS	83	91
82	TRABAJO CON EQUIPOS	84	92
83	TRABAJO CON EQUIPOS	85	93
84	TRABAJO CON EQUIPOS	86	94
85	TRABAJO CON EQUIPOS	87	95
86	TRABAJO CON EQUIPOS	88	96
87	TRABAJO CON EQUIPOS	89	97
88	TRABAJO CON EQUIPOS	90	98
89	TRABAJO CON EQUIPOS	91	99
90	TRABAJO CON EQUIPOS	92	100

INGENIERO CIVIL GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL CIR. STONE

INGENIERO CIVIL GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL CIR. STONE

COIRH		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - A.S.T.					MEDIDAS CORRECTIVAS	
PASES DE LA ACTIVIDAD / TAREA A REALIZAR		MEDIOAMBIENTO		RECONOCIMIENTO ASOCIADO		NIVEL DE RIESGO		
1	INSPECCIÓN DE LA RED DE EFERRAS	TREMADO, FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	CAJAS, HERRAJES	C	3	D		- CAMINAR CON VIDA DURA
								- CAJAS SIN MARCAR
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ÁREA DE TRABAJO	- BOLSAS, HERRAJES, CAJAS A NIVEL	C	4			- CAMINAR CON PRECAUCIÓN, USAR VESTIMENTA ADECUADA
3	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	- FALTA DE MANTENIMIENTO	- BOLSAS, HERRAJES, CAJAS A NIVEL	D	5			- MANTENER EQUIPOS EN BUEN ESTADO, PROTECCIÓN CONTRA EL SOL, USAR PASOS DE ASES Y CHAVANAS ADECUADAS
4	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	- FALTA DE MANTENIMIENTO	- BOLSAS, HERRAJES, CAJAS A NIVEL	D	5			- MANTENER EQUIPOS EN BUEN ESTADO, PROTECCIÓN CONTRA EL SOL, USAR PASOS DE ASES Y CHAVANAS ADECUADAS
5	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	- FALTA DE MANTENIMIENTO	- BOLSAS, HERRAJES, CAJAS A NIVEL	D	5			- MANTENER EQUIPOS EN BUEN ESTADO, PROTECCIÓN CONTRA EL SOL, USAR PASOS DE ASES Y CHAVANAS ADECUADAS

SEVERIDAD		Nivel de Evaluación de Riesgo					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9	10
4	5	6	7	8	9	10	11
5	6	7	8	9	10	11	12
6	7	8	9	10	11	12	13
A	B	C	D	E	F	G	H
Cantidad	Nº de Incidencias	Problemas	Reparaciones	Costos	Reparaciones	Reparaciones	Reparaciones

VERIFICACIÓN EN GRUPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA (REVISIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL TIEMPO DE TRABAJO)			
Nº	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FECHA	REVISIÓN
1	JUAN GUINDO JARAMA		
2	CONSEJO ADMINISTRATIVO HUAYUJAY S.A. RUC: 20160278001		
3	Abner Cruzada Tejeda DIRECTOR GENERAL		

GOBIERNO DEL PERÚ
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO
INPS

POSTEADO EN: HUAYUJAY S.A.
RUC: 20160278001
DIRECTOR GENERAL
Abner Cruzada Tejeda

Identificación de la actividad: CONSTRUCCION DE LA CARRERA DE BARRIO EL PASO
Empresa: CONSTRUCCION DE LA CARRERA DE BARRIO EL PASO
Actividad: CONSTRUCCION DE LA CARRERA DE BARRIO EL PASO
Fecha: 11/11/2013
Hora: 07:00 AM
Lugar: 07:00 PM
Actividad: CONSTRUCCION DE LA CARRERA DE BARRIO EL PASO
Actividad: CONSTRUCCION DE LA CARRERA DE BARRIO EL PASO

Actividad	Identificación de la actividad	Empresa	Fecha	Hora	Lugar
1	CONSTRUCCION DE LA CARRERA DE BARRIO EL PASO	CONSTRUCCION DE LA CARRERA DE BARRIO EL PASO	11/11/2013	07:00 AM	07:00 PM

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS		Nº DE DÍAS	HORA	Nº DE DÍAS	HORA
	1	2				
1	Pascual, Víctor	Pascual, Víctor	11/11/2013	7:00	11	
2	Pascual, Víctor	Pascual, Víctor	11/11/2013	7:00	12	
3	Pascual, Víctor	Pascual, Víctor	11/11/2013	7:00	13	
4	Pascual, Víctor	Pascual, Víctor	11/11/2013	7:00	14	
5	Pascual, Víctor	Pascual, Víctor	11/11/2013	7:00	15	
6	Pascual, Víctor	Pascual, Víctor	11/11/2013	7:00	16	
7	Pascual, Víctor	Pascual, Víctor	11/11/2013	7:00	17	
8	Pascual, Víctor	Pascual, Víctor	11/11/2013	7:00	18	
9	Pascual, Víctor	Pascual, Víctor	11/11/2013	7:00	19	
10	Pascual, Víctor	Pascual, Víctor	11/11/2013	7:00	20	

CONSTRUCCION DE LA CARRERA DE BARRIO EL PASO
RUC: 2045078051
Abner Gerardo Tejeda
PROPIETARIO

CONSTRUCCION DE LA CARRERA DE BARRIO EL PASO
RUC: 2045078051
Pascual, Víctor
PROPIETARIO

CONSTRUCCION DE LA CARRERA DE BARRIO EL PASO
RUC: 2045078051
Pascual, Víctor
PROPIETARIO

CONSTRUCCION DE LA CARRERA DE BARRIO EL PASO
RUC: 2045078051
Pascual, Víctor
PROPIETARIO

CONSTRUCCION DE LA CARRERA DE BARRIO EL PASO
RUC: 2045078051
Pascual, Víctor
PROPIETARIO

PASOS DE LA ACTIVIDAD / TAREA A REALIZAR		POLICIA/ACTIVO		DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE		MÉDICA CONTROL	
1	Aproximación del Accidente	- FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD	- FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD	1	1	1	1
				2	2	2	2
				3	3	3	3
2	Expresión y evaluación de riesgos y consecuencias	- FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD	- FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD	4	4	4	4
				5	5	5	5
				6	6	6	6
3	Análisis de riesgos y consecuencias	- FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD	- FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD	7	7	7	7
				8	8	8	8
				9	9	9	9
4	Ejecución de actividades	- FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD	- FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD	10	10	10	10
				11	11	11	11
				12	12	12	12

VERIFICACIÓN EN CUERPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA (EVOLUCIÓN DE CUALQUIER SÍMPTOMA DURANTE EL TIEMPO DE TRABAJO)		MÉDICA CONTROL	
Nº	TIEMPO Y SÍMPTOMAS	TIEMPO	TIEMPO
1	Tiempo de ejecución de la tarea	1	1
2	Inicio de síntomas	2	2
3	Finalización de la tarea	3	3

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RUC: 2050278051
EMPRESA: RUC: 2050278051
PROYECTO: RUC: 2050278051
FECHA: 2019-07-19
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO:
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO:
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO:

PASOS DE LA ACTIVIDAD / TAREA + REALIDAD		PELIGRO/ACCIDENTO	RIESGO/IMPACTO APROXIMADO	SEVERIDAD	FECHA	TIPO DE INCIDENTE	REGLAS CONTROL
1. Limpieza de los alrededores de la zona de trabajo		- Resaca, mareos, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, etc.	- CAÍDA AL VENTILADOR Y MARCHA	4	21	2	- Camiseta con botones Cableo
2. Limpieza y mantenimiento del área de trabajo		- Caída de objetos, resaca, mareos, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, etc.	- CAÍDA AL VENTILADOR Y MARCHA	4	16	2	- Limpieza de la zona Cableo
3. Limpieza de los alrededores de la zona de trabajo		- Resaca, mareos, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, etc.	- CAÍDA AL VENTILADOR Y MARCHA	4	14	2	- Limpieza de la zona Cableo
4. Limpieza de los alrededores de la zona de trabajo		- Resaca, mareos, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, etc.	- CAÍDA AL VENTILADOR Y MARCHA	4	14	2	- Limpieza de la zona Cableo
5. Limpieza de los alrededores de la zona de trabajo		- Resaca, mareos, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, etc.	- CAÍDA AL VENTILADOR Y MARCHA	4	14	2	- Limpieza de la zona Cableo

SEVERIDAD

SEVERIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
4	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55

Medida de Evaluación de Riesgo

VERIFICACIÓN EN CAMPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA (REVISIÓN DE LA CUALquier MEDIDA DURANTE EL TIEMPO DE TRABAJO)

Nº	FECHA DE VERIFICACIÓN	CÓDIGO	MEDIDA CORRECTIVA/RECOMENDACIÓN	FECHA	HORA
1	21/05/2015	110			10:12
2	16/05/2015	110			
3	16/05/2015	110			

INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Ing. Víctor R. Viquez Azángul
 C.I.P. N° 573144

INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Ing. Víctor R. Viquez Azángul
 C.I.P. N° 573144

COIRH		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - A.S.T.					NIVEL DE RIESGO		NIVEL DE EMERGENCIA		MEDIDAS CONTROL	
PASES DE LA ACTIVIDAD / TAREA A REALIZAR		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE ACTO APROBADO		NIVEL DE RIESGO		NIVEL DE EMERGENCIA		MEDIDAS CONTROL		
1) INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO		10/05/2018		10/05/2018		C 2		B		- CAMARAS CON CULMARS DEFECTO DEL ÁREA DE TRABAJOS		
2) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO AL ÁREA DE TRABAJO		10/05/2018		10/05/2018		C 4		B		- CAMARAS POR TORNOS (MANTENIMIENTO) - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MANTENIDAS		
3) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO AL ÁREA DE TRABAJO		10/05/2018		10/05/2018		D 5		B		- MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MANTENIDAS		
4) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO AL ÁREA DE TRABAJO		10/05/2018		10/05/2018		D 5		B		- MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MANTENIDAS		
5) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO AL ÁREA DE TRABAJO		10/05/2018		10/05/2018		D 5		B		- MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MANTENIDAS		

VERIFICACIÓN EN CAMPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA IDENTIFICANDO EL RIESGO DURANTE EL EJERCICIO DE TRABAJO		NIVEL DE RIESGO		NIVEL DE EMERGENCIA		MEDIDAS CONTROL	
Nº	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SEVERIDAD	EMERGENCIA	FECHA DE VERIFICACIÓN	FECHA DE ACTO APROBADO
1	JULIO A. SORIANO VERA	DEF. EQUIPO	DEF. EQUIPO	11	B	10/05/2018	10/05/2018
2	JULIO A. SORIANO VERA	DEF. EQUIPO	DEF. EQUIPO	11	B	10/05/2018	10/05/2018
3	JULIO A. SORIANO VERA	DEF. EQUIPO	DEF. EQUIPO	11	B	10/05/2018	10/05/2018
4	JULIO A. SORIANO VERA	DEF. EQUIPO	DEF. EQUIPO	11	B	10/05/2018	10/05/2018
5	JULIO A. SORIANO VERA	DEF. EQUIPO	DEF. EQUIPO	11	B	10/05/2018	10/05/2018

INGENIERO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
GABRIELINO BUI PALLORENO
 INGENIERO CIVIL
 C.A. 10108

INGENIERO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
GABRIELINO BUI PALLORENO
 INGENIERO CIVIL
 C.A. 10108

INGENIERO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
GABRIELINO BUI PALLORENO
 INGENIERO CIVIL
 C.A. 10108

INGENIERO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
GABRIELINO BUI PALLORENO
 INGENIERO CIVIL
 C.A. 10108



REPORTE DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL DE OBRA


 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 RUC: 20450378051
 Abraham Guzmán Tejada
 PRESIDENTE DE OBRA


 INGENIERO CIVIL
 RUC: 20450378051
 Guillermo Díaz Paredes
 INGENIERO CIVIL


 GUILLERMO DIAZ PAREDES
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 85085

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO II JUAN GUERRA – SAN MARTÍN"

REPORTE DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL DE OBRA			
1) Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE LA EBDE PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y ZONA DE TRATAMIENTO TIPO I ALIAN GUERRA - SAN MARTIN		N° de Contrato: 148-2023-PPMAGN-PRODESA-PAGE 8	
Empresa CONTRATISTA	Nombre: Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C (ODRH)	Supervisor responsable: Ing. Guillermo Diaz Palomino	Fecha de inicio de obra: 05 de septiembre 2022
	Responsable SBOMA: Ing. Pasteur R. Viera Azopg		Mes y año del reporte: Diciembre (31 al 31) - 2023
	Residente de Obra: Ing. Julio Cesar Mendoza Del Aguila		Días de ejecución de Obra: 305 días calendario

2) Actividades constructivas realizadas en el mes:
 2.1. Siembra de grupo electrogéneo (unión flexible, tubo de escape);
 2.2. Sistema de descarga de aire caliente (instalación de campana, ductos).

3) Plan de Manejo Ambiental de obra: Actividades realizadas en el mes y adjuntar el Plan de Manejo Ambiental
 Contar con Plan de Manejo ambiental SI No

3.1. Legislación y Regulación Nacional, indicar si cuenta con:

Licencia de construcción	SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permiso de conexión	SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Llave de agua	SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros al permitir	SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autorización de Depósito de Material Excedente - DME	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Plan de Manejo Arqueológico - PMA	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

3.2. Manejo de Producción químicas (indicar las actividades de control en el mes)
 3.2.1. Implementación de Hojas MSDS.

3.3. Manejo de residuos sólidos (indicar las actividades de control en el mes)
 3.3.1. Transporte y disposición final de RR.SS.

3.4. Monitoreo Ambiental (indicar si se realizó monitoreo ambiental de aplicar):
 La periodicidad fue adecuada.

3.5. Plan de Monitoreo Arqueológico
 La periodicidad fue adecuada.

4. Salud, seguridad ocupacional y comunitaria

4.1. Cantidad de trabajadores en el mes (diferenciado por sexo y cargo que ocupa):

77	Sexo	N° de persona de obra	N° de persona staff
	Mujeres	0	0
Hombres	7	5	
Total	12	5	

4.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo (Actividades realizadas en el mes y adjuntar el Plan de seguridad y salud en el trabajo):

- 4.3.1. Sefalización temporal en obra.
- 4.3.2. Implementación de Equipos de Protección Personal - EPPs
- 4.3.3. Rotación de charlas réplicas diarias de seguridad y salud en el trabajo.
- 4.3.4. Generación de SCTR

4.4. Plan de Manejo COVID-19 (Actividades realizadas en el mes y adjuntar Plan COVID-19)
 Mediante Decreto Supremo N° 009-2023-SA, publicado el 24 de febrero de 2023, se prorrogó la Emergencia Sanitaria hasta el 25 de mayo de 2023. En este sentido, si no hubiera emitido norma alguna que sustente nuevamente dicho estado, la Emergencia Sanitaria, se legado a su fin. Además, de precisarse que, mediante Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, publicado el 27 de octubre de 2022, el Gobierno Peruano declaró el final Estado de Emergencia Nacional que se declaró en el año 2020 por las circunstancias que venían afectando la vida y la salud de las personas como consecuencia de la COVID-19 además, con fecha 05 de mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el fin de la Emergencia Sanitaria Internacional por la COVID-19.
 Por lo tanto, ya no corresponden su aplicación durante la ejecución de la obra.

4.5. Reporte de Accidentes e Incidentes

Cantidad Horas trabajadas el mes	5264	Otros sin accidentes	11
Índice de Frecuencia = $\frac{N^{\circ} \text{ de accidentes} \times 1.000.000}{\text{Horas trabajadas} - \text{Horas de suspensión al trabajo}}$	0.80	Índice de Gravidad = $\frac{N^{\circ} \text{ de días perdidos}}{\text{Horas trabajadas}}$	0.80
Accidente	Acciones correctivas o preventivas	Incidentes	Acciones correctivas o preventivas
No se reportó accidentes en el mes de diciembre de 2023	-----	No se reportó accidentes en el mes de diciembre de 2023	-----

Nota: Toda información es una Declaración Jurada del Contratista

Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 RUC: 20450778051

Abner Guzmán Tejada
 GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.
 RUC: 20450778051

ING. JULIO CESAR MENDOZA DEL AGUILA
 RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCCION INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C.

Pasteur R. Viera Azopg
 ING. DE SEGURO Y SALUD EN EL TRABAJO
 N° 47 20806

Guillermo Diaz Palomino
 GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67896

1) Controles de Seguridad y salud en el trabajo:



Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C.
 HUC. 2044502 / B081

Honor Guillermo Tejada
 GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.
 HUC. 2044502 / B081

 Ing. **Walter**
 INGENIERO CIVIL

Enrique
 INGENIERO CIVIL
 CIP 87086

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
 RIO HUALLAGA S.A.C.

Ing. R. Mario Azing
 ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP N° 39586
