



**RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 062-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J**

Cayhuayna, 25 de noviembre del 2024.

**VISTO:**

Los documentos que se acompañan en sesenta y tres (63) folios, en físico;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, Ley N° 30220 – Ley Universitaria; el Estado Reconoce la autonomía normativa, de gobierno, académico, administrativo y económico en los asuntos de su competencia;

Que, el T.U.O. de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sobre la base de aplicación de leyes en el tiempo, prescriben una serie de disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contratación pública, en lo concerniente a Bienes, Servicios u Obras, y a su vez regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, con fecha 25 de junio del 2024 se suscribe el **Contrato N° 024-2024-UNHEVAL**, entre la **UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZÁN** y el **CONSORCIO SUPERVISOR FICA II**, para el Servicio de Supervisión de la Ejecución de la Obra "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO**" - ETAPA II, con un plazo de servicio de 607 días calendarios 307 días para la supervisión de la obra y 30 días para la recepción y liquidación de obra) y cuyo monto contractual asciende a la suma de S/ 1'233,902.11 con IGV.

Que, con fecha 09 de agosto del 2024 se suscribe la **Adenda N° 01 al Contrato N° 024-2024-UNHEVAL**, entre la **UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO** y el **CONSORCIO SUPERVISIÓN FICA II**, para el Servicio de Supervisión de la Ejecución de la Obra "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO**" - ETAPA II,

Que, mediante **CONTRATO N°030-2024-UNHEVAL** de fecha 20 de agosto del 2024, la **UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN** y el **CONSORCIO ING & ARQ.** suscriben el **Contrato de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO"** - ETAPA II, con un plazo de ejecución de 607 días calendarios y cuyo monto contractual asciende a la suma de S/ 17,871,080.51;

Que, el literal f) del segundo párrafo del artículo 2° del T.U.O. de la Ley de N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 082-2019 -EF, establece lo siguiente: "*f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos*".

Que, en ese orden de ideas, el artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, precisa que: "*202.1. Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un plazo máximo de siete (7) días hace una actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica. 202.2. El Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecución de Obra previo, así como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual. 202.3. El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) días manifiesta su aprobación u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo máximo de siete (7) días luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos señalados, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes. 202.4. Ante la falta de presentación del Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo señalado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos*".

TRANSCRIPCIÓN  
En la fecha se ha expedido  
Resolución siguiente



TRANSCRIPCIÓN

En la fecha se ha expedido Resolución siguiente



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD  
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 062-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J  
Cayhuayna, 25 de noviembre del 2024.

Que, en mérito a la norma legal señalada en líneas anteriores, se advierte los siguientes actuados:

1. Que, mediante **CARTA N°056-2024-JSH/RC** con fecha de recepción por parte del Consorcio Supervisión FICA II el día 13 de noviembre del 2024, el Consorcio ING & ARQ. remite su Cronograma Actualizado de ejecución de obra por Aprobación de Adicional de Obra N°01; asimismo, adjunta el **Informe N°022-2024-CONSORCIO SUPERVISIÓN FICA II/WCC/RO (CIA)**, suscrito por el Residente de Obra quien emite el cronograma actualizado de Ejecución de Obra, Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra, Curva S Proyectado, por Adicional de Obra N°01. De la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO" - ETAPA II;**
2. Que, mediante **CARTA N°090-2024-CONSORCIO SUPERVISIÓN FICA II/AJAJ/RC** con fecha de recepción por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones el día 18 de noviembre del 2024, el Consorcio Supervisión FICA II remite la Conformidad de la Actualización del Cronograma de Ejecución de Obra N°02 POR Aprobación del Adicional de Obra N°01 de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO" - ETAPA II;**
3. Que, mediante **INFORME N°215-2024-UNHEVAL-UEI/SGAG** con fecha de recepción por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones el día 22 de noviembre del 2024, el Ingeniero Civil II de la Unidad Ejecutora de Inversiones remite la **conformidad de Cronograma de Ejecución de Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO" - ETAPA II,** asimismo señala lo siguiente:

(...)

**4. ANÁLISIS**

Mediante el Informe N°038-2024-CONSORCIO SUPERVISIÓN FICA II/WCC/RO, presentado con Carta N°090-2024-CONSORCIO SUPERVISIÓN FICA II/AJAJ/RC, el Supervisor de Obra presenta su conformidad la actualización del cronograma de ejecución de obra, cronograma valorizado de ejecución de obra y la Curva S, debido a la autorización de la ejecución del Adicional de Obra N°01, mediante la Resolución Directoral N°0815-2024-DIGA/UNHEVAL, los cuales serán utilizados para el control del avance de obra y del cumplimiento de obligaciones contractuales correspondientes.

Luego de haber revisado y evaluado los documentos alcanzados, las mismas que se encuentran de acuerdo al plazo contractual vigente, se señala lo siguiente:

Fecha de inicio de obra : 06 de setiembre del 2024  
 Plazo contractual de ejecución : 607 días calendarios  
 Fecha de culminación de Obra : 05 de mayo del 2026

Asimismo, se ha podido verificar que el cronograma PERT-CPM, elaborado por la Residencia, y aprobado por la Supervisión, cuenta con las partidas consideradas dentro de la ruta crítica, la misma que servirá para tomar en consideración en cualquier afectación de la ejecución de la obra que sea causal de ampliación de plazo.

Además, se señala que, debido a las limitaciones del programa Microsoft Project, no se señaló expresamente en el diagrama de barras los días reales de ejecución de algunas de las partidas, es decir se calculó la duración (quinta columna del Gantt) restando el último día de ejecución con el primer día de ejecución, ello no quiere decir que la partida va a ser ejecutada en todo ese periodo constantemente, por lo que el número de días colocado en la columna duración, en algunas partidas, no obedece al cálculo a realizar entre el metrado, el rendimiento y el análisis de cuadrillas de las partidas correspondientes. Así que, se tomará como referencia la duración de las partidas del Expediente Técnico original para la evaluación de posibles reducciones o ampliaciones de plazo.

A continuación, se presenta, en primer lugar, el cronograma valorizado de ejecución de obra contractual.

| N° | MES    | AVANCE PROGRAMADO |              |           |             |               |
|----|--------|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|
|    |        | PARCIAL S/        | ACUMULADO S/ | PARCIAL % | ACUMULADO % | ACUMULADO 80% |
| 1  | sep-24 | 462,666.36        | 462,666.36   | 2.59%     | 2.59%       | 2.07%         |
| 2  | oct-24 | 497,272.02        | 959,938.38   | 2.78%     | 5.37%       | 4.30%         |
| 3  | nov-24 | 699,069.16        | 1,659,007.54 | 3.91%     | 9.28%       | 7.43%         |
| 4  | dic-24 | 693,401.50        | 2,352,409.04 | 3.88%     | 13.16%      | 10.53%        |
| 5  | ene-25 | 828,248.09        | 3,180,657.13 | 4.63%     | 17.80%      | 14.24%        |
| 6  | feb-25 | 655,329.06        | 3,835,986.19 | 3.67%     | 21.46%      | 17.17%        |
| 7  | mar-25 | 501,570.42        | 4,337,556.61 | 2.81%     | 24.27%      | 19.42%        |
| 8  | abr-25 | 736,945.52        | 5,074,502.13 | 4.12%     | 28.40%      | 22.72%        |
| 9  | may-25 | 859,474.42        | 5,933,976.55 | 4.81%     | 33.20%      | 26.56%        |
| 10 | jun-25 | 737,910.59        | 6,671,887.14 | 4.13%     | 37.33%      | 29.87%        |
| 11 | jul-25 | 484,917.81        | 7,156,804.95 | 2.71%     | 40.05%      | 32.04%        |
| 12 | ago-25 | 644,268.39        | 7,801,073.34 | 3.61%     | 43.65%      | 34.92%        |
| 13 | sep-25 | 562,650.68        | 8,363,724.02 | 3.15%     | 46.80%      | 37.44%        |



TRANSCRIPCIÓN


En la fecha se ha expedido Resolución siguiente

|              |        |                      |               |       |         |        |
|--------------|--------|----------------------|---------------|-------|---------|--------|
| 14           | oct-25 | 734,044.95           | 9,097,768.97  | 4.11% | 50.91%  | 40.73% |
| 15           | nov-25 | 1,465,830.85         | 10,563,599.82 | 8.20% | 59.11%  | 47.29% |
| 16           | dic-25 | 1,714,315.16         | 12,277,914.98 | 9.59% | 68.70%  | 54.96% |
| 17           | ene-26 | 1,774,986.28         | 14,052,901.26 | 9.93% | 78.63%  | 62.91% |
| 18           | feb-26 | 1,577,934.08         | 15,630,835.34 | 8.83% | 87.46%  | 69.97% |
| 19           | mar-26 | 831,307.92           | 16,462,143.26 | 4.65% | 92.12%  | 73.69% |
| 20           | abr-26 | 890,343.28           | 17,352,486.54 | 4.98% | 97.10%  | 77.68% |
| 21           | may-26 | 518,593.97           | 17,871,080.51 | 2.90% | 100.00% | 80.00% |
| <b>TOTAL</b> |        | <b>17,871,080.51</b> |               |       |         |        |

\*Los montos expuestos anteriormente son a nivel de costo total sin IGV

A continuación, se expone el cronograma de ejecución consolidado, el cual comprende el avance del Expediente contractual y del Adicional de Obra N°01, y la Curva S correspondiente, los cuales servirán para el control de avance mensual físico y financiero de la obra de referencia (3), así como para la solicitud de ampliaciones de plazo y análisis de afectación de ruta crítica.

| N°           | MES    | AVANCE PROGRAMADO    |               |           |             |               |
|--------------|--------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
|              |        | PARCIAL S/           | ACUMULADO S/  | PARCIAL % | ACUMULADO % | ACUMULADO 80% |
| 1            | sep-24 | 462,666.36           | 462,666.36    | 2.58%     | 2.58%       | 2.06%         |
| 2            | oct-24 | 497,272.02           | 959,938.38    | 2.77%     | 5.35%       | 4.28%         |
| 3            | nov-24 | 757,287.79           | 1,717,226.17  | 4.22%     | 9.58%       | 7.66%         |
| 4            | dic-24 | 693,401.50           | 2,410,627.67  | 3.87%     | 13.45%      | 10.76%        |
| 5            | ene-25 | 828,248.09           | 3,238,875.76  | 4.62%     | 18.06%      | 14.45%        |
| 6            | feb-25 | 655,329.06           | 3,894,204.82  | 3.66%     | 21.72%      | 17.38%        |
| 7            | mar-25 | 501,570.42           | 4,395,775.24  | 2.80%     | 24.52%      | 19.61%        |
| 8            | abr-25 | 736,945.52           | 5,132,720.76  | 4.11%     | 28.63%      | 22.90%        |
| 9            | may-25 | 859,474.42           | 5,992,195.18  | 4.79%     | 33.42%      | 26.74%        |
| 10           | jun-25 | 737,910.59           | 6,730,105.77  | 4.12%     | 37.54%      | 30.03%        |
| 11           | jul-25 | 484,917.81           | 7,215,023.58  | 2.70%     | 40.24%      | 32.19%        |
| 12           | ago-25 | 644,268.39           | 7,859,291.97  | 3.59%     | 43.83%      | 35.07%        |
| 13           | sep-25 | 562,650.68           | 8,421,942.65  | 3.14%     | 46.97%      | 37.58%        |
| 14           | oct-25 | 734,044.95           | 9,155,987.60  | 4.09%     | 51.07%      | 40.85%        |
| 15           | nov-25 | 1,465,830.85         | 10,621,818.45 | 8.18%     | 59.24%      | 47.39%        |
| 16           | dic-25 | 1,714,315.16         | 12,336,133.61 | 9.56%     | 68.80%      | 55.04%        |
| 17           | ene-26 | 1,774,986.28         | 14,111,119.89 | 9.90%     | 78.70%      | 62.96%        |
| 18           | feb-26 | 1,577,934.08         | 15,689,053.97 | 8.80%     | 87.51%      | 70.00%        |
| 19           | mar-26 | 831,307.92           | 16,520,361.89 | 4.64%     | 92.14%      | 73.71%        |
| 20           | abr-26 | 890,343.28           | 17,410,705.17 | 4.97%     | 97.11%      | 77.69%        |
| 21           | may-26 | 518,593.97           | 17,929,299.14 | 2.89%     | 100.00%     | 80.00%        |
| <b>TOTAL</b> |        | <b>17,929,299.14</b> |               |           |             |               |

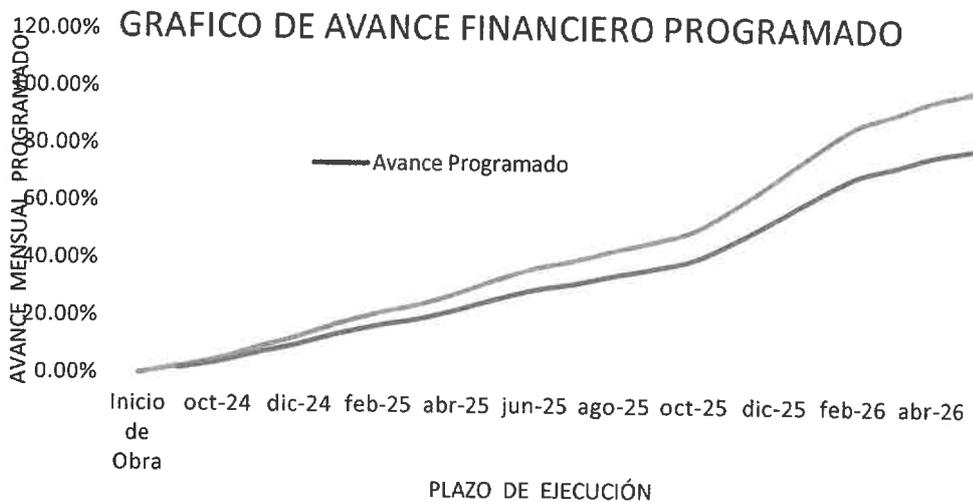

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

- ✓ Se concluye que el periodo de ejecución de la obra es desde el 06 de setiembre del 2024 hasta el 05 de mayo del 2026, teniendo un plazo de 607 días calendario, como se expone a continuación.





TRANSCRIPCIÓN  
 En la fecha se ha expedido  
 Resolución siguiente


|  |            |
|--|------------|
| ESTADO DE PLAZO                        | DURACIÓN   |
| INICIO DE PLAZO                        | 06/09/2024 |
| Plazo de Ejecución de Obra contractual | 607 días   |
| FECHA DE CULMINACIÓN VIGENTE           | 05/05/2026 |

✓ El calendario valorizado de obra se presenta en el siguiente cuadro:

| N°           | MES    | AVANCE PROGRAMADO    |               |           |             |               |
|--------------|--------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
|              |        | PARCIAL S/           | ACUMULADO S/  | PARCIAL % | ACUMULADO % | ACUMULADO 80% |
| 1            | sep-24 | 462,666.36           | 462,666.36    | 2.58%     | 2.58%       | 2.06%         |
| 2            | oct-24 | 497,272.02           | 959,938.38    | 2.77%     | 5.35%       | 4.28%         |
| 3            | nov-24 | 757,287.79           | 1,717,226.17  | 4.22%     | 9.58%       | 7.66%         |
| 4            | dic-24 | 693,401.50           | 2,410,627.67  | 3.87%     | 13.45%      | 10.76%        |
| 5            | ene-25 | 828,248.09           | 3,238,875.76  | 4.62%     | 18.06%      | 14.45%        |
| 6            | feb-25 | 655,329.06           | 3,894,204.82  | 3.66%     | 21.72%      | 17.38%        |
| 7            | mar-25 | 501,570.42           | 4,395,775.24  | 2.80%     | 24.52%      | 19.61%        |
| 8            | abr-25 | 736,945.52           | 5,132,720.76  | 4.11%     | 28.63%      | 22.90%        |
| 9            | may-25 | 859,474.42           | 5,992,195.18  | 4.79%     | 33.42%      | 26.74%        |
| 10           | jun-25 | 737,910.59           | 6,730,105.77  | 4.12%     | 37.54%      | 30.03%        |
| 11           | jul-25 | 484,917.81           | 7,215,023.58  | 2.70%     | 40.24%      | 32.19%        |
| 12           | ago-25 | 644,268.39           | 7,859,291.97  | 3.59%     | 43.83%      | 35.07%        |
| 13           | sep-25 | 562,650.68           | 8,421,942.65  | 3.14%     | 46.97%      | 37.58%        |
| 14           | oct-25 | 734,044.95           | 9,155,987.60  | 4.09%     | 51.07%      | 40.85%        |
| 15           | nov-25 | 1,465,830.85         | 10,621,818.45 | 8.18%     | 59.24%      | 47.39%        |
| 16           | dic-25 | 1,714,315.16         | 12,336,133.61 | 9.56%     | 68.80%      | 55.04%        |
| 17           | ene-26 | 1,774,986.28         | 14,111,119.89 | 9.90%     | 78.70%      | 62.96%        |
| 18           | feb-26 | 1,577,934.08         | 15,689,053.97 | 8.80%     | 87.51%      | 70.00%        |
| 19           | mar-26 | 831,307.92           | 16,520,361.89 | 4.64%     | 92.14%      | 73.71%        |
| 20           | abr-26 | 890,343.28           | 17,410,705.17 | 4.97%     | 97.11%      | 77.69%        |
| 21           | may-26 | 518,593.97           | 17,929,299.14 | 2.89%     | 100.00%     | 80.00%        |
| <b>TOTAL</b> |        | <b>17,929,299.14</b> |               |           |             |               |

\*Los montos expuestos anteriormente son a nivel de costo total sin IGV

✓ La Curva S correspondiente es la siguiente:

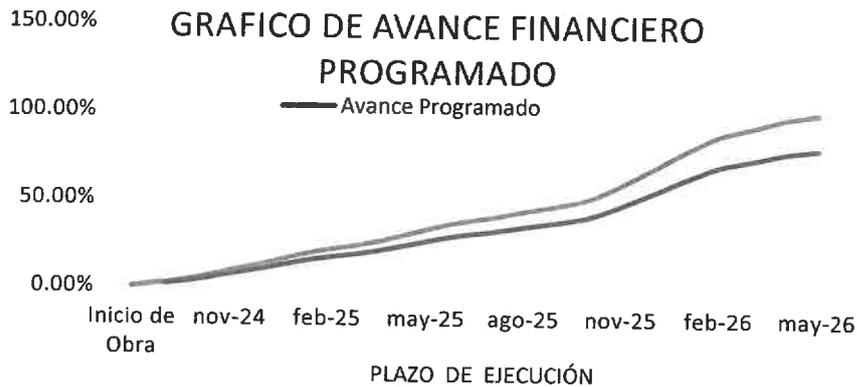

- ✓ Se da **CONFORMIDAD** a la actualización del cronograma de ejecución de obra, cronograma valorizado de ejecución de obra y Curva S presentados por el contratista CONSORCIO ING & ARQ y aprobados por la Supervisión de Obra CONSORCIO SUPERVISION FICA II.
- ✓ El cronograma actualizado aprobado en el presente informe es el único documento que puede ser utilizado como sustento para la solicitud de ampliaciones de plazo, así como para el análisis de afectación de ruta crítica.

**5.2. RECOMENDACIONES**

- ✓ Se recomienda aprobar el Calendario de Avance Programado Actualizado, el Cronograma Valorizado de Ejecución de obra y la Curva S mediante acto resolutorio.

(...)

Que, estando a las facultades y atribuciones resolutorias conferidas al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, mediante la Resolución Rectoral N° 586-2020-UNHEVAL de fecha 16 de julio de 2020, en concordancia con la Resolución Rectoral N° 0145-2022-UNHEVAL, de fecha 17 de febrero del 2021 y en concordancia con la Ley N° 30220 - Ley Universitaria y su reglamento;





**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - APROBAR, la ACTUALIZACIÓN CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA, CURVA S, concerniente a la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO" - ETAPA II, siendo la fecha de inicio de obra el 06 de setiembre de 2024 y su fecha de fin de plazo el 05 de mayo de 2026, en virtud a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

| N°           | MES    | AVANCE PROGRAMADO    |               |              |                |               |
|--------------|--------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|              |        | PARCIAL S/           | ACUMULADO S/  | PARCIAL %    | ACUMULADO %    | ACUMULADO 80% |
| 1            | sep-24 | 462,666.36           | 462,666.36    |              |                |               |
| 2            | oct-24 | 497,272.02           | 959,938.38    | 2.58%        | 2.58%          | 2.06%         |
| 3            | nov-24 | 757,287.79           | 1,717,226.17  | 2.77%        | 5.35%          | 4.28%         |
| 4            | dic-24 | 693,401.50           | 2,410,627.67  | 4.22%        | 9.58%          | 7.66%         |
| 5            | ene-25 | 828,248.09           | 3,238,875.76  | 3.87%        | 13.45%         | 10.76%        |
| 6            | feb-25 | 655,329.06           | 3,894,204.82  | 4.62%        | 18.06%         | 14.45%        |
| 7            | mar-25 | 501,570.42           | 4,395,775.24  | 3.66%        | 21.72%         | 17.38%        |
| 8            | abr-25 | 736,945.52           | 5,132,720.76  | 2.80%        | 24.52%         | 19.61%        |
| 9            | may-25 | 859,474.42           | 5,992,195.18  | 4.11%        | 28.63%         | 22.90%        |
| 10           | jun-25 | 737,910.59           | 6,730,105.77  | 4.79%        | 33.42%         | 26.74%        |
| 11           | jul-25 | 484,917.81           | 7,215,023.58  | 4.12%        | 37.54%         | 30.03%        |
| 12           | ago-25 | 644,268.39           | 7,859,291.97  | 2.70%        | 40.24%         | 32.19%        |
| 13           | sep-25 | 562,650.68           | 8,421,942.65  | 3.59%        | 43.83%         | 35.07%        |
| 14           | oct-25 | 734,044.95           | 9,155,987.60  | 3.14%        | 46.97%         | 37.58%        |
| 15           | nov-25 | 1,465,830.85         | 10,621,818.45 | 4.09%        | 51.07%         | 40.85%        |
| 16           | dic-25 | 1,714,315.16         | 12,336,133.61 | 8.18%        | 59.24%         | 47.39%        |
| 17           | ene-26 | 1,774,986.28         | 14,111,119.89 | 9.56%        | 68.80%         | 55.04%        |
| 18           | feb-26 | 1,577,934.08         | 15,689,053.97 | 9.90%        | 78.70%         | 62.96%        |
| 19           | mar-26 | 831,307.92           | 16,520,361.89 | 8.80%        | 87.51%         | 70.00%        |
| 20           | abr-26 | 890,343.28           | 17,410,705.17 | 4.64%        | 92.14%         | 73.71%        |
| 21           | may-26 | 518,593.97           | 17,929,299.14 | 4.97%        | 97.11%         | 77.69%        |
| <b>TOTAL</b> |        | <b>17,929,299.14</b> |               | <b>2.89%</b> | <b>100.00%</b> | <b>80.00%</b> |

\* Los montos expuestos anteriormente son a nivel de costo total sin IGV

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - PRECISAR, que de conformidad con los alcances de Contrato N° 024-2024-UNHEVAL, corresponde al CONSORCIO SUPERVISIÓN FICA II el control y exigir el cumplimiento de la programación y calendarios de obra vigentes, por tanto, el supervisor deberá cumplir sus obligaciones.

**ARTÍCULO TERCERO.** - NOTIFICAR, la presente Resolución al Contratista (CONSORCIO ING & ARQ) y al Supervisor (CONSORCIO SUPERVISIÓN FICA II), con las formalidades de Ley.

**ARTÍCULO CUARTO.** - DAR A CONOCER, la presente Resolución a los Órganos Competentes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE**



UNIVERSIDAD NACIONAL  
 "HERMILIO VALDIZAN"  
 ING. GUILLERMO J. ALBORNOZ RAMOS  
 JEFE UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

**TRANSCRIPCIÓN**

En la fecha se ha expedido  
 Resolución siguiente

Distribución:  
 RECTOR  
 TRANSPARENCIA  
 OAJ  
 OCI  
 DIGA  
 ARCHIVO
