



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

RESOLUCION DE GERENCIA N° 064 -2023-MDF-GM

FRIAS, 23 FEBRERO DEL 2023.

VISTO:

La CARTA N°016-CONSORCIO EL BRONCE-YMA-RC-2023 emitida por el CONSORCIO EL BRONCE, el INFORME N°001-2023-CONSORCIO JC & VCR/J.S de fecha 23/02/2023, la CARTA N°016-SUP-OBRA-2023-CONSORCIO JC&VCR/RC de fecha 23/02/2023 emitido por el CONSORCIO JC & VCR, y el INFORME N° 082-2023-W.J.P. Z/MDF-SGIDUR, de fecha 23 de febrero del 2023, del Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, mediante el cual emite su opinión favorable y solicita la Resolución de Aprobación de los Cronogramas de Obra Actualizados a la fecha de inicio de la Obra: "REHABILITACIÓN DE 24.36 KM DE CAMINO VECINAL (PI 780) EMP.PI-708 (FRIAS) - EL BRONCE - TUCAQUE - LIMÓN - HUASIPE - PAMPA RAMADA - PLATANAL ALTO - EMP.PI-780 (CHILILIQUE), DISTRITO DE FRÍAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ARCC 7149", y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en adelante "LOM", señala que las Municipalidades son los Órganos de Gobierno Local, y estas tienen autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; precisando que la autonomía de las Municipios radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 168-2022-MDF-GM, de fecha 26 de mayo del 2022, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "REHABILITACIÓN DE 24.36 KM DE CAMINO VECINAL (PI - 780) EMP.PI-708 (FRIAS) - EL BRONCE - TUCAQUE - LIMÓN - HUASIPE - PAMPA RAMADA - PLATANAL ALTO - EMP.PI-780 (CHILILIQUE), DISTRITO DE FRÍAS - PROVINCIA DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ARCC 7149"; con un valor referencial ascendente a S/. 16'777,433.67 (Dieciséis Millones Setecientos Setenta Y Siete Mil Cuatrocientos Treinta Y Tres Con 67/100 Soles), incluye Ejecución y Supervisión de obra, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria por Administración Indirecta - Contrata, con un plazo de ejecución de 150 días calendario.

Que, con fecha 26 de octubre del 2022 se celebró el CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2022-MDF-CS/ I CONVOCATORIA entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS Y EL CONSORCIO EL BRONCE, conformado por las empresas TRANSPORTES Y NEGOCIOS GENERALES REYNA DEL CISNE EIRL, NEGOCIOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES YELSINN EIRL Y LUIS FRANCISCO ARRIETA NIÑO, por el monto total de S/. 16,288,770.55 (Dieciséis Millones Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Setecientos Setenta Con 55/100 Soles), que incluye todos los impuestos de la Ley, con un plazo de ejecución de 150 días calendario.

Que, con fecha 21 de noviembre del 2022 se da Inicio a la ejecución de la OBRA: "REHABILITACIÓN DE 24.36 KM DE CAMINO VECINAL (PI - 780) EMP.PI-708 (FRIAS) - EL BRONCE - TUCAQUE - LIMÓN - HUASIPE - PAMPA RAMADA - PLATANAL ALTO - EMP.PI-780 (CHILILIQUE), DISTRITO DE FRÍAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ARCC 7149".

Que, mediante CARTA N° 016-CONSORCIO EL BRONCE-YMA-RC-2023, emitida por el CONSORCIO EL BRONCE, a través de su representante legal Sr. Yelsin Marchena Aguilar, alcanza los cronogramas, actualizados a la fecha de reinicio de la obra del Proyecto: "REHABILITACIÓN DE 24.36 KM DE CAMINO VECINAL (PI - 780) EMP.PI-708 (FRIAS) - EL BRONCE - TUCAQUE - LIMÓN - HUASIPE - PAMPA RAMADA - PLATANAL ALTO - EMP.PI-780 (CHILILIQUE), DISTRITO DE FRÍAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ARCC 7149".



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Que mediante, **INFORME N°001-2023-CONSORCIO JC & VCR/J. S**, el ING. Dante Pariahuache Calle, supervisor de la obra revisa y aprueba los Calendarios de la Programación de Obra Actualizados a la Fecha de Inicio de la Obra por motivo de suspensión de plazo contractual de ejecución de obra N°01.

Que, mediante **CARTA N° 013-SUP-OBRA-2022-CONSORCIO JC&VCR/RC** de fecha 23 de febrero del 2023, el **CONSORCIO JC&VCR**, responsable de la supervisión de la ejecución de la **OBRA: "REHABILITACIÓN DE 24.36 KM DE CAMINO VECINAL (PI - 780) EMP.PI-708 (FRIAS) - EL BRONCE - TUCAQUE - LIMÓN - HUASIPE - PAMPA RAMADA - PLATANAL ALTO - EMP.PI-780 (CHILILIQUE), DISTRITO DE FRÍAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ARCC 7149"**, remite los Calendarios de la Programación de Obra Actualizados a la Fecha de Inicio de la Obra por motivo de suspensión de plazo contractual de ejecución de obra N°01.

Que mediante **INFORME N° 082-2023-W.J.P.Z/MDF-SGIDUR** de fecha 23 de febrero del 2023, el Ing. Walter Javier Patiño Zurita, Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, emite su opinión favorable y solicita la aprobación mediante acto resolutorio del nuevo **CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES, DIAGRAMA DE GANTT Y EL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA**, Actualizados a la Fecha de Inicio de la Obra por motivo de suspensión de plazo contractual de ejecución de obra N°01, teniendo como nueva fecha de término el 13 de junio del 2023.

Que el Calendario de Avance de Obra valorizado, es el documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la obra; por periodos determinados en las bases o en el contrato, definición contemplada en el anexo único de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Decreto Supremo N° 350-2015-EF;

Que en el inc. 20 del Artículo 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que; "El Alcalde tiene la atribución de delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Municipal".


Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 009-2023-MDF-A, de fecha 03 de Enero del 2023, Delega atribuciones administrativas que correspondan al Alcalde, en el Gerente Municipal donde establece en su Artículo Primero "Aprobar y Firmar Resoluciones de la Gerencia Municipal que resuelvan asuntos administrativos (...)"; por lo que;

SE RESUELVE:

- ✓ **ARTICULO PRIMERO: APROBAR**, el nuevo **CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES, DIAGRAMA DE GANTT Y EL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA** del Proyecto: **"REHABILITACIÓN DE 24.36 KM DE CAMINO VECINAL (PI - 780) EMP.PI-708 (FRIAS) - EL BRONCE - TUCAQUE - LIMÓN - HUASIPE - PAMPA RAMADA - PLATANAL ALTO - EMP.PI-780 (CHILILIQUE), DISTRITO DE FRÍAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ARCC 7149"**, Actualizados a la Fecha de Inicio de la Obra por motivo de suspensión de plazo contractual de ejecución de obra N°01, teniendo como nueva fecha de término el 13 de junio del 2023.
- ✓ **ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE**, el presente acto resolutorio al interesado y a los órganos competentes de la Municipalidad Distrital de Frias, para su cumplimiento conforme a la Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

C.C.
Arch/CrCr




C.C. Manuel Jorge Romero Valencia
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

SGIDUR

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



INFORME N° 082 - 2023-W.J.P. Z/MDF-SGIDUR.

A : C.P.C MANUEL JESUS JIMENEZ VALENCIA.
GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRÍAS.

DE : ING. WALTER JAVIER PATIÑO ZURITA.
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL.

ASUNTO : OPINION FAVORABLE Y SOLICITUD DE RESOLUCION DE APROBACION DE CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS EN FUNCION A LA SUSPENSIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01.

REFERENCIA : a). OBRA: REHABILITACIÓN DE 24.36 KM DE CAMINO VECINAL (PI - 780) EMP.PI-708 (FRIAS) - EL BRONCE - TUCAQUE - LIMÓN - HUASIPE - PAMPA RAMADA - PLATANAL ALTO - EMP.PI-780 (CHILILIQUE), DISTRITO DE FRÍAS - PROVINCIA DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ARCC 7149".
b). CARTA N°016-CONSORCIO EL BRONCE-YMA-RC-2023.
c). INFORME N°001-2023-CONSORCIO JC & VCR /JS.
d). CARTA N°013-SUP-OBRA02-2022-CONSORCIO JC&VCR/RC.

FECHA : Jueves, 23 de febrero del 2023.

Por el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo muy cordialmente y a la vez informarle lo siguiente:

Que mediante **CARTA N°016-CONSORCIO EL BRONCE-YMA-RC-2023**, el CONSORCIO EL BRONCE, representado por el Sr. Yelsin Marchena Aguilar, alcanza el los cronogramas actualizados a la fecha de reinicio de obra del Proyecto: **REHABILITACIÓN DE 24.36 KM DE CAMINO VECINAL (PI - 780) EMP.PI-708 (FRIAS) - EL BRONCE - TUCAQUE - LIMÓN - HUASIPE - PAMPA RAMADA - PLATANAL ALTO - EMP.PI-780 (CHILILIQUE), DISTRITO DE FRÍAS - PROVINCIA DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ARCC 7149"**, al consorcio supervisor y mediante, **INFORME N°001-2023-CONSORCIO JC & VCR/J. S**, el ING. Dante Pariahuache Calle, supervisor de la obra revisa y aprueba los Calendarios de la Programación de Obra Actualizados a la Fecha de Inicio de la Obra por motivo de suspensión de plazo contractual de ejecución de obra N°01.

Mediante **CARTA N° 013-SUP-OBRA-2022-CONSORCIO JC&VCR/RC**, el CONSORCIO JC&VCR, responsable de la supervisión de la ejecución de la OBRA: **"REHABILITACIÓN DE 24.36 KM DE CAMINO VECINAL (PI - 780) EMP.PI-708 (FRIAS) - EL BRONCE - TUCAQUE - LIMÓN - HUASIPE - PAMPA RAMADA - PLATANAL ALTO - EMP.PI-780 (CHILILIQUE), DISTRITO DE FRÍAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ARCC 7149"**, remite los Calendarios de la Programación de Obra Actualizados a la Fecha de Inicio de la Obra por motivo de suspensión de plazo contractual de ejecución de obra N°01.

Por lo anteriormente expuesto esta Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural emite su opinión favorable y solicita la aprobación mediante acto resolutivo del nuevo **CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES, DIAGRAMA DE GANTT Y EL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA**, actualizados en función a la Suspensión de Plazo Contractual de Ejecución de Obra N°01, teniendo como nueva fecha de término el 13 de junio del 2023.

Sin otro asunto en particular que comunicarle, quedo de Ud.

Atentamente.

C.C.ARCHIVO.
W.J.PZ.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS
Ing. Walter Javier Patiño Zurita
SGIDUR

Piura, 23 de febrero de 2023

CARTA Nº 013 SUP-OBRA02-2022-CONSORCIO JC&VCR/RC

Señores:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRÍAS

ATENCIÓN : SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ASUNTO : ALCANZO REVISION Y APROBACION DE CALENDARIOS DE LA PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADOS A LA FECHA DE INICIO DE OBRA POR MOTIVO DE SUSPENSION DE PLAZO CONTRACTUAL DE EJECUCION DE OBRA N °01

REFERENCIA :


- a) OBRA: REHABILITACIÓN DE 24.36 KM DE CAMINO VECINAL (PI-780) EMP. PI-708 (FRÍAS) - EL BRONCE - TUCAQUE - LIMÓN - HUASIPE - PAMPA RAMADA - PLATANAL ALTO - EMP. PI-780 (CHILILIQUE), DISTRITO DE FRÍAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA
- b) CONTRATO Nº 012-2022-MDF
- c) INFORME Nº 001-2023-CONSORCIO JC&VCR/J.S.

Por medio de la presente les hago llegar mis cordiales saludos en calidad de Supervisor del Proyecto descrito en el documento de la referencia a); para indicar que el Jefe de la Supervisión Ing. Dante Pariahuache Calle, emite pronunciamiento en su **INFORME Nº 001-2023-CONSORCIO JC&VCR/J. S** la misma que se adjunta.

En tal sentido, esta Supervisión teniendo en cuenta la documentación presentada por el Contratista Calendario de Avance de Obra Reprogramado por motivo de Suspensión de Plazo Contractual de Ejecución de Obra Nº 01, comunica la opinión del Ingeniero Jefe de Supervisión de la Obra, pronunciándose CONFORME al respecto; correspondiendo a la Municipalidad Distrital de Frías proceda con el trámite respectivo.

Es todo cuanto informo para su trámite respectivo.

Atentamente,



CONSORCIO JC&VCR
Jorge A. Neira Timoteo
Representante Común



JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

"REHABILITACION DE 24.36 KM DE CAMINO VECINAL (PI-780) EMP. PI-708 (FRIAS) - EL BRONCE - TUCAQUE - LIMON - HUASIPÉ - PAMPA RAMADA - PLATANAL ALTO - EMP. PI-780 (CHILILIQUE), DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA". CON CODIGO ARCC 7149. CUI N°2453523.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Piura, 23 de febrero del 2023

Señor(es):

CONSORCIO JC & VCR

AV. GULLMAN MZA 3 LOTE 6B SAN PEDRO, DISTRITO DE PIURA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA.

Presente. -

INFORME N° 001-2023-CONSORCIO JC & VCR/J.S.

A : SR. JORGE ANTONIO NEIRA TIMOTEO
REPRESENTANTE COMUN – CONSORCIO JC & VCR

DE : ING. DANTE PARIAHUACHE CALLE
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

ASUNTO : ALCANZO REVISION Y APROBACION DE
CALENDARIOS DE LA PROGRAMACION DE OBRA
ACTUALIZADOS A LA FECHA DE INICIO DE OBRA POR
MOTIVO DE SUSPENSION DE PLAZO CONTRACTUAL
DE EJECUCION DE OBRA N °01

REFERENCIA : A) CARTA N°016-CONSORCIO EL BRONCE-YMA-RC-
2023
B) CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001 – 2022 -
MDF - CS/ I CONVOCATORIA.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar la revisión y aprobación de los calendarios actualizados de obra como son:

- ✓ Calendario de Avance de Obra reprogramado por motivo de SUSPENSIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA N °01.

Actualizados al inicio contractual de la Obra: "REHABILITACION DE 24.36 KM DE CAMINO VECINAL (PI-780) EMP. PI-708 (FRIAS) - EL BRONCE - TUCAQUE - LIMON - HUASIPÉ - PAMPA RAMADA - PLATANAL ALTO - EMP. PI-780 (CHILILIQUE), DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA". CON CODIGO ARCC 7149. CUI N°2453523.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente y sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


Dante Pariahuache Calle
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 146422



RUC: 20610153799

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CARTA N°016-CONSORCIO EL BRONCE-YMA-RC-2023

SEÑORES : CONSORCIO JC&VCR
ATENCIÓN : ING. DANTE PARIAHUACHE CALLE
ASUNTO : CRONGRAMAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE REINICIO DE OBRA.

REFERENCIA:

- Procedimiento De Contratación Publica Especial N° 001-2022-Mdf-Cs/Primera Convocatoria
- Obra "Rehabilitación De 24,36 Km De Camino Vecinal (Pi-780) Emp. Pi.708 (Frías)-El Bronce-Tucaque-Limón-Huasipe- Pampa Ramada – Platanal Alto – Emp. Pi- 780 -(Chililique), Distrito De Frías, Provincia De Ayabaca, Departamento De Piura. Código Único Arcc 7149. Cui N° 2453523"

FECHA: Frías, 18 de febrero del 2023.

Por medio del presente, hago llegar los cronogramas actualizados a la fecha del reinicio de obra, del proyecto **"REHABILITACIÓN DE 24,36 KM DE CAMINO VECINAL (PI-780) EMP. PI.708 (FRÍAS)-EL BRONCE-TUCAQUE-LIMÓN-HUASIPE- PAMPA RAMADA – PLATANAL ALTO – EMP. PI- 780 -(CHILILIQUE), DISTRITO DE FRÍAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, para su conocimiento y aprobación correspondiente.

Sin otro en particular y agradeciendo por su debida atención, me suscribo ante usted.

Atentamente,

CONSORCIO EL BRONCE

Yelsin Marchena Aguilar
REPRESENTANTE COMUN

Recibido:
20/02/23

Dante Parihuache Calle
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 146422

CRONOGRAMA DE ADQUIS

PROYECTO

"REHABILITACIÓN DE 24.36 KM DE CAMINO VECINAL (PI - 780) EMP.PI-708 (FRIAS) - EL BRONCE - TUCAQUE - LIMÓN - HUASIPE - PAMPA RAMA

UBICACION

FRIAS- A

FECHA FEBRERO-2023

ITEMS	DESCRIPCION	UND.	PRECIO S/.	PRESUPUESTO		MES 01	
				CANT.	PRESUP. (S/.)	21/11/22 - 30/11/22	
						CANT.	PARCIAL
01.00.00	OPERARIO	hh	24.28	8,837.45	214,573.29	181.26	4,401.00
01.00.01	OFICIAL	hh	19.16	10,143.94	194,357.90	101.28	1,940.53
01.00.02	PEON	hh	17.32	38,162.71	660,978.20	676.53	11,717.56
01.00.03	TOPOGRAFO	hh	26.42	213.87	5,650.48	64.96	1,716.27
01.00.04	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	7,000.00	1.00	7,000.00	0.06	420.00
01.00.05	VIAJE TERRESTRE DE IDA (CAMA BAJA)	VJE	1,616.07	10.00	16,160.70	6.00	9,696.42
01.00.06	VIAJE TERRESTRE DE VUELTA (CAMA BAJA)	VJE	1,616.07	10.00	16,160.70	6.00	9,696.42
01.00.07	JUNTA WATER STOP 6"	ML	11.50	1,396.50	16,059.75		
01.00.08	MICROESFERAS DE VIDRIO	kg	3.42	17,050.60	58,313.05		
01.00.09	DINAMITA	kg	12.36	3,063.02	37,858.94	122.51	1,514.23
01.00.10	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	5.72	159.38	911.68	1.70	9.75
01.00.11	CLAVOS PARA MADERA S/C 1"	kg	5.72	0.95	5.41	0.95	5.41
01.00.12	CLAVOS CON CABEZA 2 1/2", 3", 4"	kg	5.72	406.06	2,322.67	22.50	128.71
01.00.13	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	7.10	562.52	3,993.86	90.00	638.97
01.00.14	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg	7.10	507.95	3,606.43		
01.00.15	ALCANTARILLA TMC D=36"	ML	225.10	140.00	31,514.00		
01.00.16	ALCANTARILLA TMC D=24"	ML	154.02	240.80	37,088.02		
01.00.17	PERNOS 5/8" X 6"	pza	3.56	30.00	106.80	30.00	106.80
01.00.18	PERNOS GALVANIZADOS 5/16"X3"	und	3.90	364.00	1,419.60		
01.00.19	PERNOS 5/8"X14"	und	6.50	104.00	676.00		
01.00.20	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60	kg	5.40	5,805.59	31,350.17	7.66	41.35
01.00.21	ARENA GRADUADA	m3	107.94	1,461.60	157,765.10		
01.00.22	ARENA FINA	m3	112.18	524.37	58,824.28		
01.00.23	ARENA GRUESA	m3	107.94	1,935.26	208,892.26		
01.00.24	PIEDRA GRANDE DE 8"	m3	111.71	924.77	103,305.77		
01.00.25	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3	132.51	2,173.78	288,047.77		
01.00.26	AFIRMADO PARA BASE	m3	135.33	36,767.90	4,975,799.31		
01.00.27	LAMPARA INTERMITENTE (SEÑALIZACION)	und	122.90	24.00	2,949.60		
01.00.28	LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD	igo	13.18	813.24	10,718.50		
01.00.29	FULMINANTE N°6	und	0.75	19,143.88	14,357.91	765.76	574.32
01.00.30	GIGANTOGRAFIA DE 4.80MX3.60M (SEGUN DISEÑO)	und	325.00	2.00	650.00	2.00	650.00
01.00.31	IMPRIMANTE	gln	17.80	39.91	710.40		
01.00.32	IMPRIMANTE APLICACION ELASTOMERICA POLIURETANO	gln	165.00	21.28	3,511.20		
01.00.33	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL	25.43	32,783.03	833,672.57	92.08	2,341.71
01.00.34	POSTE DE CONCRETO	und	65.00	156.00	10,140.00		
01.00.35	YESO BOLSA DE 18 Kg	BOL	13.38	78.52	1,050.54	18.27	244.40
01.00.36	CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA	ML	0.41	220.00	90.20		
01.00.37	CINTA MASKINGTAPE	pza	13.00	133.00	1,729.00		
01.00.38	THINNER	gln	19.41	3.38	65.61		
01.00.39	SOLDADURA	kg	12.44	25.22	313.74		
01.00.40	ADITIVO ADHESIVO EPOXICO	kg	46.21	0.09	4.08		
01.00.41	APOYO DE NEOPRENO	pza	50.50	5.52	278.76		
01.00.42	PEGAMENTO PARA PVC	gln	265.00	0.45	118.72		
01.00.43	TRANQUERA DE MADERA DE 0.75X1.20M	und	110.00	20.00	2,200.00		
01.00.44	TECKNOPOR	m2	10.42	99.09	1,032.47		
01.00.45	CONO DE SEÑALIZACION NARANJA	und	22.46	24.00	539.04		
01.00.46	PASE PEATONAL 0.80x1.50 m	und	210.00	85.00	17,850.00		
01.00.47	OVER 2" - 3"	m3	111.71	19.91	2,223.92		
01.00.48	OVER 6"-8"	m3	111.71	810.00	90,485.10		
01.00.49	AGUA	m3	2.00	623.17	1,246.35		
01.00.50	EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA	gln	11.86	64,554.00	765,610.44		
01.00.51	MADERA TORNILLO	p2	6.50	14,023.39	91,152.03	222.50	1,446.24
01.00.52	ESTACA DE MADERA	p2	6.50	131.18	852.64		
01.00.53	TRIPLAY DE 1.20X2.40MX4MM	und	35.51	52.50	1,864.28	52.50	1,864.28
01.00.54	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	und	1,000.00	5.00	5,000.00	0.33	330.00
01.00.55	PLATINA DE ACERO DE 3/16"X3"	ML	7.66	7.80	59.75		
01.00.56	PLATINA DE ACERO DE 3/16"X2"	ML	6.43	2.60	16.72		
01.00.57	GUIA O MECHA	ML	0.75	19,143.88	14,357.91	765.76	574.32
01.00.58	BARRENO DE 7/8" X 5 PIES	und	314.27	206.75	64,976.55	8.26	2,597.10
01.00.59	ARANDELA DE 5/8"	und	0.68	30.00	20.40	30.00	20.40
01.00.60	ANGULO DE FIERRO 1" X 1" X 3/16"	ML	5.53	380.80	2,105.82		
01.00.61	SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO 1/2"x1/2"	gln	185.00	41.24	7,628.81		
01.00.62	SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO 1"x1/2"	gln	185.00	76.99	14,242.41		
01.00.63	PINTURA PARA TRAFICO	gln	51.61	679.41	35,064.35		
01.00.64	PINTURA ESMALTE	gln	42.37	5.92	250.89	2.43	103.02
01.00.65	PINTURA REFLECTIVA	gln	42.29	2.60	109.95		
01.00.66	DILUYENTE PARA ESMALTE EPOXICO	gln	29.58	2.60	76.91		
01.00.67	TINTA SERIGRAFICA NEGRA	gln	1,086.25	3.08	3,345.65		
01.00.68	TINTA SERIGRAFICA ROJA	gln	1,086.25	0.04	43.45		
01.00.69	PINTURA ANTICORROSIVA	gln	40.68	1.56	63.46		
01.00.70	DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO	gln	34.90	194.86	6,800.75		
01.00.71	CALAMINA GALVANIZADA DE 3.60X0.80MX20MM	pln	21.70	105.00	2,278.50	105.00	2,278.50
01.00.72	PLANCHA DE ACERO E=3/8"	m2	160.26	0.78	125.00		
01.00.73	PLANCHA DE ACERO E=3/4"	m2	396.70	0.65	257.86		
01.00.74	PLANCHA DE ACERO E=3/16"	m2	77.80	0.13	10.11		
01.00.75	TUBO DE FIERRO DE 3"X6.4M	pza	114.18	19.50	2,226.51		

ION DE MATERIALES

PLATANAL ALTO - EMP.PI-780 (CHILILIQUE), DISTRITO DE FRÍAS - PROVINCIA DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ARCC 7149"

ACA- PIURA

MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 07		MES 08	
01/12/22 -31/12/22		01/01/23 -31/01/23		01/02/23 -28/02/23		01/03/23 -31/03/23		01/04/23 -30/04/23		01/04/23 -31/05/23		01/04/23 -13/06/23	
ANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL
9.94	18,936.94			539.62	13,101.97	2287.38	55,537.59	5049.25	122,595.79				
15.38	17,538.68			739.53	14,169.39	2943.18	56,391.33	4811.07	92,180.10	446.33	8,551.68	187.17	3,586.18
72.27	58,407.72			2613.41	45,264.26	11078.06	191,872.00	17214.67	298,158.08	2260.02	39,143.55	947.75	16,415.03
4.96	1,716.24			30.26	799.47	53.69	1,418.49						
1.13	910.00			0.10	700.00	0.21	1,470.00	0.20	1,400.00	0.21	1,470.00	0.09	630.00
0.00	6,464.28												
0.00	6,464.28												
								1396.50	16,059.75				
5.21	15,143.60			918.91	11,357.73	796.39	9,843.38	17050.60	58,313.05				
								157.68	901.93				
						106.27	607.86	277.29	1,586.10				
						246.74	1,751.85	225.78	1,603.04				
						141.69	1,005.98	366.26	2,600.45				
						10.00	2,251.00	130.00	29,263.00				
						16.05	2,472.02	224.75	34,616.00				
								364.00	1,419.60				
8	41.47							104.00	676.00				
						4400.15	23,760.81	1390.10	7,506.54				
						142.60	15,392.24	534.73	57,718.76	552.56	59,643.33	231.71	25,010.78
						178.64	20,039.84	345.73	38,784.44				
						526.90	56,873.59	1408.36	152,018.67				
						641.18	71,626.22	283.59	31,679.55				
						539.40	71,475.59	1634.38	216,571.88				
5	227.37			2.77	340.43	5.72	702.99	5.54	1,819,279.84	13891.40	1,879,923.16	5825.43	788,355.44
55	5,743.16			5743.16	4,307.37	4977.41	3,733.06	813.24	10,718.50	5.72	702.99	2.40	294.96
								39.91	710.40				
								21.28	3,511.20				
						9287.97	236,193.08	23402.98	595,137.78				
	244.45			15.13	202.44	26.85	359.25	156.00	10,140.00				
	6.94			25.38	10.41	52.46	21.51	50.77	20.82	52.47	21.51	9.02	
								133.00	1,729.00				
								3.38	65.61				
								25.22	313.74				
								0.09	4.08				
								5.52	278.76				
169.40				2.31	254.10	4.76	523.60	4.62	508.20	4.77	524.70	2.00	220.00
41.55				2.77	62.21	5.72	128.47	99.09	1,032.47	5.72	128.47	2.40	53.90
								5.54	124.43				
								85.00	17,850.00				
						19.91	2,223.92						
						810.00	90,485.10						
						204.48	408.97	418.69	837.38				
						6297.95	74,693.69	23617.32	280,101.42	24404.56	289,438.08	10234.17	121,377.26
				47.28	307.32	83.90	545.32	10967.12	71,286.28				
670.00				0.50	500.00	1.02	1,020.00	1.00	1,000.00	1.04	1,000.00		440.00
								7.80	59.75				
5,743.16				5743.16	4,307.37	4977.41	3,733.06	2.60	16.72				
25,990.13				62.03	19,494.17	53.76	16,895.16						
								380.80	2,105.82				
								41.24	7,628.81				
								76.99	14,242.41				
103.38				0.38	16.10	0.67	28.39	679.41	35,064.35				
								2.60	109.95				
								2.60	76.91				
								3.08	3,345.65				
								0.04	43.45				
								1.56	63.46				
								194.86	6,800.75				
								0.78	125.00				
								0.65	257.86				
								0.13	10.11				
								19.50	2,226.51				

CONSORCIO EL BRONCE
Ing. César Homero Alvarado Torres
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 89774

CONSORCIO EL BRONCE
Yelsin Marchena Aguilar
REPRESENTANTE COMUN


CONSORCIO EL BRONCE
Yelsin Marchena Aguilar
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 89774

Dante Pariahache Calle
INGENIERO CIVIL
REG. CIR. N° 146422

ITEMS	DESCRIPCION	UND.	PRECIO S/.	PRESUPUESTO		MES 01	
				CANT.	PRESUP. (S/.)	21/11/22 - 30/11/22	
						CANT.	PARCIAL
01.00.76	BANDERINES	und	10.90	20.00	218.00		
01.00.77	CASCO CON CINTAS REFLECTIVAS	und	13.47	150.00	2,020.50	150.00	2,020.50
01.00.78	GUANTES DE CUERO	PAR	6.89	150.00	1,033.50	150.00	1,033.50
01.00.79	TUBO PVC SAP 3"x5M.	ML	16.56	6.72	111.28		
01.00.80	TUBO PVC SAP 4"x5M.	ML	23.34	6.72	156.84		
01.00.81	TUBERIA PVC 2"	ML	5.89	12.00	70.68		
01.00.82	FIBRA DE VIDRIO DE 4MM ACABADO	m2	196.29	101.96	20,013.73		
01.00.83	BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO	PAR	50.76	150.00	7,614.00	150.00	7,614.00
01.00.84	LENTE DE PROTECCION	und	5.85	150.00	877.50	150.00	877.50
01.00.85	OVEROL REFLECTIVO	und	50.76	150.00	7,614.00	150.00	7,614.00
01.00.86	HORMIGON	m3	110.94	535.96	59,459.61	19.46	2,159.10
01.00.87	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO			35,300.63		10,957.87
01.00.88	SEGUROS	GLB	3,424.31	1.00	3,424.31	1.00	3,424.31
01.00.89	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 295 AMP	hm	15.20	173.33	2,634.66		
01.00.90	MARTILLO NEUMATICO	hm	8.75	1,709.26	14,956.00	83.87	733.83
01.00.91	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	15.00	219.96	3,299.45		
01.00.92	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101 - 135HP 10-12 TON	hm	188.46	1,064.80	200,671.77	20.00	3,769.20
01.00.93	RODILLO NEUMATICO 5.5-20 TN	hm	153.92	487.20	74,989.82		
01.00.94	COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM 87 HP	hm	96.40	1,072.04	103,345.13	29.16	2,811.50
01.00.95	CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1800 GLN	hm	182.42	657.72	119,981.28		
01.00.96	BARREDORA MECANICA 10-20 HP	hm	59.89	170.52	10,212.44		
01.00.97	CAMION VOLQUETE 15 M3	hm	288.76	3,095.87	893,963.57	56.14	16,211.13
01.00.98	TRACTOR DE ORUGAS 190-240 HP	hm	307.76	1,337.57	411,651.31	49.17	15,133.33
01.00.99	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA)1500 GL	hm	142.76	976.48	139,402.11		
01.00.100	CAMION CISTERNA DE EMULSION DE 7500 GLNS	hm	200.26	170.52	34,148.34		
01.00.101	MOTONIVELADORA de 145 -150 HP	hm	249.14	984.38	245,247.93		
01.00.102	CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 160-192 HP, 3.8Y3	hm	250.06	1,135.84	284,028.73	15.77	3,944.02
01.00.103	EXCAVADORA S/ORUGAS 170-250 HP 1.1- 2.75 YD3	hm	377.19	666.59	251,431.20	18.54	6,993.22
01.00.104	ESTACION TOTAL	hm	15.00	213.87	3,208.07	64.96	974.40
01.00.105	PRISMAS	hm	4.20	213.87	898.26	64.96	272.83
01.00.106	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	4.35	1,650.14	7,178.12		
01.00.107	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	2.00	173.17	346.33		
01.00.108	VIBRADOR DE 4 HP CAB. =2.40"	hm	6.67	1,322.39	8,820.31		
01.00.109	CARRO PARA PINTADO	dia.	108.00	38.97	4,209.06		
01.00.110	EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (VOLQ/CIST/ETC.)IDA	und	1,921.00	1.00	1,921.00	1.00	1,921.00
01.00.111	EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (VOLQ/CIST/ETC.) VUELTA	und	1,921.00	1.00	1,921.00	1.00	1,921.00
01.00.112	RECURSOS PARA LA RESPUESTA ANTES LA EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	5,000.00	1.00	5,000.00	0.06	300.00
01.00.113	FLETE	GLB	81,449.30	1.00	81,449.30	0.07	5,701.45
01.00.114	SUMINISTRO Y HABILITACION DE BARANDAS METALICAS	ML	300.00	24.00	7,200.00		
01.00.115	PINTADO Y MONTAJE DE BARANDAS METALICAS	ML	110.00	24.00	2,640.00		
				COSTO DIRECTO:		S/151,445.40	
				GASTOS GENERALES: (8%)		S/12,115.63	
				UTILIDAD: (5%)		S/7,572.27	
				PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19		S/1,816.63	
				SUB TOTAL:		S/172,949.93	
				IMPUESTO (IGV) 18%:		S/31,130.99	
				PRESUPUESTO PARCIAL:		S/204,080.92	

MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 07		MES 08	
01/12/22 -31/12/22		01/01/23 -31/01/23		01/02/23 -28/02/23		01/03/23 -31/03/23		01/04/23 -30/04/23		01/04/23 -31/05/23		01/04/23 -13/06/23	
CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL
1.54	16.79			2.31	25.18	4.76	51.88	4.62	50.36	4.77	51.99	2.00	21.80
						6.72	111.28						
						6.72	156.84						
						8.00	47.12	4.00	23.56				
								101.96	20,013.73				
						516.50	57,300.51						
	3,753.06			3,810.74		5,765.10		1,516.51		6,068.05		3,429.29	
								173.33	2,634.66				
690.55	6,042.31			500.81	4,382.09	434.03	3,797.76						
						167.39	2,510.85	52.57	788.60				
55.00	10,365.30			128.15	24,151.15	424.86	80,069.55	232.92	43,896.10	150.63	28,387.30	53.24	10,033.18
						46.80	7,203.46	178.54	27,480.88	184.49	28,396.70	77.37	11,908.79
433.47	41,786.51			166.55	16,055.42	160.98	15,518.47	190.39	18,353.60	64.46	6,213.94	27.03	2,605.69
						63.45	11,574.55	240.92	43,948.63	248.95	45,413.46	104.40	19,044.65
						16.64	996.57	62.39	3,736.54	64.46	3,860.51	27.03	1,618.83
1070.41	309,091.59			1158.82	334,620.86	370.10	106,870.08	178.54	51,555.21	184.49	53,273.33	77.37	22,341.36
591.77	182,123.14			406.68	125,159.84	289.95	89,235.01						
						464.69	66,339.32	232.92	33,251.66	195.63	27,927.97	83.24	11,883.17
						16.64	3,332.33	62.39	12,494.22	64.46	12,908.76	27.03	5,413.03
						472.59	117,741.57	232.92	58,029.69	195.63	48,738.76	83.24	20,737.92
263.73	65,948.32			288.68	72,187.32	127.26	31,822.64	178.54	44,645.71	184.49	46,133.57	77.37	19,347.14
185.47	69,957.43			358.31	135,150.95	104.27	39,329.60						
64.96	974.40			30.26	453.92	53.69	805.35						
64.96	272.83			30.26	127.10	53.69	225.50						
						611.15	2,658.62	1038.99	4,519.61				
						131.59	263.18	41.58	83.15				
						357.28	2,383.06	965.11	6,437.26				
								38.97	4,209.06				
0.13	650.00			0.10	500.00	0.21	1,050.00	0.20	1,000.00	0.21	1,050.00	0.09	450.00
0.17	13,846.38			0.06	4,588.41	0.30	24,176.32	0.29	23,362.33	0.12	9,773.92		
								24.00	7,200.00				
								24.00	2,640.00				
	S/ 869,390.81		S/ 0.00		S/ 836,407.72		S/ 2,193,601.65		S/ 4,465,032.05		S/ 2,598,785.73		S/ 1,085,227.41
	S/ 69,551.26		S/ 0.00		S/ 66,912.62		S/ 175,488.13		S/ 357,202.56		S/ 207,902.86		S/ 86,818.19
	S/ 43,469.54		S/ 0.00		S/ 41,820.39		S/ 109,680.08		S/ 223,251.60		S/ 129,939.29		S/ 54,261.37
	S/ 1,816.63		S/ 0.00		S/ 1,816.63		S/ 1,816.63		S/ 3,633.25		S/ 3,633.25		S/ 3,633.25
	S/ 984,228.25		S/ 0.00		S/ 946,957.34		S/ 2,480,586.50		S/ 5,049,119.47		S/ 2,940,261.13		S/ 1,229,940.22
	S/ 177,161.09		S/ 0.00		S/ 170,452.32		S/ 446,505.57		S/ 908,841.50		S/ 529,247.00		S/ 221,389.24
	S/ 1,161,389.34		S/ 0.00		S/ 1,117,409.66		S/ 2,927,092.07		S/ 5,957,960.97		S/ 3,469,508.13		S/ 1,451,329.46



Dante Parlahuache Calle
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. N° 146422

CONSORCIO EL BRONCE

 Ing. Cesar Homero Alvarado Torres
 RESIDENTE DE OBRA
 C.I.P. N° 89774

CONSORCIO EL BRONCE

Yelsin Marchena Aguilar
 REPRESENTANTE COMUN

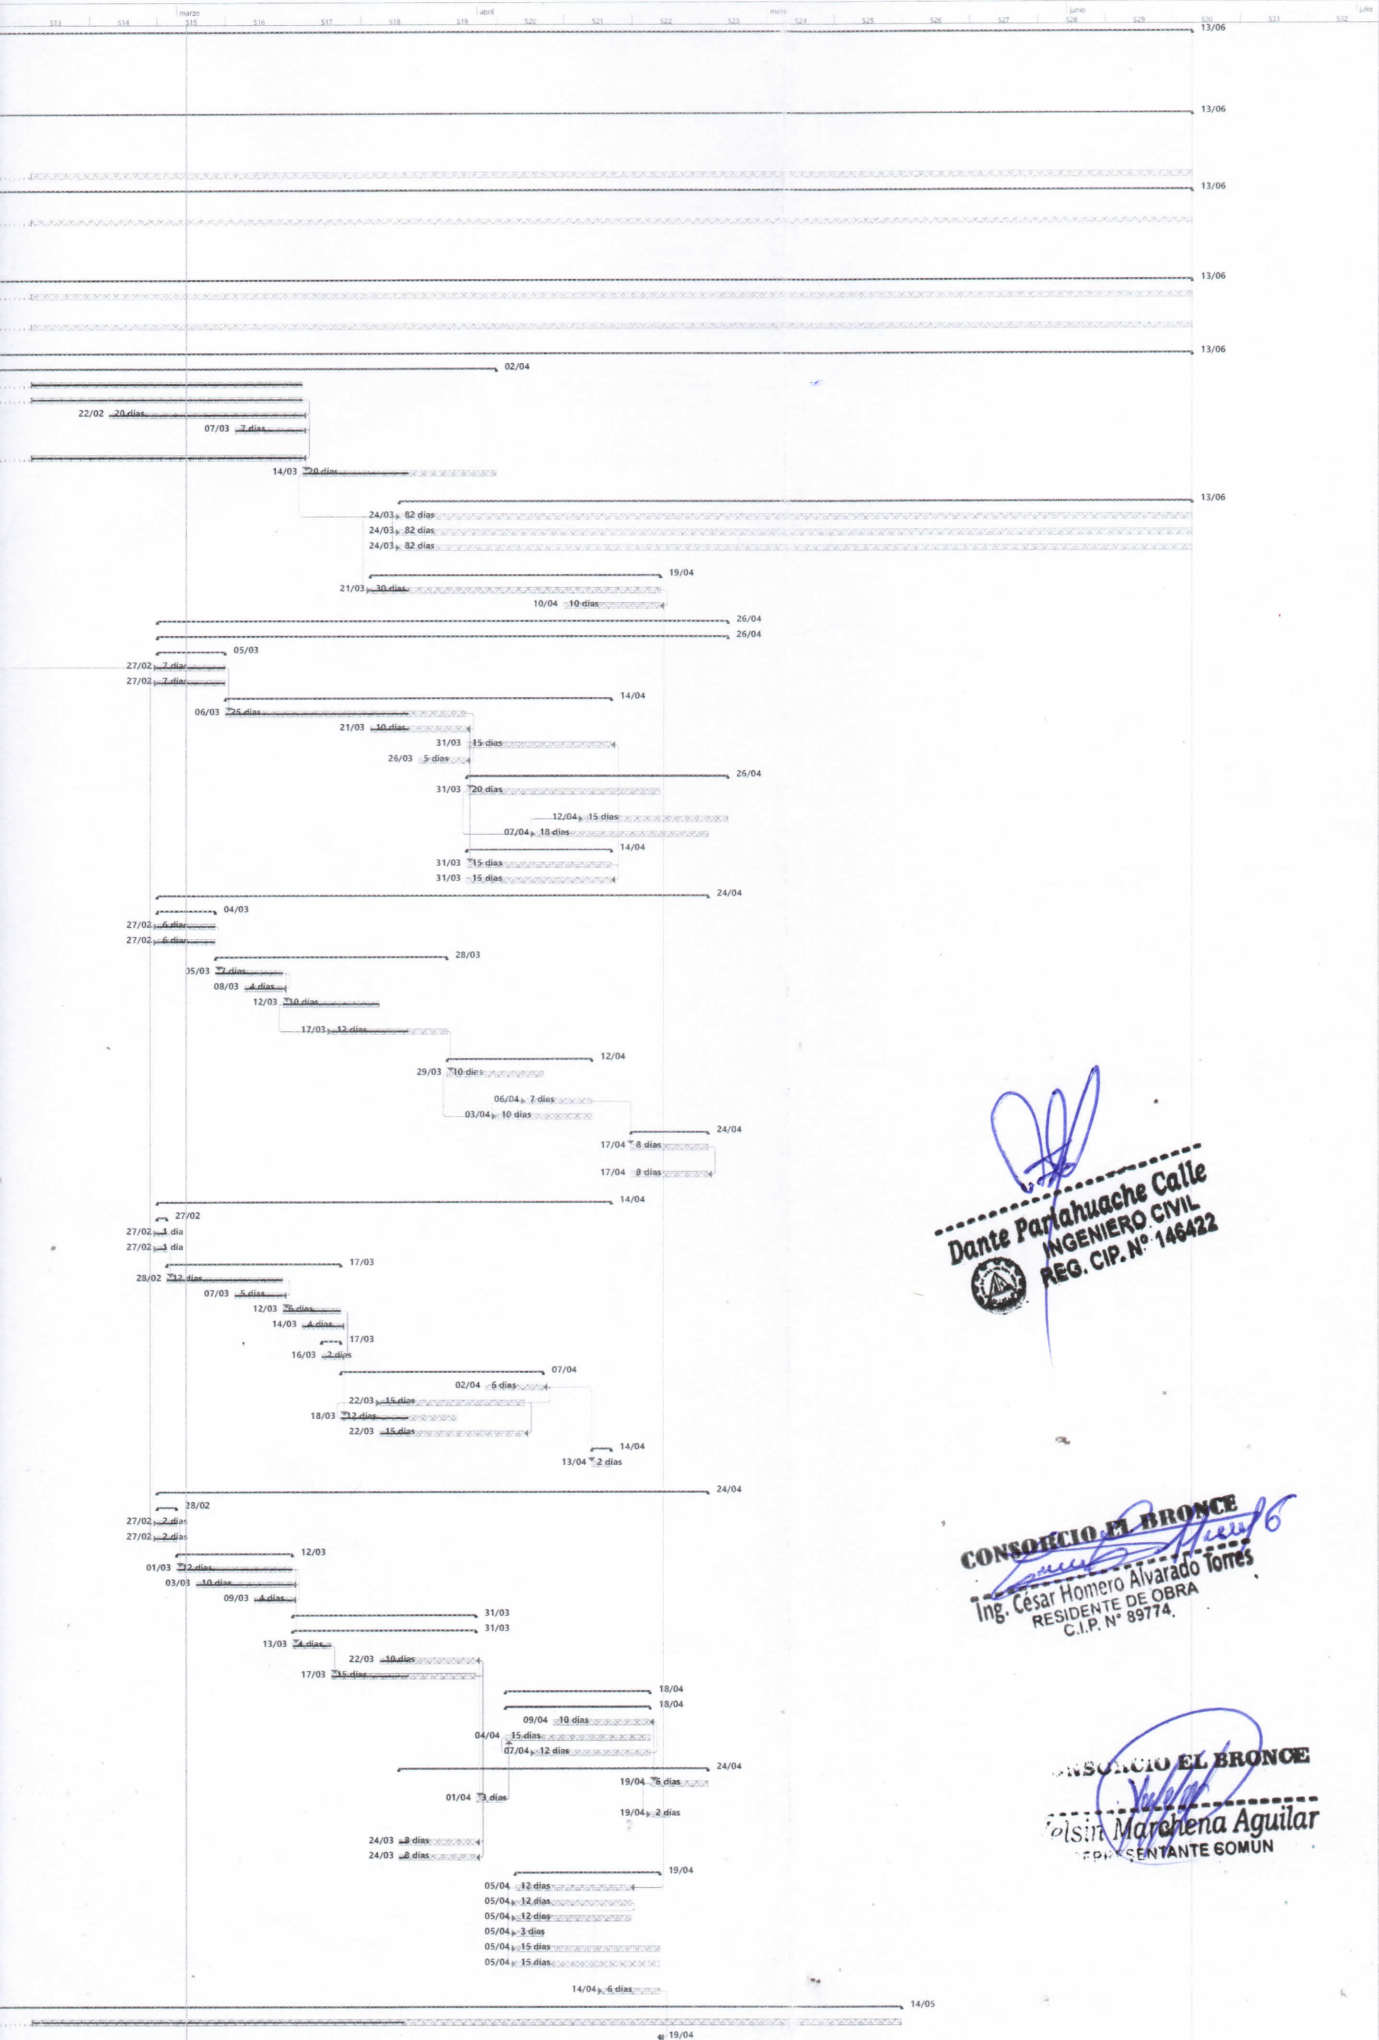Id	Texto	Nombre de tarea	Contenido	Duración	Fin
1			"REHABILITACIÓN DE 24.36 KM DE CAMINO VECINAL (PI - 780) EMP.PI-708 (Frias) - EL BRONCE - TUCAQUE - LIMÓN - HUASIPÉ - PAMPA RAMADA - PLATANAL ALTO - EMP.PI-780(CHILIQUE), DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYARACA- DEPARTAMENTO DE PIURA"	205 días	mar 13/06/23
2					
3	01		INICIO	0 días	lun 21/11/22
4	01.01		OBRA PROVISIONALES	205 días	mar 13/06/23
5	01.02		CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (4.8 M x 3.60 M)	2 días	mar 22/11/22
6	01.03		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	5 días	vie 25/11/22
7	01.04		BAÑOS QUIMICOS PORTATILES	7 días	dom 27/11/22
8	02		TRABAJOS PRELIMINARES	150 días	mar 13/06/23
9	02.01		TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO (EN CARRETERAS)	205 días	mar 13/06/23
10	02.02		MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	20 días	sáb 10/12/22
11	02.03		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES	7 días	dom 04/12/22
12	02.04		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	5 días	sáb 03/12/22
13	03		SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	205 días	mar 13/06/23
14	03.01		MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	150 días	mar 13/06/23
15	03.02		EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	10 días	mié 30/11/22
16	03.03		RECURSOS PARA LA RESPUESTA ANTES LA EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150 días	mar 13/06/23
17	04		MEJORAMIENTO DE VÍA		
18	04.01		MOVIMIENTOS DE TIERRAS	197 días	mar 13/06/23
19	04.01.01		CORTE DE MATERIAL SUELO	125 días	dom 02/04/23
20	04.01.02		CORTE EN ROCA, INCLUYE DESQUINCHE, REFINE Y PENADO	50 días	lun 13/03/23
21	04.01.03		RELLENO COMPACTADO CON EXCEDENTES DE CORTE	50 días	lun 13/03/23
22	04.01.04		MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE CON OVER MAX 8", e=0.30 m.	20 días	lun 13/03/23
23	04.01.05		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	50 días	lun 13/03/23
24	04.01.06		PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE (SUP. LASTRADURA)	20 días	dom 02/04/23
25	04.02		AFIRMADO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL	82 días	mar 13/06/23
26	04.02.01		BASE DE AFIRMADO E=0.25 M TROCHA	82 días	mar 13/06/23
27	04.02.02		IMPRIMACION ASFALTICA	82 días	mar 13/06/23
28	04.02.03		APLICACION DE SLURRY SEAL ASFALTICO SUPERFICIAL E=12 mm.	82 días	mar 13/06/23
29	04.03		CUNETAS		
30	04.03.01		CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS	30 días	mié 19/04/23
31	04.03.02		PASE PEATONAL 0.80x1.50 m	30 días	mié 19/04/23
32	05		OBRAS DE ARTE		
33	05.01		ALCANTARILLAS	59 días	mié 26/04/23
34	05.01.01		TRABAJOS PRELIMINARES	7 días	dom 05/03/23
35	05.01.01.01		TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	7 días	dom 05/03/23
36	05.01.01.02		LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	7 días	dom 05/03/23
37	05.01.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS	40 días	vie 14/04/23
38	05.01.02.01		EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	25 días	jue 30/03/23
39	05.01.02.02		CAMA BASE E=0.10 M, MATERIAL SELECCIONADO	10 días	jue 30/03/23
40	05.01.02.03		RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL SELECCIONADO	15 días	vie 14/04/23
41	05.01.02.04		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	5 días	jue 30/03/23
42	05.01.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	27 días	mié 26/04/23
43	05.01.03.01		EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'c=175 kg/cm2 + 60% P.M	20 días	mié 19/04/23
44	05.01.03.02		CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PULIDO	15 días	mié 26/04/23
45	05.01.03.03		ENCOFRADO Y DESENCOFADO	18 días	lun 24/04/23
46	05.01.04		ALCANTARILLA TMC	15 días	vie 14/04/23
47	05.01.04.01		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TMC Ø 24"	15 días	vie 14/04/23
48	05.01.04.02		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TMC Ø 36"	15 días	vie 14/04/23
49	05.02		BADEN		
50	05.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES	57 días	lun 24/04/23
51	05.02.01.01		TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	6 días	sáb 04/03/23
52	05.02.01.02		LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	6 días	sáb 04/03/23
53	05.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS	24 días	dom 05/03/23
54	05.02.02.01		EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	7 días	sáb 11/03/23
55	05.02.02.02		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	4 días	sáb 11/03/23
56	05.02.02.03		RELLENO DE ESTRUCTURA CON MATERIAL OVER 8" e=0.20 m.	10 días	mar 21/03/23
57	05.02.02.04		RELLENO DE ESTRUCTURA CON MATERIAL HORMIGON e=0.20 m.	12 días	mar 28/03/23
58	05.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	15 días	mié 12/04/23
59	05.02.03.01		EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'c=175 kg/cm2 + 60% P.M	10 días	vie 07/04/23
60	05.02.03.02		CONCRETO F'c = 210 kg/cm2	7 días	mié 12/04/23



Dante Parlahuache Calle
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 146422

CONSORCIO EL BRONCE
Ing. Cesar Homero Alvarado Torres
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 89774

CONSORCIO EL BRONCE
Ing. Marchena Aguilar
REPRESENTANTE COMUN

PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE 24.36 KM DE CAMINO VECINAL (PI - 780) EMP.PI-708 (FRIAS) - EL BRONCE - TUCAQUE - LIMÓN - HUASIPE - PAMPA RAMADA - PLATANAL ALTO - EMP.PI-780 (CHILILIQUE), DISTRITO DE FRÍAS - PROVINCIA DE AYACUCHO"

UBICACIÓN: FRIAS- AYABACA- PIURA

FECHA: FEBRERO-2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	P. Unit. S/.	Parcial S/.	MES 1			MES 2			MES 3	
						21/11/22 -30/11/22			01/12/22 -31/12/22			01/01/23	
						Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial
01.01	OBRAS PRELIMINARES				59,563.12								
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (4.8 M x 3.60 M)	und	2.00	1,688.73	3,377.46								
01.03	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	150.00	79.32	11,898.00	150.00	11,898.00	100.00%					
01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	est	1.00	39,587.71	39,587.71	1.00	39,587.71	100.00%					
02.01	BAÑOS QUIMICOS PORTATILES	mes	5.00	1,000.00	5,000.00	0.24	243.90	4.88%	1.13	1,134.15	22.68%		
02.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO (EN CARRETERAS)	km	24.36	698.29	17,010.34	12.18	8,505.17	50.00%					
02.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	mes	2.00	3,727.17	7,454.34				12.18	8,505.17	50.00%		
02.04	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES	m3	623.60	7.35	4,583.46	267.26	1,964.34	42.86%	0.39	1,470.73	19.73%		
03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	779.50	6.81	5,308.40	311.80	2,123.36	40.00%	356.34	2,619.12	57.14%		
03.02	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	0.05	341.46	4.88%	467.70	3,185.04	60.00%		
03.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	GLB	1.00	19,159.50	19,159.50	1.00	19,159.50	100.00%	0.23	1,587.81	22.68%		
04.01	RECURSOS PARA LA RESPUESTA ANTES LA EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00	0.05	243.90	4.88%	0.23	1,134.15	22.68%		
04.02	MEJORAMIENTO DE VÍA				10,397,351.26								
04.01.01	MOVIMIENTOS DE TIERRAS				2,356,218.86								
04.01.02	CORTE DE MATERIAL SUELTO	m3	79,942.51	4.54	362,939.00								
04.01.03	CORTE EN ROCA, INCLUYE DESQUINCHE, REFINE Y PEINADO	m3	47,859.70	12.03	575,752.19	1522.71	6,913.12	1.90%	37006.65	168,010.19	46.29%		
04.01.04	RELLENO COMPACTADO CON EXCEDENTES DE CORTE	m3	13,865.47	6.11	84,718.02	2884.30	34,698.16	6.03%	21195.01	254,975.97	44.29%		
04.01.05	MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE CON OVER MAX 8", e=0.30 m.	m2	2,700.00	36.10	97,470.00								
04.01.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	136,724.09	6.81	931,091.05	2604.27	17,735.07	1.90%	60549.24	412,340.33	44.29%		
04.02.01	PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE (SUP. LASTRADA)	m2	146,980.00	2.07	304,248.60								
04.02.02	AFIRMADO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL				5,946,033.60								
04.02.03	BASE DE AFIRMADO E= 0.25 M TROCHA	m2	146,980.00	36.12	5,308,917.60								
04.02.04	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	121,800.00	3.35	408,030.00								
04.02.05	APLICACION DE SLURRY SEAL ASFALTICO SUPERFICIAL E=12 mm.	m2	121,800.00	9.27	1,129,086.00								
04.03.01	CUNETAS				1,194,948.90								
04.03.02	CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS	m	24,360.00	48.25	1,175,370.00								
04.03.03	PASE PEATONAL 0.80x1.50 m	und	85.00	230.34	19,578.90								
05.01.01	ALCANTARILLAS				1,272,139.37								
05.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				314,640.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		
05.01.01.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	858.22	2.20	1,888.08								
05.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	858.22	0.97	832.47								
05.01.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				28,268.53								
05.01.02.02	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS	m3	694.81	19.74	13,715.55								
05.01.02.03	CAMA BASE E=0.10 M, MATERIAL SELECCIONADO	m2	176.12	27.31	4,809.84								
05.01.02.04	RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL SELECCIONADO	m3	258.12	25.34	6,540.76								
05.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	545.87	6.81	3,717.37								
05.01.03.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				173,867.65								
05.01.03.02	EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 60% P.M	m3	68.00	291.93	19,851.24								
05.01.03.03	CONCRETO Fc=175 KG/CM2 : PULIDO	m3	185.87	464.88	86,407.25								
05.01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,253.22	53.31	66,809.16								
05.01.04.01	ALCANTARILLA TMC				127,568.77								
05.01.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TMC Ø 24"	ML	240.80	255.21	61,454.57								
05.01.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TMC Ø 36"	ML	140.00	346.53	48,514.20								
05.02.01	BADEN				214,698.25	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		
05.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				13,041.38								
05.02.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	4,114.00	2.20	9,050.80								
05.02.01.03	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	4,114.00	0.97	3,990.58								
05.02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				150,252.67								
05.02.02.02	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS	m3	1,753.15	19.74	34,607.18								
05.02.02.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2,191.44	6.81	14,923.71								
05.02.02.04	RELLENO DE ESTRUCTURA CON MATERIAL OVER 8" e=0.20 m.	m3	466.80	146.57	68,418.88								
05.02.02.05	RELLENO DE ESTRUCTURA CON MATERIAL HORMIGON e=0.20 m.	m3	229.10	141.00	32,303.10								
05.02.03.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				278,722.11								
05.02.03.02	EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 60% P.M	m3	582.93	291.93	170,174.75								
05.02.03.03	CONCRETO Fc = 210 kg/cm2	m3	572.73	480.85	275,397.22								
05.02.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	933.53	56.94	53,155.20								
05.02.04.01	JUNTA DE BADEN				52,667.41								
05.02.04.02	JUNTA DE DILATACION, ELASTOMERICO DE POLIURETANO DE 1"x1/2"	ML	806.67	42.25	34,081.81								
05.02.04.03	JUNTA DE CONTRACCION, ELASTOMERICO DE POLIURETANO DE 1/2"x1/2"	ML	484.00	38.40	18,585.60								
05.03.01	BADEN				214,698.25	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		
05.03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				13,041.38								
05.03.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	94.80	2.20	208.56								
05.03.01.03	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	94.80	0.97	91.96								
05.03.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				15,679.07								
05.03.02.02	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS	m3	318.04	19.74	6,278.11								
05.03.02.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	397.55	6.81	2,707.32								
05.03.02.04	RELLENO Y COMPACTACIÓN C/HORMIGON	m3	28.44	141.00	4,010.04								
05.03.02.05	RELLENO Y COMPACTACIÓN C/OVER	m3	18.96	141.54	2,683.60								
05.03.03.01	CONCRETO SIMPLE				3,005.16								
05.03.03.02	SOLADO PARA ZAPATA C:H 1:12 E = 10 CM	m2	94.80	31.70	3,005.16								
05.03.03.03	CONCRETO ARMADO				71,247.38								
05.03.03.04	CONCRETO Fc = 210 kg/cm2	m3	52.76	480.85	25,369.65								
05.03.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	257.20	53.31	13,711.33								
05.03.03.06	ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	4,112.29	7.73	31,788.00								
05.03.03.07	LLORADEROS	und	24.00	15.85	380.40								
05.03.04.01	JUNTAS				816.69								
05.03.04.02	JUNTA DE DILATACION, ELASTOMERICO DE POLIURETANO DE 1"x1/2"	ML	19.33	42.25	816.69								
05.04.01	BADEN (e=0.00m 62 UND)				191,679.23	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		
05.04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				503.71								
05.04.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	179.98	2.20	395.96								
05.04.01.03	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	111.08	0.97	107.75								
05.04.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				15,092.46								
05.04.02.02	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS	m3	296.60	19.74	5,854.88								
05.04.02.03	RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL SELECCIONADO	m3	383.49	25.34	9,717.64								
05.04.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	370.76	6.81	2,524.88								
05.04.03.01	SUBESTRUCTURA				95,985.60								
05.04.03.02	ESTRIBOS Y ALETAS				95,985.60								
05.04.03.01.01	SOLADO PARA ZAPATA C:H 1:12 E = 10 CM	m2	251.66	31.70	7,977.62								
05.04.03.01.02	CONCRETO CICLOPE C:H 1:8 + 30% P.M.	m3	215.71	354.65	76,501.55								
05.04.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	215.84	53.31	11,506.43								

DE OBRA

AMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ARCC 7149"

MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8			
01/02/23 -28/02/23				01/03/23 -31/03/23				01/04/23 -30/04/23				01/04/23 -31/05/23				01/04/23 -13/06/23			
%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%		Metrado	Parcial	%		Metrado	Parcial	%		Metrado	Parcial	%	
		1.060.97			756.10				731.71				756.10				317.07		
	1.06	1.060.97	21.22%	0.76	756.10	15.12%		0.73	731.71	14.63%		0.76	756.10	15.12%		0.32	317.07	6.34%	
		1.752.77			1.249.11				1.208.81				1.249.11				523.82		
	0.47	1.752.77	23.51%	0.34	1.249.11	16.76%		0.32	1.208.81	16.22%		0.34	1.249.11	16.76%		0.14	523.82	7.03%	
		2.721.26			1.639.11				1.795.10				1.814.54				780.97		
	0.23	1.587.81	22.68%	0.14	956.09	13.66%		0.15	1.024.39	14.63%		0.15	1.058.54	15.12%		0.06	443.90	6.34%	
	0.23	1.134.15	22.68%	0.14	682.92	13.66%		0.15	731.71	14.63%		0.15	756.10	15.12%		0.06	317.07	6.34%	
		811.385.30			1.758.741.34				3.274.431.35				2.586.449.94				1.039.197.39		
	31107.20	141.226.69	38.91%	10305.95	46.789.00	12.89%			30.424.86										
	17854.90	214.794.46	37.31%	5925.49	71.283.60	12.38%													
	6543.06	39.978.12	47.19%	7322.41	44.739.90	52.81%													
				2700.00	97.470.00	100.00%													
	56642.84	385.737.72	41.43%	16927.74	115.277.94	12.38%													
	14324.30	29.651.31	9.75%	117957.70	244.172.43	80.25%		14698.00	30.424.86	10.00%									
					208.059.48				2.185.326.79				2.586.449.94				1.065.197.39		
				15459.92	558.412.23	10.52%		53099.87	1.917.967.28	36.13%		55565.61	2.007.029.82	37.80%		22854.60	825.508.27	15.55%	
				11788.81	39.492.52	9.68%		44560.98	149.279.27	36.59%		46140.46	154.570.53	37.88%		19309.76	64.687.68	15.85%	
				11882.93	110.154.73	9.76%		44560.98	413.080.24	36.59%		46046.34	426.849.59	37.80%		19309.76	179.001.44	15.85%	
				8932.00	430.969.00	36.67%		15428.00	744.401.00	63.33%									
							85.00	19.578.90	100.00%										
	6.431.53		0.57%	12.664.03	416.767.94	25.51%		6.824.92	6.889.39.40	19.12%		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%	
	4.951.11		0.37%	2.855.45	52.765.85	4.43%		2.183.87	2.889.512.34	3.25%		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%	
	490.41		0.27%	1.223.03	1.943.25	1.41%						0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%	
	245.21	539.45	28.57%	613.01	1.348.63	71.43%													
	245.21	237.85	28.57%	613.01	594.62	71.43%													
				1.434.00	22.678.81	3.07%		240.91	6.104.71	0.93%									
				694.81	13.715.55	100.00%													
				176.12	4.809.84	100.00%													
				17.21	436.05	6.67%		240.91	6.104.71	93.33%									
				545.87	3.717.37	100.00%													
					972.54			1303.69	172.025.09	3.95%									
				3.40	992.56	5.00%		64.60	18.858.68	95.00%									
								185.87	36.407.25	100.00%									
								1253.22	66.809.16	100.00%									
				25.37	7.301.25	0.11%		335.41	107.637.52	1.87%									
				16.05	4.096.97	6.67%		224.75	57.357.60	93.33%									
				9.33	3.234.28	6.67%		130.67	45.279.92	93.33%									
	2.742.66	4.747.12	0.87%	5.485.34	3.244.26	1.33%		3.253.96	50.916.15	4.20%		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%	
	1371.33	3.016.93	33.33%	2742.67	6.033.87	66.67%													
	1371.33	1.330.19	33.33%	2742.67	2.660.39	66.67%													
				4.640.45	150.232.87	4.00%													
				1753.15	34.607.18	100.00%													
				2191.44	14.923.71	100.00%													
				466.80	68.418.88	100.00%													
				229.10	32.303.10	100.00%													
				171.88	51.052.43	0.30%		1.914.31	447.674.74	0.70%									
				174.88	51.052.43	30.00%		408.05	119.122.32	70.00%									
								572.73	275.397.22	100.00%									
								933.53	53.155.20	100.00%									
								1.790.67	52.667.41	2.00%									
								806.67	34.081.81	100.00%									
								484.00	18.585.60	100.00%									
								185.87	36.407.25	100.00%									
	189.60	300.53	2.00%	2.191.44	42.333.24	7.33%													
	94.80	208.56	100.00%																
	94.80	91.96	100.00%																
	26.50	523.18	0.08%	736.49	15.155.89	3.92%													
	26.50	523.18	8.33%	291.54	5.754.93	91.67%													
				397.55	2.707.32	100.00%													
				28.44	4.010.04	100.00%													
				18.96	2.683.60	100.00%													
				94.80	3.005.16	1.00%													
				94.80	3.005.16	100.00%													
				4.299.76	41.182.49	2.33%		146.49	30.066.89	1.62%									
				171.47	9.140.89	66.67%		52.76	25.369.65	100.00%									
				4112.29	31.788.00	100.00%		85.73	4.570.44	33.33%									
				16.00	253.60	66.67%		8.00	126.80	33.33%									
								19.33	816.69	100.00%									
	291.00	303.71	2.00%	1.745.86	114.476.92	8.30%		1.556.13	26.876.35	6.60%		6.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%	
	179.98	395.96	100.00%																
	111.08	107.75	100.00%																
				1.050.85	15.097.40	3.00%													
				296.60	5.854.88	100.00%													
				383.49	9.717.64	100.00%													
				370.76	2.524.88	100.00%													
				683.21	95.985.60	3.00%													
				683.21	95.985.60	3.00%													
				251.66	7.977.62	100.00%													
				215.71	76.501.55	100.00%													
				215.84	11.506.43	100.00%													

Dante Parlahuache Calle
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 146422

CONSORCIO EL BRONCE
Cesar Homero Alvarado Torres
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 89774

CONSORCIO EL BRONCE
Yelsin Marchena Aguilar
REPRESENTANTE COMUN

Item	Descripción	Und.	Metrado	P. Unit. S/.	Parcial S/.	MES 1			MES 2				
						21/11/22 -30/11/22			01/12/22 -31/12/22			01/01/23	
						Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Pa
05.04.04	SUPERESTRUCTURA												
05.04.04.01	LOSA PUNTE				25,399.05								
05.04.04.01.01	CONCRETO Fc = 210 Kg/cm2				25,399.05								
05.04.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m3	31.38	480.85	15,089.07								
05.04.04.01.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60	m2	9.60	53.31	511.78								
05.04.05	VARIOS	kg	1,266.65	7.73	9,791.20								
05.04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA				11,900.47								
05.04.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO DE NEOPRENO	ML	24.00	410.00	9,840.00								
05.04.05.03	JUNTA DE DILATACION, ELASTOMERICO DE NEOPRENO	pza	5.52	148.46	819.50								
05.04.05.04	TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP Ø 3"	ML	20.00	42.25	845.00								
05.04.05.05	TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP Ø 4"	ML	6.40	27.34	174.98								
06	SEÑALIZACION	ML	6.40	34.53	220.99								
06.01	HITOS KILOMETRICOS				203,701.53								
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	26.00	104.41	2,714.66								
06.03	SEÑALES INFORMATIVAS	und	152.00	364.32	55,376.64								
06.04	SEÑAL REGLAMENTARIA	und	13.00	630.86	8,201.18								
06.05	ESTRUCTURA DE SOPORTE P/SEÑAL	und	4.00	468.35	1,873.40								
06.06	POSTES DE CONCRETO P/SEÑAL PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA	und	13.00	1,353.53	17,595.89								
06.07	PINTADO DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA)	und	156.00	357.32	55,741.92								
07	FLETE	ML	48,716.00	3.74	182,197.84								
7.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	81,449.30	81,449.30								
COSTO DIRECTO					12,199,890.77	0.06	4,654.25	5.71%		14,428.16	17.71%		
GASTOS GENERALES: (8%)					975,991.26		151,445.40	1.24%		869,390.81	7.13%		
UTILIDADES: (5%)					609,994.54		12,115.63	1.24%		69,551.26	7.13%		
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19					18,166.27		7,572.27	1.24%		43,469.54	7.13%		
SUBTOTAL					13,804,042.84		1,816,630.00	10.00%		1,816.63	10.00%		
IMPUUESTOS (IGV) (18%)					2,484,727.71		172,949.93	1.25%		984,228.25	7.13%		
PRESUPUESTO PARCIAL					16,288,770.55		31,130.99	1.25%		177,161.09	7.13%		
							204,080.92	1.25%		1,161,389.34	7.13%		

MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8			
01/02/23 -28/02/23				01/03/23 -31/03/23				01/04/23 -30/04/23				01/04/23 -31/05/23				01/04/23 -13/06/23			
%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%		Metrado	Parcial	%		Metrado	Parcial	%		Metrado	Parcial	%	
								1,307.63	35,392.05	3.00									
								1,307.63	25,392.05	3.00									
								31.38	15,089.07	100.00%									
								9.60	511.78	100.00%									
								1266.65	9,791.20	100.00%									
				12.60	395.97	2.00		49.53	11,504.50	3.00									
								24.00	9,840.00	100.00%									
								5.52	819.50	100.00%									
								20.00	845.00	100.00%									
				6.40	174.98	100.00%													
				6.40	220.99	100.00%													
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			924,201.54				0.00%				0.00%		
								26.00	2,714.66	100.00%									
								152.00	55,376.64	100.00%									
								13.00	8,201.18	100.00%									
								4.00	1,873.40	100.00%									
								13.00	17,595.89	100.00%									
								156.00	55,741.92	100.00%									
								48716.00	182,197.84	100.00%									
		13,031.89			14,428.16				13,962.74				6,515.94				14,428.16		
	0.16	13,031.89	16.00%	0.18	14,428.16	17.71%	0.17	13,962.74	17.14%	0.08	6,515.94	8.00%	0.18	14,428.16	17.71%				
0.00%		836,407.72	6.86%		2,193,401.65	17.98%		4,465,032.05	36.60%		2,598,785.73	21.30%		1,085,227.41	8.90%				
0.00%		66,912.62	6.86%		175,488.13	17.98%		357,202.56	36.60%		207,902.86	21.30%		86,818.19	8.90%				
0.00%		41,820.39	6.86%		109,680.08	17.98%		223,251.60	36.60%		129,939.29	21.30%		54,261.37	8.90%				
0.00%		1,816.63	10.00%		1,816.63	10.00%		3,633.25	20.00%		3,633.25	20.00%		3,633.25	20.00%				
0.00%		946,957.34	6.86%		2,480,586.50	17.97%		5,049,119.47	36.58%		2,940,261.13	21.30%		1,229,940.22	8.91%				
0.00%		170,452.32	6.86%		446,505.57	17.97%		908,841.50	36.58%		529,247.00	21.30%		221,389.24	8.91%				
0.00%		1,117,409.66	6.86%		2,927,092.07	17.97%		5,957,960.97	36.58%		3,469,508.13	21.30%		1,451,329.46	8.91%				


Dante Parahuache Calle
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 148422


CONSORCIO EL BRONCE
Ing. Cesar Homero Alvarado Torres
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 89774


CONSORCIO EL BRONCE
Yelsin Marchena Aguilar
REPRESENTANTE COMUN
