

# Resolución de Gerencia General Regional

**N° 194-2025-G.R.P./GGR.**

Cerro de Pasco, 20 MAR, 2025

## EL GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO

### VISTO:

El Memorando N° 0692-2025-G.R.PASCO-GOB/GGR, de fecha 19 de marzo de 2025, emitido por la Gerencia General Regional; Informe Legal N° 432-2025-G.R.P-GGR/DRAJ, de fecha 19 de marzo de 2025, emitido por la Dirección Regional de Asesoría Jurídica; Informe N° 0415-2025-G.R.PASCO-GGR/GRI, de fecha 18 de marzo de 2025, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; Informe N° 1603-2025-GRP-GGR-GRI/SGSO, de fecha 18 de marzo de 2025, emitido por el Sub Gerente de Supervisión de Obras; Informe N° 057-2025-G.R.PASCO-GRI-SGSO-ACO/MJM-CUI:2116853, de fecha 18 de marzo de 2025, emitido por el Administrador de Contrato; Carta N° 058-2025-CONSORCIOSUPERVISORTUPAC/JCVP-R, de fecha 14 de marzo de 2025, emitido por el CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC; Informe N° 42-2025-JEFE SUPERVISIÓN EMCR/JSO, de fecha 14 de marzo de 2025, emitido por el Jefe de Supervisión de Obra; Carta N° 070-2025-CTP, de fecha 12 de marzo de 2025, emitido por el representante común del CONSORCIO TERMINAL PASCO, y;

### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, precisa que “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia (...)”; siendo la autonomía una atribución constitucional, conforme se desprende de los alcances del artículo 191° de la norma *normarum*, que indica “Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se desprende que es atribución de la Gerencia General Regional: emitir “(...) las **Resoluciones de Gerencia General Regional** (...)”;

Que, en principio se debe tener en consideración actualmente se encuentra vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificaciones; no obstante, se tiene que en el presente caso el procedimiento de selección fue convocado en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, actualizado con Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, actualizado Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en ese sentido, procede la aplicación de dicha normatividad en el presente caso;

Que, sobre la ampliación de plazo, el numeral 34.5 del artículo 34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (aplicable al presente caso), establece que: “El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento”;

Que, a su vez, el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, precisa las causales por las cuales el contratista, ante situaciones ajenas a su voluntad que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, puede solicitar la ampliación del plazo de ejecución en los contratos de obra, por las siguientes: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2. **Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra.** En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 3. **Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico”;**

Que, del mismo modo, el artículo 170° concerniente con el Procedimiento de ampliación de plazo, establece en sus numerales: 170.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 170.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. 170.3. Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. 170.4. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo período de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente. 170.5. En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valore los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado. 170.6. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor debe elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado

el calendario elevado por el inspector o supervisor. 170.7. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada. (...);

Que, como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado otorga al contratista el derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de obra cuando se produzcan situaciones ajenas a su voluntad, principalmente por atrasos y/o paralizaciones que afecten la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, con la finalidad de extender el plazo de ejecución de obra y, de esta manera, reparar y equilibrar las condiciones inicialmente pactadas o adecuar el plazo de ejecución de obra a las modificaciones del contrato ordenadas por la Entidad;

Que, con fecha 20 de diciembre del 2018, la Entidad y el CONSORCIO TERMINAL PASCO, suscribieron el Contrato N° 0109-2018-G.R.PASCO/GGR, derivado de la Licitación Pública N° 011-2018-GRP/OBRAS (Primera Convocatoria), para la Ejecución de la Obra: "Construcción del Moderno Terminal Terrestre Interprovincial de la Ciudad de Cerro de Pasco, provincia de Pasco - Pasco", con CUI 2116853, por el monto total de S/ 32'744,195.06 (treinta y dos millones setecientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y cinco con 06/100 soles), por un plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario. Supervisado por el CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC;

Que, en mérito a ello, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 164-2025-G.R.PASCO/JGGR, de fecha 10 de marzo de 2025, se APROBÓ el Expediente Adicional de Obra N° 10 y Deductivo Vinculante N° 05, (Replanteo del sistema de drenaje a consecuencia del cambio de dirección del flujo), para la ejecución de obra: "Construcción del Moderno Terminal Terrestre Interprovincial de la Ciudad de Cerro de Pasco, provincia de Pasco - Pasco", con CUI 2116853, peticionado por el CONSORCIO TERMINAL PASCO, siendo el Adicional de Obra N° 10, la suma de S/. 1,023,084.18 (Un millón veintitrés mil ochenta y cuatro con 18/100 Soles) y Deductivo Vinculante N° 05, la suma de S/. 522,237.70 (Quinientos veintidós mil doscientos treinta y siete con 70/100 soles); por tanto, el valor neto del Adicional de Obra N° 10 y Deductivo Vinculante N° 05, es la suma de S/. 500,846.48 (Quinientos mil ochocientos cuarenta y seis con 48/100 Soles), con una incidencia de 1.53% y porcentaje de acumulada 6.97% del monto contractual, conforme a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001623, de fecha 27 de febrero del 2025, emitida por el Sub Gerente de Presupuesto y Tributación;

Que, en ese sentido, mediante Carta Múltiple N° 00162-2025-GRP-GGR-GRI/SGSO, de fecha 10 de marzo de 2025, el Ing. Leonel BENITES DIEGO - Sub Gerente de Supervisión de Obras, notifica al contratista - CONSORCIO TERMINAL PASCO y supervisor - CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC, la Resolución de Gerencia General Regional N° 164-2025-G.R.PASCO/JGGR, de fecha 10 de marzo de 2025;

Que, de esta manera, mediante Asiento N° 797 del Cuaderno de Obra, de fecha 10 de marzo de 2025, el Ing. Apolinario VILLANUEVA SEBASTIÁN - Residente de Obra, anota el inicio y fin de causal de ampliación de plazo, señalando que: "1) Siendo 8.22 pm., del día hoy mediante correo electrónico nos notifican la Resolución de Gerencia General Regional N° 164-2025-G.R.PASCO/JGGR, de fecha 10 de marzo de 2025, donde se aprueba el Expediente Adicional de Obra N° 10 y Deductivo Vinculante N° 05, (Replanteo del sistema de drenaje a consecuencia del cambio de dirección del flujo), para la ejecución de obra: "Construcción del Moderno Terminal Terrestre Interprovincial de la Ciudad de Cerro de Pasco, provincia de Pasco - Pasco", con CUI 2116853, (...);

Que, en ese sentido, dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor, con Carta N° 070-2025-CTP, de fecha 12 de marzo de 2025, emitido por la Sra. Mariú Angelita RAMÍREZ ZAMUDIO, representante común del CONSORCIO TERMINAL PASCO, por el periodo de cuarenta y siete (47) días calendario, a consecuencia de la aprobación del Expediente Técnico Adicional N° 10, bajo la causal invocada en el numeral 2 del artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, es así, el supervisor emite el informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud, con Carta N° 058-2025-CONSORCIOSUPERVISORTUPAC/JCVP-R, de fecha 17 de marzo de 2025, emitido por el Sr. Joselito Carlos VALERIO PRESENTACIÓN, representante común del CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC, adjuntado el Informe N° 42-2025-JEFE SUPERVISIÓN EMCR/JSO, de fecha 14 de marzo de 2025, emitido por el Ing. Erick Miguel CHÁVEZ RÍOS - Jefe de Supervisión de Obra, quien **aprueba** la solicitud de ampliación de plazo N° 19, por cuarenta (40) días calendario, concluyendo: (...). Se ha identificado que el contratista ha cuantificado su solicitud en cuarenta y siete días calendario, argumentando que dicho periodo corresponde a la afectación sufrida en el desarrollo de las actividades programadas. No obstante, al realizar la evaluación técnica correspondiente, se ha identificado que dentro de este periodo existen siete días de traslape con partidas contractuales ya establecidas en el cronograma original. Estas partidas, al encontrarse incluidas en el contrato principal, no pueden ser consideradas como justificantes válidos para la ampliación de plazo, motivo por el cual se ha procedido a descontarlas del total solicitado. Sobre la base de estos hallazgos, se concluye que la ampliación de plazo N° 019 debe ser aprobada por un periodo de cuarenta días calendario (40 dc), en lugar de los cuarenta y siete días requeridos inicialmente. Esta decisión se fundamenta en el análisis detallado de los registros de obra, la documentación técnica presentada por el contratista y la aplicación de los criterios normativos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (...);

Que, en ese sentido, con Informe N° 057-2025-G.R.PASCO-GRI-SGSO-ACO/MJM-CUI:2116853, de fecha 18 de marzo de 2025, el Ing. Gregorio Mauro JAUNI MEZA - Administrador de Contrato de obra, **otorga opinión técnica favorable** para la ampliación de plazo N° 19, por un total de cuarenta (40) días calendario de los cuarenta y siete (47) días calendario, solicitado por el CONSORCIO TERMINAL PASCO, señalando lo siguiente:

**ANÁLISIS:**

(...);


**4.5 OPINIÓN DE LA COORDINACIÓN DE OBRA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS:**

Ahora bien, el análisis también contempla la documentación que sustenta la solicitud de ampliación de plazo, a través de la Resolución de Gerencia General Regional N° 164-2025-G.R.P/GGR, emitida el 10 de MARZO de 2025, se autoriza la ejecución de la prestación adicional de obra N° 10 y deductivo vinculante N°05, para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL MODERNO TERMINAL INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE PASCO - PASCO" con CÓDIGO ÚNICO 2116853, por el cual, se realiza la cuantificación de los plazos establecidos, de esta manera, mediante CARTA N°070-2025-CTP, el Ing. Apolinario VILLANUEVA SEBASTIAN (Residente de Obra)

<sup>1</sup> Debe precisarse que el otorgamiento de una ampliación del plazo, además de incrementar el plazo de ejecución de obra, genera, como efecto económico, el pago de los mayores gastos generales que se derivan de dicha ampliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 171° del Reglamento.

menciona en la solicitud de ampliación de plazo AP-04 (Plazo necesario para ejecutar las partidas del drenaje interno es importante precisar que la notificación para la ejecución de las partidas de drenaje Interno fue realizada el (11/03/2025) sin embargo según la programación general se inician de forma simultánea las prestaciones adicionales de mejoramiento de Fundación y Drenaje Interno esto por el proceso constructivo), AP-06: Plazo necesario para la culminación de las partidas de Drenaje Interno por el Proceso Constructivo. Se ha establecido que, en relación con el Expediente Técnico Adicional N°10 y Deducivo Vinculante N°05, la ejecución de las partidas vinculadas al (Replanteo del Sistema de Drenaje a consecuencia del Cambio de Dirección del Flujo), la solicitud de ampliación de plazo N°019 presentada por el contratista, en la cual se requiere una extensión de cuarenta y siete días calendario (47 dc). Sin embargo, el realizar un análisis detallado del periodo solicitado, se ha identificado que dentro de los cuarenta y siete días calendario requeridos, estas partidas como limpieza final de obra son partidas que comprenden al contrato principal. En otras palabras, estos siete días corresponden a actividades previamente establecidas en el contrato y cuya ejecución no puede ser considerada como una justificación válida para la ampliación de plazo. Por lo tanto, dichos días deben ser descontados del total de la solicitud presentada, dado que su inclusión no responde a un retraso atribuible a factores imprevistos o externos que justifiquen su consideración dentro de la ampliación de plazo solicitada, **de esta manera se ha determinado que el tiempo realmente requerido para la culminación efectiva de las actividades debe ser reconocido por 40 días calendario**

➤ Sobre la Cuantificación se tiene la siguiente línea De Tiempo:

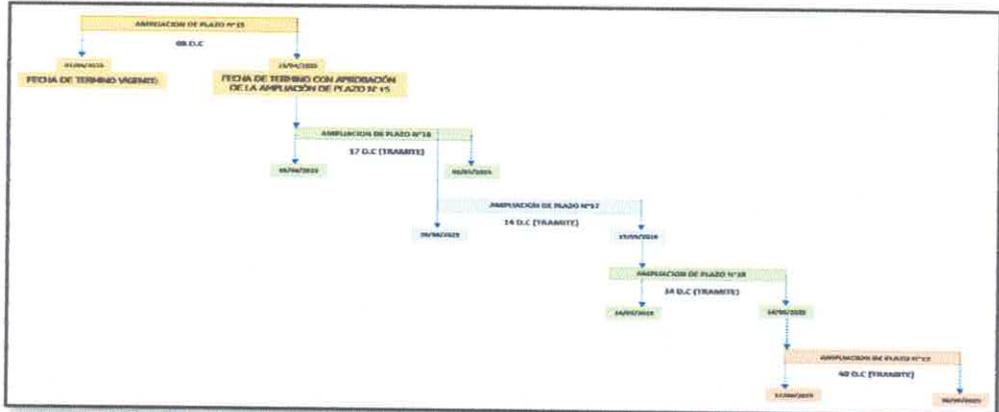

#### SOBRE LA RUTA CRITICA

Los trabajos correspondientes al ADICIONAL DE OBRA N°10 y DEDUCTIVO VINCULANTE N°05 requiere una ampliación de plazo del 17/06/2025 al 26/07/2025 del 2025.

(...).

Por lo descrito se tiene una ampliación de 40 días calendario para la culminación de partidas del adicional de Obra N° 10 y deductivo Vinculante N° 05 (REPLANTEO DEL SISTEMA DE DRENAJE A CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL FLUJO)

EL CONSORCIO TERMINAL PASCO, de acuerdo al R.L.C.E.: Artículo 170. Procedimiento de ampliación de plazo, cumple:

- ✓ Inicio de la causal : 10 de marzo de 2025
- ✓ Fin de la Causal : 10 de marzo de 2025
- ✓ Plazo Contratista para presentar la solicitud: (15 días) : 25 de marzo de 2025
- ✓ Contratista presentó la solicitud de ampliación de plazo : 12 de marzo de 2025
- ✓ Plazo del Supervisor para elevar su informe : 19 de marzo de 2025
- ✓ Fecha de entrega del informe del Supervisor : 17 de marzo de 2025
- ✓ Plazo de la Entidad para Emitir su Pronunciamiento : 31 de marzo de 2025

4.6 El contratista y el supervisor de la obra han cumplido con el procedimiento indicado en el artículo 170 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo al siguiente análisis:

- Se considera conforme la CAUSAL de ampliación de plazo según lo establecido en el art. 169 del RLCE (2) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado, a consecuencia de la aprobación del Expediente Técnico del Adicional de Obra N°10 y Deducivo Vinculante N°05.
- Se cuenta con la anotación en el cuaderno de obra del inicio de causal y cierre de causal cumpliendo con lo exigido en el Art. 170 RLCE.
- Habiendo evaluado, revisado y analizado los argumentos sustentados por el contratista y aprobados por el supervisor de la solicitud de ampliación de plazo N°19 a consecuencia del Adicional de Obra N°10 y Deducivo Vinculante N°05, está Administración de Contrato OTORGA OPINIÓN FAVORABLE PARA LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°19 por un total de 40 días calendario, trasladando la fecha de término contractual de obra al día 26 de julio del 2025. Sin reconocimiento de pago de mayores gastos generales ya que es por la aprobación de un Adicional de obra N°10 y Deducivo Vinculante N°05, como establece el RLCE en el artículo 171. Efectos de la modificación del plazo contractual menciona (...)171.1. Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y los gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones. Los costos directos deben encontrarse debidamente acreditados y formar parte de aquellos conceptos que integren la estructura de costos de la oferta económica del contratista o del valor referencial, según el caso. Los gastos generales variables se determinan en función al número de días correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en los casos de prestaciones adicionales de obra (...). El énfasis es agregado.

Trasladando la Fecha de Término de Obra, de acuerdo a:

FECHA DE TERMINO VIGENTE	15/04/2025
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 16	(17 D.C) (EN TRAMITE)
FECHA DE TERMINO CON APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°16 (17 D.C)	02/05/2025
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 17	(14 D.C) (EN TRAMITE)
FECHA DE TERMINO CON APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°17 (14 D.C)	13/05/2025
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 18	(34 D.C) (EN TRAMITE)
FECHA DE TERMINO CON APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°18 (34 D.C)	16/06/2025
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 19	(40 D.C) (EN TRAMITE)
FECHA DE TERMINO CON APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°19 (40 D.C)	26/07/2025

#### V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

5.1 Del análisis realizado en el presente informe, el ejecutor CONSORCIO TERMINAL PASCO solicita la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°19 con la CAUSAL enmarcado el Artículo 169. Causales de ampliación de plazo inciso 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. (Expediente Técnico del Adicional de Obra N°10 y Deducivo Vinculante N°05).

5.2 Por lo tanto y por los argumentos expuestos en el presente informe, está coordinación OTORGA OPINIÓN FAVORABLE PARA LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 19 por Cuarenta (40) DÍAS CALENDARIOS, de los 47 días calendario solicitados por el CONSORCIO TERMINAL PASCO, trasladando la fecha de término contractual de obra al día 26 de julio del 2025. Sin reconocimiento de pago de mayores gastos generales ya que es por la aprobación de un Adicional de obra N° 10 y Deducivo Vinculante N°05, como establece el RLCE en el artículo 171. Efectos de la modificación del plazo contractual menciona (...)171.1. Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y los gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones. Los costos directos deben encontrarse debidamente acreditados y formar parte de aquellos conceptos que integren la estructura de costos de la oferta económica del contratista o del valor referencial, según el caso. Los gastos generales variables se determinan en función al número de días

correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto general variable diario, **salvo en los casos de prestaciones adicionales de obra** (...). El énfasis es agregado. (...).

Trasladando la Fecha de Término de Obra, de acuerdo a:

FECHA DE TERMINO VIGENTE	15/04/2025
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 16	(17 D.C) (EN TRAMITE)
FECHA DE TERMINO CON APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°16 (17 D.C)	02/05/2025
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 17	(14 D.C) (EN TRAMITE)
FECHA DE TERMINO CON APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°17 (14 D.C)	13/05/2025
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 18	(34 D.C) (EN TRAMITE)
FECHA DE TERMINO CON APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°18 (34 D.C)	16/06/2025
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 19	(40 D.C) (EN TRAMITE)
FECHA DE TERMINO CON APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°19 (40 D.C)	26/07/2025

5.3 (...).

Que, ante ello, con Informe N° 1603-2025-GRP-GGR-GRI/SGSO, de fecha 18 de marzo de 2025, el Ing. Leonel BENITES DIEGO – Sub Gerente de Supervisión de obra, **otorga opinión técnica favorable** a la ampliación de plazo N° 19, por el periodo de cuarenta (40) días calendario de los cuarenta y siete (47) días calendario solicitados por el CONSORCIO TERMINAL PASCO, para la ejecución del Expediente Adicional de Obra N° 10 y Deductivo Vinculante N° 05, (Replanteo del sistema de drenaje a consecuencia del cambio de dirección del flujo);

Que, por lo tanto, con Informe N° 0415-2025-G.R.PASCO-GGR/GRI, de fecha 18 de marzo de 2025, el Arq. Fredy Roland TOLENTINO HUARANGA – Gerente Regional de Infraestructura, en señal de conformidad solicita su aprobación mediante acto resolutorio la ampliación de plazo N° 19, correspondiente a la obra: "Construcción del Moderno Terminal Terrestre Interprovincial de la Ciudad de Cerro de Pasco, provincia de Pasco – Pasco", con CUI 2116853, por cuarenta (40) días calendario de los cuarenta y siete (47) días calendario solicitado por el CONSORCIO TERMINAL PASCO;

Que, en ese sentido, teniendo en cuenta la normativa de contrataciones que señala el procedimiento que debe seguirse para que la solicitud de ampliación de plazo resulte procedente en estricta observancia de la causal correspondiente; se advierte que, la solicitud de ampliación de plazo N° 19 petitionado por el CONSORCIO TERMINAL PASCO, ejecutor de la obra: "Construcción del Moderno Terminal Terrestre Interprovincial de la Ciudad de Cerro de Pasco, provincia de Pasco – Pasco", con CUI 2116853, se encuentra amparada por la causal establecida en el numeral 2) del artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, esto es "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra", Expediente Adicional de Obra N° 10 y Deductivo Vinculante N° 05, (Replanteo del sistema de drenaje a consecuencia del cambio de dirección del flujo), aprobado con Resolución de Gerencia General Regional N° 164-2025-G.R.PASCO/GGR, de fecha 10 de marzo de 2025, notificado con Carta Múltiple N° 00162-2025-GRP-GGR-GRI/SGSO, de fecha 10 de marzo de 2025, emitido por el Ing. Leonel BENITES DIEGO – Sub Gerente de Supervisión de Obras, siendo ello, el inicio y fin de la causal de la ampliación de plazo, el mismo que se encuentra anotado en el Asiento N° 797 del Cuaderno de Obra, de fecha 10 de marzo de 2025, emitido por el Ing. Apolinario VILLANUEVA SEBASTIÁN - Residente de Obra; en ese sentido, dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor, con Carta N° 070-2025-CTP, de fecha 12 de marzo de 2025, emitido por la Sra. Marilú Angelita RAMÍREZ ZAMUDIO, representante común del CONSORCIO TERMINAL PASCO, por el periodo de cuarenta y siete (47) días calendario, a consecuencia de la aprobación del Expediente Técnico Adicional N° 10; es así que, el supervisor emite el informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud, con Carta N° 058-2025-CONSORCIOSUPERVISORTUPAC/JCVP-R, de fecha 17 de marzo de 2025, emitido por el Sr. Joselito Cartos VALERIO PRESENTACIÓN, representante común del CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC, adjuntado el Informe N° 42-2025-JEFE SUPERVISIÓN EMC/RJSO, de fecha 14 de marzo de 2025, emitido por el Ing. Erick Miguel CHÁVEZ RÍOS - Jefe de Supervisión de Obra, quien **aprueba** la solicitud de ampliación de plazo N° 19, por cuarenta (40) días calendario; puesto que se ha identificado siete días de traslape con partidas contractuales ya establecidas en el cronograma original; por ende, al encontrarse incluidas en el contrato principal, no pueden ser consideradas como justificantes válidos para la ampliación de plazo; en ese sentido, con Informe N° 057-2025-G.R.PASCO-GRI-SGSO-ACO/MJM-CUI:2116853, de fecha 18 de marzo de 2025, el Ing. Gregorio Mauro JAUNI MEZA - Administrador de Contrato de obra, **otorga opinión técnica favorable** para la ampliación de plazo N° 19, por un total de cuarenta (40) días calendario de los cuarenta y siete (47) días calendario, de esta manera, con Informe N° 1603-2025-GRP-GGR-GRI/SGSO, de fecha 18 de marzo de 2025, el Ing. Leonel BENITES DIEGO – Sub Gerente de Supervisión de obra, **otorga opinión técnica favorable** a la ampliación de plazo N° 19, por el periodo de cuarenta (40) días calendario de los cuarenta y siete (47) días calendario; por lo tanto, con Informe N° 0415-2025-G.R.PASCO-GGR/GRI, de fecha 18 de marzo de 2025, el Arq. Fredy Roland TOLENTINO HUARANGA – Gerente Regional de Infraestructura, en señal de conformidad solicita su aprobación mediante acto resolutorio la ampliación de plazo N° 19, por cuarenta (40) días calendario de los cuarenta y siete (47) días calendario; cumpliendo así, con el procedimiento establecido en la normativa de contrataciones del Estado, y que dicha ampliación se encuentra dentro de las causales establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado; el mismo que no generará mayores gastos generales al contratista, puesto que se encuentran considerados en el presupuesto de la prestación adicional, los mismo que fueron revisados y ameritaron un pronunciamiento del Supervisor de Obra, Sub Gerente de Supervisión de Obra, Administrador de Contratos de Obra, y demás órganos técnicos competentes; por consiguiente, son de su absoluta responsabilidad de dichos profesionales, dado que dicha área técnica es exclusivamente responsable de la información remitida y del contenido de la misma; por ende, con Informe Legal N° 432-2025-G.R.P-GGR/DRAJ, de fecha 19 de marzo de 2025, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, recomienda aprobar la ampliación de plazo N° 19, por un periodo de cuarenta (40) días calendario de los cuarenta y siete (47) días calendario, por la causal establecido en el numeral 2) del artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, esto es "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra"; de esta manera, con Memorando N° 0692-2025-G.R.PASCO-GOB/GGR, de fecha 19 de marzo de 2025, el Gerente General Regional dispone emitir el presente acto resolutorio;



Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0049-2023-G.R.P./GOB de fecha 04 de enero del 2023, el ejecutivo DELEGA al Gerente General Regional, la facultad de **aprobar o denegar las ampliaciones del plazo contractual**, establecidas en su literal e) del numeral 1); siendo ello así, conforme a esa facultad delegada por el Gobernador Regional, es atribución de la Gerencia Regional la emisión del presente acto resolutivo;

Que, por lo expuesto, y en uso de las facultades y atribuciones otorgadas mediante la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N° 27902 y en uso de las atribuciones conferidas mediante delegación, y de acuerdo de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley 30225 y su Reglamento.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 19**, por un periodo de **cuarenta (40) días calendario**, de los cuarenta y siete (47) días calendario, petitionado por el **CONSORCIO TERMINAL PASCO**, correspondiente a la **Ejecución de la Obra: "Construcción del Moderno Terminal Terrestre Interprovincial de la Ciudad de Cerro de Pasco, provincia de Pasco - Pasco"**, con **CUI 2116853**, por la causal establecida en el numeral 2) del artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, esto es "*Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra*", Expediente Adicional de Obra N° 10 y Deductivo Vinculante N° 05, (Replanteo del sistema de drenaje a consecuencia del cambio de dirección del flujo), aprobado con Resolución de Gerencia General Regional N° 164-2025-G.R.PASCO./GGR, de fecha 10 de marzo de 2025, de conformidad a los informes técnicos emitidos por el Supervisor de Obra, Sub Gerente de Supervisión de Obras, Administrador de Contratos, y por las consideraciones expuestas en la presente Resolución.


**ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR**, que el área encargado de la supervisión de la ejecución de la obra conjuntamente con el Supervisor de Obra, son responsables de la cuantificación y sustentación de la ampliación de plazo N° 19.

**ARTÍCULO TERCERO.- DE CONFORMIDAD AL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD**, debe advertirse en caso de negligencia u otro análogo, será de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, del Gerente Regional de Infraestructura, Sub Gerente de Supervisión de Obra, Supervisor de Obra, Administrador de Contrato de Obra, y todos los que elaboraron y evaluaron técnicamente la ampliación de plazo N° 19, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

**ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR**, el presente acto administrativo al contratista ejecutor de obra **CONSORCIO TERMINAL PASCO**, en el domicilio señalado en su contrato y al **SUPERVISOR DE OBRA**, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO QUINTO.- TRANSCRIBIR**, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión de Obra y a los órganos estructurados correspondientes, para su cumplimiento; bajo responsabilidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE  
GOBIERNO REGIONAL PASCO



Mg. Yanet Soledad ZUELLAR CHAVEZ  
GERENTE GENERAL REGIONAL

