

**CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACIONES**

OBRA

"CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO"

ENTIDAD

PLAN COPESCO NACIONAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

CONTRATISTA

CONSORCIO SANTA MARIA

SUPERVISIÓN

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

MONTO CONTRATADO

18,662,068.28

MONTO CONTRATADO SIN IGV

15,744,273.40 (s/I.G.V.)

| DESCRIPCION                              | Monto del contrato<br>s/I.G.V. | VALORIZACION        |                   | ACUMULADO           |               | SALDO                |               |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                          |                                | ANTERIOR            | ACTUAL            | MONTO               | %             | MONTO                | %             |
| <b>VALORIZACIÓN CONTRACTUAL</b>          |                                |                     |                   |                     |               |                      |               |
| UNICA                                    | 15,744,273.40                  | 5,209,010.67        | 444,402.49        | 5,653,413.16        | 35.91%        | 10,090,860.24        | 64.09%        |
| <b>TOTAL CONTRACTUAL</b>                 | <b>15,744,273.40</b>           | <b>5,209,010.67</b> | <b>444,402.49</b> | <b>5,653,413.16</b> | <b>35.91%</b> | <b>10,090,860.24</b> | <b>64.09%</b> |
| AVANCE DE LA OBRA A LA FECHA %           |                                | 33.09%              | 2.82%             |                     | 35.91%        |                      | 64.09%        |
| AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADO ACUMULADO % |                                | 38.94%              | 19.04%            |                     | 57.98%        |                      |               |
| <b>REAJUSTES</b>                         |                                |                     |                   |                     |               |                      |               |
| Presupuesto Principal                    |                                | 84,122.08           | 28,643.96         | 112,766.04          |               |                      |               |
| <b>Total Reajustes</b>                   |                                | <b>84,122.08</b>    | <b>28,643.96</b>  | <b>112,766.04</b>   |               |                      |               |
| <b>DEDUCCIÓN DE REAJUSTES</b>            |                                |                     |                   |                     |               |                      |               |
| Por Adelanto Directo                     |                                | 976.04              | 103.40            |                     |               |                      |               |
| Por Adelanto para Materiales             |                                | 8,703.52            | 53.99             |                     |               |                      |               |
| <b>Total Deducción de Reajustes</b>      |                                | <b>9,679.56</b>     | <b>157.39</b>     | <b>9,836.95</b>     |               |                      |               |
| <b>VALORIZACIÓN BRUTA</b>                |                                |                     |                   |                     |               |                      |               |
| Presupuesto Principal                    |                                | 5,283,453.19        | 472,889.06        |                     |               |                      |               |
| <b>Total Valorización Bruta</b>          |                                | <b>5,283,453.19</b> | <b>472,889.06</b> |                     |               |                      |               |
| <b>AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS</b>         |                                |                     |                   |                     |               |                      |               |
| Del Adelanto Directo                     | 1,581,530.36                   | 500,995.14          | 44,440.25         | 545,435.39          |               | 1,036,094.97         |               |
| Del Adelanto para Materiales             | 3,163,060.73                   | 978,033.70          | 13,526.04         | 991,559.74          |               | 2,171,500.99         |               |
| <b>Total Amortización de Adelantos</b>   |                                | <b>1,479,028.84</b> | <b>57,966.29</b>  | <b>1,536,995.13</b> |               |                      |               |
| <b>VALORIZACIÓN NETA</b>                 |                                |                     |                   |                     |               |                      |               |
| Presupuesto Principal                    |                                | 3,804,424.35        | 414,922.77        | 4,219,347.12        |               |                      |               |
| <b>Total Valorización Neta</b>           |                                | <b>3,804,424.35</b> | <b>414,922.77</b> | <b>4,219,347.12</b> |               |                      |               |
| <b>MONTO NETO A FACTURAR</b>             |                                |                     |                   |                     |               |                      |               |
| En Efectivo                              |                                | 3,804,424.35        | 414,922.77        | 4,219,347.12        |               |                      |               |
| I.G.V. 18%                               |                                | 684,796.38          | 74,686.10         | 759,482.48          |               |                      |               |
| <b>TOTAL</b>                             |                                | <b>4,489,220.73</b> | <b>489,608.87</b> | <b>4,978,829.60</b> |               |                      |               |
| RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO           |                                | 614,663.26          | 52,439.49         |                     |               |                      |               |
| OTRAS PENALIDADES                        |                                | 42,200.00           | 2,675.00          |                     |               |                      |               |
| <b>MONTO A CANCELAR</b>                  |                                | <b>3,832,357.47</b> | <b>434,494.37</b> |                     |               |                      |               |

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.  
RUC: 20602263526

Cleider A. Rinzaycuna Morales  
TITULAR - GERENTE

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Ing. Osven Sigfredo Barlanga Carazas  
JEFE DE SUPERVISIÓN  
CIP N° 196605

RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N°13

| RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 013     |                                                                                                                                                                                         |     |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| (01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025)       |                                                                                                                                                                                         |     |            |
| OBRA                               | : "CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO" |     |            |
| ENTIDAD                            | : PLAN COPESCO NACIONAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO                                                                                                                   |     |            |
| CONTRATISTA                        | : CONSORCIO SANTA MARIA                                                                                                                                                                 |     |            |
| SUPERVISIÓN                        | : SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.                                                                                                                                              |     |            |
| MONTO CONTRATADO                   | : 18662058.28 (Inc. IGV)                                                                                                                                                                |     |            |
| 1.- VALORIZACIÓN DEL PERIODO       |                                                                                                                                                                                         |     |            |
| Presupuesto Principal              |                                                                                                                                                                                         |     | 410,127.28 |
| Total Valorización del Periodo     |                                                                                                                                                                                         | S/. | 410,127.28 |
| 2.- REAJUSTES                      |                                                                                                                                                                                         |     |            |
| Presupuesto Principal              |                                                                                                                                                                                         |     | 20,180.25  |
| Total Reajustes                    |                                                                                                                                                                                         | S/. | 20,180.25  |
| 3.- DEDUCCIÓN DE REAJUSTES         |                                                                                                                                                                                         |     |            |
| Por Adelanto Directo               |                                                                                                                                                                                         |     | -142.45    |
| Por Adelanto para Materiales       |                                                                                                                                                                                         |     | -67.56     |
| Total Deducción de Reajustes       |                                                                                                                                                                                         | S/. | -210.01    |
| 4.- VALORIZACIÓN BRUTA (1 + 2 - 3) |                                                                                                                                                                                         |     |            |
| Presupuesto Principal              |                                                                                                                                                                                         |     | 430,517.54 |
| Total Valorización Bruta           |                                                                                                                                                                                         | S/. | 430,517.54 |
| 5.- AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS      |                                                                                                                                                                                         |     |            |
| Del Adelanto Directo               |                                                                                                                                                                                         |     | 41,012.73  |
| Del Adelanto para Materiales       |                                                                                                                                                                                         |     | 23,083.98  |
| Total Amortización de Adelantos    |                                                                                                                                                                                         | S/. | 64,096.71  |
| 6.- VALORIZACIÓN NETA (4 - 5)      |                                                                                                                                                                                         |     |            |
| Presupuesto Principal              |                                                                                                                                                                                         |     | 366,420.83 |
| Total Valorización Neta            |                                                                                                                                                                                         | S/. | 366,420.83 |
| 7.- RESUMEN                        |                                                                                                                                                                                         |     |            |
| En Efectivo (A)                    |                                                                                                                                                                                         | S/. | 366,420.83 |
| I.G.V. 18% (B)                     |                                                                                                                                                                                         | S/. | 65,955.75  |
| TOTAL (A) + (B)                    |                                                                                                                                                                                         | S/. | 432,376.58 |
| RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO     |                                                                                                                                                                                         | S/. | 48,395.02  |
| PENALIDADES                        |                                                                                                                                                                                         | S/. | 0.00       |
| MONTO A CANCELAR                   |                                                                                                                                                                                         | S/. | 383,981.56 |

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.  
RUC: 20602263526

Glendier A. Nimaycuna Morales  
TITULAR - GERENTE

CAL POLONIA NRO. 0286 URB. LAS BRISAS LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO.

RUC: 20602263526 Telefono: (041) 261540 Celular: 964564490 www.singenor.com

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.  
Ing. Edwin Benavente Carazas  
JEFE DE SUPERVISIÓN  
CIN N° 196695



2.2.1. Resumen de la valorización N°14

| RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 014         |                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| (01 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2025)        |                                                                                                                                                                                         |            |                   |
| <b>OBRA</b>                            | : "CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO" |            |                   |
| <b>ENTIDAD</b>                         | : PLAN COPESCO NACIONAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO                                                                                                                   |            |                   |
| <b>CONTRATISTA</b>                     | : CONSORCIO SANTA MARIA                                                                                                                                                                 |            |                   |
| <b>SUPERVISIÓN</b>                     | : SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.                                                                                                                                              |            |                   |
| <b>MONTO CONTRATADO</b>                | : 18662058.28 (Inc. IGV)                                                                                                                                                                |            |                   |
| <b>1.- VALORIZACIÓN DEL PERIODO</b>    |                                                                                                                                                                                         |            |                   |
| Presupuesto Principal                  |                                                                                                                                                                                         |            | 852,625.74        |
| <b>Total Valorización del Periodo</b>  |                                                                                                                                                                                         | <b>S/.</b> | <b>852,625.74</b> |
| <b>2.- REAJUSTES</b>                   |                                                                                                                                                                                         |            |                   |
| Presupuesto Principal                  |                                                                                                                                                                                         |            | 13,478.57         |
| <b>Total Reajustes</b>                 |                                                                                                                                                                                         | <b>S/.</b> | <b>13,478.57</b>  |
| <b>3.- DEDUCCIÓN DE REAJUSTES</b>      |                                                                                                                                                                                         |            |                   |
| Por Adelanto Directo                   |                                                                                                                                                                                         |            | -569.09           |
| Por Adelanto para Materiales           |                                                                                                                                                                                         |            | 1,261.66          |
| <b>Total Dedución de Reajustes</b>     |                                                                                                                                                                                         | <b>S/.</b> | <b>692.57</b>     |
| <b>4.- VALORIZACIÓN BRUTA</b>          | <b>( 1 + 2 - 3 )</b>                                                                                                                                                                    |            |                   |
| Presupuesto Principal                  |                                                                                                                                                                                         |            | 865,411.74        |
| <b>Total Valorización Bruta</b>        |                                                                                                                                                                                         | <b>S/.</b> | <b>865,411.74</b> |
| <b>5.- AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS</b>   |                                                                                                                                                                                         |            |                   |
| Del Adelanto Directo                   |                                                                                                                                                                                         |            | 85,262.57         |
| Del Adelanto para Materiales           |                                                                                                                                                                                         |            | 47,767.13         |
| <b>Total Amortización de Adelantos</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>S/.</b> | <b>133,029.70</b> |
| <b>6.- VALORIZACIÓN NETA</b>           | <b>( 4 - 5 )</b>                                                                                                                                                                        |            |                   |
| Presupuesto Principal                  |                                                                                                                                                                                         |            | 732,382.04        |
| <b>Total Valorización Neta</b>         |                                                                                                                                                                                         | <b>S/.</b> | <b>732,382.04</b> |
| <b>7.- RESUMEN</b>                     |                                                                                                                                                                                         |            |                   |
| En Efectivo                            | <b>( A )</b>                                                                                                                                                                            | <b>S/.</b> | <b>732,382.04</b> |
| I.G.V. 18%                             | <b>( B )</b>                                                                                                                                                                            | <b>S/.</b> | <b>131,828.77</b> |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>( A ) + ( B )</b>                                                                                                                                                                    | <b>S/.</b> | <b>864,210.81</b> |
| <b>RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO</b>  |                                                                                                                                                                                         | <b>S/.</b> | <b>100,609.84</b> |
| <b>PENALIDADES</b>                     |                                                                                                                                                                                         | <b>S/.</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>MONTO A CANCELAR</b>                |                                                                                                                                                                                         | <b>S/.</b> | <b>763,600.97</b> |

descontado o dejado de valorizar 2 repisas y 2 vigas en cada stand, que acumulan un monto total de S/ 15,256.00 soles. Para tal motivo se adjunta calculo según propuesta de sus costos unitarios del contratista:

## 6. RESUMEN DE VALORIZACION

| RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR POR CONCEPTO DE VALORIZACION MENSUAL N° 011 - DEL 01 AL 17 DE JULIO DE 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                           |           |              |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
| OBRA                                                                                                   | REMODELACION DE MALECON TURISTICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA USO TURISTICO; ADQUISICION DE SENALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACIÓN; EN EL(LA) MALECON DEL RELOJ PÚBLICO - PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL BORTOLLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI N° 2637426" |                            |                                                           |           |              |               |            |
| ENTIDAD CONTRATANTE                                                                                    | PLAN COPESCO NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                           |           |              |               |            |
| CONTRATISTA                                                                                            | CONSORCIO PLAZA 242                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                           |           |              |               |            |
| PLAZO CONTRACTUAL                                                                                      | OCHENTA (80) DIAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                           |           |              |               |            |
| RESIDENTE                                                                                              | ING. MARLON EDUARDO MORALES QUEZADA - CIP : 111904                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                           |           |              |               |            |
| SUPERVISOR                                                                                             | ARQ. JUAN CARLOS VILLACORTA RAMIREZ - CAP 5441                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                           |           |              |               |            |
| FECHA DE INICIO CONTR                                                                                  | 04 DE SETIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                           |           |              |               |            |
| MONTO CONTRACTUAL                                                                                      | S/ 1,990,702.97                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | SIN IGV                                                   |           |              |               |            |
| DESCRIPCION                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MONTO ADJUDICADO (SIN IGV) | VALORIZACIONES                                            |           |              | % AVANCE ACUM | SALDO      |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | ANTERIOR                                                  | ACTUAL    | ACUMULADO    |               |            |
| A VALORIZACION                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                           |           |              |               |            |
|                                                                                                        | REMODELACION DE MALECON TURISTICO                                                                                                                                                                                                                                               | 1,990,702.97               | 1,619,337.15                                              | 80,384.31 | 1,699,721.46 | 85.383%       | 290,981.51 |
|                                                                                                        | TOTAL (A)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,990,702.97               | 1,619,337.15                                              | 80,384.31 | 1,699,721.46 |               | 290,981.51 |
|                                                                                                        | AVANCE EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 81.345%                                                   | 4.038%    | 85.383%      |               | 14.617%    |
|                                                                                                        | AVANCE PROGRAMADO VIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 100.000%                                                  | 0.000%    | 100.000%     |               | 0.000%     |
| B REAJUSTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                           |           |              |               |            |
|                                                                                                        | ESTRUCTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00         |               |            |
|                                                                                                        | REMODELACIÓN DE LA ALAMEDA                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00         |               |            |
|                                                                                                        | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00         |               |            |
|                                                                                                        | INSTALACIONES HIDRAULICAS                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00         |               |            |
|                                                                                                        | TOTAL (B)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00         |               | 0.00       |
| VB VALORIZACION BRUTA (VB) = (A) + (B)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 1,619,337.15                                              | 80,384.31 | 1,699,721.46 |               | 290,981.51 |
| C AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                           |           |              |               |            |
|                                                                                                        | AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00         |               |            |
|                                                                                                        | AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00         |               |            |
|                                                                                                        | AMORTIZACION DE RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00         |               | 0.00       |
|                                                                                                        | TOTAL (C)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00         |               | 0.00       |
| VN VALORIZACION NETA (VN) = (VB) - (C)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 1,619,337.15                                              | 80,384.31 | 1,699,721.46 |               | 290,981.51 |
| MF MONTO POR FACTURAR POR EL CONTRATISTAS                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                           |           |              |               |            |
|                                                                                                        | EN EFECTIVO (VN) + (E) + (F)                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,990,702.97               | 1,619,337.15                                              | 80,384.31 | 1,699,721.46 |               | 290,981.51 |
|                                                                                                        | EN IGV (0.0% LEY N°27037)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                       | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00         |               | 0.00       |
|                                                                                                        | TOTAL (MF)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,990,702.97               | 1,619,337.15                                              | 80,384.31 | 1,699,721.46 |               | 290,981.51 |
| P PENALIDADES INC. IGV                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                           |           |              |               |            |
|                                                                                                        | MULTA POR ATRASO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00         |               |            |
|                                                                                                        | TOTAL (P)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00         |               |            |
| MP MONTO POR PAGAR AL CONTRATISTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                           |           |              |               |            |
|                                                                                                        | TOTAL (MP) = (MF) - (P)                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,990,702.97               | 1,619,337.15                                              | 80,384.31 | 1,699,721.46 |               |            |
| S SENCICO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                           |           |              |               |            |
|                                                                                                        | PAGO POR SENCICO (0.20%)                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                           | 160.77    |              |               |            |
|                                                                                                        | TOTAL (S)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                           | 160.77    |              |               |            |
| TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S/80,384.31                | OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 31/100 SOLES |           |              |               |            |



## 10. RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN

A continuación, presentamos el resumen de la valorización:

### RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA No. 11

OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL MALECÓN GRAU, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD.


PROPIETARIO : PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN : Pacasmayo- Pacasmayo - La Libertad

RESIDENTE : ING. LUIS LYONEL ARROYO SALDAÑA \_ CIP 63376

SUPERVISOR : ING. JOSE LUIS APARCANA PISCONTE \_ CIP 177592

FECHA : JULIO 2025

|                    |                                                                                         |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Valorización mes   | V = KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.                                            | 705,826.01 |
| Reintegros y otros | R =  | 18,037.70  |
| Deducción          | D = ING. JOSE LUIS APARCANA PISCONTE<br>SUPERVISOR DE OBRA<br>C.I.P. N° 177592          | -339.84    |

VALORIZACIÓN BRUTA VB = V+R-D = 724,203.55

Amortización A = 153,018.65

VALORIZACIÓN NETA VN = VB - A = 571,184.90

EFFECTIVO E = VN = 571,184.90

I.G.V. 18% x VN = 102,813.28

#### Monto a Cancelar al Contratista

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| EFFECTIVO | E = VN =   | 571,184.90 |
| I.G.V.    | 18% x VN = | 102,813.28 |

Monto a Facturar = S/. 673,998.18

Retención de Fiel Cumplimiento (11 de 14) = S/. 144,240.68

Calendario de Compromisos a Solicitar = S/. 529,757.50

#### NOTA :

- Formato según Resolución 01-95-EF / 76.01 ( E-4 )
- Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en Las Bases o en el contrato, por el inspector o supervisor y el contratista.

## 10. RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN

A continuación, presentamos el resumen de la valorización:

### RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA No. 12

|                                                  |                      |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA                                             | :                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL MALECÓN GRAU, DISTRITO DE PACAS MAYO, PROVINCIA DE PACAS MAYO, REGIÓN LA LIBERTAD. |
| PROPIETARIO                                      | :                    | PLAN COPESCO NACIONAL                                                                                                                          |
| UBICACIÓN                                        | :                    | Pacasmayo- Pacasmayo - La Libertad                                                                                                             |
| RESIDENTE                                        | :                    | ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS _ CIP 65645                                                                                                      |
| SUPERVISOR                                       | :                    | ING. JOSE LUIS APARCANA PISCONTE _ CIP 177592                                                                                                  |
| FECHA                                            | :                    | AGOSTO 2025                                                                                                                                    |
| Valorización mes                                 | V =                  | 508,540.57                                                                                                                                     |
| Reintegros y otros                               | R =                  | 21,193.84                                                                                                                                      |
| Deducción                                        | D =                  | 2,816.50                                                                                                                                       |
| <b>VALORIZACIÓN BRUTA</b>                        | <b>VB = V+R-D =</b>  | <b>526,917.91</b>                                                                                                                              |
| Amortización                                     | A =                  | 142,637.34                                                                                                                                     |
| <b>VALORIZACIÓN NETA</b>                         | <b>VN = VB - A =</b> | <b>384,280.57</b>                                                                                                                              |
| <b>EFFECTIVO</b>                                 | <b>E = VN =</b>      | <b>384,280.57</b>                                                                                                                              |
| <b>I.G.V.</b>                                    | <b>18% x VN =</b>    | <b>69,170.50</b>                                                                                                                               |
| <b>Monto a Cancelar al Contratista</b>           |                      |                                                                                                                                                |
| EFFECTIVO                                        | E = VN =             | 384,280.57                                                                                                                                     |
| I.G.V.                                           | 18% x VN =           | 69,170.50                                                                                                                                      |
| <b>Monto a Facturar</b>                          | <b>=</b>             | <b>S/. 453,451.07</b>                                                                                                                          |
| <b>Retención de Fiel Cumplimiento (12 de 14)</b> | <b>=</b>             | <b>S/. 144,240.68</b>                                                                                                                          |
| <b>Calendario de Compromisos a Solicitar</b>     | <b>=</b>             | <b>S/. 309,210.39</b>                                                                                                                          |

#### NOTA :

- Formato según Resolución 01-95-EF / 76.01 ( E-4 )
- Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en Las Bases o en el contrato, por el inspector o supervisor y el contratista.

KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.  
  
**ING. JOSE LUIS APARCANA PISCONTE**  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 CIP 177592



## 10. RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN

A continuación, presentamos el resumen de la valorización:

### RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA No. 13

OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL MALECÓN GRAU, DISTRITO DE PACAS MAYO, PROVINCIA DE PACAS MAYO, REGIÓN LA LIBERTAD.

PROPIETARIO : PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN : Pacasmayo- Pacasmayo - La Libertad

RESIDENTE : ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS \_ CIP 65645

SUPERVISOR : ING. JOSE LUIS APARCANA PISCONTE \_ CIP 177592

FECHA : SETIEMBRE 2025

Valorización mes V = 649,855.41

Reintegros y otros R = 30,372.65

Deducción D = 4,487.31

VALORIZACIÓN BRUTA VB = V+R-D = 675,740.75

Amortización A = 230,807.64

VALORIZACIÓN NETA VN = VB - A = 444,933.11

EFFECTIVO E = VN = 444,933.11

I.G.V. 18% x VN = 80,087.96

#### Monto a Cancelar al Contratista

EFFECTIVO E = VN = 444,933.11

I.G.V. 18% x VN = 80,087.96

Monto a Facturar = S/. 525,021.07

Retención de Fiel Cumplimiento (13 de 14) = S/. 144,240.68

Calendario de Compromisos a Solicitar = S/. 380,780.39

#### NOTA :

- Formato según Resolución 01-95-EF / 76.01 ( E-4 )
- Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en Las Bases o en el contrato, por el inspector o supervisor y el contratista.

KAZUKI CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

ING. JOSE LUIS APARCANA PISCONTE  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 C.I.P. N° 177592



**RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 10**

| RESUMEN DE PAGO VALORIZACIÓN N°10 - JULIO 2025                             |                                                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| OBRA:                                                                      | OBRA: "CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" |                |              |                 |                                 |                           |
| CONTRATISTA:                                                               | CONSORCIO LIBERTAD                                                                                                         |                |              |                 |                                 |                           |
| RESIDENTE:                                                                 | ARQ. LAURA LUZ OLARTE ENCISO                                                                                               |                |              |                 |                                 |                           |
| SUPERVISOR:                                                                | ING. VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE                                                                                    |                |              |                 |                                 |                           |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV):                                         | S/. 14,215,753.97                                                                                                          |                |              |                 | #####                           |                           |
| PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin IGV):                                          | S/. 13,479,479.86                                                                                                          |                |              |                 |                                 |                           |
| VALORIZACIÓN DE OBRA N° 10 - JULIO 2025                                    |                                                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |
| DESCRIPCIÓN                                                                | MONTO CONTRATADO (S/.)                                                                                                     | VALORIZACION   |              |                 | % DE AVANCE ACUMULADO EJECUTADO | SALDO POR VALORIZAR (S/.) |
|                                                                            |                                                                                                                            | ANTERIOR (S/.) | ACTUAL (S/.) | ACUMULADA (S/.) |                                 |                           |
| OBRAS PROVISIONALES , TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD             | 1,388,035.23                                                                                                               | 799,782.37     | 107,587.93   | 907,370.30      | 65.37%                          | 480,664.93                |
| ESTRUCTURAS                                                                | 1,949,772.06                                                                                                               | 1,423,949.73   | 10,754.48    | 1,434,704.21    | 73.58%                          | 515,067.85                |
| ARQUITECTURA Y RESTAURACION                                                | 4,576,212.30                                                                                                               | 416,231.46     | 45,870.27    | 462,101.73      | 10.10%                          | 4,114,110.57              |
| INSTALACIONES SANITARIAS                                                   | 695,465.53                                                                                                                 | 124,578.41     | 816.01       | 125,394.42      | 18.03%                          | 570,071.11                |
| INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECHANICAS Y CORRIENTES DEBILES           | 2,670,570.54                                                                                                               | 62,906.28      | 13,186.16    | 76,092.44       | 2.85%                           | 2,594,478.10              |
| MANEJO AMBIENTAL                                                           | 32,757.28                                                                                                                  | 11,735.36      | 846.12       | 12,581.48       | 38.41%                          | 20,175.80                 |
| SEGURIDAD SEÑALÉTICAS Y EVACUACIÓN                                         | 14,481.06                                                                                                                  | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00%                           | 14,481.06                 |
| GASTOS GENERALES 15%                                                       | 1,699,094.10                                                                                                               | 425,877.53     | 26,859.15    | 452,736.68      |                                 |                           |
| UTILIDAD 4%                                                                | 453,091.76                                                                                                                 | 113,567.34     | 7,162.44     | 120,729.78      |                                 |                           |
| VALORIZACIÓN (V)                                                           | 13,479,479.86                                                                                                              | 3,378,628.47   | 213,082.56   | 3,591,711.03    | 26.65%                          | 9,887,768.83              |
| TOTAL CONTRACTUAL                                                          |                                                                                                                            | 25.06%         | 1.58%        | 26.65%          | 26.65%                          | 73.35%                    |
| Avances en porcentaje                                                      |                                                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |
| REAJUSTES (R)                                                              |                                                                                                                            | 34,996.19      | 3,203.31     | 38,199.50       |                                 |                           |
| DEDUCCIONES DE REINTEGROS (D)                                              |                                                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |
| POR ADELANTO EN EFECTIVO                                                   |                                                                                                                            | 386.20         | -58.47       | 327.73          |                                 |                           |
| POR ADELANTO PARA MATERIALES                                               |                                                                                                                            | -4,461.38      | -431.04      | -4,892.42       |                                 |                           |
| VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D)                                        |                                                                                                                            | 3,417,699.84   | 216,775.38   | 3,634,475.22    |                                 |                           |
| AMORTIZACIONES (A)                                                         |                                                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |
| AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO                                          | 1,347,947.99                                                                                                               | 337,862.87     | 21,308.26    | 359,171.13      |                                 | 988,776.86                |
| AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES                                  | 2,695,895.97                                                                                                               | 848,308.64     | 33,826.06    | 882,134.70      |                                 | 1,813,761.27              |
| TOTAL AMORTIZACIONES (A)                                                   | 4,043,843.96                                                                                                               | 1,186,171.51   | 55,134.32    | 1,241,305.83    |                                 |                           |
| VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A)                                            |                                                                                                                            | 2,231,528.33   | 161,641.06   | 2,393,169.39    |                                 |                           |
| MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA                                               |                                                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |
| EN EFECTIVO (VN)                                                           |                                                                                                                            | 2,231,528.33   | 161,641.06   | 2,393,169.39    |                                 |                           |
| MONTO POR I.G.V. (VN x 0,18)                                               |                                                                                                                            | 401,675.10     | 29,095.39    | 430,770.49      |                                 |                           |
| MONTO TOTAL CON I.G.V.                                                     |                                                                                                                            | 2,633,203.43   | 190,736.45   | 2,823,939.88    |                                 |                           |
| VALORIZACION NETA                                                          |                                                                                                                            | S/. 190,736.45 |              |                 |                                 |                           |
| RETENCIONES                                                                |                                                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |
| RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO -10%                           | 1,590,578.62                                                                                                               | 376,335.31     | 25,143.74    | 401,479.05      |                                 |                           |
| NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA                                             |                                                                                                                            | 165,592.71     |              |                 |                                 |                           |
| SON : CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 71/100 SOLES |                                                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |

CONSORCIO SUPERVISOR  
RIMAC CULTURAL  
Ing. Victor Alberto Portilla Bustamante  
JEFE DE SUPERVISIÓN  
CIP N°16J592

CONSORCIO SUPERVISOR RIMAC CULTURAL  
Leon Tapia Jhon Maycol  
REPRESENTANTE COMÚN  
DNI. 71000043

**RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 11**

| RESUMEN DE PAGO VALORIZACIÓN N°11 - AGOSTO 2025                  |                                                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| OBRA:                                                            | OBRA: "CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" |                |              |                 |                                 |                           |
| CONTRATISTA:                                                     | CONSORCIO LIBERTAD                                                                                                         |                |              |                 |                                 |                           |
| RESIDENTE:                                                       | ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |
| SUPERVISOR:                                                      | ING. VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE                                                                                    |                |              |                 |                                 |                           |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV):                               | S/. 14,215,753.97                                                                                                          |                |              |                 | #####                           |                           |
| PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin IGV):                                | S/. 13,479,479.86                                                                                                          |                |              |                 |                                 |                           |
| VALORIZACIÓN DE OBRA N° 11 - AGOSTO 2025                         |                                                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |
| DESCRIPCIÓN                                                      | MONTO CONTRATADO (S/.)                                                                                                     | VALORIZACIÓN   |              |                 | % DE AVANCE ACUMULADO EJECUTADO | SALDO POR VALORIZAR (S/.) |
|                                                                  |                                                                                                                            | ANTERIOR (S/.) | ACTUAL (S/.) | ACUMULADA (S/.) |                                 |                           |
| OBRAS PROVISIONALES , TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD   | 1,388,035.23                                                                                                               | 907,370.30     | 77,553.88    | 984,924.18      | 70.96%                          | 403,111.05                |
| ESTRUCTURAS                                                      | 1,949,772.06                                                                                                               | 1,434,704.21   | -12,819.15   | 1,421,885.06    | 72.93%                          | 527,887.00                |
| ARQUITECTURA Y RESTAURACION                                      | 4,576,212.30                                                                                                               | 462,101.73     | -49,525.01   | 412,576.72      | 9.02%                           | 4,163,635.58              |
| INSTALACIONES SANITARIAS                                         | 695,465.53                                                                                                                 | 125,394.42     | 0.00         | 125,394.42      | 18.03%                          | 570,071.11                |
| INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECHANICAS Y CORRIENTES DEBILES | 2,670,570.54                                                                                                               | 76,092.44      | 7,856.84     | 83,949.28       | 3.14%                           | 2,586,621.26              |
| MANEJO AMBIENTAL                                                 | 32,757.28                                                                                                                  | 12,581.48      | 886.38       | 13,467.86       | 41.11%                          | 19,289.42                 |
| SEGURIDAD SEÑALÉTICAS Y EVACUACIÓN                               | 14,481.06                                                                                                                  | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00%                           | 14,481.06                 |
| GASTOS GENERALES 15%                                             | 1,699,094.10                                                                                                               | 452,736.68     | 3,592.92     | 456,329.60      |                                 |                           |
| UTILIDAD 4%                                                      | 453,091.76                                                                                                                 | 120,729.77     | 958.11       | 121,687.88      |                                 |                           |
| VALORIZACIÓN (V)                                                 | 13,479,479.86                                                                                                              | 3,591,711.03   | 28,503.85    | 3,620,214.88    | 26.86%                          | 9,859,264.98              |
| TOTAL CONTRACTUAL                                                |                                                                                                                            | 26.65%         | 0.21%        | 26.86%          | 26.86%                          | 73.14%                    |
| Avances en porcentaje                                            |                                                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |
| REAJUSTES (R)                                                    |                                                                                                                            | 38,199.50      | -1,419.32    | 36,780.10       |                                 |                           |
| DEDUCCIONES DE REINTEGROS (D)                                    |                                                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |
| POR ADELANTO EN EFECTIVO                                         |                                                                                                                            | 327.73         | -106.21      | 221.52          |                                 |                           |
| POR ADELANTO PARA MATERIALES                                     |                                                                                                                            | -4,892.42      | 12.27        | -4,880.15       |                                 |                           |
| VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D)                              |                                                                                                                            | 3,634,475.22   | 27,178.47    | 3,661,653.69    |                                 |                           |
| AMORTIZACIONES (A)                                               |                                                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |
| AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO                                | 1,347,947.99                                                                                                               | 359,171.13     | 2,850.39     | 362,021.52      |                                 | 985,926.47                |
| AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES                        | 2,695,895.97                                                                                                               | 882,134.70     | 3,684.85     | 885,819.55      |                                 | 1,810,076.42              |
| TOTAL AMORTIZACIONES (A)                                         | 4,043,843.96                                                                                                               | 1,241,305.83   | 6,535.24     | 1,247,841.07    |                                 |                           |
| VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A)                                  |                                                                                                                            | 2,393,169.39   | 20,643.23    | 2,413,812.62    |                                 |                           |
| MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA EN EFECTIVO (VN)                    |                                                                                                                            | 2,393,169.39   | 20,643.23    | 2,413,812.62    |                                 |                           |
| MONTO POR I.G.V. (VN x 0.18)                                     |                                                                                                                            | 430,770.49     | 3,715.78     | 434,486.27      |                                 |                           |
| MONTO TOTAL CON I.G.V.                                           |                                                                                                                            | 2,823,939.88   | 24,359.01    | 2,848,298.89    |                                 |                           |
| VALORIZACION NETA                                                |                                                                                                                            | S/. 24,359.01  |              |                 |                                 |                           |
| RETENCIONES                                                      |                                                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |
| RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO -10%                 | 1,590,578.62                                                                                                               | 376,335.31     | 3,363.45     | 379,698.76      |                                 |                           |
| NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA                                   |                                                                                                                            | 20,995.56      |              |                 |                                 |                           |
| SON : VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 56/100 SOLES    |                                                                                                                            |                |              |                 |                                 |                           |

CONSORCIO SUPERVISOR  
RIMAC CULTURAL  
Ing. Victor Alberto Portilla Bustamante  
JEFE DE SUPERVISIÓN  
CIP N° 163592



**RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 12**

| RESUMEN DE PAGO VALORIZACIÓN N°12 - SETIEMBRE 2025               |                                                                                                                            |                |              |                 |                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| OBRA:                                                            | OBRA: "CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" |                |              |                 |                                       |                              |
| CONTRATISTA:                                                     | CONSORCIO LIBERTAD                                                                                                         |                |              |                 |                                       |                              |
| RESIDENTE:                                                       | ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA                                                                                            |                |              |                 |                                       |                              |
| SUPERVISOR:                                                      | ING. VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE                                                                                    |                |              |                 |                                       |                              |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV):                               | S/. 14,215,753.97                                                                                                          |                |              |                 |                                       | #####                        |
| PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin IGV):                                | S/. 13,479,479.86                                                                                                          |                |              |                 |                                       |                              |
| VALORIZACIÓN DE OBRA N° 12 - SETIEMBRE 2025                      |                                                                                                                            |                |              |                 |                                       |                              |
| DESCRIPCIÓN                                                      | MONTO<br>CONTRATADO (S/.)                                                                                                  | VALORIZACION   |              |                 | % DE AVANCE<br>ACUMULADO<br>EJECUTADO | SALDO POR<br>VALORIZAR (S/.) |
|                                                                  |                                                                                                                            | ANTERIOR (S/.) | ACTUAL (S/.) | ACUMULADA (S/.) |                                       |                              |
| OBRAS PROVISIONALES , TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD   | 1,388,035.23                                                                                                               | 984,924.13     | 26,874.38    | 1,011,798.51    | 72.89%                                | 376,236.72                   |
| ESTRUCTURAS                                                      | 1,949,772.06                                                                                                               | 1,421,885.03   | -19,521.40   | 1,402,363.63    | 71.92%                                | 547,408.43                   |
| ARQUITECTURA Y RESTAURACION                                      | 4,576,212.30                                                                                                               | 412,576.68     | 35,084.74    | 447,661.42      | 9.78%                                 | 4,128,550.88                 |
| INSTALACIONES SANITARIAS                                         | 695,465.53                                                                                                                 | 125,394.41     | 8,566.79     | 133,961.20      | 19.26%                                | 561,504.33                   |
| INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECHANICAS Y CORRIENTES DEBILES | 2,670,570.54                                                                                                               | 83,949.29      | 5,998.39     | 89,947.68       | 3.37%                                 | 2,580,622.86                 |
| MANEJO AMBIENTAL                                                 | 32,757.28                                                                                                                  | 13,467.86      | 186.02       | 13,653.88       | 41.68%                                | 19,103.40                    |
| SEGURIDAD SEÑALÉTICAS Y EVACUACIÓN                               | 14,481.06                                                                                                                  | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00%                                 | 14,481.06                    |
| GASTOS GENERALES 15%                                             | 1,699,094.10                                                                                                               | 456,329.60     | 8,578.34     | 464,907.94      |                                       |                              |
| UTILIDAD 4%                                                      | 453,091.76                                                                                                                 | 121,687.88     | 2,287.56     | 123,975.44      |                                       |                              |
| VALORIZACIÓN (V)                                                 | 13,479,479.86                                                                                                              | 3,620,214.88   | 68,054.82    | 3,688,269.70    | 27.36%                                | 9,791,210.16                 |
| TOTAL CONTRACTUAL                                                |                                                                                                                            |                |              |                 |                                       |                              |
| Avances en porcentaje                                            |                                                                                                                            | 26.86%         | 0.50%        | 27.36%          | 27.36%                                | 72.64%                       |
| REAJUSTES (R)                                                    |                                                                                                                            | 36,780.18      | 1,000.18     | 37,780.36       |                                       |                              |
| DEDUCCIONES DE REINTEGROS (D)                                    |                                                                                                                            |                |              |                 |                                       |                              |
| POR ADELANTO EN EFECTIVO                                         |                                                                                                                            | 221.52         | -64.15       | 157.37          |                                       |                              |
| POR ADELANTO PARA MATERIALES                                     |                                                                                                                            | -4,880.15      | -324.87      | -5,205.02       |                                       |                              |
| VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D)                              |                                                                                                                            | 3,661,653.69   | 69,444.02    | 3,731,097.71    |                                       |                              |
| AMORTIZACIONES (A)                                               |                                                                                                                            |                |              |                 |                                       |                              |
| AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO                                | 1,347,947.99                                                                                                               | 362,021.52     | 6,805.48     | 368,827.00      |                                       | 979,120.99                   |
| AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES                        | 2,695,895.97                                                                                                               | 885,819.55     | 20,951.17    | 906,770.72      |                                       | 1,789,125.25                 |
| TOTAL AMORTIZACIONES (A)                                         | 4,043,843.96                                                                                                               | 1,247,841.07   | 27,756.65    | 1,275,597.72    |                                       |                              |
| VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A)                                  |                                                                                                                            | 2,413,812.62   | 41,687.37    | 2,455,499.99    |                                       |                              |
| MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA                                     |                                                                                                                            |                |              |                 |                                       |                              |
| EN EFECTIVO (VN)                                                 |                                                                                                                            | 2,413,812.62   | 41,687.37    | 2,455,499.99    |                                       |                              |
| MONTO POR I.G.V. (VN x 0.18)                                     |                                                                                                                            | 434,486.27     | 7,503.73     | 441,990.00      |                                       |                              |
| MONTO TOTAL CON I.G.V.                                           |                                                                                                                            | 2,848,298.89   | 49,191.10    | 2,897,489.99    |                                       |                              |
| VALORIZACION NETA                                                |                                                                                                                            | S/. 49,191.10  |              |                 |                                       |                              |
| RETENCIONES                                                      |                                                                                                                            |                |              |                 |                                       |                              |
| RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO                      | 1,590,578.62                                                                                                               | 376,335.31     | 8,030.47     | 384,365.78      |                                       |                              |
| -10%                                                             |                                                                                                                            |                |              |                 |                                       |                              |
| NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA                                   |                                                                                                                            | 41,160.63      |              |                 |                                       |                              |
| SON : CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA CON 63/100 SOLES          |                                                                                                                            |                |              |                 |                                       |                              |

CONSORCIO SUPERVISOR RIMAC CULTURAL  
  
**Leon Tapia Jhon Maycol**  
 REPRESENTANTE COMEN  
 DNI 71000043

CONSORCIO SUPERVISOR  
 RIMAC CULTURAL  
**Ing. Victor Alberto Portilla Bustamante**  
 JEFE DE SUPERVISIÓN  
 CIP N°163592





02.02.02. RESUMEN DE LA VALORIZACION

## RESUMEN DE VALORIZACIÓN



PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA-DISTRITO DE VALERA  
PROVINCIA DE BONGARA-REGION AMAZONAS"

ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN AGUSTIN I

SUPERVISIÓN : CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

VALORIZACIÓN 10

|       |                                              |            |            |
|-------|----------------------------------------------|------------|------------|
| I.-   | VALORIZACIÓN BRUTA (VB)                      |            | 665,085.22 |
| 1.1.- | VALORIZACIÓN DEL PERÍODO                     | 653,245.66 |            |
| 1.2.- | REAJUSTE                                     | 11,839.56  |            |
| II.-  | DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE (A)                   |            | 2,367.10   |
| 2.1.- | POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO         | 379.07     |            |
| 2.2.- | POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO PARA MATERIALES | 1,988.03   |            |
| III.- | VALORIZACIÓN NETA (VN)                       |            | 662,718.12 |
| 3.1.- | $VN = VB - A$                                | 662,718.12 |            |
| IV.-  | AMORTIZACIÓN POR ADELANTOS                   |            | 247,843.90 |
| 4.1.- | DIRECTO                                      | 65,324.56  |            |
| 4.2.- | PARA MATERIALES                              | 182,519.34 |            |
| V.-   | MONTO FACTURABLE                             |            | 489,551.58 |
| 5.1.- | SUB TOTAL                                    | 414,874.22 |            |
| 5.2.- | I.G.V. (18%)                                 | 74,677.36  |            |
| VI.-  | RETENCIONES (RM)                             |            | 77,082.99  |
| 6.1.- | FONDO DE GARANTÍA                            | 77,082.99  |            |
| 6.2.- | PENALIDADES                                  |            |            |
| VII.- | VALORIZACION LIQUIDA (VL)                    |            | 412,468.59 |
| 7.1.- | $VL = VN - RM$                               | 412,468.59 |            |

MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

412,468.59

Carlos Humberto Mendoza Picoaga  
DNI N° 10659580  
CONSULTOR DE OBRA - REG. C9175

CARLOS EDUARDO  
FARFOL LAMAS  
Ingeniero Civil  
CIP N° 48227

Domicilio: Av. San Luis 1607- Int: 202- Urb. Jacaranda II- San Borja- Lima- Lima  
Teléfono: 270-5268 / 99659-3722 / correo: cmpicoaga@hotmail.com; cmpicoaga@gmail.com

|                |                                                                                     |     |          |          |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------|
| 04.02.03.03.03 | DEMOLICION DE BUZON EXISTENTE 2.00M-2.50M DE PROF.                                  | m3  | 26.15    | 26.15    | 100.00% |
| 04.02.03.03.05 | EXCAVACION (MAQ.) P/BUZON NUEVO D=1.20m. TERRENO NATURAL DE 1.20M A 1.50M           | m3  | 8.60     | 11.81    | 100.00% |
| 04.02.03.03.06 | EXCAVACION (MAQ.) P/BUZON NUEVO D=1.20m. TERRENO NATURAL DE 1.50M A 2.00M           | m3  | 5.22     | 34.67    | 100.00% |
| 04.02.03.03.07 | RELLENO Y COMPACTACION (CON MATERIAL PROPIO) DE BUZON TERRENO NATURAL 1.20M A 1.50M | m3  | 22.05    | 22.05    | 100.00% |
| 04.02.03.03.08 | RELLENO Y COMPACTACION (CON MATERIAL PROPIO) DE BUZON TERRENO NATURAL 1.50M A 2.00M | m3  | 67.05    | 67.05    | 100.00% |
| 04.02.03.03.09 | RELLENO Y COMPACTACION (CON MATERIAL PROPIO) DE BUZON TERRENO NATURAL 2.00M A 2.50M | m3  | 23.52    | 23.52    | 100.00% |
| 04.02.03.03.11 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICIONES                                   | m3  | 20.60    | 40.14    | 85.01%  |
| 04.03          | SISTEMA DE DRENAJE                                                                  |     |          |          |         |
| 04.03.01       | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                               |     |          |          |         |
| 04.03.01.01    | EXCAV. ZANJA (MAQ) P/TUB. TN H=1 M PROF. A. PROM.=0.60M.                            | m3  | 299.83   | 481.02   | 83.58%  |
| 04.03.01.02    | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE                                                   | m3  | 359.80   | 577.23   | 83.59%  |
| 04.03.01.03    | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL TODA PROFUNDIDAD                     | m2  | 1,156.49 | 1,855.36 | 83.58%  |
| 04.03.02       | OBRAS DE CONCRETO                                                                   |     |          |          |         |
| 04.03.02.01    | CUNETAS CON REJILLA DE CONCRETO A=0.40M PROFUNDIDAD PROM. 0.50M                     |     |          |          |         |
| 04.03.02.01.01 | CONCRETO 210kg/cm2 EN CUNETA ANCHO 0.40M Y ALTURA VARIABLE                          | m3  | 56.51    | 104.53   | 64.22%  |
| 04.03.02.01.02 | ENCOFRADO EN CUNETA ANCHO=0.40M Y ALTURA VARIABLE                                   | m2  | 602.76   | 1,114.98 | 63.78%  |
| 04.03.02.01.03 | ACERO fy=4200kg/cm2 EN CUENTA ANCHO=0.40M Y ALTURA VARIABLE                         | kg  | 1,053.83 | 3,141.13 | 71.57%  |
| 04.03.02.02    | CUNETAS TECHADAS A=0.40 PROFUNDIDAD PROM. 0.50M                                     |     |          |          |         |
| 04.03.02.02.01 | CONCRETO 210kg/cm2 EN CUNETA TECHADA ANCHO 0.40M Y ALTURA VARIABLE                  | m3  | 30.26    | 34.47    | 59.62%  |
| 04.03.02.02.02 | ENCOFRADO EN CUNETA TECHADO ANCHO=0.40M Y ALTURA VARIABLE                           | m2  | 322.71   | 362.62   | 58.39%  |
| 04.03.02.02.03 | ACERO fy=4200kg/cm2 EN CUNETA TECHADO ANCHO=0.40M Y ALTURA VARIABLE                 | kg  | 981.27   | 1,142.67 | 73.29%  |
| 07             | MITIGACION AMBIENTAL                                                                |     |          |          |         |
| 07.02          | PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES              |     |          |          |         |
| 07.02.01       | HUMEDECIMIENTO DE AREAS DE DEMOLICION Y EXCAVACION                                  | día | 31.00    | 34.00    | 26.15%  |
| 07.03          | PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDO                                    |     |          |          |         |
| 07.03.04       | BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE CAPACIDAD 50 LITROS                       | und | 10.00    | 239.00   | 95.60%  |
| 07.03.05       | BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE CAPACIDAD 120 LITROS                      | und | 10.00    | 239.00   | 95.60%  |
| 07.03.06       | ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS                                                | m2  | 1.72     | 2.25     | 100.00% |
| 07.05          | PLAN DE CONTINGENCIA                                                                |     |          |          |         |
| 07.05.03       | GEOMEMBRANA                                                                         | m2  | 19.00    | 20.00    | 100.00% |

## 02.02.02. RESUMEN DE LA VALORIZACION

## RESUMEN DE VALORIZACIÓN



|             |                                                                                                                                          |              |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| PROYECTO    | :"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA-DISTRITO DE VALERA PROVINCIA DE BONGARA-REGION AMAZONAS" |              |              |
| ENTIDAD     | : PLAN COPESCO NACIONAL                                                                                                                  |              |              |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO SAN AGUSTIN I                                                                                                                |              |              |
| SUPERVISION | : CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA                                                                                                        | VALORIZACIÓN | 11           |
| I.-         | VALORIZACIÓN BRUTA (VB)                                                                                                                  |              | 1,038,134.06 |
| 1.1.-       | VALORIZACIÓN DEL PERÍODO                                                                                                                 | 1,022,014.66 |              |
| 1.2.-       | REAJUSTE                                                                                                                                 | 16,119.40    |              |

Carlos Humberto Mendoza Picoaga  
DNI N° 10659580  
CONSULTOR DE OBRA - REG. C9175

CARLOS EDUARDO FARFOL LAMAS  
Ingeniero Civil  
CIP N° 48227


Domicilio: Av. San Luis 1607- Int.202- Urb. Jacaranda II- San Borja- Lima- Lima  
Telefono: 270-5268 / 996594-3722 / correo: cnpicoaga@hotmail.com; cnpicoaga@gmail.com



|       |                                              |              |              |
|-------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| II.-  | DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE (A)                   |              | 1,942.87     |
| 2.1.- | POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO         | 345.65       |              |
| 2.2.- | POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO PARA MATERIALES | 1,597.22     |              |
| III.- | VALORIZACIÓN NETA (VN)                       |              | 1,036,191.19 |
| 3.1.- | $VN = VB - A$                                | 1,036,191.19 |              |
| IV.-  | AMORTIZACIÓN POR ADELANTOS                   |              | 359,856.46   |
| 4.1.- | DIRECTO                                      | 102,201.46   |              |
| 4.2.- | PARA MATERIALES                              | 257,655.00   |              |
| V.-   | MONTO FACTURABLE                             |              | 798,074.98   |
| 5.1.- | SUB TOTAL                                    | 676,334.73   |              |
| 5.2.- | I.G.V. (18%)                                 | 121,740.25   |              |
| VI.-  | RETENCIONES (RM)                             |              | 120,597.73   |
| 6.1.- | FONDO DE GARANTÍA                            | 120,597.73   |              |
| 6.2.- | PENALIDADES                                  | -            |              |
| VII.- | VALORIZACION LIQUIDA (VL)                    |              | 677,477.25   |
| 7.1.- | $VL = VN - RM$                               | 677,477.25   |              |

**MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA**
**677,477.25**

#### 02.03. RESUMEN DEL AVANCE FISICO ACUMULADO

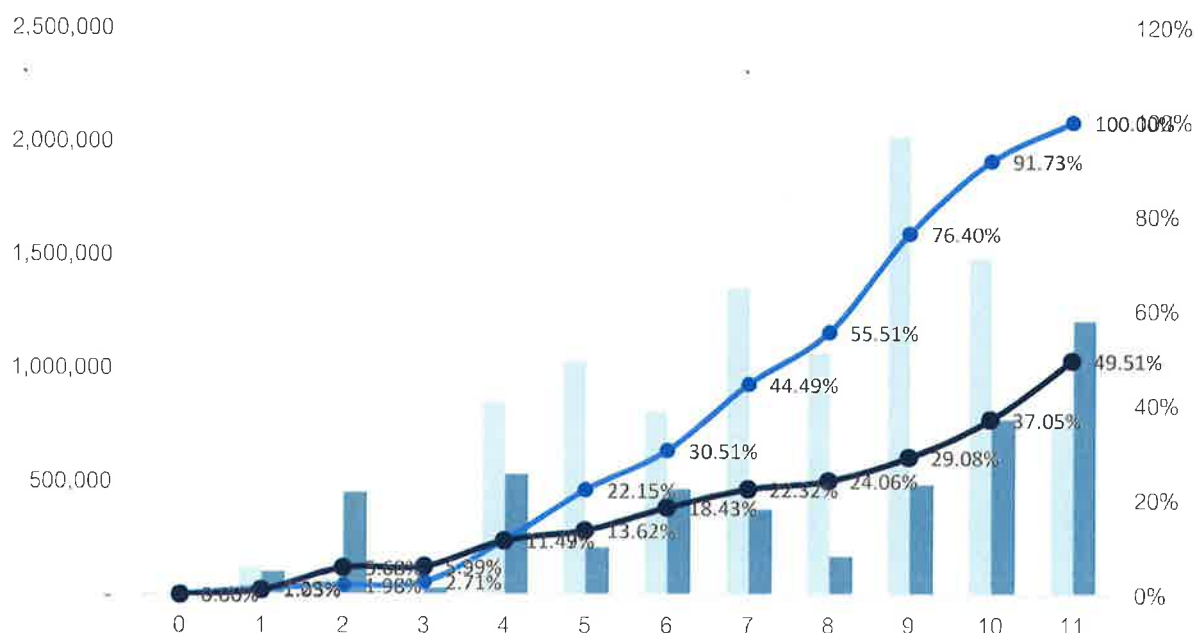

#### 02.04. COMPARATIVO DE AVANCE REAL EJECUTADO VS AVANCE PROGRAMADO

El proyecto durante el periodo de agosto de 2025 tuvo un porcentaje de avance mensual de 12.46% y un porcentaje de avance acumulado de 49.51%, asimismo, el porcentaje de avance programado acumulado es de 100.00%, por lo que, el proyecto se encuentra en un estado ATRASADO con respecto al avance programado.

Desagregado en el anexo N°01.

Carlos Humberto Mendoza Picoaga  
DNI N° 10659580  
CONSULTOR DE OBRA - REG. C9175

CARLOS EDUARDO  
FARFÁN LAMAS  
Ingeniero Civil  
CIP N° 48227

Domicilio: Av. San Luis 1607 - Int. 202 - Urb. Jacaranda II - San Borja - Lima - Lima  
Teléfono: 270-5268 / 99659-3722 / correo: cmpicoaga@hotmail.com, cmpicoaga@gmail.com

|             |                                                                        |     |        |        |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 05.02       | OBRAS EXTERIORES Y VIAS URBANAS                                        |     |        |        |        |
| 05.02.01    | ILUMINACION EXTERIOR                                                   |     |        |        |        |
| 05.02.01.02 | POSTE DE F*G° DE 4 METROS SEGUN DETALLE                                | und | 45.00  | 29.00  | 29.00  |
| 07          | MITIGACION AMBIENTAL                                                   |     |        |        |        |
| 07.01       | PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA                                        |     |        |        |        |
| 07.01.02    | FORMULARIO DE CONSULTAS Y SUGERENCIAS                                  | und | 250.00 | 150.00 | 151.00 |
| 07.01.03    | MATERIAL INFORMATIVO                                                   | und | 250.00 | 150.00 | 150.00 |
| 07.02       | PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES |     |        |        |        |
| 07.02.01    | HUMEDECIMIENTO DE AREAS DE DEMOLICION Y EXCAVACION                     | día | 130.00 | 30.00  | 64.00  |
| 07.02.03    | CUBIERTA DE LONA PARA VOLQUETE                                         | m2  | 36.00  | 36.00  | 36.00  |
| 07.03       | PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDO                       |     |        |        |        |
| 07.03.04    | BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE CAPACIDAD 50 LITROS          | und | 250.00 | 11.00  | 250.00 |
| 07.03.05    | BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE CAPACIDAD 120 LITROS         | und | 250.00 | 11.00  | 250.00 |

#### 02.02.02. RESUMEN DE LA VALORIZACION

|             |                                                                                                                                             |              |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| PROYECTO    | :"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA-DISTRITO DE VALERA<br>PROVINCIA DE BONGARA-REGION AMAZONAS" |              |            |
| ENTIDAD     | : PLAN COPESCO NACIONAL                                                                                                                     |              |            |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO SAN AGUSTIN I                                                                                                                   |              |            |
| SUPERVISIÓN | : CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA                                                                                                           |              |            |
| I.-         | VALORIZACIÓN BRUTA (VB)                                                                                                                     | VALORIZACIÓN | 12         |
| 1.1.-       | VALORIZACIÓN DEL PERÍODO                                                                                                                    | 662,943.62   | 669,241.90 |
| 1.2.-       | REAJUSTE                                                                                                                                    | 6,298.28     |            |
| II.-        | DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE (A)                                                                                                                  |              | 828.18     |
| 2.1.-       | POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO                                                                                                        | 53.94        |            |
| 2.2.-       | POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO PARA MATERIALES                                                                                                | 882.12       |            |
| III.-       | VALORIZACIÓN NETA (VN)                                                                                                                      |              | 668,413.72 |
| 3.1.-       | VN = VB - A                                                                                                                                 | 668,413.72   |            |
| IV.-        | AMORTIZACIÓN POR ADELANTOS                                                                                                                  |              | 256,275.17 |
| 4.1.-       | DIRECTO                                                                                                                                     | 66,294.36    |            |
| 4.2.-       | PARA MATERIALES                                                                                                                             | 189,980.81   |            |
| V.-         | MONTO FACTURABLE                                                                                                                            |              | 486,323.49 |
| 5.1.-       | SUB TOTAL                                                                                                                                   | 412,138.55   |            |
| 5.2.-       | I.G.V. (18%)                                                                                                                                | 74,184.94    |            |
| VI.-        | RETENCIONES (RM)                                                                                                                            |              | 78,227.35  |
| 6.1.-       | FONDO DE GARANTÍA                                                                                                                           | 78,227.35    |            |
| 6.2.-       | PENALIDADES                                                                                                                                 |              |            |
| VII.-       | VALORIZACION LIQUIDA (VL)                                                                                                                   |              | 408,096.14 |
| 7.1.-       | VL = VN - RM                                                                                                                                | 408,096.14   |            |

MCNTO A PAGAR AL CONTRATISTA

408,096.14

Carlos Humberto Mendoza Picoaga  
DNI N° 10659580  
CONSULTOR DE OBRA - REG. C9175

CARLOS EDUARDO  
FARRO LAMAS  
Ingeniero Civil  
CIP N° 48227


Domicilio: Av. San Luis 1607- Int. 202- Urb. Jacaranda II- San Borja- Lima- Lima  
Teléfono: 270-5268 / 99659-3722 / correo cmpicoaga@hotmail.com; cmpicoaga@gmail.com





002603

## 02.03. RESUMEN DEL AVANCE FISICO ACUMULADO

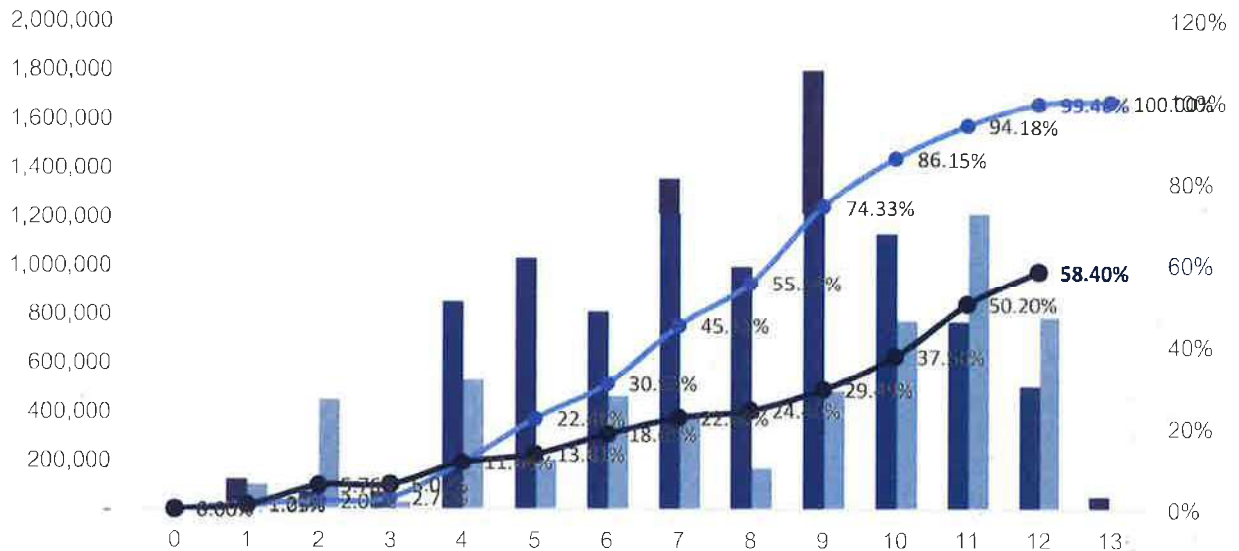

## 02.04. COMPARATIVO DE AVANCE REAL EJECUTADO VS AVANCE PROGRAMADO

El proyecto durante el periodo de setiembre de 2025 tuvo un porcentaje de avance mensual de 8.20% y un porcentaje de avance acumulado de 58.07%, asimismo, el porcentaje de avance programado acumulado es de 99.46%, por lo que, el proyecto se encuentra en un estado ATRASADO con respecto al avance programado. Desagregado en el anexo N°01.

| PERIODO      |        |          | PROGRAMADO   |              |           |             |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| VALORIZACIÓN | MES    | DURACIÓN | MENSUAL      | ACUMULADO    | % MENSUAL | % ACUMULADO |
| 0            | Nov-24 |          | -            | -            | 0.00%     | 0.00%       |
| 1            | Nov-24 | 19       | 121,325.87   | 121,325.87   | 1.27%     | 1.27%       |
| 2            | Dic-24 | 15       | 70,538.45    | 191,864.32   | 0.74%     | 2.01%       |
| 3            | Dic-24 | 16       | 70,538.45    | 262,402.77   | 0.74%     | 2.75%       |
| 4            | Ene-25 | 31       | 849,468.43   | 1,111,871.20 | 8.90%     | 11.65%      |
| 5            | Feb-25 | 28       | 1,031,296.02 | 2,143,167.22 | 10.81%    | 22.46%      |
| 6            | Mar-25 | 17       | 809,005.88   | 2,952,173.10 | 8.48%     | 30.93%      |
| 7            | Abr-25 | 30       | 1,352,779.18 | 4,304,952.28 | 14.18%    | 45.11%      |
| 8            | May-25 | 31       | 994,877.60   | 5,299,829.88 | 10.42%    | 55.54%      |
| 9            | Jun-25 | 30       | 1,794,036.90 | 7,093,866.78 | 18.80%    | 74.33%      |
| 10           | Jul-25 | 31       | 1,127,619.14 | 8,221,485.92 | 11.82%    | 86.15%      |
| 11           | Ago-25 | 31       | 766,175.69   | 8,987,661.61 | 8.03%     | 94.18%      |
| 12           | Set-25 | 30       | 504,373.93   | 9,492,035.54 | 5.29%     | 99.46%      |
| 13           | Oct-25 | 11       | 51,175.42    | 9,543,210.96 | 0.54%     | 100.00%     |
| TOTAL        |        | 320      | 9,543,210.96 |              | 100.00%   |             |

\* Cronograma actualizado con Ampliación N°04, Aprobado con CARTA N° 194 - 2025 - MINCETUR/DM/UCET-DE/UEO

Carlos Humberto Mendoza Picoaga  
DNI N° 10659580  
CONSULTOR DE OBRA - REG. C9175

CARLOS EDUARDO  
FARFOLAMAS  
Ingeniero Civil  
CIP N° 48227

Domicilio: Av. San Luis 1607 - Int. 202 - Urb. Jacaranda II - San Borja - Lima - Lima  
Teléfono: 270-5268 / 99659-3722 / correo: cmpicoaga@hotmail.com; cmpicoaga@gmail.com



000525



## RESUMEN DE VALORIZACION N° 03

Del 01 al 31 de julio del 2025

EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "REMODELACION DE SENDERO Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA"

EJECUTA : CONSORCIO CAMILOS  
 INSPECTOR : ING. LUIS PEREZ DESCALZI  
 RESIDENTE : JEREMIAS HUAYANEY VALVERDE

| DESCRIPCIÓN                                                   | MONTO CONTRATO      | VAL ACUM. ANTERIOR | VAL ACTUAL       | VAL ACUM ACTUAL   | % DE AVANCE ACUMUL. | SALDO POR VALORIZAR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | 84,968.97           | 57,711.63          | 13,946.39        | 71,658.02         | 84.33               | 13,310.95           |
| ESTRUCTURAS                                                   | 128,118.85          | 69,002.91          | 26,951.61        | 95,954.52         | 74.89               | 32,164.33           |
| ARQUITECTURA                                                  | 1,241,328.32        | 5,369.45           | 3,149.92         | 8,519.37          | 0.69                | 1,232,808.95        |
| INSTALACIONES SANITARIAS                                      | 438,901.09          | -                  | 2,325.82         | 2,325.82          | 0.53                | 436,575.27          |
| INSTALACIONES ELECTRICAS                                      | 702,009.60          | 53,529.37          | 4,367.90         | 57,897.27         | 8.25                | 644,112.33          |
| MANEJO AMBIENTAL                                              | 18,557.92           | 4,869.97           | -                | 4,869.97          | 26.24               | 13,687.95           |
|                                                               |                     | -                  |                  |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL CONTRACTUAL</b>                                      | <b>2,613,884.75</b> | <b>190,483.33</b>  | <b>50,741.64</b> | <b>241,224.97</b> |                     | <b>2,372,659.78</b> |
| <b>% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA</b>                         |                     | <b>7.29%</b>       | <b>1.94%</b>     | <b>9.23%</b>      |                     | <b>90.77%</b>       |
| <b>REAJUSTES</b>                                              |                     |                    |                  |                   |                     |                     |
| OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |                     | 220.81             | 45.17            | 265.98            |                     |                     |
| ESTRUCTURAS                                                   |                     | -                  | -                | -                 |                     |                     |
| ARQUITECTURA                                                  |                     | 10.74              | 10.74            | 21.48             |                     |                     |
| INSTALACIONES SANITARIAS                                      |                     | -                  | -                | -                 |                     |                     |
| INSTALACIONES ELECTRICAS                                      |                     | 229.10             | 96.46            | 325.56            |                     |                     |
| MITIGACION AMBIENTAL                                          |                     | 15.60              | 26.31            | 41.91             |                     |                     |
|                                                               |                     |                    |                  |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL REAJUSTE (S)</b>                                     |                     | <b>476.25</b>      | <b>178.68</b>    | <b>654.93</b>     |                     |                     |
| <b>AMORTIZACION</b>                                           |                     |                    |                  |                   |                     |                     |
| Amortización del Adelanto Directo                             |                     | 8,152.84           | 5,074.16         | 13,227.01         |                     |                     |
| OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |                     | 2,258.45           | 1,394.64         | 3,653.09          |                     |                     |
| ESTRUCTURAS                                                   |                     | 2,717.00           | 2,695.16         | 5,412.16          |                     |                     |
| ARQUITECTURA                                                  |                     | 536.95             | 314.99           | 851.94            |                     |                     |
| INSTALACIONES SANITARIAS                                      |                     | -                  | 232.58           | 232.58            |                     |                     |
| INSTALACIONES ELECTRICAS                                      |                     | 2,421.16           | 436.79           | 2,857.95          |                     |                     |
| MITIGACION AMBIENTAL                                          |                     | 219.28             | -                | 219.28            |                     |                     |
|                                                               |                     |                    |                  |                   |                     |                     |
| Amortización del Adelanto para Materiales                     |                     | 15,595.54          | 7,895.09         | 23,490.63         |                     |                     |
| ESTRUCTURAS                                                   |                     | 5,178.08           | 5,136.46         | 10,314.54         |                     |                     |
| ARQUITECTURA                                                  |                     | 2,164.44           | 1,269.75         | 3,434.19          |                     |                     |
| INSTALACIONES ELECTRICAS                                      |                     | 8,253.01           | 1,488.88         | 9,741.89          |                     |                     |
|                                                               |                     |                    |                  |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL AMORTIZACIONES (A)</b>                               |                     | <b>23,748.38</b>   | <b>12,969.25</b> | <b>36,717.64</b>  |                     | -                   |
| <b>VALORIZACION NETA (VN=VA+S-A)</b>                          |                     | 167,211.20         | 37,951.07        | 205,162.27        |                     |                     |
| <b>MULTA POR ATRASO DE OBRA (M)</b>                           |                     | -                  | -                | -                 |                     |                     |
| <b>MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>                           |                     |                    |                  |                   |                     |                     |
| En efectivo (VN-M)                                            | 2,613,884.75        | 167,211.20         | 37,951.07        | 205,162.26        |                     | -                   |
| En IGV (VN x 18%)                                             | 470,499.26          | 30,098.02          | 6,831.19         | 36,929.21         |                     | -                   |
|                                                               |                     |                    |                  |                   |                     |                     |
| <b>MONTO TOTAL CON IGV S/.</b>                                | <b>3,084,384.01</b> | <b>197,309.22</b>  | <b>44,782.26</b> | <b>242,091.47</b> |                     |                     |
|                                                               |                     |                    |                  |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL COMPROMISO S/.</b>                                   | <b>3,084,384.01</b> | <b>197,309.22</b>  | <b>44,782.26</b> | <b>242,091.47</b> |                     |                     |

ING. LUIS PEREZ DESCALZI  
 CIP N° 56318  
 INSPECTOR DE OBRA

**CONSORCIO CAMILOS**  
 HUGO EUSEBIO CAMILO SABINO  
 DNI N° 31672199  
 REPRESENTANTE COMUN

**CONSORCIO CAMILOS**  
 ING. MISAEL JEREMIAS HUAYANEY VALVERDE  
 CIP 181257  
 RESIDENTE DE OBRA



**RESUMEN DE VALORIZACION N° 04**

Del 01 al 31 de Agosto del 2025

EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "REMEDIACION DE SENDERO Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA"

EJECUTA : CONSORCIO CAMILOS  
INSPECTOR : ING. LUIS PEREZ DESCALZI  
RESIDENTE : JEREMIAS HUAYANEY VALVERDE

| DESCRIPCIÓN                                                   | MONTO CONTRATO      | VAL 01            | VAL 02           | VAL 03           | VAL ACUM. ANTERIOR | VAL ACTUAL        | VAL ACUM ACTUAL   | % DE AVANCE ACUMUL. | SALDO POR VALORIZAR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | 84,966.97           | 35,127.15         | 22594.48         | 13946.39         | 71,658.02          | 12,740.81         | 84,398.83         | 99.33               | 570.14              |
| ESTRUCTURAS                                                   | 128,118.85          | 41,832.88         | 27,170.03        | 26,951.61        | 95,954.52          | 5,262.32          | 101,216.84        | 79.00               | 26,902.01           |
| ARQUITECTURA                                                  | 1,241,328.32        | -                 | 5,369.45         | 3,149.92         | 8,519.37           | 138,881.70        | 147,401.07        | 11.87               | 1,093,927.25        |
| INSTALACIONES SANITARIAS                                      | 438,901.09          | -                 | -                | 2,325.82         | 2,325.82           | -                 | 2,325.82          | 0.53                | 436,575.27          |
| INSTALACIONES ELECTRICAS                                      | 702,009.60          | 29,317.73         | 24,211.64        | 4,387.90         | 57,897.27          | 27,477.64         | 85,374.91         | 12.16               | 616,634.69          |
| MANEJO AMBIENTAL                                              | 18,557.92           | 2,677.21          | 2192.76          | -                | 4,869.97           | 348.86            | 5,218.93          | 28.12               | 13,338.99           |
| <b>TOTAL CONTRACTUAL</b>                                      | <b>2,813,884.75</b> | <b>108,954.97</b> | <b>81,528.38</b> | <b>50,741.64</b> | <b>241,224.97</b>  | <b>184,711.43</b> | <b>425,936.40</b> |                     | <b>2,187,948.35</b> |
| <b>% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA</b>                         |                     | <b>4.17%</b>      | <b>3.12%</b>     | <b>1.94%</b>     | <b>9.23%</b>       | <b>7.07%</b>      | <b>16.30%</b>     |                     | <b>83.70%</b>       |
| <b>REAJUSTES</b>                                              |                     |                   |                  |                  |                    |                   |                   |                     |                     |
| OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |                     | 175.64            | 45.17            | 45.17            | 265.98             | -44.91            | 221.07            |                     |                     |
| ESTRUCTURAS                                                   |                     | -                 | -                | -                | -                  | 18.41             | 18.41             |                     |                     |
| ARQUITECTURA                                                  |                     | -                 | 10.74            | 10.74            | 21.48              | 199.98            | 221.44            |                     |                     |
| INSTALACIONES SANITARIAS                                      |                     | -                 | -                | -                | -                  | -                 | -                 |                     |                     |
| INSTALACIONES ELECTRICAS                                      |                     | 132.64            | 96.46            | 96.46            | 325.56             | 58.11             | 383.67            |                     |                     |
| MITIGACION AMBIENTAL                                          |                     | -10.71            | 26.31            | 26.31            | 41.91              | -0.55             | 41.26             |                     |                     |
| <b>TOTAL REAJUSTE (\$)</b>                                    |                     | <b>297.57</b>     | <b>178.68</b>    | <b>178.68</b>    | <b>654.93</b>      | <b>229.01</b>     | <b>883.65</b>     |                     |                     |
| <b>AMORTIZACION</b>                                           |                     |                   |                  |                  |                    |                   |                   |                     |                     |
| Amortización del Adelanto Directo                             |                     |                   | 8,152.84         | 5,074.16         | 13,227.01          | 18,471.14         | 31,698.15         |                     |                     |
| OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |                     |                   | 2,258.45         | 1,394.64         | 3,653.09           | 1,274.08          | 4,927.17          |                     |                     |
| ESTRUCTURAS                                                   |                     |                   | 2,717.00         | 2,695.16         | 5,412.16           | 528.23            | 5,938.39          |                     |                     |
| ARQUITECTURA                                                  |                     |                   | 536.95           | 314.99           | 851.94             | 13,888.17         | 14,740.11         |                     |                     |
| INSTALACIONES SANITARIAS                                      |                     |                   | -                | 232.58           | 232.58             | -                 | 232.58            |                     |                     |
| INSTALACIONES ELECTRICAS                                      |                     |                   | 2,421.16         | 436.79           | 2,857.95           | 2,747.76          | 5,605.71          |                     |                     |
| MITIGACION AMBIENTAL                                          |                     |                   | 219.26           | -                | 219.26             | 34.90             | 254.18            |                     |                     |
| Amortización del Adelanto para Materiales                     |                     |                   | 15,595.54        | 7,895.09         | 23,490.63          | 36,849.17         | 60,339.80         |                     |                     |
| ESTRUCTURAS                                                   |                     |                   | 5,178.08         | 5,136.46         | 10,314.54          | 1,002.90          | 11,317.44         |                     |                     |
| ARQUITECTURA                                                  |                     |                   | 2,164.44         | 1,289.75         | 3,434.19           | 26,479.98         | 29,914.17         |                     |                     |
| INSTALACIONES ELECTRICAS                                      |                     |                   | 8,253.01         | 1,488.88         | 9,741.89           | 9,366.29          | 19,108.18         |                     |                     |
| <b>TOTAL AMORTIZACIONES (A)</b>                               |                     | <b>-</b>          | <b>23,748.38</b> | <b>12,969.25</b> | <b>36,717.64</b>   | <b>55,320.31</b>  | <b>92,037.65</b>  |                     | <b>-</b>            |
| <b>VALORIZACION NETA (VN=VA+S-A)</b>                          |                     | <b>109,252.54</b> | <b>57,958.66</b> | <b>37,951.07</b> | <b>205,162.26</b>  | <b>129,620.13</b> | <b>334,782.39</b> |                     |                     |
| <b>MULTA POR ATRASO DE OBRA (M)</b>                           |                     | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                     |                     |
| <b>MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>                           |                     |                   |                  |                  |                    |                   |                   |                     |                     |
| En efectivo (VN-M)                                            | 2,813,884.75        | 109,252.54        | 57,958.66        | 37,951.07        | 205,162.26         | 129,620.13        | 334,782.39        |                     | -                   |
| En IGV (VN x 18%)                                             | 470,499.26          | 19,665.46         | 10,432.56        | 6,831.19         | 36,929.21          | 23,331.62         | 80,260.83         |                     | -                   |
| <b>MONTO TOTAL CON IGV SI.</b>                                | <b>3,084,384.01</b> | <b>128,918.00</b> | <b>68,391.22</b> | <b>44,782.26</b> | <b>242,091.47</b>  | <b>152,951.75</b> | <b>395,043.22</b> |                     |                     |
| <b>TOTAL COMPROMISO SI.</b>                                   | <b>3,084,384.01</b> | <b>128,918.00</b> | <b>68,391.22</b> | <b>44,782.26</b> | <b>242,091.47</b>  | <b>152,951.75</b> | <b>395,043.22</b> |                     |                     |

  
**ING. LUIS PEREZ DESCALZI**  
CIP N° 56318  
INSPECTOR DE OBRA

  
**CONSORCIO  
CAMILOS**  
**HUGO EUSEBIO CAMILO SABINO**  
CIP N° 11672199  
REPRESENTANTE COMUN

  
**CONSORCIO  
CAMILOS**  
**ING. MISAEL JEREMIAS HUAYANEY VALVERDE**  
CIP 181257  
RESIDENTE DE OBRA





## RESUMEN DE VALORIZACION N° 05

Del 01 al 30 de Setiembre del 2025

EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "REMODELACION DE SENDERO Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA"

EJECUTA : CONSORCIO CAMILOS  
 INSPECTOR : ING. LUIS PEREZ DESCALZI  
 RESIDENTE : JEREMIAS HUAYANEY VALVERDE

| DESCRIPCIÓN                                                   | MONTO CONTRATO      | VAL ACUM. ANTERIOR | VAL ACTUAL        | VAL ACUM ACTUAL   | % DE AVANCE ACUMUL. | SALDO POR VALORIZAR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | 84,968.97           | 84,398.83          | -                 | 84,398.83         | 99.33               | 570.14              |
| ESTRUCTURAS                                                   | 128,118.85          | 101,216.84         | -                 | 101,216.84        | 79.00               | 26,902.01           |
| ARQUITECTURA                                                  | 1,241,328.32        | 147,401.07         | 155,973.70        | 303,374.77        | 24.44               | 937,953.55          |
| INSTALACIONES SANITARIAS                                      | 438,901.09          | 2,325.82           | -                 | 2,325.82          | 0.53                | 436,575.27          |
| INSTALACIONES ELECTRICAS                                      | 702,009.60          | 85,374.91          | 146,306.31        | 231,681.22        | 33.00               | 470,328.38          |
| MANEJO AMBIENTAL                                              | 18,557.92           | 5,218.93           | -                 | 5,218.93          | 28.12               | 13,338.99           |
| <b>TOTAL CONTRACTUAL</b>                                      | <b>2,613,884.75</b> | <b>425,936.40</b>  | <b>302,280.01</b> | <b>728,216.41</b> |                     | <b>1,885,668.34</b> |
| <b>% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA</b>                         |                     | <b>16.30%</b>      | <b>11.56%</b>     | <b>27.86%</b>     |                     | <b>72.14%</b>       |
| <b>REAJUSTES</b>                                              |                     |                    |                   |                   |                     |                     |
| OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |                     | 221.07             | -                 | 221.07            |                     |                     |
| ESTRUCTURAS                                                   |                     | 16.41              | -                 | 16.41             |                     |                     |
| ARQUITECTURA                                                  |                     | 221.44             | -133.32           | 88.12             |                     |                     |
| INSTALACIONES SANITARIAS                                      |                     | -                  | -                 | -                 |                     |                     |
| INSTALACIONES ELECTRICAS                                      |                     | 383.67             | 214.72            | 598.39            |                     |                     |
| MITIGACION AMBIENTAL                                          |                     | 41.36              | -                 | 41.36             |                     |                     |
| <b>TOTAL REAJUSTE (S)</b>                                     |                     | <b>883.95</b>      | <b>81.40</b>      | <b>965.35</b>     |                     |                     |
| <b>AMORTIZACION</b>                                           |                     |                    |                   |                   |                     |                     |
| Amortización del Adelanto Directo                             |                     | 31,698.15          | 30,228.00         | 61,926.15         |                     |                     |
| OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |                     | 4,927.17           | -                 | 4,927.17          |                     |                     |
| ESTRUCTURAS                                                   |                     | 5,938.39           | -                 | 5,938.39          |                     |                     |
| ARQUITECTURA                                                  |                     | 14,740.11          | 15,597.37         | 30,337.48         |                     |                     |
| INSTALACIONES SANITARIAS                                      |                     | 232.58             | -                 | 232.58            |                     |                     |
| INSTALACIONES ELECTRICAS                                      |                     | 5,605.71           | 14,630.53         | 20,236.34         |                     |                     |
| MITIGACION AMBIENTAL                                          |                     | 254.18             | -                 | 254.18            |                     |                     |
| Amortización del Adelanto para Materiales                     |                     | 60,339.80          | 60,996.81         | 121,336.61        |                     |                     |
| ESTRUCTURAS                                                   |                     | 11,317.44          | -                 | 11,317.44         |                     |                     |
| ARQUITECTURA                                                  |                     | 29,914.17          | 36,061.12         | 65,975.29         |                     |                     |
| INSTALACIONES ELECTRICAS                                      |                     | 19,108.18          | 24,935.69         | 44,043.87         |                     |                     |
| <b>TOTAL AMORTIZACIONES (A)</b>                               |                     | <b>92,037.95</b>   | <b>91,224.81</b>  | <b>183,262.76</b> |                     |                     |
| <b>VALORIZACION NETA (VN=VA+S-A)</b>                          |                     | <b>334,782.39</b>  | <b>211,136.60</b> | <b>545,918.99</b> |                     |                     |
| <b>MULTA POR ATRASO DE OBRA (M)</b>                           |                     |                    |                   |                   |                     |                     |
| <b>MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>                           |                     |                    |                   |                   |                     |                     |
| En efectivo (VN-M)                                            | 2,613,884.75        | 334,782.39         | 211,136.60        | 545,918.99        |                     | -                   |
| En IGV (VN x 18%)                                             | 470,499.26          | 60,260.83          | 38,004.59         | 98,265.42         |                     | -                   |
| <b>MONTO TOTAL CON IGV S/.</b>                                | <b>3,084,384.01</b> | <b>395,043.22</b>  | <b>249,141.19</b> | <b>644,184.41</b> |                     |                     |
| <b>TOTAL COMPROMISO S/.</b>                                   | <b>3,084,384.01</b> | <b>395,043.22</b>  | <b>249,141.19</b> | <b>644,184.41</b> |                     |                     |

ING. LUIS PEREZ DESCALZI  
 CIP N° 56318  
 INSPECTOR DE OBRA

CONSORCIO CAMILOS  
 ING. MISAEL JEREMIAS HUAYANEY VALVERDE  
 CIP N° 81257  
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO CAMILOS  
 HUGO EUSEBIO CAMILO SABINO  
 DNI N° 31672199  
 REPRESENTANTE COMUN

VALORIZACION DE OBRA N° 14 - RESUMEN DE AVANCES ACUMULADOS  
(Periodo del 01 al 05 de junio de 2025)

OBRA: SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA - CITE QUINUA - CUI 2116978" – SALDO DE OBRA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA.  
SISTEMA: SUMA ALZADA  
PROPIETARIO: PLAN COPESCO NACIONAL  
UBICACIÓN: DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA -DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
CONTRATISTA: GRUPO MARREROS S.A.C.

MONTO CONTRATADO CON IGV: S/. 2,554,956.05  
MONTO CONTRATADO SIN IGV: S/. 3,014,848.14

RESIDENTE: ING. MEDINA CUADROS ANIBAL OCTAVIO

INSPECCION: ING. TASAYCO GARCIA, WILLIAM AUGUSTO

F. de inicio 26/06/2024

Plazo vigente 319

F. de culminación 22/05/2025

F. de culminación 5/06/2025

real

Dias penalidad: 14

FECHA DE INICIO

PLAZO DE EJECUCION: 180 DC

AMPLIACIÓN DE PLAZO 01: 60 DC

AMPLIACIÓN DE PLAZO 02: 5 DC

AMPLIACIÓN DE PLAZO 03: 45 DC

AMPLIACIÓN DE PLAZO 04: 0 DC

AMPLIACIÓN DE PLAZO 05: 15 DC

AMPLIACIÓN DE PLAZO 06: 0 DC

AMPLIACIÓN DE PLAZO 07: 27 DC

AMPLIACIÓN DE PLAZO 08: 14 DC

PLAZO VIGENTE: 319 DC

  
WILLIAM AUGUSTO TASAYCO GARCIA  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 101018

| ITEM | PRESUPUESTO    | DESCRIPCION              | PARCIAL (S/.) | VALORIZADO   |         |            |       | SALDO        |         |            |        |
|------|----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|---------|------------|--------|
|      |                |                          |               | ANTERIOR     |         | ACTUAL     |       | ACUMULADO    |         | SALDO      |        |
|      |                |                          |               | VALORIZADO   | %       | VALORIZADO | %     | VALORIZADO   | %       | VALORIZADO | %      |
|      |                |                          |               | S/.          |         | S/.        |       | S/.          |         | S/.        |        |
|      | <b>RESUMEN</b> |                          |               |              |         |            |       |              |         |            |        |
| 1.00 |                | OBRAS PROVISIONALES      | 82,337.20     | 77,093.42    | 93.63%  | 5,243.78   | 6.37% | 82,337.20    | 100.00% | 0.00       | 0.00%  |
| 2.00 |                | ESTRUCTURAS              | 229,369.17    | 229,369.16   | 100.00% | 0.00       | 0.00% | 229,369.16   | 100.00% | 0.01       | 0.00%  |
| 3.00 |                | ARQUITECTURA             | 657,993.47    | 646,145.78   | 98.20%  | 6,557.45   | 1.00% | 652,703.23   | 99.20%  | 5,290.24   | 0.80%  |
| 4.00 |                | INSTALACIONES SANITARIAS | 538,192.17    | 537,620.97   | 99.89%  | 571.21     | 0.11% | 538,192.19   | 100.00% | -0.02      | 0.00%  |
| 5.00 |                | INSTALACIONES ELECTRICAS | 484,246.19    | 390,520.39   | 80.65%  | 531.84     | 0.11% | 391,052.23   | 80.75%  | 93,193.96  | 19.25% |
| 6.00 |                | MITIGACION AMBIENTAL     | 13,321.81     | 9,456.31     | 70.98%  | 0.00       | 0.00% | 9,456.31     | 70.98%  | 3,865.50   | 29.02% |
|      |                |                          |               |              |         |            |       |              |         |            |        |
|      |                | COSTO DIRECTO            | 2,005,460.01  | 1,890,206.03 |         | 12,904.28  |       | 1,903,110.30 |         | 102,349.71 |        |
|      |                | GASTOS GENERALES         | 348,950.04    | 328,895.85   |         | 2,245.34   |       | 331,141.19   |         | 17,808.85  |        |
|      |                | UTILIDADES               | 200,546.00    | 189,020.60   |         | 1,290.43   |       | 190,311.03   |         | 10,234.97  |        |
|      |                | SUB - TOTAL              | 2,554,956.05  | 2,408,122.49 | 94.25%  | 16,440.05  | 0.64% | 2,424,562.52 | 94.90%  | 130,393.53 | 5.10%  |
|      |                | IGV                      | 459,892.09    | 433,462.05   |         | 2,959.21   |       | 436,421.25   |         | 23,470.83  |        |
|      |                | TOTAL PRESUPUESTO        | 3,014,848.14  | 2,841,584.54 | 94.25%  | 19,399.26  | 0.64% | 2,860,983.77 | 94.90%  | 153,864.36 | 5.10%  |
