

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

INFORME N° 013-2026-MPA-GDUI-USLO/rot



A : ARQ. ERIC R. AROTOMA LANDEO
Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura

ASUNTO : REMITO INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR (PTE)

REFERENCIA : MEMORANDO MULTIPLE N° 0047-2026/MPA-HVCA-GM/YQS
INFORME N° 001-2026-MPA-GPP-UTIS/jsfm

FECHA : Acobamba, 09 de febrero del 2026.

Por medio del presente es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente a nombre de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, que de acuerdo al documento de la referencia, detallo lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Mediante MEMORANDO MULTIPLE N° 0047-2026/MPA-HVCA-GM/YQS de fecha 05 de febrero del 2026 el Lic. Adm. Yoni Quispe Sullcaray Grente Municipal de la Municipalidad Provincial de Acobamba, solicita remitir información para la actualización del portal de transparencia estándar (PTE) de la Entidad al Arq. Eric R. Arotoma Landeo Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura.



2. ANALISIS

2.1. ORGANO Y/O UNIDAD ORGANICA

- Unidad de Supervision y Liquidacion de Obras – Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

2.2. PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”, con CUI N° 2624570.

| | |
|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA | : Municipalidad Provincial de Acobamba |
| LOCALIDAD | : BARRIO PILLCOSAY – ACOBAMBA - HUANCAMELICA |
| MODALIDAD | : Por Contrata |
| SISTEMA DE CONTRATACION | : Suma alzada |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO PILCOMAX |
| CONTRATO | : N° 050-2024-MPA/GM |
| MONTO REFERENCIAL | : S/ 1,347,930.40 soles |
| MONTO CONTRACTUAL | : S/ 1,346,267.47 soles |
| MONTO DEL DEDUCTIVO DE OBRA ADICIONAL DE OBRA | : S/ 11,973.27 |
| DEDUCTIVO DE OBRA | : Np se tiene adicional de obra |
| PLAZO DE EJECUCION | : 90 días calendarios |
| FECHA DE ENTREGA DE TERRENO | : 03 de octubre del 2024 |
| FECHA DE INICIO DE EJECUC. | : 04 de octubre del 2024 |
| FECHA DE CULMINAC.PROG. | : 01 de enero del 2025 |
| SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUC. | : 31 de diciembre del 2025 |
| FECHA DE REINICIO DE EJECUCION | : 15 de enero del 2025 |
| FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO | : 16 de enero del 2025 |
| FECHA DE CULMINACION REAL | : 17 de enero del 2025 |
| RESIDENTE DE OBRA | : Arq. Prospero Andres De La Cruz Paucar |
| SUPERVISOR DE OBRA | : Ing. Saul Gonzales Acuña |
| ESTADO DE LA OBRA | : Culminado al 100% en proceso de liquidación de obra |


Se logro beneficiar a los pobladores de la Provincia de Acobamba, siendo la cantidad de 38208 pobladores entre niños, adolescentes y adultos (varones y mujeres), la inversión realizada dentro de la provincia de Acobamba y tiene relación con la ejecución de la obra asciende a S/ 1,346,267.47 soles (Un Millon Trecientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Siete con 47/100 soles), actualmente la obra se encuentra culminada y puesta la servicio de la población beneficiaria.



OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE CCARABAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CON CUI 2591998.

| | |
|-----------------------------|---|
| UNIDAD EJECUTORA | : Municipalidad Provincial de Acobamba |
| LOCALIDAD | : C. P. CCARABAMBA |
| DISTRITO | : ACOBAMBA |
| PROVINCIA | : ACOBAMBA |
| DEPARTAMENTO | : HUANCAMELICA |
| MODALIDAD | : Por Contrata |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | : A suma alzada |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO CCARABAMBA |
| CONTRATO | : N° 025-2025-MPA/GM |
| MONTO CONTRACTUAL | : S/ 326,091.12 soles |
| ADICIONAL DE OBRA | : Np se tiene adicional de obra |
| DEDUCTIVO DE OBRA | : No se tiene deductivo de obra |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : 75 días calendarios |
| FECHA DE ENTREGA DE TERRENO | : 29 de mayo del 2025 |
| FECHA DE INICIO DE EJECUC. | : 10 de junio del 2025 |
| FECHA DE CULMINAC.PROG. | : 23 de agosto del 2025 |
| RESIDENTE DE OBRA | : Ing. Jhon Walter Auqui Ayala |
| SUPERVISOR DE OBRA | : Ing. Wilber Ronald Anyosa Escobar |
| ESTADO DE LA OBRA | : Culminado al 100% en proceso de liquidación de obra |

Se logro beneficiar a los pobladores del Centro Poblado de Ccarabamba, siendo la cantidad de 580 pobladores entre niños, adolescentes y adultos (varones y mujeres), la inversión realizada dentro del Centro Poblado de Ccarabamba y tiene relación con la ejecución de la obra asciende a S/ 326.091.12, (Trecientos Ventiseis Mil Noventa y Uno Con 12/100 soles), actualmente la obra se encuentra culminada y puesta la servicio de la población beneficiaria.

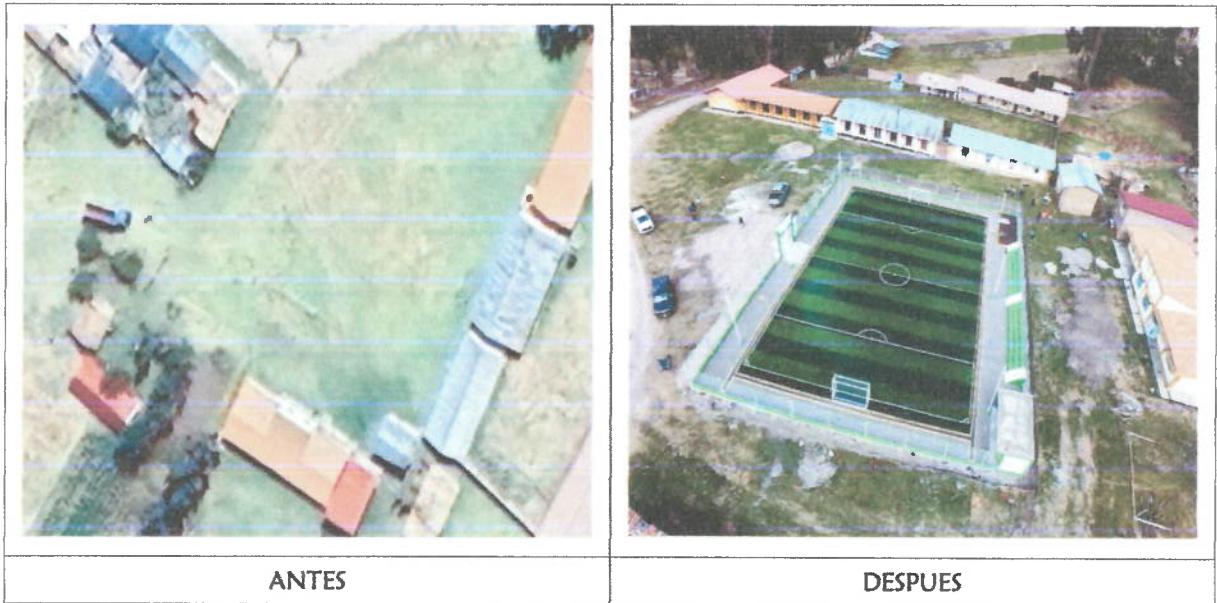

ANTES

DESPUES



OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA) LOCALIDAD DE TUPAC AMARU DE POMAVILCA, DISTRITO DE ACOBAMBA, DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CUI 2677643.

| | |
|-----------------------------|---|
| UNIDAD EJECUTORA | : Municipalidad Provincial de Acobamba |
| UBICACIÓN | : |
| LOCALIDAD | : TUPAC AMARU DE POMAVILCA |
| DISTRITO | : ACOBAMBA |
| PROVINCIA | : ACOBAMBA |
| DEPARTAMENTO | : HUANCAMELICA |
| MODALIDAD | : Por Contrata |
| SISTEMA DE CONTRATACION | : A Suma Alzada |
| CONTRATISTA | : Consorcio A y A |
| CONTRATO | : N° 021-2025-MPA/GM |
| MONTO REFERENCIAL | : S/ 268,311.66 soles |
| MONTO CONTRACTUAL | : S/ 268,311.66 soles |
| ADICIONAL DE OBRA | : Np se tiene adicional de obra |
| DEDUCTIVO DE OBRA | : No se tiene deductivo de obra |
| PLAZO DE EJECUCION | : 60 días calendarios |
| FECHA DE ENTREGA DE TERRENO | : 12 de mayo del 2025 |
| FECHA DE INICIO DE EJECUC. | : 23 de mayo del 2025 |
| FECHA DE CULMINAC.PROG. | : 21 de julio del 2025 |
| RESIDENTE DE OBRA | : Ing. Alfredo Rafael Acero Chocce |
| SUPERVISOR DE OBRA | : Ing. Franklin Hirahoka Huacho Rojas |
| ESTADO DE LA OBRA | : Culminado al 100% en proceso de liquidación de obra |

Se logro beneficiar a los pobladores del Centro Poblado de Tupac Amaru de Pomavilca, siendo la cantidad de 670 pobladores entre niños, adolescentes y adultos (varones y mujeres), la inversión realizada dentro del Centro Poblado de Tupac Amaru de Pomavilca y tiene relación con la ejecución de la obra asciende a S/ 268,311.66 soles, (Doscientos Sesenta y Ocho Mil Trecientos Once con 66/100 soles), actualmente la obra se encuentra culminada y puesta la servicio de la población beneficiaria.



ANTES

DESPUES

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO PEDREGAL Y LA LOMA EN EL CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA – PROVINCIA DE ACOBAMBA – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" con CUI N° 2520285.

| | |
|-----------------------------|---|
| UNIDAD EJECUTORA | : Municipalidad Provincial de Acobamba |
| LOCALIDAD | : BARRIO LA LOMA |
| DISTRITO | : ACOBAMBA |
| PROVINCIA | : ACOBAMBA |
| DEPARTAMENTO | : HUANCAMELICA |
| MODALIDAD | : Por Contrata |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | : Costos Unitarios |
| CONTRATISTA | : EMPRESA CONSTRUCTORA JP SRL |
| CONTRATO | : N° 051-2024-MPA/GM |
| MONTO REFERENCIAL | : S/ 2,264,078.02 soles |
| MONTO CONTRACTUAL | : S/ 2,263,665.02 soles |
| ADICIONAL DE OBRA | : No se tiene adicional de obra |
| DEDUCTIVO DE OBRA | : No se tiene deductivo de obra |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : 105 días calendarios |
| FECHA DE ENTREGA DE TERRENO | : 08 de noviembre del 2024 |
| FECHA DE INICIO DE EJECUC. | : 15 de noviembre del 2024 |
| FECHA DE CULMINAC.PROG. | : 27 de febrero del 2025 |
| RESIDENTE DE OBRA | : Ing. Percy Nicanor Soler Espinoza |
| SUPERVISOR DE OBRA | : Ing. James Baldeon Gonzales |
| ESTADO ACTUAL DE LA OBRA | : Culminado al 100% en proceso de liquidación de obra |

Se logro beneficiar a los pobladores del Barrio La Loma y Pedregal, siendo la cantidad de 1578 pobladores entre niños, adolescentes y adultos (varones y mujeres), la inversión realizada dentro del Barrio La Loma y Pedregal y tiene relación con la ejecución de la obra asciende a S/ 2,264,078.02 (Dos Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Setenta y Ocho con 02/100 soles), actualmente la obra se encuentra culminada y puesta la servicio de la población beneficiaria



MPA

GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO E INFRAESTRUCTURAUNIDAD DE SUPERVISION
Y LIQUIDACIÓN

ANTES

DESPUES

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL PJE. ROSALES, AV. PROCERES, CL. PRECURSORES, PJE. LIBERTAD, PR. MARTIRES, JR. JUNIN, PR. SAENZ PEÑA, AV. EVITAMIENTO OESTE, PJE. SAN AGUSTIN, JR. SANTO TOMAS Y CL LIBIA EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", con CUI N° 2617066.

| | |
|-----------------------------|--|
| UNIDAD EJECUTORA | : Municipalidad Provincial de Acobamba |
| LOCALIDAD | : ACOBAMBA |
| DISTRITO | : ACOBAMBA |
| PROVINCIA | : ACOBAMBA |
| DEPARTAMENTO | : HUANCAMELICA |
| MODALIDAD | : Por Contrata |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | : Costos Unitarios |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO ROSALES |
| CONTRATO | : N° 012-2025-MPA/GM |
| MONTO REFERENCIAL | : S/ 7,283,243.63 soles |
| MONTO CONTRACTUAL | : S/ 6,554,921.07 soles |
| ADELANTO DIRECTO | : S/ 655,492.11 soles |
| ADICIONAL DE OBRA | : Np se tiene adicional de obra |
| DEDUCTIVO DE OBRA | : No se tiene deductivo de obra |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : 210 días calendarios |
| FECHA DE ENTREGA DE TERRENO | : 21 de abril del 2025 |
| FECHA DE INICIO DE EJECUC. | : 06 de mayo del 2025 |
| FECHA DE CULMINAC.PROG. | : 01 de diciembre del 2025 |
| RESIDENTE DE OBRA | : Ing. Alfredo Palacios Tinoco |
| SUPERVISIÓN DE OBRA | : Consorcio Virgen de Cocharcas |
| JEFE DE SUPERVISIÓN | : Ing. Jaime Michel Orellana Huaman |
| ESTADO DE LA OBRA | : En proceso de ejecución de obra |

Se logro beneficiar a los pobladores del Barrio Pilcosay, Calvario, San Blas, Chilcahuaycco y Callcapa, siendo la cantidad de 1578 pobladores entre niños, adolescentes y adultos (varones y mujeres), la inversión realizada dentro del Barrio Barrio Pilcosay, Calvario, San Blas, Chilcahuaycco y Callcapa y tiene relación con la ejecución de la obra asciende a S/ 2,264,078.02 (Dos Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Setenta y Ocho con 02/100 soles), actualmente la obra se encuentra culminada y puesta la servicio de la población beneficiaria




ANTES

DESPUES

OBRA: "RENOVACION DE PUENTE EN EL (LA) PUENTE CHALLHUAPUQUIO; EN EL CAMINO VECINAL R-090264 DEL TRAMO RAYANNIYOCC HACIA ANCCOMARCA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", con CUI N° 2636165.

ENTIDAD CONTRATANTE : Municipalidad Provincial de Acobamba
 UBICACIÓN :
 REGION : Huancavelica
 PROVINCIA : Acobamba
 DISTRITO : Acobamba
 LOCALIDADES : RAYANNIYOCC - ANCCOMARCA
 SISTEMA DE LICITACION : Adjudicación Simplificada
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA : N° 01-2025-MPA/C
 CONTRATISTA : CONSORCIO ANTA
 REPRESENTANTE LEGAL : ELVIS ESTRADA PALACIOS
 CONTRATO DE EJECUCION : CONTRATO N° 028-2025/MPA/GM
 FECHA DE FIRMA DEL CONTRA. : 30 de junio del 2025
 RESIDENTE DE OBRA : ING. MARCOS RAMOS ESTEBAN
 CIP DEL RESIDENTE DE OBRA : N° 271916
 MODALIDAD DE EJECUCION : PRECIOS UNITARIOS
 MONTO CONVOCADO : S/. 1,147,398.79
 MONTO DEL CONTRATO : S/. 1,147,398.79
 SUPERVISION DE OBRA : CONSULTOR Y CONSTRUCTORA ZAVALA & LEON SCRL
 CONTRATO DE SUPERVISOR : CONTRATO N° 29-2025/ MPA/GM
 MONTO CONTRA. SUPERVIS : S/. 20.000.00 Inc. I.G.V.
 JEFE DE SUPERVISION : ING. RONY FRANK CANCHANYA PIÑAS
 CIP DEL SUPERVISOR DE OBRA : CIP114998
 ADICIONAL DE OBRA : Np se tiene adicional de obra
 DEDUCTIVO DE OBRA : No se tiene deductivo de obra
 PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE ENTREGA DE TERRE. : 17 de julio del 2025
 FECHA DE INICIO DE EJECUC. : 23 de julio del 2025
 FECHA DE CULMINAC. PROG. : 20 de octubre del 2025
 FECHA DE CULMINAC. REAL : 20 de octubre del 2025
 ESTADO DE LA OBRA : Culinado al 100% yen proceso de liquidación de obra

Se logro beneficiar a los pobladores del Centro Poblado de Ancomarca y Rayanniyocc, siendo la cantidad de 850 pobladores entre niños, adolescentes y adultos (varones y mujeres), la inversión realizada dentro del Centro Poblado de Ancomarca y Rayanniyocc y tiene relación con la ejecución de la obra asciende a S/ 1,147.398.79 soles, (Un Millon Ciento Cuarenta y Siete Mil Trecientos Noventa y Ocho con 79/100 soles), actualmente la obra se encuentra culminada y puesta la servicio de la población beneficiaria.

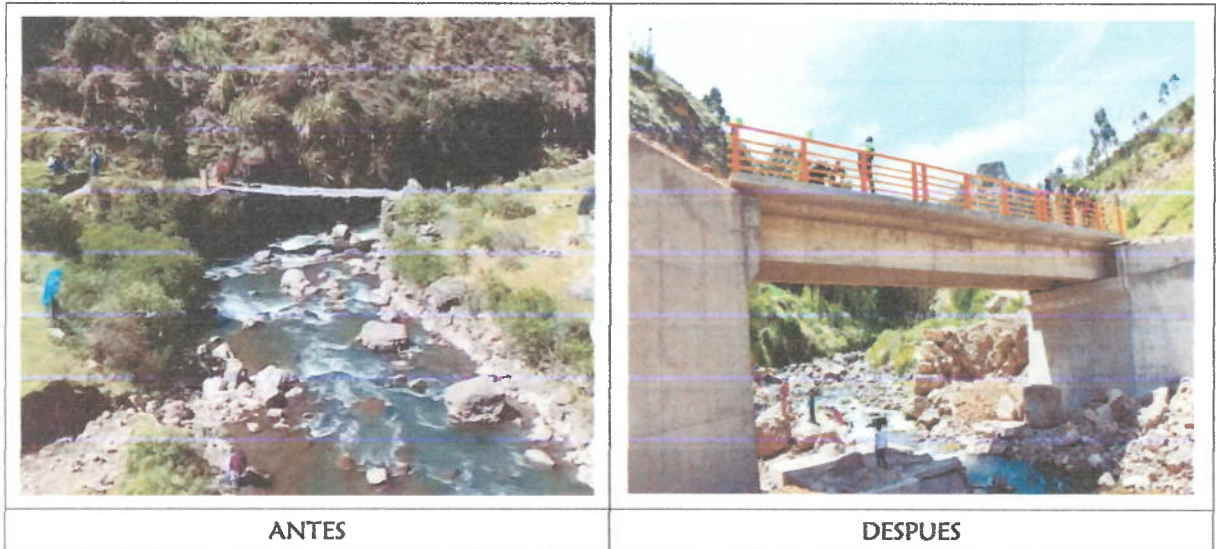

OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE TOTORACCOCHA; EN EL CAMINO VECINAL TRAMO: TOTORACCOCHA - BELLAVISTA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA", con CUI N° 2636005.

| | |
|-----------------------------|---|
| UNIDAD EJECUTORA | : Municipalidad Provincial de Acobamba |
| UBICACIÓN | : |
| LOCALIDAD | : TOTORACCHOCA |
| DISTRITO | : ACOBAMBA |
| PROVINCIA | : ACOBAMBA |
| DEPARTAMENTO | : HUANCAMELICA |
| MODALIDAD | : Por Contrata |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | : A Suma Alzada |
| CONTRATISTA | : Consorcio Bellavista |
| CONTRATO | : N° 037-2025-MPA/GM |
| MONTO REFERENCIAL | : S/ 480,360.19 soles |
| MONTO CONTRACTUAL | : S/ 480,360.19 soles |
| ADICIONAL DE OBRA | : No se tiene adicional de obra |
| DEDUCTIVO DE OBRA | : No se tiene deductivo de obra |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : 45 días calendarios |
| FECHA DE ENTREGA DE TERRENO | : 06 de octubre del 2025 |
| FECHA DE INICIO DE EJECUC. | : 14 de octubre del 2025 |
| FECHA DE CULMINAC.PROG. | : 27 de noviembre del 2025 |
| RESIDENTE DE OBRA | : Ing. Dionisia Rosa Aguirre Gaspar |
| SUPERVISOR DE OBRA | : Ing. Emerson Dávila Tito |
| ESTADO DE LA OBRA | : Culminado al 100% y en proceso de liquidación de obra |

Se logro beneficiar a los pobladores del anexo de Totoraccochac, siendo la cantidad de 978 pobladores entre niños, adolescentes y adultos (varones y mujeres), la inversión realizada dentro del anexo de Totoraccocha y tiene relación con la ejecución de la obra asciende a S/ 480,360.19 soles, (Cuatrocientos Ochenta Mil Trecientos Sesenta con 19/100 soles), actualmente la obra se encuentra culminada y puesta la servicio de la población beneficiaria



OBRA: “RENOVACION DE PUENTE EN EL (LA) PUENTE CHILCAHUAYCCO; EN EL CAMINO VECINAL TRAMO ACOBAMBA – COMUN ERA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”, con CUI N° 2636185.

| | |
|-----------------------------|---|
| UNIDAD EJECUTORA | : Municipalidad Provincial de Acobamba |
| UBICACIÓN | : |
| LOCALIDAD | : ACOBAMBA |
| DISTRITO | : ACOBAMBA |
| PROVINCIA | : ACOBAMBA |
| DEPARTAMENTO | : HUANCAMELICA |
| MODALIDAD | : Por Contrata |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | : A Suma Alzada |
| CONTRATISTA | : Consorcio Chilcahuaycco |
| CONTRATO | : N° 038-2025-MPA/GM |
| MONTO REFERENCIAL | : S/ 519,909.48 soles |
| MONTO CONTRACTUAL | : S/ 519,909.48 soles |
| ADICIONAL DE OBRA | : Np se tiene adicional de obra |
| DEDUCTIVO DE OBRA | : No se tiene deductivo de obra |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : 45 días calendarios |
| FECHA DE ENTREGA DE TERRENO | : 13 de febrero del 2025 |
| FECHA DE INICIO DE EJECUC. | : 03 de noviembre del 2025 |
| FECHA DE CULMINAC.PROG. | : 17 de diciembre del 2025 |
| FECHA DE TERMINO REPROGRAM. | : 27 de diciembre del 2025 |
| RESIDENTE DE OBRA | : Ing. Marcos Ramos Esteban |
| SUPERVISOR DE OBRA | : ing. CARLOS POMA RAMOS |
| RESIDENTE DE OBRA | : Ing. PERCY NICANOR SOLER ESPINOZA |
| ESTADO DE LA OBRA | : Culminado al 100% en proceso de liquidación de obra |

Se logro beneficiar a los pobladores del Barrio Pueblo Viejo y Comun Era, siendo la cantidad de 1978 pobladores entre niños, adolescentes y adultos (varones y mujeres), la inversión realizada dentro Barrio Pueblo Viejo y Comun Era y tiene relación con la ejecución de la obra asciende a S/ 519,909.48 soles, (Quinientos Diecinueve Mil Novecientos Nueve con 48/100 soles), actualmente la obra se encuentra culminada y puesta la servicio de la población beneficiaria.



ANTES


DESPUES



OBRA: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA – HUANCAMELICA” con C.U.I.: 2336948.

| | |
|-----------------------------------|--|
| UNIDAD EJECUTORA | : Municipalidad Provincial de Acobamba |
| LOCALIDAD | : C. P. CHOPCCAPAMPA |
| DISTRITO | : PAUCARA |
| PROVINCIA | : ACOBAMBA |
| DEPARTAMENTO | : HUANCAMELICA |
| MODALIDAD | : Por Contrata |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | : Costos Unitarios |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO EJECUTOR CENTRO Y SUR |
| CONTRATO | : N° 022-2025-MPA/GM |
| MONTO CONTRACTUAL | : S/ 4,607,212.82 soles |
| MONTO ADICIONAL DE OBRA N°01 | : S/ 964,320.57 |
| MONTO DEDUCTIVO DE OBRA N°01 | : S/ 964,600.11 |
| RES. DE APROB. ADIC Y DEDUC. N°01 | : R. G. N° 079-2025/MPA-HVCA-GDUI |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : 165 días calendarios |
| FECHA DE ENTREGA DE TERRENO | : 29 de mayo del 2025 |
| FECHA DE INICIO DE EJECUC. | : 10 de junio del 2025 |
| FECHA DE CULMINAC.PROG. | : 21 de noviembre del 2025 |
| FECHA DE SUSP. DE PLAZO | : 01 de julio del 2025 |
| FECHA DE REINIC. DE PLAZO | : 19 de setiembre del 2025 |
| FECHA DE CULM. REPORG. | : 09 de febrero del 2026 |
| RESIDENTE DE OBRA | : Ing. Cristian Victor Espinoza Daniel |
| SUPERVISIÓN DE OBRA | : Consorcio Consultores Ayacucho |
| JEFE DE SUPERVISIÓN | : Ing. Teófilo Navarro Muñoz |
| ESTADO ACTUAL DE LA OBRA | : En proceso de ejecución |

Se logro beneficiar a los pobladores del Centro Poblado de Chopccapampa, siendo la cantidad de 2978 pobladores entre niños, adolescentes y adultos (varones y mujeres), la inversión realizada dentro del Centro Poblado de Chopccapampa y tiene relación con la ejecución de la obra asciende a S/ 4,607,212.82 (Cuatro Millones Seiscientos Siete Mil Doscientos Doce con 82/100 soles), actualmente la obra se encuentra en proceso de ejecución.

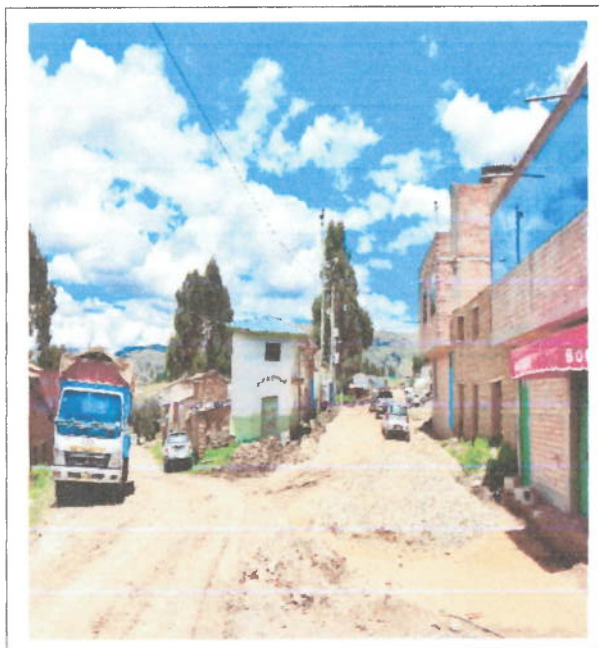

ANTES



DESPUES



OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA DE LA PROVINCIA ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO HUANCAMELICA", con CUI: 2587682.

| | |
|-----------------------------|--|
| UNIDAD EJECUTORA | : Municipalidad Provincial de Acobamba |
| LOCALIDAD | : CHOPCCAPAMPA |
| DISTRITO | : PAUCARA |
| PROVINCIA | : ACOBAMBA |
| DEPARTAMENTO | : HUANCAMELICA |
| MODALIDAD | : Por Contrata |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | : Esquema Mixto de Tarifas y Suma Alzada |
| CONTRATISTA | : FREDY ENCISO HUAMAN |
| CONTRATO | : N° 046-2025-MPA/GM |
| MONTO REFERENCIAL | : S/ 73,791.35 soles |
| MONTO CONTRACTUAL | : S/ 73,000.00 soles |
| ADICIONAL DE OBRA | : Np se tiene adicional de obra |
| DEDUCTIVO DE OBRA | : No se tiene deductivo de obra |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : 150 días calendarios |
| FECHA DE ENTREGA DE TERRENO | : 14 de noviembre del 2025 |
| FECHA DE INICIO DE EJECUC. | : 15 de noviembre del 2025 |
| FECHA DE CULMINAC.PROG. | : 12 de febrero del 2026 |
| RESIDENTE DE OBRA | : Ing. Marco Antonio Velasquez Paredes |
| SUPERVISIÓN DE OBRA | : Ing. Fredy Enciso Huaman |

Se logro beneficiar a los pobladores del Centro Poblado de Chopccapampa, siendo la cantidad de 2978 pobladores entre niños, adolescentes y adultos (varones y mujeres), la inversión realizada dentro del Centro Poblado de Chopccapampa y tiene relación con la ejecución de la obra asciende a S/ 1,444,057.80 (Un Millon Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Cincuenta y Siete con 80/100 soles), actualmente la obra se encuentra en proceso de ejecución.



MPA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

08



ANTES

DESPUES



OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL SECTOR ÑAHUINCUCHO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE ÑAHUINCUCHO, DISTRITO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", con CUI N° 2590779.

| | |
|-----------------------------|--|
| UNIDAD EJECUTORA | : Municipalidad Provincial de Acobamba |
| LOCALIDAD | : ACOBAMBA |
| DISTRITO | : ACOBAMBA |
| PROVINCIA | : ACOBAMBA |
| DEPARTAMENTO | : HUANCAMELICA |
| MODALIDAD | : Por Contrata |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | : Costos Unitarios |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO VIAL ANTA |
| CONTRATO | : N° 044-2025-MPA/GM |
| MONTO REFERENCIAL | : S/ 6,925.787.64 soles |
| MONTO CONTRACTUAL | : S/ 6,925.787.64 soles |
| ADICIONAL DE OBRA | : Np se tiene adicional de obra |
| DEDUCTIVO DE OBRA | : No se tiene deductivo de obra |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : 180 días calendario |
| FECHA DE ENTREGA DE TERRENO | : 28 de noviembre del 2025 |
| FECHA DE INICIO DE EJECUC. | : 02 de diciembre del 2025 |
| FECHA DE CULMINAC.PROG. | : 30 de mayo del 2026 |
| RESIDENTE DE OBRA | : Ing. Rubén Darío Palomino Torres |
| SUPERVISIÓN DE OBRA | : Consorcio Prisma |
| JEFE DE SUPERVISIÓN | : Ing. Augusto Alfonso Ponce Farfán |
| ESTADO ACTUAL DE LA OBRA | : En proceso de ejecución |

Se logro beneficiar a los pobladores del Centro Poblado de Ñahuincucho, siendo la cantidad de 1678 pobladores entre niños, adolescentes y adultos (varones y mujeres), la inversión realizada dentro del Centro Poblado de Ñahuincucho y tiene relación con la ejecución de la obra asciende a S/ 6,925.787.64 (Seis Millones Novecientos Venticinco Mil Setecientos Ochenta y Siete con 64/100 soles), actualmente la obra se encuentra en proceso de ejecución.



ANTES


DESPUES

3. CONCLUSIONES

Notificar el presente informe al Lic. Adm. Yoni Quispe Sullcaray Grente Municipal de la Municipalidad Provincial de Acobamba para hacer de conocimiento referente a la información solicitada.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y aprobra via acto resolutivo.

Atentamente.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
Gerente Municipal
Yoni Quispe Sullcaray
(e) DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
PASE A: *Carretera*
su atención
FECHA: 11 FEB 2026
GERENTE DE D. U. I.
