


INFORME DE SUPERVISIÓN:
VALORIZACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA N° 02
(DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025)

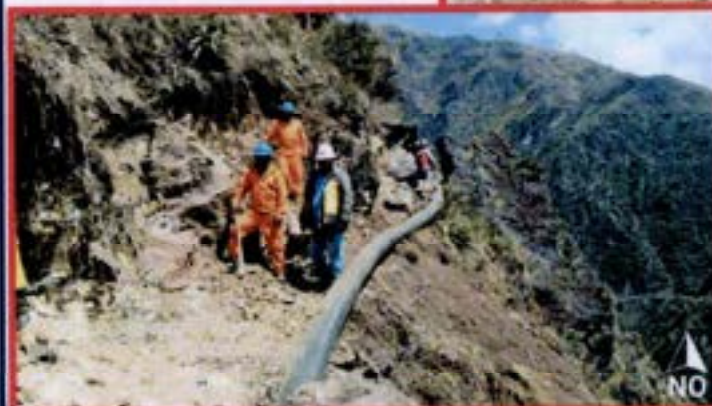

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ING. JERONIMO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N°: 73537

JEFE DE SUPERVISIÓN: ING. JERONIMO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE - 2025

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ALCIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
CIP: 13127094
REPRESENTANTE COMUN

CONTENIDO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ING. JERÓNIMO ANTONIO RANDAN RODRÍGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N°: 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127094
REPRESENTANTE COMUN

CONTENIDO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
2. RESUMEN DE PAGO DE VALORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN
3. INFORME DE SUPERVISOR DE OBRA SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES, INCLUYENDO EL CONTROL AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICO.
4. INFORME DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.
5. INFORME DE CONTROL TOPOGRÁFICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUIRÁ DECISIONES TÉCNICAS TOMADAS EN CAMPO.
6. CUADRO DE VALORIZACIÓN DE OBRA MENSUAL DE LA SUPERVISIÓN.
7. CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO DE LA OBRA.
8. CUADRO DE CURVA "S" DE AVANCE DE OBRA.
9. CERTIFICADO DE PAGO Y CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA TRAMITADO.
10. PANEL FOTOGRÁFICO DE AVANCE DEL MES.
11. CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRAS Y EQUIPO TÉCNICO.
12. COPIA DE LOS CARGOS DE DOCUMENTOS CURSADOS Y RECIBIDOS ENTRE: CONTRATISTA, ENTIDAD Y SUPERVISIÓN.
13. IMPRESIÓN DEL CUADERNO DE INCIDENCIAS DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES VALORIZADO.
14. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE OBRA (SOLO EN LA PRIMERA VALORIZACIÓN).
15. COPIA DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO VIGENTE.
16. COPIA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA DE SUPERVISIÓN DE OBRA.
17. ACTA DE TÉRMINO DE OBRA (EN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN)

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRÍGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N°: 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127090
REPRESENTANTE COMÚN

1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA


ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRÍGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N°: 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA


ALCIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127090
REPRESENTANTE COMÚN

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**DATOS REFERIDOS A LA OBRA**

PROCESO DE SELECCIÓN	: NO COMPETITIVO-DIRECTA-N°002-2025-MINAGRI-AGRORUR-1
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	: CONTRATO N°064-2025-MIDAGRI-AGRORURAL
EMPRESA PRIVADA	: CONSORCIO LUZ DE MARÍA. conformado por las empresas ARCAVAS CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L. & IZZYETHAN CONSTRUCCIONES S.A.C
REPRESENTANTE LEGAL	: SR. LUIS MANUEL TEMOCHE CACERES, N° DNI:72040098
MONTOS PRESUPUESTO	: S/ 2,392,865.12 soles
MONTOS PRESUPUESTO OFERTADO	: S/ 2,390,000.00 soles
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	: Monto: S/ 239,000.00 soles; (10% por REMYPE).
ADELANTO DIRECTO	: S/ 239,000.00 soles (Inc. IGV)
ADELANTO DE MATERIALES	: No solicitado a la fecha
ADICIONALES (M.T.O.)	: No solicitado a la fecha
DEDUCTIVOS	: No presentado a la fecha
FECHAS DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	: 17 de julio de 2025
PLAZO EJECUCIÓN	: 120 días calendario
ENTREGA DE TERRENO	: 21/08/2025
INICIO DE OBRA	: 22/08/2022
AMPLIACIONES DE PLAZO	: No solicitado a la fecha
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA	: 19/12/2025
MONTOS VALORIZADOS	: Valorización obra N° 01: S/ 144,586.33, soles (Inc. IGV) Valorización obra N° 02: S/ 693,067.63, soles (Inc. IGV)
MONTOS VALORIZADOS ADICIONALES	: No corresponde
PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO	: 29.00 %
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	: 31.57 %
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO EJECUTADO	: 35.05 %
SITUACIÓN DE LA OBRA	: ADELANTADO
RESIDENTE DE OBRA	: Ing. Miguel Eduardo Campos Quintana CIP N° 69418

DATOS REFERIDOS A LA SUPERVISIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN	: NO COMPETITIVO-DIRECTA-N°012-2025-MINAGRI-AGRORUR-1
CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	: CONTRATO N°076-2025-MIDAGRI-AGRORURAL

CONSORCIO SUPERVISOR ROKAVA
ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROKAVA
ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127096
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

INFORME DE SUPERVISIÓN
VALORIZACION DEL SEVICIO DE
CONSULTORIA N° 02-SEPTIEMBRE-2025

ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA : CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA conformado por las
empresas JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO & JUAN
CARLOS CORDOVA SALVADOR

REPRESENTANTE LEGAL : Sra. Aleida Zegarra Villavicencio, N° DNI:03127096

MONTOS DE PROPUESTA ECONÓMICA : S/ 140,500.00 soles (Inc. IGV)

ADICIONALES : No solicitado a la fecha

DEDUCTIVO : No presentado a la fecha

FECHAS DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 14/08/2025

INICIO DE LOS SERVICIOS : 22/08/2025

AMPLIACIONES DE PLAZO : No solicitado a la fecha

FIN DE LOS SERVICIOS : 19/12/2025

MONTOS VALORIZADOS CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

Valorización de Supervisión N° 01: S/ 11,118.33 soles

Valorización de Supervisión N° 02: S/ 33,355.00 soles

PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO : 23.74 %

JEFE DE SUPERVISIÓN : Ing. Jerónimo Antonio Rondan Rodríguez; CIP N° 73537

MONTO A FACTURAR : S/ 33,355.00 soles (Inc. IGV)

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA
Ing. Jerónimo Antonio Rondan Rodríguez
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA
ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127096
REPRESENTANTE COMÚN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME DE VALORIZACION DE OBRA N° 02

RECIBIDO
DNI 03127096
06/10/25

Asunto : VALORIZACION DE OBRA N°02-SEPTIEMBRE-2025, de la obra "SALDO DE OBRA "CONSTRUCCION CANAL RIEGO TAMBO – VISTA ALEGRE – CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA – CONCEPCION – JUNIN", CUI N°2136236"

Referencia :
a). -CONTRATO N°076-2025-MIDAGRI-AGRO RURAL (Supervisión de obra)

Fecha : 05 de octubre 2025

I. DATOS GENERALES

OBRA : SALDO DE OBRA "CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TAMBO – VISTA ALEGRE – CHURAY, DISTRITO ANDAMARCA – CONCEPCION – JUNIN

CODIGO UNICO DE INVERSIÓN : CUI N°2136236

BENEFICIARIOS DIRECTOS : 84 familias y 185 Ha de los centros poblados Tambo – Vista Alegre - Churay, quienes pertenecen a la Junta de Usuarios Sector Hidráulico Menor Mantaro – ALA Mantaro

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO : Desarrollo sostenido e integral de las poblaciones asentadas en el ámbito rural, promoviendo proyectos de desarrollo rural y negocios agrarios que les permita integrarse a los mercados, nacional e internacional y de esta manera incrementar sus ingresos económicos y por consiguiente mejorar su nivel de vida

OBJETIVOS ESPECIFICOS : Dejar habilitado y en total funcionamiento el canal de riego Tambo – Vista Alegre- Churay.Rehabilitar las cámaras de inspección, válvulas, rompe presión y distribución. Reemplazar la tubería de conducción dañada. Construcción de cámaras de inspección, válvulas, rompe presión y distribución.

DATOS REFERIDOS A LA OBRA

PROCESO DE SELECCIÓN :NO COMPETITIVO-DIRECTA-N°002-2025-MINAGRI-AGRORUR-1

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA : CONTRATO N°064-2025-MIDAGRI-AGRORURAL

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA
ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA
ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127096
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

INFORME DE SUPERVISIÓN
VALORIZACION DEL SEVICIO DE
CONSULTORIA N° 02-SEPTIEMBRE-2025

EMPRESA PRIVADA	: CONSORCIO LUZ DE MARÍA, conformado por las empresas ARCAVAS CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L. & IZZYETHAN CONSTRUCCIONES S.A.C
REPRESENTANTE LEGAL	: SR. LUIS MANUEL TEMOCHE CACERES, N° DNI:72040098
MONTOS PRESUPUESTO	: S/ 2,392,865.12 soles
MONTOS PRESUPUESTO OFERTADO	: S/ 2,390,000.00 soles
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	: Monto: S/ 239,000.00 soles; (10% por REMYPE).
ADELANTO DIRECTO	: S/ 239,000.00 soles (Inc. IGv)
ADELANTO DE MATERIALES	: No solicitado a la fecha
ADICIONALES (M.T.O.)	: No solicitado a la fecha
DEDUCTIVOS	: No presentado a la fecha
FECHAS DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	: 17 de Julio de 2025
PLAZO EJECUCIÓN	: 120 días calendario
ENTREGA DE TERRENO	: 21/08/2025
INICIO DE OBRA	: 22/08/2022
AMPLIACIONES DE PLAZO	: No solicitado a la fecha
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA	: 19/12/2025
MONTOS VALORIZADOS	: Valorización obra N° 01: S/ 144,586.33, soles (Inc. IGv) Valorización obra N° 02: S/ 693,067.63, soles (Inc. IGv)
MONTOS VALORIZADOS ADICIONALES	: No corresponde
PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO	: 29.00 %
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	: 31.57 %
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO EJECUTADO	: 35.05 %
SITUACIÓN DE LA OBRA	: ADELANTADO
RESIDENTE DE OBRA	: Ing. Miguel Eduardo Campos Quintana CIP N° 69418
DATOS REFERIDOS A LA SUPERVISIÓN	
PROCESO DE SELECCIÓN	: NO COMPETITIVO-DIRECTA-N°012-2025-MINAGRI- AGRORUR-1
CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	: CONTRATO N°076-2025-MIDAGRI-AGRORURAL
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA	: CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA conformado por las empresas JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO & JUAN CARLOS CORDOVA SALVADOR
REPRESENTANTE LEGAL	: Sra. Aleida Zegarra Villavicencio, N° DNI:03127096
MONTOS DE PROPUESTA ECONÓMICA	: S/ 140,500.00 soles (Inc. IGv)
ADICIONALES	: No solicitado a la fecha
DEDUCTIVO	: No presentado a la fecha

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127096
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

INFORME DE SUPERVISIÓN
VALORIZACION DEL SEVICIO DE
CONSULTORIA N° 02-SEPTIEMBRE-2025

FECHAS DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	: 14/08/2025
INICIO DE LOS SERVICIOS	: 22/08/2025
AMPLIACIONES DE PLAZO	: No solicitado a la fecha
FIN DE LOS SERVICIOS	: 19/12/2025
MONTOS VALORIZADOS CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	
	Valorización de Supervisión N° 01: S/ 11,118.33 soles
	Valorización de Supervisión N° 02: S/ 33,355.00 soles
PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO	: 23.74 %
JEFE DE SUPERVISIÓN	: Ing. Jerónimo Antonio Rondan Rodríguez; CIP N° 73537
MONTO A FACTURAR	: S/ 33,355.00 soles (Inc. IGV)

II. ANTECEDENTES

- Mediante Resolución de aprobación de Expediente Técnico, de fecha 11/03/2024, El Expediente técnico de Saldo Obra es aprobado mediante RESOLUCION Jefatural N° 012-2024- MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURALDE/UIR" por contrata con precios vigentes al mes diciembre de 2023 Asimismo, se aprobó la Actualización de presupuesto del expediente mediante Resolución Jefatural N° 0065-2025-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR de fecha 13/03/2025.
- Mediante Contrato de consultoría, de fecha 14/08/2025, se materializa el servicio de la Supervisión de la ejecución de obra: **"SALDO DE OBRA "CONSTRUCCION CANAL RIEGO TAMBO – VISTA ALEGRE – CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA – CONCEPCION – JUNIN", CUI N°2136236"**, con el CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA.
- Mediante Contrato de obra, de fecha 17/07/2025, se materializa la ejecución de la obra: **"SALDO DE OBRA "CONSTRUCCION CANAL RIEGO TAMBO – VISTA ALEGRE – CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA – CONCEPCION – JUNIN", CUI N°2136236"**, con el CONSORCIO LUZ DE MARIA.
- Mediante Acta de Entrega de terreno, de fecha 21/08/2025, se dio inicio el 22/08/2025 a la ejecución de la obra: **"SALDO DE OBRA "CONSTRUCCION CANAL RIEGO TAMBO – VISTA ALEGRE – CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA – CONCEPCION – JUNIN", CUI N°2136236"**

III. OBRAS PROYECTADAS

- ✓ Rehabilitación en la progresiva 1+160 a 1+181 ubicado en la catarata, tubería RIB LOC de 250mm una longitud de 21m.
- ✓ Rehabilitación en la progresiva 4+120 después de la CI-23 hasta la progresiva 4+517 ubicada en la CI-24 con tubería HDPE de 315mm en una longitud de 397m.
- ✓ Instalar tubería RIB LOC de 350mm una longitud de 71m.
- ✓ Instalar tubería RIB LOC de 350mm una longitud de 220m.
- ✓ Cambio de tuberías en 26m en el canal de conducción.
- ✓ Rehabilitar 38 cámaras de inspección.

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA
ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127000
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA
ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRÍGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

INFORME DE SUPERVISIÓN
VALORIZACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA N° 02-SEPTIEMBRE-2025

- ✓ Rehabilitar 28 cámaras de válvulas.
- ✓ Rehabilitar 120 cámaras de distribución.
- ✓ Rehabilitar 32 cámaras rompe presión.
- ✓ Instalación de 1,490m de tubería 2" PVC C-10.
- ✓ Construcción 02 cámaras de inspección.
- ✓ Construcción 02 cámaras de válvula.
- ✓ Construcción 26 cámaras de distribución.
- ✓ Construcción 11 cámaras rompe presión.

IV. UBICACIÓN

La ubicación política del área de estudio es:

Localidad : CP Tambo- Vista Alegre - Churuy
 Distrito : Andamarca
 Provincia : Concepción
 Departamento : Junín

Ubicación del distrito de Andamarca


Departamento Junín



Provincia de Concepción.



Distrito de Andamarca

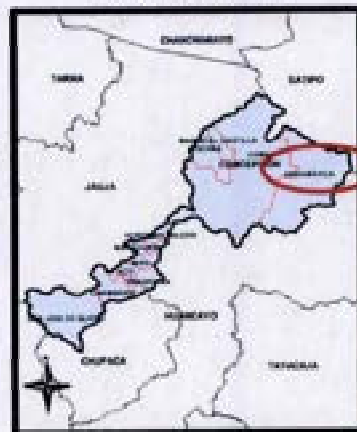

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ALFEDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
 DNI: 03127000
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRÍGUEZ
 AL. DE SUPERVISIÓN
 CIP N°: 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

**INFORME DE SUPERVISIÓN
VALORIZACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA N° 02-SEPTIEMBRE-2025**

Ubicación Geográfica del Canal **SISTEMA UTM - WGS84**

Inicio del Tramo

Coordenada Este: 514.602mE
Coordenada Norte: 8.710.799mN
Altitud: 3.768.00 m.s.n.m

Ubicación Hidrográfica:

Rio Tambo.

LÍMITES

Por el Norte: Cuenca de Runatullo.
Por el Sur: Cuenca de Comas
Por el Oeste: Cuenca Andamarca
Por el Este: Cuenca Mantaro

Ubicación Hidrográfica:

Región Hidrográfica : Atlántico
Cuenca : Mantaro
Sub-Cuenca : Tambo
Autoridad Administrativa del Agua : Mantaro
ALA : Mantaro

V. RESUMEN DE TRABAJOS EFECTUADOS EN EL MES

El Jefe de Supervisión otorga conformidad a las diversas actividades supervisadas mediante el registro en el cuaderno de obra. Durante el mes de agosto de 2025, las actividades principales fueron:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
01	OBRAS PROVISIONALES		
01.02	Almacén y caseta de guardiana	m2	32.08
01.03	Instalación de polvorín	und	2.00
02	LINEA DE CONDUCCIÓN		
02.01	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION		
02.01.01	Trazo, nivelación y replanteo	m	190.00
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.01	Excavación en material suelto	m3	289.81
02.02.03	Excavación en roca Fija	m3	498.87
02.02.04	Eliminación de material excedente	m3	597.36
03	LINEA DE DISTRIBUCIÓN		
03.01	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN		
03.01.01	Trazo, nivelación y replanteo	m	12.68
03.01.02	Excavación en material suelto	m3	312.62
03.01.03	Relleno con material propio seleccionado	m3	142.00
03.01.04	Eliminación de material excedente	m3	130.00
03.01.05	Preparación de cama de apoyo	m	1,060.00
03.01.06	Suministro e Instalación de tubería PVC SAP C-10 2"	m	1,060.00
03.01.07	Prueba hidráulica	m	1,060.00
04	CÁMARA DE INSPECCION		
04.01	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCION		
04.01.01	Trazo, nivelación y replanteo	m	2.00
04.01.02	Excavación en material suelto	m3	1.73
04.01.03	Eliminación de material excedente	m3	1.73
04.02	REHABILITACION CÁMARA DE INSPECCION		
04.02.01	Limpieza de cámara de inspección	und	15.00

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

Ing. Jerónimo Antonio Rondon Rodríguez / CIP N°: 73537
Jefe de Supervisión

Ing. Jerónimo Antonio Rondon Rodríguez / CIP. 73537 / Jefe de Supervisión / Cel. 950892310

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA
ALBA ZEGARRA VILLAVICENCIO
CNE: 03127096
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

INFORME DE SUPERVISIÓN
VALORIZACION DEL SEVICIO DE
CONSULTORIA N° 02-SEPTIEMBRE-2025

04.02.02	CONSTRUCCIÓN DE TAPA DE CONCRETO		
04.02.02.01	TAPA TIPO 1 (GRANDE)		
04.02.02.01.03	Acero en Losa de Fondo $F_y=4200 \text{ Kg/cm}^2$	kg	328.00
06	CAMARA DE DISTRIBUCION		
06.02	REHABILITACION DE CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN		
06.02.01	Limpieza de cámara de distribución	und	34.00
08	BOCATOMA		
08.01	Limpieza general de bocatoma	m2	42.00
09	DESARENADOR		
09.01	Limpieza de desarenador	m2	30.00
10	FLETE		
10.01	FLETE TERRESTRE	und	0.20
10.02	FLETE RURAL	und	0.30
10.03	FLETE PARA EXPLOSIVOS	und	1.00
11	SEGURIDAD Y SALUD		
11.02	Señalización temporal de seguridad	GLB	0.20
11.03	Equipo de protección individual	GLB	0.15
11.04	Equipo de protección colectiva	GLB	0.15
12	MITIGACION AMBIENTAL		
12.01	Mitigación Ambiental	GLB	0.30

PARTIDAS EJECUTADAS

01 OBRAS PRELIMINARES

01.02. ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA

DESCRIPCIÓN:

Consistió en que de acuerdo a las necesidades de la obra se incluyó y contemplo la construcción de almacén y caseta de guardiania para: Oficina, almacén y guardiania.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V) (costo directo)	%
01.02	Almacén y caseta de guardiania	m2	35.00	3.614.45	Avance del Mes	32.08	3,312.90	91.66%
					Avance Acumulado Actual	35.00	3,614.45	100.00%
					Saldo por Pagar	0.00	0.00	0.00%

01.03. INSTALACION DE POLVORIN

DESCRIPCIÓN:

Se instalo dos containeres para colocar los explosivos, en uno de los containeres se colocó la dinamita y en el otro los accesorios, con la finalidad de cumplir con los parámetros solicitados por el SUCAMEC y los trámites necesarios para poder utilizar los explosivos en la excavación en la voladura controlada. La ubicación del polvorin cumple con las medidas y distancia de seguridad establecidas en la directiva de la SUCAMEC.

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ
ALTA DE SUPERVISIÓN
CIP N°: 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ACEIDA ZEGARRIA VILLAVICENCIO
DNI: 03127096
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

INFORME DE SUPERVISIÓN
VALORIZACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA N° 02-SEPTIEMBRE-2025

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/ (.costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V) (costo directo)	%
01.03	Instalación de polvorin	und	2.00	16,003.08	Avance del Mes	2.00	16,003.08	100.00%
					Avance Acumulado Actual	2.00	16,003.08	100.00%
					Saldo por Pagar	0.00	0.00	0.00%

02 LINEA DE CONDUCCION

02.01 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION

02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

DESCRIPCIÓN:

Se realizo todos los trabajos topográficos necesarios dentro del área total de trabajo, que han permiten delimitar la zona donde se ejecutaran los trabajos de toda la obra. Se trazo en el terreno a partir de un bench mark, trabajos que incluyen el control estricto y permanente de las cotas, dimensiones y profundidades durante todo el proceso de ejecución del movimiento de tierras según lo especificado en los planos y aprobados por la Supervisión y/o Inspección.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/ (.costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V) (costo directo)	%
02.01.01	Trazo, nivelación y replanteo	m	6,940.00	49,204.60	Avance del Mes	190.00	1,347.10	2.74%
					Avance Acumulado Actual	5,940.00	42,114.60	85.59%
					Saldo por Pagar	1,000.00	7,090.00	14.41%

02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO

DESCRIPCIÓN:

Los trabajos que comprenden este ítem fueron: el suministro y puesto a disposición de todos los equipos, materiales y herramientas, en cuanto a excavación, acarreo y descarga del material sobrante. La excavación se realizó manualmente, apoyado con mano de obra no calificada, lampas y carretillas para el refine de la sección excavada. Comprende también todos los cortes y refines de taludes, así como la preparación del fondo de las excavaciones para las obras que se van a construir sobre él. Las secciones, alineamientos y perfiles de la línea de distribución y zanjas indicadas en los planos, son susceptibles de cambios, como resultado de las características del subsuelo o cualquier otra causa que considere justo.

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA


ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDÁN RODRÍGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N°: 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA


ALCIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127090
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

INFORME DE SUPERVISIÓN
VALORIZACION DEL SEVICIO DE
CONSULTORIA N° 02-SEPTIEMBRE-2025

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Preco Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V) (costo directo)	%
02.02.01	Excavación en material suelto	m3	368.71	19,246.66	Avance del Mes	289.81	15,128.08	78.60%
					Avance Acumulado Actual	368.71	19,246.66	100.00%
					Saldo por Pagar	0.00	0.00	0.00%

02.02.03 EXCAVACION EN ROCA FUA

DESCRIPCIÓN:

Comprendió la excavación de masas de rocas mediana o fuertemente litificadas que, debido a su cementación y consolidación, requieren el empleo sistemático de explosivos. Se ha realizado la excavación de la línea de conducción en roca fija. Está constituido por terreno normal, mezclado con bolonería de diámetros de 8" hasta 20", la extracción se realizó con pionjer en con roca fragmentada de volúmenes 10 dm3 hasta 66 dm3 con empleo de equipos de rotura y/o explosivos. Para este caso se excavo un ancho de 2.00 m por una altura de 2.00m en una longitud de 20.00 m.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Preco Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V) (costo directo)	%
02.02.03	Excavación en roca Fija	m3	1,031.97	458,906.74	Avance del Mes	498.87	221,842.50	48.34%
					Avance Acumulado Actual	498.87	221,842.50	48.34%
					Saldo por Pagar	533.10	237,064.24	51.66%

02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

DESCRIPCIÓN:

Se ejecutaron después de las excavaciones, el material extraído que no va a ser utilizado en rellenos fue eliminado, al igual de todo el desmonte obtenido en el proceso constructivo. El material excedente es eliminado del lugar de la Obra, siendo cargado a carretillas y transportados y evacuados hasta una distancia de 100 m. en lugares donde se colocarán los desmontes, este material excedente es producto de las excavaciones realizadas para las estructuras, las cuales no son usadas para relleno.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Preco Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V) (costo directo)	%
02.02.04	Eliminación de material excedente	m3	1,551.77	161,275.46	Avance del Mes	597.16	62,083.62	38.50%
					Avance Acumulado Actual	702.71	73,032.65	45.28%
					Saldo por Pagar	849.06	88,242.81	54.72%

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA
Ing. Jerónimo Antonio Rondan Rodríguez
Jefe de Supervisión

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA
Ing. JESSICA VILLAVIGENCIO
CIP: 73537 / Cel: 950632310
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Jerónimo Antonio Rondan Rodríguez / CIP. 73537 / Jefe de Supervisión / Cel: 950632310

120

03. LINEA DE DISTRIBUCION

03.01. CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION

03.01.01. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

DESCRIPCION:

Se realizo todos los trabajos topográficos necesarios dentro del área total de trabajo, que han permiten delimitar la zona donde se ejecutaran los trabajos de toda la obra. Se trazo en el terreno a partir de un bench mark, trabajos que incluyen el control estricto y permanente de las cotas, dimensiones y profundidades durante todo el proceso de ejecución del movimiento de tierras según lo especificado en los planos y aprobados por la Supervisión y/o Inspección.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Predo Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V.) (costo directo)	%
03.01.01	Trazo, nivelación replanteo	y/m	1,500.00	10,635.00	Avance del Mes	12.68	89.90	0.85%
					Avance Acumulado Actual	1,500.00	10,635.02	100.00%
					Saldo por Pagar	0.00	-0.02	0.00%

03.01.02. EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO

DESCRIPCION:

Los trabajos que comprenden este ítem fueron: el suministro y puesto a disposición de todos los equipos, materiales y herramientas, en cuanto a excavación, acarreo y descarga del material sobrante. La excavación se realizó manualmente, apoyado con mano de obra no calificada, lampas y carretillas para el refine de la sección excavada. Comprende también todos los cortes y refines de taludes, así como la preparación del fondo de las excavaciones para las obras que se van a construir sobre él. Las secciones, alineamientos y perfiles de la línea de distribución y zanjas indicadas en los planos, son susceptibles de cambios, como resultado de las características del subsuelo o cualquier otra causa que considere justo.

Partida	Descripción	Und	Metrado	Predo Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V.) (costo directo)	%
03.01.02	Excavación en material suelto	m3	349.30	18,233.46	Avance del Mes	312.62	16,318.76	89.50%
					Avance Acumulado Actual	349.30	18,233.46	100.00%
					Saldo por Pagar	0.00	0.00	0.00%

03.01.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

DESCRIPCION:

Se ejecutaron con el material del sitio y área de trabajo de acuerdo con las especificaciones y de conformidad con los alineamientos, rasantes, secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos. Se tomaron las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que protegerá las

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

Ing. Fernando Antonio Rondan Rodríguez / CIP. 73537 / Jefe de Supervisión
AL. DE SUPERVISIÓN
CIP N°: 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127096
REPRESENTANTE COMÚN

estructuras. El material para la formación del relleno es colocado en capas horizontales de 15 a 30 cm. de espesor, y abarcan todo el ancho de la sección y son esparcidas suavemente. Los rellenos por capas horizontales son ejecutados en una longitud que hacen factible los métodos de acarreo, mezcla, riego o secado y compactación usados.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Preco Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V.) (costo directo)	%
03.01.03	Relleno con material propio seleccionado	m3	202.50	8,877.50	Avance del Mes	142.00	6,225.28	70.12%
					Avance Acumulado Actual	142.00	6,225.28	70.12%
					Saldo por Pagar	60.50	2,652.32	29.88%

03.01.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE**DESCRIPCIÓN:**

Se ejecutaron después de las excavaciones, el material extraído que no va a ser utilizado en rellenos fue eliminado, al igual de todo el desmonte obtenido en el proceso constructivo. El material excedente es eliminado del lugar de la Obra, siendo cargado a carretillas y transportados y evacuados hasta una distancia de 100 m. en lugares donde se colocarán los desmontes, este material excedente es producto de las excavaciones realizadas para las estructuras, las cuales no son usadas para relleno.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Preco Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V.) (costo directo)	%
03.01.04	Eliminación de material excedente	m3	146.80	15,256.92	Avance del Mes	130.00	13,510.90	88.56%
					Avance Acumulado Actual	130.00	13,510.90	88.56%
					Saldo por Pagar	16.80	1,746.02	11.44%


03.01.05. PREPARACION DE CAMA DE APOYO**DESCRIPCIÓN:**

Se realizó la preparación de cama de apoyo para colocar posteriormente la tubería, con material propio de 5cm de espesor con capas de colocación de manera de rellenar posteriormente la excavación realizada. Todos los espacios excavados al fondo del canal son rellenos hasta alcanzar los 5 centímetros para colocar posteriormente la tubería.

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA


Ing. Jerónimo Antonio Rondan Rodríguez
Jefe de Supervisión
CIP N° 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA


ZEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127094
REPRESENTANTE COMÚN

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V) (costo directo)	%
03.01.05	Preparación de cama de apoyo	m	1,500.00	14,970.00	Avance del Mes	1,060.00	10,578.80	70.67%
					Avance Acumulado Actual	1,060.00	10,578.80	70.67%
					Saldo por Pagar	440.00	4,391.20	29.33%

03.01.06. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 2"**DESCRIPCIÓN:**

En esta partida se ejecutó el suministro e instalación de tubería PVC SAP C-10 2", en la zanja previamente preparada. La tubería es colocada en la zanja cuidadosamente trazada, se eliminó prominencia rocosa y se emparejó el fondo de la zanja con una cama de arena o material suelto con la finalidad de evitar daños a la tubería cuando se realice la compactación. En los cruces de caminos la excavación se hizo lo más angosta posible y se protegió además la tubería con un revestimiento de concreto cuyo espesor fue determinada por el ingeniero inspector residente. Los tubos se apoyaron sobre el fondo de la zanja en la cual va adecuadamente colocada la cama de apoyo de un espesor promedio de 05 centímetros, dejando debajo de cada junta o unión un área descubierta con la finalidad de revisar al momento de realizar las pruebas de ensayo.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V) (costo directo)	%
03.01.06	Suministro e instalación de tubería PVC SAP C-10 2"	m	1,500.00	74,850.00	Avance del Mes	1,060.00	52,894.00	70.67%
					Avance Acumulado Actual	1,060.00	52,894.00	70.67%
					Saldo por Pagar	440.00	21,956.00	29.33%

03.01.07. PRUEBA HIDRAULICA**DESCRIPCIÓN:**

Se ejecuto la doble prueba hidráulica de la tubería, la finalidad de esta partida fue el de verificar que todas las líneas de agua estén en correcto estado de instalación, probadas contra fugas para poder cumplir con el fin a que han sido construidas. Tanto en el proceso de la prueba como en los resultados son dirigidos y verificados por la Supervisión con asistencia de la contratista. Este proceso es fundamental para verificar que la instalación cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad, y es una condición necesaria para considerar la partida como ejecutada.

CONSORCIO SUPERVISOR ROKAVA

ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROKAVA

ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127090
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

INFORME DE SUPERVISIÓN
VALORIZACION DEL SEVICIO DE
CONSULTORIA N° 02-SEPTIEMBRE-2025

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V) (costo directo)	%
03.01.07	Prueba hidráulica	m	1,500.00	4,905.00	Avance del Mes	1,060.00	3,466.20	70.67%
					Avance Acumulado Actual	1,060.00	3,466.20	70.67%
					Saldo por Pagar	440.00	1,438.80	29.33%

04. CAMARA DE INSPECCION

04.01. CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION

04.01.01. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

DESCRIPCIÓN:

Se realizo todos los trabajos topográficos necesarios dentro del área total de trabajo, que han permiten delimitar la zona donde se ejecutaran los trabajos de toda la obra. Se trazo en el terreno a partir de un bench mark, trabajos que incluyen el control estricto y permanente de las cotas, dimensiones y profundidades durante todo el proceso de ejecución del movimiento de tierras según lo especificado en los planos y aprobados por la Supervisión y/o Inspección.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V) (costo directo)	%
04.01.01	Trazo, nivelación replanteo	y/m	4.00	28.36	Avance del Mes	2.00	14.18	50.00%
					Avance Acumulado Actual	2.00	14.18	50.00%
					Saldo por Pagar	2.00	14.18	50.00%

04.01.02. EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO

DESCRIPCIÓN:

Los trabajos que comprenden este ítem fueron: el suministro y puesto a disposición de todos los equipos, materiales y herramientas, en cuanto a excavación, acarreo y descarga del material sobrante. La excavación se realizó manualmente, apoyado con mano de obra no calificada, lampas y carretillas para el refine de la sección excavada. Comprende también todos los cortes y refines de taludes, así como la preparación del fondo de las excavaciones para las obras que se van a construir sobre él. Las secciones, alineamientos y perfiles de la línea de distribución y zanjas indicadas en los planos, son susceptibles de cambios, como resultado de las características del subsuelo o cualquier otra causa que considere justo.

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127098
REPRESENTANTE COMÚN

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin LG.V) (costo directo)	%
04.01.02	Excavación en material suelto	m3	3.46	180.61	Avance del Mes	1.73	90.31	50.00%
					Avance Acumulado Actual	1.73	90.31	50.00%
					Saldo por Pagar	1.73	90.31	50.00%

04.01.03. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE**DESCRIPCIÓN:**

Se ejecutaron después de las excavaciones, el material extraído que no va a ser utilizado en rellenos fue eliminado, al igual de todo el desmonte obtenido en el proceso constructivo. El material excedente es eliminado del lugar de la Obra, siendo cargado a carretillas y transportados y evacuados hasta una distancia de 100 m. en lugares donde se colocarán los desmontes, este material excedente es producto de las excavaciones realizadas para las estructuras, las cuales no son usadas para relleno.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin LG.V) (costo directo)	%
04.01.03	Eliminación de material excedente	m3	3.46	359.60	Avance del Mes	1.73	179.80	50.00%
					Avance Acumulado Actual	1.73	179.80	50.00%
					Saldo por Pagar	1.73	179.80	50.00%

04.02. REHABILITACION CAMARA DE INSPECCION**04.02.01. LIMPIEZA DE CAMARA DE INSPECCION****DESCRIPCIÓN:**

Se ejecuto la excavación y eliminación de la capa orgánica y de material suelto del suelo para el acondicionamiento de la cámara de inspección. El material de excavación fue eliminado o acopiado en un botadero que se ubica en lugar adecuado a fin de que no obstaculice la ejecución de la obra. Se utilizaron herramientas manuales consistente en palas, barretas, picos, rastrillo y carretillas. El espesor de la capa eliminada es el suelo orgánico, hierbas y raíces de una profundidad no mayor de 0.20 m, dentro de los límites de excavación fijado para la extracción del material. El material orgánico excavado se dispuso en un botadero ubicado a una distancia no mayor de 30m, de tal forma que no interfiere en los trabajos a efectuarse posteriormente.

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA


Ing. Jerónimo Antonio Rondán Rodríguez
Jefe de Supervisión
CIP N°: 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA


ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
CIP N°: 70590
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

INFORME DE SUPERVISIÓN
VALORIZACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA N° 02-SEPTIEMBRE-2025

PARTIDA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V.) (costo directo)	%
04.02.01	Limpieza de cámara de inspección	und	38.00	251.56	Avance del Mes	15.00	99.30	39.47%
					Avance Acumulado Actual	38.00	251.56	100.00%
					Saldo por Pagar	0.00	0.00	0.00%

04.02.02. CONSTRUCCION DE TAPA DE CONCRETO

04.02.02.01. TAPA TIPO 1 (GRANDE)

04.02.02.01.03. ACERO EN LOSA DE FONDO FY=4200 KG/CM2

DESCRIPCIÓN:

En esta partida se ejecutó el refuerzo al concreto tal como se indica y se especifica en este documento. El refuerzo incluye varillas de acero y alambres tal como se muestra y especifica. El acero está especificado en los planos sobre la base de su carga de fluencia correspondiente a $f_y = 4,200 \text{ Kg/cm}^2$ debiendo satisfacer las siguientes condiciones: • Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM A-615, 815 • Carga de rotura mínima de 5900 Kg/cm^2 • Elongación en 20 cm. Mínimo 8%

PARTIDA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V.) (costo directo)	%
04.02.02.01.03	Acero en Losa de Fondo FY=4200 Kg/cm²	kg	328.80	4,912.55	Avance del Mes	328.00	3,047.12	62.03%
					Avance Acumulado Actual	328.00	3,047.12	62.03%
					Saldo por Pagar	200.80	1,865.43	37.97%

06. CAMARA DE DISTRIBUCION

06.02 REHABILITACION DE CAMARA DE DISTRIBUCION

06.02.01 LIMPIEZA DE CAMARA DE DISTRIBUCION

DESCRIPCIÓN

En esta partida se ejecutó la excavación y eliminación de la capa orgánica y de material suelto del suelo para el acondicionamiento de la cámara de distribución. El material de excavación fue eliminado o acopiado en un botadero que se ubicará en lugar adecuado a fin de que no obstaculice la ejecución de la obra. Se utilizaron herramientas manuales consistente en palas, barretas, picos, rastrillo y carretillas. El espesor de la capa a eliminar fue el suelo orgánico, hierbas y raíces hasta una profundidad no mayor de 0.20 m, dentro de los límites de excavación fijado para la extracción del material. El material orgánico excavado se dispuso en un botadero ubicado a una distancia no mayor de 30m, de tal forma que no interfieran en los trabajos a efectuarse posteriormente.

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

[Firma]
Antonio Rondon Rodriguez / CIP. 73537 / Jefe de Supervisión / Cel. 950892310

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

[Firma]
ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127090
REPRESENTANTE COMÚN

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V.) (costo directo)	%
06.02.01	Limpieza de cámara de distribución	und	120.00	794.40	Avance del Mes	34.00	225.08	28.33%
					Avance Acumulado Actual	34.00	225.08	28.33%
					Saldo por Pagar	86.00	569.32	71.67%

08. BOCATOMA

08.01 LIMPIEZA GENERAL DE BOCATOMA

DESCRIPCIÓN:

Se ejecuto la excavación y eliminación de la capa orgánica, piedras y de material suelto del suelo para el acondicionamiento de la Bocatoma. El material de excavación fue eliminado o acopiado en un botadero que se ubicará en lugar adecuado a fin de que no obstaculice la ejecución de la obra. Se utilizaron herramientas manuales consistente en palas, barretas, picos, rastrillo y carretillas. El espesor de la capa eliminada es el suelo orgánico, hierbas y raíces hasta una profundidad no mayor de 0.20 m, dentro de los límites de excavación fijado para la extracción del material. El material orgánico excavado se dispuso en un botadero ubicado a una distancia no mayor de 30m, de tal forma que no interfieran en los trabajos a efectuarse posteriormente.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V.) (costo directo)	%
08.01	Limpieza general de bocatoma	m2	42.00	278.04	Avance del Mes	42.00	278.04	100.00%
					Avance Acumulado Actual	42.00	278.04	100.00%
					Saldo por Pagar	0.00	0.00	0.00%

09. DESARENADOR

09.01 LIMPIEZA DE DESARENADOR

DESCRIPCIÓN:

Se ejecuto la excavación y eliminación de la capa orgánica, piedras y de material suelto del suelo para el acondicionamiento del desarenador. El material de excavación fue eliminado o acopiado en un botadero que se ubicará en lugar adecuado a fin de que no obstaculice la ejecución de la obra. Se utilizaron herramientas manuales consistente en palas, barretas, picos, rastrillo y carretillas. El espesor de la capa eliminada es el suelo orgánico, hierbas y raíces hasta una profundidad no mayor de 0.20 m, dentro de los límites de excavación fijado para la extracción del material. El material orgánico excavado se dispuso en un botadero ubicado a una distancia no mayor de 30m, de tal forma que no interfieran en los trabajos a efectuarse posteriormente.

CONSORCIO SUPERVISOR BOCAYA

Inga. Inocencio Antonio Rondan Rodríguez
ING. INOCENCIO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 73537

CONSORCIO SUPERVISOR BOCAYA

Alfredo Zegarra Villavicencio
ALFREDO ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127090
REPRESENTANTE COMÚN

Inga. Inocencio Antonio Rondan Rodríguez / CIP. 73537 / Jefe de Supervisión / Cel. 950092310

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V) (costo directo)	%
09.01	Limpieza de desarenador	m2	30.00	198.60	Avance del Mes	30.00	198.60	100.00%
					Avance Acumulado Actual	30.00	198.60	100.00%
					Saldo por Pagar	0.00	0.00	0.00%

10. FLETES

10.01 FLETE TERRESTRE

DESCRIPCIÓN

Se ejecuto el traslado de materiales de obra desde el punto de descarga hasta el Sector de Tambo, Vista Alegre y Churay usando recursos humanos y también de animales de carga, para la zona de obra. Se contrato el transporte de materiales a obra, teniendo cuidado de que éstos no sufran deterioro o pérdida en dicha actividad.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V) (costo directo)	%
10.01	FLETE TERRESTRE	und	1.00	84,613.55	Avance del Mes	0.20	16,922.71	20.00%
					Avance Acumulado Actual	0.45	38,076.10	45.00%
					Saldo por Pagar	0.55	46,537.45	55.00%

10.02 FLETE RURAL

DESCRIPCIÓN

Se ejecuto el traslado de los materiales a la zona de trabajo. El traslado de los materiales que se descargan en almacén y se llevan dónde van a ser usados, se dio en forma independiente de los materiales con la finalidad de evitar posibles daños a estos.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V) (costo directo)	%
10.02	FLETE RURAL	und	1.00	51,759.11	Avance del Mes	0.30	15,527.73	30.00%
					Avance Acumulado Actual	0.30	15,527.73	30.00%
					Saldo por Pagar	0.70	36,231.38	70.00%

10.03 FLETE PARA EXPLOSIVOS

DESCRIPCIÓN:

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRÍGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127096
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

INFORME DE SUPERVISIÓN
VALORIZACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA N° 02-SEPTIEMBRE-2025

Se ejecuto el traslado de los explosivos y container a la zona de trabajo. El traslado del container y los explosivos que se descargan del almacén Huancayo y se llevan a la zona de trabajo dónde van a ser usados, el traslado es en forma independiente de los materiales con la finalidad de evitar posibles daños a estos.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V.) (costo directo)	%
10.03	FLETE PARA EXPLOSIVOS	und	2.00	50,000.00	Avance del Mes	1.00	25,000.00	50.00%
					Avance Acumulado Actual	1.00	25,000.00	50.00%
					Saldo por Pagar	1.00	25,000.00	50.00%

11. SEGURIDAD Y SALUD

11.02 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN:

Se ejecuto la señalización temporal de seguridad. Respondiendo a las más avanzadas tecnologías y adecuándose a las particularidades de la obra, diversos frentes de trabajo y amplia longitud de avance de las tareas, en función de asegurar la correcta prestación del servicio, evitar riesgos sobre la salud y la contaminación del ambiente y asegurar el mantenimiento de estos servicios en buenas condiciones de uso.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V.) (costo directo)	%
11.02	Señalización temporal de seguridad	GUB	1.00	1,595.00	Avance del Mes	0.20	319.00	20.00%
					Avance Acumulado Actual	0.20	319.00	20.00%
					Saldo por Pagar	0.80	1,276.00	80.00%

11.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN:

Comprendió el uso de mascarillas quirúrgicas o equipos de protección personal (EPP) dependiendo del nivel de riesgo laboral en el que se encuentre. El uso de protección personal de acuerdo al usuario, referido a dispositivos, herramientas o indumentaria diseñada para que un trabajador lleve o sujete, con el fin de protegerlo de uno o varios riesgos para su salud o seguridad en el entorno laboral.

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA


ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRÍGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA


ALCIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127006
REPRESENTANTE COMÚN

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valor: (S/.) (Sin I.G.V) (costo directo)	%
11.03	Equipo de protección individual	GLB	1.00	3,460.00	Avance del Mes	0.15	519.00	15.00%
					Avance Acumulado Actual	0.35	1,211.00	35.00%
					Saldo por Pagar	0.65	2,249.00	65.00%

11.04 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA

DESCRIPCIÓN:

Comprendió los equipos de protección colectiva que deben ser instalados para proteger a los trabajadores y público en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo. Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: barandas rígidas en bordes de losa y acordonamientos para limitación de áreas de riesgo, tapas para aberturas en losas de piso, sistema de líneas de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje, sistema de mallas antiácida, sistema de entibados, sistema de extracción de aire, sistemas de bloqueo (tarjeta y candado), interruptores diferenciales para tableros eléctricos provisionales, alarmas audibles y luces estroboscópicas en maquinaria pesada y otros.

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Precio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valor: (S/.) (Sin I.G.V) (costo directo)	%
11.04	Equipo de protección colectiva	GLB	1.00	2,220.00	Avance del Mes	0.15	333.00	15.00%
					Avance Acumulado Actual	0.25	555.00	25.00%
					Saldo por Pagar	0.75	1,665.00	75.00%

12. MITIGACIÓN AMBIENTAL

12.01 MITIGACIÓN AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN:

Se ejecuto El Plan de Manejo Ambiental consta de los programas y planes. Este constituyo un instrumento básico de la gestión ambiental que se cumple durante el desarrollo de la implementación de los trabajos de Rehabilitación del Canal Higuierillas. Así mismo, describe las medidas de manejo ambiental que deberá aplicar. El PMA está conformado por programas, que deberán ser implementados durante las distintas etapas del Proyecto (construcción, operación y cierre de obra), con la finalidad de conservar el ambiente donde se desarrolla, lograr el adecuado desarrollo socioeconómico de la población involucrada y lograr una mayor vida útil de la infraestructura del mismo, a fin de evitar la generación de conflictos, mejorar la calidad de vida de la población involucrada y mantener una buena relación con la misma.

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRÍGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ACEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127098
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Jerónimo Antonio Rondan Rodríguez / CIP. 73537 / Jefe de Supervisión / Cel. 950892310

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

INFORME DE SUPERVISIÓN
VALORIZACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA N° 02-SEPTIEMBRE-2025

PARTIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO					ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADO			
Partida	Descripción	Und	Metrado	Presio Parcial S/. (costo directo)	Estado	Metrado	Valoriz. (S/.) (Sin I.G.V.) (costo directo)	%
12.01	Mitigación Ambiental	GUB	1.00	12,000.00	Avance del Mes	0.30	3,600.00	30.00%
					Avance Acumulado Actual	0.38	4,560.00	38.00%
					Saldo por Pagar	0.62	7,440.00	62.00%

CONSORCIO SUPERVISOR ROKAVA

ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRÍGUEZ
JEF. DE SUPERVISIÓN
CIP N° 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROKAVA

ALEIDA ZEGARR VILLAVICENCIO
DNI: 03127096
REPRESENTANTE COMÚN

VI. AVANCE DE OBRA**RESUMEN DE VALORIZACION**

HOJA RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02	
OBRA	: "SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO TAMBO-VISTA ALEGRE-CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN" CUI N° 2136236
ENTIDAD	: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -AGRO RURAL
EMPRESA	: CONSORCIO LUZ DE MARIA
EJECUTORA	: CONSORCIO LUZ DE MARIA
RESIDENTE	: ING. VICTORIANO SANTAMARIA CAJUSOL
JEFE DE SUPERVISIÓN	: ING. JERONIMO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ
PLAZO	: 120 DÍAS CALENDARIO
INICIO DE PLAZO	: 22 DE AGOSTO DEL 2025
TERMINO DE PLAZO	: 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
MES VALORIZADO	: SEPTIEMBRE 2025
DESCRIPCIÓN	MONTO Set-25
1.00 VALORIZACIÓN CONTRACTUAL	S/
PRESUPUESTO OBRA	587,345.45
	587,345.45
2.00 REAJUSTES	0.00
REAJUSTE DEL MES	0.00
	0.00
3.00 VALORIZACIÓN BRUTA (2+1)	587,345.45
4.00 DEDUCCIONES	0.00
DEDUCCIÓN DE ADELANTO DIRECTO	0.00
DEDUCCIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES	0.00
	0.00
5.00 AMORTIZACIONES	176,203.63
AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO	58,734.54
AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES	117,469.09
	117,469.09
6.00 MONTO A VALORIZAR(3-4-5)	411,141.81
7.00 IMPUESTO IGV	74,005.53
18.00%	74,005.53
	74,005.53
8.00 MONTO TOTAL A FACTURAR (6+7)	485,147.34
9.00 RETENCIONES	79,666.66
POR FIEL CUMPLIMIENTO	79,666.66
PENALIDADES	0.00
	0.00
10.00 NETO A RECIBIR DEL CONTRATISTA	405,480.68

El monto a facturar de la VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02-SEPTIEMBRE 2025, por parte de la empresa Contratista es de S/ 485,147.34 soles, incluido el IGV (18%) (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 34/100 SOLES (INC. IGV)

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

Ing. Jeronimo Antonio Rondan Rodriguez / CIP. 73537 / Jefe de Supervisión
ING. JERONIMO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N°: 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

Ing. Jeronimo Antonio Rondan Rodriguez / CIP. 73537 / Jefe de Supervisión
2261950892310 VILLAVICENCIO
DNI: 031270993
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

INFORME DE SUPERVISIÓN
VALORIZACION DEL SEVICIO DE
CONSULTORIA N° 02-SEPTIEMBRE-2025

CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE FÍSICO:

CUADRO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA (DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)

OBRA : "SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO TAMBO-VISTA ALEGRE- CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN" CUI N° 2136236

ENTIDAD : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL-AGRO RURAL

EMPRESA PRIVADA : CONSORCIO LUZ DE MARIA

RESIDENTE : ING. VICTORIANO SANTAMARIA CAJUSOL

JEFE DE SUPERVISIÓN : ING. JERONIMO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ

PLAZO : 120 DÍAS CALENDARIO


INICIO DE PLAZO : 22 DE AGOSTO DE 2025

TERMINO DE PLAZO : 19 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA : SEPTIEMBRE 2025

VAL. N°	MONTO VALORIZADO PROGRAMADO		% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO		MONTO VALORIZADO EJECUTADO		% DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUM.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
1	79,717.61	79,717.61	3.34%	3.34%	144,586.33	144,586.33	6.05%	6.05%
2	754,545.10	834,262.71	31.57%	34.91%	693,067.63	837,653.96	29.00%	35.05%
3	1,085,902.37	1,920,165.08	45.44%	80.34%				
4	445,981.31	2,366,146.39	18.66%	99.00%				
5	23,853.61	2,390,000.00	1.00%	100.00%				
	2,390,000.00	2,390,000.00	100.00%	100.00%	837,653.96	837,653.96	35.05%	35.05%

CUADRO COMPARATIVO N° 01

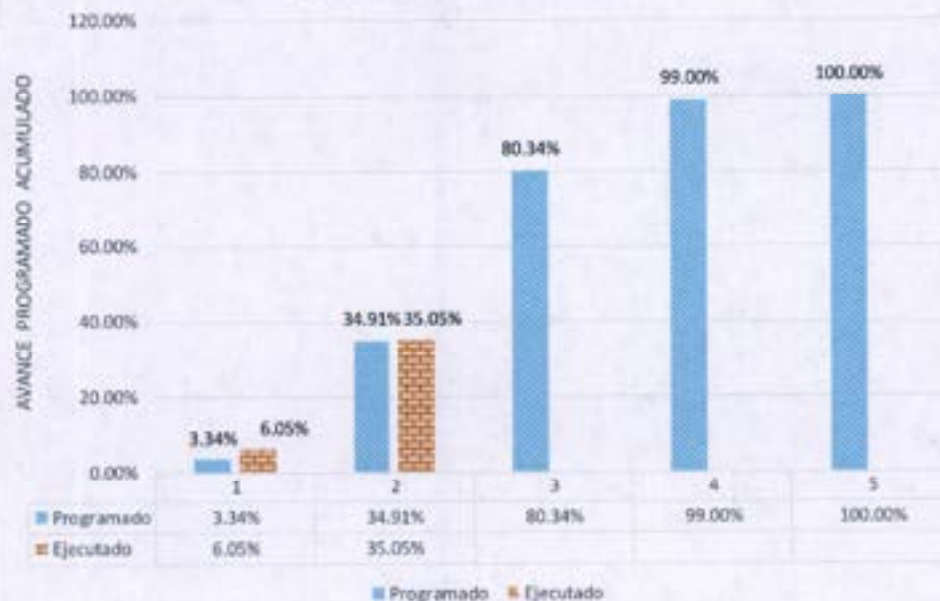

NOTA: LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA


CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ING. JERONIMO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127090
REPRESENTANTE COMUN

CURVA "S" DE AVANCE DE OBRA:

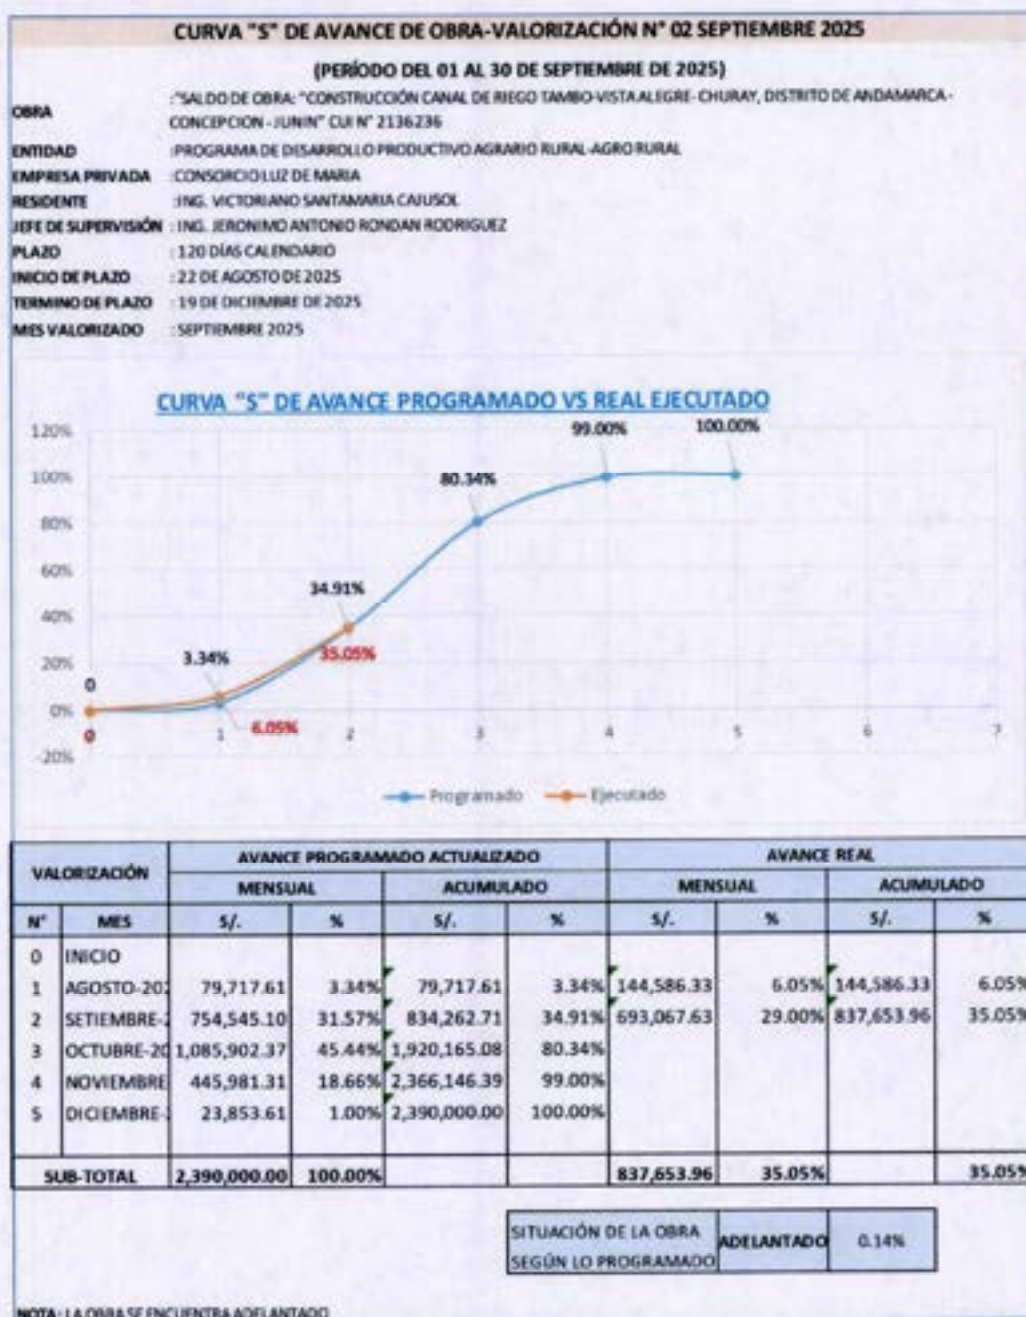

Situación de la Obra

La obra se encuentra ADELANTADA en 0.14 % en comparación con el Cronograma programado de

Avance de Obra ACUMULADO, estando por encima del Programado Acumulado.

CONSORCIO SUPERVISOR ROKAVA

ING. JERONIMO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR ROKAVA

ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127030
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Jerónimo Antonio Rondan Rodríguez / CIP. 73537 / Jefe de Supervisión / Cel. 950892310

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La Valorización de obra correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 30 de septiembre de 2025 tiene un Avance ejecutado mensual del 29.00 %. El avance acumulado ejecutado de obra es del 35.05%, lo cual representa que la obra se encuentra ADELANTADO.
2. La obra se ejecuta de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del proyecto. El Ritmo de obra del presente periodo ha sido NORMAL.
3. La Valorización de Obra N° 02 correspondiente al mes de septiembre de 2025, se ha elaborado en forma conjunta entre el constructor de la empresa privada y la supervisión, con los metrados reales ejecutados durante el periodo de septiembre de 2025, los cuales fueron VERIFICADOS y APROBADO por esta supervisión, por lo que se recomienda proceder con los trámites correspondiente.
4. La Valorización de Obra N° 02-Mes de septiembre 2025; asciende a la suma total de S/ 693,067.63 soles que equivale al 29.00 % del monto de ejecución de obra total.
5. El monto a facturar por parte del Contratista es de S/ 485,147.34 soles, incluido el IGV (18%) (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 34/100 SOLES (INC. IGV)). Por lo mencionado se da CONFORMIDAD a la VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02-SEPTIEMBRE 2025, para su trámite respectivo.
6. Las partidas fueron ejecutadas de acuerdo a las especificaciones Técnicas del Expediente Técnico aprobado. Estos trabajos fueron verificados por la supervisión, controlando las características de la mano de obra, materiales, maquinaria y equipo presentado por el contratista, y comparándolas con los rendimientos y planos del expediente técnico aprobado. Por no existir un ensayo especial para el control de estas actividades, solo se realizó el control de calidad de la obra de manera directa para garantizar la calidad del producto ejecutado. Luego de la evaluación en campo, se determina el nivel de calidad en Categoría 2 (Exigencia normal). Por lo mencionado esta supervisión otorga la Conformidad a los trabajos provisionales y preliminares ejecutados en obra.
8. Esta supervisión informa que la Empresa Contratista (CONSORSIO LUZ DE MARIA), no ha incurrido en penalidad durante los 30 días de ejecución de la obra en el mes de septiembre de 2025.
9. El monto a facturar por la empresa consultora CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA es de S/ 33,355.00 soles incluido IGV (18%) (Treinta y tres mil trescientos cincuenta y cinco con 00/100 SOLES) correspondiente a la Valorización N°02 por el Servicio de Consultoría periodo del 01 al 30 del mes de septiembre de 2025.

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

Ing. Jerónimo Antonio Rodríguez / CIP. 73537 / Jefe de Supervisión / Cel. 950892310

 ING. JERÓNIMO ANTONIO RODRÍGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N°: 73537

 GARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127094
REPRESENTANTE COMÚN

CUADRO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

(DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)

OBRA : "SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO TAMBO-VISTA ALEGRE- CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN" CUI N° 2136236

ENTIDAD : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL-AGRO RURAL

EMPRESA PRIVADA : CONSORCIO LUZ DE MARIA

RESIDENTE : ING. VICTORIANO SANTAMARIA CAJUSOL

JEFE DE SUPERVISIÓN : ING. JERONIMO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ

PLAZO : 120 DÍAS CALENDARIO


INICIO DE PLAZO : 22 DE AGOSTO DE 2025

TERMINO DE PLAZO : 19 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA : SEPTIEMBRE 2025

VAL	MONTO VALORIZADO PROGRAMADO		% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO		MONTO VALORIZADO EJECUTADO		% DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUM.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
1	79,717.61	79,717.61	3.34%	3.34%	144,586.33	144,586.33	6.05%	6.05%
2	754,545.10	834,262.71	31.57%	34.91%	693,067.63	837,653.96	29.00%	35.05%
3	1,085,902.37	1,920,165.08	45.44%	80.34%				
4	445,981.31	2,366,146.39	18.66%	99.00%				
5	23,853.61	2,390,000.00	1.00%	100.00%				
	2,390,000.00	2,390,000.00	100.00%	100.00%	837,653.96	837,653.96	35.05%	35.05%

CUADRO COMPARATIVO N° 01

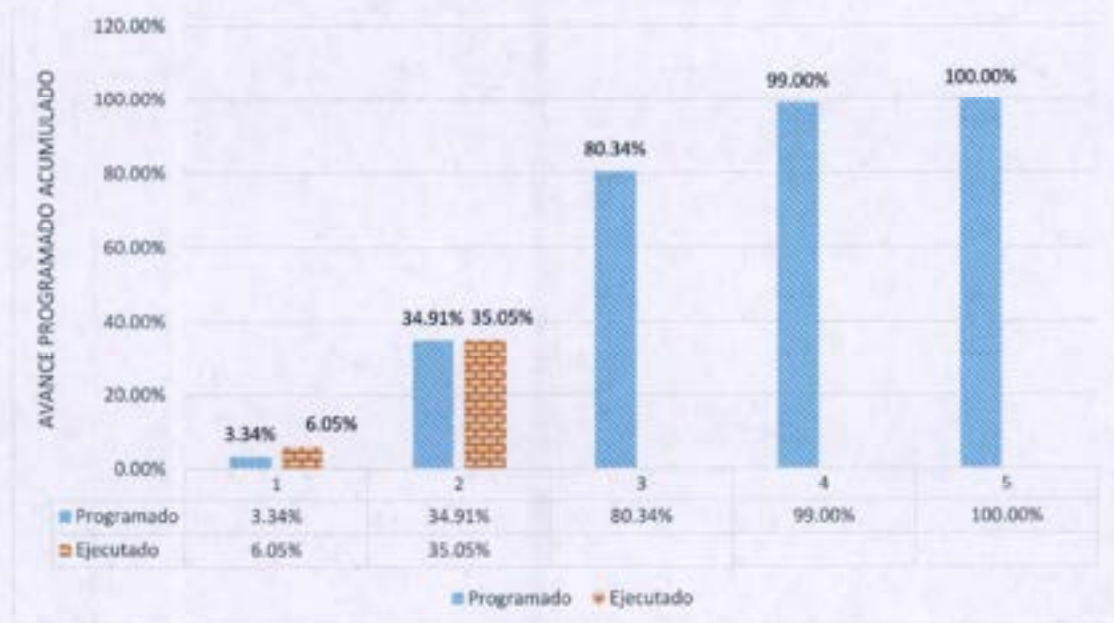

NOTA: LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA

CONSORCIO SUPERVISOR BOCANA

ING. JERONIMO ANTONIO RONDAN RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N°: 73837

CONSORCIO SUPERVISOR BOCANA

ALICIA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 031270940
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR ROCAVA

INFORME DE SUPERVISIÓN
VALORIZACION DEL SEVICIO DE
CONSULTORIA N° 02-SEPTIEMBRE-2025



FOTO 10: LIMPIEZA DE CAJA DE INSPECCIÓN.

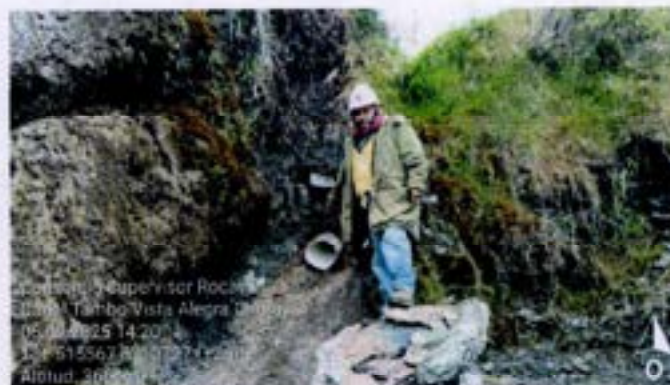


FOTO 11: LIMPIEZA DE LINEA DE CONDUCCIÓN.



FOTO 12: LIMPIEZA DE LINEA DE CONDUCCIÓN.

CONSORCIO SUPERVISOR ROKAVA

ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRÍGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N°: 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROKAVA

ALDO ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 03127090
REPRESENTANTE COMÚN

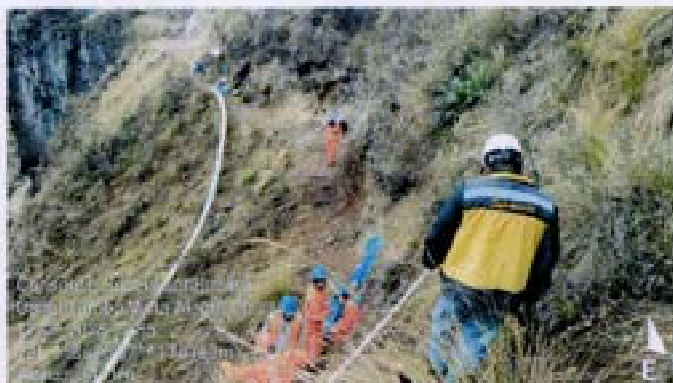


FOTO 28: EXCAVACION EN ROCA FIJA-LINEA DE CONDUCCIÓN.



FOTO 29: EXCAVACION EN ROCA FIJA-LINEA DE CONDUCCIÓN.



FOTO 30: TUBERIA A REMPLAZAR

CONSORCIO SUPERVISOR ROKAVÄ

ING. JERÓNIMO ANTONIO RONDAN RODRÍGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N°: 73537

CONSORCIO SUPERVISOR ROKAVÄ

ALEIDA ZEGARRA VILLAVICENCIO
DNI: 031270113
REPRESENTANTE COMÚN
