



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



000049

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA – PEBLT

ANEXOS

PROYECTO:

*“Instalación Y Mejoramiento Del Sistema De Riego
Sucre, Distrito De Llalli – Melgar – Puno”*



Juan de Dios Velasquez Cayo
INGENIERO CIVIL CIP 138705
SUPERVISOR DE OBRA



000048

CONTROL DE CALIDAD



Juan De Dios Velasquez Cáyot
INGENIERO CIVIL CIP 136704
SUPERVISOR DE OBRA



Hecho por: Personal Lab.
Fecha: 29.03.2021

OBRA	
: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SUCRE,DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO.	

Fecha: 29/09/2021

ESTRUCTURA : BOCATOMA
CANtera : RIO LLALLIMAYO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN TESTIGOS CILINDRICOS
MTC E704-2000

[illegible]

OBSERVACIONES: Las muestras de testigos de concreto fueron puestos por el solicitante y el ensayo de compresion se realizo en presencia del asistente y supervisor de obra.


Ing. AUGUSTO H. ORTEGA PILCO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 96703

 Cesar Quispe Tito
ING. GEÓLOGO
ESP. EN GEOTECNIA
CIP N° 198779

[illegible]

DISEÑO DE MEZCLAS
CONCRETO $f_c=210$ Kg/cm²
MODULO DE FINEZA

OBRA : Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre, Distrito de de Litali - Melgar - Puno MUESTRA : SELECCIONADO

SUPERVISA : Ing° Juan De Dios Velásquez Cayo CANTERA : Río Litalimayo
 FECHA : Agosto del 2021 RESIDENTE : Ing° Edgar Saúl Machaca Sanomamani
 REALIZADO : Ing° Marcial Teobaldo Aquino Mamani TECNICO : Isaac Aquino Velásquez

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CEMENTO	AGREGADOS	
CANTERA PROCEDENCIA : Río Litalimayo		RUMI TIPO IP	FINO	GRUESO
TAMAÑO MAXIMO	Pulg		N° 4	1"
PESO ESPECIFICO	gr/cc	2.99	2.37	2.51
PESO UNITARIO SUELTO	Kg/m ³		1564	1560
PESO UNITARIO COMPACTADO	Kg/m ³		1705	1665
CONTENIDO DE HUMEDAD	%		0.73	0.38
ABSORCION	%		3.04	3.47
MODULO DE FINEZA			3.10	8.24

DOSIFICACION

CONCRETO: sin aire incorporado

f_c PROM. f_{cr} (Kg/m ²)	TMN (pulg)	SLUMP (pulg)	AGUA (lit/m ³)	AIRE (%)	Agua/cem A/C	Factor cem. FC (Kg/m ³)	Factor cem. FC (bol/m ³)	ml Comb. De Agreg
294	1"	3" - 4"	195	1.5	0.51	382.35	9.00	6.500

CALCULO DE LOS VALORES RELATIVOS DEL MODULO DE FINEZA

CALCULO DE RF	33.88
VOLUMEN ABSOLUTO DE LOS AGREGADOS	0.657

DOSIFICACIÓN EN PESO

DESCRIPCION	VOLUM. ABSOLUTOS	PESOS SECOS/M ³	HUMEDAD	PESOS KG/M ³	PROPORCION
CEMENTO	0.128	382.353		382.35	1.00
AGREGADO FINO	0.223	529.489	-12.2	533.37	1.39
AGREGADO GRUESO	0.434	1091.309	-33.9	1095.25	2.86
AGUA	0.200	200.000	-46.1	246.11	27.36
AIRE	0.015				

Rel A/C Efectiva	0.64
------------------	------

DOSIFICACION EN VOLUMEN

DESCRIPCION	EN P3	PROPORCION
CEMENTO	8.997	1.00
AGREGADO FINO	12.044	1.34
AGREGADO GRUESO	24.789	2.76
AGUA	27.358	27.36

LA NORMA ITINTEC 420 037 RECOMIENDA QUE EL AGREGADO FINO DEBE DE ESTAR LIBRE DE CANTIDADES PERJUDICIALES DE PIZARRAS, HACIENDO LIMITADO SU USO



Ing. Juan De Dios Velásquez Cayo
 P.º 5.º C.P. N° 171160
 ESTE DISEÑO EN MECANICA DE SUELOS
 CONCRETOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS



Juan De Dios Velásquez Cayo
 INGENIERO CIVIL C.P. 136704
 SUPERVISOR DE OBRA

MTAM PROYECTOS DE INGENIERIA

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS

DIRECCIÓN: JIRON LEONCIO PRADO N° 455 PUNO, CEL.: 951822888, RUC: 10018543058

000045

DISEÑO DE MEZCLAS

CONCRETO $f_c=175 \text{ Kg/cm}^2$

MODULO DE FINEZA

OBRA : Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre, Distrito de de Llalili - Melgar - Puno MUESTRA : SELECCIONADO

SUPERVISA : Ing° Juan De Dios Velásquez Cayo

CANtera : Río Llalimayo

FECHA : Agosto del 2021

RESIDENTE : Ing° Edgar Saúl Machaca Sanomamani

REALIZADO : Ing° Marcial Teobaldo Aquino Mamani

TECNICO : Isaac Aquino Velásquez

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CEMENTO	AGREGADOS	
		RUMI TIPO IP	FINO	GRUESO
CANtera PROCEDENCIA : Río Llalimayo				
TAMAÑO MAXIMO	Pulg		N° 4	1"
PESO ESPECIFICO	gr/cc	2.99	2.37	2.51
PESO UNITARIO SUELTO	Kg/m3		1584	1580
PESO UNITARIO COMPACTADO	Kg/m3		1705	1685
CONTENIDO DE HUMEDAD	%		0.73	0.38
ABSORCION	%		3.04	3.47
MODULO DE FINEZA			3.10	8.24

DOSIFICACION

CONCRETO: sin aire incorporado

f_c PROM. f_{cr} (Kg/m2)	TMN (pulg)	SLUMP (pulg)	AGUA (lit/m3)	AIRE (%)	Agua/cem A/C	Factor cem. FC (Kg/m3)	Factor cem. FC (bol/m3)	mf Comb. De Agreg
245	1"	3" - 4"	195	1.5	0.60	325.00	7.65	6.500

CALCULO DE LOS VALORES RELATIVOS DEL MODULO DE FINEZA

CALCULO DE RF	33.88
VOLUMEN ABSOLUTO DE LOS AGREGADOS	0.681

DOSIFICACIÓN EN PESO

DESCRIPCION	VOLUM. ABSOLUTOS	PESOS SECOS/M3	HUMEDAD	PESOS KG/M3	PROPORCION
CEMENTO	0.109	325.000		325.00	1.00
AGREGADO FINO	0.231	548.484	-12.7	552.50	1.70
AGREGADO GRUESO	0.450	1131.542	-35.1	1135.63	3.49
AGUA	0.195	195.000	-47.8	242.80	31.75
AIRE	0.015				

Rel A/C Efectiva 0.75

DOSIFICACION EN VOLUMEN

DESCRIPCION	EN P3	PROPORCION
CEMENTO	7.647	1.00
AGREGADO FINO	12.478	1.63
AGREGADO GRUESO	25.703	3.36
AGUA	31.751	31.75

LA NORMA ITINTEC 400 037 RECOMIENDA QUE EL AGREGADO FINO DEBE DE ESTAR LIBRE DE CANTIDADES PERJUDICIALES DE ARENISCAS, HACIENDO LIMITADO SU USO



Ing° Juan De Dios Velásquez Cayo
CIP 136705
INGENIERO CIVIL
ESPECIALIDAD EN MECANICA DE SUELOS
CONCRETOS Y PAVIMENTOS

Juan De Dios Velásquez Cayo
CIP 136705
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA

DISEÑO DE MEZCLAS

CONCRETO $f_c=140 \text{ Kg/cm}^2$
 MODULO DE FINEZA

Instalación y Mejoramiento del
OBRA : Sistema de Riego Sucre, Distrito de de Llalili - Melgar - Puno **MUESTRA :** SELECCIONADO
SUPERVISA : Ing° Juan De Dios Velásquez Cayo **CANTERA :** Río Llalimayo
FECHA : Agosto del 2021 **RESIDENTE :** Ing° Edgar Saúl Machaca Sanomamani
REALIZADO : Ing° Marcial Teobaldo Aquino Mamani **TECNICO :** Isaac Aquino Velásquez

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CEMENTO	AGREGADOS	
CANTERA PROCEDENCIA : Río Llalimayo		RUMI TIPO IP	FINO	GRUESO
TAMAÑO MAXIMO	Pulg		N° 4	1"
PESO ESPECIFICO	gr/cc	2.99	2.37	2.51
PESO UNITARIO SUELTO	Kg/m3		1564	1560
PESO UNITARIO COMPACTADO	Kg/m3		1705	1665
CONTENIDO DE HUMEDAD	%		0.73	0.36
ABSORCION	%		3.04	3.47
MODULO DE FINEZA			3.10	8.24

DOSIFICACION

CONCRETO: sin aire incorporado

f_c PROM. f_{cr} (Kg/m2)	TMN (pulg)	SLUMP (pulg)	AGUA (lit/m3)	AIRE (%)	Agua/cem A/C	Factor cem. FC (Kg/m3)	Factor cem. FC (bol/m3)	ml Comb. De Agreg
210	1"	3" - 4"	195	1.5	0.67	291.04	6.85	6.500

CALCULO DE LOS VALORES RELATIVOS DEL MODULO DE FINEZA

CALCULO DE RF	33.88
VOLUMEN ABSOLUTO DE LOS AGREGADOS	0.725

DOSIFICACIÓN EN PESO

DESCRIPCION	VOLUM. ABSOLUTOS	PESOS SECOS/M3	HUMEDAD	PESOS KG/M3	PROPORCION
CEMENTO	0.097	291.045		291.05	1.00
AGREGADO FINO	0.246	584.100	-13.5	588.38	2.02
AGREGADO GRUESO	0.479	1204.464	-37.4	1208.61	4.15
AGUA	0.163	163.000	-50.9	213.85	31.23
AIRE	0.015				

Rel A/C Efectiva	0.73
------------------	------

DOSIFICACION EN VOLUMEN

DESCRIPCION	EN P3	PROPORCION
CEMENTO	6.848	1.00
AGREGADO FINO	13.286	1.94
AGREGADO GRUESO	27.360	4.00
AGUA	31.232	31.23

LA NORMA ITINTEC 400 037 RECOMIENDA QUE EL AGREGADO FINO DEBE DE ESTAR LIBRE DE CANTIDADES PERJUDICIALES DE ARENISCAS, HACIENDO LIMITADO SU USO



Isaac Aquino Velásquez
 Ing° Marcial Teobaldo Aquino Mamani
 TECNICO EN P3
 ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS
 CONCRETOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS

Isaac Aquino Velásquez
 Ing° Juan De Dios Velásquez Cayo
 INGENIERO CIVIL CIP 136705
 SUPERVISOR DE OBRA

MTAM PROYECTOS DE INGENIERIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
 DIRECCIÓN: JIRON LEONCIO PRADO N° 455 PUNO, CEL.: 951822888, RUC: 10018543058

CONTENIDO DE HUMEDAD
AGREGADOS FINO Y GRUESO

OBRA : Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego
 Sucre, Distrito de de Lllalli - Melgar - Puno

SUPERVISA : Ing° Juan De Dios Velásquez Cayo

CANTERA : Río Lllallimayo

FECHA : Agosto del 2021

REALIZADO : Ing° Marcial Teobaldo Aquino Mamani

TÉCNICO : Isaac Aquino Velásquez

RESIDENTE : Ing° Edgar Saúl Machaca Sanomamani

AGREGADO GRUESO

Nro De Tara	25	20	22
Peso de Tara	24.2	26.9	26.4
Peso de Tara + M. Humeda	523.5	503.7	496.4
Peso de Tara + M. Seca	521.8	501.9	494.7
Peso de Agua	1.7	1.8	1.7
Peso Muestra Seca	497.6	475	468.3
Contenido de humedad W%	0.34	0.38	0.36
Promedio cont. Humedad W%	0.36		

AGREGADO FINO

Nro De Tara	28	25	23
Peso de Tara	26.9	25.88	27.5
Peso de Tara + M. Humeda	512.8	489.6	508.1
Peso de Tara + M. Seca	509.2	486.3	504.6
Peso de Agua	3.6	3.3	3.5
Peso Muestra Seca	482.3	460.42	477.1
Contenido de humedad W%	0.75	0.72	0.73
Promedio cont. Humedad W%	0.73		



Ing. Marcial Teobaldo Aquino Mamani
 REG. CIP N° 171169
 ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS
 CONCRETOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS



Ing. Juan De Dios Velásquez Cayo
 INGENIERO CIVIL CIP 136704
 SUPERVISOR DE OBRA

MTAM PROYECTOS DE INGENIERIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
 DIRECCIÓN: JIRON LEONCIO PRADO N° 455 PUNO, CEL.: 951822888, RUC: 10018543058

000042

PESO ESPECIFICO UNITARIO
AGREGADOS FINO Y GRUESO PARA DISEÑO DE MEZCLAS

OBRA: Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre, Distrito de de Lillalli - Melgar - Puno MUESTRA : AGREGADO GRUESO Y FINA

SUPERVISA: Ing° Juan De Dios Velásquez Cayo CANTERA : Río Lillimeyo

FECHA : Agosto del 2021 RESIDENTE : Ing° Edgar Saúl Machaca Sanomamani

TECNICO: Isaac Aquino Velásquez REALIZADO : Ing° Marcel Tadeo Aguirre Huamán

AGREGADO FINO
PESO UNITARIO SUELTO

MOLDE NRO.	I	II	III
PESO DEL MOLDE gr.	6648.000	6648.000	6648.000
PESO MOLDE + MUESTRA gr.	9842.000	9828.000	9863.000
PESO DE LA MUESTRA gr.	3194.000	3180.000	3215.000
VOLUMEN DEL MOLDE cm ³ .	2044.130	2044.130	2044.130
PESO UNITARIO KG/M ³ .	1.574	1.567	1.584
PESO UNITARIO HUMEDO KG/M ³ .		1575	
PESO UNITARIO SECO KG/M ³ .		1554	

PESO UNITARIO COMPACTADO

MOLDE NRO.	I	II	III
PESO DEL MOLDE gr.	6648.000	6648.000	6648.000
PESO MOLDE + MUESTRA gr.	10106.000	10142.000	10149.000
PESO DE LA MUESTRA gr.	3458.000	3494.000	3501.000
VOLUMEN DEL MOLDE cm ³ .	2044.130	2044.130	2044.130
PESO UNITARIO KG/M ³ .	1.704	1.722	1.725
PESO UNITARIO HUMEDO KG/M ³ .		1717	
PESO UNITARIO SECO KG/M ³ .		1705	

AGREGADO GRUESO
PESO UNITARIO SUELTO

MOLDE NRO.	I	II	III
PESO DEL MOLDE gr.	6648.000	6648.000	6648.000
PESO MOLDE + MUESTRA gr.	9837.000	9825.000	9849.000
PESO DE LA MUESTRA gr.	3189.000	3177.000	3201.000
VOLUMEN DEL MOLDE cm ³ .	2044.130	2044.130	2044.130
PESO UNITARIO KG/M ³ .	1.566	1.560	1.572
PESO UNITARIO HUMEDO KG/M ³ .		1566	
PESO UNITARIO SECO KG/M ³ .		1560	

PESO UNITARIO COMPACTADO

MOLDE NRO.	I	II	III
PESO DEL MOLDE gr.	6648.000	6648.000	6648.000
PESO MOLDE + MUESTRA gr.	10045.000	10058.000	10050.000
PESO DE LA MUESTRA gr.	3397.000	3410.000	3402.000
VOLUMEN DEL MOLDE cm ³ .	2044.130	2044.130	2044.130
PESO UNITARIO KG/M ³ .	1.668	1.674	1.670
PESO UNITARIO HUMEDO KG/M ³ .		1671	
PESO UNITARIO SECO KG/M ³ .		1665	


 Ing° Marcel Tadeo Aguirre Huamán
 RES. CIP N° 171169
 ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS
 CONCRETOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS


 Ing° Juan De Dios Velásquez Cayo
 INGENIERO CIVIL CIP 136706
 SUPERVISOR DE OBRA

MTAM PROYECTOS DE INGENIERIA

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS

DIRECCIÓN: JIRON LEONCIO PRADO N° 453 PUNO, CEL.: 951822888, RUC: 10018543058

000040

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (ASTM D422) ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION (D2216 - D854 - D4318 - D427 - D2487)

OBRA : Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego
Sucre, Distrito de de Lilaill - Melgar - Puno

RESIDENTE : Ing° Edgar Saúl Machaca Sanomamani

SUPERVIS/ Ing° Juan De Dios Velásquez Cayo

MUESTRA : AGREGADO FINO

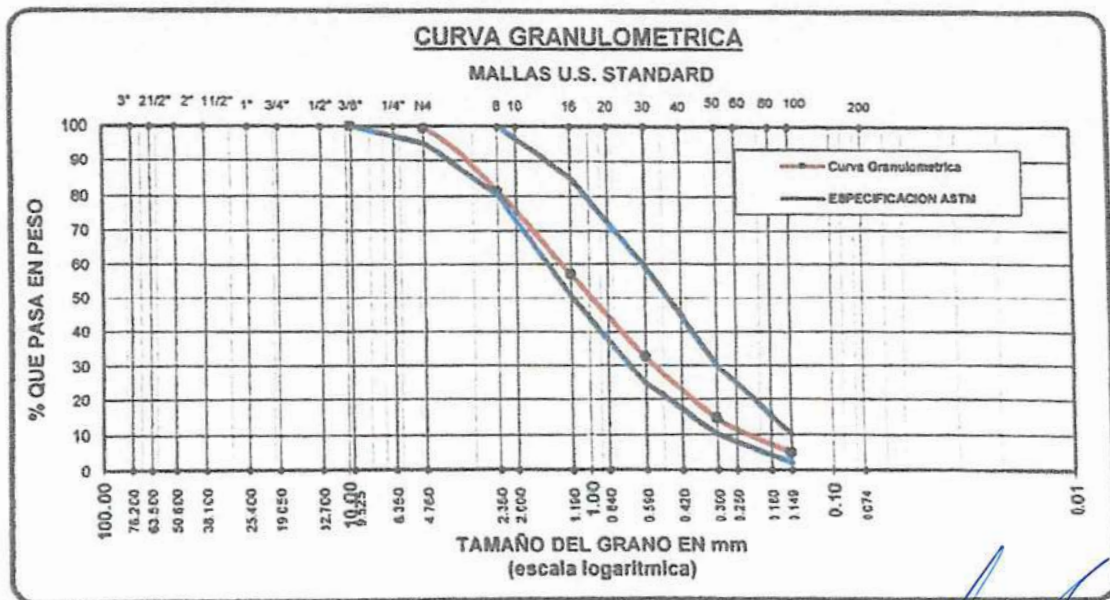
FECHA : Agosto del 2021

MATERIAL : Río Lilaillmayo

REALIZADO: Ing° Marcial Teobaldo Aquino Mamani

TECNICO : Isaac Aquino Velásquez

TAMICES ASTM	ABERTURA mm	PESO RETENIDO	%RETENIDO PARCIAL	%RETENIDO ACUMULADO	% QUE PASA	ESPECIF. ASTM	DESCRIPCION DE LA MUESTRA
3"	76.200						P.S. 1798.50
2 1/2"	63.500						P.L. 1773.20
2"	50.800						% FINOS 1.73 %
1 1/2"	38.100						Cont. de Humedad: 0.36
1"	25.400						Peso unitario suelto : 1564 kg/m3
3/4"	19.050						peso unit. Compactado: 1705 kg/m3
1/2"	12.700						CARACT. GRANULOMETRICAS: D10= 0.230 Cu= 5.83 D30= 0.549 Cc= 0.97 D60= 1.341
3/8"	9.525					100	
1/4"	6.350					95 100	
No4	4.760	10.70	0.59	0.59	99.41	80 100	MODULO DE FINEZA : 3.10
No8	2.380	324.70	17.99	18.59	81.41	60 100	
No10	2.000					50 85	
No18	1.190	442.60	24.53	43.12	56.88	25 60	EL MATERIAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES ASTM, SE RECOMIENDA SEPAR FINOS Y GRUESOS
No20	0.840					10 30	
No30	0.590	438.60	24.31	67.42	32.58	2 10	
No40	0.420						El modulo de fineza debe de estar dentro de los limites de 2.35 - 3.15, no debiendo excederse el limite en mas o menos 0.2 ... Max 3.35
No50	0.300	324.80	18.00	85.42	14.58		
No60	0.250						
No80	0.180						
No100	0.149	178.50	9.89	95.32	4.68		
No200	0.074	53.30	2.95	98.27	1.73		
BASE		31.20	1.73	100.00	0.00		
TOTAL		1894.40	100.00				
% PERDIDA							



Ing° Marcial Teobaldo Aquino Mamani
ING° CIVIL N° 171193
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS

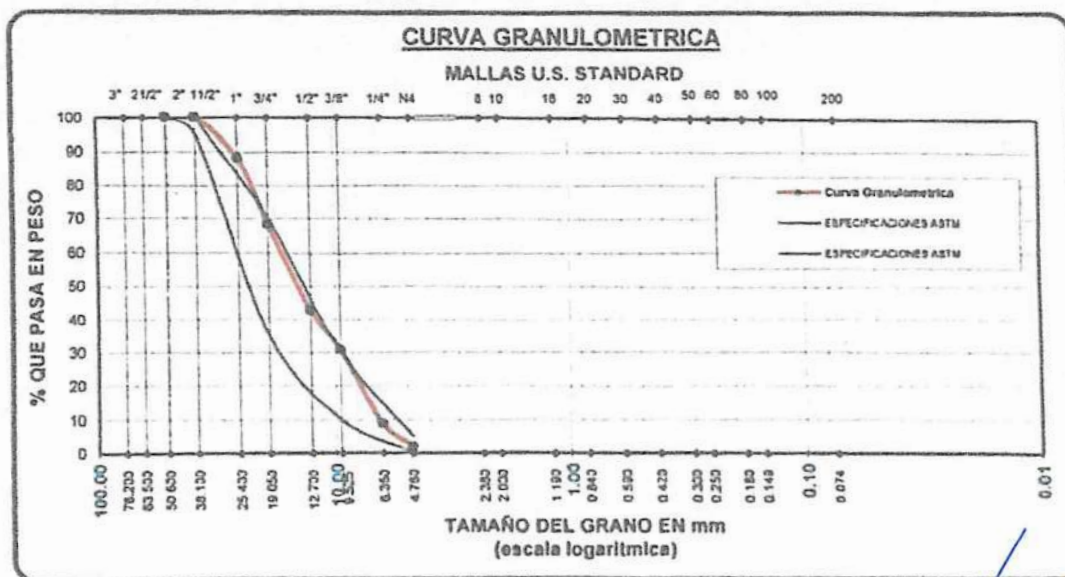


Ing° Juan De Dios Velásquez Cayo
INGENIERO CIVIL CIP 136105
SUPERVISOR DE OBRA

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (ASTM D422)
ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION (D2216 - D854 - D4318 - D427 - D2487)

Instalación y Mejoramiento del Sistema
OBRA : de Riego Sucre, Distrito de de Lilall - Melgar - Puno
RESIDENTE : Ing° Edgar Saúl Machaca Sanomamani
FECHA : Agosto del 2021
REALIZADO : Ing° Marcial Teobaldo Aquino Mamani
SUPERVISA : Ing° Juan De Dios Velásquez Cayo
MUESTRA : AGREGADO GRUESO
MATERIAL : Río Llallimayo
TECNICO : Isaac Aquino Velásquez

TAMICES ASTM	ABERTURA mm	PESO RETENIDO	%RETENIDO PARCIAL	%RETENIDO ACUMULADO	% QUE PASA	ESPECIF. 1/2" ASTM C-33-54	TAMAÑO MAXIMO. 1"
3"	76.200						DESCRIPCION DE LA MUESTRA
2 1/2"	63.500						P.M 3920 70
2"	50.800						
1 1/2"	38.100						
1"	25.400	463.80	11.83	11.83	88.17	100 100	Contenido de Humedad 0.73
3/4"	19.050	783.50	19.98	31.81	68.19	95 100	
1/2"	12.700	993.20	25.33	57.15	42.85	25 60	Peso unitario suelto : 1560 kg/m3
3/8"	9.525	479.70	12.24	69.39	30.62		peso unit. Compactado: 1665 kg/m3
1/4"	6.350	856.10	21.84	91.22	8.78		
No4	4.760	272.00	6.94	98.15	1.85	0 10	CARACT. GRANULOMETRICAS:
No8	2.380	45.80	1.17	99.32	0.68	0 5	D10= Cu=
No10	2.000						D30= 9.364 Cc=
No16	1.190	1.60	0.04	99.36	0.64		D60= 9.478
No20	0.840						MODULO DE FINEZA : 8.24
No30	0.590						
No40	0.420						OBSERVACIONES:
No50	0.300						
No60	0.250						
No80	0.180						
No100	0.149						
No200	0.074						
BASE		25.00	0.64	100.00	0.00		
TOTAL		3920.70	100.00				
% PERDIDA							



Ing° Marcial Teobaldo Aquino Mamani
 TECNICO EN MECANICA DE SUELOS
 CONCRETOS Y PAVIMENTOS ASISTENTE



Ing° Juan De Dios Velásquez Cayo
 INGENIERO CIVIL C.V. 136104
 SUPERVISOR DE OBRA



000038

CUADERNO DE OBRA



Juan D. Velásquez Cárdenas
INGENIERO CIVIL CIP 136709
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

000037

ASIENTO Nº 32 MIÉRCOLES 01-09-2021
EN LA FECHA DE HOY SE TIENE COMO INICIO DEL MES
DE SEPTIEMBRE EL MISMO QUE SE SOLICITA
PERMISO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES DE ACERO DE
REFUERZO $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ EN LO QUE REFIERE A MUROS DE
ENCAUZAMIENTO LADO IZQUIERDO Y POSTERIOR ENCOFRADO
DEMURAS.

A LA FECHA SE TIENE EN LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL
ASIENTO Nº 22 DEL RESIDENTE DONDE CLARAMENTE
SE DESCRIBE POR SOBRETUDO LA INTERVENCIÓN DEL
CANAL PRINCIPAL Y CANALES LATERALES Y SUB LATERALES.

CONSORCIO HACIENDA SUERE

Ing. Edgar Saul Machaca S. nomamant
CIP: 79193
RESIDENTE DE OBRA

ASIENTO Nº 33 JUEVES 02-09-2021

SOLICITA PERMISO PARA VACIAR MURD DE ENCAUZAMIENTO
LADO IZQUIERDO EL CUAL INCLUYE EL MERO - AGUAS ADON
DE BOCATON. EL CONCRETO ES DE RESISTENCIA $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$
DE TAL MANERA QUE SE ALCANZA EL DISEÑO CORRESPON-
DIENTE PARA LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA.

CONSORCIO HACIENDA SUERE

Ing. Edgar Saul Machaca S. nomamant
CIP: 79193
RESIDENTE DE OBRA



Ing. Edgar Saul Machaca S. nomamant
CIP: 79193
RESIDENTE DE OBRA



Ing. Edgar Saul Machaca S. nomamant
CIP: 79193
RESIDENTE DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

000036

Asiento N° 34 Jueves 02 de Septiembre del 2021
Del Supervisor de obra

No fecha se continúan con los trabajos con toda normalidad con respecto al Asiento N° 32 del Contratista. Donde inicio la Respuesta al Asiento N° 22, El Asiento N° 22 del Contratista de A conocer la Tercera del Expediente Técnico mas no se aprueba ninguna consulta pero si describe las posibles Adiciones y Deductivos que segun el RLCE claramente indica en tanto no corresponde como consulta pero si para un posible y/o Antecedente. Para una consulta, se concluye que se hará saber las posibles Recomendaciones para el Proceso Constructivo.

Sobre la Autorización para la Explotación de la Cantera Para El Contratista deberá hacer Alance el estudio y/o diseño y/o ensayo de desgaste de los Angeles, la Autorización en los Profesionales competentes en la materia En Original Para Que no haya Adulteración de documentos, Ademas deberán hacer Alance con una Anterioridad de 48 Horas Para su Registro, Procesamiento, Verificación y Su Posterior Aprobación de dichos diseños.

Sobre el Asiento N° 33 del Contratista, en donde solicito Permiso Para usar Muro de Encomendado, Para dicho solicitud deberá Presentar el Diseño de muros zócalos en Original Para Que no exista posibles Adulteraciones y/o falsificación, Ademas deberá contener las Respectives Firmas tanto del Técnico y Del Profesional Autorizado.

Asi tambien el Contratista debe Presentar el cronograma Actualizado en cumplimiento al RLCE y segun las Plazas Establecidas

ING. INSPECTOR

CONSORCIO CIENDEA SUCRE

ING. RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA

ING. SUPERVISOR

INGENIERO CIVIL CIP 136704
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

000035


Asiento N° 35

Sábado 04 de Septiembre del 2021

Del Supervisor de obra

No debe ser continuado con los trabajos con toda Normalidad y se recomienda Al contratista Aumentar mas frentes de trabajo en la zona que se encuentra Atascada. Por otro lado debe de Presentar el Plan CIVIL, Plan de Seguridad en el Trabajo, Seguros de los Trabajadores, SCTR y Normas Seguras, Ademas de tener a Creditar al Personal que labora en obra.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE


Ing. Residente de Obra

Asiento N° 36


LUNES 06 - 09 - 2021

EN LA FECHA A PEDIDO DE LOS TITULADORES DE LA OBRA Y SON USUARIOS DEL CANAL SUCRE TIENEN LA REUNION CONVOCADO POR LA JUNTA DE USUARIOS PARA ACORDAR TEMAS DE PROBLEMÁTICA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.

EL DIA VIERNES 03 LA SRA. BERTHA RINOTOZA GAMARRA SE APROXIMA HASTA LA BOYOTA DONDE SEÑORA QUE SON LOS DUEÑOS DE LOS TERRENOS CONSIGO AL MURO DE ENCAUZAMIENTO LADO IZQUIERDO LO QUE SEÑALA QUE SE ESTA PERTURBANDO RECLAMANDO UNA INDEMNIZACION POR LOS DAÑOS, CUYA VERSION ES QUE DEBERA EFECTUAR TAL INDEMNIZACION CASO CONTRARIO RECURRIR A CERRAR Y CERCAR SU COLINDANCIA Y NO PERMITIR EL PASO.

EN EL DIA DE HOY SE LLEVA ACABO UNA REUNION CON LOS USUARIOS PARALIZANDOSE LA OBRA PERTURBANDO EL AVANCE. DEL ASIENTO N° 22 EXISTE CONSULTA

CONSORCIO HACIENDA SUCRE


Ing. Residente

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR



Juan Carlos Velazquez C.A.
INGENIERO CIVIL CIP 126704
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

000034

→ VIENEN a dar AGENA DE LA INTERVENCION DE LOS CANALES
LATERALES PRINCIPALES, LATERALES Y SUB LATERALES
LO QUE A LA FECHA NO HAY UNA RESPUESTA CONCRETA
DE PARTE DE LA ENTIDAD YA QUE EN FECHA 19
DE AGOSTO TAMBIEN SE HIZO CONSTANCIA
DE LA CORRECTA MANERA DE EJECUTAR UN CANAL
MEDIANTE CARTA N° 05-2021/CONSORCIO NS/RO-
ESMS, CONSIDERANDO LA ESTABILIDAD DEL CANAL.
SE ALCANZA EL CERTIFICADO DE ENSAYOS DE ATRASION DE
ROCA PARA PIQUE.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

Ing. Residente
CIP: 79193

ASIENTO N° 37 DEL PRESIDENTE 07-09-2021 - MARTES
EN LA FECHA DE HOY SE TIENE LA VISITA A LA OBRA
DEL DIRECTOR EJECUTIVO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
DEL PROYECTO ESPECIAL TRINACIONAL LAGO TITICACA
EN HORAS DE LA MAÑANA (10:30 am). ASIMISMO SE TUVO
LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITE DE REGANTES,
SECRETARIO DEL COMITE DE REGANTES, ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LULLY, ASICOMO DEL GERENTE
DE LA EMPRESA (CON HUAYNABOQUE, PARA TENER
ALGUNOS ACUERDOS CON RESPECTO A LA OBRA, EN
PARTICULAR DEL RETIRO DE OBRA. SE EFECTUA CAMBIO
DE MAESTRO DE OBRA.

EN LA FECHA SE EFECTUA EL VACIADO DEL MURO DE
ENCAUZAMIENTO DE MURO DE ENCAUZAMIENTO LADO
IZQUIERDO AGUAS ABAJO CON $C' f' c = 210 \text{ Kg/m}^3$
CON AUTO NORMIGONERA. PIEDRA CHANCADA Y ARENA.
SE CONSULTA A LA SUPERVISION QUE DENTRO DEL...

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

Ing. Residente
CIP: 79193

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR



Juan De Dios Velásquez Cayo
INGENIERO CIVIL CIP 136709
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____

Obra: _____

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad Ejecutora: _____

000033

→ VIENEN por EXPEDIENTE TECNICO NO SE ENCUENTRA LA PLANILLA DE UBICACIONES DE LAS OBRAS DE ARTE EN TODA LA MAGNITUD DE LOS CANALES LO QUE A LA FECHA NO PODEMOS ESTABLECERLO PLASMAR EN CAMPO DICHAS ESTRUCTURAS, SE SOLICITA NOS ALIANZE DICHA INFORMACION (TIPO DE OBRA DE ARTE Y PROGRESIVA), ASI MISMO DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO PARTIDA EXISTE LA PARTIDA "RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO", EN LO QUE REFIERE A CANALES, EN EL EXP. TECNICO NO SE EVIDENCIA LA UBICACION DE LA CANTERA DE MATERIAL DE PRESTAMO, DISTANCIAS CALIDAD DEL MATERIAL O PARAMETROS GEOTECNICOS DEL MATERIAL DE PRESTAMO, DE LO QUE SOLICITA NOS MUESTRE O NOS INDIQUE ESTOS ASPECTOS CONCERNIENTES A DICHA PARTIDA.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA

Aguante N° 38

Martes 07 de Setiembre del 2021

Del Supervisor de obra

A la fecha se continúa con los trabajos con toda normalidad. Así también el día de Ayer 06 de Setiembre del 2021 a petición de los trabajadores el Residente optó por sus Pender a partir de las 10:30 AM y que de Puntón terminó a las dos 2:00 PM. Aproximadamente al mismo tiempo el día lunes 06 no se tiene maestro de obra, Pazon por lo que no tubieron Avances Programados Generando más Retrasos por parte de la Contrata, Al mismo tiempo se da a conocer a la UAN

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

[Signature]
RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

[Signature]
ING. SUPERVISOR

ING. SUPERVISOR



Juan De Dios Vinos Cayan
INGENIERO CIVIL CIP 136701
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

...> VIEVEN. Del Asiento N° 38 de Supervisión de obra
Que el Asiento N° 22 Expone lo Enunciado en el Art 177
del Reglamento de la ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado
Aprobada mediante Decreto Supremo N° 744-2018-EE y
sus modificaciones, En donde establece En el Art 177
“(c) El Contratista Presenta al Supervisor o Inspector de obra
un INFORME TÉCNICO de Revisión del Expediente Técnico de obra
que incluye entre otros, los Posibles Prestaciones Adicionales,
Riesgos del Proyecto y otros Aspectos que sean materia de
consulta (c)” Razón Por la cual lo Expuesto en el Asiento
N° 22 No Corresponde a una Consulta ya que claramente indica
en el Art 193 Consultas sobre ocurrencias en la obra en el numeral
193.1 “Las Consultas se FORMULAN en el Cuaderno de obra y se dirigen
al Inspector o Supervisor, según corresponda”; En tanto la
Supervisión recomienda Realizar las Consultas Al G. al Reclamen-
to de la ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones
Pese a ello estas observaciones N° Alcanza el Asiento N° 22
de Parte del Contratista se ha Enviado las Respuestas al Correo
Institucional del Consorcio ya que hasta fecha no ha acreditado
un Personal Para la Recepción de documentos legales.
La Supervisión recomienda tener mayor Comunicación con el
Representante Legado del Consorcio y la Residencia Para no
generar Retrasos N° mal Información y esto genera un Retraso
Por Parte del Contratista a Atribuir al Contratista
El día de hoy se tuvo la visita de los Representantes de la
Entidad Contratante y los Representantes de la Part.
Usuraria ya que indica que la Empresa Estaría Abusando
con Pagos Infimos Así como el maltrato Por Parte del
gerente a uno de los Empleados Razón Por la que no se
Estaría llegando a los Avances Programados, Por otra
parte se tiene un maestro de obra nuevo → VAW

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA

ING. SUPERVISOR



Juan Carlos Pacheco Cárdenas
INGENIERO CIVIL, CIP 12470
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

... → VIENE del Asiento N° 38 del Supervisor de obra. Sobre el Asiento 37 se le A Realizar la Revisión más detallada del E.T. A demás de ello en caso no ubiera se Realizará el Planteo en obra.

Dej A Oírse Que lo Empleado el Contratista hasta la fecha no hace Almorar al Seguro SCTP, Por lo tanto queda Responsable Exclusivo de cualquier Accidente, lesión entre otras que ubiera o susitema en obra. Además de ello hasta la fecha no ha Implementado el plan de Seguridad en obra ya que al día de hoy el Personal no Contaba con Arnes, lino de vida y otros Aspectos Para trabajos A más de 3 metros.

También se solicita Al Contratista el plano de Planteo de las Juntas Para su Revisión y Posterior Aprobación ya que sin ello es Responsabilidad Contratista. Además de ello debere Adjuntar los planos de las Posibles Afectados si los ubiera Segun el Planteo.

Se Recomendado Al Contratista Acelerar los trabajos Para no caer en Retrasos Injustificados y/o Demoras Injustificados en la Ejecución de la obra tal como Indica en el Art. 203 del RLCE.

Se Piden Por Cuarta Vez la Acreditación del Personal clave y no clave tal como Indica en el RLCE, Además de ello en el Art 190.00 190.6 Indica "En caso el contratista considere Necesario la Participación de personal Adicional al plantel técnico afectado, si anota en el Cuaderno de obra e Informarse por escrito a la Entidad el Mecanismo de sus servicios, a efectos de que esta pueda Supervisar la efectiva participación de tales profesionales (en)".

Por otro lado se Recomendado Al Contratista cumplir lo indicado en el Expediente técnico (Planos, métricas, Precios unitarios, Especificaciones técnicas y demás Estudios complementarios).

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR



Man De Dios Valenzuela
INGENIERO CIVIL CIP 136701
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

Asiento N° 039 miércoles 08 de Septiembre del 2021

Del Supervisor de Obra

A la fecha se continua con los trabajos con toda normalidad. Pero con poca personal, poca material y se cuenta con el Excavador, el Volquete, el Retro Excavadora, el motor Herrerero el Camion Pequeño y el camaronero.

Se recomienda al contratista Aumentar mas frentes, Asi tambien Abastecer de material segun su cronograma de Adquisicion. Por otro lado se solicita hacer Alance el Diseño de mezclas de Concreto 175 kg/cm², tambien se solicita en hacer Alance el Plan como y el Plan de trabajo de los Partidos de Obra.

El contratista Para el cierre de canal existente de obra de comunicar a la Parte usuaria con una Anticipacion de 48 Horas

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

CIP: 79193
RESIDENTE DE OBRA

Ing. de Obra
INGENIERO CIVIL CIP 12049

ASIENTO N° 040 DEL RESIDENTE MIE. 08-09-2021
SE SOLICITA PERMISO, A MANERA REITERATIVA PARA
EXPLOTAR CANTERA DE PIEDRA PARA DIQUE COMO PROVISION
DE ROCA, YA QUE SEGUN ASIENTO N° 30 SE SOLICITÓ PERMISO
PARA TAL FIN, Y QUE EN FECHA 06-09-2021 SE HIZO
ALANCE DEL CERTIFICADO DE DESGASTE Y/O ENSAYO DE
ABRUSION DE LOS ANGELES CUYO RESULTADO ES 66.11% COMO
RESISTENCIA AL DESGASTE Y 33.89% COMO PORCENTAJE
DE PERDIDA, FIRMADO POR UN TECNICO Y PROFESIONAL
RESPONSABLE. SE PROSIGUEN LAS LABORES DE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CANAL AGUAS
ABAJO LADO IZQUIERDO. SE MOVILIZA EL EXCAVADOR
A LA CANTERA DE ROCA HUAYTA HUACHO PARA INICIAR LOS
TRABAJOS DE EXTRACCION DE ROCA PARA DIQUE.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR



Ing. de Obra
INGENIERO CIVIL CIP 12049
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____

Obra: _____


Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad Ejecutora: _____

ASIENTO N° 41 DEL RESIDENTE JUE 10-09-2021
SE REMITE DOCUMENTO A LA COMISION DE REGANTES
PARA EL CIERRE DEFINITIVO DEL INGRESO DE AGUA
A LOS CANALES EXISTENTES ASI MISMO ENVIANDO UN
COMUNICADO POR RADIO LOCAL DEL DIST. LLALAY.
SE PROCEDE AL TIAZO Y REPUNTE - (MARCA DO CON YESO)
DEL CANAL LATERAL Y ASI COMO CON LIMPIEZA Y DESBROCE
EL CUAL IMPIDEN EL INGRESO DE INUNDACION QUE ADUCEN
SE PERJUDICAN SUS TERRENOS, SE SUSPENDEN LOS
TRABAJOS EN ESTA PARTIDA.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE


Ing. Edgar S. Alvarado
CIP: 7932
RESIDENTE DE OBRA


Asiento N° 042

Jueves 09 de Septiembre del 2021

Del Supervisor de obra.

A la fecha se continua con los trabajos con total normalidad
Sobre el Asiento N° 40 y el Asiento N° 30 Se ha Autorizado
la utilización de dicha Piedra Para el Dique en donde se aprueba
grande Dimensiones, a Recor Para ello deberá tener las Dimensiones
Que Indica el Expediente Técnico, Sobre el Asiento N° 041
de fecha Jueves 09.09.2021 Se toma conocimiento Sobre los documentos
Presentados A la Junta de Regantes, y sobre el tiaz y replanteo
en obra, Para ello se ha solicitado en Putura dos practicas
hacer Alance el Plano de Replanteo Para la Verificación
y Aprobación, trabajos Antes de su Aprobación es Responsabilidad
del Contratista Que haya Retrasos y/o Paralizaciones con ende
deberá Presentar lo solicitado en con Al Pliego de
la ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE


Ing. Edgar S. Alvarado
CIP: 7932
RESIDENTE DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR


Ing. Juan de Dios Velasco
CIP: 136707
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

Señale del Asiento W-042 del Supervisor de obra
Además de ella la Partida Desbroce y limpieza de terreno se
deberá realizar de forma manual sin remover el material propio
existente.

Con respecto al Asiento W-37 de parte del contratista de
Fecha 07.09.2021 que indica que no se encuentra la planilla
de ubicación de obras de Arte, el tipo de obra de Arte, ubicación en
Proyecto, con respecto a este punto se tiene en el Expediente
Técnico del folio 001692 que viene a ser el Plano
OA-01 tipo de obra, canal, Partida, Pase Vehicular, Pase
Peatonal entre otros tipo que se tiene según plano
harto el folio 001702 con el plano OA-11, así también
se tiene los proyectos en los cuales a intervenir y
las coordenadas en los cuales que no se ha intervenido,
así también se tiene desde el folio 001703 con el plano OA-PP
-01 harto el folio 001715 con el plano OA-TL-01, se
tienen los detalles de todos los tipos de las obras de Arte.
Se recomienda al contratista revisar con mayor detenimiento
los planos que se ha hecho entrega así también
tanto a que tenga que revisar y no hacer consultas que
se tienen a simple revisión al Expediente Técnico, además
de entender que el contratista ha revisado el Expediente
Técnico tal como indica en el Art. 177 - Revisión al
Expediente Técnico, del Reglamento de la Ley de Contratación
del Estado y sus modificaciones.
y Sobre la consigna W-02 sobre la Partida "relleno manual
compactado con material de préstamo" la ubicación es la
cantera, En el Expediente Técnico Técnico en el Capítulo General
de suelos 6.6 Compactación de suelos dice "Al momento de iniciar
la construcción de las canchales, en algunos casos se requerirá la
excavación de material, en otros casos se requerirá rellenar de..."

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

Ing. Edgar Velásquez Coto

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR



Ing. Edgar Velásquez Coto
INGENIERO CIVIL CIP 136404
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

000022

002 → VIENEN Del Asiento N° 042 Del Supervisor Obra
De material de préstamo para dar de Presente al canal, ganar
Altura y Poder Distribuir y dar mejor el Agua por las Torres
y Portillos.

Delo el uso de Pellets se Procederá a usar el material de Pellets
el material Tostado de Excavaciones para garantizar el
Proceso constructivo, Por ende se Realizo en ensayos de Proctor
modificado para garantizar la compactación de Suelos en los
Canales, siendo la Densidad Seca máxima 2.042 gr/cm^3 y el
contenido de Humedad optima 10.97% tomando en consideración
de que Tramo de Norma E-050 Suelos y Cementaciones.
En tanto la Consulta está en el Expediente técnico por ende
deberá de seguir de Tratado en el Expediente Así también
se recomienda tener mayor cuidado al momento de Realizar
las Excavaciones ya que deberá estar Autorizado por el
Arquitecto y mantener a altura bajo Resolución ya que sin
ella es Responsabilidad Notamente al contratista si hubiera
Paralizaciones por falta de ella.

Se recomienda aumentar mas frentes ya que se encuentran
Atascado y esto en cronograma Acelerado Así también el
dato de hoy se Presenta a la Entidad el cronograma Acelerado
Para tramite correspondiente.

Para el trabajo de muro de encausamiento deberá de usar
los Protecciones y/o Implementos completos Así como
Amig. hasta a vida entre otras Ademas de cumplir de
Requerido por el Reglamento de Edificaciones G-50 Seguridad
En obras Así también para el muro de Lado deberá
de contar con los Insumos en obra para no generar Retardos
y/o Paralizaciones Imprevistas atribuibles al contratista.

CONSORCIO INCIENDA SUCRE

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR



CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____ 000026
Entidad Ejecutora: _____

ASIENTO Nº 043 DEL RESIDENTE 10-09-2021-VIE.
EN LA FECHA DE HOY SE INICIAN CON LA EXPLOTACION DE
LA CANTERA DE PIEDRA HUAYTA HUACHO SEÑALADO EN EL EXP.
TECNICO CON UNA EXCAVADORA. A LA FECHA DE HOY EN
PRESENCIA DE LA SUPERVISOR SE EFECTUAN LOS VACIADOS
DE CONCRETO $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ (PIEDRA CHACADA + ARENA + AGUA)
EN MURO DE ENCRUZAMIENTO NUEVAS ARRIBA VDO 12 DQUIERO
INCLUYE ALERO + WATER STOP. DEL ASIENTO Nº 17 DE LA
SUPERVISION, DEL NUMERAL 3 EL SUPERVISOR SOLICITA
AL CONTRATISTA REALIZAR UNA PROPUESTA TECNICA POR EL
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COMPUERTA. ESTA RESIDENCIA
NO SE ENCUENTRA FACULTADA DE PODER ALCANZAR LA PROPUESTA
TECNICA PARA LA COMPUERTA RADIAL EN EL MECANISMO DE
IZAJE PUES A QUE EXISTEN VARIAS OPCIONES PARA TAL
FIN. SE REITERA EL PEDIDO DE BRINDARNOS CUAL SERA
EL SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE DE LA COMPUERTA
RADIAL. POR OTRO LADO EL EXP. TECNICO DEBE ESTAR
ELABORADO Y APROBADO Y CONTENER INFORMACION CONCISA
OBJETIVA Y CLARA EN LA QUE ESTA NO CUENTA INFORMACION
Y TRAE CONFUSION AL MOMENTO DE INTERPRETAR, ESTIMO
QUE DEBE HABER UN CUADRO RESUMEN DE OTROS
DETALLE EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA. DE LA CONSULTA
UBICACION DE CANTERA DE MATERIAL DE PRESTAMO SE
REITERA DICHA SOLICITUD PARA EFECTUAR LOS ANALISIS
CORRESPONDIENTES, YA QUE EN LOS ITEM'S 6.6 Y 7.3
MATERIAL DE PRESTAMO SEÑALA UNA SERIE DE CONDICIONES
GEOTECNICAS PARA EL CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE
A LOS RELLENOS C/MAT. PRESTAMO, MAS NO INDICA EL
LUGAR DE DONDE CORRESPONDE DICHA PRESTAMOS, SOLICITA
SEÑALE UBICACION DE CANTERA DE PRESTAMOS. ASI MISMO
SE ESTIMA QUE EL MATERIAL PROPIO CONSIDERADO

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

ING. INSPECTOR

RESIDENTE

ING. SUPERVISOR



Juan de Dios Velasquez Cerna
INGENIERO CIVIL CIP 136704
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____


00025

→ VIENEN... PARA LOS RELLENOS EN CANALES EN GENERAL, EL MATERIAL ORGANICO Y/O MALEZA PRESENTE EN EL LUGAR DE INTERVENCION TIENE ENRAIZADO HASTA 0.40 m DE ALTURA POR LO QUE CONSIDERAMOS NO SERA APROPIADO PARA CONFORMAR RELLENOS EN CUERPO DE CANAL LO QUE PODRIA OCASIONAR ALGUNA FALLA DEL CANAL UNA VEZ CONSTRUIDO, COMO ASIENTAMIENTOS, FISURAMIENTO Y/O AGRIETAMIENTO DE LOS MISMOS DEBIDO A CAMBIOS VOLUMETRICOS DEL SUELO DE APOYO.

SE SOLICITA PERMISO PARA INICIAR LOS TRASLADOS DE MATERIAL ROCA PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN DIQUE. AGUAS ARRIBA DE LA TOMA - CAPTACION.

EN LA CANTERA DE ROCA SE APREHA QUE PRESENTA ROCA FIJA EL CUAL ESTIMA EL USO DE ESPLOIVOS PARA SU CONTINUACION EN LA PROVISION DE ROD EL CUAL NO ESTA ESTIMADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. SE COMUNICA QUE EL HORARIO DE TRABAJO DE OBRAS ES DESDE LAS 7:00 am a 5:00 pm HORARIO DE OFICINA.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE


CIP: 79193
RESIDENTE DE OBRA

ASIENDO N° 044 DEL RESIDENTE 13-09-2021 LUNES EN LA FECHA DE HOY SE REINICIAN LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA SEMANA, DENTRO DE LOS METRADOS CONSIGNADOS EN EL RUBRO CAPTACION (ROCATOMA) EL METRADO EN CONCRETO NO CORRESPONDE AL METRADO REAL RECALCULADO. EN EL EXP. TECNICO CONSIGNA, DE LA PARTIDA...

ING. INSPECTOR

CONSORCIO HACIENDA SUCRE


ING. RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA

ING. SUPERVISOR




INGENIERO CIVIL CIP 136107
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____ 000024
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

- VIVEN. 01.03.01.04.03 CONCRETO $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ ESPECIFICAMENTE EN EL COMPONENTE BARRAJE FUE CONSIDERADO EL AREA DE SECCION TRANSVERSAL DE 1.00 m^2 CUANDO DEBIO CONSIDERADO DE 4.16 m^2 . EL VOLUMEN DEL CONCRETO CALCULADO EN EL EXP TECNICO ES DE 48.00 m^3 LO QUE SE CONSIDERA UN DATO ERRADO, EFECTUANDO UN RECALCULO DEL MISMO ESTA RESULTA UNA CANTIDAD SUPERIOR DEL EXP. TECNICO APROXIMADO LO QUE ESTIMAMOS QUE SERA UN MAYOR METRAO.
- SOLICITA PERMISO PARA VACIADO DE CONCRETO $f'c = 140 \text{ kg/cm}^2 + 40\% \text{ PM}$ CONCRETO CIELOPEN LADO DEL MURO DERECHO PREVIO ENCOFRADO QUE SERVIRA DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE ENCAUZAMIENTO LADO DERECHO.
- DEL TRAZO Y REPUNTEO EFECTUADO EFECTUADO EN LOS CANALES LATERALES Y SUB LATERALES SE PRESENTA UN CASO DE INCONVENIENTE EN EL CANAL LATERAL Y DONDE EL PROSECCIONARIO Y/O DUEÑO DEL TERRENO, DESDE 0+000 HASTA 0+200 NO ESTA DE ACUERDO ADUCIENDO QUE NO ES BENEFICIARIO DEL PROYECTO Y QUE EL TRAZO DEL CANAL ESTA PERJUDICANDO SU PROPIEDAD Oponiendose rotundamente a la INTERVENCION DEL CANAL EN EJECUCION. EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR, PRESIDENTES DEL COMITE DE REGANTES DEL CANAL SUCRE (PRESIDENTE) Y RESIDENTE ASI COMO DEL SEÑOR GREGORIO NEFTALI RAMOS QUE NAMARI SE PONE EN ACUERDO LA MODIFICACION DEL EJE DE CANAL EN CONSTRUCCION RECORRIENDO AL MARGEN DERECHO CUYO REPUNTEO SE PLONZARA A LA SUPERVISION. MIENTRAS ESTA UDORS Y/O INTERVENCION SE PARABA POR EL MOMENTO.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

Ing. Edgar S. ...
RESIDENTE DE OBRA

ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR



Juan De Dios Velásquez Cajo
INGENIERO CIVIL CIP 136709
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

Asiento N° 045

Lunes 13 de Septiembre del 2021

Del Supervisor de obra

A lo largo se continua con los trabajos con toda Normalidad Pero con trabajos lentos es por ello que se tiene Retraso en obra. Sobre el mecanismo de Apertura y Cierre de Compuerta Radial esto se tiene como observación en la Revisión del Expediente técnico por ende estamos a la espera de que pueda Pronunciarse el Proyectista.

Con respecto a la obra de Arte, no se tiene detallado tal como pide el Residente Pero si se tiene en los planos con las Programaciones y coordenadas de forma muy clara y sencilla de leer en todo el tramo a intervenir por ende es tarea de la Residencia y su Equipo técnico de poder clasificar y/o subclasificar y/o poner en un cuadro segun su Parecer y segun su manejo de cada técnica para mayor Prestación y comprensión y control de su labor. Sobre la ubicación de la cantera se ha tenido Respuesta por parte de la Supervisión de la obra en el Asiento N° 042 del folio 37 y 38 del Cuaderno de obra por ende se recomienda a que pueda Reformular la consulta de corresponder ya que la ubicación se ha dado y a conocer así como tambien el Estolito de dicho material Ademas se ha señalado que se tiene en el Expediente técnico lo que indica claramente, las consultas deben ser claras y concisas y no ambiguas y/o mal intencionadas ya que en el Asiento N° 043 entra el contrato "CON" así mismo se estima que el material propio considerado para los Rellenos en canales en general es material Organico y/o maleza presente en el lugar de intervención tiene enraizado hasta 0.10 m de altura por lo que consideramos no será apropiado para conformar Rellenos en cuerpo de canal lo que rotta alguna falla de canal una vez construido

ING. INSPECTOR

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

Ing. F. J. Sánchez Sandoval
ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR



Ing. J. J. Velásquez Cova
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____

Obra: _____

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad Ejecutora: _____

... → VIENE Del Asiento N° 005 del Supervisor de obra, como Asentamiento, Reasentamiento y/o Segregamiento de los mismos debido a cambios volumétricos del suelo de Apoyo. Debe de Entender que los Estudios Son Exactos Por ende no hay Estimaciones ni supuestos por ello las observaciones y/o Consultas que no contemplen en el Expediente Técnico deben ser hechas por Tramos y/o Kilómetros, ya que el Expediente Técnico está casi hecho por canales Principales, canales laterales, canales sub laterales entre otros y las observaciones deben ser hechas por Km tal al Km tal, con mayor precisión ya que estas observaciones son generales y/o vagas y Estimaciones que solo confunden tanto a la supervisión así como a la Entidad y por ende también al Proyectista, Por lo tanto se solicita al Contratista Realizar las Consultas con mayor claridad y precisión del caso. Sobre la solicitud en el Asiento N° 043 del contratista solicita Permiso Para iniciar los trabajos de material Para Para iniciar los trabajos en dique Aguas arriba de la toma - captación, Para dicho trabajo debe de entender que Primero debe ser excavado las orillas Antiescavante Para luego poner el enrocado Según Indica los especificaciones técnicas, Además debe de entender que no hay modificaciones y/o variación del Expediente Técnico ya que no hicieron alcance del plano de Replanteo del dique Aguas arriba margen Izquierdo, Por lo tanto deberán de mantener los Pendientes de 3 km + 00 al km + 120 una Pendiente de -0.15% y del km 0+120 al km 0+170 en una Pendiente de -1.54% y del km 0+170 al km 0+224 tiene una Pendiente de -2.54% deberá de cumplir estrictamente lo Indicado en el Plano EN-01, Por otro lado sobre el Asiento N° 043 sobre el uso de Exposuras en la Provisión de Rocas en el que el Contratista Indica que no está Estimado en el Expediente Técnico, Para hacer Aseveraciones Primero deberá de Buscar el Expediente Técnico en la Partida al. 03.01.06.01 Provisión de Roca se encuentra en el Análisis...

ING. INSPECTOR

CONSORCIO INGENIERIA SUAREZ

ING. RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA

ING. SUPERVISOR



INGENIERO CIVIL CIP 13670
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

100. SUPLENTE Del Asiento N 45 Del Supervisor de obra.
A Costos unitarios Perforación y Disparo de Tercera Roca Se
encuentra Ademas como sub contrato, se concluye que si
Existe dicho Servicio se Presume al Contratista A
Que Pueda Revisar el Expediente Tecnico Para no hacer observas
y/o observaciones que, si existen en el Exp. Tec., por otro lado
Presumo que discrepase el Expediente Tecnico Pese a que ha
tenido un tiempo para que Pueda hacer de Revisión al Exp. Tec.
Ademas de ello entiendo que para la buena marcha de la obra
es necesaria que este capacitado para que Pueda dirigir la obra
y no haya Retrasos por Falta de ello.

Lo Indicado en el Asiento N 44 al Contratista sobre el concreto
 $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ Se tiene un mayor motivo ya que se tiene un
error al hallar el Area del Concreto de la Sección y en toda la
longitud del barraje tal como se ha tenido la observación por
parte de la supervisión al momento de la Revisión al Expediente
Tecnico, este mayor motivo se dará a conocer a la Entidad al
momento de que se por Autorizado el Vaciado del barraje.
Sobre el Asiento N 44 a Parte al Contratista sobre el trazo y
Replanteo en obra, a Parte de la Supervisión no se tiene Auto-
rización para que Pueda dar orden con los trabajos de Desbroce
en el canal por ende es Responsabilidad del Contratista de iniciar
los trabajos sin consentimiento de la supervisión, Pese a ello se ha
dado la solución con el usuario generando un PT Adicional,
la Empresa viene Realizando trabajos sin coordinación con la
Supervisión ajenos los usuarios como por ejemplo, Razon por lo
que se tiene Problemas Sociales generados por la misma Empresa
por otro lado se solia hacer Abance los planos de Replanteo
para su posterior Autorización ya que sin ella es netamente
Responsabilidad. el Contratista si hubiera Problemas con terceros
demas de ello deberá Implementar el plan de Seguridad en obra.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

Ing. Residente

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR



Supervisor de Obra

CUADERNO DE OBRA

00002

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

002 → VIENE

Que Segun su cronograma, Acordado a obra, se viene Incomplendo al Avance del como la Ruta critica que fue programado Para este mes de Setiembre Asi como a CARTEL DE OBRA DESBROCE Y LIMPIEZA DE DIQUE, DESBROCE Y LIMPIEZA DE CANAL y entre otros Partidas Principales Qu don no dan inicio y se viene retrasando por ende se recomienda incrementar mayor Personal tecnico y Personal de obra Para llegar Al Avance Programado y no caer en Retrasos o Atosos Injustificables Atribuidos al contratista.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

[Signature]
Ing. Carlos Sánchez Salazar
RESIDENTE DE OBRA

[Signature]
INGENIERO CIVIL CIP 134704
SUPERVISOR DE OBRA

Asiento N° 046

Martes 14 de Setiembre 11/2021

Del Supervisor de obra

A la fecha se continua con los trabajos con total Normalidad Se Realiza el vaciado de concreto citopero en el muro de Encausamiento hda derecho Por ello se observa que falta Implementar los EPP (Equipo de protección Personal) Asi tambien la Señalización de toda la Zona de trabajo ya que se tiene maquinaria en movimiento Al mismo tiempo tener mayor cuidado en cuanto Al manejo de Cables eléctricos ya que se tiene Presencia de Agua y Podria ocasionar Algun Accidente, Asi tambien se solicita hacer Alance los planos de replanteo de los canales A Intervallar ya que hasta la fecha no hay Alance Para dar Inicio, Por otro lado tampoco ha Percibido el personal Técnico de obra hasta la fecha lo que Entiendo que hasta la fecha solo se tiene la Presencia del Personal de Obra.

UAW

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

[Signature]
Juan De Dios Velásquez Cárdenas
INGENIERO CIVIL CIP 134704
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

200 ➔ VIRENEN del Asiento N° 046 Del Supervisor de obra
Así también se recomienda cumplir los Especificaciones técnicas
tal como indica en el Expediente técnico, por otro lado hasta la
fecha no hace almorzar el plan nutricional, plan de Seguridad y Salud
ocupacional en obra, este Asiento se Realiza a horas 4:30pm
Se recomienda tener medidas para tener un mejor avance
en obra para no caer en Retrasos Injustificados

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

ING. RESIDENTE DE OBRA

ING. SUPERVISOR DE OBRA

ASIENTO N° 047 DEL RESIDENTE MARTES 14-09-2021
SE DIO INICIO AL TRASLADO DE Poca PARA LA CONSTRUCCION DE DIQUE
AGUAS ARRIBA DE LA BACATOMA COLOCANDO EL MATERIAL AL COSTADO
DE LA VÍA PROYECTADA DEL DIQUE, AUN NO SE PROCEDERÁ A LA
EXCAVACION DEL MISMO OPTANDOSE EL METODO DE PROCEDIMIENTO
DE TRABAJO DE EXCAVACION Y CONFORMACION INMEDIATA DE UNA
ANTISACAVANTE, POR LO PRONTO SOLO SE ESTA DEPOSITANDO EL
MATERIAL Poca EN LO QUE SERA DIQUE AGUAS ARRIBA LADO
IZQUIERDO. DENTRO DEL TRANSPORTE ES PASO OBLIGADO POR
COLINDANCIA DE TERRENOS DE CULTIVO Y/O PASTOS CULTIVADOS
LO QUE LOS DUEÑOS Y/O POSESIONARIOS RECLAMAN QUE
EL PASO DE VOLAVETES EMITEN POLVO EL CUAL AFECTA A
LOS PASTOS Y TERRENOS ADYACENTES Y QUE ESTA DEBERA
SER REGADO CON AGUA PARA MITIGAR LA EMISION DE POLVO.
LA ACTIVIDAD QUE POR PROCESO CONSTRUCTIVO SE EFECTUA, ENCAUZAMIENTO
DE RIO POR MEDIO DEL CAUCE DEL RIO EL CUAL PERMITE EFECTUAR
LABORES EN EL MURO DE ENCAUZAMIENTO DE LADO DERECHO. A LA FECHA
NO TENEMOS CON CLARIDAD LA UBICACION DEL MATERIAL DE PRESTADO
A EMPLEAR EN LOS RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTADO.

ING. INSPECTOR

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

ING. RESIDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ING. SUPERVISOR



INGENIERO CIVIL CIP 136701
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

Asiento N°: 048

miércoles 15 de Setiembre del 2021

Del Supervisor de obra

A la fecha se continúa con los trabajos con toda normalidad. Así también se recomienda al contratista presentar el plan de PMA para poder intervenir y no afectar a los vecinos con ruido, polvo, residuos entre otros. Asimismo se recomienda dar inicio al canal en toda las trincheras así como la presentación de planos de replanteo y otros instrumentos de control.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

Ing. Juan Carlos Hernández
RESIDENTE DE OBRA

Juan Carlos Hernández
SUPERVISOR DE OBRA

Asiento N° 049

MIÉRCOLES 15-09-2021 - RESIDENTE

EN LA FECHA SE HIZO ENTREGA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A LA SUPERVISION DE OBRA EN 49 FOLIOS PARA SU APROBACION, SE PROSIGUE CON EL ENCAUZAMIENTO DE MURO DE ENCAUZAMIENTO LADO IZQUIERDO SOLICITANDO PERMISO PARA EL VACIADO DEL MISMO CO $1\text{ic} = 210 \text{ Kg/cm}^2$ PIEDRA CHANCA DA + ARENA. ASIMISMO SE HABILITAN ACERO EN MURO DE ENCAUZAMIENTO LADO DERECHO SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO. SE PROSIGUEN EN EL PROVISION, SELECCION, CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA LA CONSTRUCCION DEL DIQUE LADO IZQUIERDO AGUAS ARRIBA, PARA POSTERIORMENTE INICIAR CON LOS TRABAJOS CONFORMACION DEL DIQUE. SE OBSERVA QUE EN LOS PLANOS DEL ERP. TECNICO EN LO QUE REFIERE AL CANAL ADUCTOR, SE APPRECIAN EN LAS SECCIONES (TIPICA) LA NO PRESENCIA DE ACERO O NO EVIDENCIA EL ACERO SIN EMBARGO EN LA PLANILLA DE METRADAS ESTA CONSIDERADO ASI COMO TAMBIEN EN LA EJECUTOR LA PARTIDA 1.5.1.3.2 ACERO DE REFUERZO $1\text{ic} = 4200 \text{ Kg/m}^3$ → VAN

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

Ing. Juan Carlos Hernández
ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR

Juan Carlos Hernández
INGENIERO CIVIL CIP 136704
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA


Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

→ VIENEN... CONCERNIENTE AL REFUERZO EN MURO Y LOSA DE FONDO DEL CANAL ADUCTOR, EFECTUANDO UNA REVISIÓN MINUCIOSA DE LA PARTIDA Y/O DEL RURO CANAL ADUCTOR EN LO QUE REFIERE SECCIÓN DE CANAL, ESTO CONSIDERA $C = 0.10m$. SIN EMBARGO EXISTE DIVERGENCIA ENTRE PUNO Y MBTRADO LO QUE SOLICITA A LA SUPERVISIÓN SE NOS ACUERTE LA CONTROVERSIAS.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE


RESIDENTE DE OBRAS


Asiento N° 050 Jueves 16 de Setiembre del 2021
Del Supervisor de obra

A la fecha se continúa con los trabajos con toda normalidad. Así también se realiza el trabajo de muro de encoframiento lado izquierdo concreto $pl = 210 kg/cm^2$ (Piedra chancada + Arena). Así también el Residente hace Alance al plan de Seguridad Sin Firmas del Responsable que lo elabora ni la Acreditación del Profesional que estará a cargo para llevar dicho plan y a que en el expediente técnico contenga un presupuesto para que desarrolle dicho plan. Por ende se tiene deficiencia en cuanto a Señalizaciones, Indicaciones del uso de EPPs, entre otros por lo tanto la Supervisión Review lo presentará y hará los Alances necesarios para que pueda ser aprobado y su posterior ejecución, en ese sentido hasta la fecha solo se tiene la presencia del Residente como personal clave y como equipo técnico ya que no ha acreditado ningún personal más para el desarrollo de la obra, sobre la Señalada en la Partida 1.5.1.3.2 Muro de Refuerzo $pl = 1700 kg/cm^2$

CONSORCIO HACIENDA SUCRE


ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR


ING. SUPERVISOR


ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____

Obra: _____


Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad Ejecutora: _____

SE VIENE DEL ASIENTO N° 050 DEL SUPERVISOR DE OBRA
Sobre esta Contravista se va a revisar con mayor detenimiento
Por otro lado el contratista debe de proveer de material o insumo
Suficiente para el normal avance de la obra ya que se viene
Retrasando Algunas Partidas Programadas, Así también
las solicitudes de Autorizaciones deberá de ser con Anterioridad
Via cuadrupla de obra con 24 Horas Antes de ejecutar la partida
ya que la oficina de la Residencia y la obra en ejecución
no están en el mismo lugar por ende se recomienda con
Anterioridad, Así también recomiendo Acelerar los trabajos
de obra que, haciendo son a 4:10 PM.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE


CIP: 72195
RESIDENTE


CIP: 10000
SUPERVISOR DE OBRA

ASIENTO N° 051 DEL RESIDENTE DE OBRA VIERNES 17-09-2021
EN LA FECHA DE HOY SE PROSIGUEN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO
EN BOCATOMA - CAPTACION. DEL PERSONAL RESPONSABLE DE
SEGURIDAD NO EVIDENCIAMOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO
EL CUAL SOLICITAMOS NOS INDIQUE EN QUE FOLIO ESTA SEÑALADO
EL O LA CONTRATACION DE UN RESPONSABLE DE SEGURIDAD. A LA
FECHA NO TENEMOS ESCURECIDO QUE CANTERA SE UTILIZARA
PARA LA COLOCACION, EN CANALES, DEL MATERIAL DE PRESTAMO,
Y QUE PUEDA CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
EN CUANTO AL PERSONAL A LA FECHA SE TIENE TRABAJANDO
EN LA OBRA AL PERSONAL TECNICO PROFESIONAL COMO:
1.- PRESIDENTE DE OBRA : EDGAR SAUL MACHACA SANO MAMANI
2.- ASISTENTE TECN. : WILLI IVAN CANAZA CAÑAZACA
3.- MAESTRO DE OBRA : RODI MAMANI HUAQUILLA
4.- TOPOGRAFO : WILSON PONCA MASCO

CONSORCIO HACIENDA SUCRE


CIP: 72195
RESIDENTE

ING. INSPECTOR


CIP: 10000
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA


Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

→ VIENEN... 5.- ALMACENERO & ROCIO VERONICA APAZA CHIPANA
6.- GUARDIAN: JULIO HANCO VECORDE
7.- ADMINISTRADOR DE OBRA: MILAGROS MARGOT FLORES CACERES

CONSORCIO HACIENDA SUCRE


CIP: 70193
RESIDENTE DE OBRA

ASIENTO Nº 052 DEL RESIDENTE LUNES 20-09-2021
EN LA FECHA DE HOY SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS CONCERNIENTE
A LA OBRA "INSTALACION Y METRAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
SUCRE, DISTRITO DE UALLI - MELGAR - PUNO", VACIADO ZAPATA CONCRETO
 $f'c = 21014/\text{cm}^2$ EN MURO DE ENCAUZAMIENTO LADO DERECHO
PIEDRA CHANCAADA + ARENA + CEMENTO + AGUA, SLUMP 3", OBTENIENDOSE
TESTIGOS DE CONCRETO FRESCO PARA POSTERIOR SOMETIMIENTO
A LA COMPRESION. SE ALCANZA A LA SUPERVISION PUNO REPLANTEO
DEL CANAL LATERAL 04 PARA SU APROBACION Y PROSEGUIR A TRABAJAR
SEGUN DISPUESTO EN EL EXPEDIENTE TECNICO, CABE PRECI-
SAR QUE

Asiento Nº 053 Lunes 20 de Septiembre del 2021
Del Supervisor de obra

A la fecha se continua con los trabajos con toda normalidad
En tanto se verifica a los agregados se evidencia que
no es lo indicado en el diseño a mezclar por lo tanto se
solicita hacer blanco el nuevo diseño a mezclar para que
pueda ser verificada en campo Asi tambien se recibe el
el plano de replanteo al lateral 04 para su revision por
ende aun no se da por autorizado para dar inicio

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR



Ing. Carlos Pacheco Lazo
INGENIERO CIVIL CIP 13670
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº




Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

000 → VIENE Del Asiento N° 053 Del Supervisor Obra.
Por ello aun no se tiene Autorización la Ejecución de Trazo de
Partido Desbore y limpieza tal como Trazo las Espas Marcaciones
Terminas Del Expediente Técnico, en cumplimiento al RLE
Se va por Aprobado y autorizado el cronograma Acelerado Obra.
Por otro lado las tecnologías en bocatoma sobre de Implementar
el plan de Seguridad en obra propiamente Dicho, a la vez se solicita
la Autorización al Estremo Arquitecto Para dar Trazo con lo
Excavación en Canales.


CONSORCIO HACIENDA SUCRE


ING. RESIDENTE


INGENIERO CIVIL CP 13047
SUPERVISOR DE OBRA

→ VIENE DEL ASIENTO N° 052 DEL RESIDENTE DE OBRA
FOLIO 30, SE EFECTUO EL TRAMITE DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA
DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) LO CUAL ESTAMOS A LA ESPERA
DE LA RESOLUCION DEL MINISTERIO DE CULTURA.
A LA FECHA NO ESPECIFICA EL MATERIAL DE PRESTAMO A UTILIZAR
PARA LOS RELLENOS EN CANALES CON MATERIAL PROPIAMENTE DICHO
ESTAMOS A LA ESPERA DEL PRONUICIAMIENTO DE LA SUPERVISION DE
OBRA PARA ESCLARECER EL TEMAS. A

CONSORCIO HACIENDA SUCRE


ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR




INGENIERO CIVIL CP 13047
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

ASIENTO Nº 54 DEL RESIDENTE DE OBRA 21-09-2021 MARTES.
EN LA FECHA DE HOY SE TIENE CONSULTA Y AUTORIZACION
PARA EJECUTAR MAYOR METRADO EN LA PARTIDA 01.0301.04.03
CONCRETO $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$, YA QUE EL METRADO DEL EXPEDIENTE
ES CONSIDERADO $= 514.33 \text{ m}^3$ Y DE ACUERDO A LO RECALCU-
LADO ESTA SE EFECTUARA UN TOTAL DE 690.72 m^3 , LO
QUE QUEDA ESTE METRADO COMO CONSULTA PARA SU EVALUACION
Y APROBACION. EL MAYOR RESULTANTE RESULTARIA 176.39 m^3 .

METRADO APROBADO EXPED. TECNICO $= 514.33 \text{ m}^3$
• METRADO RECALCULADO $= 690.72 \text{ m}^3$
• MAYOR METRADO ESTIMADO $= 176.39 \text{ m}^3$

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

Ing. Roger Sant Machaca Sanamamani
CIP: 70193
RESIDENTE DE OBRA

Asiento Nº 055 Martes 21 de Septiembre del 2021
Del Supervisor de obra

Ala Fecha se Continúan con los trabajos Así también se
tiene Retrasos en obra Por falta de Insumos, A Partir del
metrado de se Paralizan las maquinarias casi la mayoría
en la que viene a ser en obra Por falta de combustible
y esto genera Retraso Injustificado atribuible al Contratista
Así también debe de Abastecer de cemento, fierro y otros
Insumos Para no generar un mayor retraso lo que ya se
tiene hasta la fecha, se recomienda al Contratista tener
mayor control sobre el fondo de trabajo de obra y que los
Asientos deben de ser correlativos Segun Trámite al P.D.C.
En cuanto a lo que Trámite Segun Asiento Nº 052 del Contratista
el Retraso si del momento de obra en la que no obra de que fecha
correspondiendo y sin correlación de los Asientos del expediente

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

Ing. Roger Sant Machaca Sanamamani
CIP: 70193
RESIDENTE DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR



CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

... → VIENE del Asiento N.º 55 del Super-Vision de obra, se ha verificado conjuntamente con los encargados del canal lateral N.º 4 se evidencia material granular con presencia de grava y limo por lo que si es posible cumplir la Tercera del Expediente tal como se hizo las calicatas en la progresiva km 0+620 en coordenadas N.º 301286 8347409 en tanto se recomienda Realizar mas Puntos de Inspección así tambien en las coordenadas N.º 301291 8347418 tambien se debe grabar y bastante tanto Puntos, así tambien se Realiza la Verificación del Informe y/o carta N.º 012-2021-CHS/ESMS Presentado por el Residente en fecha 20.09.2021 (4:30 pm) en la Progresiva Encomendada en el plano de replanteo se tiene una Diferencia de 0.10 - 0.40 cm de diferencia en campo tamaño como base el Bm N.º 1 dato (3970.2665), así tambien tamaño como Punto de Referencia y/o Punto de Control el Bm-5 o dato (3968.915) que corresponden cerca a la Progresiva km 0+640 En tanto deberá hacer un mayor precisión así como tambien Ajustar el artificio de calibración para no tener estas Diferencias y en longitudes se ve afectado el volumen de terreno Poner por lo cual debe de entregar y presentar ala brevedad posible para ser otra vez verificado por el Equipo de Supervisión por ende no correspondría Queda Aprobada dicha plano de replanteo sobre el Asiento N.º 55 y del Asiento se solicita instalar el mayor número de Puntos para ser por Aprobado y Realizar con el Trámite correspondiente tal como indica el RLE y sus modificaciones, por otro lado se tiene que visto al Representante de la Unidad y/o Entidad Contratante en donde indica que se encuentra atascado segun la Programación Se recomienda tener mayor detalle y mayor cuidado al momento de presentar las Autorizaciones y/o Puntos.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

Ing. Edgar...

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

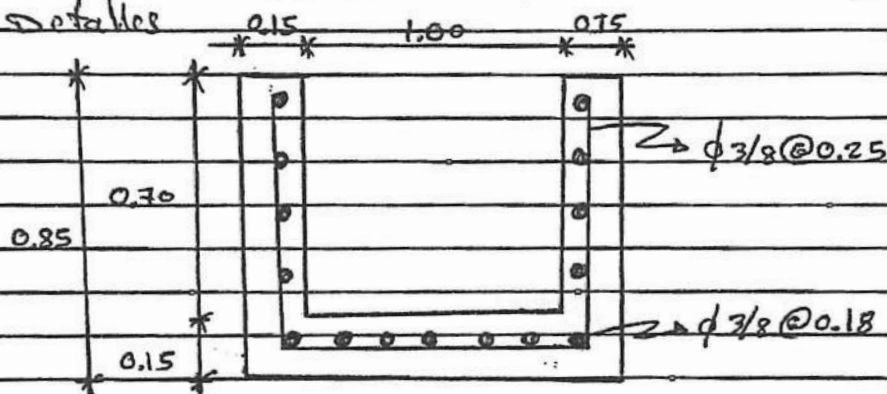
Asiento N° 056

miércoles 22 de septiembre del 2021

Del Supervisor de obra

Se tiene con toda Normalidad el Alance a la obra así también sobre el Asiento N° 049 de parte del Contratista de la Partida 1.5.1.3.2 Acero de Refuerzo $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ que se tiene un muestreo de 3201.86 kg , esta partida no tallya en el plano para si se encuentra en los muestreos por m² se tiene las siguientes

Detalles



es la que corresponde al Canalductor 225 ML.

Se recomienda al Contratista Realizar la Partida 1.3.1.7.3 Pruebas de calidad al concreto (pruebas de compresión) así también hacer Alance los Planos de Planteo del Digue y canales, laterales y sub laterales.

Sobre el Asiento N° 051 del Pasaporte sobre el Personal que labore debe de entender que los profesionales deben ser o estar habilitados así también se solicita hacer Alance los C.V. Para dar a conocer a la Entidad e Informar que se viene trabajando con Profesionales Calificados y capacitados para asumir dicho cargo en tanto estara a Espera de dicha Solución Para el cumplimiento estructural de la obra.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR

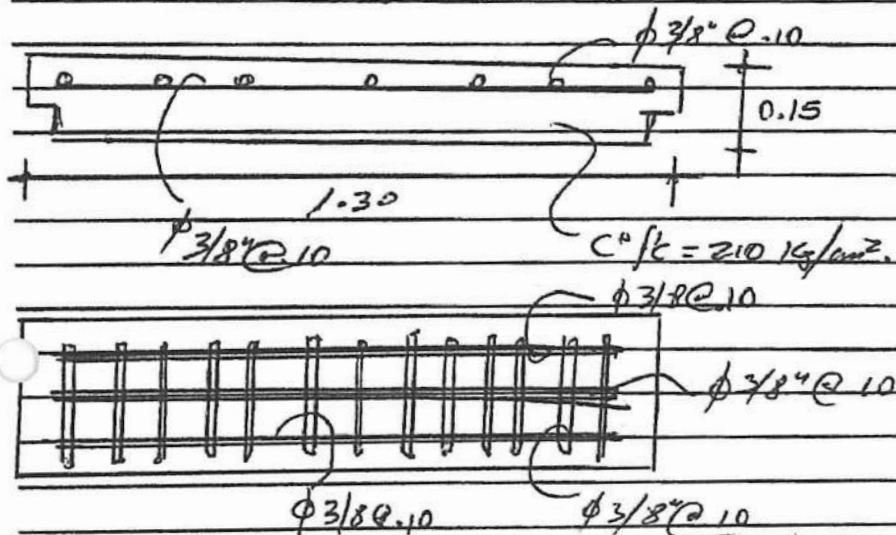
CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

ASIENTO Nº 057 DEL RESIDENTE JUEVES 23-09-2021
EN LA FECHA SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS CARRES PENDIENTES
A LA OBRA. DE LA PARTIDA 1.5.1.3.7 TAPAS PREFABRICADAS
DE Cº $1.30 \times 0.50 \times 0.15$ CON ACERO CORRUGADO DE CONSTRUCCION
EFECTUANDO EL CALCULO DEL PESO DE ESTAS RESULTA TENER
UN PESO DE 224.25 Kg CONSIDERANDO ESTE PESO ES ELEVADO
PARA MANIPULAR EN LA CUAL SE DEBERA USAR MAQUINARIA PESADA
DE CONSTRUCCION POR LO CUAL SE SOLICITA EL CAMBIO DE LAS
DIMENSIONES DEL MISMO QUE PARA MEJOR MANIOBRABILIDAD DE
ESTAS TAPAS RESPETANDO LAS CONDICIONES TECNICAS CONSIDERADOS
EN EL EXP. TECNICO TANTO EN LA CALIDAD DEL CONCRETO,
CANTIDAD DE ACERO Y LA DISPOSICION DE FIERRO DE CONSTRUCCION
SIENDO COMO SIGUE.



[Signature]
ING. SUPERVISOR

POR LO EXPUERTO SOLICITA APROBACION. POR OTRO LADO
SE SOLICITA VACIADO DE Cº $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ PARA VACIADO EN
BARRAS DENTELON. LOS VACIADOS Y/O EJECUCION DE 4 BARRAS
SE EFECTUARAN EN TRES TRAMOS EN LA LONGITUD...

ING. INSPECTOR

CONSORCIO INCIENDA SUCRE

[Signature]
ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

→ VIENEN... DE LO QUE REQUERIMOS LA APROBACION. LA SUSTENTACION DE LO INDICADO SE DEBE AL GRAN VOLUMEN DE AGUA PRESENTADO EN LAS EXCAVACIONES DEL BARRATE CUYO CAUDAL DE RECUPERACION DEL AGUA EN LAS EXCAVACIONES SUPERA ENORMEMENTE A LOS EQUIPOS DE BOMBEO CON QUE SE CUENTA EN OBRA, COMO SON 03 MOTOBOMBAS AUTOCERANTES DE 4"x4" (GASOLINOL) Y 01 MOTOBOMBA CENTRIFUGA O MOTOR DIESEL 4"x4" Y QUE EN SITUACION ES INCONTROLABLE EL AGUA. POR OTRO LADO SIENDO LA CANTIDAD FUENTE DEL VOLUMEN DEL CONCRETO EN PROMEDIO 2000m³ EN BARRATS NOS IMPOSIBILITA PRODUCIR CONCRETO EN LA ZONA EN ESAS CANTIDADES PUES A QUE SE CUENTA CON UNA AUTO-NORMIGONERA DE 4.5m³ DE PRODUCCION POR HORA. TENIENDO ESTOS ASPECTOS SE TIENE EN CONSIDERACION EL USO DE ADITIVOS EPOXICOS ADHESIVOS ESTRUCTURAL DE CONCRETO FRESCO CON CONCRETO ENDURECIDO CUYAS CARACTERISTICAS TECNICAS TIENE UNA ALTA RESISTENCIA A LA TRACCION, ACTAMENTE EFECTIVO AUN EN SUPERFICIES EXPUESTAS AL AGUA Y CUYA APLICACION DEL ELEMENTO ES MEDIANTE BROCHA O RODILLO, SE DADE PERMISO PARA EFECTUAR ESTE METODO DE TRABAJO. ASI MISMO SE SOLICITA LA VERIFICACION DE LOS ENCOFRADOS Y LA DISPOSICION DE LOS ALEROS DE CONSTRUCCION EN LA ESTRUCTURA DEL BARRATE YA QUE ESTA SE EFECTUA EN BASE A LOS PLANOS Y METRADOS Y ESPECIFICAS TECNICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

Asiento N° 058

Jueves 23 de Setiembre del 2021

Del Supervisor de obra

A la fecha se continúa con los trabajos con total normalidad sobre el Asiento N° 057 al Residente en la Partida 1.5.1.3.7

TABLAS PREFABRICADAS de dimensiones $1.30 \times 0.50 \times 0.15$ m

En donde Solicitan de dimensiones $1.30 \times 0.25 \times 0.15$ m sin variar

la calidad del concreto ni el acero, ni tampoco se tendrán mayores

mitades ni deductivas en tanto la Supervisión aprueba dicho

Cambio ya que se tendrá que fabricar el doble de la cantidad de

trabajo por el expediente técnico ya que para el manipuleo

será mejor para cualquier eventualidad, así también el peso

del ~~expediente~~ ^{trabajo} será $1.30 \times 0.50 \times 0.15 \times 2400 \text{ kg/m}^3 = 234 \text{ kg}$ este

Peso no es manipulable manualmente para con las dimensiones

$1.30 \times 0.25 \times 0.15 \times 2400 \text{ kg/m}^3 = 117 \text{ kg}$ este peso se puede manipular

con la presente de tres personas, entanto es más recomendable

así también la Enmienda en el Asiento Anterior por el Residente

sobre el vaciado en tres partes primero por la cantidad de concreto

que no es posible ver dentro en el tiempo de fabricación de la

misma y segunda por la gran cantidad de Agua subterránea

difícil de controlar. Solicita vaciar en tres partes y que utilicen

Aditivo Epoxi Adhesivo Estructural de Concreto fresco con

Concreto endurecido, se autoriza dicho trabajo pero deberá

de tener bastante cuidado con el uso del Aditivo. A la que deberá

hacer Alance el uso y aplicación al dicho Aditivo porque la

Supervisión recomienda el vaciado monolítico.

Así también se verifica el Armado de Acero en el trabajo

que se encuentra de Indicado según el Expediente Técnico

Al mismo tiempo se recomienda apuntalar el encofrado para

que no haya desalineamiento.



CONSORCIO HACIENDA SUCRE

Ing. E. [Firma]

RESIDENTE

ING. INSPECTOR



Ing. E. [Firma]

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

Asiento Nro 59 Viernes 24 de Septiembre del 2021
Del Supervisor de obra

A la fecha se prosigue con los trabajos con total normalidad. Así también se desarrolla el plan de Seguridad y Salud en el trabajo para que pueda ser cumplido. Así también se van haciendo los trabajos de la base prefabricada (tapas) para el canal corrido por otro lado en cumplimiento al Art 187 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado - Funciones del Inspector o Supervisor. Tanto en el numeral 187.1 "La Entidad controla los trabajos efectuados por el Contratista a través del Inspector o Supervisor, según corresponda quien es el Responsable de la obra directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y Administrativa de la obra y el cumplimiento del Contrato (...)" Así también según el Numeral 187.2 el Inspector o Supervisor, según corresponda, está facultado para Ordenar el Retiro de cualquier Subcontratista o trabajador por Incapacidad o Incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra para rectificar y ordenar el retiro o por el incumplimiento de las Especificaciones Técnicas (...)" En cumplimiento a la normativa el PLCE Solicito y lo Indico el Retiro del maestro de obra por que Perjudica la buena Marcha de la obra Así también por una Incorrecta ejecución técnica de la obra en la que deberá de ser retirado y a la vez Reemplazado por un nuevo maestro de obra a la brevedad posible para la buena marcha de obra Así también deberá de tener experiencia en la ejecución de este tipo de obras (bocatoma - canales)

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

Ing. Carlos Soto
RESIDENTE DE OBRA
ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad Ejecutora: _____

ASIENTO Nº 060 DEL RESIDENTE 24-09-2021 / VIERNES
DADO QUE EXISTE UN TRAMITE DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS Y EL INFORME DEL ARQUEOLOGO LIC. HENRY POMPEYO COLLANA RODRIGUEZ DONDE EFECTUO TRABAJO DE CAMPO DONDE RECORRIO E HIZO LA INSPECCION DE SUPERFICIE DE LAS AREAS QUE INVOLUCRA EL PROYECTO EN GENERAL DESDE LA BOTAOMA HASTA LOS CANALES EXISTENTES DE TIERRA DONDE CONCLUYE BASTO CONSTATAACION SUPERF. DE LA INEXISTENCIA DE LAS MISMAS, LO QUE SE PUEDEN REALIZAR TRABAJOS LO QUE TAMBIEN SE EFECTUARA EL SEGUIMIENTO DE PARTE DEL ARQUEOLOGO MIENTRAS SARE LOS TRAMITES, DICHO ESTO SOLICITAMOS TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA DE LOS CANALES LATERALES EN PARTICULAR EL CANAL LATERAL 4 Y EL CANAL LATERAL 3 Y CANAL LATERAL 2 ASIMISMO EL ENRIQUECIMIENTO Y/O DIQUE DE LATERAL IZQUIERDO AGUAS ARRIBA CUYOS PLANOS DE REPANTEO SON ALCANZADOS A LA SUPERVISION TAL COMO SON PLANTA Y PERELL ASI COMO SECCIONES TRANSVERSALES Y CUANDO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. SE SOLICITA PERMISO PARA EFECTUAR LABORES DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO, RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE

Ing. Eloy Sosa Sánchez
CIP: 79193
RESIDENTE DE OBRA



Ing. Eloy Sosa Sánchez
CIP: 136709
INGENIERO CIVIL DE OBRA



Ing. Eloy Sosa Sánchez
CIP: 136709
SUPERVISOR DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____

Obra: _____


Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad Ejecutora: _____

ASIENTO Nº 63 DEL PRESIDENTE LUNES 27-09-2021
EN LA FECHA SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS ENCOFRADO
Y HABILITACION DE FIERRO DE CONSTRUCCION EN BARRAJE
2º TRAMO EL CUAL ES CONSIDERABLE EL INGRESO DE AGUA
EN LA EXCAVACION PARA BARRAJE, ASI MISMO SE PROCEDE A
LOS VACIADOS DEL MISMO, CONCRETO $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$,
EN EL DENTELLON EFECTUANDO EL USO DEL ADHESIVO
ESTRUCTURAL PARA PEGADO DE CONCRETO ENDURECIDO Y
CONCRETO FRESCO. SE PROSIGUEN CON LOS DESBROCES
Y EL RELENO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA CANALES
EN CANAL LATERAL 4. SE PROSIGUEN CON LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DEL DIQUE LADO IZQUIERDO AGUA ARRIBA.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE



Ing. Edgar Saul Machaca Sarmiento
CIP- 79193
RESIDENTE DE OBRA


Ing. De Dios Velásquez Coto
INGENIERO CIVIL 13670
SUPERVISOR DE OBRA

ASIENTO Nº 64 DEL PRESIDENTE MIERCOLES 29-09-2021
EN LA FECHA SE PROSIGUEN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES AL
PROYECTO "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
SUCRE, DISTRITO DE LALY - MELGAR - PUNO", HABILITADO Y
DISPOSICION DE FIERRO $f'c = 4200 \text{ kg/cm}^2$ EN BARRAJE. COLOCADO
CONCRETO $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ EN MURO DE ENCAUZAMIENTO
LADO DERECHO CON PIEDRA (MANCADA + ARENA + CEMENTO).
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS EN DIQUE (ENROCADO) CONFER-
MACION DE TALLA DEL DIQUE, TALUD SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y PUNOS. SE PROSIGUEN LOS TRABAJOS EN CANAL
LATERAL 4 CON RELENO DE MATERIAL DE PRESTAMO, ASI COMO
DEL DESBROCE DEL CANAL LATERAL 2.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE


ING. RESIDENTE
CIP: 79193
RESIDENTE DE OBRA


ING. SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____

Obra: _____

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad Ejecutora: _____

0000003

ASIENTO N° 65 DEL RESIDENTE JUEV. 30-09-2021

EN LA FECHA DE HOY SE PROSIGUEN LAS LABORES CONCERNIENTES A LA OBRA. ASI MISMO SE PROCEDE A CON LA VERIFICACION DE LOS AVANCES DEL MES DE SETIEMBRE 2021 CUYO RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS ES COMO SIGUE:

1.11 CARTEL DE OBRA	01 UND.
1.1.2 ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	01 MES.
1.2.1 TRAZO, NIVELES Y REPUNTEO	01 MES
1.3.1.1. DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO	1210.62 M ²
1.3.1.2.2 EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO	874.01 M ³
1.3.1.2.3 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO	2106.55 M ²
1.3.1.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1109.03 M ³
1.3.1.3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	37.57 M ²
1.3.1.3.2 CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm ² +40% PM	39.11 M ³
1.3.1.4.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	608.95 M ²
1.3.1.4.2 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm ²	14,347.01 Kg
1.3.1.4.3 CONCRETO f'c=210 kg/cm ²	325.86 M ³
1.3.1.4.4 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENO	29.60 m
1.3.1.4.6 CURADO CONCRETO	787.45 m ²
1.3.1.7.3 PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO	6.00 UND.
1.4.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO	1500.00 M ²
1.4.2.1 LIMPIEZA DE CAUCE DE RIO	1500.00 M ²
1.4.2.2 EXCAVACION PARA CONFORMACION DE UNA ANTIS	880.70 M ³
1.4.2.3 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO	1300.00 M ²
1.4.3.1 PROVISION DE ROCA PARA ENROCAMIENTO	1200.00 M ³
1.4.3.2 SELECCION DE ROCA EN CANTERA	1200.00 M ³
1.4.3.3 CARGUIO DE ROCA EN CANTERA	800.00 M ³
1.4.3.4 TRANSPORTE DE ROCA	800.00 M ³
1.4.3.5 ACOMODO DE ROCA EN DIQUE	800.00 M ³
1.5.1.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO	74250 M ²
1.5.1.3.7 TOPAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 1.3x0.5x0.5	150 UND

CONSORCIO HACIENDA SUCRE



Ing. [Signature]
RESIDENTE D. [Signature]
RESIDENTE

ING. INSPECTOR



ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____

Obra: _____

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad Ejecutora: _____


000002

7 VIENEN 0.20 DEL ASIENTON 65 DEL RESIDENTE

1.6.2.1.1 DESBORCE Y LIMPIEZA DE TERRENO	17.50 00 M ²
1.6.2.2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUERTO	75.00 M ³
1.6.2.2.2 RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MAT. PROPIO	63.00 M ³
1.6.2.2.3 RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MAT. PRESTAMO	550.00 M ³
1.6.4.1.1 DESBORCE Y LIMPIEZA DE TERRENO	5008.00 M ²
1.6.4.2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUERTO	254.29 M ³
1.6.4.2.2 RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MAT. PROPIO	228.86 M ³
1.6.4.2.3 RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MAT. DE RES	236.34 M ³
1.6.4.2.4 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO	2,145.00 M ²
1.9.1 FLETE TERRESTRE JULACA - LLALLI	0.20 S/L
1.9.2 TRANSPORTE DE MATERIALES A PIE DE OBRA	25 DIA
1.11.2 PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL	0.10 S/L
1.11.3 PROGRAMA DE MONETO DE RESIDUOS Y LIQUID.	0.10 S/L
1.11.5 PLAN DE CONTINGENCIAS	0.10 S/L
1.11.6 SUPERVISION AMBIENTA	0.12 S/L
1.12.1 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	0.30 S/L
1.12.1 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	0.70 S/L

SE SOLICITA APROBACION DE LOS METRADOS DESCRITOS
Y EJECUTADOS REALMENTE.

CONSORCIO HACIENDA SUCRE


CIP: 79193
PRESIDENTE DE OBRA


SUPERVISOR DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº



Fecha: _____ Modalidad: _____

Obra: _____

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad Ejecutora: _____

Acuerdo N.º 066

Jueves 30 de Septiembre del 2021

Del Supervisor de obra

A la fecha se continúan con los trabajos con total normalidad. Así también el día de hoy por ser el último día del mes se concluyen los trabajos en cumplimiento al PLCE y sus modificaciones, lo que se acuerda en el Acuerdo N.º 066 de parte del Contratista se apruebe los trabajos ejecutados en el mes de Septiembre del 2021, así también se compromete a seguir los trabajos para este mes que viene.



CONSORCIO HACIENDA SUCRE

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA

ING. SUPERVISOR
