



**RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 083-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE**

Lima, **11 MAR. 2022**

VISTO: El Informe N° 213-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP, de fecha 10.03.2022, de la Oficina de Gestión de Proyectos, relacionado al Código Único de Inversión N° 2471220, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a sus funciones y naturaleza institucional, establecida por los Lineamientos de Gestión aprobados por Resolución Ministerial N° 471-2017-MINAGRI, la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, es un programa adscrito al Despacho Vice Ministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, tiene como objetivo incrementar la seguridad hídrica agraria contribuyendo a la prosperidad del agro peruano a través de la siembra y cosecha de agua de las áreas agrícolas y alto andinas de todo el territorio Peruano, favoreciendo prioritariamente a aquellos agricultores con menores niveles de ingreso económico, en situación de pobreza y extrema pobreza, a través del financiamiento de Actividades en materia de siembra y cosecha de agua a nivel nacional, utilizando la tecnología que diseñe el Fondo Sierra Azul para cada ámbito de intervención;

Qué, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 094-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 04.02.2020, la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul" aprobó el Expediente Técnico de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de Agua; En El(La) Unidad Productora Sistema de Riego de los Sectores Ocshahuay, Chicchipunta, Carretera Divisoria Ganamanay, Mashampampa, Sillapata, Cumbre Pucara, Ancahuachanan, Potrero y Apash; Distrito de Paucartambo, Provincia Pasco, Departamento Pasco", con Código Único de Inversión N° 2471220; cuya obra ha sido culminada a la fecha, tal como lo ha manifestado los Residentes de Obra en los Asientos del Cuaderno de Obra N° 125,126 y 089; y los Supervisores de Obra en los Asientos del Cuaderno de Obra N° 126,127 y 091;

Qué, mediante el Informe de Visto, emitido por la Oficina de Gestión de Proyectos ratifica y da cuenta documentadamente del término de la obra antes señalada; y, en consecuencia, solicita en observancia a lo establecido en el inciso 6.3.7 del numeral 6.3 de la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA "Lineamientos para la Ejecución de Obras por la modalidad de Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul", aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 328-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, la conformación de la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra;



Por las consideraciones antes expuestas, de conformidad con la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA "Lineamientos para la Ejecución de Obras por la modalidad de Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul", aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 328-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, de fecha 06 de setiembre de 2021; así como la Directiva General N° 004-2020-UEFSA-MINAGRI: "Lineamientos para la Liquidación de Inversiones de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua de la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul, bajo la modalidad de Ejecución de Administración Directa", aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 408-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 24 de noviembre de 2020; y las facultades conferidas por los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul", aprobados por Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI;

Con el visto bueno de la Oficina de Gestión de Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – Conformar la Comisión de Recepción y Transferencia de la Obra del proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2471220, de acuerdo al siguiente detalle:

Qocha Cushurcocha 2 con Código de Obra Pas3-2019-Q5 y Qocha Cushurcocha 3 con Código de Obra Pas3-2019-Q6

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Mirko Joan Euscate Cardenas
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	
Miembro de la Comisión	
Ing. Alfredo Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Ruth Milly Ramírez Esteban	

Qocha Verdecocha 1 con Código de Obra Pas3-2019-Q7

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Mirko Joan Euscate Cardenas
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	
Miembro de la Comisión	
Ing. Alfredo Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Liz Roxana Ancasi Yaranga	

ARTÍCULO SEGUNDO. – Disponer que los miembros de la Comisión de Recepción y Transferencia de la Obra antes señalada, conformada en el artículo precedente, ejercerán sus funciones conforme a la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA "Lineamientos para la Ejecución de Obras por la modalidad de Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul", aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 328-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE; así como la Directiva General N° 004-2020-UEFSA-MINAGRI: "Lineamientos para la Liquidación de Inversiones de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua de la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul, bajo la





**RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE**

modalidad de Ejecución de Administración Directa”, aprobada con Resolución
Directoral Ejecutiva N° 408-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE.

ARTÍCULO TERCERO. – Disponer la notificación de la presente Resolución a
los profesionales señalados en el artículo primero de la presente Resolución, y a la
Oficina de Gestión de Proyectos, para los fines de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el
portal institucional de la Unidad Ejecutora 036-001634: Fondo Sierra Azul
(www.sierraazul.gob.pe)

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRAAZUL

Ing. Max Alberto Sáenz Carrillo
Director Ejecutivo





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N° 213 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA/DE-OGP



A : ING. MAX ALBERTO SAENZ CARRILLO
Director Ejecutivo
Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul

Asunto : Conformación de Comisión de Recepción y Transferencia de Obra de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con Código Único de Inversión N° 2471220

Fecha : Jesús María, 10 MAR. 2022

Es grato dirigirme a usted, en atención al asunto de la referencia, a fin de hacer de conocimiento el término de la ejecución física de la obra, y a su vez solicitar la conformación de la Comisión de Recepción y Transferencia de la Obra, teniendo en cuenta lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 094-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 04 de febrero de 2020, se aprobó el Expediente Técnico de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de Agua; En El(La) Unidad Productora Sistema de Riego de los Sectores Ocshahuay, Chicchipunta, Carretera Divisoria Ganamanay, Mashampampa, Sillapata, Cumbre Pucara, Ancahuachanan, Potrero y Apash; Distrito de Paucartambo, Provincia Pasco, Departamento Pasco", con Código Único de Inversión N° 2471220.
- 1.2. La Residente de Obra, Ingeniera Mirella Alanya Barzola, mediante los Asientos del Cuaderno de Obra N° 125 y 126, comunico a la Supervisora de Obra, Ingeniera Ruth Milly Ramírez Esteban, la conclusión de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2471220, Actividad Qocha Cushurcocha 2 con Código de Obra Pas3-2019-Q5 y Qocha Cushurcocha 3 con Código de Obra Pas3-2019-Q6.
- 1.3. La Supervisora de Obra, Ingeniera Ruth Milly Ramírez Esteban, mediante los Asientos del Cuaderno de Obra N° 126 y 127, comunicó a la Oficina de Gestión de Proyectos, la culminación de Obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2471220, Actividad Qocha Cushurcocha 2 con Código de Obra Pas3-2019-Q5 y Qocha Cushurcocha 3 con Código de Obra Pas3-2019-Q6.
- 1.4. El Residente de Obra, Ingeniero Juan Juarez Ludeña, mediante el Asiento del Cuaderno de Obra N° 089, comunico a la Supervisora de Obra, Ingeniera Liz Roxana Ancasí Yaranga, la conclusión de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2471220, Actividad Qocha Verdecocha 1 con Código de Obra Pas3-2019-Q7.
- 1.5. La Supervisora de Obra, Ingeniera Liz Roxana Ancasí Yaranga, mediante el Asiento del Cuaderno de Obra N° 091, comunicó a la Oficina de Gestión de Proyectos, la culminación de Obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2471220, Actividad Qocha Qocha Verdecocha 1 con Código de Obra Pas3-2019-Q7.





II. BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 0012-2019-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento del Fondo Sierra Azul y crea el Comité Técnico del Fondo Sierra Azul.
- Resolución Ministerial N° 0375-2016-MINAGRI, Resolución Ministerial que encarga al Fondo MI RIEGO la dirección, articulación, orientación y supervisión de estudios de preinversión y proyectos de inversión pública financiados con recursos provenientes del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, a cargo de diversos programas y proyecto.
- Resolución Ministerial N° 471-2017-MINAGRI, Resolución Ministerial que aprueba el documento denominado "Lineamiento de Gestión de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul"
- Resolución Directoral Ejecutiva N° 408-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, Resolución Directoral Ejecutiva que aprueba la Directiva General N° 004-2020-MINAGRI—DVDIAR-UEFSA "Lineamientos para la Liquidación de Inversiones de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua en la Unidad Ejecutora 0036-001634- Fondo Sierra Azul"
- Resolución Directoral Ejecutiva N° 328-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, Resolución Directoral que aprueba la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA "Lineamientos para la Ejecución de Obras por Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-001634 – Fondo Sierra Azul"

III. ANÁLISIS

DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA UNIDAD EJECUTORA 0036-001634 "FONDO SIERRA AZUL"

Una vez concluida la obra conjuntamente con los beneficiarios y representantes de la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul" suscribirán el Anexo N° 17 - Acta de Terminación y Conformidad de Obra, a partir del cual el Supervisor o Inspector de Obra solicitará por escrito a la entidad la designación de la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra.

DE LA RESIDENTE DE OBRA (Qocha Cushurcocha 2 con Código de Obra Pas3-2019-Q5 y Qocha Cushurcocha 3 con Código de Obra Pas3-2019-Q6)

Cabe señalar que, la Ingeniera Mirella Alanya Barzola, en su calidad de Residente de Obra, mediante los Asientos del Cuaderno de Obra N° 125 y 126, comunico a la Supervisora de Obra, Ingeniera Ruth Milly Ramírez Esteban, la conclusión de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2471220, Actividad Qocha Cushurcocha 2 con Código de Obra Pas3-2019-Q5 y Qocha Cushurcocha 3 con Código de Obra Pas3-2019-Q6.

DE LA SUPERVISORA DE OBRA (Qocha Cushurcocha 2 con Código de Obra Pas3-2019-Q5 y Qocha Cushurcocha 3 con Código de Obra Pas3-2019-Q6)

Cabe señalar que, la Ingeniera Ruth Milly Ramírez Esteban, en su calidad de Supervisora de Obra, mediante los Asientos del Cuaderno de Obra N° 126 y 127, comunicó a la Oficina de Gestión de Proyectos, la culminación de Obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2471220, Actividad Qocha Cushurcocha 2 con Código de Obra Pas3-2019-Q5 y Qocha Cushurcocha 3 con Código de Obra Pas3-2019-Q6.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

DEL RESIDENTE DE OBRA (Qocha Verdecocha 1 con Código de Obra Pas3-2019-Q7)

Cabe señalar que, el Ingeniero Juan Juarez Ludeña, en su calidad de Residente de Obra, mediante el Asiento del Cuaderno de Obra N° 089, comunico a la Supervisora de Obra, Ingeniera Liz Roxana Ancasi Yaranga, la conclusión de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2471220, Actividad Qocha Verdecocha 1 con Código de Obra Pas3-2019-Q7.

DE LA SUPERVISORA DE OBRA (Qocha Verdecocha 1 con Código de Obra Pas3-2019-Q7)

Cabe señalar que, la Ingeniera Liz Roxana Ancasi Yaranga, en su calidad de Supervisora de Obra, mediante el Asiento del Cuaderno de Obra N° 091, comunicó a la Oficina de Gestión de Proyectos, la culminación de Obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2471220, Actividad Qocha Qocha Verdecocha 1 con Código de Obra Pas3-2019-Q7.

Por otro lado, luego de haber verificado exhaustivamente la ejecución de las metas de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, autorizándose al Residente de Obra y el Supervisor de Obra, levanten las Actas de Terminación de Obra y prosiga con el trámite respectivo.

DEL TERMINO DE LAS OBRAS

Al respecto, debemos manifestar que, teniendo conocimiento del término de las obras, se procederá a designar a la Comisión que estará a cargo de la recepción de la obra y en el mismo acto, efectúe la transferencia de estas.

Dicha comisión de recepción y transferencia de obra, una vez que verifique la ejecución de la obra sin observaciones, levantará el Acta de Recepción de Obra y además el Acta de Transferencia.

IV. ANALISIS LEGAL DE LA CONCLUSIÓN DE OBRA

De lo expresado anteriormente, podemos indicar que, se cumple con lo establecido en el inciso 6.3.7 y 6.3.9 del numeral 6.3. de la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA "Lineamientos para la Ejecución de Obras por Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-001634 – Fondo Sierra Azul".

V. RECOMENDACIÓN

Por los argumentos expuestos, se recomienda expedir el acto resolutivo conformando la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra.

Por otro lado, para la conformación de la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con Código Único de Inversión N° 2471220, se propone a los siguientes profesionales:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Qocha Cushurcocha 2 con Código de Obra Pas3-2019-Q5 y Qocha Cushurcocha 3 con Código de Obra Pas3-2019-Q6

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	Ing. Mirko Joan Euscate Cardenas
Miembro de la Comisión Ing. Alfredo Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión Ing. Ruth Milly Ramírez Esteban	

Qocha Verdecocha 1 con Código de Obra Pas3-2019-Q7


Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	Ing. Mirko Joan Euscate Cardenas
Miembro de la Comisión Ing. Alfredo Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión Ing. Liz Roxana Ancasari Yaranga	

Atentamente,

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRAZUL

Ing. Alfredo Adalberto Moreno Pisconte
Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos

CUT: 1352 -2022

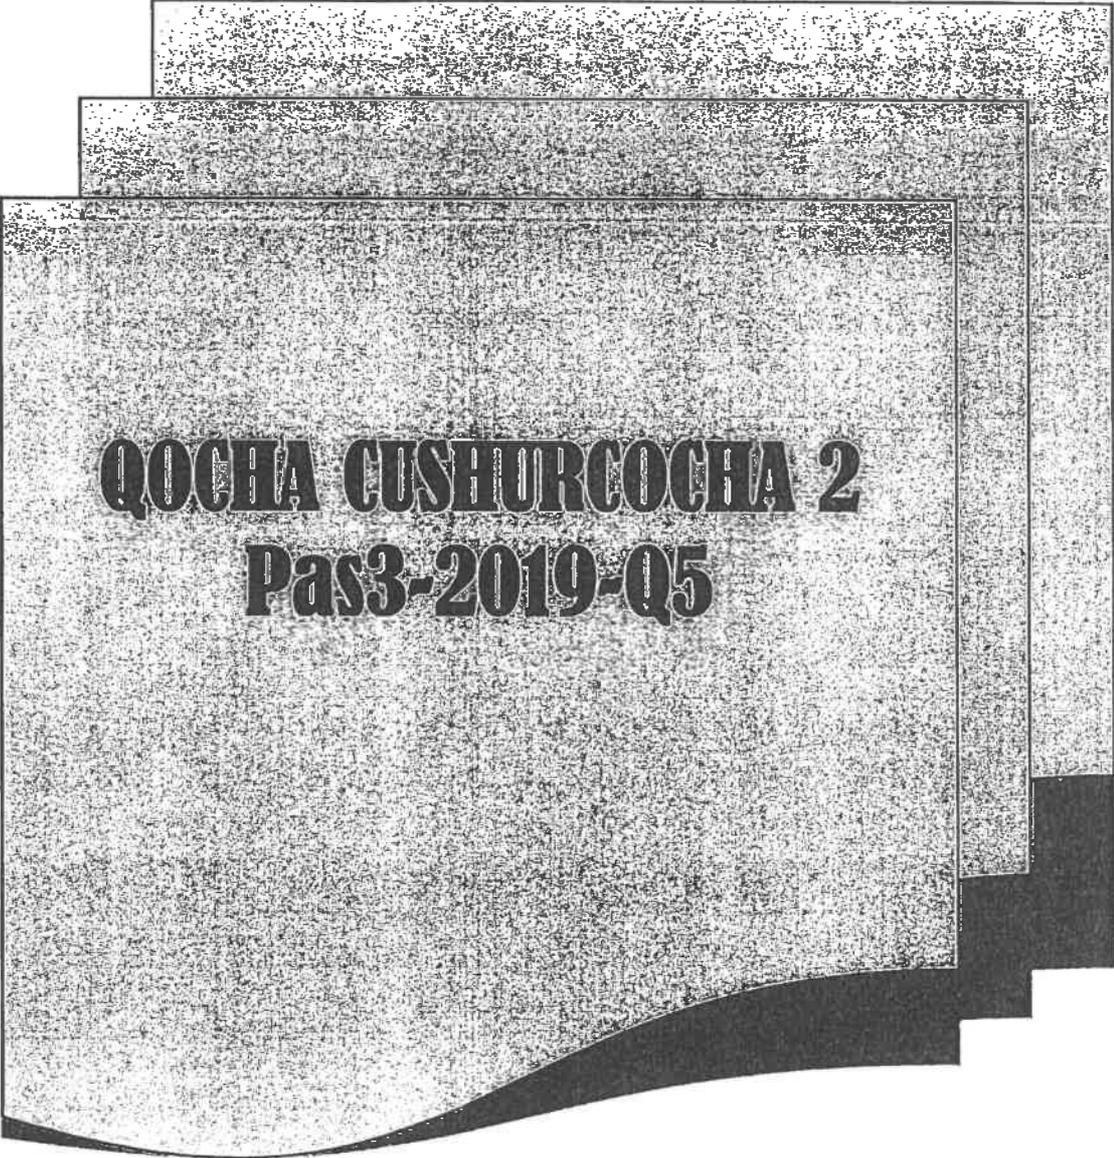

QOCHA CUSHURCOCHA 2
Pas3-2019-Q5



ANEXO N° 17

ACTA DE TERMINACION Y CONFORMIDAD DE OBRA

En la localidad del Anexo de Liriopampa distrito de Paucartambo provincia de Pasco Departamento Pasco a los 02 días del mes Noviembre del 2020 se reunieron.

POR RESIDENTE Y SUPERVISION O INSPECTOR DE OBRA

	Nombre	DNI
Residente de Obra	Mirella Alanya Bartzola	45432224
Supervisor o Inspector de Obra	Ruth Milly Ramirez Esteban	46684798

POR LA UNIDAD EJECUTORA 036-001637 FONDO SIERRA AZUL

	Nombre	DNI
Coordinador Regional:	Ulianov Emerson Zavaia Rutti	10120676

Con la finalidad de constatar el término de obra "CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) UNIDAD PRODUCTORA SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES OCSHAHUAY, CHICCHIPUNTA, CARRETERA DIVISORIA GANAMANAY, MASHAMPAMPA, SILLAPATA, CUMBRE PUCARA, ANCAHUACHANAN, POTRERO Y APASH; DISTRITO PAUCARTAMBO; PROVINCIA PASCO; DEPARTAMENTO PASCO". CUI N° 2471220, Actividad: CUSHURCOCHA 2 Código de Obra: PAS3 -- 2019 - Q5

Verificar su construcción o mejoramiento de acuerdo al expediente técnico (planos, especificaciones técnicas), ejecutando con financiamiento de UNIDAD EJECUTORA 036-001634 FONDO SIERRA AZUL S/ 76,702.26

1.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Según Expediente Técnico)

Se implementará actividades de siembra y cosecha de agua través de la construcción de 12 Qochas, cuyos volúmenes acumulado es: 8'926,094.69 m3.

2.- CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CULMINANDO (ambas partes efectuarán una inspección a la obra constituida, verificando su estado y condición de funcionalidad y operatividad).

La obre ejecutada se encuentra conforme según lo solicitado, encontrándose en óptimas condiciones para su uso correspondiente, siendo así conforme su culminación.

3.-FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA: 30 de Octubre del 2020

4.-OBSERVACIONES

.....


En señal de conformidad suscriben en 4 originales la presente acta:



[Handwritten Signature]
Ing. **Uliana ZAVALA RUTTI**
COORDINADORA REGIONAL
CIP. N° 85391

[Handwritten Signature]
Residente de Obra
CIP. N° 190528

[Handwritten Signature]
Supervisor o Inspector de obra
CIP. N° 152948

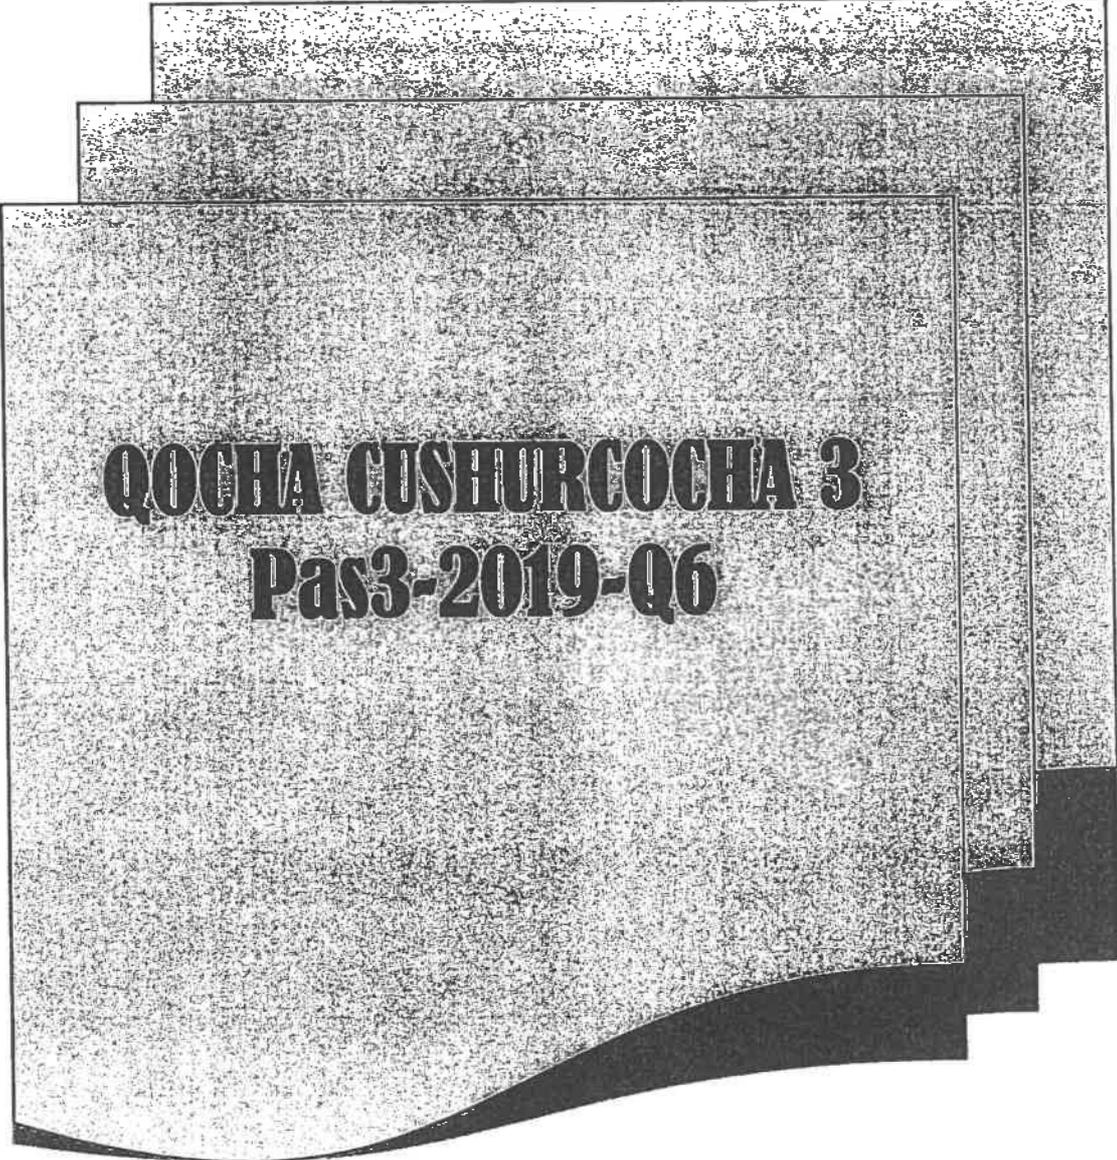

QOCHA CUSHURCOCHA 3
Pas3-2019-Q6



ANEXO N° 17

ACTA DE TERMINACION Y CONFORMIDAD DE OBRA

En la localidad del Anexo de Liriopampa distrito de Paucartambo provincia de Pasco Departamento Pasco a los 02 días del mes Noviembre del 2020 se reunieron.

POR RESIDENTE Y SUPERVISIÓN O INSPECTOR DE OBRA

	Nombre	DNI
Residente de Obra	Mirella Alanya Barzola	45432224
Supervisor o Inspector de Obra	Ruth Milly Ramírez Esteban	46684798

POR LA UNIDAD EJECUTORA 036-001637 FONDO SIERRA AZUL

	Nombre	DNI
Coordinador Regional:	Ulianov Emerson Zavala Rutti	10120676

Con la finalidad de constatar el término de obra "CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) UNIDAD PRODUCTORA SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES OCSHAHUAY, CHICCHIPUNTA, CARRETERA DIVISORIA GANAMANAY, MASHAMPAMPA, SILLAPATA, CUMBRE PUCARA, ANCAHUACHANAN, POTRERO Y APASH; DISTRITO PAUCARTAMBO; PROVINCIA PASCO; DEPARTAMENTO PASCO". CUI N° 2471220, Actividad: CUSHURCOCHA 3 Código de Obra: PAS3 – 2019 – Q6

Verificar su construcción o mejoramiento de acuerdo al expediente técnico (planos, especificaciones técnicas), ejecutando con financiamiento de UNIDAD EJECUTORA 036-001634 FONDO SIERRA AZUL S/104,785.82

1.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Según Expediente Técnico)

Se implementará actividades de siembra y cosecha de agua través de la construcción de 12 Qochas, cuyos volúmenes acumulado es: 8'926,094.69 m3.

2.- CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CULMINANDO (ambas partes efectuaran una inspección a la obra constituida, verificando su estado y condición de funcionalidad y operatividad).

La obre ejecutada se encuentra conforme según lo solicitado, encontrándose en óptimas condiciones para su uso correspondiente, siendo así conforme su culminación.

3.-FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA: 30 de Octubre del 2020

4.-OBSERVACIONES

.....

En señal de conformidad suscriben en 4 originales la presente acta:



PERÚ Ministerio de Agricultura y Riego

Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul

[Handwritten Signature]
Coordinador General ZAVALA RUTTI
REGIONAL DE PASCO
CIP. N° 88391 CIP. 86381

[Handwritten Signature]
Residente de Obra
CIP. N° 190528

[Handwritten Signature]
Supervisor o Inspector de obra
CIP. N° 152948

QOCHA VERDECOCHA 1
Pas3-2019-Q7



ANEXO N° 17

ACTA DE TERMINACION Y CONFORMIDAD DE OBRA

En la localidad de Cochambra distrito de Paucartambo provincia de Pasco Departamento de Pasco al 31 día del mes Octubre del 2020 se reunieron.

POR RESIDENTE Y SUPERVISION O INSPECTOR DE OBRA

	Nombre	DNI
Residente de Obra	Ing. Juan Cesar Juarez Ludeña	20071254
Supervisor o Inspector de Obra	Ing. Liz Roxana Anccasi Yaranga	40010854

POR LA UNIDAD EJECUTORA 036-001637 FONDO SIERRA AZUL

	Nombre	DNI
Coordinador Regional	Ing. Ulianov Emerson Zavala Ruti	10120676

Con la finalidad de constatar el término de obra fue cumplida según el expediente técnico con CUI 2471220, Actividad Qocha Verdecocha 1 Código de Obra PAS3-2019-Q7.

Verificar su construcción o mejoramiento de acuerdo al expediente técnico (planos, especificaciones técnicas), ejecutando con financiamiento de UNIDAD EJECUTORA 036-001634 FONDO SIERRA AZUL S/ 109,915.75 (Ciento nueve Mil Novecientos Quince con 75/100 Soles).

1.-DESCRIPCION DEL PROYECTO (Según Expediente Técnico)

a) Construcción de captación superficial (12 Qochas) se implementará actividades de siembra y cosecha de agua través de la construcción de 12 Qochas, cuyo volumen acumulado es 8'926,094.69 m3.

2.- CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CULMINANDO (ambas partes efectuaran una inspección a la obra constituida, verificando su estado y condición de funcionalidad y operatividad).


Se verifica la obra VERDECOCHA 1, con código PAS3-2019-Q7, en su totalidad de termino de obra 100 %, con todo el trabajo que figura en el expediente técnico.

3.-FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA: 31 de octubre de 2020

4.-OBSERVACIONES

Las intensas lluvias no han dejado trabajar el cual, a generado cierto atraso, en el avance de obra, los cambios del personal que nos dio la comunidad han sido rotatorio, la maquinaria de acuerdo al expediente no era el adecuado, esa observación se hace al expediente técnico, los metrados también han variado, algunos planos faltan detalles.

En señal de conformidad suscriben en 4 originales la presente acta:


 Ing. Juan César JUAREZ LUDEÑA
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. 125156


 Ing. Liz ANCCASI YARANGA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP. 134562


 Ing. Ulianov Emerson ZAVALA RUTTI
 COORDINADOR REGIONAL DE PASCO
 CIP. 66391

CUADERNO DE OBRA



FECHA: 20-10-2020 MODALIDAD: "ADMINISTRACION DIRECTA"
OBRA: COSHURCOCHA "2"
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA"
PROGRAMA: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
ENTIDAD EJECUTORA: "SIERRA AZUL"

Asiento N°: 123 Fecha: 20/10/2020
DEL RESIDENTE
DEL PERSONAL - OFICIAL, 2.º PÓNENES.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- se continúa con los trabajos de la forma y la descarga del agua.
- se continúa con los trabajos de limpieza en el agua.



MIRILLA ALANYA BARZOLA
Ingeniero Civil
CIP N° 190528
Residente de Obra

Asiento N°: 124 Fecha: 20/10/2020
DE LA SUPERVISIÓN

Respecto a las partidas ejecutadas se verifican todas las partidas que se están cumpliendo según los planos de la forma y la descarga del agua y de igual manera se verifica la limpieza del agua con su respectivo cuidado en obra.



MIRILLA ALANYA BARZOLA
Ingeniero Civil
CIP N° 190528
Residente de Obra


Ing. Rein Miry RAMÍREZ ESTEBAN
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 152848

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: 21-10-2020

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: CUSHURCOCHA 2'

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA"

PROGRAMA: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIESGO

ENTIDAD EJECUTORA: "SIERRA AZUL"

Asiento N° 125

Fecha: 21/10/2020

DEL RESIDENTE

DEL PERSONAL - OFICIAL - 1, PEONES - 2.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- se termina los trabajos de la forma y descarga a su 100% según plano
- a la vez se hace el acabado del pintado de la forma y descarga del dique.
- se continúa con los trabajos de limpieza en obra.



Mirella Alanya Barzola
MIRELLA ALANYA BARZOLA
Ingeniero Civil
CIP N° 190528
Residente de Obra

Asiento N° 126
DE LA SUPERVISION

Fecha 21/10/2020

Respecto al término de los trabajos de la forma y descarga se verifica los acabados al 100% en obra y de igual manera los acabados de pintado en forma y descarga del dique.



Mirella Alanya Barzola
MIRELLA ALANYA BARZOLA
Ingeniero Civil
CIP N° 190528
Residente de Obra

Ruth Mily Ramirez Esteban
Ing. Ruth Mily RAMÍREZ ESTEBAN
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 152948

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: 22-10-2020. MODALIDAD: "ADMINISTRACIÓN DIRECTA"
OBRA: CUSHURCOCHA 2"
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA"
PROGRAMA: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
ENTIDAD EJECUTORA: SIERRA AZUL

Asiento N° 127
DEL RESIDENTE

FECHA: 22/10/2020

DEL PERSONAL - OFICIA - 1, PROMES : 2.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- se termina la LIMPIEZA total de la OBRA al 100%.
A LA VEZ SE CULMINA todas las PARTIDAS SIN RESERVA
SIONES.
- se solicita la APROBACION al 100% a la SUPERVISION
de las PARTIDAS SUSCRITAS DE ACUERDO al expediente
TECNICO.

Asiento N° 128
DE 2ª SUPERVISION:

FECHA 22/10/2020

- Respecto al asiento del RESIDENTE se SUPERVISA la
limpieza total de la OBRA, TAMBIEN se VERIFICA las
PARTIDAS TERMINADAS que si cumple al 100% termino
de la OBRA.
- TAMBIEN se VERIFICA que no HABIENDO OBSERVACIONES en
la OBRA se le comunica a la ENTIDAD que la OBRA terminado
a su 100% y a LA VEZ se COMUNICARA al comite de
RECEPCION de OBRA que la OBRA esta terminado a
su 100%.

Ing. Ruth MILLY RAMIREZ ESTEBAN
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 162948

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA




FECHA: 20-10-2020 MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: CUSAURCOCHA 3
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA"
PROGRAMA: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCO
ENTIDAD EJECUTORA: "SIERRA AZUL"

Asiento N° 124
A RESIDENTE
del personal - OFICIAL
- PUNOS 02

Fecha: 20-10-2020

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- se continúa con los trabajos de colocación de champa en el dique.
- se realiza los trabajos de pintura en la toma y la descarga en el dique
- se realiza la limpieza de la obra.

Asiento N° 125
A SUPERVISIÓN

Fecha: 20-10-2020

se verifica los acabados de mampostería del aliviadero a su 100% si cumple acuerdo a plano

- se supervisa los trabajos de colocación de champa en el dique y a la vez se verifica los acabados de pintura de la toma y descarga





Ing. Ruth Milly RAMÍREZ ESTEBAN
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 152948

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: 21-10-2020 MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: CUSHURCOCHA 3
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA
PROGRAMA: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
ENTIDAD EJECUTORA: "SIERRA AZUL"

Asiento N° 126 Fecha: 21-10-2020
DEL RESIDENTE
Del PERSONAL - OFICIAL
- PEONES O2

Actividades Ejecutadas

- se termina los trabajos de colocacion de CHAMPA EN el DIGUE A SU 100 %.
- se continuan con los trabajos de limpieza EN OBRA.

Asiento N° 127 Fecha: 22-10-2020
DEL RESIDENTE
DEL PERSONAL - OFICIAL
- PEONES O2

Actividades Ejecutadas.

- se termina los trabajos de limpieza A 100 % EN OBRA Y A LA VEZ se CUMPLEN todas las PARTIDAS SIN OBSERVACIONES.
- se solicita LA APROBACION A 100 % A LA SUPERVISION DE LAS PARTIDAS SUSCRITOS DE ACUERDO AL expediente TECNICO.

Ing. Ruth Milly RAMIREZ ESTEBAN
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 152948

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA




FECHA: 22-10-2020 MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: CUSHURCOCHA 3
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA"
PROGRAMA: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
ENTIDAD EJECUTORA: SIERRA AZUL*

Asiento N° 128
LA SUPERVISION

Fecha: 22-10-2020

- Respecto al asiento del residente se supervisa la limpieza total en obra, tambien se verifica las partidas terminadas que se cumple al 100% termino de la obra.
- tambien se verifica que no habiendo observaciones en la obra se le comunica a la entidad que la obra terminada a su 100% y la vez se comunicara al comite de recepcion de obra, que la obra esta terminada a su 100%.



MIRELLA ALANYA BARZOLA
Ingeniero Civil
CIP N° 190528
Residente de Obra


Ing. Rogelio RAMIREZ ESTEBAN
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 152948

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR



CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:


FECHA

Asiento N° 88

26-10-2020

Del ~~Reservista~~

En el anexo se revisa y evalúa y se le autoriza el
Usado de la Caja de Valores y se le indica
al residente que supervise bien el concreto -
con los datos que están en el plano
al término del bacheado.


Ing. Liz ANCASTI YARANGA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. 134562

Asiento N° 89

27/10/2020

Del residente

Personal:


02 operarios

01 oficial

09 peones

Termino al 100% de la empedración del dique
una cara (hacia la laguna)


se solicita cierre y administración de obra


Ing. Juan César JUAREZ LUDENA
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 125158

.....
ING. RESIDENTE

.....
INSPECTOR





CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

Asiento N° 90 28 / 10 / 2020

Del Residente

Personal:

02 operarios 01 oficial 09 peones.

Materiales: 03 bolsas de cemento 48 palas de agregados

Desencajado de la caja de voladura; armado de dadas para el zócalo (soporte de la voladura); limpieza de provisiones temporales

Juan César Juárez Ludena
Ing. Juan César JUAREZ LUDENA
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 125158

Asiento N° 91

Del supervisor 28 / 10 / 2020

ante el pedido de culminación de obra se verificó en campo, en la visita en campo se observa que en la corona falta algunos detalles los cujos, falta pintado de tapa y que vuelva a colocar la voladura, se le da de tres días para que frente las observaciones hasta el 31 - 10 - 2020 El cual se volara a urgencias.

Liz Ancasi Yarangá
Ing. Liz ANCASÍ YARANGA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. 134562

.....
ING. RESIDENTE

.....
INSPECTOR





CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

Asiento N° 92 29/10/2020

Del residente:

Personal:

02 operarios 01 oficial 09 peones

Materiales: 01 brocha 48 pinturas esmalte

Pintado de tapa y colocación de roloula, se paso ordenar los herramientas y tambien los materiales

Ing. Juan Cesar JUAREZ LUDENA
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 125156

Asiento N° 93

30/10/2020

Del residente

Personal:

02 operarios 01 oficial 09 peones


Scopio de residuos solidos, restauraciones morfologicas de las areas utilizadas

Ing. Juan Cesar JUAREZ LUDENA
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 125156

.....
ING. RESIDENTE

.....
INSPECTOR





CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:


Contratista:

FECHA

Asiento N° 94 30-10-2020

Del Supervisor

se ve los trabajos realizados en cumplimiento a los observaciones pero se le solicita al Residente tener en cuenta el cuidado y resguardo de los Herramientas y Saldo de obra a buen recaudo para hacer entrega al Centro poblado Cochabamba y sus representantes.


Ing. Liz ANCCASI YARANGA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. 134562

Asiento N° 95 31/10/2020

Del Residente

Personal:

02 operarios 01 oficial 09 personales

Se solicita al area de supervisión de nuevo al cierre de obra.


Prueba de agua de la tubería y eliminación de residuos solidos


Ing. Juan César JUAREZ LUDENA
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 125150

.....
ING. RESIDENTE

.....
INSPECTOR





CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:


FECHA

A Sanlúcar N° 96

31-10-2020

Del Supervisor

Se realizó la Evaluación de los trabajos que faltaba culminar y que el área este limpia y sin residuos. Salida se le acepta la culminación de obra, se le pide al residente de obra haga los trámites para su conformación de Comité de Recepción y mi persona informo al Coordinador la culminación de obra.


Ing. Liz AMCASÍ YARANCA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. 134562

.....
ING. RESIDENTE

.....
INSPECTOR

