

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

AUDIENCIA REGIONAL 2018:

**LOGROS, DIFICULTADES Y PERSPECTIVAS
DE LA GESTIÓN**

DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Dirección Regional de Agricultura

PROYECTOS EJECUTADOS 2015-2018

AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

**UNIDAD EJECUTORA – DIRECCION REGIONAL DE
AGRICULTURA**

PROYECTOS TRANSFERIDOS 2015

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO SNIP/ UNICO	PROVINCIA	DISTRITO	MODALIDAD EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL ENCONTRADO	ESTADO SITUACIONAL ACTUAL
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL PUCACHACA-CANTA	36964	CANTA	CANTA	ADM. DIRECTA	OBRA PARALIZADA.	OBRA CULMINADA
2	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON	77013	CANTA	PACARAOS	ADM. DIRECTA	OBRA ABANDONADA POR HABER ALCANZADO SU TECHO PRESUPUESTAL	OBRA REGISTRADO Y REINICIADO SU EJECUCION
3	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO LIUYAGARAN COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA II ETAPA	87087	OYON	COCHAMARCA	ADM. DIRECTA	OBRA PARALIZADA POR LLUVIAS.	OBRA CULMINADA
4	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SINCAI - COCHACAYA COCHACAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	96603	OYON	COCHAMARCA	ADM. DIRECTA	OBRA PARALIZADA, POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO Y SE SOLICITO FINANCIAMIENTO AL MEF Y SE ENCUENTRA EN EL MPI 2019.
5	MEJORAMIENTO DEL CANAL CENTRAL CAUJUL - OYON	2094361	OYON	CAUJUL	ADM. DIRECTA	OBRA ABANDONADA POR HABER ALCANZADO SU TECHO PRESUPUESTAL	OBRA CULMINADA
6	CONSTRUCCION BOCATOMA IRRIGACION PATIVILCA	114566	BARRANCA	BARRANCA	ADM. DIRECTA	OBRA PARALIZADA CON PROBLEMAS TECNICOS.	OBRA PARALIZADA CON PROBLEMAS TECNICOS.
7	CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO PATIVILCA SECTOR ARAYA CHICA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA	261448	BARRANCA	BARRANCA	ADM. DIRECTA	OBRA PARALIZADA	OBRA CULMINADA
8	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PUMARINRI EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA	2147740	CAJATAMBO	CAJATAMBO	ADM. DIRECTA	OBRA PARALIZADA POR HABER ALCANZADO SU TECHO PRESUPUESTAL.	OBRA CULMINADA
9	DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUAURA, SECTOR HUACAN - II ETAPA	89894	HUAURA	SANTA MARIA	ADM. DIRECTA	OBRA PARALIZADA POR DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS LICITADOS.	OBRA CULMINADA
10	CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR SAN GERMAN, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA	227053	HUAURA	HUAURA	ADM. DIRECTA	OBRA PARALIZADA POR HABER ALCANZADO SU TECHO PRESUPUESTAL.	OBRA REGISTRADA Y CULMINADA
11	INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR SARAPE - CERRO LA X, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	226393	HUAURA	HUAURA	ADM. DIRECTA	OBRA PARALIZADA POR HABER ALCANZADO SU TECHO PRESUPUESTAL.	OBRA REGISTRADA Y CULMINADA
12	INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR ZOSIMO, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	226412	HUAURA	HUAURA	ADM. DIRECTA	OBRA PARALIZADA POR HABER ALCANZADO SU TECHO PRESUPUESTAL.	OBRA REGISTRADA Y CULMINADA
13	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA CONCEVIDA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA Y DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	158356	HUARAL	SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	CONTRATA	EN EJECUCION	OBRA CULMINADA
14	CONSTRUCCION DE LA REPRESA POTAGA	26545	HUAROCHIRI	SAN PEDRO DE CASTA	ADM. DIRECTA	OBRA ABANDONADA POR HABER ALCANZADO SU TECHO PRESUPUESTAL	OBRA REINICIADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2018 POR CONTRATA
15	CONSTRUCCION CANAL CERRO CALATO A CANTACACHI, HUAROCHIRI - CAÑETE	2029170	HUAROCHIRI	MARIATANA	ADM. DIRECTA	OBRA PARALIZADA, EL SALDO PRESUPUESTAL NO ALCANZABA PARA SU CULMINACION.	OBRA CULMINADA
16	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION HAUSUCARA - PIEDRA PATO	2023109	HUAROCHIRI	MARIATANA	ADM. DIRECTA	OBRA PARALIZADA, EL SALDO PRESUPUESTAL NO ALCANZABA PARA SU CULMINACION.	OBRA PROGRAMADA SU CULMINACION EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

EJECUCION DE CANALES DE RIEGO 2015-2018

Item	Proyecto	Codigo Unico	Presupuesto Ejecutado al 2014	Presupuesto Ejecutado 2015-2017				Ejecución 2018		Modalidad de Ejecucion	ESTADO SITUACIONAL
				2015	2016	2017	Total	PIM	Devengado		
A	CANALES		19,778,136	4,621,971	14,948,016	18,426,828	37,996,815	7,964,279	6,582,128		
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL PUCACHACA-CANTA	2030929	4,111,997	841,955	421,367	0	1,263,322	0	0	AD. DIRECTA	OBRA DE CONTINUIDAD CULMINADA EN NOVIEMBRE DEL 2016 Y LIQUIDADADA MEDIANTE LA RESOLUCION DIRECTORAL SECTORIAL N°0078-2017-GRL-GRDE-DRA
2	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SINCAY - COCHACAYA COCHACAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	2084424	4,337,011	385,769	0	155,500	541,269	0	0	AD. DIRECTA	OBRA DE CONTINUIDAD PARALIZADA EN DICIEMBRE DEL 2015
3	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO LIUYAGARAN COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	2085271	1,774,761	309,835	206,657	1,737,278	2,253,770	0	0	AD. DIRECTA	OBRA DE CONTINUIDAD CULMINADA EL 31 DE ENERO DEL 2018. OBRA REPECIONADA. EN ETAPA DE LIQUIDACION
4	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA CONCEVIDA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA Y DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	2162032	1,398,174	1,424,205	18,300	119,041	1,561,546	0	0	CONTRATA	OBRA DE CONTINUIDAD CULMINADA EL 13 DE AGOSTO DEL 2015. OBRA LIQUIDADADA MEDIANTE R.D.S. N°189-2015-GRL-DRA
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOMAS MINKA, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA	2214074	0	1,247,957	519,421	0	1,767,378	0	0	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EL 14 DE ABRIL DEL 2016. Y LIQUIDADADA MEDIANTE R.D.S. N°49-2017-GRDE-DRA
6	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR COYLLOR - ORMAZA - PACCHA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE YAUAYOS - LIMA	2287430	0	356,720	3,434,816	4,960	3,796,496	0	0	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EN DICIEMBRE DEL 2016. EN ETAPA DE LIQUIDACION
7	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION HAUSUCARA - PIEDRA PATO	2023109	3,128,863	0	1,024,807	7,000	1,031,807	954,825	431,811	AD. DIRECTA	OBRA PROGRAMADA SU CULMINACION EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018..
8	CONSTRUCCION CANAL CERRO CALATO A CANTACACHI, HUAROCHIRI - CAÑETE	2029170	3,016,647	17,030	773,216	7,000	797,246	425,163	401,316	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. EN ETAPA DE LIQUIDACION
9	MEJORAMIENTO DEL CANAL HUANCA, TRAMO SAN TUSTIO-PUQUIO CASTILLA, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA	2108524	35,000	38,500	528,938	0	567,438	0	0	MIXTA	OBRA TRANSFERIDA DE LIMA SUR EN EL AÑO 2015. SE PARALIZO POR DEFICIT PRESUPUESTAL EN MAYO DEL 2016
10	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PUMARINRI EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA	2147740	1,040,059	0	334,105	1,318,616	1,652,720	0	0	AD. DIRECTA	OBRA DE CONTINUIDAD CULMINADA EN FEBRERO DEL 2018. EN ETAPA DE LIQUIDACION

EJECUCION DE CANALES DE RIEGO 2015-2018

Item	Proyecto	Codigo Unico	Presupuesto Ejecutado al 2014	Presupuesto Ejecutado 2015-2017				Ejecución 2018		Modalidad de Ejecucion	ESTADO SITUACIONAL
				2015	2016	2017	Total	PIM	Devengado		
A	CANALES										
11	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL VIEJO IMPERIAL, PROGRESIVA 3+037 - 11+893.70, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA	2191671	0	0	5,925,068	5,091,319	11,016,387	0	0	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA 2018.
12	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CARAL, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA	2214108	11,000	0	433,960	0	433,960	0	0	CONTRATA	OBRA CULMINADA EN DICIEMBRE DEL 2016.OBRA LIQUIDADADA MEDIANTE R.D.S.N°152-2017-GRL-GRDE-DRA
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO L-1E SUB SECTOR DE RIEGO SANTA ROSA, DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	2239349	0	0	647,058	4,879,253	5,526,311	0	0	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EN NOVIEMBRE DEL 2017. OBRA LIQUIDADADA MEDIANTE R.D.S.N°0192-2018-GRL-GRDE-DRA
14	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL LATERAL DE COLILLA AL RESERVOIRIO LECHICA - WILLCAPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - HUAROCHIRI - LIMA	2243783	0	0	505,206	206,041	711,247	0	0	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA OCTUBRE DEL 2017. EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
15	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA, CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA	2312296	0	0	135,098	325,855	460,953	4,005,540	3,197,960	CONTRATA	OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FÍSICO DEL 84.85%
16	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE TUNA Y ANEXO LA MERCED DE CHILCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - HUAROCHIRI - LIMA	2173629	0	0	0	592,100	592,100	49,903	47,180	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA 15 DE MARZO DEL 2018. EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
17	MEJORAMIENTO DEL CANAL CENTRAL CAUJUL - OYON	2094361	924,624	0	30,000	395,911	425,911	0	0	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EN ENERO DEL 2018. OBRA LIQUIDADADA MEDIANTE R.D.S.N°142-2018-GRL-GRDE-DRA
18	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL URASEQUIA EN LA LOCALIDAD DE COPA, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA	2327874	0	0	10,000	1,179,610	1,189,610	2,515,666	2,490,861	CONTRATA	OBRA CULMINADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. EN ETAPA DE RECEPCION DE OBRA.
19	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL UNION ALTA (0+000 AL 5+159.00), DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	2196418	0	0	0	1,837,283	1,837,283	13,182	13,000	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EN NOVIEMBRE DEL 2017. EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
20	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CANAL DE RIEGO COYA ARRIBA, EN EL SECTOR COYA ARRIBA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AHUAS VIRUNHUAYRA, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO - REGION LIMA	2338182	0	0	0	570,062	570,062	0	0	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EN ENERO DEL 2018. EN ETAPA DE LIQUIDACION

EJECUCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 2015-2018

Item	Proyecto	Codigo Unico	Presupuesto Ejecutado al 2014	Presupuesto Ejecutado 2015-2017				Ejecución 2018		Modalidad de Ejecucion	ESTADO SITUACIONAL
				2015	2016	2017	Total	PIM	Devengado		
B	DEFENSAS RIBEREÑAS		10,589,880	31,630,719	7,205,107	39,540,247	78,376,073	12,652,267	892,635		
21	DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUAURA, SECTOR HUACAN	2148500	4,666,662	1,520,322	312,516	0	1,832,838	0	0	AD. DIRECTA	OBRA DE CONTINUIDAD CULMINADA EN MAYO DEL 2016. OBRA LIQUIDADADA MEDIANTE R.D.S. N°70-2017-GRL-GRDE-DRA
22	CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO PATIVILCA SECTOR ARAYA CHICA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA	2186482	1,116,820	175,150	177,576	0	352,726	0	0	AD. DIRECTA	OBRA DE CONTINUIDAD CULMINADA EN ENERO DEL 2016. OBRA LIQUIDADADA CON R.D.S.N°219-2017-GRL-GRDE-DRA
23	CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR SAN GERMAN, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA	2228754	1,328,088	343,845	248,727	0	592,572	0	0	AD. DIRECTA	OBRA DE CONTINUIDAD CULMINADA EN AGOSTO DEL 2016. OBRA LIQUIDADADA MEDIANTE R.D.S.N°019-2017-GRL-GRDE-DRA
24	INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR SARAPE - CERRO LA X, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	2229446	1,749,143	88,266	588,909	0	677,175	0	0	AD. DIRECTA	OBRA DE CONTINUIDAD CULMINADA EN FEBRERO DEL 2017. OBRA LIQUIDADADA MEDIANTE R.D.S.N°329-2017-GRL-GRDE-DRA
25	INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR ZOSIMO, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	2229447	1,677,169	290,089	219,000	0	509,089	0	0	AD. DIRECTA	OBRA DE CONTINUIDAD CULMINADA EN FEBRERO DEL 2017. EN ETAPA DE LIQUIDACION.
26	2147741: DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO RIMAC MARGEN DERECHA SECTOR LOS CIPRESES, DISTRITO SANTA EULALIA Y PROVINCIA DE HUAROCHIRI - REGION LIMA	2147741	16,948	0	851,170	0	851,170	0	0	CONTRATA	OBRA CULMINADA JUNIO DEL 2016. OBRA LIQUIDADADA MEDIANTE LA R.D.S.N°246-2017-GRL-GRDE-DRA
27	AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACHANGARA, SECTOR EL HORTELANO - AYARONGO, DISTRITO DE PACHANGARA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	2276443	0	0	0	1,438,086	1,438,086	256,931	256,893	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EN FEBRERO DEL 2018. EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
28	INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR BUENOS AIRES - GALERIA FILTRANTE, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	2229444	17,800	0	0	2,556,732	2,556,732	0	0	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EN FEBRERO DEL 2018. EN ETAPA DE RECEPCION DE OBRA

EJECUCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 2015-2018

Item	Proyecto	Codigo Unico	Presupuesto Ejecutado al 2014	Presupuesto Ejecutado 2015-2017				Ejecución 2018		Modalidad de Ejecucion	ESTADO SITUACIONAL
				2015	2016	2017	Total	PIM	Devengado		
B	DEFENSAS RIBEREÑAS										
29	INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR PALENQUE - ALCANTARILLA, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	2193959	0	0	0	5,092,329	5,092,329	111,668	85,000	AD. DIRECTA	OBRA PARALIZADA DESDE EL 26 DE MAYO DEL 2018. ACTUALMENTE LA ASEGURADORA ESTA REPARANDO LAS EXCAVADORAS.
30	INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUAURA SECTOR CARQUIN ALTO, DISTRITO DE CALETA DE CARQUIN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	2229448	17,250	0	0	2,469,558	2,469,558	38,900	38,900	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EN ENERO DEL 2018. OBRA LIQUIDADADA MEDIANTE R.D.S. N°174-2018-GRL-GRDE-DRA.
31	INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUAURA SECTOR SANTA ROSALIA, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA	2251357	0	0	0	2,052,620	2,052,620	0	0	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EN SEPTIEMBRE DEL 2017. EN ETAPA DE LIQUIDACION
32	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR DEL CENTRO POBLADO DE GORGOR AMBAS MARGENES DEL RIO GORGOR, PROGRESIVA 0+000 A 0+990, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA	2320263	0	0	82,220	1,981,023	2,063,243	475,653	372,025	CONTRATA	OBRA CULMINADA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
33	MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO EN EL RIO FORTALEZA, SECTOR MONTEGRANDE CUTATAMBO, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA	2239498	0	0	0	1,381,784	1,381,784	0	0	CONTRATA	OBRA CULMINADA EN ENERO DEL 2018. OBRA LIQUIDADADA MEDIANTE R.D.S.N°140-2018-GRL-GRDE-DRA
34	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS E INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LIMA	2178523	0	29,213,047	4,724,989	22,568,116	56,506,152	11,769,115	139,817	AD. DIRECTA	ETAPA I DE ADQUISICION: SE ADQUIRIO 64 MAQUINARIAS Y VEHEICULOS (05 MOTONIVELADORAS, 05 RODILLOS LISOS, 07 CARGADOR FRONTAL, 06 EXCAVADORAS S/RUEDAS, 09 EXCAVADORAS S/ORUGAS, 05 BULLDOZER D6, 08 BULLDOZER D8, 09 CAMION VOLQUETES, 03 TRACTO CON CAMA BAJA, 04 CAMIONETAS Y 03 CISTERNAS DE AGUA). EN EL 2018 SE HA PROGRAMADO LA ADQUISICION DE 04 CAMION VOLQUETE Y 02 CAMION DE CARGA, 01 MOTONIVELADORA Y 01 RODILLO LISO, 02 EXCAVADORAS, 01 TRACTOR ORUGA Y CAMIONETA.

EJECUCION DE REPRESAS Y RESERVORIOS 2015-2018

Item	Proyecto	Codigo Unico	Presupuesto Ejecutado al 2014	Presupuesto Ejecutado 2015-2017				Ejecución 2018		Modalidad de Ejecucion	ESTADO SITUACIONAL
				2015	2016	2017	Total	PIM	Devengado		
C	REPRESAS Y RESERVORIOS		172,217	318,599	11,706,786	9,577,002	21,602,387	32,288,830	11,019,033		
35	CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE QUIPACACA	2109768	70,000	0	3,105,551	572,098	3,677,649	140,409	30,000	AD. DIRECTA	OBRA REINICIADA EN NOVIEMBRE DEL 2018, CON UN AVANCE FISICO DEL 45.12%.
36	AMPLIACION DE LA PRESA SHIÑA, DISTRITO DE CARANIA - YAUYOS - LIMA	2135721	0	0	2,681,801	392,022	3,073,822	1,609,137	1,233,804	AD. DIRECTA	SE CULMINÓ LA ETAPA I DE LA APERTURA DE CARRETERA QUE MIDE 8.5 KM. SE INICIO CON LA EJECUCION DE REPRESA. TIENE UN AVANCE 55% (TROCHA + PRESA).
37	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YANCCA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS, ANEXO ESMERALDA, DISTRITO DE VIÑAC, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA	2284954	0	318,599	1,142,595	0	1,461,194	0	0	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EN ENERO DEL 2017. OBRA LIQUIDADADA MEDIANTE R.D.S.N° 284-2017-GRL-GRDE-DRA.
38	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA-PRESA CACCRAY-SANTA CRUZ DE ANDAMARCA-HUARAL-LIMA	2232352	0	0	4,310,067	791,038	5,101,104	268,951	223,525	AD. DIRECTA	OBRA REINICIADA, SE ESTA REALIZANDO LA CONFORMACION DEL CUERPO DE PRESA. EL CUERPO DE PRESA TENDRA UNA ALTURA DE 21 DE LOS CUALES SE CULMINO Y SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DEL . TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 75.81%
39	MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO BUENAVISTA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE PALLAC, DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO - HUARAL - LIMA	2277263		0	305,707	0	305,707	0	0	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EN AGOSTO DEL 2017. EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
40	CREACION DEL RESERVORIO JALGUINCANCHA COMUNIDAD DE CANIN, DISTRITO DE CHECRAS - HUAURA	2296913	0	0	31,407	834,094	865,501	0	0	CONTRATA	OBRA CULMINADA EN ENERO DEL 2018. EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
41	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION LA ESPERANZA Y RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE CABUYAL, LA VIRGEN Y GRANADOS, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	2322930	0	0	129,660	1,471,344	1,601,004	5,214,625	2,643,815	AD. DIRECTA	LA META I (RESERVORIO), CULMINÓ EN OCTUBRE DEL 2018. LA META II (CANAL) SE ENCUENTRA EJECUTANDOSE DESDE NOVIEMBRE DEL 2018.
42	CONSTRUCCION DE LA MICROPRESA CUNCUSHPATA DE CALPA, DISTRITO DE COCHAMARCA DE LA PROVINCIA OYON, REGION LIMA	2106383	49,500	0	0	232,870	232,870	2,277,678	542,591	AD. DIRECTA	EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO, SE INICIO EL 17 DE SEPTIEMBRE, SE ESTA REALIZANDO TRABAJOS PRELIMINARES, EXPLOTACIÓN DE ROCA. TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 12%.
43	CREACION DE LA REPRESA AULLO, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA	2317792	0	0	0	212,556	212,556	0	0	AD. DIRECTA	OBRA EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD CULMINADA
44	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MOTOPLICHE II, DISTRITO DE LAHUAYTAMBO - HUAROCHIRI - LIMA	2220735	0	0	0	3,371,877	3,371,877	671,187	472,932	CONTRATA	OBRA POR CONTRATA CULMINADA. EN ETAPA DE RECEPCION DE OBRA..
45	RECUPERACION DE LA PRESA LLONGOTE DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, REGION LIMA	2338310	0	0	0	727,507	727,507	0	0	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA. EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
46	RECUPERACION DE LA PRESA YANACANCHA, DISTRITO DE VITIS, PROVINCIA DE YAUYOS, REGION LIMA	2338322	0	0	0	447,694	447,694	10,000	0	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EN NOVIEMBRE DEL 2017. EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

EJECUCION DE REPRESAS Y RESERVORIOS 2015-2018

Item	Proyecto	Codigo Unico	Presupuesto Ejecutado al 2014	Presupuesto Ejecutado 2015-2017				Ejecución 2018		Modalidad de Ejecucion	ESTADO SITUACIONAL
				2015	2016	2017	Total	PIM	Devengado		
C	REPRESAS Y RESERVORIOS										
47	REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA	2107657	52,717	0	0	523,904	523,904	140,295	135,900	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EN OCTUBRE DEL 2018. EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
48	CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE POTAGA	2027610	0	0	0	0	0	2,649,983	5,000	CONTRATA	LA OBRA INICIÓ EL 23 DE OCTUBRE DEL 2018.
49	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION	2026943	0	0	0	0	0	3,742,369	1,301,299	AD. DIRECTA	LA OBRA INICIÓ EL 01 DE SETIEMBRE DEL 2018.
50	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR QUICHUA PISUPAMPA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA	2242998	0	0	0	0	0	1,000,000	77,500	AD. DIRECTA	SE REALIZÓ UN CONVENIO N°121-2018-GRL, CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAJES. DONDE AGRICULTURA OTORGA LA TUBERIA HDPE.
51	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PUSGOJ, PISACWAIN, LAQUIAR, SHIMPUM, PUCROC Y AYSHA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA	2251772	0	0	0	0	0	3,500,000	1,607,229	AD. DIRECTA	INICIO LA EJECUCION FISICA EL 18 DE JUNIO DEL 2018. LA META I: 02 BOCATOMAS Y DESARENADOR, INSTALACION DE 2,737 ML DE TUBERIA PVC-PUSGOT, 2,400 ML DE CANAL EN LA TOMA PISACWAIN Y 2,500 ML DEL CANAL DE UTCAS.
52	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON	2092274	0	0	0	0	0	2,000,000	0	AD. DIRECTA	OBRA EN EJECUCIÓN RECIEN REINICIADA.
53	CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO DE USO AGRICOLA EL PARRAL DEL COMITE DE RIEGO VENTUROSA BAJA-COMISION DE REGANTES DE PULANCACHE, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA	2306032	0	0	0	0	0	440,506	0	AD. DIRECTA	EN COORDINACIONES PARA EL INICIO DE OBRA EN EJECUCIÓN
54	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA REPRESA CHACRAQUIRE EN EL DISTRITO DE LANGA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA	2334200	0	0	0	0	0	130,000	33,000	AD. DIRECTA	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD, DRA OTORGA MATERIALES.
55	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SHUYO - AHUAYPANCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA	2335211	0	0	0	0	0	132,589	56,626	AD. DIRECTA	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO FIRMADO, EL 50% DE LOS MATERIALES FUERON ENTREGADOS
56	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO BAJO HUAMPAN, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA	2335212	0	0	0	0	0	190,322	77,167	AD. DIRECTA	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO FIRMADO, EL 40% DE LOS MATERIALES FUERON ENTREGADOS
57	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PACHACOCHA, CANTUCHA Y SUCHE - WILLCAPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - HUAROCHIRI - LIMA	2336168	0	0	0	0	0	2,228,631	1,155,680	AD. DIRECTA	LA OBRA INICIÓ EL 16 DE AGOSTO DEL 2018. TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 41.56%
58	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR DE SHUJOC GARUPATA, DISTRITO DE CAUJUL, OYON- LIMA	2337054	0	0	0	0	0	2,456,676	648,580	AD. DIRECTA	LA OBRA INICIÓ EL 01 DE OCTUBRE DEL 2018. TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 07.11%.
59	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES YANGAS, CENTRO POBLADO DE YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES CANTA-LIMA	2341625	0	0	0	0	0	3,485,472	774,385	AD. DIRECTA	LA OBRA INICIÓ EL 05 DE SETIEMBRE DEL 2018. TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 06.54%.

EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2015-2018

Item	Proyecto	Código Único	Presupuesto Ejecutado al 2014	Presupuesto Ejecutado 2015-2017				Ejecución 2018		Modalidad de Ejecucion	ESTADO SITUACIONAL
				2015	2016	2017	Total	PIM	Devengado		
D	PROYECTO PRODUCTIVOS		351,829	824,111	1,644,239	3,151,422	5,619,772	7,342,000	3,067,178		
60	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE VID, A LOS PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS DE SAN LUIS, SAN VICENTE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA - PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA	2184084	283,675	597,697	936,217	397,096	1,931,010	0	0	AD. DIRECTA	PROYECTO CULMINADO EN DICIEMBRE DEL 2017. EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
61	MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA EN EL CENTRO POBLADO SANTA FE, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA	2222190	68,155	226,414	16,500	0	242,914	0	0	AD. DIRECTA	PROYECTO CULMINADO EN DICIEMBRE DEL 2017. EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
62	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MANZANA EN LOS DISTRITOS DE COLONIA, YAUYOS, AYAUCA, SAN LORENZO DE PUTINZA EN LA PROVINCIA DE YAUYOS-LIMA	2173348	0	0	0	1,219,576	1,219,576	0	0	AD. DIRECTA	PROYECTO CULMINADO EN DICIEMBRE DEL 2017
63	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO PRODUCTORA DE LECHE EN LAS PROVINCIAS DE HUAURA Y BARRANCA	2154249	0	0	427,522	1,215,393	1,642,916	2,331,392	830,239	AD. DIRECTA	OBRA EN EJECUCIÓN
64	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA	2194931	0	0	264,000	319,356	583,356	5,010,608	2,236,939	AD. DIRECTA	SE ADQUIRIO 09 DE 4X4 PARA LAS AGENCIAS AGRARIAS, ADEMAS DE LAS LAPTOPS QUE ESTA EN PROCESO. CON EL MONTO ASIGNADO EN EL DECRETO DE URGENCIA N°006-2018 SE IMPLEMENTARA LAS AGENCIAS AGRARIAS Y CONSTRUIRA UNA INFRAESTRUCTURA. SE INICIO CON LA EJECUCION DE LA OFICINA DE LA DRA

EJECUCION DE PROYECTOS POR ENCARGO 2015-2018

Item	Proyecto	Código Único	Presupuesto Ejecutado al 2014	Presupuesto Ejecutado 2015-2017				Ejecución 2018		Modalidad de Ejecucion	ESTADO SITUACIONAL	
				2015	2016	2017	Total	PIM	Devengado			
E	OBRAS POR ENCARGO		957,955	0	4,718,262	10,305,986	15,024,247	7,298,027	1,066,050			
65	MEJORAMIENTO DE CARRETERA PARADERO ESTACION SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTRITO DE LACHAQUI - CANTA - LIMA	2199176	0	0	821,138	3,121,197	3,942,335	0	0	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EN DICIEMBRE DEL 2017	
66	CONSTRUCCION DE CARRETERA VILCA - HUANCAYA - TRAGADERO - TANTA, PROVINCIA YAUYOS	2086726	957,955	0	1,241,809	5,340,104	6,581,913	794,721	766,715	AD. DIRECTA	OBRA CULMINADA EN MAYO DEL 2018. EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	
67	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N°20340, TAMBO BLANCO, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA HUAURA (COAR - LIMA)		0	0	2,655,315	1,844,685	4,500,000	0	0	AD. DIRECTA	COAR - LIMA CULMINADO	
68	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE	2106392	0	0	0	0	0	639,979	0	AD. DIRECTA	OBRA EN EJECUCIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO TUBULAR	
69	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION HUACHO Y SAN PEDRO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	2186027	0	0	0	0	0	2,970,943	256,010	AD. DIRECTA	OBRA EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA. OBRA EN EJECUCIÓN	
70	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	2248887	0	0	0	0	0	2,892,384	43,326	AD. DIRECTA	OBRA EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA. OBRA EN EJECUCIÓN	
				37,395,400	40,222,411	81,001,485		67,545,403	22,627,024			
				158,619,295								

OBRAS CULMINADAS 43
OBRAS EN EJECUCION 25
OBRAS PARALIZADAS 2

OBRAS PRIORIZADAS POR LA AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS PARA SU LICITACION

ITEM	PROVINCIA	PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	CODIGO UNIFICADO	MONTO SOLICITADO
1	HUAURA	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO HUAURA TRAMO, DESEMBOCADURA - PUENTE ALCO - RIO HUAURA 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA, CODIGO UNIFICADO 2430080	2430080	S/. 36,698,204.32
2	CAÑETE	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE: TRAMO, PUENTE SOCSI-PUENTE SAN JERÓNIMO, EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA, CODIGO UNIFICADO 2430098	2430098	S/. 36,080,313.33
3	CAÑETE	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO MALA: TRAMO: PROGRESIVA 00+00 KM. A 4+900 KM DEL RIO MALA, EN LOS DISTRITOS DE MALA Y SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA, CODIGO UNIFICADO 2430100	2430100	S/. 12,292,865.55
4	HUAROCHIRI	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDE E INUNDACIONES DE LOS RIOS SANTA EULALIA Y RIMAC EN LOS TRAMOS: PROGRESIVA 0+000 KM. A 11+500 KM. DEL RIO SANTA EULALIA Y PROGRESIVA 56+000 KM. A 65+500 KM. DEL RIO RIMAC- EN LOS DISTRITOS DE SANTA EULALIA Y RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA, CODIGO UNIFICADO 2430402.	2430402	S/. 18,146,032.79
TOTAL				S/. 103,217,416



EJECUCION DE CANALES 2015 -2018

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL PUCACHACA – CANTA”

CODIGO SNIP	:36964
PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	: 6'144,363 SOLES
MODALIDAD DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL	: 6'134,202 SOLES
* PRESUPUESTO EJECUTADO - DRA	: 5'375,319 SOLES
	2009-2014 : 4'111,997
	2015 : 841,955
	2016 : 421,367
* PRESUPUESTO EJECUTADO – GRI	: 758,883 SOLES
* FECHA DE INICIO	: 01 SETIEMBRE DEL 2013
* FECHA DE TERMINO	: NOVIEMBRE DEL 2016.

METAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 8.00 KM DE CANAL ENTUBADO EN TOTAL DESDE LA PROGRESIVA 0+000 AL 8+000.

- * CONSTRUCCIÓN DE UN SIFÓN INVERTIDO CON TUBERÍA HDPE-SDR 21, Ø=500MM EN UNA LONGITUD DE 886.50M, UBICADO EN LAS PROGRESIVAS (00+499 AL KM 1+069.26).
- * CONSTRUCCIÓN DE 01 CAJA DE VÁLVULA DE PURGA, CONSTRUCCIÓN DE 2 CÁMARAS DE CARGA A LA ENTRADA Y SALIDA DEL SIFÓN.
- * INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA RIB LOG D=600MM, EN UNA LONGITUD DE 850 ML ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+070 AL KM 6+220.
- * CONSTRUCCIÓN DE DOS TOMAS LATERALES, CONSTRUCCIÓN DE 24 CÁMARAS DE INSPECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CRUCES DE QUEBRADAS (CANOAS) 11 UNIDADES Y CONSTRUCCIÓN DE 1 PUENTE ACUEDUCTO.
- * INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE D=400MM, EN UNA LONGITUD DE 1780 ML ENTRE LAS PROGRESIVAS (6+220 A 8+000).
- * CONSTRUCCIÓN DE 5 CÁMARAS DE CARGA.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

PROYECTO CULMINADO Y LIQUIDADA.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL PUCACHACA – CANTA”



Dado de Anclaje de Tubería HDPE



Captación Funcionando



Cámara de Purga

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SINCAI - COCHACAYA COCHACAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA”

* CODIGO SNIP	:	96603
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	:	12'506,007 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL	:	4'028,532 SOLES
	2009-2014	: 4'337,011
	2015	: 385,769
	2017	: 155,500
* FECHA DE PARALIZACION	:	19 DE DICIEMBRE DEL 2015

METAS DEL PROYECTO

- * HABILITACION DE CAMINO 12,900 ML
- * CONSTRUCCION DE 01 DESARENADOR.
- * REVESTIMIENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 12,660 ML.
- * CONSTRUCCION DE 32 CANOAS
- * CONSTRUCCION DE 05 PASES AEREOS.
- * CONSTRUCCION DE 05 ALCANTARILLAS DE CONCRETO.
- * CONSTRUCCION DE 01 ACUEDUCTO DE 15.30 ML.
- * 10 TOMAS LATERALES.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra paralizado desde el 19 de Diciembre del 2015, por déficit presupuestal, teniendo un avance físico del 54.06% que representa una ejecución de 4,200 ml de canal de concreto simple y obras de arte (pases aéreos, desarenador, etc).

En el 2016 se realizo todos los tramites para realizar un registro del proyecto ya que

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SINCAI - COCHACAYA COCHACAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA”



Canal Revestido



Toma Lateral



Canal Revestido



Pase Aereo

“REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO LIUYAGARAN COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA”

CODIGO SNIP	:87087
PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	: 4'045,033 SOLES
MODALIDAD DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL:	4'028,532 SOLES
	2009-2014 : 1'774,761
	2015 : 309,835
	2016 : 206,657
	2017 : 1'767,378
* FECHA DE INICIO	: 20 AGOSTO DEL 2013
* FECHA DE TERMINO	: ENERO DEL 2018

METAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 7,977 ML DE CANAL MAS OBRAS DE ARTE.

- * CONSTRUCCIÓN DE 7,023 ML DE CANAL DE CONCRETO SIMPLE F`C= 175 KG/CM2 DE SECCIÓN RECTANGULAR.**
- * INSTALACIÓN DE 954 ML DE TUBERÍA.**
- * 10 CANOAS DE CONCRETO.**
- * 03ALCANTARILLAS DE CONCRETO.**
- * 04 POZAS DISIPADORAS.**
- * 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN.**
- * 01 TRANSICIÓN DE CONCRETO.**
- * 29 CÁMARAS DE ACCESORIOS (CÁMARAS DE INSPECCIÓN)**
- * 01 CÁMARA DE ENTREGA.**

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

PROYECTO CULMINADO EN ENERO DEL 2018

“REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO LIUYAGARAN COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA”



Canal de concreto Simple



Canoa terminada



Desarenador



Bocatoma Rehabilitada

“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA CONCEVIDA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA Y DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA HUARAL - LIMA”

* CODIGO SNIP	:	158356
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	:	2'959,734 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	:	CONTRATA
* PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL	:	2' 959,721 SOLES
	2009-2014	: 1'398,174
	2015	: 1'424,205
	2016	: 18,300
	2017	: 119,042
* FECHA DE INICIO	:	06 ENERO DEL 2014
* FECHA DE TERMINO	:	13 DE AGOSTO 2015

METAS DEL PROYECTO

- * Canal de conducción de sección circular con tubería HDPE de L= 11+460 km.
- * Construcción de 02 Bocatoma y 02 Desarenadores
- * Reservorio con geomembrana para almacenar un V= 1,945.35 m3.
- * Canoa (04 unidades)
- * Toma Lateral (01 unidad)
- * Cámaras de carga (28 unidades).

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Proyecto De Continuidad Culminado En Agosto Del 2015.

“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA CONCEVIDA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA Y DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA HUARAL - LIMA”



RESERVORIO DE GEOMEMBRANA



Canoa terminada



Bocatoma y Desarenador

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOMAS MINKA, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA- LIMA”

- * **CODIGO SNIP** :87087
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 1'770,569 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 1'767,378 SOLES
 - 2015 : 1'247,957
 - 2016 : 519,421
- * **FECHA DE INICIO** : 08 SEPTIEMBRE DEL 2015
- * **FECHA DE TERMINO** : 14 ABRIL DEL 2016

METAS DEL PROYECTO

- * 3,334.10 ML. DE CANAL TIPO TRAPEZOIDAL.
- * UNA (01) TOMA DE CAPTACIÓN
- * DOS (02) ALCANTARILLAS DE TIPO CAJÓN.
- * 13 CANALES DE ENTREGA
- * 21 TOMAS LATERALES Y PREDIALES
- * UN (01) DESARENADOR

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

PROYECTO CULMINADO, LIQUIDADO Y CERRADO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOMAS MINKA, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA- LIMA”



CAPTACION DE RIEGO



TOMA LATERAL



CANAL TRAPEZOIDAL

**“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR COYLLOR - ORMAZA - PACCHA DEL
DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA”**

- * **CODIGO SNIP** :329251
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 3'809,256 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 3'796,496 SOLES
 - 2015 : 356,720
 - 2016 : 3'434,816
 - 2017 : 4,960
- * **FECHA DE INICIO** : 14 OCTUBRE DEL 2015
- * **FECHA DE TERMINO** : DICIEMBRE DEL 2016

METAS DEL PROYECTO

- * **01 bocatoma y desarenador**
- * **7,264 m de canal entubado**
- * **02 pases aéreos**
- * **05 cámaras de inspección**
- * **01 cámaras de recepción**

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

PROYECTO CULMINADO EN DICIEMBRE DEL 2016

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR COYLLOR - ORMAZA - PACCHA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA”



CAPTACION Y DESARENADOR



CAMARAS DE INSPECCION



PASE AEREO N°01



PASE AEREO N°02

“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION HAUSUCARA - PIEDRA PATO”

CODIGO SNIP :20897

PRESUPUESTO REGISTRADO (F15) : 6'242,505 SOLES

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

* **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 4'313,266 SOLES

* **PRESUPUESTO EJECUTADO DRA**

2009-2014 : 3'128,863

2016 : 1'024,807

2017 : 7,000

* **FECHA DE INICIO** : 2010

* **PRIMER REINICIO 2018**: 16 DE JULIO 2018

* **PARALIZACION 2018** : 30 DE AGOSTO 2018

* **SEGUNDO REINICIO 2018** : 19 DE OCTUBRE 2018

* **ASIGNACION PRESUPUESTAL 2018** : 954,825.00

METAS DEL PROYECTO

- * Revestimiento de 14,404 ml de canal (3,344 ml de canal rectangular y 11,060 ml de canal trapezoidal)
- * Instalación de 09 compuertas con izaje.
- * Construcción de 03 pases vehiculares.
- * Construcción de 64 transiciones de caja de canal trapezoidal a rectangular.
- * Construcción de 12 rápidas de concreto armado.
- * Instalación de tubería HDPE d=630 mm, L=467.
- * 01 Desarenador, 02 pozas disipadoras y 03 Buzón de Inspección.
- * 02 Cámaras disipadoras y 01 partidor.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

PROYECTO EN EJECUCION PROGRAMADO SU CULMINACION EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018. ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 90% DE TODO EL PROYECTO.

“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION HAUSUCARA - PIEDRA PATO”



“CONSTRUCCION CANAL CERRO CALATO A CANTACACHI, HUAROCHIRI - CAÑETE”

* CODIGO SNIP	:32828	
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)		: 5'727,569 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA	
* PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL		:4'164,202 SOLES
* PRESUPUESTO EJECUTADO DRA	3'813.893	
	2009-2014	: 3'016,647
	2015	: 17,030
	2016	: 773,216
	2017	: 7,000
* PRESUPUESTO EJECUTADO GRI	350,309	
* FECHA DE INICIO	: 2009	
* FECHA DE ULTIMA PARALIZACION	: DICIEMBRE 2016	
* REINICIO 2018	: 425,163.00 SOLES	

METAS DEL PROYECTO

- * Revestimiento de 12,895 ml de canal de canal rectangular.
- * Instalación de 01 compuerta.
- * Construcción de 12 canoas.
- * Construcción de 02 pasarelas.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

OBRA CULMINADA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2018.

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN CANAL CERRO CALATO A CANTACACHI - HUAROCHIRI - CAÑETE"



“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUANCA SECTOR SAN TUSTIO (PROGRESIVA 5+832.01-7+765.96), DISTRITO DE SAN VICENTE, CAÑETE, LIMA”

- * **CODIGO SNIP** :132330
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 3'040,537 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 4'313,266 SOLES
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO DRA** : 602438
 - 2009-2014 : 35,000
 - 2015 : 38,500
 - 2016 : 528,938
- * **PRESUPUESTO E. LIMA SUR GRI:** 2'437,976
- * **FECHA DE INICIO** : 2012
- * **FECHA DE ULTIMA PARALIZACION** : MAYO 2016

METAS DEL PROYECTO TOTAL

- * MEJORAMIENTO DE 8,000 ML DE CANAL.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

- * La Obra se encuentra paralizada por haber alcanzado su techo presupuestal.
- * Se elaboró un expediente para su culminación de obra con un presupuesto de S/.857,782.35 soles donde se incorporada la suma de S/.91,531 soles al contratista cuando se ejecutó el tramo 0+000 al 2+516 km por reconocimiento de deuda. Se encuentra en evaluación el expediente técnico para su registro.

“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUANCA SECTOR SAN TUSTIO (PROGRESIVA 5+832.01-7+765.96), DISTRITO DE SAN VICENTE, CAÑETE, LIMA”



Excavación en caja del canal



Mejoramiento del suelo de la base del canal



Cerchado del canal de geoceldas



Canal revestido con geoweb y piedra chancada

“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PUMARINRI EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJATAMBO”

* CODIGO SNIP	:127064
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	: 2'747,136 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL	:2'692,780 SOLES
2009-2014	: 1'040,059
2016	: 334,105
2017	: 1'318,616
* FECHA DE INICIO	: 2013
* FECHA DE TERMINO	: Febrero del 2018

METAS DEL PROYECTO

- * Canal de conducción 4,533 ml.
- * 01 bocatoma y un desarenador, 10 pasarelas, 68 ml de canal tapado, 01 canoa y impermeabilización del reservorio de tierra.

METAS EJECUTADAS

Metas Físicas ejecutadas en el 2013-2014 (S/. 987,139.42 soles)

- * 01 bocatoma y un desarenador, revestimiento de 1,708 ml de canal de concreto, 68 ml de canal tapado y 01 canoa.

Metas Físicas ejecutadas en el 2016 (S/.334,114.00 soles)

- * Construido 750 ml de canal de concreto y apertura de 500 ml de trocha al pie del canal.

Metas Físicas Ejecutadas en el 2017 (S/. 1'350,892 soles)

- * Se Construyó 2,325 ml de canal y se mejoró el reservorio y además se está termino la reconstrucción de 120 ml de canal de tubería HDPE.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Proyecto De Continuidad Culminado en Febrero del 2018, se encuentra liquidándose el proyecto.

“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PUMARINRI EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA”



Canal de Concreto Simple



Caja de intersección de canal abierto a canal de tubería HDPE



Canal Ejecutado

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL VIEJO IMPERIAL, SEGUNDA ETAPA, PROGRESIVA 3+037 - 11+893.70, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA”

- * **CODIGO SNIP** :211009
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 11'109,893 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 11,093,862
- PRESUPUESTO EJECUTADO DRA** 11'016,387 SOLES
 - 2016 : 5'925,068
 - 2017 : 5'091,319
- PRESUPUESTO EJECUTADO GRI** 77,475 SOLES

- * **FECHA DE INICIO** : 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

METAS DEL PROYECTO

- * Mejoramiento del trazo del canal y revestimiento del mismo en 06 tipos de secciones en una longitud de 8,856 ml de canal
- * Construcción de 05 transiciones de cambio de sección.
- * Mejoramiento de 73 estructuras de descargas (desagües).
- * Construcción de 23 tomas laterales, incluyendo el suministro y colocación de las compuertas metálicas.
- * Construcción de 10 viaductos de sección rectangular – tipo canoa
- * Construcción de 01 unidad desarenador
- * Construcción de 500.00 ml. cerco de seguridad urbana

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

PROYECTO CULMINADO 2018.

**“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL VIEJO IMPERIAL, SEGUNDA ETAPA, PROGRESIVA
3+037 - 11+893.70, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA”**



Vaceado de concreto simple con Carmix



Estructura de descarga



Canal Trapezoidal y su camino de vigilancia



Se observa un tramo del canal terminado

“Mejoramiento del servicio de agua para riego en el centro poblado de Caral, distrito de Supe- Barranca - Lima”

- * **CODIGO SNIP** : 206589
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 444,961 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : CONTRATA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 444,960 SOLES
 - 2014 : 11,000
 - 2016 : 433,960
- * **FECHA DE INICIO** : 24 DE DICIEMBRE DEL 2016
- * **FECHA CULMINACION** : 23 DE MARZO DEL 2017

METAS DEL PROYECTO

- * REVESTIMIENTO CON CONCRETO EN SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 1,200 ML DE CANAL.
- * CONSTRUCCIÓN DE SIFÓN INVERTIDO DE PASO DE 135 ML,
- * CONSTRUCCIÓN DE 01 TOMA LATERAL CON CONCRETO FC=175 KG/CM²+25%P.M.CON SU RESPECTIVA COMPUERTA METÁLICA CON SISTEMA DE IZAJE MECÁNICO.
- * UNA CAIDA VERTICAL CON CONCRETO CICLOPEO
- * 03 TRANSICIONES UBICADAS EN LA PROGRESIVA 0+650,0+805 Y 0+812.10

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra culminada, liquidada y cerrada en el 2017.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO L-1E SUB SECTOR DE RIEGO SANTA ROSA, DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”

- * **CODIGO SNIP** : 272426
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 5'640,147.32 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 5'526,311 SOLES
 - 2016 : 647,058
 - 2017 : 4'879,253
- * **FECHA DE INICIO** : 12 DICIEMBRE DEL 2016
- * **FECHA DE ULTIMA PARALIZACION** : 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017

METAS DEL PROYECTO

- * Revestimiento de 20,478 ml de canal, con un espesor de muros de concreto de 175 kg/cm² de 7.5 cm y juntas cada 2.5 m.
- * Instalación de 33 compuertas metálicas.
- * CAPACITACIONES.- Talleres de Capacitación respecto al uso del agua, mantenimiento de infraestructura de riego y operación de la misma.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Proyecto culminado.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO L-1E SUB SECTOR DE RIEGO SANTA ROSA, DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”



“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL LATERAL DE COLILLA AL RESERVORIO LECHICA - WILLCAPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - HUAROCHIRI - LIMA”

- * **CODIGO SNIP** : 290822
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 714,304 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 711,247 SOLES
 - 2016 : 505,206
 - 2017 : 206,041

- * **FECHA DE INICIO** : 21 NOVIEMBRE DEL 2016
- * **FECHA DE CULMINACION** : 30 DE OCTUBRE DEL 2017


METAS DEL PROYECTO

- * Construcción de una (01) Toma Lateral.
- * Instalación de Canal Entubado de 2,364 ml de PVC.
- * Instalación de 03 tomas sub-laterales Quilico, Gorgora y Hualapunco.
- * Construcción de pase aéreo de 35 ml de luz.
- * Construcción de 11 Cámaras Rompe Presión.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Proyecto culminado.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL LATERAL DE COLILLA AL RESERVORIO LECHICA - WILLCAPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - HUAROCHIRI - LIMA”

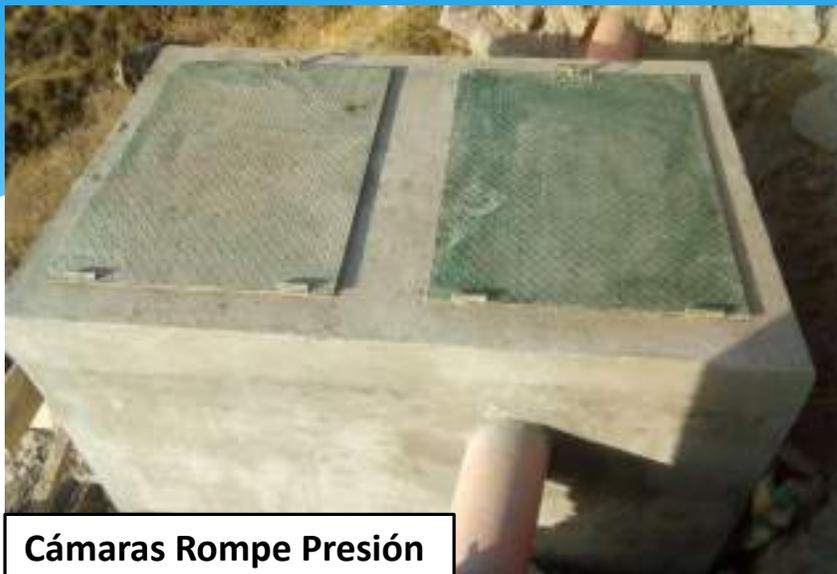

Cámaras Rompe Presión



Reservorio y desarenador



Tendido de Tubería PVC



Pase Aéreo

“IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA, CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA”

* CODIGO UNICO	:	2312296
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	:	4'466,493.18 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	:	CONTRATA
* PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL	:	5'526,311 SOLES
	2016	: 135,098
	2017	: 325,855
* FECHA DE INICIO	:	24 ENERO DEL 2018

METAS DEL PROYECTO

- * Canal abierto tipo rectangular en Huaylashtoclanca de longitud de 3,250.83 ml.
- * 01 captación – Bocatoma en la progresiva 0+000 con muros de concreto armado
- * 02 desarenadores en las progresivas 0+005 y 5+354 con concreto armado.
- * 52 pozas disipadoras con concreto armado.
- * 03 pasarelas con concreto armado.
- * 31 tomas laterales con concreto simple.
- * 01 partidador en la progresiva 0+062 con concreto armado.
- * 05 canoas en el tramo del canal Huaylashtoclanca con concreto armado.
- * Construcción de 01 Alcantarilla para el pase vehicular.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Proyecto en Ejecución. Paralizada el 27 de Agosto del 2018 y se reinicio el 23 de Octubre del 2018. La obra tiene un avance físico del 84.85%.

“IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA, CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA”



Bocatoma de Captación



Obras de Arte



Canal en la progresiva 0+500



Canal en la progresiva 0+350

“AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE TUNA Y ANEXO LA MERCED DE CHILCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - HUAROCHIRI”

CODIGO UNICO :249183

* **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 647,339 SOLES

* **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA

* **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 597,436 SOLES

2017 : 597,436

* **FECHA DE INICIO** : 03 DICIEMBRE DEL 2017

* **FECHA DE CULMINACION** : 31 DE ENERO DEL 2018

METAS DEL PROYECTO

- * Mejoramiento de 12 pequeños reservorios.
- * Mejoramiento de 2,338 ml de canal de concreto simple.
- * Construcción de 10 unidades de pozas disipadoras de energía.
- * Construir 35 tomas laterales
- * Construir 02 pases aéreos.
- * Construcción de una captación.
- * Instalación de línea de aducción de entubado de 110 ml.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Proyecto Culminado, en etapa de recepción de obra.

“AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE TUNA Y ANEXO LA MERCED DE CHILCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - HUAROCHIRI”



“MEJORAMIENTO DEL CANAL CENTRAL CAUJUL - OYON”

- CODIGO SNIP** :123936
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 1'397,579.63 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : **1'350,535 SOLES**
 - 2009-2014 : 924,624
 - 2016 : 30,000
 - 2017 : 395,911
- * **FECHA INICIO** : 25 OCTUBRE 2010
- * **FECHA CULMINACION DEL PROYECTO** : ENERO 2018

METAS DEL PROYECTO TOTAL

- * REVESTIMIENTO DE CANAL DE CONCRETO SIMPLE 3.71 KM.
- * CONSTRUCCION DE 11 POZAS DISIPADORAS.
- * CONSTRUCCION DE 18 TOMAS LATERALES.
- * CONSTRUCCION DE 01 CANOA.
- * INSTALACION SIFON INVERTIDO DE LONGITUD 290 ML.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

- * OBRA CULMINADA, SE ESTA REALIZANDO LA LIQUIDACION DE OBRA.

“MEJORAMIENTO DEL CANAL CENTRAL CAUJUL - OYON”



Instalación de Sifón Invertido



Instalación de Sifón Invertido

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL URASEQUIA EN LA LOCALIDAD DE COPA, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA”

CODIGO UNICO	:	364267
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	:	3'708,873 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	:	CONTRATA
* PRESUPUESTO EJECUTADO	:	1'189,610 SOLES
	2016	: 10,000
	2017	: 1'179,610
* PLAZO DE EJECUCION	:	150 DIAS CALENDARIOS
* FECHA DE INICIO	:	08 DICIEMBRE DEL 2017
* FECHA DE PARALIZACION	:	19 DE MARZO DEL 2018
* FECHA DE REINICIO	:	21 DE MAYO DEL 2018

METAS DEL PROYECTO

- * 01 Captación de quebrada, de concreto ciclópeo $f'c=175$ kg/cm².
- * 01 Desarenador, de concreto armado y 03 Cámaras de carga, de concreto armado.
- * Canal circular de tubería HDPE, longitud total de 4553.15 ml.
- * Canal rectangular de concreto, de concreto de $f'c=175$ kg/cm² en una longitud de 1640.00 ml.
- * 64 Tomas laterales en canal circular, de concreto armado de $f'c=175$ kg/cm², con una sección rectangular de 1.20 x 1.00m con 1.00m de alto y 0.20m de ancho de muro.
- * 24 Tomas laterales en canal de concreto simple de $f'c=175$ kg/cm².
- * 17 Cámaras de inspección, de concreto simple de $f'c=175$ kg/cm².
- * 03 Cámaras de impacto, con una sección rectangular de concreto simple de $f'c=175$ kg/cm².

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Proyecto en Ejecución desde el 08 de diciembre del 2017, tuvo una paralización el 19 de marzo por factores climáticos y reiniciado el 21 de Mayo del 2018. Tiene un avance físico del 46.37% al mes de marzo del 2018. se incorporo la diferencia presupuestal del monto del contrato el 02 de mayo del 2018. A inicios de año solo tenia S/.233,721 soles.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL URASEQUIA EN LA LOCALIDAD DE COPA, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA”



Bocatoma en Funcionamiento



Canal rectangular de C° simple

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL UNION ALTA (0+000 AL 5+159), DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA”

CODIGO UNICO	:289629
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	: 1'936,726 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO	: 1'900,052 SOLES
	DRA 2017 : 1'837,283 SOLES
	GRI 2016 : 62,769 SOLES
* PLAZO DE EJECUCION	: 180 DIAS CALENDARIOS
* FECHA DE INICIO	: 03 SEPTIEMBRE DEL 2017
* FECHA DE CULMINACION	: 24 NOVIEMBRE DEL 2017

METAS DEL PROYECTO

- * Mejoramiento de la sección del canal en una longitud de 3,423 ml.
- * Reparación de 450 ml. de paredes revestidas del canal que presentan deterioros.
- * Construcción de 44 tomas laterales, con concreto armado $f'c=210$ kg/cm².
- * Construcción de 06 estructuras de descarga.
- * Construcción de 02 caídas con sus respectivas pozas disipadoras de energía.
- * Construcción del partidur hidráulico ubicado en el inicio del canal.
- * Construcción de 06 puentes vehiculares con su respectiva baranda metálica.
- * Construcción de 03 puentes peatonales con su respectiva baranda metálica.
- * Construcción de 01 aforador parshall.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra culminada el 24 de Noviembre del 2018, tiene un saldo balance de S/.13,183 soles para su liquidación de obra, el cual se solicito su incorporación al PMI en el paquete II.

**“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL UNION ALTA (0+000 AL 5+159),
DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA”**



Canal trapezoidal de C° simple



Canal trapezoidal de C° simple



Puente Peatonal

“RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CANAL DE RIEGO COYA ARRIBA, EN EL SECTOR COYA ARRIBA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AHUAS VIRUNHUAYRA, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJAYAMBO”



Captación y desarenador en funcionamiento



Captación y desarenador



Tubería Anclada

“REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION”





EJECUCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 2015 -2018

“DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUAURA, SECTOR HUACAN”

- * **CODIGO SNIP** :89894
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 6'648,478 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 6'499,500 SOLES
 - 2009-2014 : 4'666,662
 - 2015 : 1'520,322
 - 2016 : 312,516
- * **FECHA DE INICIO** : DICIEMBRE 2011
- * **FECHA DE CULMINACION** : MAYO 2016

METAS DEL PROYECTO TOTAL

- * 6,000 metros lineales de limpieza y dirección de cauce del río Huaura en el sector Huacán a la margen izquierda. (0+000 AL 6+000)
- * 6,000 metros lineales de dique enrocado en la margen izquierda del río Huaura en el sector Huacán (0+000 AL 6+000).

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

- * OBRA CULMINADA EN MAYO DEL 2016.

“CREACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RÍO PATIVILCA, SECTOR ARARA CHICA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA”

- * **CODIGO SNIP** :261448
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 1'480,967 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 1'469,546 SOLES
 - 2009-2014 : 1'116,820
 - 2015 : 175,150
 - 2016 : 177,576
- * **FECHA DE INICIO** : SEPTIEMBRE DEL 2014
- * **FECHA DE CULMINACION** : 02 DE ENERO DEL 2016.

METAS DEL PROYECTO TOTAL

- * 1,000 metros lineales de limpieza y dirección de cauce del río Pativilca en el sector Araya Chica a la margen izquierda.
- * 1,000 metros lineales de dique enrocado en la margen izquierda del río Pativilca en el sector Araya Chica a la margen izquierda.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

- * OBRA CULMINADA EL 02 DE ENERO DEL 2016.

“CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO PATIVILCA SECTOR ARAYA CHICA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA”



**“CREACION DE DEEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR SAN GERMAN,
DISTRITO DE HUAURA, HUAURA - LIMA”**

- * **CODIGO SNIP** : 227053
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 1'940,134 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 1'920,660 SOLES
 - 2009-2014: 1'328,088
 - 2015 : 343,845
 - 2016 : 248,727
- * **FECHA DE INICIO** : 02 DE DICIEMBRE DEL 2013
- * **FECHA DE CULMINACION** : 07 DE AGOSTO DEL 2016

METAS DEL PROYECTO TOTAL

- * 1,415.20 metros lineales de limpieza de cauce del río Huaura en el sector San Germán.
- * Instalación de 1,415.20 metros lineales de dique enrocado en la margen derecha del río Huaura en el sector San Germán.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

- * OBRA CULMINADA EL 07 DE AGOSTO DEL 2016.

**“CREACION DE DEEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR SAN GERMAN,
DISTRITO DE HUAURA, HUAURA - LIMA”**



Descolmatación del rio Huaura



Descolmatación del rio Huaura

“INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR SARAPE - CERRO LA X, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”

- * **CODIGO SNIP** : 226393
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 2'885,742 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 2'426,318 SOLES
 - 2009-2014: 1'749,143
 - 2015 : 88,266
 - 2016 : 588,909
- * **FECHA DE INICIO** : NOVIEMBRE DEL 2013
- * **FECHA DE CULMINACION** : 12 DE FEBRERO DEL 2017

METAS DEL PROYECTO TOTAL

- * 1,797.00 metros lineales de limpieza de cauce del río Huaura en el sector Sarape – Cerro La X.
- * Instalación de 1,797.00 metros lineales de dique enrocado en la margen derecha del río Huaura en el sector Sarape – Cerro La X.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

- * OBRA CULMINADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2017

**“INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR ZOSIMO,
DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”**

- * **CODIGO SNIP** : 226412
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 2'885,742 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 2'633,780 SOLES
 - 2009-2014: 1'677,169
 - 2015 : 290,089
 - 2016 : 219,000
- * **FECHA DE INICIO** : NOVIEMBRE DEL 2013
- * **FECHA DE CULMINACION** : ENERO DEL 2017

METAS DEL PROYECTO TOTAL

- * 1,856.50 metros lineales de limpieza de cauce del río Huaura en el sector Zósimo.
- * Instalación de 1,856.50 metros lineales de dique enrocado en la margen derecha del río Huaura en el sector Zósimo.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

- * OBRA CULMINADA EN ENERO DEL 2017

“DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO RIMAC MARGEN DERECHA SECTOR LOS CIPRECES, DISTRITO SANTA EULALIA Y PROVINCIA DE HUAROCHIRI-REGION LIMA”

- * **CODIGO SNIP** : 162579
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 868,785 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : CONTRATA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 868,118 SOLES
 - 2009-2014: 16,948
 - 2016 : 851,170
- * **FECHA DE INICIO** : FEBRERO DEL 2016
- * **FECHA DE CULMINACION** : ABRIL DEL 2016

METAS DEL PROYECTO TOTAL

- * Construcción de 67 m de muro de contención en la Margen derecha del rio Rímac (36.05 aguas arriba, y 30.95 m aguas abajo del puente peatonal Los Cipreses).

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

- * OBRA CULMINADA

OBRAS DE DEFENSA RIBEREÑA



DEFENSA RIBEREÑA ZOSIMO



DEFENSA RIBEREÑA SARAPE

“AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACHANGARA, SECTOR EL HORTELANO-AYARPONGO, DISTRITO DE PACHANGARA, PROVINCIA DE OYON”

- * **CODIGO SNIP** :321689
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 1'714,014 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO** : 1,438,086
2017 : 1'438,086

- * **FECHA DE INICIO** : DICIEMBRE DEL 2017
- * **FECHA DE CULMINACION** : FEBRERO DEL 2018

METAS DEL PROYECTO

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTA DE LA CREACIÓN DE UNA DEFENSA RIBEREÑA LONGITUDINAL DE 497.21 ML CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

- * La defensa está compuesta por muros de concreto armado, con una altura total de 3.00 m, la zapata tiene como dimensiones: H = 0.50m, Ancho 2.4m.
- * El muro propuesto es de concreto armado $f'c=210$ kg/cm², la cual tiene un muro pantalla de 3.00m y una malla de acero $f'y=42000$ kg/cm² que sirve de refuerzo y temperatura.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra culminada, en febrero del 2018.

En el presente año tiene una asignación de S/.256,930 soles para el pago de deudas pendientes de planilla y servicios. Se incorporo al PMI 2018 el 29 de mayo del 2018.

**“AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACHANGARA,
SECTOR EL HORTELANO-AYARONGO, DISTRITO DE PACHANGARA, PROVINCIA DE OYON”**



**Realizando la base de la
cimentación del muro.**



**Muro de concreto
armado culminado**

“INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR BUENOS AIRES - GALERIA FILTRANTE, PROVINCIA DE HUAURA-LIMA”

- * **CODIGO SNIP** : 226416
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 2'636,448 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO** : 2'574,532
 - 2015 : 17,800
 - 2017 : 2'556,732
- * **BENEFICIARIOS** : 180 familias
- * **ÁREA BENEFICIADAS** : 568 hectáreas.
- * **COMISIÓN DE REGANTES** : Ingenio
- * **FECHA DE INICIO** : 25 MAYO DEL 2017
- * **FECHA DE CULMINACION** : FEBRERO DEL 2018

METAS DEL PROYECTO

- * 1,800 ML LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO HUAURA.
- * 1,800 ML DE DIQUE DE ENROCADO.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra culminada, en febrero del 2018. Se encuentra en etapa de recepción de obra.

“INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR BUENOS AIRES - GALERIA FILTRANTE, PROVINCIA DE HUAURA-LIMA”



DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO HUAURA



DIQUE DE ENROCADO

“INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR PALENQUE - ALCANTARILLA, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”

* CODIGO SNIP	:257780
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	: 5'293,257 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO	:5,092,329 (2017)
* BENEFICIARIOS	: 368 familias
* ÁREA BENEFICIADAS	: 409 hectáreas.
* COMISIÓN DE REGANTES	: El ingenio
* FECHA DE INICIO	: 25 MAYO DEL 2017
* FECHA DE PARALIZACION	: ENERO DEL 2018
* FECHA DE REINICIO	: MAYO DEL 2018

METAS DEL PROYECTO

- * 3,234 ML LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO HUAURA.
- * 3,234 ML DE DIQUE DE ENROCADO.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra Paralizada en Enero del 2018 teniendo un avance físico del 90%, que representa 2,234 ml de enrocado. Actualmente se encuentra reiniciada en Mayo del 2018. Tiene una asignación con el decreto de urgencia N°006-2018 de S/.111,668, con la cual se culminará el proyecto a fines de julio.

**“INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR PALENQUE -
ALCANTARILLA, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”**



“INSTALACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO HUAURA SECTOR CARQUIN ALTO, DISTRITO DE CALETA DE CARQUIN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”

- * **CODIGO SNIP** : 226432
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 2'708,746 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO** : 2'486,808
 - 2015 : 17,250
 - 2017 : 2'469,558
- * **BENEFICIARIOS** : 75 usuarios.
- * **ÁREA BENEFICIADAS** : 211.08 hectáreas.
- * **COMISIÓN DE REGANTES** : Carquin
- * **FECHA DE INICIO** : 25 MAYO DEL 2017
- * **FECHA DE CULMINACION** : ENERO DEL 2018


METAS DEL PROYECTO

- * 1,500 ML LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO HUAURA.
- * 1,500 ML DE DIQUE DE ENROCADO.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra culminada, en Enero del 2018. Se encuentra en etapa de recepción de obra. Tiene una asignación presupuestal de S/210,917 mediante el decreto de urgencia N°006-2018, de los cuales se utilizará solo 40,000 para liquidar a la obra.

“INSTALACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO HUAURA SECTOR CARQUIN ALTO, DISTRITO DE CALETA DE CARQUIN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”

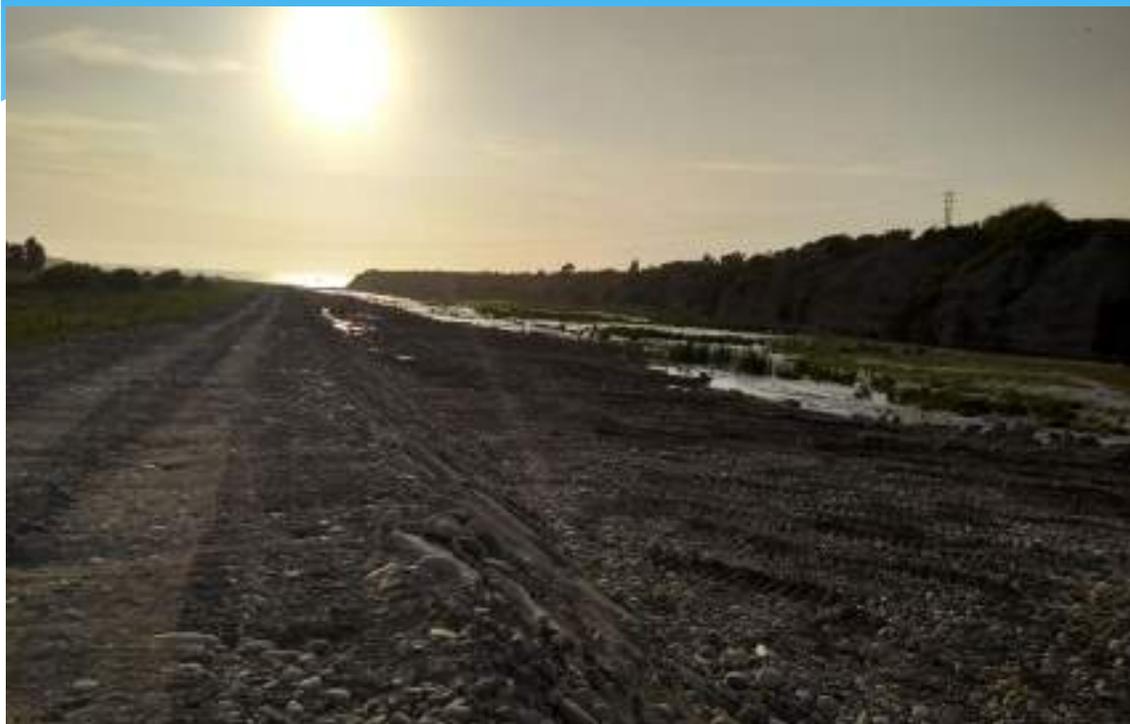

SE OBSERVA LA DESCOLMATACION Y ENROCADO CULMINADO



DIQUE DE ENROCADO CULMINADO

“INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUAURA SECTOR SANTA ROSALIA, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”

* CODIGO SNIP	:301364
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	: 2'054,269 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO	: 2'052,620 (2017)
* BENEFICIARIOS	: 26 usuarios del Sector Santa Rosalía.
* ÁREA BENEFICIADAS	: 136.50 hectáreas.
* COMISIÓN DE REGANTES	: Santa Rosalía
* FECHA DE INICIO	: 25 MAYO DEL 2017
* FECHA DE CULMINACION	: SEPTIEMBRE DEL 2017

METAS DEL PROYECTO

- * 1,160 ML LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO HUAURA.
- * 1,160 ML DE DIQUE DE ENROCADO.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra culminada, en septiembre del 2017. Se encuentra en etapa de recepción de obra.

“INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUAURA SECTOR SANTA ROSALIA, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”



“INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR DEL CENTRO POBLADO DE GORGOR AMBAS MARGENES DEL RIO GORGOR, PROGRESIVA 0+000 A 0+990, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO”

* CODIGO SNIP	:310279
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	: 2'538,895 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	: CONTRATA
* PRESUPUESTO EJECUTADO	: 2'063,243
	2016 : 82,220
	2017 : 1'981,023
* BENEFICIARIOS	: 1,235 beneficiarios
* FECHA DE INICIO	: 18 de Enero del 2018
* FECHA DE PARALIZACION	: 18 DE marzo del 2018
* FECHA DE CULMINACION	: 14 de Mayo del 2018

METAS DEL PROYECTO

- * 1,560 ML LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO.
- * 1,560 ML DE DIQUE DE ENROCADO.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra en ejecución, tiene un avance físico del 65%. Tuvo una paralización el 18 de marzo por lluvias y reiniciado el 14 de mayo.

**“INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR DEL CENTRO POBLADO DE GORGOR
AMBAS MARGENES DEL RIO GORGOR, PROGRESIVA 0+000 A 0+990, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO”**



Dique enrocado



Acopio de roca al pie de dique

“MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO EN EL RIO FORTALEZA, SECTOR MONTEGRANDE CUTATAMBO, DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA LIMA”

* CODIGO SNIP	:273097
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	: 1'394,415 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	: CONTRATA
* PRESUPUESTO EJECUTADO	: 1'381,784 (2017)
* BENEFICIARIOS	: 570 Familias
* FECHA DE INICIO	: Octubre DEL 2017
* FECHA DE CULMINACION	: Enero DEL 2018

METAS DEL PROYECTO

- * 1,289 ML LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO FORTALEZA.
- * 1,289 ML DE DIQUE DE ENROCADO.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra culminada, en enero del 2017. Se encuentra liquida el contrata mediante la Resolución Directoral Sectorial N°0111-2018.

“MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO EN EL RIO FORTALEZA, SECTOR MONTEGRANDE CUTATAMBO, DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA LIMA”



“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS E INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LIMA”

- * **CODIGO SNIP** :250491
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 71'753,421 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO** : 56'506,152 SOLES
 - 2015 : 29'213,047
 - 2016 : 4'724,989
 - 2017 : 22'568,116

METAS DEL PROYECTO

- * Adquisición de 86 maquinarias.
- * Construcción e instalación de taller de maestranza.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Se ha adquirido 64 maquinarias las cuales son:

ITEM	TIPO DE MAQUINARIA	N° DE MAQUINARIA ADQUIRIDA
1	MOTONIVELADORAS KOMATSU	5
2	RODILLO LISO JHON DEERE	5
3	CARGADOR FRONTAL	7
4	EXCAVADORAS SOBRE RUEDAS	6
5	EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS	9
6	BULLDOZER D65EX KOMATSU	5
7	BULLDOZER D8T	7
8	BULLDOZER D155A	1
9	CAMION VOLQUETES	9
10	TRACTO Y CAMA BAJA	3
11	CAMIONETAS	4
10	CAMION CISTERNAS	3
		64

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS E INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LIMA”



“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS E INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LIMA”





EJECUCION DE REPRESAS Y RESERVORIOS 2015 -2018

“CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE QUIPACACA”

* CODIGO SNIP	:132078
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	: 4'734,412 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO	: 4'593,975.10
PRESUPUESTO DRA	: 3'747,649
2014	: 70,000
2016	: 3'105,551
2017	: 572,098
PRESUPUESTO GRI	795,893 (Componente I : Trocha de acceso)
* FECHA DE INICIO	: 16 Setiembre del 2016
* Primera Paralización	: 31 Enero del 2017
* Primer Reinicio	: 13 Junio 2017
* Segundo Paralización	: 31 Julio 2017
* Segundo Reinicio	: 24 Noviembre 2017
* Tercera Paralización	: 14 de Enero del 2018

METAS DEL PROYECTO

- * Componente I : Trocha de acceso a la represa (Culminada)
- * Componente II : Conformación de dique para la represa para un almacenamiento de 100,000 m3 de agua.
30.00 ml de muro de concreto armado de F'c=210 kg/cm2.
11.10 m de Altura del dique de concreto armado.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra paralizada en Enero del 2018 por factores climáticos. A la fecha tiene una programación de incorporación financiero de S/140,437 soles y se esta realizando un registro del expediente técnico total ascendente a S/. 6'294,603 (valor de presa S/.5'498,710 soles). cuyo almacenamiento será para un volumen de 100,000 m3 agua.

“CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE QUIPACACA”



Control topográfico de Cimentación de dique



Habilitación de camino de acceso



Excavación para cimentación del dique



Excavación para cimentación del dique

“AMPLIACION DE LA PRESA SHIÑA, DISTRITO DE CARANIA - YAUYOS – LIMA”

* CODIGO SNIP	:	177377
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	:	4'702,776 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO	:	3'073,822
		2016 : 2'681,801
		2017 : 392,022
* FECHA DE INICIO	:	29 Setiembre del 2016
* PRIMERA PARALIZACIÓN	:	28 Enero del 2017
* REINICIO	:	28 Mayo del 2018

METAS DEL PROYECTO

- * Componente I : Trocha de acceso a la represa de una longitud 8,500 ml
- * Componente II : Conformación de dique para la represa para un almacenamiento de 771,335 m³ de agua.
Longitud de Dique 103.10 ml, compuesta de mampostería de piedra asentada con concreto de 175 kg/m³ y impermeabilizado con una pantalla de concreto armado de f'c=280 kg/cm².
5,00 ml de altura del dique.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra en ejecución, tiene un avance físico del 35% del componente 1 que representa una apertura de 3.50 km de trocha. Programada la culminación del componente 1 (Trocha de acceso) para fines de julio y se iniciara la ejecución de la represa terminando la carretera. Cuenta con los permisos del Cira y PMA.

**PROYECTO: "AMPLIACION DE LA PRESA SHIÑA, DISTRITO DE CARANIA - YAUYOS – LIMA" – COMPONENTE I:
TROCHA DE ACCESO**



Trocha de acceso



Apertura de Trocha



Apertura de Trocha



Trocha de acceso

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YANCCA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS ANEXO LA ESMERALDA DISTRITO DE VIÑAC, PROVINCIA DE YAUYOS”

* CODIGO SNIP	:	327208
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	:	1'468,415 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO	:	1'461,194
	2015	: 318,599
	2016	: 1'142,595
* FECHA DE INICIO	:	Noviembre del 2015
* PARALIZACION N° 01	:	10 de Junio 2016
* REINICIO	:	Agosto del 2016
* CULMINACION DE OBRA	:	Diciembre del 2016

METAS DEL PROYECTO

COMPONENTE N° 01 – INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

- * CANAL DE INGRESO AL RESERVORIO DE $f_c=175$ kg/cm².- Longitud de canal 0+0028 KM.
- * RESERVORIO.- Estructura de concreto armado con capacidad de 692.15 m³.
- * CANAL DE CONDUCCION CON TUBERIA HDPE.- Longitud de 1+135 km de canal entubado.
- * OBRAS DE ARTE
- * 01 CAPTACION, 01 CAJA DE INGRESO, 01 CAJA DE VALVULAS, 01 CAJA DE SALIDA, 02 CRUCES AEREOS (L=15 y L=50) y 07 TOMAS LATERALES.

COMPONENTE N° 02 – DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra Culminada, liquidada y cerrada.

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YANCCA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS ANEXO LA ESMERALDA DISTRITO DE VIÑAC, PROVINCIA DE YAUYOS – REGIÓN LIMA”



Reservorio con cap. 690 m³



Canal de ingreso al reservorio



Pase Aéreo

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA-PRESA CACCRAY”

* CODIGO SNIP	:	124429
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	:	5'370,176 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO	:	5'101,104
	2016	: 4'310,067
	2017	: 791,038
* FECHA DE INICIO	:	03 Septiembre del 2016
* PARALIZACION N°01	:	15 de Enero 2017
* REINICIO DE OBRA N°01	:	Octubre del 2017
* PARALIZACION N°02	:	Enero del 2018

METAS DEL PROYECTO

1. Construcción de una represa de tierra homogénea con espaldón húmedo de pantalla de concreto armado y espaldón seco de enrocado de talud.

Capacidad Total	2.49 MMC de almacenamiento total.
Longitud de Corona	128.00 metros lineales.
Ancho de Corona	4.0 metros
Altura de dique	10.50 metros de altura

2. Aliviadero de Demasías, diseñado para un caudal de 2.0 m3/seg.

3. Rápida, diseñado para un caudal de 2.0 m3/seg.

4. Poza de Disipación, diseñado para un caudal de 2.0 m3/seg.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra paralizada en Enero del 2018, por factores climáticos. Tiene programado su reinicio el 15 de Junio del 2018. Tiene un avance físico del 85% de la represa.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA-PRESA CACCRAY”



Realizando control topográfico



Rasgado de la capa para continuar con el relleno.



Compactando el dique



Cámara de Ingreso

“MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO BUENA VISTA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE PALLAC, DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO – HUARAL - LIMA”

- * **CODIGO SNIP** : 322248
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 305'715 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO** : 305,707
2016 : 305,707

- * **FECHA DE INICIO** : 14 Noviembre 2016
- * **PARALIZACION N°01** : 31 Diciembre 2016
- * **REINICIO DE OBRA N°01** : 12 Junio 2017
- * **FECHA DE CULMINACION** : 30 Junio 2017

METAS DEL PROYECTO

- * Mejoramiento del Reservoirio Buena Vista (60 metros de largo por 17.30 metros de ancho), con una capacidad útil de 2,410 m³
- * Construcción de un desarenador.
- * Construcción de 185 ml de canal de ingreso a reservoirio.
- * Construcción de 20 ml de canal de salida del reservoirio.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra Culminada y Recepcionada.

“MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO BUENA VISTA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE PALLAC, DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO – HUARAL - LIMA”



Reservorio Culminado



Canal de Ingreso al Reservorio



Colocacion de junta de dilatación de elastómero

“RECUPERACION DE LA PRESA LLONGOTE DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, REGION LIMA ”

* CODIGO SNIP	: 377213
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	: 783'361 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO	: 727,507 (2017)
* FECHA DE INICIO	: 21 Agosto 2017
* FECHA DE CULMINACION	: Enero 2018

METAS DEL PROYECTO

1. Impermeabilización con geomembrana del Dique de mampostería de piedra asentado con concreto con contrafuertes, e impermeabilizado con un tarrajeo de concreto simple en la cara húmeda del dique.

* Longitud del Dique	:120 metros
* Ancho de corona	:0.90 metros
* Altura del dique	: 3.50 metros aproximadamente
* Contrafuertes	: 1.00 metros de espesor
* Longitud de Aliviadero	: 10.15 metros
* Capacidad est. De almacenamiento	: 0.54 MMC

2. Instalación de Compuerta Metálica en toma de descarga.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra Culminada y en etapa de liquidación.

**“RECUPERACION DE LA PRESA LLONGOTE DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS,
REGION LIMA ”**



“RECUPERACION DE LA PRESA YANACANCHA, DISTRITO DE VITIS, PROVINCIA DE YAUYOS, REGION LIMA”

* CODIGO SNIP	: 377225
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	: 465,867 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO	: 447,694 (2017)
* FECHA DE INICIO	: 07 Agosto 2017
* FECHA DE CULMINACION	: 30 Noviembre 2017

METAS DEL PROYECTO

Capacidad estimada de la Represa 0.34 MMC

Revestimiento de cara húmeda en cuerpo de presa.

Longitud del Dique : 26 metros

Ancho de corona :1.00 metros

Altura del dique : 7.00 metros aproximadamente

Instalación de Compuerta Metálica en toma de descarga.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra Culminada y en etapa de liquidación, se asigno S/.10,000 soles para su liquidación en Junio del 2018.

“RECUPERACION DE LA PRESA YANACANCHA, DISTRITO DE VITIS, PROVINCIA DE YAUYOS, REGION LIMA”



**“CREACION DEL RESERVORIO JALGUINCANCHA COMUNIDAD DE CANIN, DISTRITO DE
CHECRAS - HUAURA - LIMA”**



“REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA”



“AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PACHACOCHA, CANTUCHA Y SUCHE - WILLCAPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - HUAROCHIRI - LIMA”



**“AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR DE SHUJOC
GARUPATA, DISTRITO DE CAUJUL, OYON- LIMA”**



“MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES YANGAS, CENTRO POBLADO DE YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES CANTA-LIMA”





EJECUCION DE OBRAS POR ENCARGO 2015 -2018

“MEJORAMIENTO DE CARRETERA PARADERO ESTACION SAN JUAN DE VIZCAS-SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTRITO DE LACHAQUI-CANTA-LIMA”

* CODIGO SNIP	:	274734
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	:	4,002,670 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO	:	4'001,335
EJECUTADO DRA	:	3'942,335
2016	:	854,138
2017	:	3,121,197
EJECUTO MUNI	:	25,000
* FECHA DE INICIO	:	21 Noviembre del 2016
* FECHA DE CULMINACION	:	Diciembre del 2017

METAS DEL PROYECTO

- * Construcción de carretera de 13.40 km. A nivel de afirmado.
- * Excavación de 13.40 km de cunetas de 0.60x0.30.
- * Colocación de 13 postes de kilometraje de concreto armado.
- * Construcción de un badén empedrado en la progresiva km 4+580.
- * Colocación 40 señales preventivas en puntos críticos.
- * Colocación de 06 señales reglamentarias en puntos necesarios.
- * Colocación de 04 señales informativas en puntos elegidos.
- * Construcción de 13 alcantarillas de tubería metálica circular de diámetro 36 pulgadas.
- * Construcción de 120 ml de muro de contención de concreto armado del km 6+200 a km 6+260 y del km 6+540 a km 6+600.
- * Habilitación de plazoletas de cruce cada 500 m.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra culminada, en etapa de liquidación.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE CARRETERA PARADERO ESTACION SAN JUAN DE VISCAS-SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTRITO DE LACHAQUI-CANTA-LIMA”



“CONSTRUCCION DE CARRETERA VILCA - HUANCAYA - TRAGADERO - TANTA, PROVINCIA DE YAUYOS”

* CODIGO SNIP	: 274734
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	: 9'274,235.78 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO	: 9,101,821 soles
Región Lima (Infraestructura)	S/. 1'075,202.00 soles (2008, 2009, 2010)
Región Lima – Sur	S/. 35,910.00 soles (2013)
Agricultura Lima Provincias	S/. 7'990,708.97soles (2009-2010, 2016-2018)
* FECHA DE REINICIO	: Octubre del 2016
* FECHA DE CULMINACION	: Mayo del 2018

METAS DEL PROYECTO

- * Mejoramiento de carretera 7.40 km desde 0+000 hasta 7+400 a nivel de afirmado.
- * Construcción de un Puente mixto de acero estructural
- * Construcción de carretera de 8.138 km a nivel de afirmado
- * Construcción de alcantarilla tipo TMC.
- * Construcción de 12 badenes.
- * Retiro y reposición de muros de piedra.
- * Conformación de cunetas en sus 15.838 km de la carretera.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Obra culminada en el mes de mayo del 2018. Tiene una asignación presupuestal mediante el decreto de urgencia N°006-2018, de S/. 387,794 soles.

“CONSTRUCCION DE CARRETERA VILCA - HUANCAYA - TRAGADERO - TANTA, PROVINCIA DE YAUYOS”



PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION HUACHO Y SAN PEDRO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”





EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2015 -2018

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE VID, A LOS PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS DE SAN LUIS, SAN VICENTE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA -PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA”

CODIGO SNIP : 2184084

PRESUPUESTO REGISTRADO (F15) : 1,861,533.43SOLES

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

* **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL**: 1'931,010 SOLES

2009 AL 2014 : 283,675

2015 : 597,697

2016 : 936,217

2017 : 397,096

* **FECHA DE INICIO** :

* **FECHA DE TERMINO** : DICIEMBRE 2017

METAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 8.00 KM DE CANAL ENTUBADO EN TOTAL DESDE LA PROGRESIVA 0+000 AL 8+000.

- * Mejorar los servicios de apoyo a los productores de la cadena productiva de vid en los distritos de San Luis, San Vicente, Nuevo Imperial y Lunahuana, en la Provincia de Cañete.
- * Mejorar los servicios de apoyo a los productores de la cadena productiva de la vid en la localidad de San Luis, distrito de (San Luis).
- * Mejorar los servicios de apoyo a los productores de la cadena productiva de la vid en las localidades de Cuiva, Esmeralda, Herbay Alto; distrito de (San Vicente).
- * Mejorar los servicios de apoyo a los productores de la cadena productiva de la vid en la localidad de Santa Adela, distrito de (Nuevo Imperial).
- * Mejorar los servicios de apoyo a los productores de la cadena productiva de la vid en la localidad de Lunahuana, distrito de (Lunahuana).
- * Brindar y consolidar la capacitación y asistencia técnica permanente a los beneficiarios del proyecto, así como también a promotores locales y a personal de la entidad.
- * Conseguir la formalización de las asociaciones de productores vitivinícolas del ámbito de intervención.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

PROYECTO CULMINADO EN DICIEMBRE 2017

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE VID, A LOS PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS DE SAN LUIS, SAN VICENTE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA -PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA”



PARCERLA DEMOSTRATIVA



FRUTOS



PRODUCTO CULMINADO

“MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA EN EL CENTRO POBLADO SANTA FE, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA”

* CODIGO SNIP	: 2222190
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	: 267,275.21 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL	:242,914 SOLES
2009 AL 2014	: 68,155
2015	: 226,414
2016	: 16,500

METAS DEL PROYECTO

- * Construcción de la cámara de bombeo y el pozo artesiano, instalación de un electro bomba y sus accesorios.
- * Construcción de 632 ml de línea impulsión con sus respectivos tubos de impulsión.
- * Construcción de un reservorio de 15.00 M³ con sus accesorios y acabados.
- * Construcción de 340 ml de línea de aducción, tendido de tuberías, prueba hidráulica y desinfección de tuberías y la construcción bebederos.
- * Realizar 24 cursos de capacitación
- * Brindar asistencia técnica por 03 meses.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

EL PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADO.

“MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA EN EL CENTRO POBLADO SANTA FE, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA”



CASETA PARA BOMBEO DE AGUA HASTA 632 METROS



ACEQUIA PARA LA INSTALADO LOS 632 ML DE TUBERÍA

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MANZANA EN LOS DISTRITOS DE COLONIA, YAUYOS, AYAUCA, SAN LORENZO DE PUTINZA EN LA PROVINCIA DE YAUYOS-LIMA”

- * **CODIGO SNIP** : 2173348
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 1,287,029.80 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 1,219,576 SOLES
 - 2009-2014 : 0
 - 2015 : 0
 - 2016 : 0
 - 2017 : 1,219,576
- * **FECHA DE INICIO** :
- * **FECHA DE TERMINO** : DICIEMBRE DEL 2017

METAS DEL PROYECTO

- * Capacitación en desarrollo de capacidades técnicas de los productores
- * Asistencia técnica en manejo agronómico y valor agregado
- * Capacitación en desarrollo de capacidades técnicas a la entidad
- * Capacitación en desarrollo de capacidades técnicas a los gobiernos

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

PROYECTO CULMINADO EN DICIEMBRE 2017

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MANZANA EN LOS DISTRITOS DE COLONIA, YAUYOS, AYAUCA, SAN LORENZO DE PUTINZA EN LA PROVINCIA DE YAUYOS-LIMA”



CAMPO DE POMPUCRO



CAMPO DE PUTINZA



AGRICULTORES DE MANZANA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO PRODUCTORA DE LECHE EN LAS PROVINCIAS DE HUAURA Y BARRANCA”



Crías nacidas mediante el programa de mejoramiento genético



Parcela de pastos en el distrito de Leoncio Prado



Presentación de los terneros del programa de inseminación artificial

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA”

* CODIGO SNIP	:	2194931
* PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)	:	15,793,152.98 SOLES
* MODALIDAD DE EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA
* PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL	:	583,356 SOLES
	2015	: 0
	2016	: 0
	2017	: 1,215,393
	2018	: EN EJECUCION
* FECHA DE INICIO	:	
* FECHA DE TERMINO	:	

METAS DEL PROYECTO

- * 3,334.10 ML. DE CANAL TIPO TRAPEZOIDAL.
- * UNA (01) TOMA DE CAPTACIÓN
- * DOS (02) ALCANTARILLAS DE TIPO CAJÓN.
- * 13 CANALES DE ENTREGA
- * 21 TOMAS LATERALES Y PREDIALES
- * UN (01) DESARENADOR

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

PROYECTO CULMINADO, LIQUIDADO Y CERRADO

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA”

- * **CODIGO SNIP** : 2194931
- * **PRESUPUESTO REGISTRADO (F15)** : 15,793,152.98 SOLES
- * **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA
- * **PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL** : 583,356 SOLES
 - 2017 : 1,215,393
 - 2018 : EN EJECUCION
- * **FECHA DE INICIO** : OCTUBRE DEL 2017
- * **FECHA DE TERMINO** : EN EJECUCION

METAS DEL PROYECTO

- * INFRAESTRUCTURA
- * EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
- * CAPACITACION
- * SISTEMAS DE GESTION
- * TECNOLOGIA Y COMPETITIVIDAD

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

PROYECTO EN EJECUCION



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Dirección Regional de Agricultura

AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
UNIDAD EJECUTORA – DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LOS
CAUCES DE LOS RIOS 2015-2018




**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION FINANCIADAS POR EL
MINAGRI EN EL 2015-2016**

METAS FISICAS EJECUTADAS POR EMERGENCIA FEN 2015-2016 (CONVENIO N°01)

	NOMBRE DE ACTIVIDAD	META (KM) PROGRAMADA	EJECUTADO (KM)	ADICIONAL (KM)	EJECUTADO + ADICIONAL (KM)	ESTADO
1	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO PATIVILCA SECTOR BOCATOMA HUAYTO Y VINTO	3.00	3.00	1.00	4.00	CULMINADO
2	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO PATIVILCA SECTOR ALPAS BOCATOMA - IRRIGACION PATIVILCA	3.00	3.00	-	SIN ADICIONAL	CULMINADO
3	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUAURA SECTOR SAN MIGUEL BAJO - QUIPICO	2.80	2.30	1.20	3.50	CULMINADO
4	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUAURA SECTOR CARQUIN	3.20	3.20	0.90	4.10	CULMINADO
5	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHANCAY - HUARAL, SECTORES BOZA - LA HUACA	4.25	4.25	1.60	5.85	CULMINADO
6	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHANCAY - HUARAL, SECTORES PASAMAYO - LAS SALINAS	5.00	5.00	1.00	6.00	CULMINADO
7	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CAÑETE SECTOR BOCATOMA LA PINTA DISTRITO NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA CAÑETE – LIMA	3.50	3.50	-	SIN ADICIONAL	CULMINADO
8	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CAÑETE SECTOR LA ISLA BAJA - SAN FRANCISCO	3.50	3.50	1.00	4.50	CULMINADO
9	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO MALA SECTOR BOCATOMA BUJAMA	2.00	2.00	-	SIN ADICIONAL	CULMINADO


METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DE LAS 09 ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EMERGENCIA FEN 2015-2016 (CONVENIO N° 01)

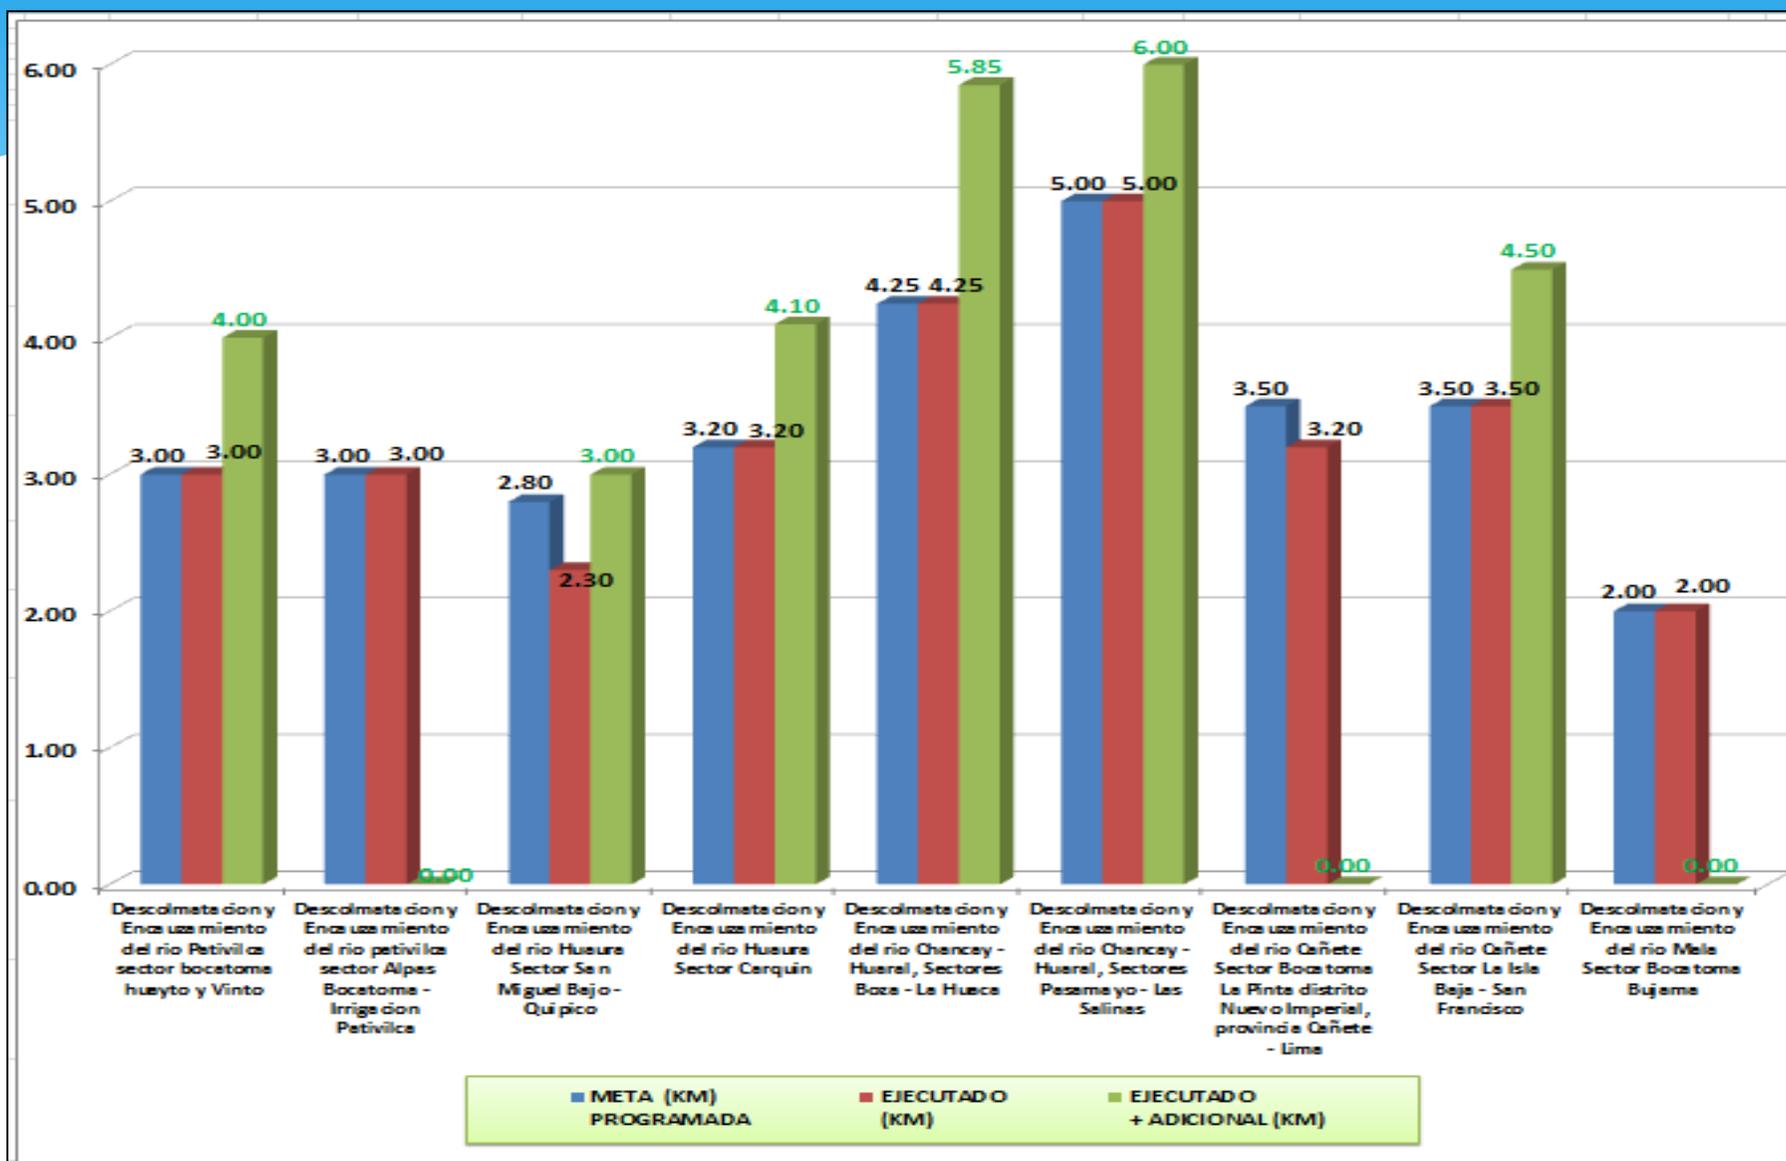

METAS FISICAS EJECUTADAS POR EMERGENCIA FEN 2015-2016 (CONVENIO N°02)

	ACTIVIDADES	META (KM) PROGRAMADA	EJECUTADO (KM)	ADICIONAL (KM)	EJECUTADO + ADICIONAL (KM)	ESTADO
1	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DEL RIO CHANCAY-HUARAL, SECTORES SANTA ROSA BAJO -PALPA -HUYAN HORNILLOS -LA ESPERANZA	3.10	3.10	-	SIN ADICIONAL	CULMINADO
2	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DEL RIO PATIVILCA SECTOR CANAL MATRIZ BARRANCA-SUPE-SAN NICOLÁS, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA-LIMA	1.50	1.50	-	SIN ADICIONAL	CULMINADO
3	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DEL RIO CHANCAY-HUARAL, SECTORES CHINVIL-HUAYAN	1.50	1.50	-	SIN ADICIONAL	CULMINADO
4	DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUAURA SECTOR GUAYABAL BAJO	2.25	2.25	1.00	3.25	CULMINADO
5	DESCOLMATACIÓN DEL RIO CHICO SECTOR LULE ALTO Y LULE BAJO	1.80	1.80	1.45	3.25	CULMINADO

METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DE LAS 09 ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EMERGENCIA FEN 2015-2016 (CONVENIO N° 02)

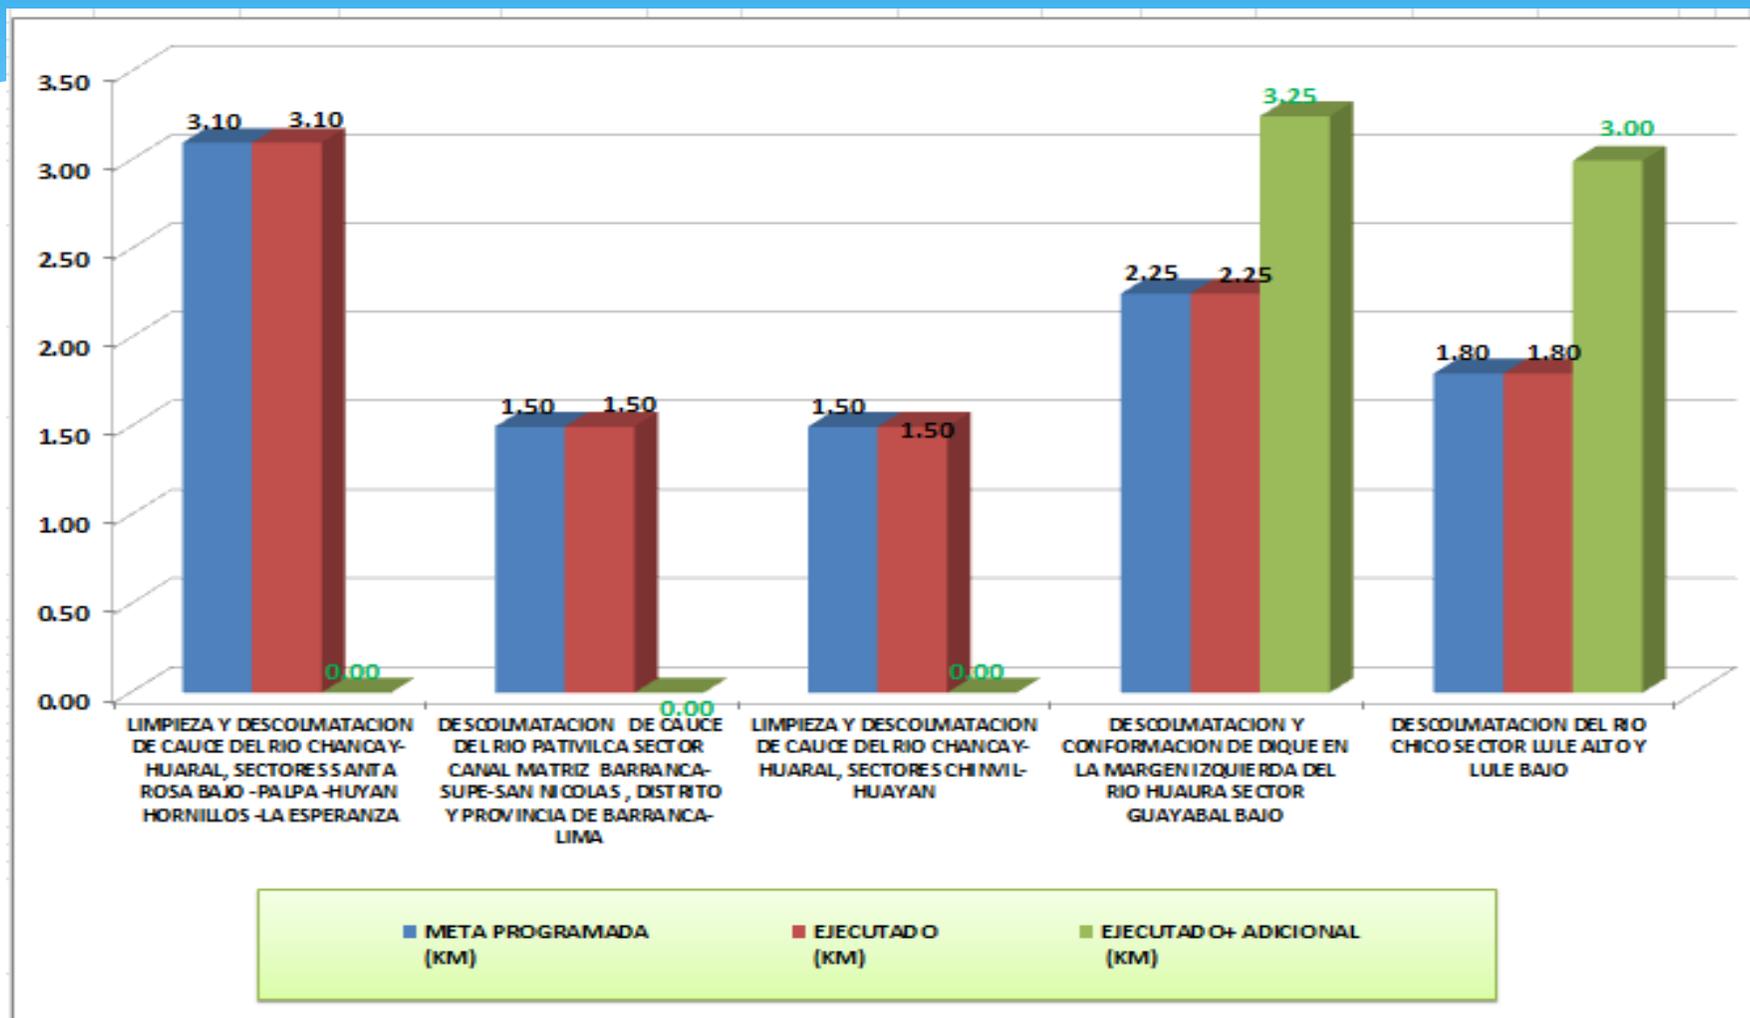

**“DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO PATIVILCA SECTOR ALPAS BOCATOMA
- IRRIGACION PATIVILCA”
ACTIVIDAD CULMINADA L=3.00 KM**



“DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO PATIVILCA, SECTOR BOCATOMA HUAYTO - VINTO”

ACTIVIDAD CULMINADA L=3.00 KM (EXPEDIENTE) + 1.00 KM (ADICIONAL)



**ACTIVIDAD: “DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUAURA, SECTOR SAN MIGUEL
BAJO – QUIPICO”**

ACTIVIDAD CULMINADA L=2.80 KM + 0.50 KM ADICIONAL



**“DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUAURA, SECTOR CARQUIN”
ACTIVIDAD CULMINADA L=3.2 KM (Expediente) + 0.90 Km (Adicional)**



ACTIVIDAD: “DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUAURA, SECTOR CARQUIN”
ACTIVIDAD CULMINADA L=3.2 KM (Expediente) + 0.90 Km (Adicional)



**“DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHANCAY - HUARAL, SECTORES BOZA -
LA HUACA”**

ACTIVIDAD CULMINADA L=4.25 KM (Expediente) +1.60 km Adicional



**“DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHANCAY – HUARAL, SECTOR PASAMAYO
– LA SALINAS”**

ACTIVIDAD CULMINADA L=5.00Km (Expediente) + 1.00 Km Adicional



**“DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO MALA- SECTOR BOCATOMA BUJAMA”
ACTIVIDAD CULMINADA L=2.00 km**



**ACTIVIDAD: “DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CAÑETE SECTOR
BOCATOMA LA PINTA DISTRITO NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA CAÑETE - LIMA”
ACTIVIDAD CULMINADA**



**“DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CAÑETE SECTOR BOCATOMA LA PINTA
DISTRITO NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA CAÑETE - LIMA”
ACTIVIDAD CULMINADA**



“DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CAÑETE SECTOR ISLA BAJA – SAN FRANCISCO, PROVINCIA CAÑETE - LIMA”

ACTIVIDAD CULMINADA L=3.50 KM (Expediente) + 1.00 Km (Adicional)



**“DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO PATIVILCA SECTOR CANAL MATRIZ BARRANCA-SUPE-SAN NICOLAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA-LIMA”
ACTIVIDAD CULMINADA (1.50 km)**



**“DESCOLMATAACION DEL RIO CHICO SECTOR LULE ALTO Y LULE BAJO”.
ACTIVIDAD CULMINADA L=1.80 KM (Expediente) + 1.45 Km (Adicional)**



**“DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
HUAURA SECTOR GUAYABAL BAJO”.**

ACTIVIDAD CULMINADA L=2.30 Km (Expediente) + 1.5 km (Adicional)



“LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION DE CAUCE DEL RIO CHANCAY-HUARAL, SECTORES SANTA ROSA BAJO - PALPA - HUAYAN HORNILLOS - LA ESPERANZA”.

ACTIVIDAD CULMINADA L=3.10



**“LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO CHANCAY-HUARAL, SECTORES CHINVIL-
HUAYAN”.**

ACTIVIDAD CULMINADA L=1.50 KM





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION FINANCIADAS POR LA
AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCION
2017-2018**

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN LOS CAUCES DE LOS RIOS 2017-2018

- *MEDIANTE **D.S N° 091-2017-PCM**, APRUEBA EL PLAN DE LA RECONSTRUCCIÓN AL QUE SE REFIERE LA LEY N.º 30556, LEY QUE APRUEBA DISPOSICIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO PARA LAS INTERVENCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL FRENTE A DESASTRES Y QUE DISPONE LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.*

- *MEDIANTE **D.S N°193-2017 EF**, AUTORIZAN CRÉDITO SUPLEMENTARIO EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017 A FAVOR DE DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. EN EL ANEXO_02_DS193_2017EF SE TRANSFIERE CRÉDITO AL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA POR S/. 42,515,168.00 PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE.*

NOMBRE DEL RIO	MODALIDAD	LONGITUD (KM)	Presupuesto Transferido (S/.)
HUAURA	ADMINISTRACION DIRECTA	41.869	S/. 28,239,315
CAÑETE	ADMINISTRACION DIRECTA	27.291	S/. 14,275,853
TOTAL			S/. 42,515,168

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN LOS CAUCES DE LOS RIOS 2017-2018

MEDIANTE LOS OFICIOS N°0344, 357 Y 1244-2017-GRL/PRES, SE SOLICITO UN FINANCIAMIENTO PARA INTERVENIR EN LOS DIFERENTES VALLES DE LOS RIOS DE S/.178'981,029 SOLES, DE LOS CUALES SOLO FUE FINANCIADO CON S/.56'689,375 SOLES, LOS CUALES DETALLO EN EL SIGUIENTE CUADRO

ITEM	PROVINCIA	PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO	MONTO SOLICITADO	FECHA DE SOLICITUD	MONTO TRANSFERIDO	FECHA DE TRANSFERENCIA
1	HUARAL	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE RÍO CHANCAY – HUARAL TRAMO DESDE SU DESEMBOCADURA HASTA SANTO DOMINGO	Oficio N°0344-2017-GRL/PRES	S/. 26,520,475	10/08/2017	S/. 8,601,801	11/11/2017
2	CAÑETE	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO MALA TRAMO DESDE SU DESEMBOCADURA HASTA CALANGO	Oficio N°0344-2017-GRL/PRES	S/. 20,029,407	10/08/2017	S/. 7,113,644	11/11/2017
3	BARRANCA	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE RÍO FORTALEZA TRAMO RINCONADA HASTA SU DESEMBOCADURA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA – REGIÓN LIMA	Oficio N°0357-2017-GRL/PRES	S/. 23,245,197	17/08/2017	S/. 5,993,593	11/11/2017
4	BARRANCA	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO PATIVILCA TRAMO PURMACANA HASTA SU DESEMBOCADURA, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA – REGIÓN LIMA	Oficio N°0357-2017-GRL/PRES	S/. 47,738,914	17/08/2017	S/. 11,747,281	11/11/2017
5	BARRANCA	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SUPE DEL SECTOR DE LAS MINAS HASTA SU DESEMBOCADURA, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA – REGIÓN LIMA	Oficio N°0357-2017-GRL/PRES	S/. 23,056,834	17/08/2017	S/. 5,575,761	11/11/2017
6	CANTA	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO CHILLÓN, TRAMO DESDE EL SECTOR DE TRAPICHE HASTA EL SECTOR LA CABAÑA	Oficio N°1244-2017-GRL-GRDE-DRA-CT-I-DPA	S/. 18,184,431	13/09/2017	S/. 8,273,827	11/11/2017
7	HUAROCHIRI	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO RÍMAC, TRAMO MICROCUENCA SANTA EULALIA Y RICARDO PALMA	Oficio N°1244-2017-GRL-GRDE-DRA-CT-I-DPA	S/. 6,740,905	14/09/2017	S/. 4,571,746	11/11/2017
8	HUAROCHIRI	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO LURÍN, TRAMO DESDE EL SECTOR DE OCURERE – ANTIOQUÍA, HASTA EL SECTOR DE ORCOCOTO – CUENCA, HUAROCHIRÍ	Oficio N°1244-2017-GRL-GRDE-DRA-CT-I-DPA	S/. 13,464,865	15/09/2017	S/. 4,811,723	11/11/2017
TOTAL				S/. 178,981,029		S/. 56,689,375	

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN LOS CAUCES DE LOS RIOS 2017-2018

MEDIANTE D.S N.º 326-2017-EF, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SE AUTORIZO LA INCORPORACION DE RECURSOS VIA CREDITO SUPLEMENTARIO POR LA SUMA DE S/.56'689,375 A FAVOR DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES LEY 30458.

- CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SE TRANSFIERE RECURSOS A LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LOS DIFERENTES RIOS DE LA REGION LIMA.*

PROVINCIA	RIO	SOLICITADO		TRANSFERIDO	
		LONGITUD (KM)	PRESUPUESTO (S/.)	LONGITUD (KM)	PRESUPUESTO (S/.)
BARRANCA	Pativilca	38.491	S/. 47'738,913.73	10.00	S/. 11'747,281
	Supe	32.760	S/. 23'056,834.42	7.00	S/. 5'575,761
	Fortaleza	35.647	S/. 23'245,197.41	8.00	S/. 5'993,593
HUARAL	Chancay - Huaral	39.608	S/. 26'520,474.82	9.00	S/. 8'601,800
CANTA	Chillón	23.048	S/. 18'184,430.83	8.50	S/. 8'273,827
HUAROCHIRI	Rímac (Sector Santa Eulalia)	10.424	S/. 6'740,905.29	8.00	S/. 4'571,746
	Rímac (Sector Ricardo Palma)	7.394			
	Lurín	16.800	S/. 13'464,865.48	4.50	S/. 4'811,723
CAÑETE	Mala	23.920	S/. 20'029,407.41	12.00	S/. 7'113,644
TOTAL		204.172	178'981,029.00	67.00	S/. 56'689,375.00

ESTADO SITUACIONAL FISICO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION –D.S. N°193-2017

NOMBRE DEL RIO	MODALIDAD	LONGITUD (KM)	Presupuesto Transferido (S/.)	Presupuesto Ejecutado			AVANCE FINANCIERO (%)	ESTADO FISICO
				2017	2018	TOTAL		
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO HUAURA	ADM. DIRECTA	41.869	S/. 28,239,315	S/. 21,914,706.57	S/. 0	S/. 21,914,706.57	77.60%	100.00%
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO CAÑETE	ADM. DIRECTA	27.291	S/. 14,275,853	S/. 7,147,449.88	S/. 3,149,191.42	S/. 10,296,641.30	72.13%	100.00%
TOTAL		69.160	S/. 42,515,168	S/. 29,062,156	S/. 3,149,191	S/. 32,211,348		

- EN LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO HUAURA AL SER UN RECURSO ORDINARIO, NO SE SOLICITO LA CONTINUIDAD POR HABER CUMPLIDO LA META FISICA PROGRAMADA, POR LO QUE EL SALDO DE S/, 6'324,608.43 SE REVIRTIERON AL TESORO PUBLICO.
- EN LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO CAÑETE, SE SOLICITO LA **CONTUNUIDAD EN EL 2018 POR LA SUMA DE S/. 6'213,400** PARA CULMINAR CON LA ACTIVIDAD, APROBADO CON D.S. 016-2018-EF QUEDANDO UN SALDO DE S/. 853,405,88 QUE FUE REVERTIDO AL TESORO PUBLICO. LA ACTIVIDAD EN EL RIO CAÑETE SE CULMINO, PERO SE ESTA REALIZANDO LAS REPARACIONES DE LA MAQUINARIA UTILIZADA EN EL RIO CAÑETE.

PUNTOS CRITICOS EJECUTADOS HUAURA

TRAMO	PROGRESIVAS		COORDENADAS UTM				METAS (m)
	INICIO	FIN	INICIO		FINAL		
			N	E	N	E	
I	0+000	1+534	8773517.51	212831.1	8774071.55	214246.08	1534
	3+385	4+851	8774375.42	215970.47	8774835.26	217293.07	1466
II	4+851	7+851	8774835.26	217293.07	8775481.62	220154.46	3000
III	7+851	8+064	8775481.62	220154.46	8775498.46	220373.82	213
	13+404	16+191	8774262.61	225433.3	8773226.11	227965.19	2787
IV	16+191	17+813	8773226.11	227965.19	8772660.67	229482.26	1622
	19+218	20+596	8772154.23	230761.49	8771643.63	232025.47	1378
V	20+596	23+596	8771643.63	232025.47	8771262.82	234906.32	3000
VI	23+596	26+596	8771262.82	234906.32	8771092.31	237848.43	3000
VII	26+596	29+596	8771092.31	237848.43	8770909.96	240811.56	3000
VIII	29+596	32+596	8770909.96	240811.56	8770168.69	243591.74	3000
IX	32+596	35+596	8770168.69	243591.74	8769125.84	246188.32	3000
X	35+596	38+596	8769125.84	246188.32	8768289.38	249004.32	3000
XI	38+596	41+596	8768289.38	249004.32	8767350.99	251844.3	3000
XII	41+596	44+596	8767350.99	251844.3	8767490.75	254741.09	3000
XIII	44+596	47+596	8767490.75	254741.09	8767068.86	257651.65	3000
XIV	47+596	50+465	8767068.86	257651.65	8768248.95	259902.03	2869
TOTAL							41,869.00

PANEL FOTOGRAFICO HUAURA



FOTO N°01 : INICIANDO LOS TRABAJOS DE DESCOLMATACION

PANEL FOTOGRAFICO HUAURA



FOTO N°02 : ARRIMADO DEL MATERIAL HACIA LAS MARGENES DEL RIO

PANEL FOTOGRAFICO HUAURA



FOTON°03: ENCAUZAMIENTO DE LAS AGUAS BAJAS EN EL EJE DEL RIO Y TRABAJOS DE CORTE Y ARRIMADO

PANEL FOTOGRAFICO HUAURA



FOTO N°04: TRABAJO DE REFINE Y CONFORMACION DE DIQUE

PANEL FOTOGRAFICO HUAURA



FOTO N°05: TRABAJOS CULMINADOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION

PANEL FOTOGRAFICO HUAURA



FOTO N°06: TRABAJOS CULMINADOS EN EL TRAMO 01

PANEL FOTOGRAFICO HUAURA



FOTO N°07: TRABAJOS CULMINADOS EN EL TRAMO 2

PANEL FOTOGRAFICO HUAURA



FOTO N°09 : TRABAJOS CULMINADOS EN EL TRAMO 12

PANEL FOTOGRAFICO HUAURA



FOTO N°10 : TRABAJOS CULMINADOS DE DESCOLMATAACION EN EL TRAMO 14

PANEL FOTOGRAFICO HUAURA



FOTO N°11: ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

PUNTOS CRITICOS EJECUTADOS CAÑETE

TRAMOS	INICIO	FINAL	DISTANCIA (m)
Tramo I	0+000	3+381	3,381.00
Tramo II	3+381	6+760	3,379.00
Tramo III	6+760	10+140	3,380.00
Tramo IV	10+140	13+520	3,380.00
Tramo V	13+520	16+900	3,380.00
Tramo VI	16+900	20+280	3,380.00
Tramo VII	20+280	23+660	3,380.00
Tramo VIII	23+660	27+291	3,631.00
TOTAL			27,291

PANEL FOTOGRAFICO CAÑETE



FOTO N°01: INICIANDO LOS TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN Y FORMACIÓN DEL DIQUE EN EL TRAMO IV, (10+140 A 13+520)

PANEL FOTOGRAFICO CAÑETE



FOTO N°02: VISTA PRELIMINAR A REALIZAR LAS ACTIVIDADES, DE LA PROGRESIVA 13+520 HASTA LA PROGRESIVA 11+200 SECTOR SAN CARLOS.

PANEL FOTOGRAFICO CAÑETE



FOTO N°03: VISTA PRELIMINAR A REALIZAR LAS ACTIVIDADES, DE LA PROGRESIVA 11+500 HASTA LA PROGRESIVA 10+140 SECTORES, ISLA ALTA E ISLA BAJA

PANEL FOTOGRAFICO CAÑETE



FOTO N°04: ARRIMADO DE MATERIAL RIO CAÑETE.

PANEL FOTOGRAFICO CAÑETE



FOTO N°05: TRABAJO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS RIO CAÑETE.

PANEL FOTOGRAFICO CAÑETE



FOTOGRAFÍA N° 06: TRAMO I (0+000 A 3+380), MATERIAL EXCEDENTE TRASLADO EN LOS VOLQUETES.

PANEL FOTOGRAFICO CAÑETE



FOTO N°07: TRABAJOS DE LA MAQUINARIA EN EL TRAMO VIII, (23+660 A 27+291)

PANEL FOTOGRAFICO CAÑETE



FOTO N°08: VISTA PANORÁMICA DEL TOPÓGRAFO REALIZANDO EL RESPECTIVO CONTROL DESPUÉS DE HABER CULMINADO LA ACTIVIDAD.

PANEL FOTOGRAFICO CAÑETE



FOTO N°09: CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS (LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ARRIMADO DEL MATERIAL A AMBOS LADOS DEL RIO, CON UN ANCHO DE SECCIÓN DE 120 METROS O MÁS.), EN EL TRAMO V.

PANEL FOTOGRAFICO CAÑETE



FOTO N°10: CULMINACIÓN DE LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CAÑETE, SECTOR SAN CARLOS, DESDE LA PROGRESIVA 14+700 HASTA LA PROGRESIVA 16+900.

PANEL FOTOGRAFICO CAÑETE




FOTO N°11: CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS (LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ARRIMADO DEL MATERIAL A AMBOS LADOS DEL RIO, CON UN ANCHO DE SECCIÓN DE 120 MTS O MÁS.), EN EL SECTOR CALTOPILLA.

ESTADO SITUACIONAL FISICO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION –D.S. N°326-2017

Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PLAZO DE EJECUCION	PRESUPUESTO	METAS FÍSICAS (ETAPA I)		AVANCE FISICO	ESTADO SITUACIONAL
				DESCOLMATACIÓN (KM)	ROCA AL VOLTEO (KM)		
1	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PATIVILCA TRAMO PURMACANA HASTA SU DESEMBOCADURA, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA – REGION LIMA" - META I	110	S/. 11,747,281	10.00	2.45	100%	ACTIVIDAD CULMINADA EL 06/05/2018
2	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO FORTALEZA TRAMO RINCONADA HASTA SU DESEMBOCADURA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA – REGION LIMA"	110	S/. 5,993,593	8.00	2.90	100%	ACTIVIDAD CULMINADA EL 30/04/2018
3	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SUPE DEL SECTOR LAS MINAS HASTA SU DESEMBOCADURA, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA – REGION LIMA"	110	S/. 5,575,761	7.00	2.88	100%	ACTIVIDAD CULMINADA EL 31/03/2018
4	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RÍO CHANCAY - HUARAL, TRAMO DESDE SU DESEMBOCADURA HASTA SANTO DOMINGO"	110	S/. 8,601,800	9.00	1.45	100%	ACTIVIDAD CULMINADA EL 30/04/2018
5	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO CHILLÓN, TRAMO DESDE EL SECTOR TRAPICHE HASTA EL SECTOR LA CABAÑA"	120	S/. 8,273,827	8.50	8.00	56.10%	ACTIVIDAD EN EJECUCION ACTIVIDAD ATRAZADA POR IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS CRITICOS A INTERVENIR.
6	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO RÍMAC, TRAMO MICROCUENCA SANTA EULALIA Y TRAMO MICROCUENCA RICARDO PALMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA"	110	S/. 4,571,746	8.00	2.50	100.00%	ACTIVIDAD CULMINADA EL 30/04/2018
7	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO LURÍN, TRAMO DESDE EL SECTOR OCURURE -ANTIOQUÍA, HASTA EL SECTOR ORCOCOTO -CUENCA, HUAROCHIRÍ"	120	S/. 4,811,723	4.50	2.30	100.00%	ACTIVIDAD CULMINADA
8	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO MALA, TRAMO DESDE SU DESEMBOCADURA HASTA CALANGO"	120	S/. 7,113,644	12.00	3.50	100.00%	ACTIVIDAD CULMINADA EL 31/03/2018
TOTAL			S/. 56,689,375	67.00	25.98		

ESTADO SITUACIONAL FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION –D.S. N°326-2017

ESTADO FINANCIERO

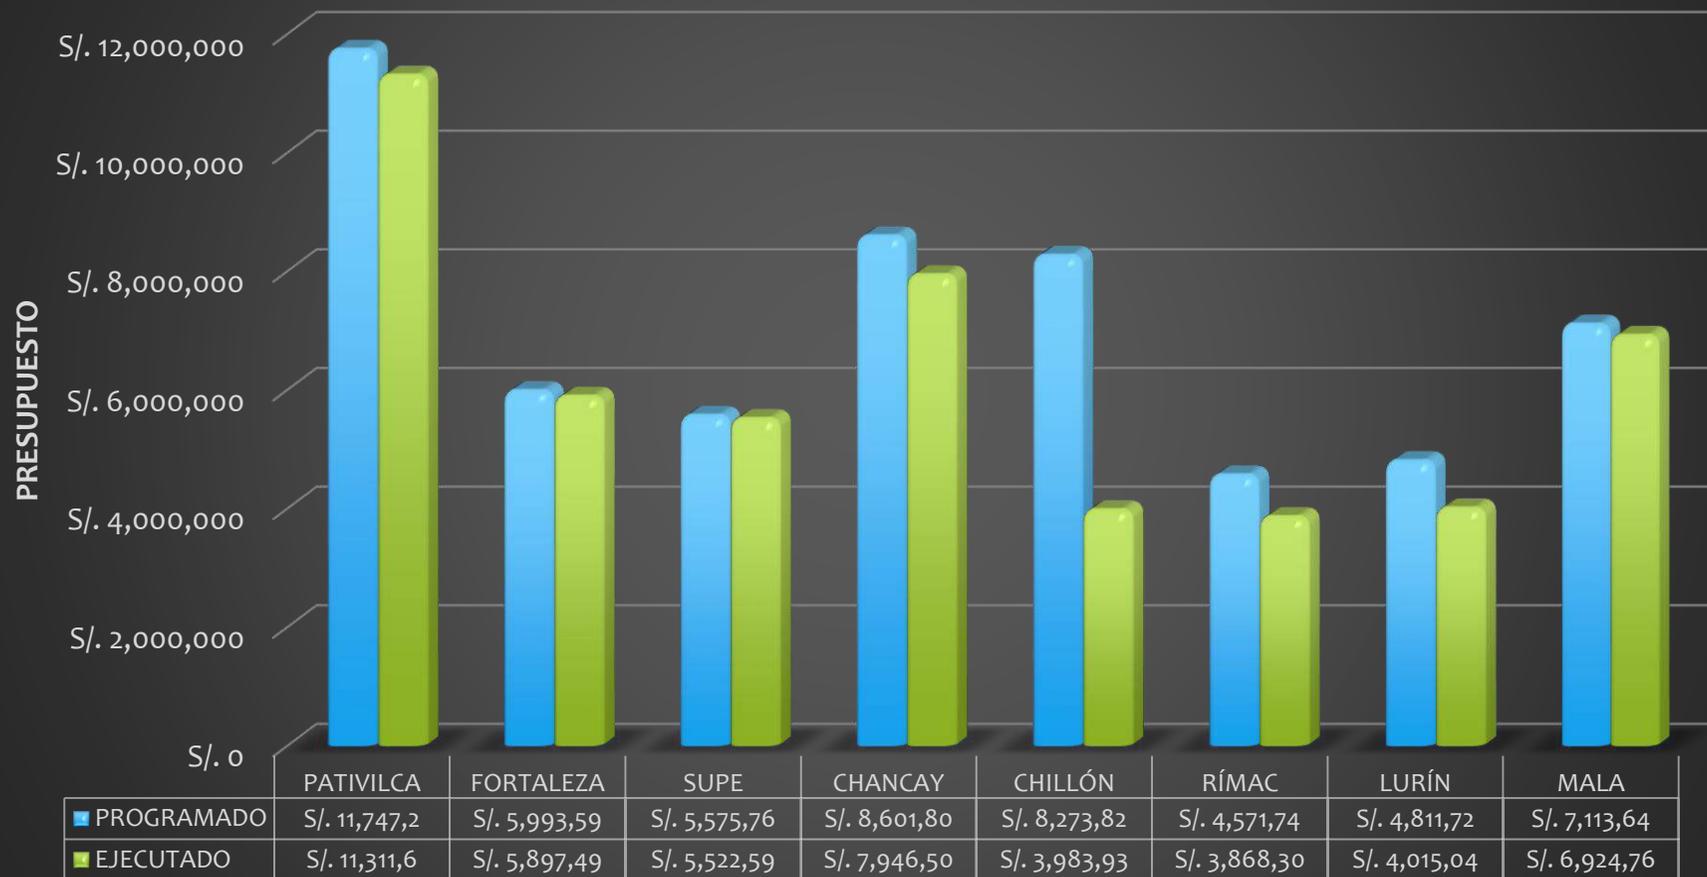

PUNTOS CRITICOS EJECUTADOS FORTALEZA

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS DE EMERGENCIA DE LA META "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO FORTALEZA" TRAMO 01 (8.0 KM)

N°	SECTOR	TRAMO	INFRAESTRUCTURA A PROTEGER	LONGITUD	ACTIVIDAD	FRENTE	PROGRESIVAS		PLANOS
							PROG-INC	PROG-FIN	
1	HOYA GRANDE	HOYA GRANDE HASTA BALCON DE JUDAS		7200	DESCOLMATACION		18+150	25+350	
2	SAUCE CHICO	SAUCE CHICO - 1 KM AGUAS ABAJO		800	DESCOLMATACION		32+200	33+000	
	TOTAL			8,000					

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS DE EMERGENCIA DE LA META "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO FORTALEZA" TRAMO 01 (8.0 KM)

N°	SECTOR	MARGEN	INFRAESTRUCTURA A PROTEGER	LONGITUD	ACTIVIDAD	FRENTE	PROGRESIVAS		PLANOS
1	CHUSIN MEDIO	DERECHA	BOCA TOMA	300	ROCA AL VOLTEO		18+650	18+950	
2	CANCHAN	IZQUIERDA	BOCA TOMA	300	ROCA AL VOLTEO		18+750	19+050	
3	CHUSIN ALTO	DERECHA	BOCA TOMA	300	ROCA AL VOLTEO		19+650	19+950	
4	NARANJAL	IZQUIERDA	BOCA TOMA	300	ROCA AL VOLTEO		21+300	21+600	
5	NARANJAL	IZQUIERDA	DIQUE	500	ROCA AL VOLTEO		21+650	22+150	
6	YUNTIN	DERECHA	BOCA TOMA	200	ROCA AL VOLTEO		21+800	22+000	
7	HOYA GRANDE	DERECHA	DIQUE	100	ROCA AL VOLTEO		24+350	24+450	
8	HOYA GRANDE	IZQUIERDA	BOCA TOMA	200	ROCA AL VOLTEO		25+050	25+250	
9	HUARICANGA	IZQUIERDA	DIQUE	100	ROCA AL VOLTEO		25+250	25+350	
10	SAUCE CHICO	IZQUIERDA	DIQUE	600	ROCA AL VOLTEO		32+400	33+000	
11	TOTAL			2,900					

PANEL FOTOGRAFICO FORTALEZA



FOTO N°01: SECTOR SAUCE CHICO - ANTES

PANEL FOTOGRAFICO FORTALEZA



FOTO N°02: INICIANDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN EL SECTOR NARANJAL.

PANEL FOTOGRAFICO FORTALEZA



FOTO N°03: SECTOR CANCHAN - ANTES

PANEL FOTOGRAFICO FORTALEZA



FOTO 04: TRABAJOS DE BARRIDO DEL CAUCE Y PERFILADO DE LA SECCIÓN DEL DIQUE.

PANEL FOTOGRAFICO FORTALEZA



FOTO 05: CORTE Y ARRIMADO DEL MATERIAL DEL CAUCE
HACIA LA RIBERA DEL RÍO.

PANEL FOTOGRAFICO FORTALEZA



FOTO 06: ACOMODO DE ROCA EN EL TALUD DEL DIQUE DE LOS TRAMOS CRÍTICOS.

PANEL FOTOGRAFICO FORTALEZA



FOTO 07: TRAMO CULMINADO EN EL SECTOR SAUCE CHICO.

PANEL FOTOGRAFICO FORTALEZA



FOTO 08: TRAMO CULMINADO DESDE CANCHAN HASTA BALCÓN DE JUDAS.

PANEL FOTOGRAFICO FORTALEZA



FOTO 09: COLOCACIÓN DE ROCA EN EL SECTOR HUARICANGA Y CAPTACIÓN DEL MINERODUCTO.

PANEL FOTOGRAFICO PATIVILCA



FOTO N°01: IMÁGENES DEL RIO ANTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

PANEL FOTOGRAFICO PATIVILCA



FOTO N°02: INICIOS DE LOS TRABAJOS EN EL SECTOR DE COCHAS

PANEL FOTOGRAFICO PATIVILCA



FOTO N°03: EL SECTOR MOLINO ALTO ANTES DE LA INTERVENCION DE LA ACTIVIDAD

PANEL FOTOGRAFICO PATIVILCA



FOTO N°04: INGRESO DE MAQUINARIA E INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SECTOR ALPAS

PANEL FOTOGRAFICO PATIVILCA



FOTO N°05: TRABAJOS DE CONFORMACION DE DIQUE EN EL
SECTOR DE ALPAS

PANEL FOTOGRAFICO PATIVILCA



FOTO N°06: TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION
EN LA ZONA DE GALPON

PANEL FOTOGRAFICO PATIVILCA



FOTO N°07: TRABAJOS DE COLOCACION DE ROCA

PANEL FOTOGRAFICO PATIVILCA



FOTO N°08: TRABAJOS CULMINADOS EN EL SECTOR ALPAS

PANEL FOTOGRAFICO PATIVILCA



FOTO N° 09: TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A COLOCACION DE ROCA

PANEL FOTOGRAFICO SUPE



FOTO N° 01: SECTOR VEGUETANO - ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS

PANEL FOTOGRAFICO SUPE



FOTO N° 02: SECTOR TURRE – ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS

PANEL FOTOGRAFICO SUPE



FOTO N° 03: SECTOR CIUDAD CARAL – ANTES DE INICIAR CON LOS TRABAJOS

PANEL FOTOGRAFICO SUPE



FOTO N° 04: SECTOR CHUPACIGARRO – CULMINANDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN.

PANEL FOTOGRAFICO SUPE



**FOTO N°05: SECTOR LAREDO – LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y
DESCOLMATACIÓN**

PANEL FOTOGRAFICO SUPE



FOTO N° 06: SECTOR LAREDO – LOS TRABAJOS COLOCACIÓN DE ROCA
AL VOLTEO EN TALUD DE DIQUE

PANEL FOTOGRAFICO SUPE



FOTO N° 07: SECTOR EL PORVENIR – TRABAJOS CULMINADOS

PANEL FOTOGRAFICO SUPE



FOTO N° 08: SECTOR VEGUETANO – CULMINADOS LOS TRABAJOS

PANEL FOTOGRAFICO SUPE



FOTO N° 09: SECTOR LLAMAHUACA – TRABAJOS CULMINADOS

PANEL FOTOGRAFICO SUPE



FOTO N°10: SECTOR PULANCACHI – TRABAJOS
CULMINADOS

PANEL FOTOGRAFICO CHANCAY-HUARAL



FOTO N°01: TRAMO NRO. 05 INICIO DE LOS TRABAJOS AGUAS
ARRIBA PUENTE CHANCAY

PANEL FOTOGRAFICO CHANCAY-HUARAL



FOTO N° 02: TRAMO NRO. 06 VISTA DEL ESTADO COLMATADO Y TOMA DE DATOS INICIALES EN PASAMAYO - NICHOS.

PANEL FOTOGRAFICO CHANCAY-HUARAL



FOTO N° 03: ZONA NRO. 06 VISTA DEL ESTADO INICIAL PARA LA COLOCACIÓN DE ROCA AL VOLTEO ZAMUDIO



FOTO N°04: INICIO DE LOS TRABAJOS DE DESCOLMATACION AGUAS ARRIBA DEL PUENTE PALPA.

PANEL FOTOGRAFICO CHANCAY-HUARAL



FOTO N° 05: DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGUAS ARRIBA DEL PUENTE PALPA.

PANEL FOTOGRAFICO CHANCAY-HUARAL



FOTO N°06:VISTA DEL ESTADO ACTUAL, DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ROCA AL VOLTEO.

PANEL FOTOGRAFICO CHANCAY-HUARAL



FOTO N° 07: VISTA DEL ESTADO ACTUAL DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL SECTOR PASAMAYO – NICHOS + ENROCADO DE 300M.

PANEL FOTOGRAFICO CHANCAY-HUARAL



FOTO N° 08: TRABAJO CULMINADO EN EL 2+000KM AGUAS ARRIBA PUENTE CHANCAY, DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

PUNTOS CRITICOS EJECUTADOS CHILLON

LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO CHILLÓN, TRAMO DESDE EL SECTOR TRAPICHE HASTA EL SECTOR LA CABAÑA” – TRAMO 1 (8.50 KM).

PUNTOS CRITICOS RIO CHILLON

PUNTO	UBICACIÓN	MARGEN	COORDENADAS		LONGITUD (km)	ANCHO (m)
			ESTE	NORTE		
1	INICIO	DERECHA	286288	8703304	5.5	60
	FINAL		289969	8707250		
2	INICIO	DERECHA	290689	8708071	0.9	45
	FINAL		291516	8708347		
3	INICIO	DERECHA	292895	8708312	0.5	55
	FINAL		293340	8708122		
4	INICIO	IZQUIERDA	297576	8706359	0.4	40
	FINAL		297914	8706385		
5	INICIO	IZQUIERDA	299228	8706623	0.9	55
	FINAL		300147	8706619		
6	INICIO		300798	8706604	0.3	60
	FINAL		301089	8706626		
TOTAL DESCOLMATACION					8.5	

PANEL FOTOGRAFICO CHILLON



FOTO N°01: EN LAS PROGRESIVAS 35+200 SE ENCONTRÓ EL RIO CHILLÓN COLMATADO.

PANEL FOTOGRAFICO CHILLON



FOTO N°02: SE ENCONTRÓ EN LA PROGRESIVAS 39+500 QUE EL RIO ESTÁ TOTALMENTE COLMATADO

PANEL FOTOGRAFICO CHILLON



FOTO N°03: AL INICIO DE LA ACTIVIDAD EN EL TRAMO 3 EN LA PROGRESIVA 43+650

PANEL FOTOGRAFICO CHILLON



FOTO N° 04: MEDIANTE LAS LABORES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO CHILLON SE ESTA DANDO UN ENCAUZAMIENTO AL RIO.

PANEL FOTOGRAFICO CHILLON



FOTO N°05: LA CONFORMACIONES DE DIQUE Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO CHILLON EN LA PROGRESIVAS 39+500

PANEL FOTOGRAFICO CHILLON



FOTO N°06: TRABAJOS DE ROCA AL VOLTEO DESDE EL PUENTE ZAPAN HACIA AGUAS ARRIBA QUE ESTAN EN LAS PROGRESIVAS (38+580 - 39+080)

PANEL FOTOGRAFICO CHILLON



FOTO N°07: CULMINACION DE LA COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO EN EL TRAMO III

PANEL FOTOGRAFICO CHILLON



FOTO N°08: DESPUES DE LAS LABORES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION EN LAS PROGRESIVAS 49+030

PUNTOS CRITICOS EJECUTADOS RIMAC

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO RIMAC, TRAMO MICROCUENCA SANTA EULALIA Y TRAMO MICROCUENCA RICARDO PALMA

TRAMO TOTAL DEL SECTOR SANTA EULALIA

TRAMO	PUNTO	COORDENADA	PROGRESIVA	ESTE	NORTE	LONGITUD
I	Inicio	U.T.M.	58+000	318408.206	8681350.469	3.81 Km
	Fin	U.T.M.	61+810	324881.635	8682506.814	
II	Inicio	U.T.M.	63+170	320465	8686459	2.04 Km
	Fin	U.T.M.	65+210	321358	8688134	
III	Inicio	U.T.M.	66+630	322023	8689316	0.34 Km
	Fin	U.T.M.	66+970	322010	8689652	
IV	Inicio	U.T.M.	67+850	322524	8690335	0.574 Km
	Fin	U.T.M.	68+424	322866.3	8690791.376	

TRAMO TOTAL DEL SECTOR SANTA EULALIA

PUNTO	COORDENADA	PROGRESIVA	ESTE	NORTE	LONGITUD
Inicio	U.T.M.	60+270	319066.418	8684139.332	1.54 Km
Fin	U.T.M.	61+810	319984.814	8685239.777	
Inicio	U.T.M.	63+170	320465	8686459	1.03 Km
Fin	U.T.M.	64+200	321129.431	8687209.336	

TRAMO TOTAL DEL SECTOR RICARDO PALMA

TRAMO	COORDENADAS	COTA (msnm)	ESTE	NORTE
Inicio	U.T.M.	924.31	318408.206	8681350.469
Fin	U.T.M.	1132.44	324881.635	8682506.814
TOTAL DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SECTOR RICARDO PALMA				
Inicio	U.T.M.		321930.63	8681547.216
Fin	U.T.M.		324589.261	8682479.628

PANEL FOTOGRAFICO RIMAC



FOTO N°01: TRAMO 3 RECORRIDO A LO LARGO ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS

PANEL FOTOGRAFICO RIMAC



FOTO N°02: REALIZANDO CORTE DE MATERIAL EN EL TRAMO 4

PANEL FOTOGRAFICO RIMAC



FOTO N°03: ROCA AL VOLTEO EN PROTECCION DE CAPTACION DE AGUA TRAMO 3

PANEL FOTOGRAFICO RIMAC



FOTO N°04: TRABAJOS ACABADOS EN RICARDO PALMA SECTOR CUPICHE KM 63+820

PANEL FOTOGRAFICO RIMAC



FOTO N°05: TRABAJOS CULMINADOS

PUNTOS CRITICOS EJECUTADOS LURIN

LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO LURÍN, TRAMO DESDE EL SECTOR OCURURE-ANTIOQUIA, HASTA EL SECTOR ORCOCOTO-CUENCA, HUAROCHIRÍ

PUNTOS CRITICOS

PUNTO	UBICACIÓN	MARGEN	COORDENADAS		LONGITUD (metros)
			ESTE	NORTE	
1	INICIO	AMBAS MARGENES	330739.806	8667410.009	1500
	FINAL		332626.577	8667069.469	
2	INICIO	AMBAS MARGENES	329598.512	8667737.93	800
	FINAL		329680.92	8667634	
LONGITUD TOTAL PARA ROCA AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS (Km)					2.3

PANEL FOTOGRAFICO LURIN



FOTO N° 01: REPLANTEO TOPOGRAFICO “COLOCACIÓN DE BANDERIN EN PIE DE TALUD – CARA HUMEDA DE LA DEFENSA RIBEREÑA”

PANEL FOTOGRAFICO LURIN



FOTO 02: VISTA PANORÁMICA DEL CONTROL DE NIVELES TOPOGRÁFICOS “CORTE Y RELLENO”

PANEL FOTOGRAFICO LURIN



FOTO N° 03: CORTE Y ARRIMADO DE MATERIAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO LURIN PROG45+800

PANEL FOTOGRAFICO LURIN



**FOTO N° 04: SELECCIÓN Y ACOPIO DE MATERIAL EN CANTERA
“CHILLACO PERÚ”**

PANEL FOTOGRAFICO LURIN



FOTO N°05: SE PUEDE OBSERVAR LOS TRABAJOS DE CORTE Y ARRIMADO DESDE LA PROGRESIVA 56+650 HASTA LA PROGRESIVA 57+200

PANEL FOTOGRAFICO LURIN



FOTO N°06: VISTA DE LOS TRABAJOS DE ARRIMADO DE MATERIAL CON BULDÓCER KM 58+100

PANEL FOTOGRAFICO LURIN



FOTO N° 07: TRABAJO CULMINADO EN CORTE Y ARRIMADO DE MATERIAL PG 46+200

PANEL FOTOGRAFICO LURIN

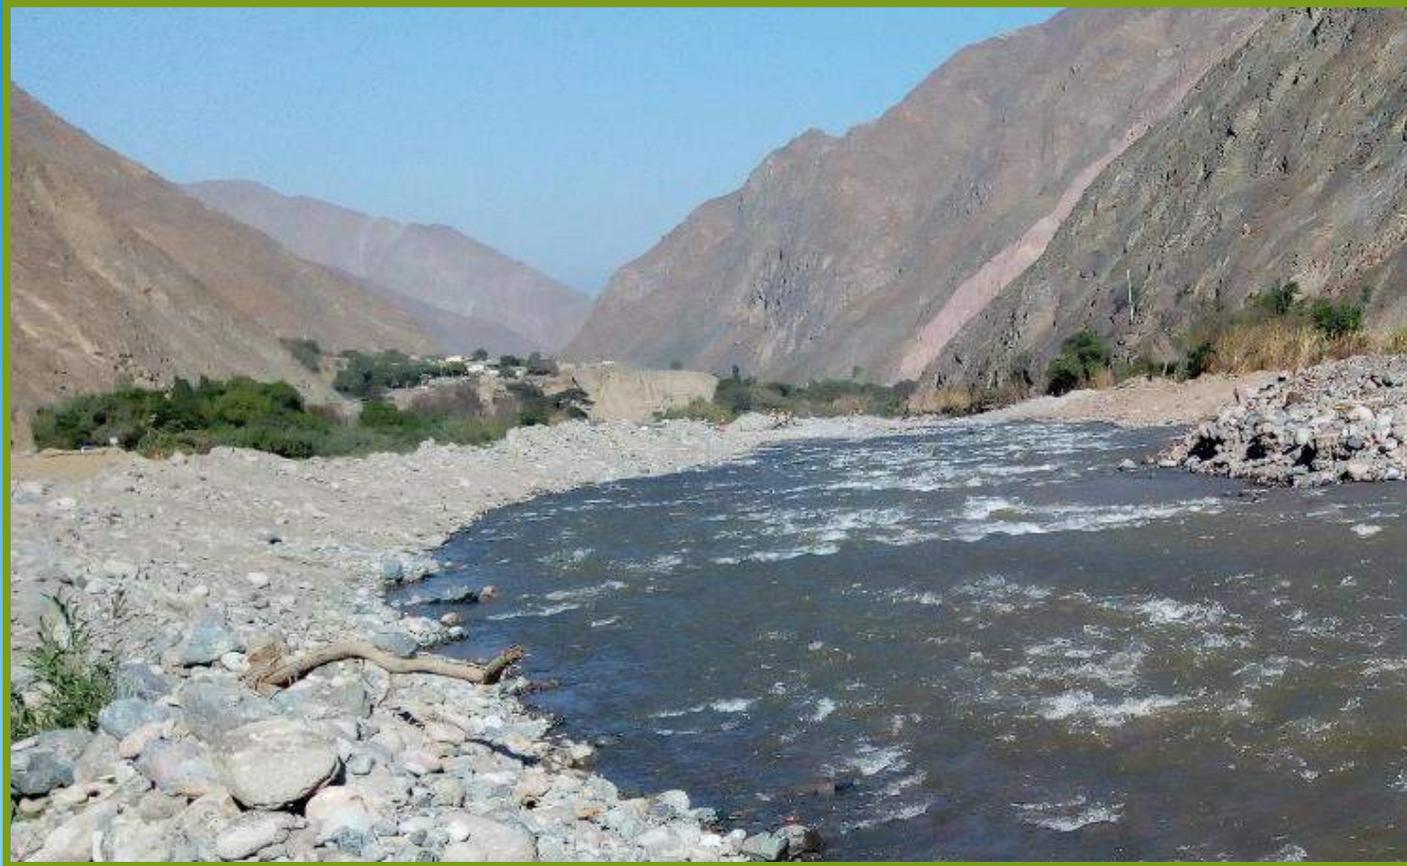


FOTO 08: VISTA PANORÁMICA DE TRABAJOS CULMINADOS EN CORTE Y ARRIMADO DE MATERIAL PG 56+100

PUNTOS CRITICOS EJECUTADOS MALA

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO MALA; TRAMO DESDE SU DESEMBOCADURA HASTA CALANGO.

PUNTOS CRITICOS

MARGEN DERECHA

INICIO	9+450	FIN	9+600	150.00
INICIO	9+780	FIN	9+960	180.00
INICIO	10+120	FIN	10+370	250.00
INICIO	10+490	FIN	11+025	535.00
INICIO	15+640	FIN	15+790	150.00
INICIO	4+125	FIN	4+625	500.00
INICIO	7+460	FIN	7+900	440.00

MARGEN IZQUIERDA

INICIO	9+950	FIN	10+150	200.00
INICIO	15+640	FIN	15+790	150.00
INICIO	4+125	FIN	4+625	500.00
INICIO	6+700	FIN	7+150	450.00

PANEL FOTOGRAFICO MALA



FOTO N°01: INICIO DE TRABAJOS CON LA MAQUINARIA EN RIO MALA DESDE PUENTE SAN ANTONIO

PANEL FOTOGRAFICO MALA



FOTO N°02: ZONA DE PROGRESIVA 16+350, DESCOLMATADO Y ENCAUZAMIENTO DEL EJE DEL RIO.

PANEL FOTOGRAFICO MALA



FOTO N°03: COLOCACION DE BANDERINES PARA INICIO Y FINAL DE ZONA DE ROCA AL VOLTEO. MARGEN DERECHO.

PANEL FOTOGRAFICO MALA



FOTO N°04: TERMINANDO CON LA COLOCACION DE ROCA EN LA ACTIVIDAD

PANEL FOTOGRAFICO MALA



FOTO N°05: TRABAJOS CULMINADOS

PANEL FOTOGRAFICO MALA



FOTO N°06: INSPECCION DE LOS TRABAJOS CULMINADOS POR PARTE DE LA CONTRALORIA Y DRAL



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Muchas Gracias
