


ANEXO 02


CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

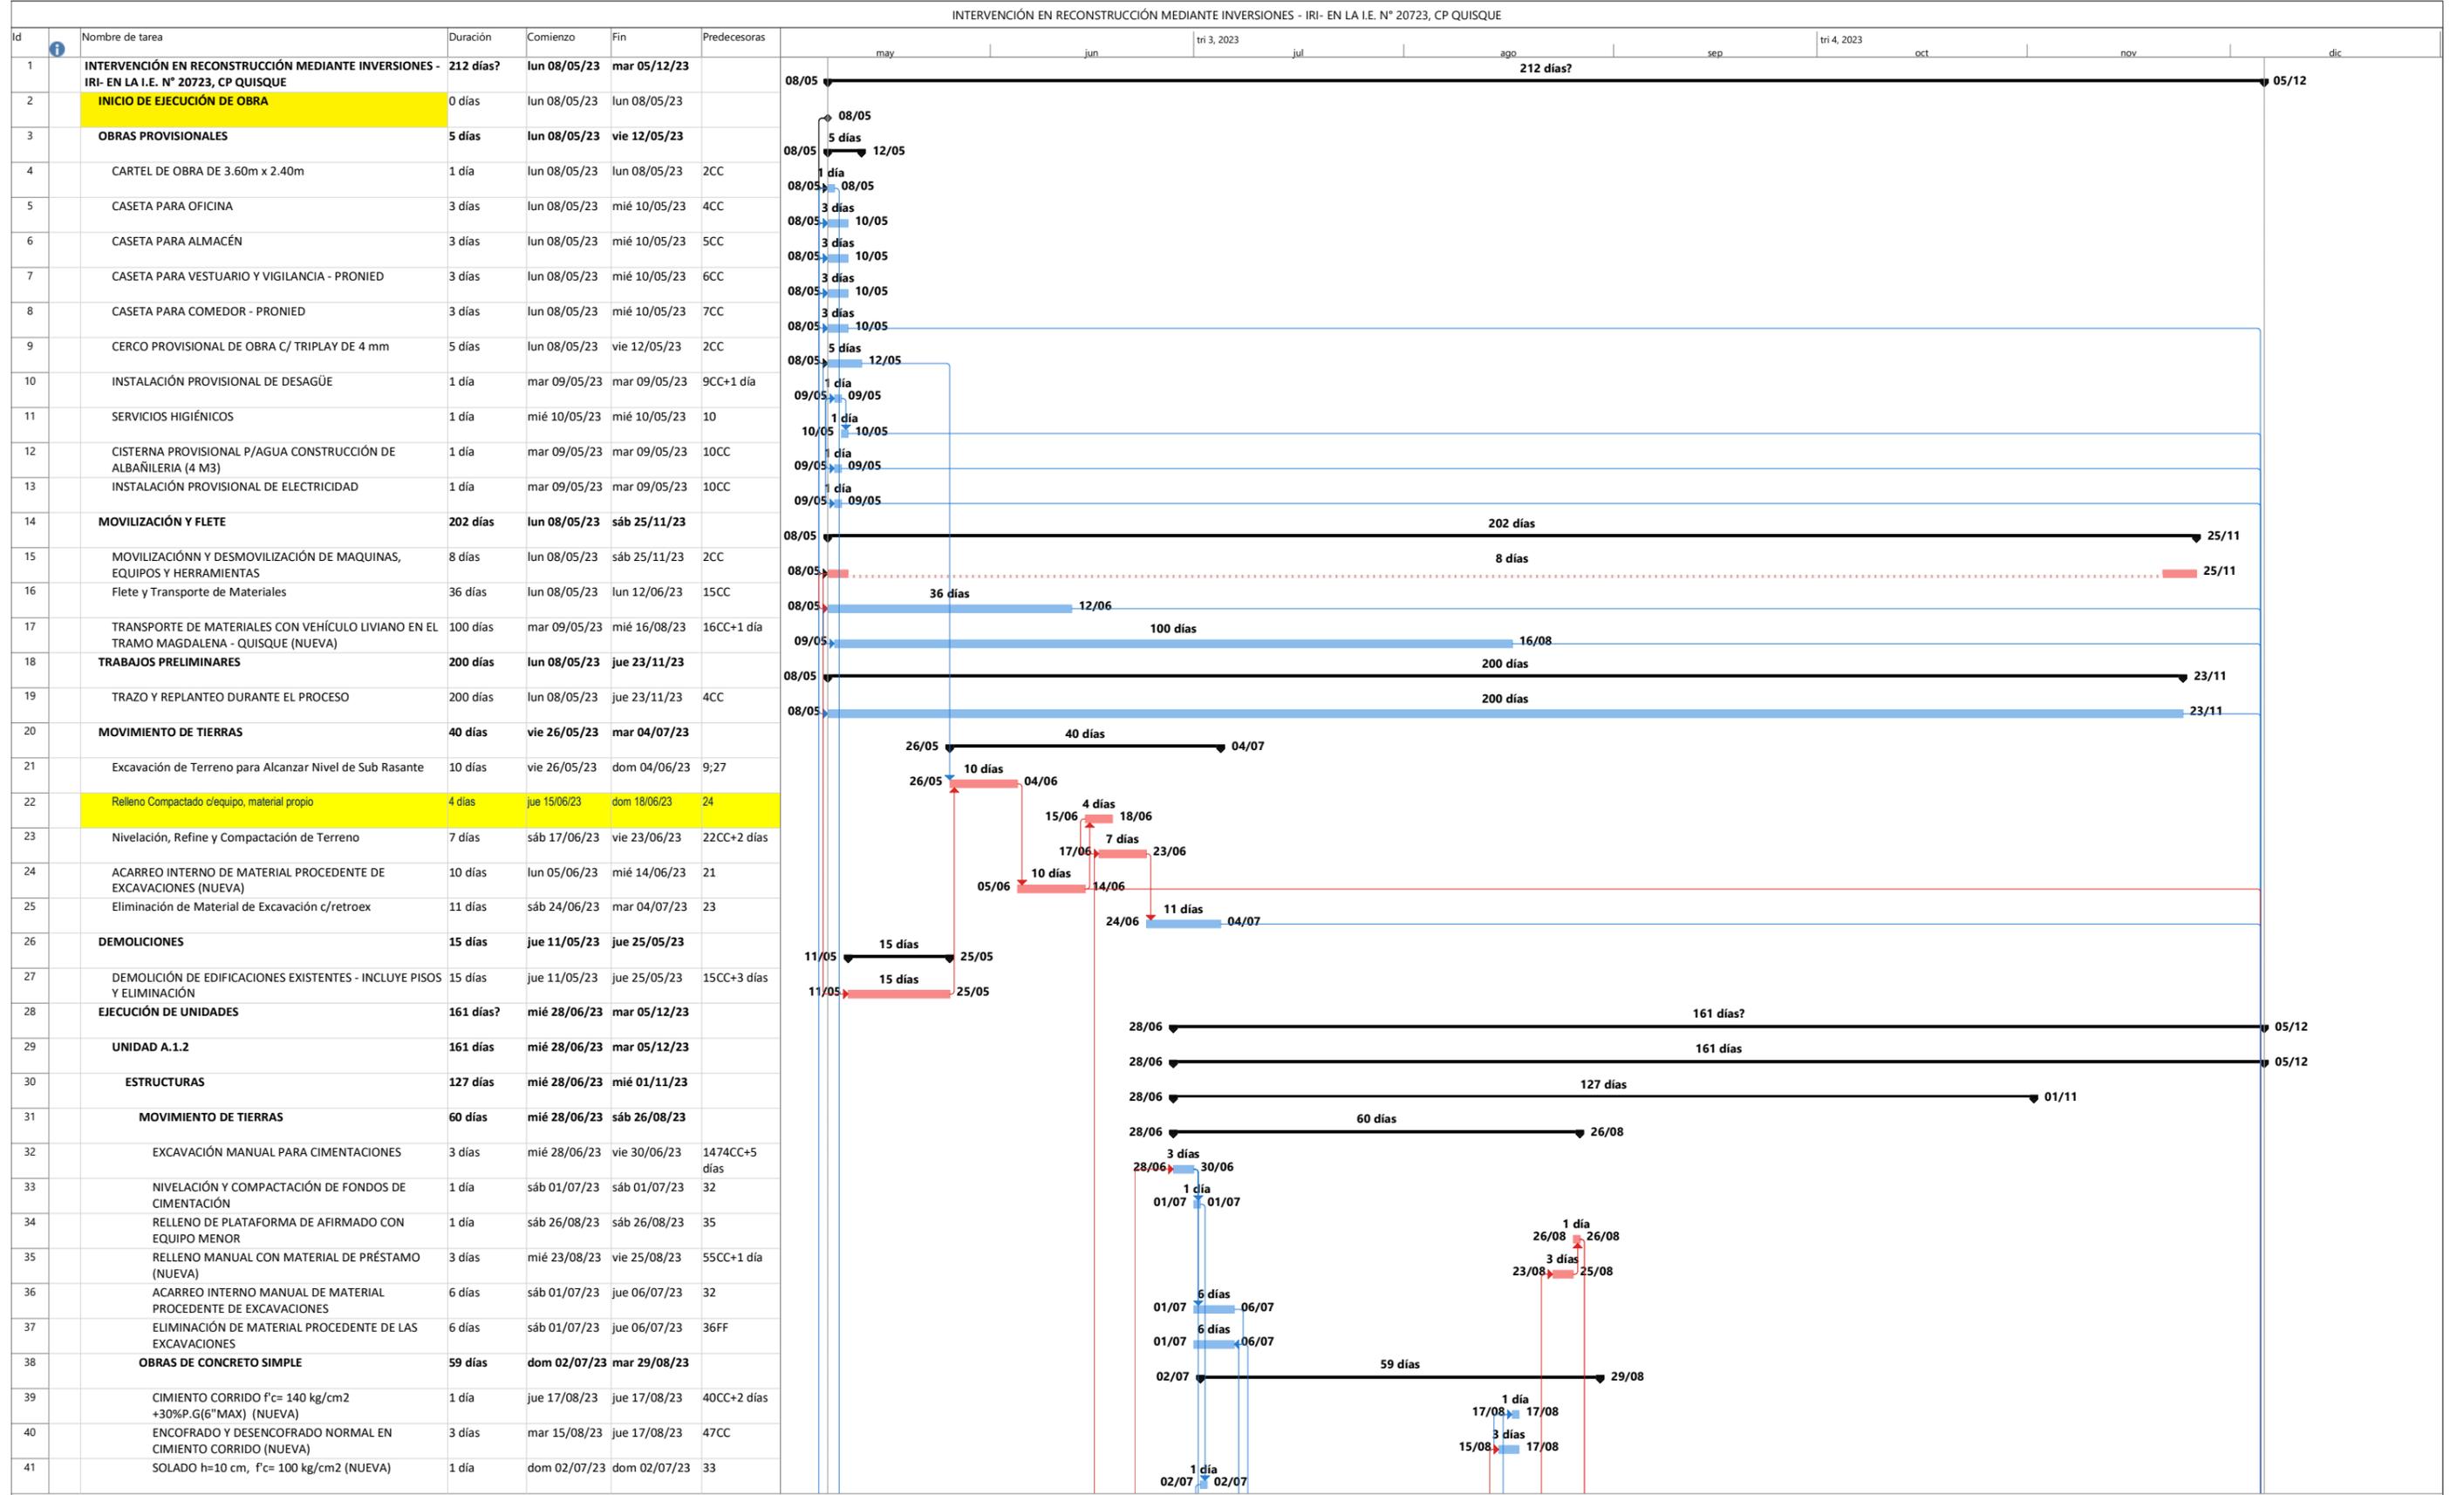

Proyecto: Fecha: mié 19/03/25
 Tarea: Resumen Hito inactivo solo duración solo el comienzo Hito externo División crítica
 División: Resumen del proyecto Resumen inactivo Informe de resumen manual solo fin Fecha limite Progreso
 Hito: Tarea inactiva Tarea manual Resumen manual Tareas externas Tareas críticas Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

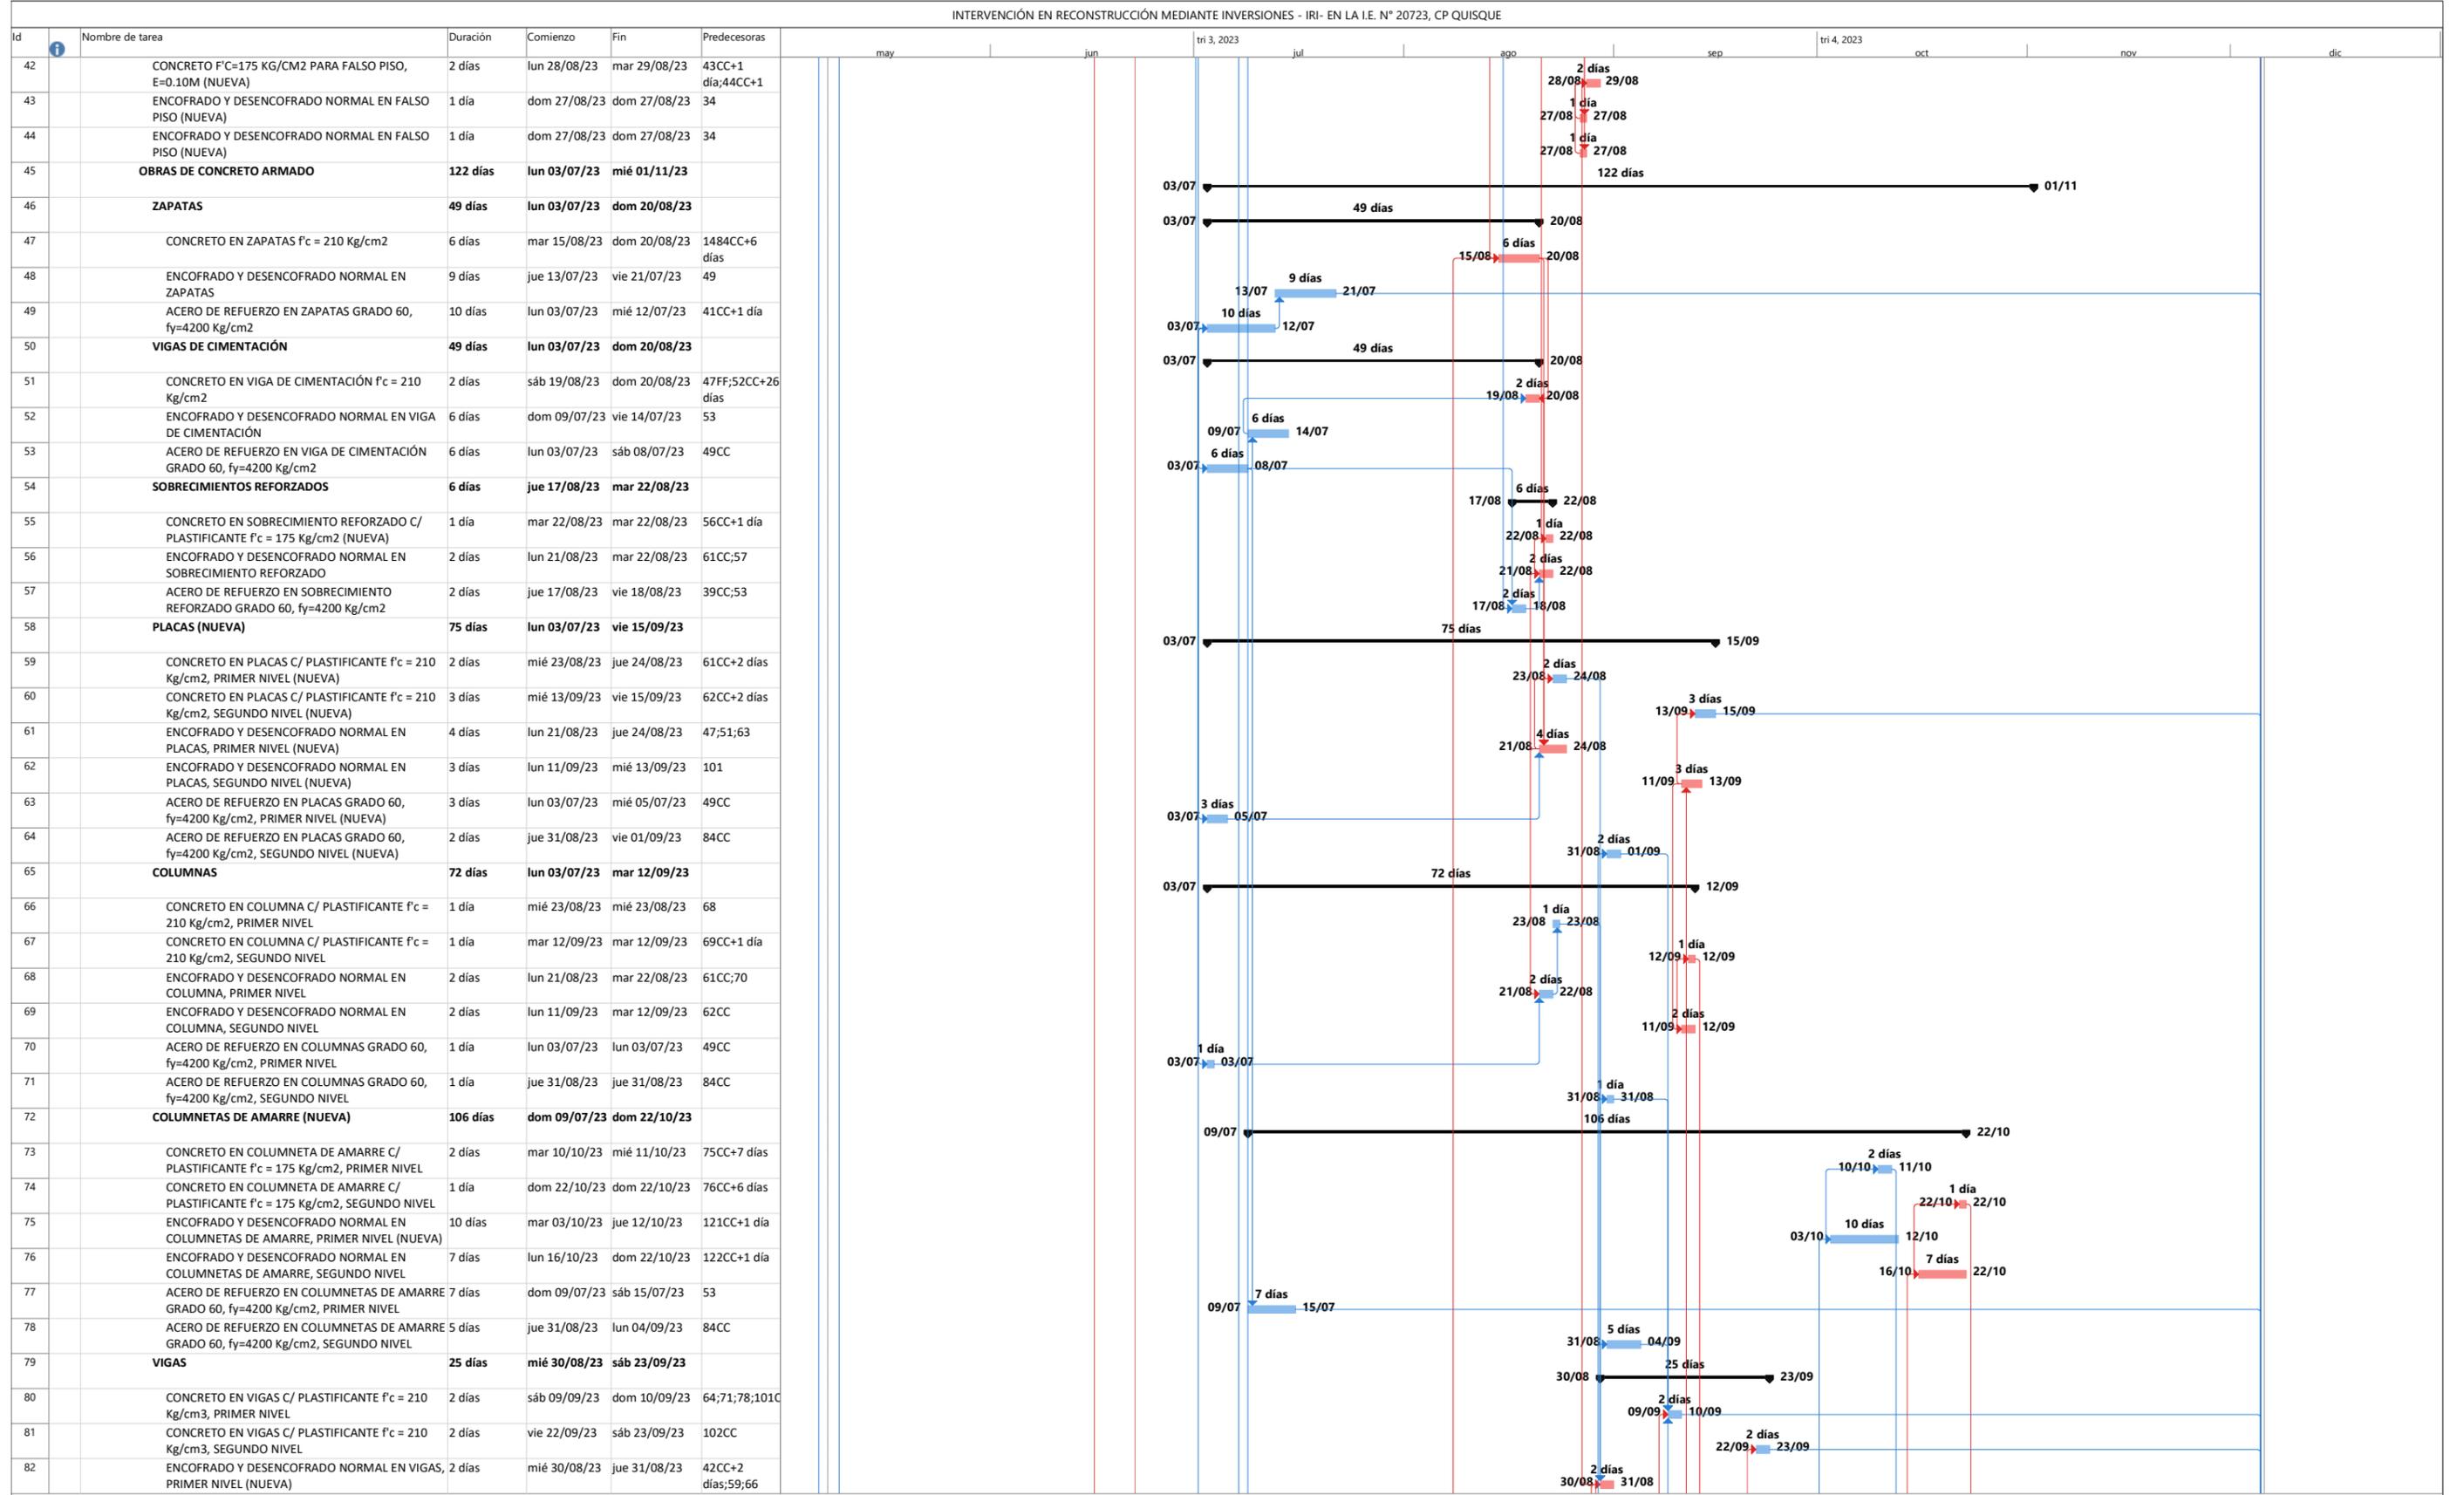

Proyecto: jiji
Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

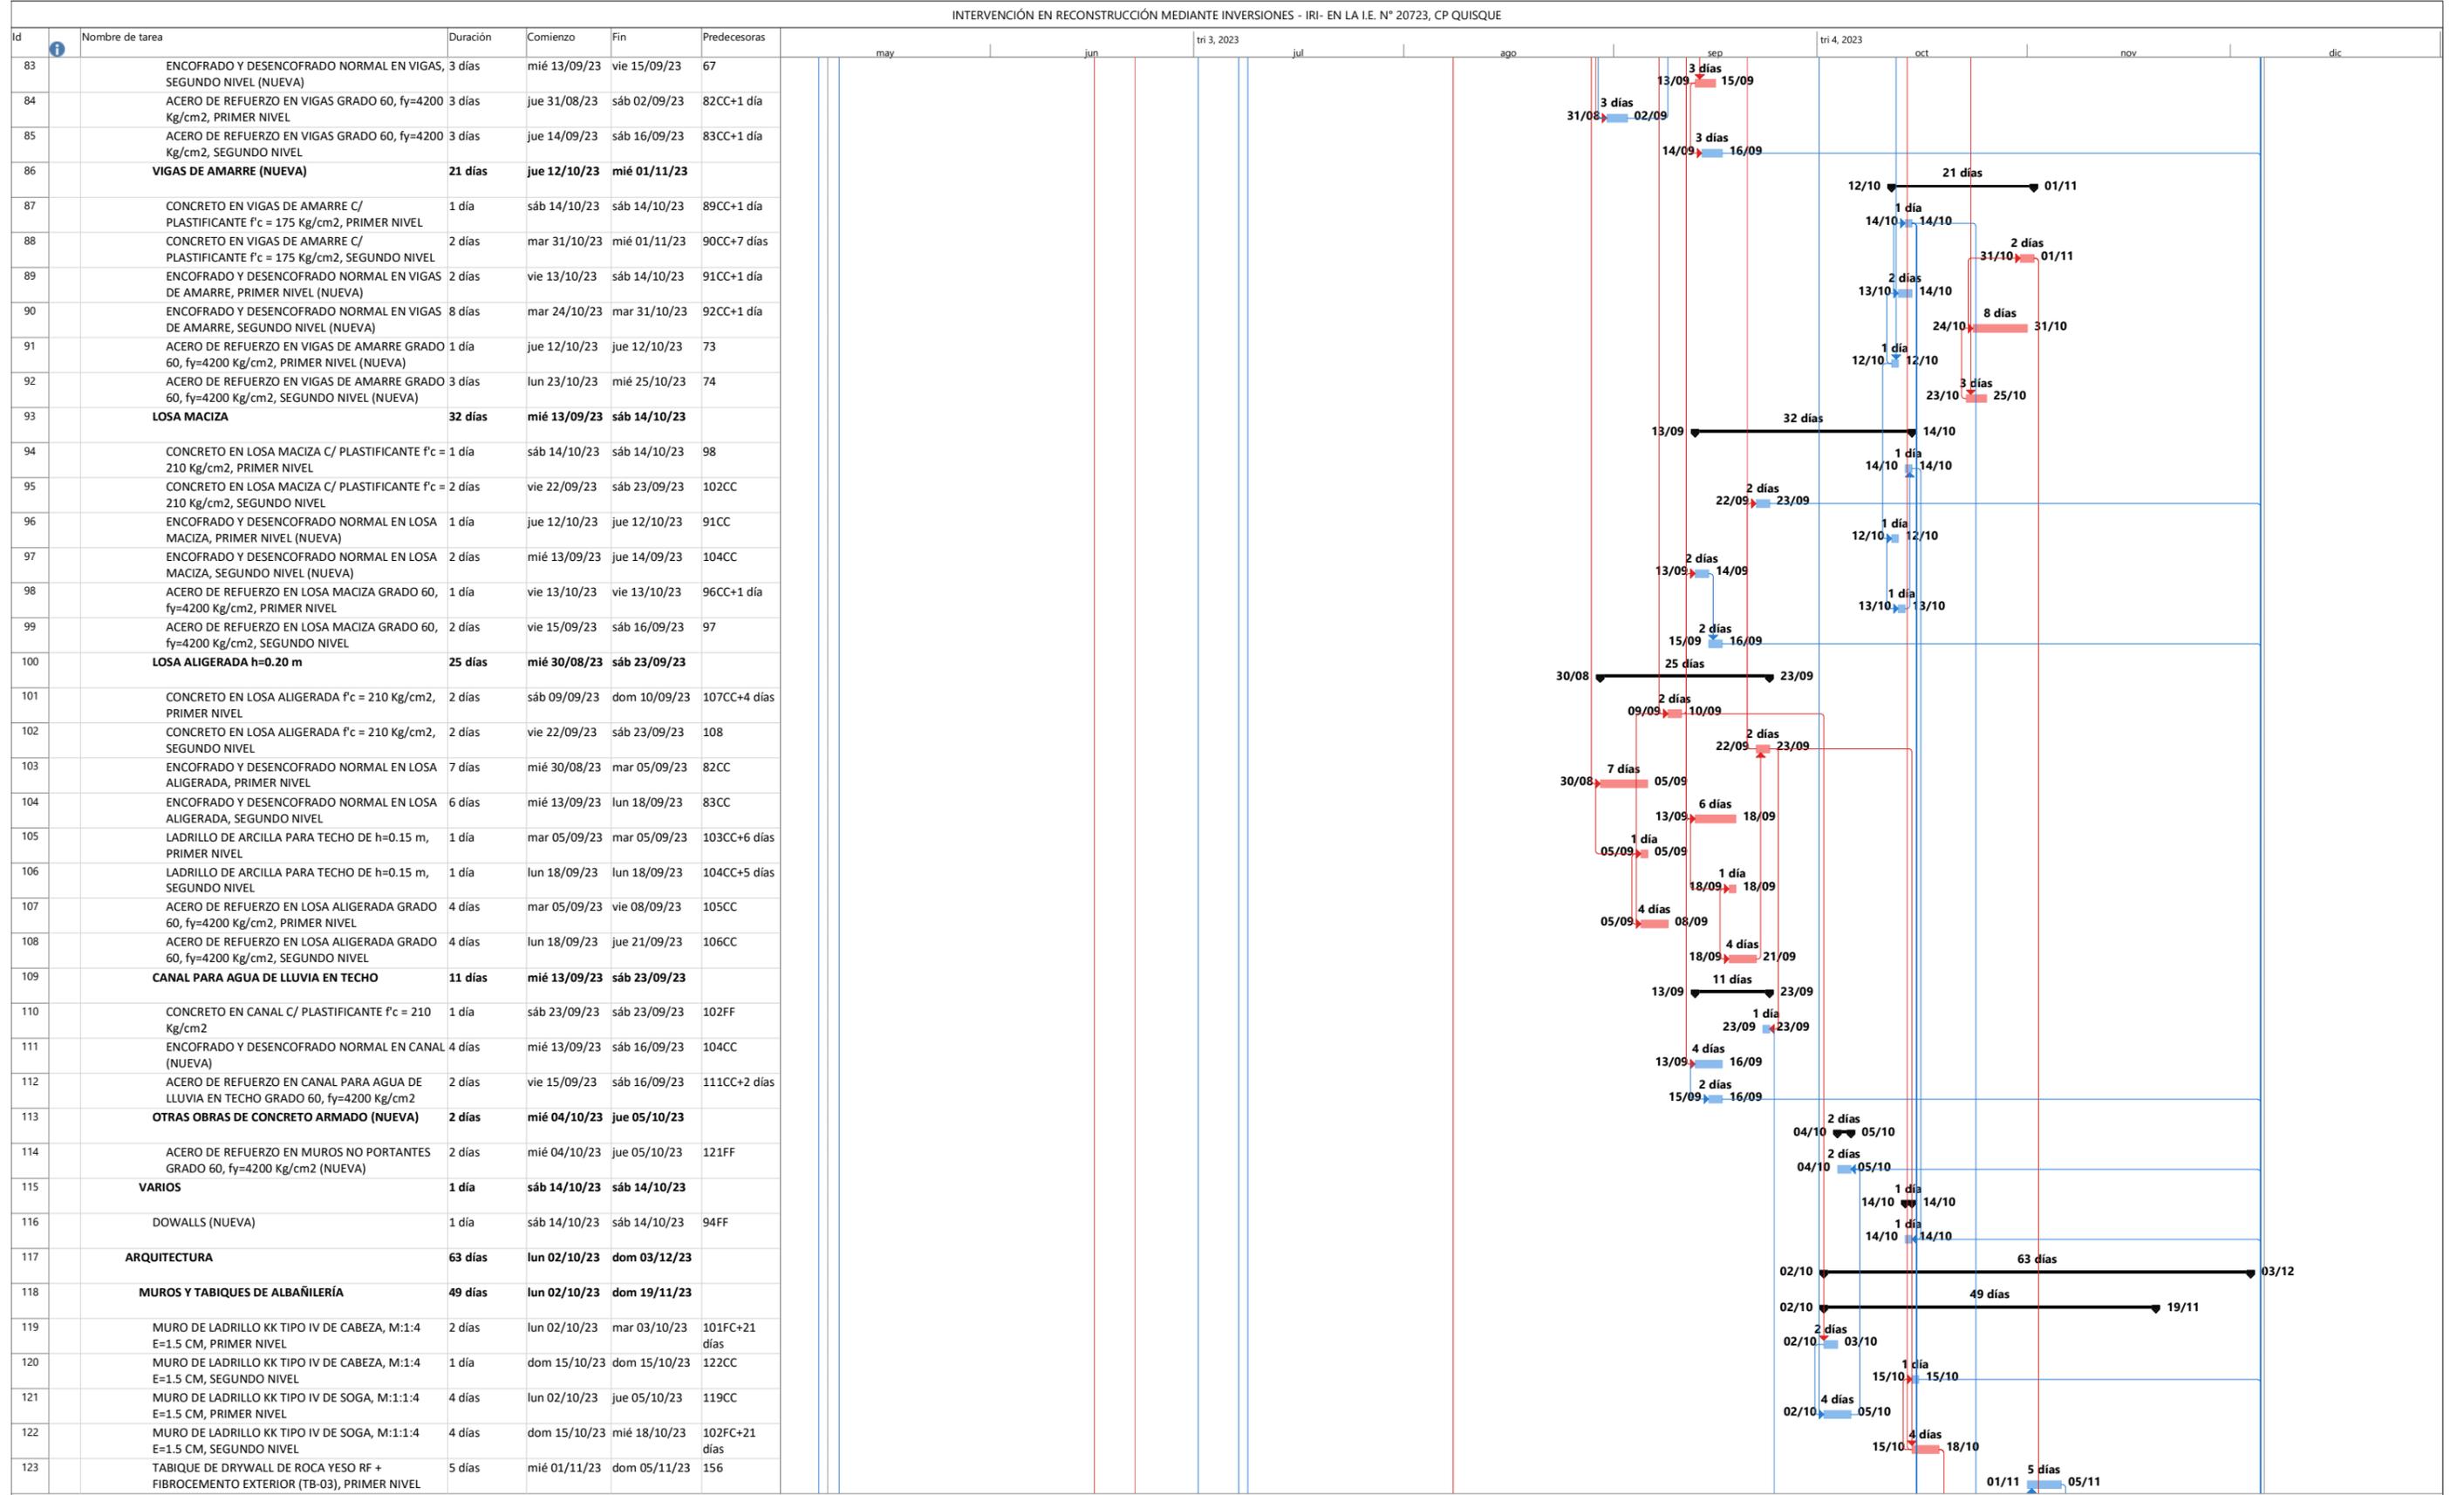

Proyecto: jiiii
Fecha: mié 19/03/25


Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

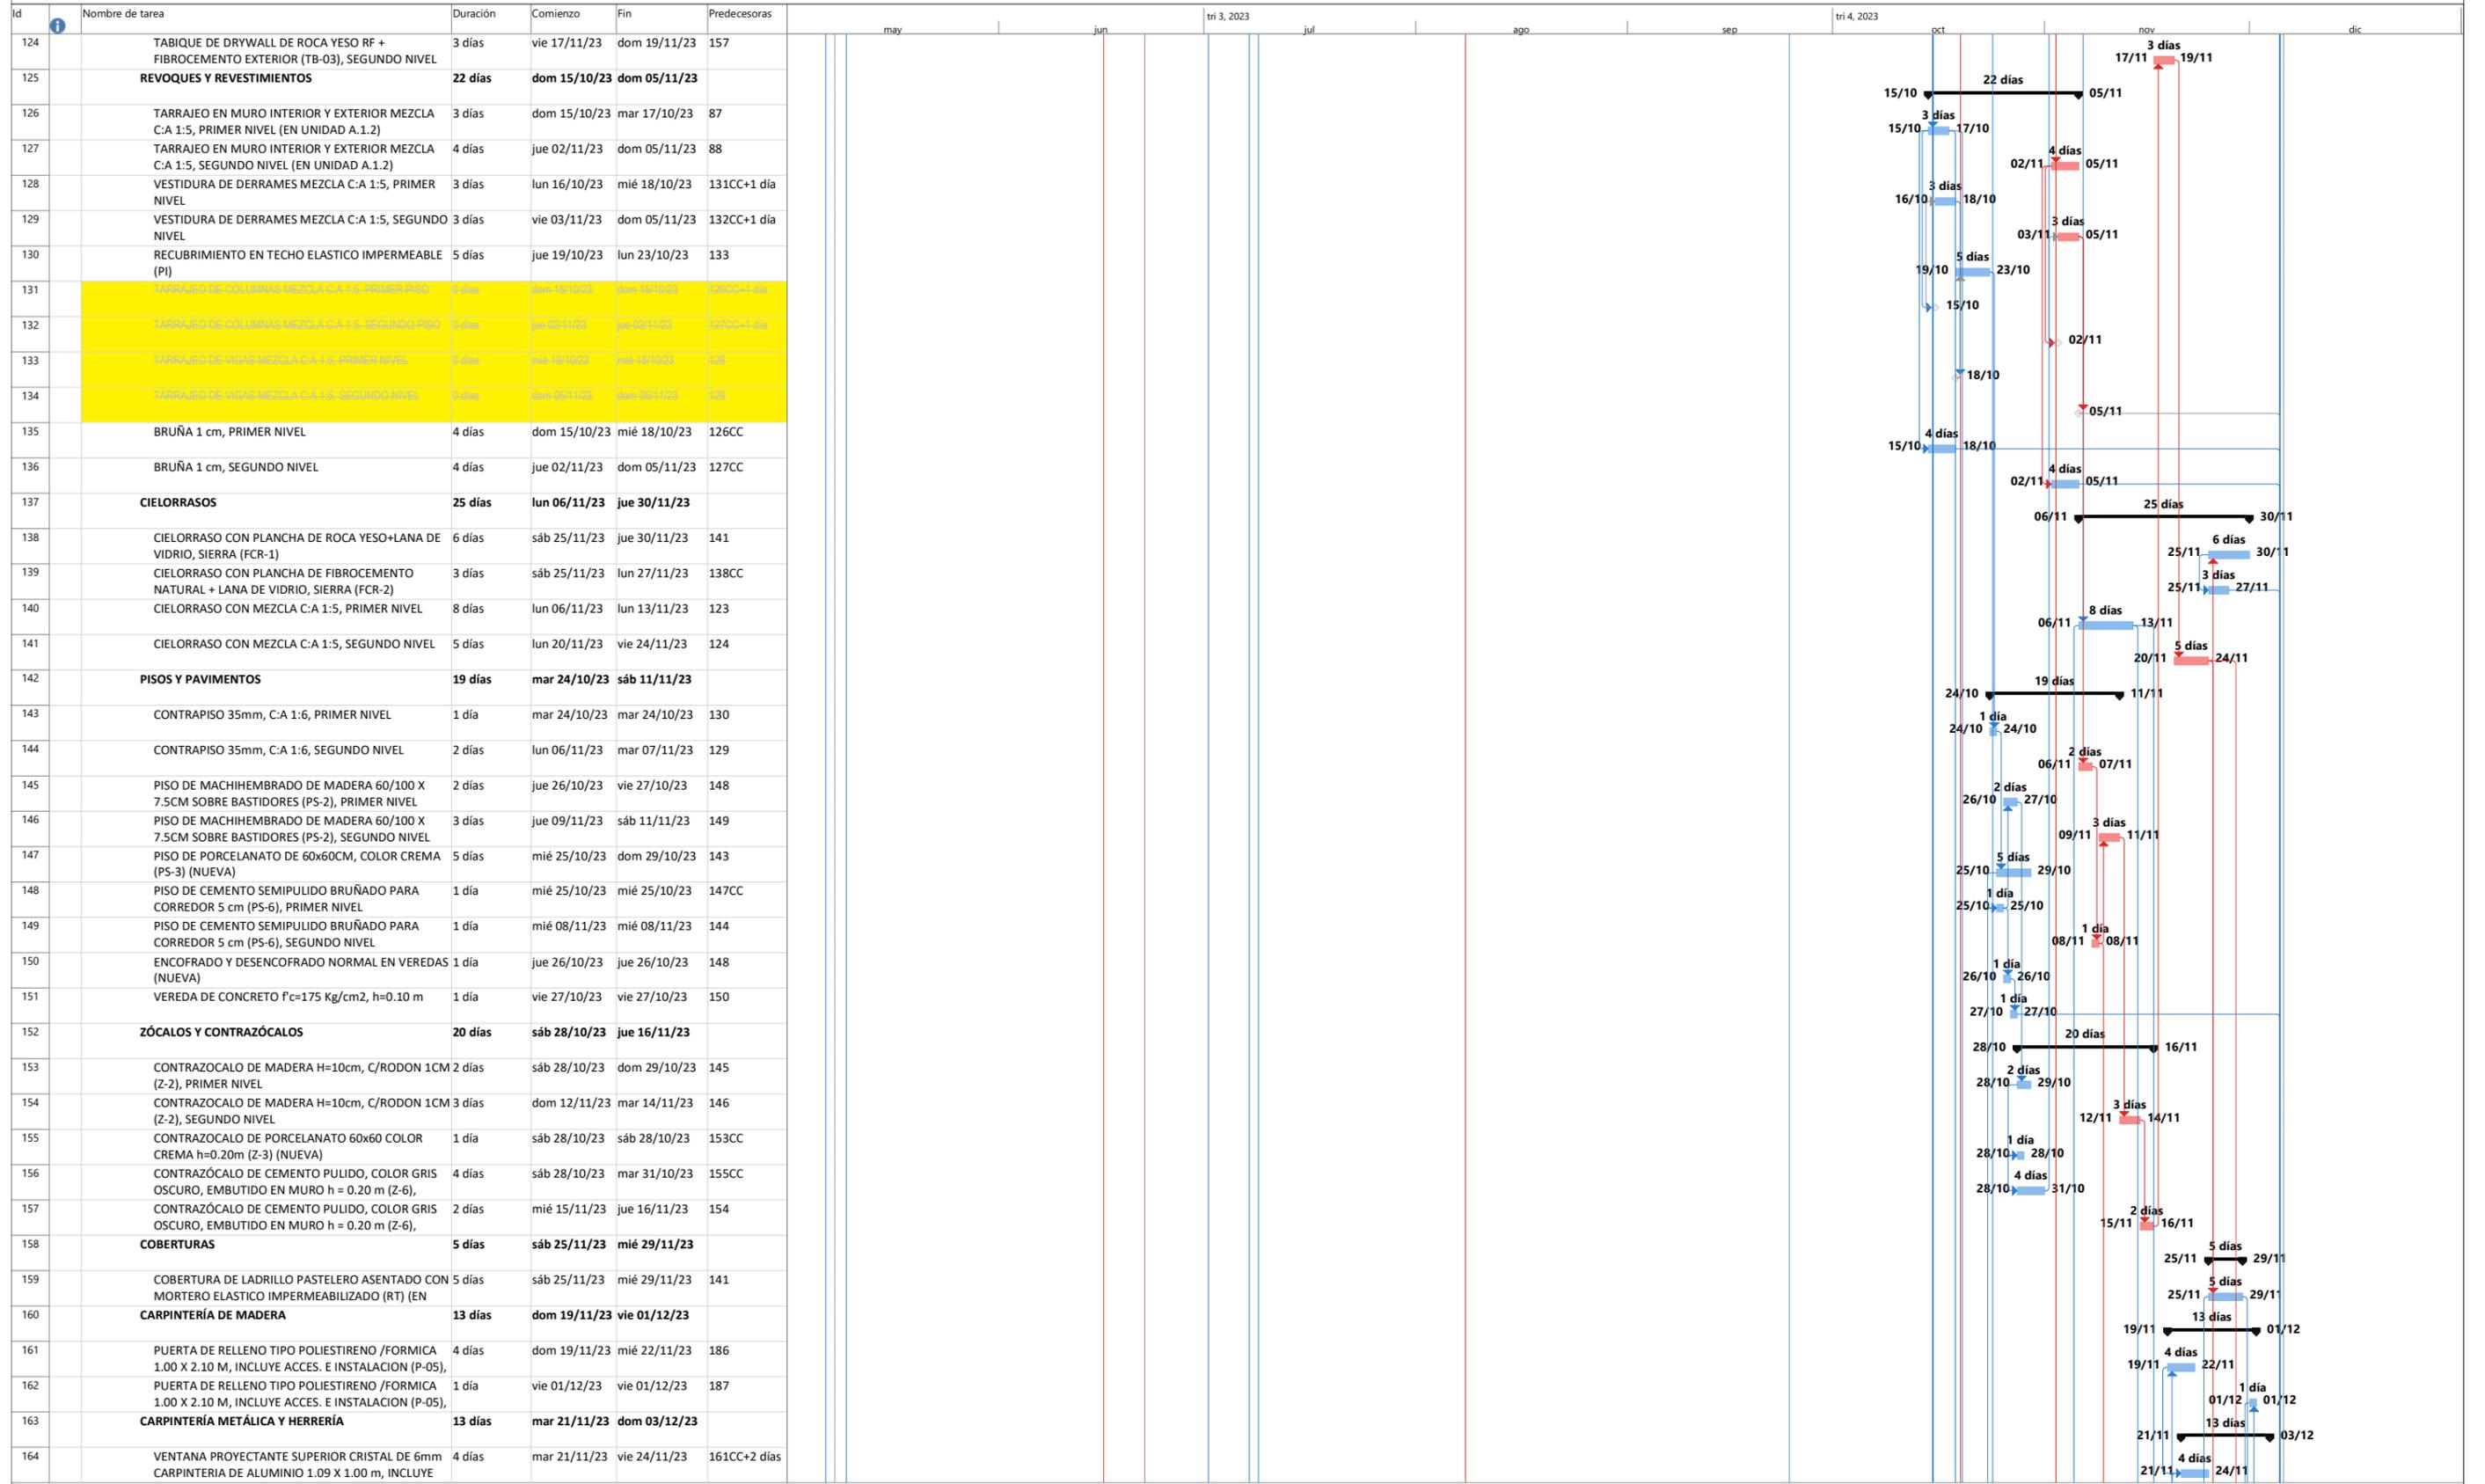

Proyecto: Fecha: mié 19/03/25
 Tarea: Resumen Hito inactivo solo duración solo el comienzo Hito externo División crítica Progreso manual
 División: Resumen del proyecto Resumen inactivo Informe de resumen manual solo fin Fecha limite Progreso Progreso manual
 Hito: Tarea inactiva Tarea manual Resumen manual Tareas externas Tareas críticas Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

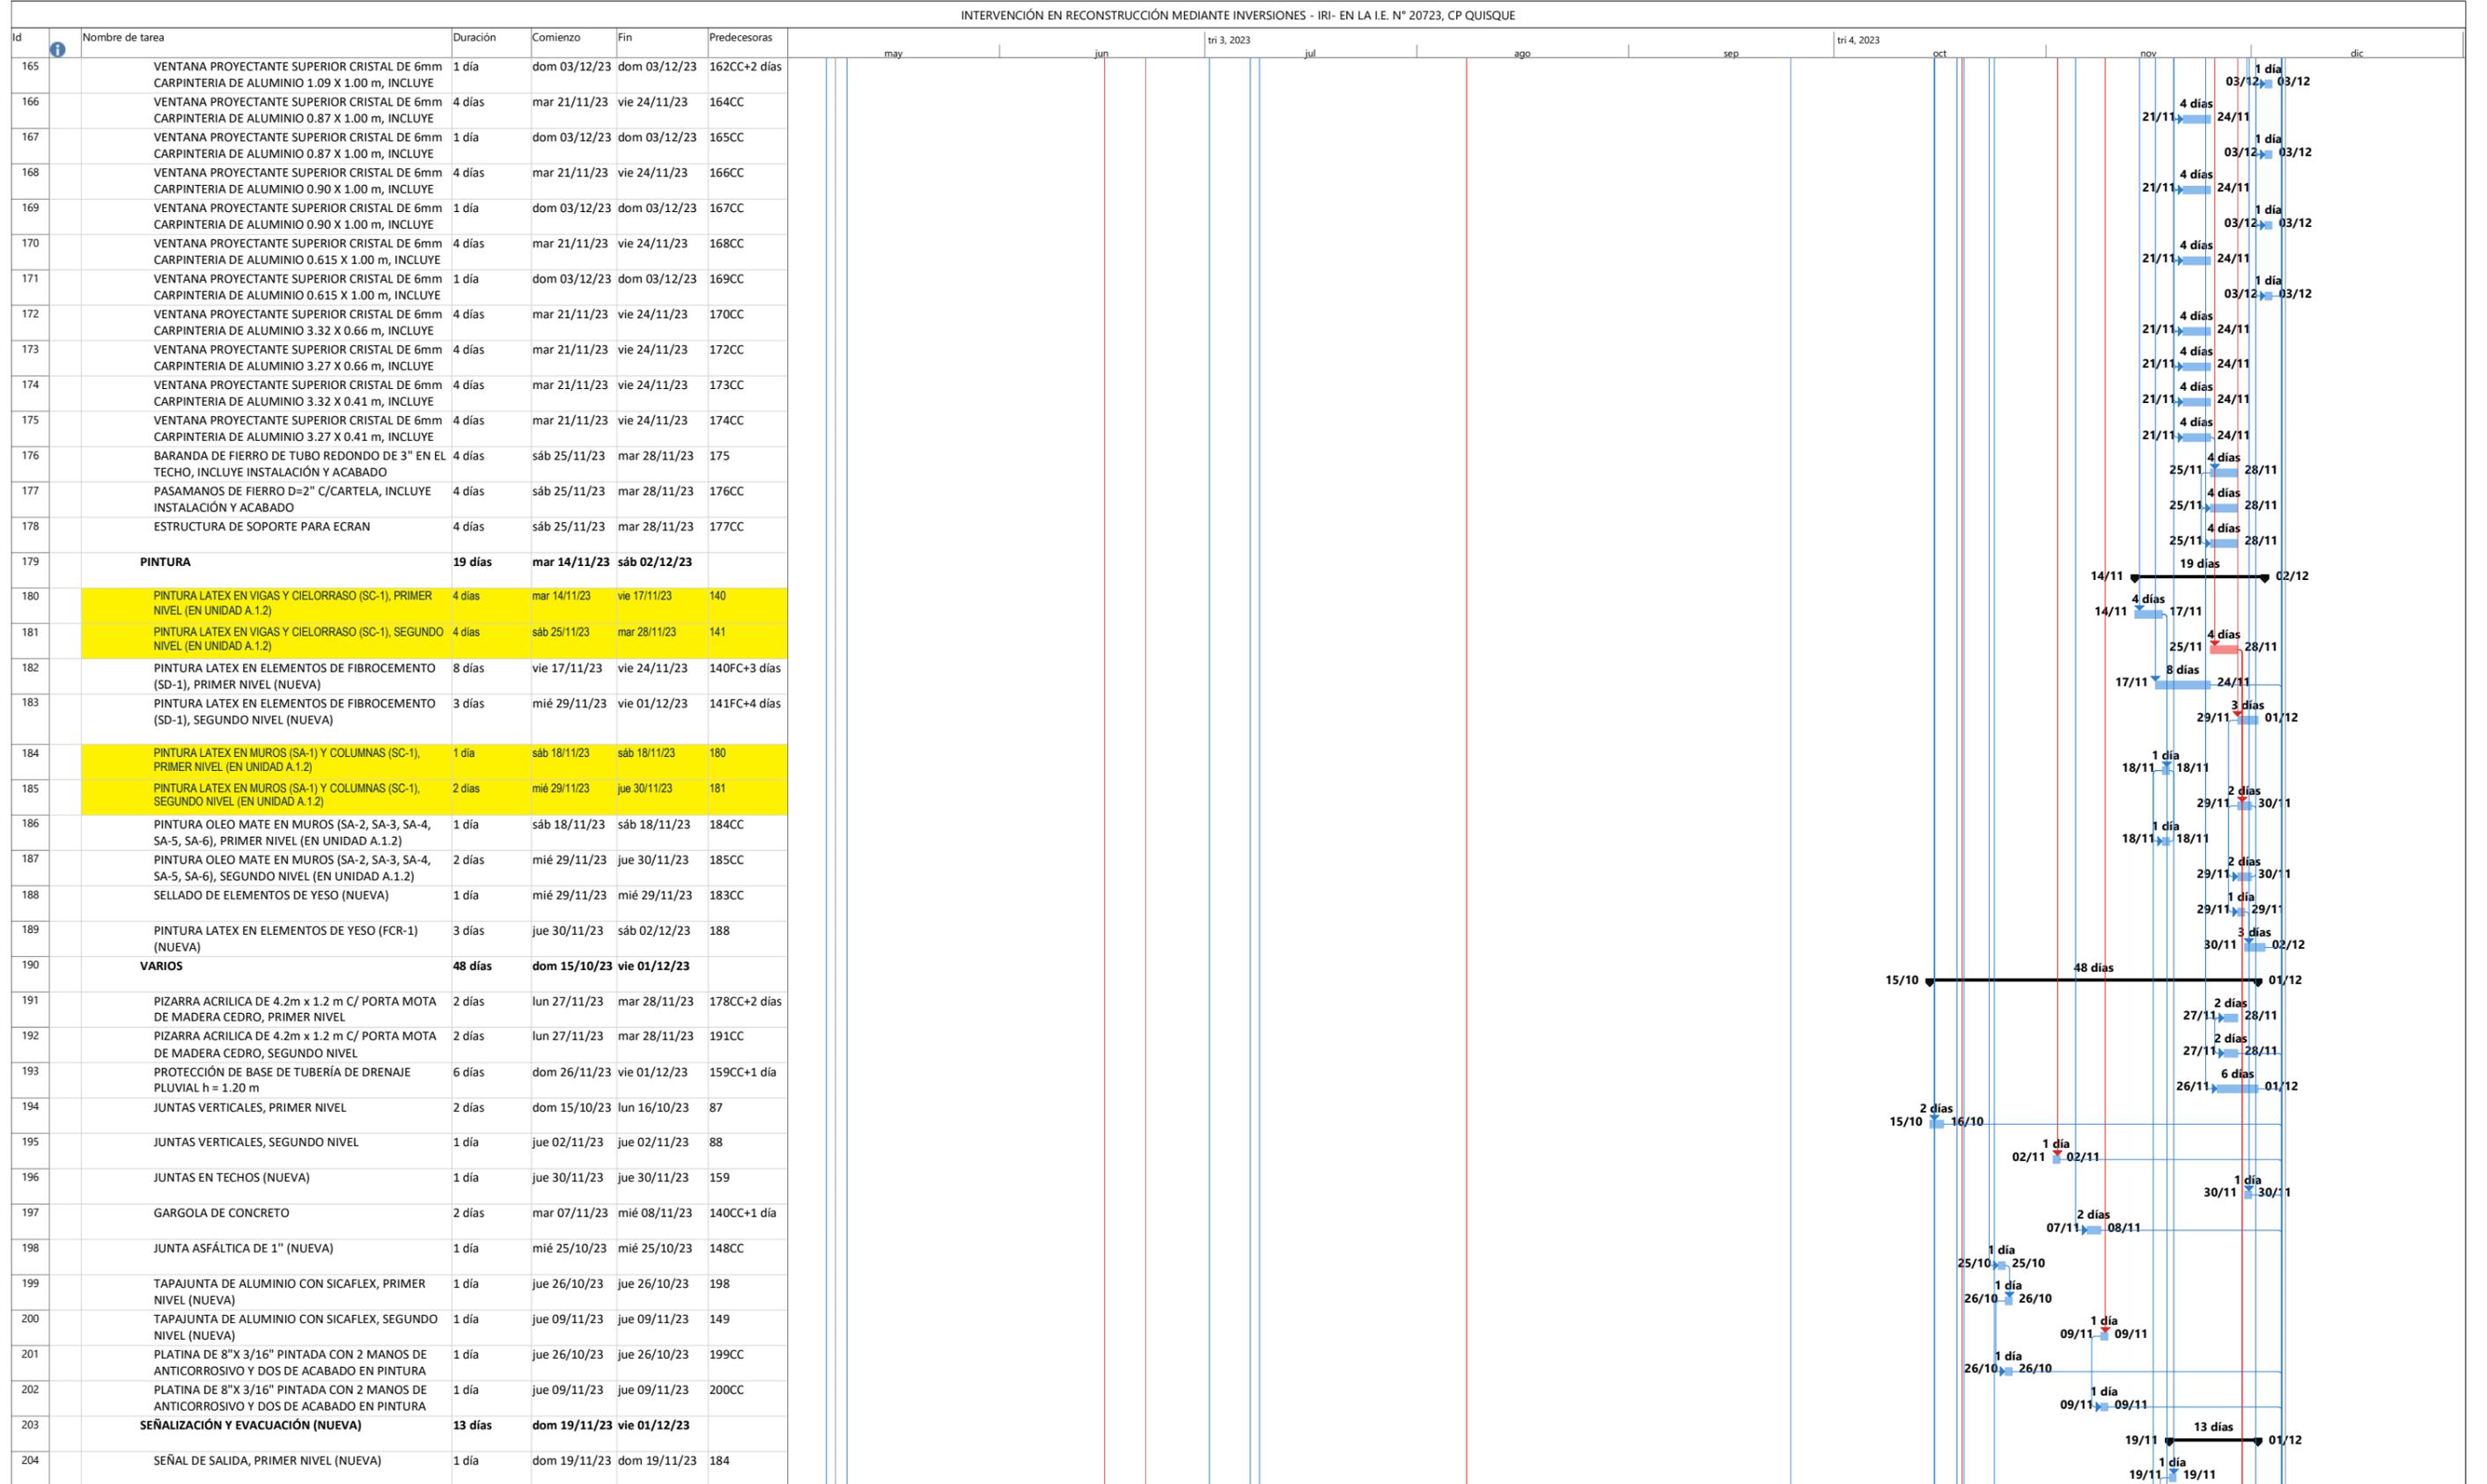

Proyecto:
 Fecha: mié 19/03/25

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		División crítica	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite		Progreso	
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Tareas críticas		Progreso manual	


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

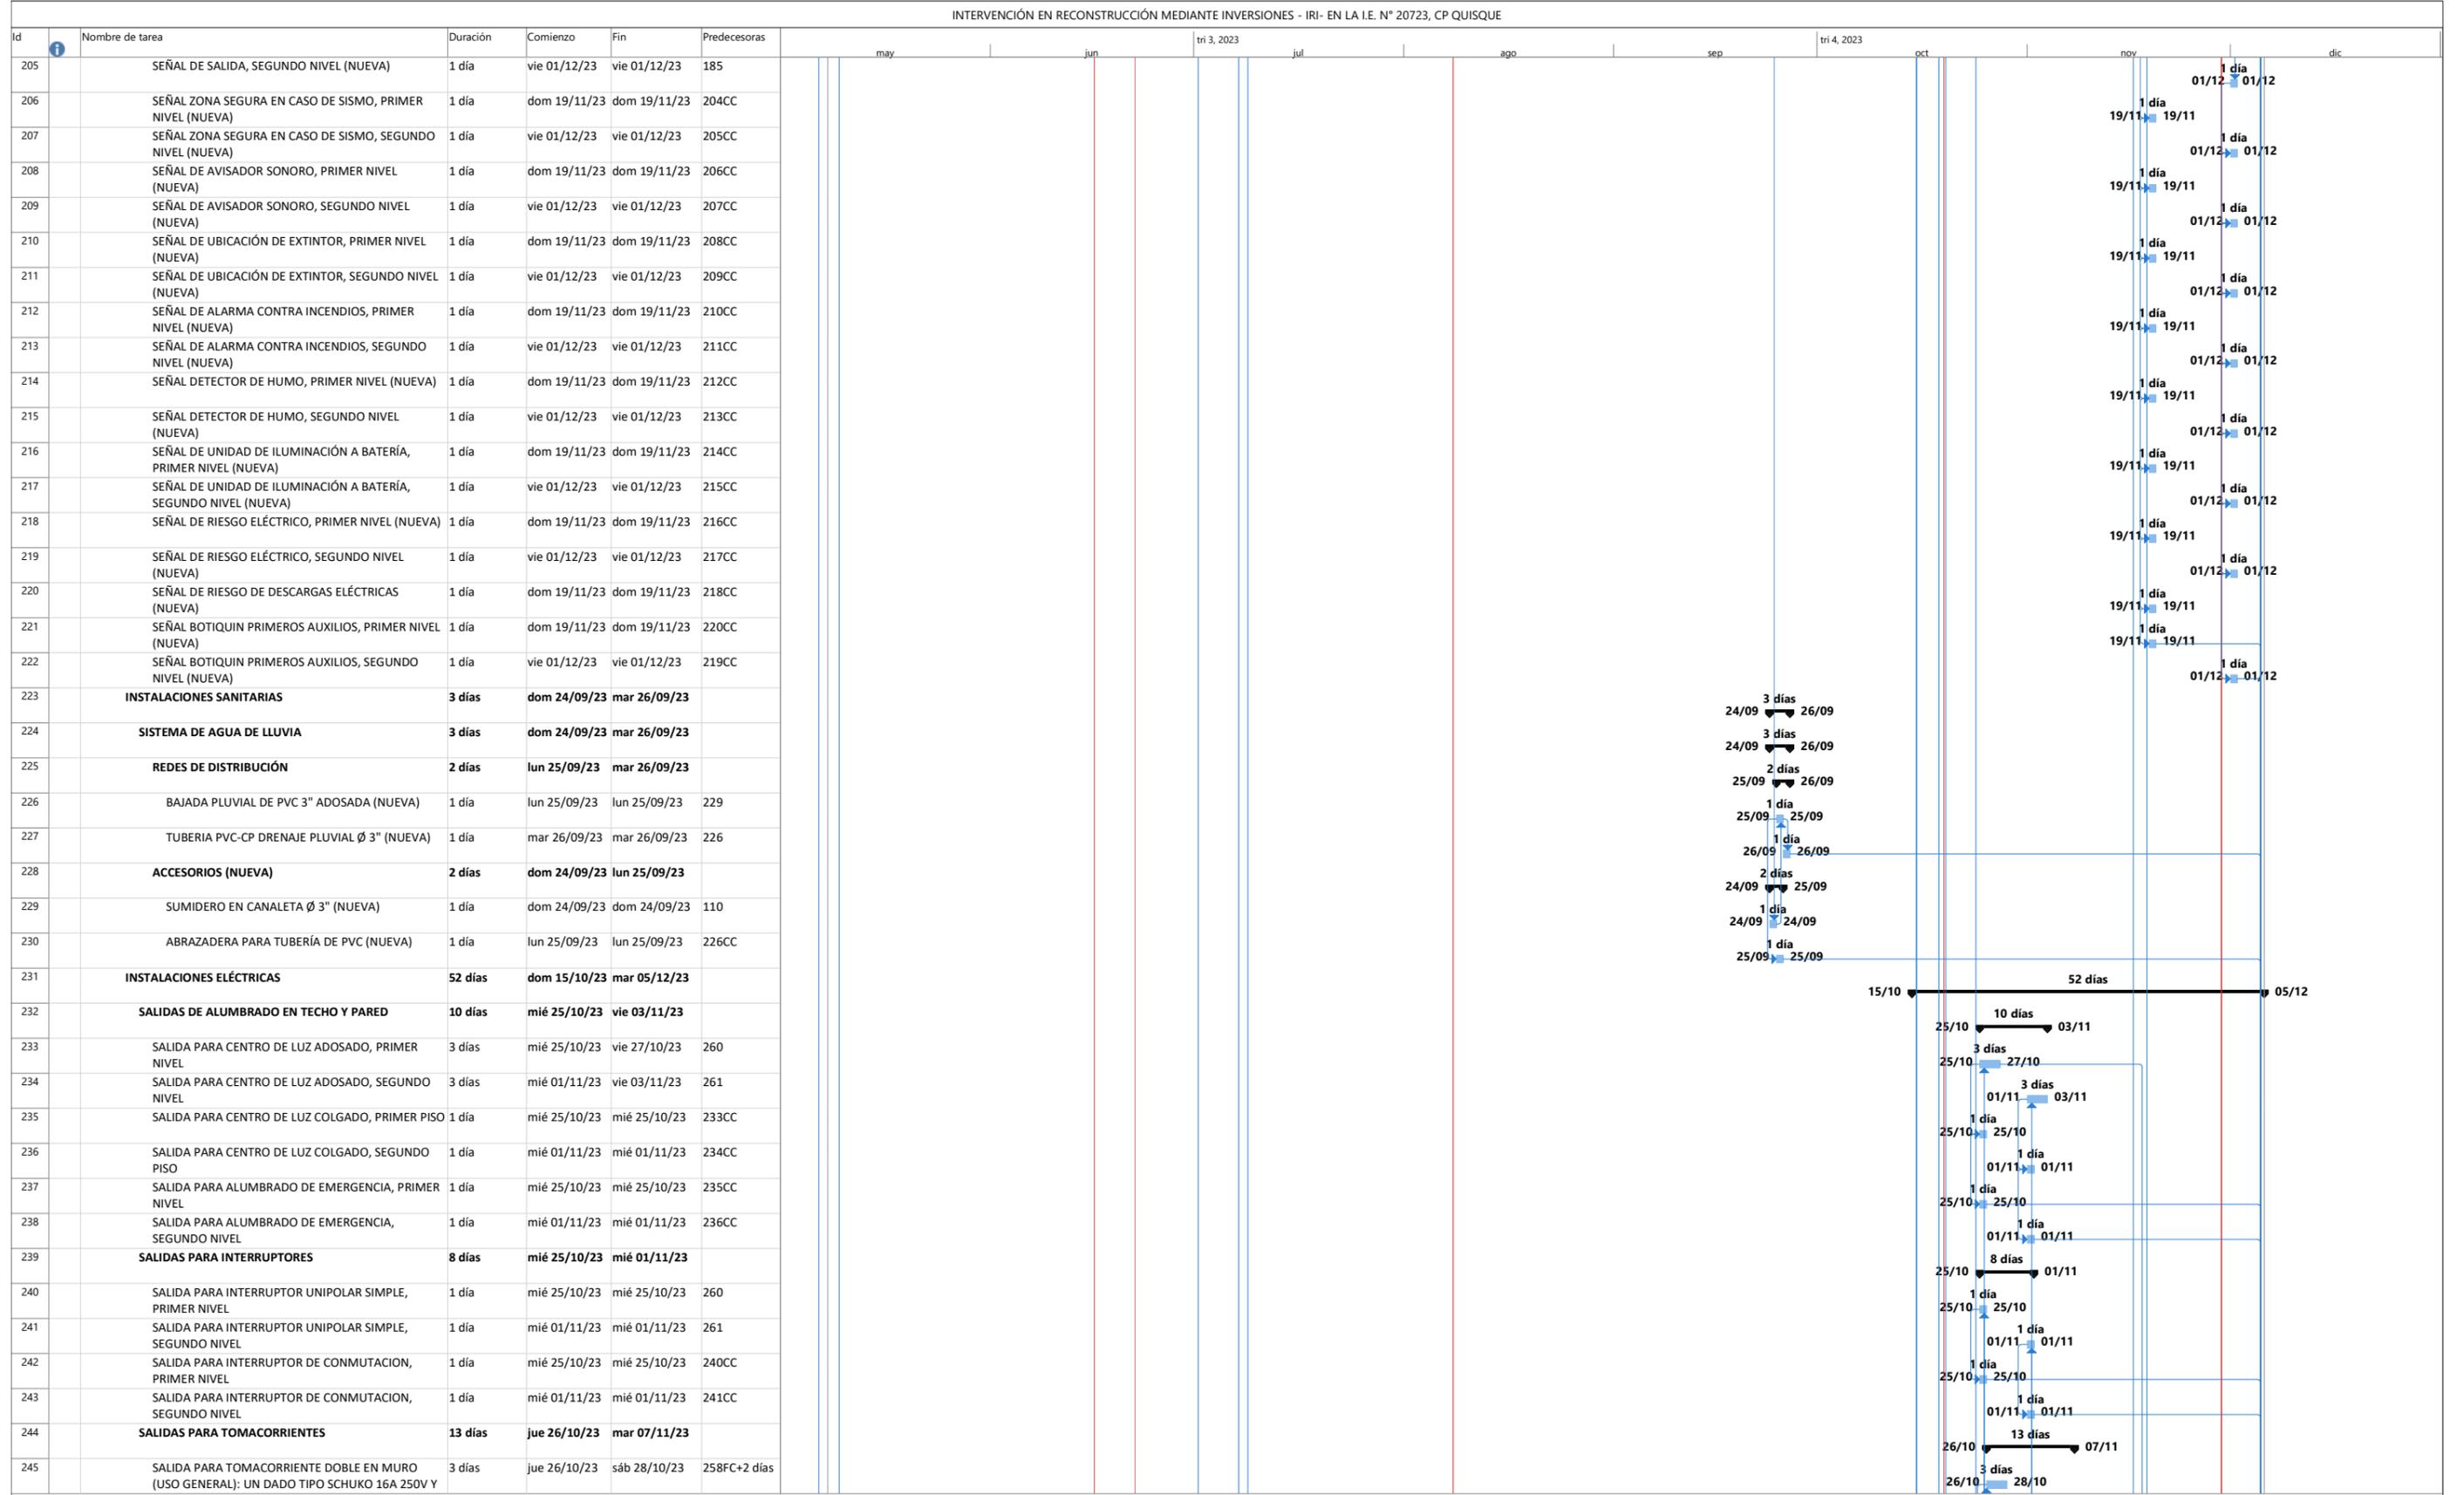

Proyecto: j|||||
 Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	Progreso
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso	Progreso manual
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	

INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

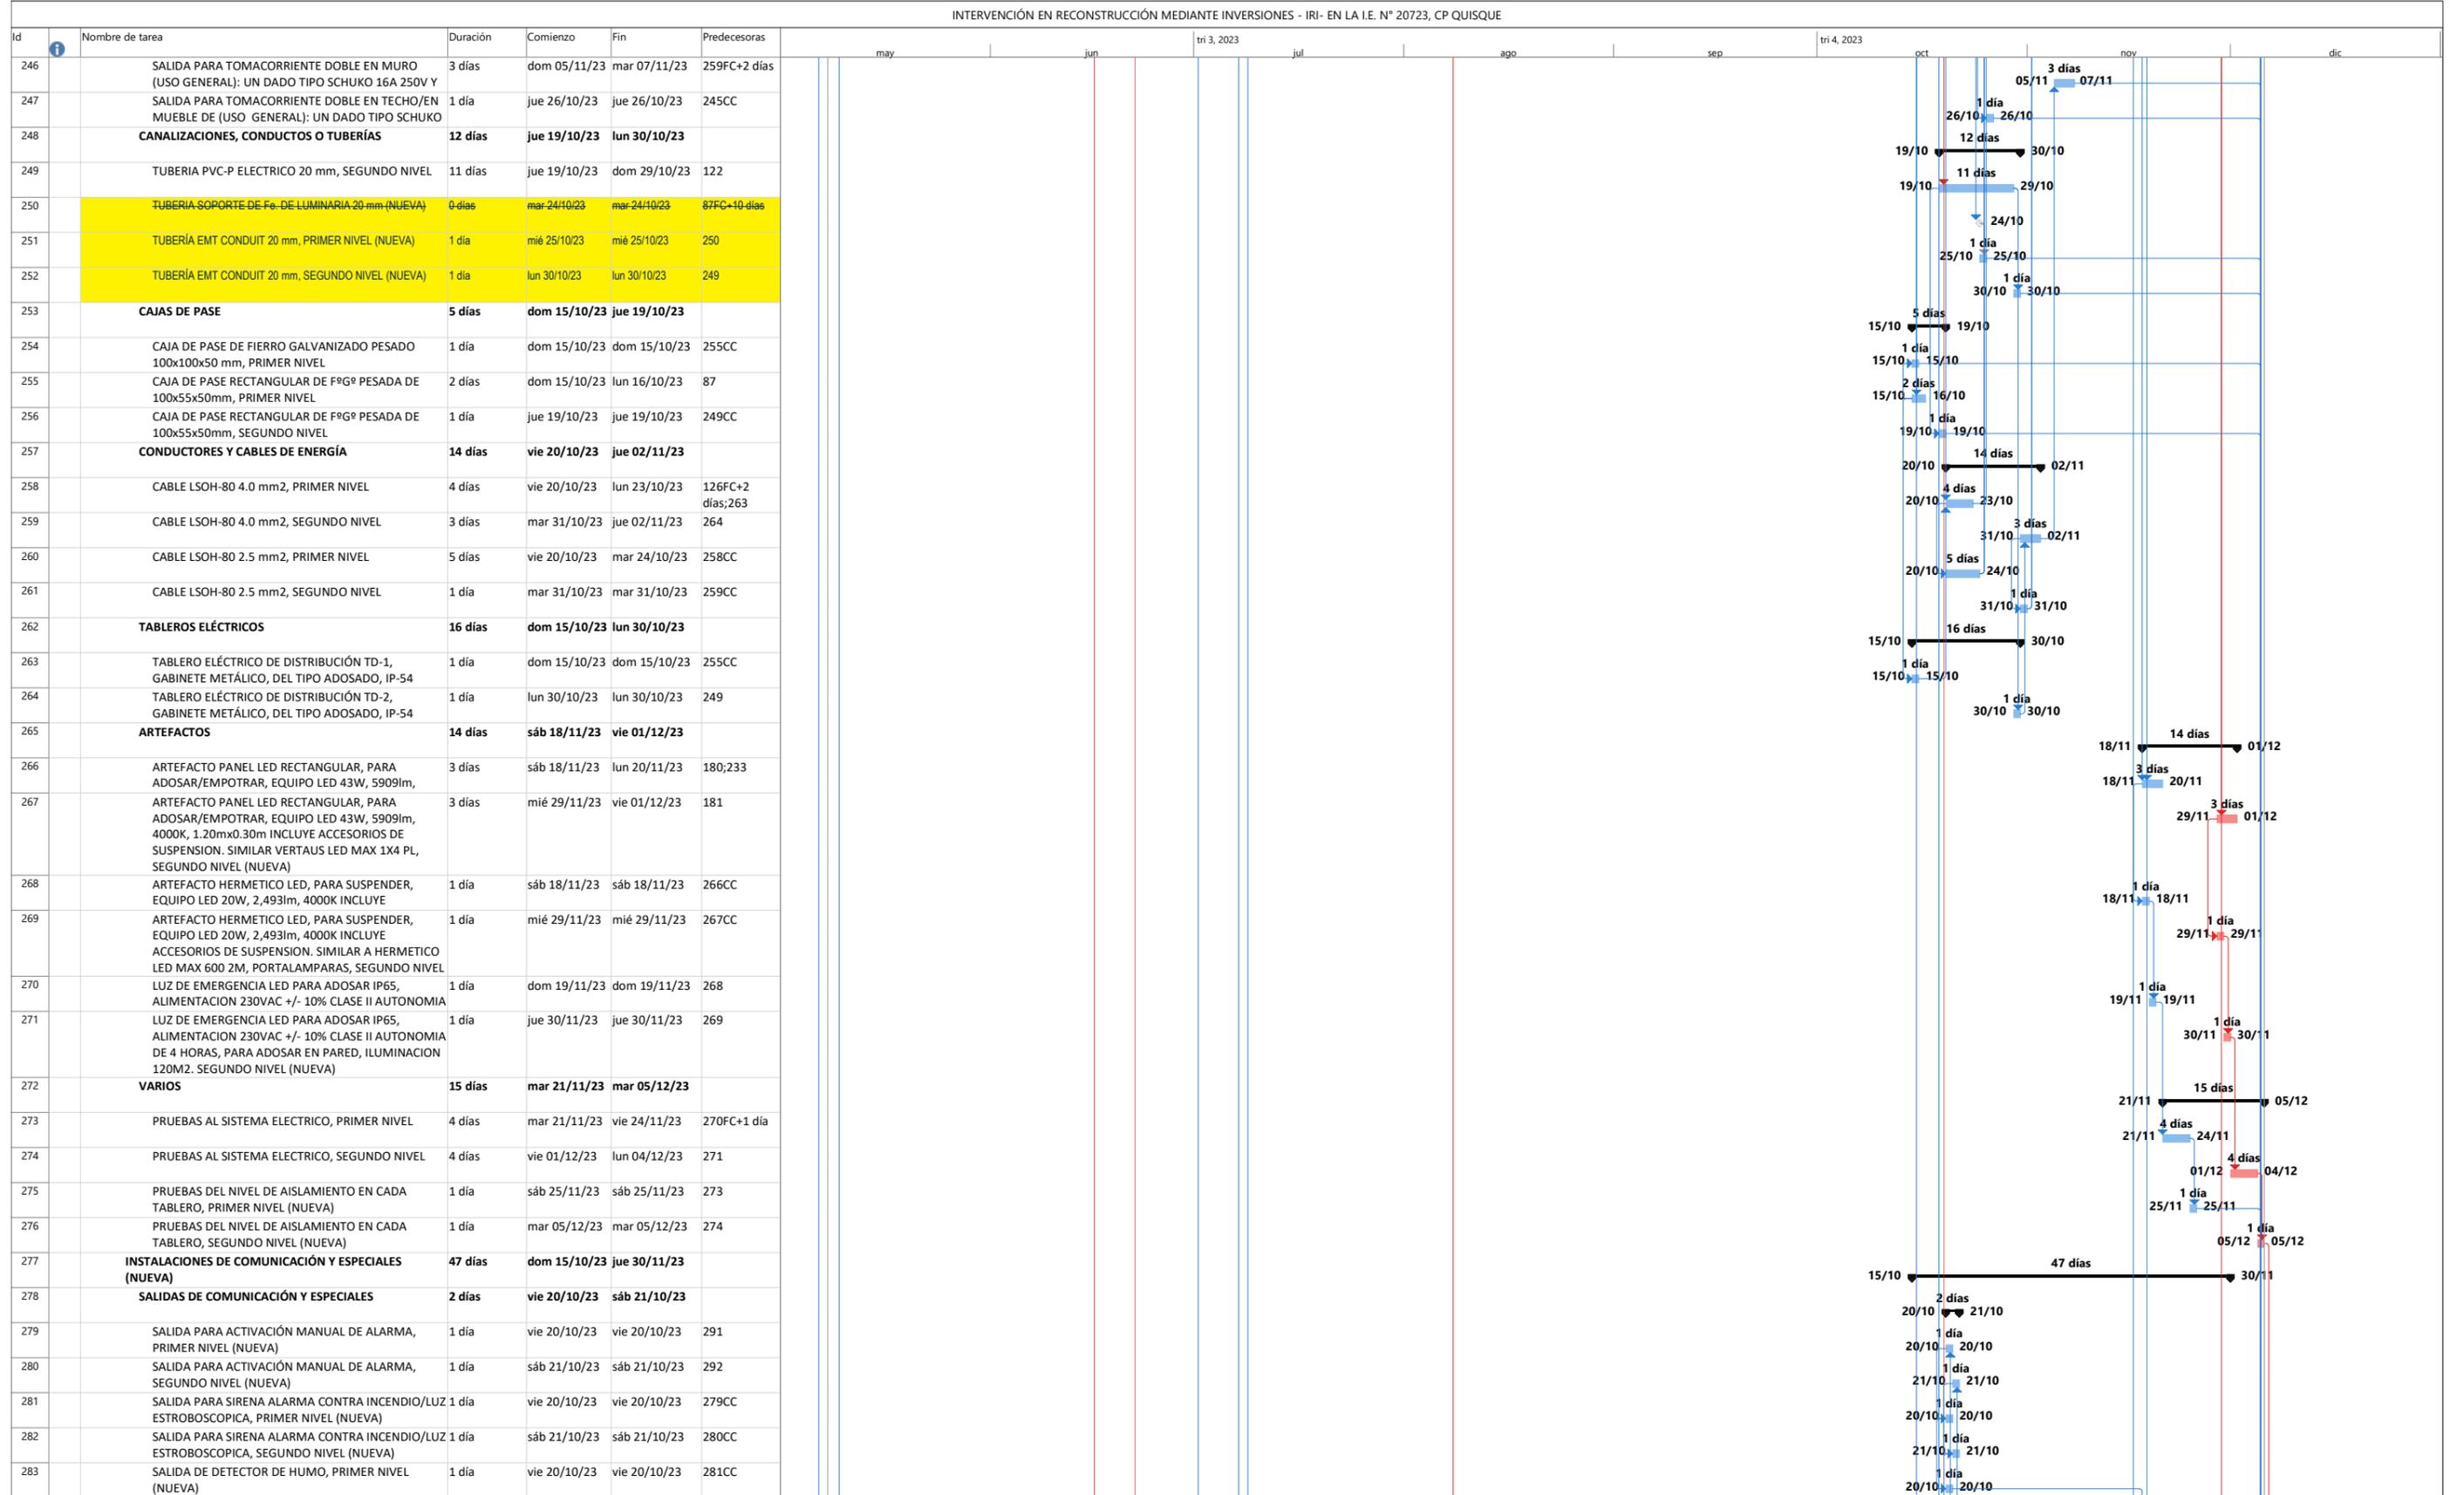

Proyecto: jiji
Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	Progreso
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso	Progreso manual
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE



Proyecto: jujujj
Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

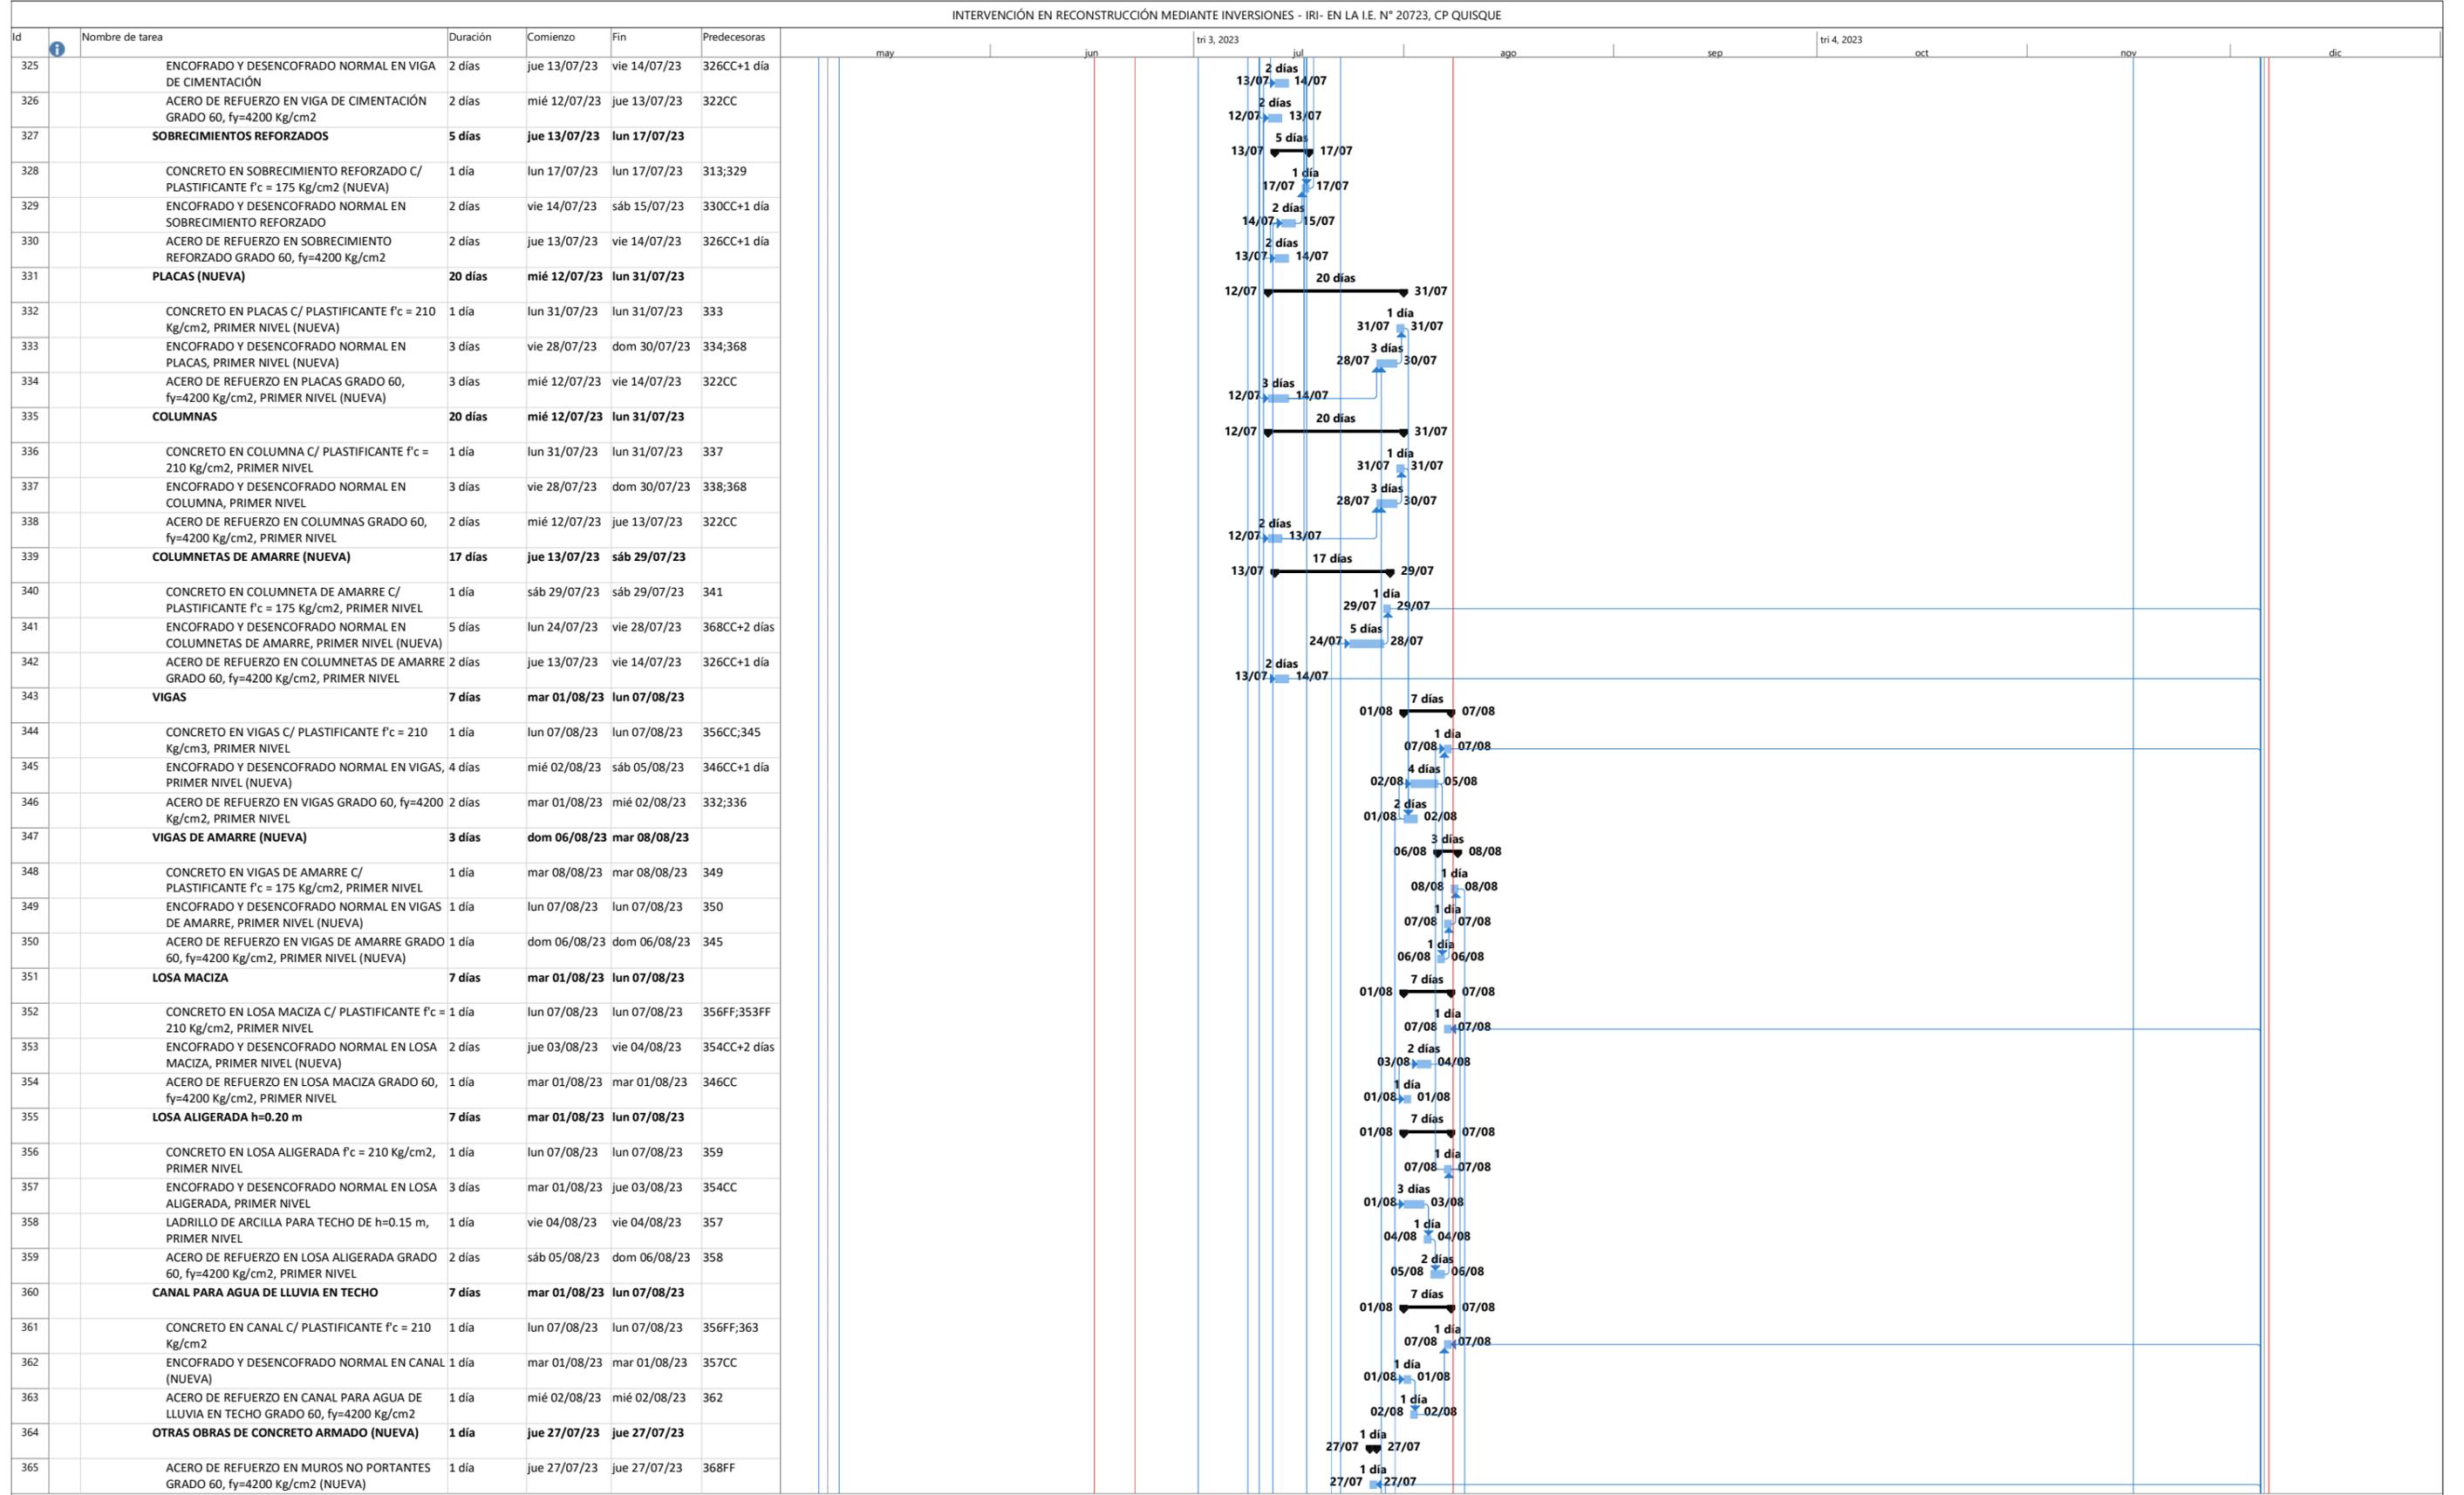

Proyecto: jujuj
 Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual

INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

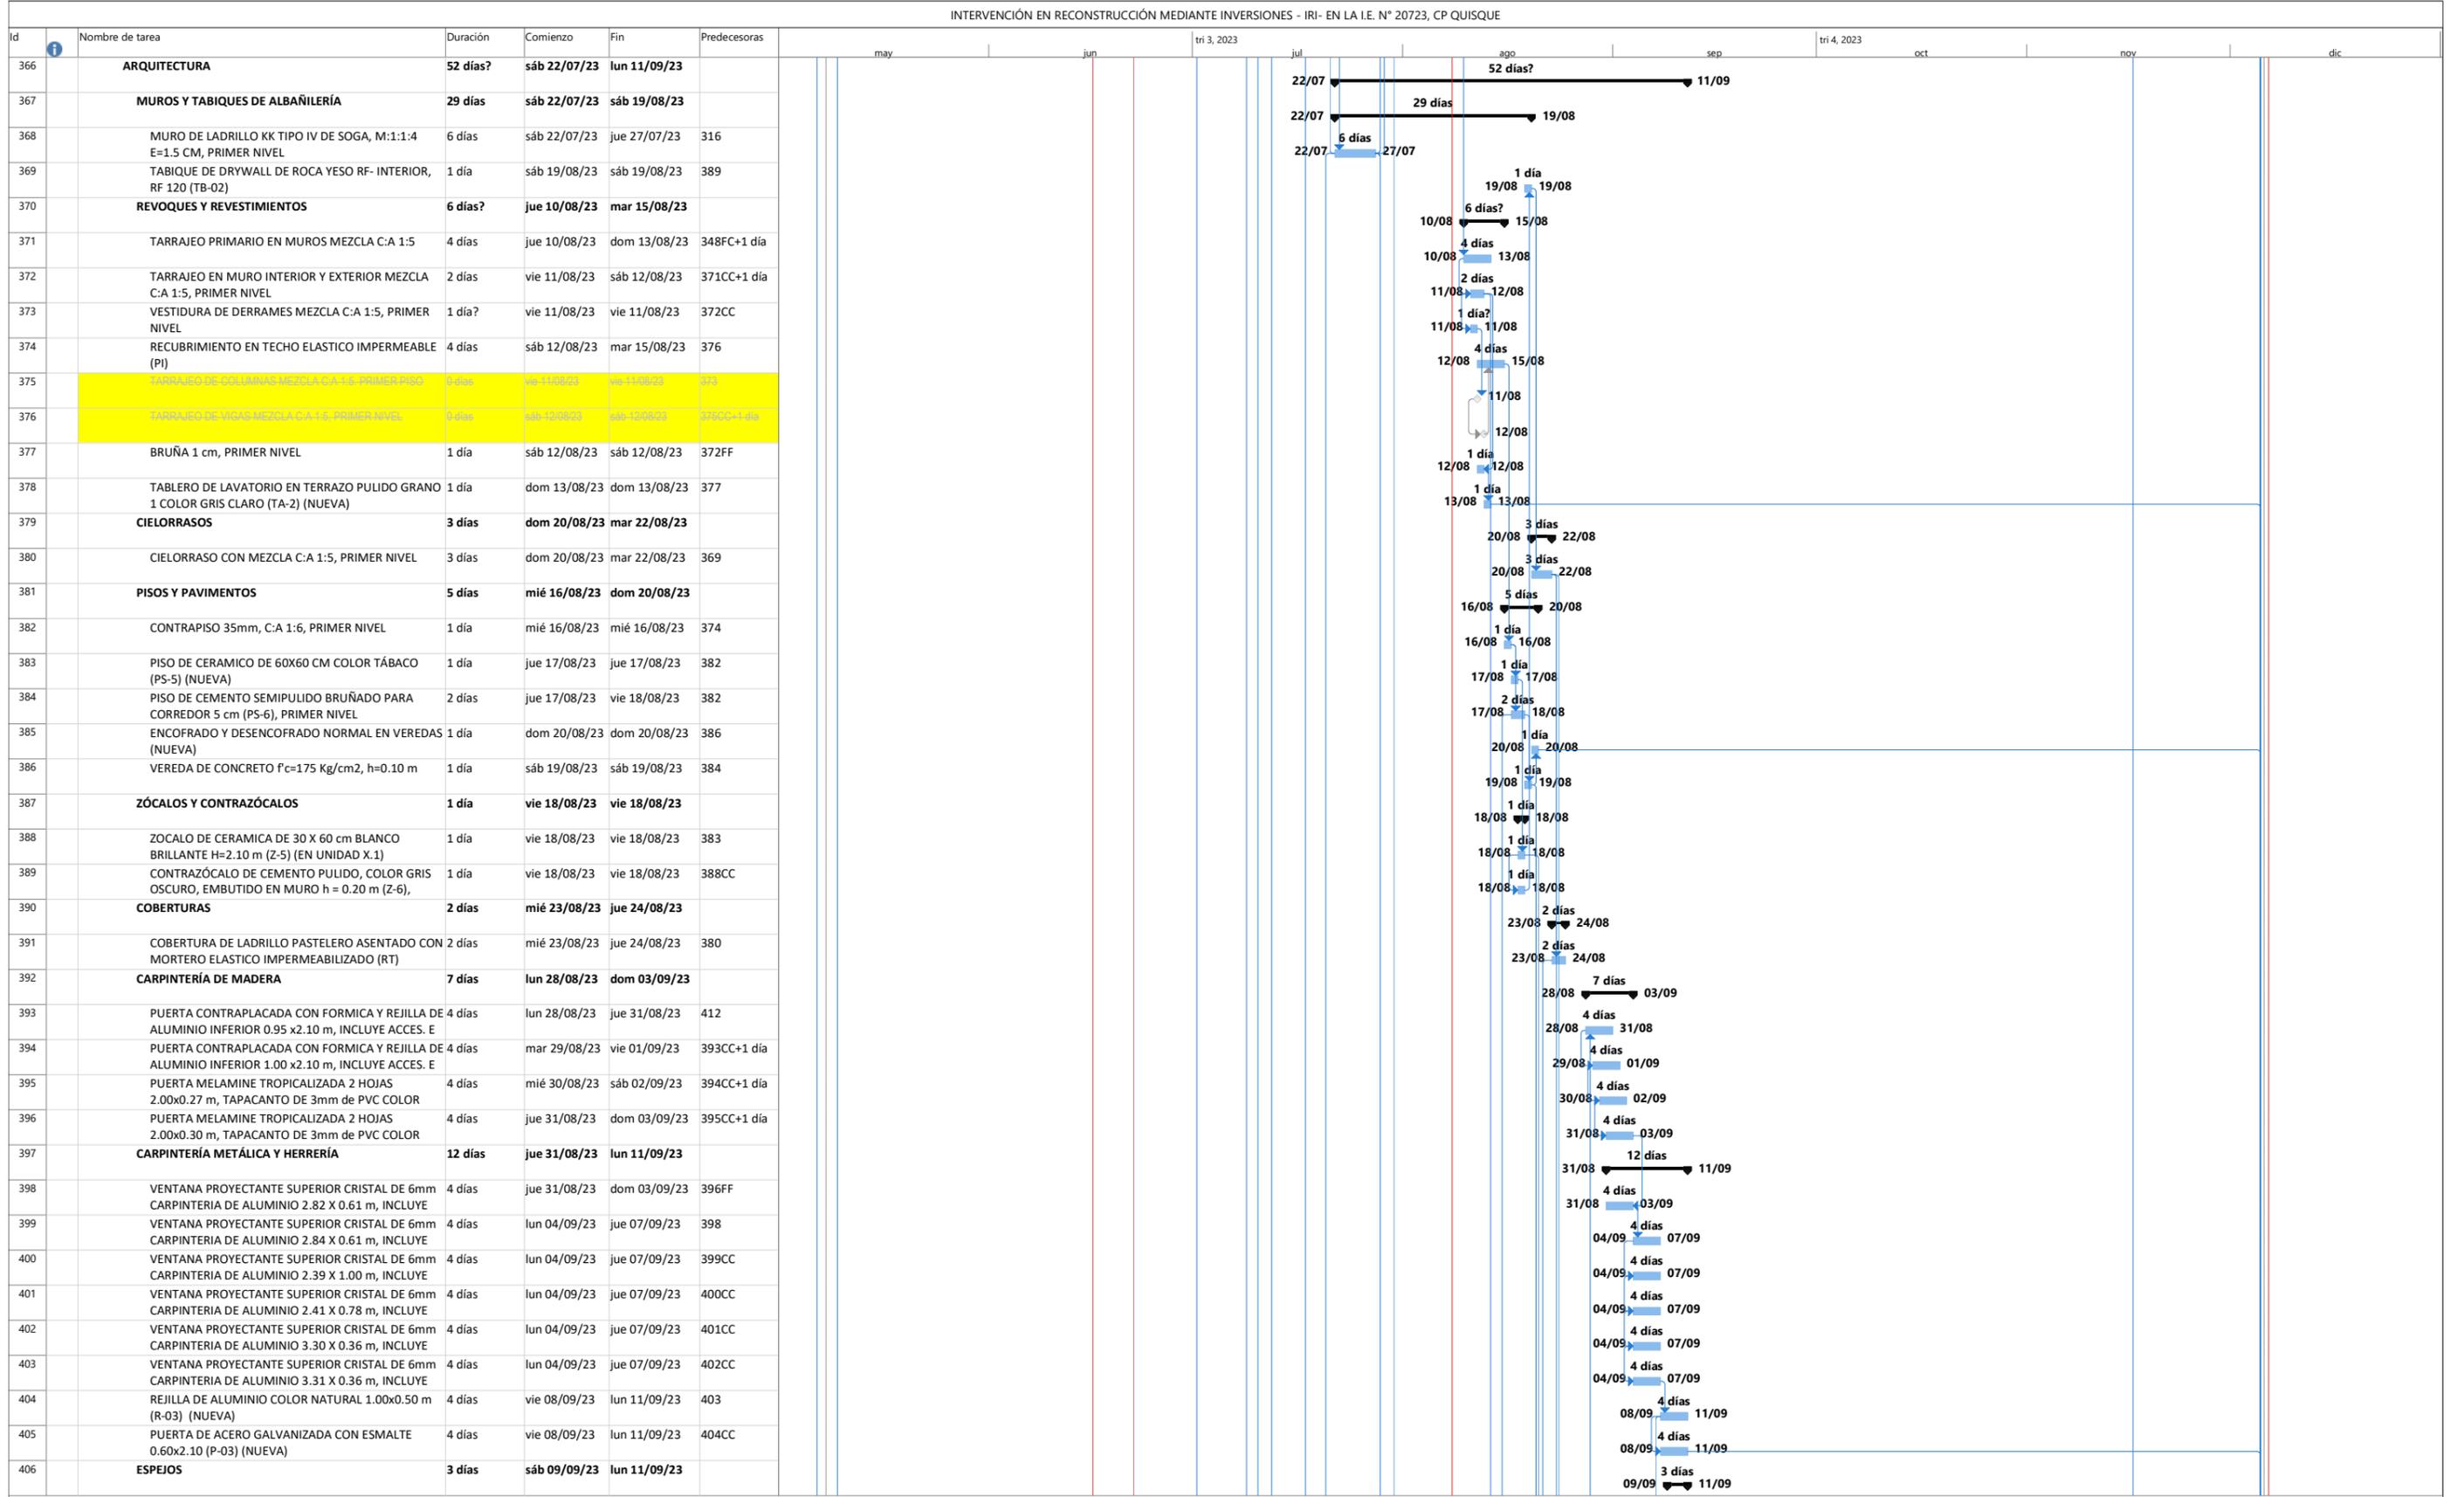

Proyecto: Fecha: mié 19/03/25
 Tarea: Resumen Hito inactivo solo duración solo el comienzo Hito externo División crítica
 División: Resumen del proyecto Resumen inactivo Informe de resumen manual solo fin Fecha limite Progreso
 Hito: Tarea inactiva Tarea manual Resumen manual Tareas externas Tareas críticas Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
407	ESPEJOS DE SSHH	3 días	sáb 09/09/23	lun 11/09/23	404CC+1 día					09/09	11/09		
408	PINTURA	5 días	jue 24/08/23	lun 28/08/23									
409	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1), PRIMER NIVEL	2 días	vie 25/08/23	sáb 26/08/23	410								
410	PINTURA LATEX EN ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO (SD-1), PRIMER NIVEL (NUEVA)	1 día	jue 24/08/23	jue 24/08/23	380FC+1 día								
411	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1), PRIMER NIVEL	2 días	dom 27/08/23	lun 28/08/23	409								
412	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6), PRIMER NIVEL	1 día	dom 27/08/23	dom 27/08/23	411CC								
413	VARIOS	28 días	vie 28/07/23	jue 24/08/23									
414	PROTECCIÓN DE BASE DE TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL h = 1.20 m	2 días	mié 23/08/23	jue 24/08/23	380								
415	JUNTAS VERTICALES, PRIMER NIVEL	9 días	vie 28/07/23	sáb 05/08/23	368								
416	JUNTAS EN TECHOS (NUEVA)	1 día	mié 23/08/23	mié 23/08/23	391CC								
417	JUNTA ASFÁLTICA DE 1" (NUEVA)	1 día	jue 17/08/23	jue 17/08/23	384CC								
418	TAPAJUNTA DE ALUMINIO DE 2mmx30mm (NUEVA)	1 día	vie 18/08/23	vie 18/08/23	417								
419	PLATINA DE 8"X 3/16" PINTADA CON 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y DOS DE ACABADO EN PINTURA	1 día	sáb 19/08/23	sáb 19/08/23	418								
420	SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN	1 día	mar 29/08/23	mar 29/08/23									
421	SEÑAL DE SS.HH. (NUEVA)	1 día	mar 29/08/23	mar 29/08/23	411								
422	SEÑAL ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO, PRIMER NIVEL (NUEVA)	1 día	mar 29/08/23	mar 29/08/23	421CC								
423	SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO, PRIMER NIVEL (NUEVA)	1 día	mar 29/08/23	mar 29/08/23	422CC								
424	INSTALACIONES SANITARIAS	44 días	jue 13/07/23	vie 25/08/23									
425	EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	5 días	lun 21/08/23	vie 25/08/23									
426	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	5 días	lun 21/08/23	vie 25/08/23									
427	INODORO SIFON JET BLANCO O SIMILAR INC. ACCESORIOS (NUEVA)	2 días	lun 21/08/23	mar 22/08/23	388FC+2 días								
428	INODORO LOSA TIPO ONE PICE TREBOLO SIMILAR (NUEVA)	1 día	mié 23/08/23	mié 23/08/23	427								
429	OVALIN DE SOBREPONER, 45x30 cm BLANCO, C/ LLAVE TEMPORIZADA	2 días	mié 23/08/23	jue 24/08/23	428CC								
430	URINARIO LOSA TIPO CADET TREBOL (NUEVA)	1 día	vie 25/08/23	vie 25/08/23	429								
431	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS	1 día	vie 25/08/23	vie 25/08/23									
432	PAPELERA DE LOZA BLANCA	1 día	vie 25/08/23	vie 25/08/23	429								
433	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO (NUEVA)	1 día	vie 25/08/23	vie 25/08/23	432CC								
434	DISPENSADOR AUTOMÁTICO METÁLICO DE PAPEL TOALLA (NUEVA)	1 día	vie 25/08/23	vie 25/08/23	433CC								
435	SISTEMA DE AGUA FRÍA	12 días	mié 19/07/23	dom 30/07/23									
436	SALIDAS DE AGUA FRÍA	2 días	vie 28/07/23	sáb 29/07/23									
437	SALIDA DE AGUA FRÍA - Ø 1/2" PVC-R	2 días	vie 28/07/23	sáb 29/07/23	368;439								
438	REDES DE DISTRIBUCIÓN	12 días	mié 19/07/23	dom 30/07/23									
439	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 1/2" P/INTERIORES	1 día	vie 21/07/23	vie 21/07/23	440								
440	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4" P/INTERIORES	1 día	jue 20/07/23	jue 20/07/23	441								
441	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø1" P/INTERIORES	1 día	mié 19/07/23	mié 19/07/23	443CC								
442	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 1 1/2" P/INTERIORES (NUEVA)	1 día	mié 19/07/23	mié 19/07/23	308CC								
443	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 1 1/4" P/INTERIORES (NUEVA)	1 día	mié 19/07/23	mié 19/07/23	442CC								
444	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA	1 día	dom 30/07/23	dom 30/07/23	437FF+1 día;446;448;44								
445	VÁLVULAS Y LLAVES	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23									
446	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 3/4"	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	437CC								
447	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 1" (NUEVA)	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	446CC								

Proyecto: jujujj
 Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

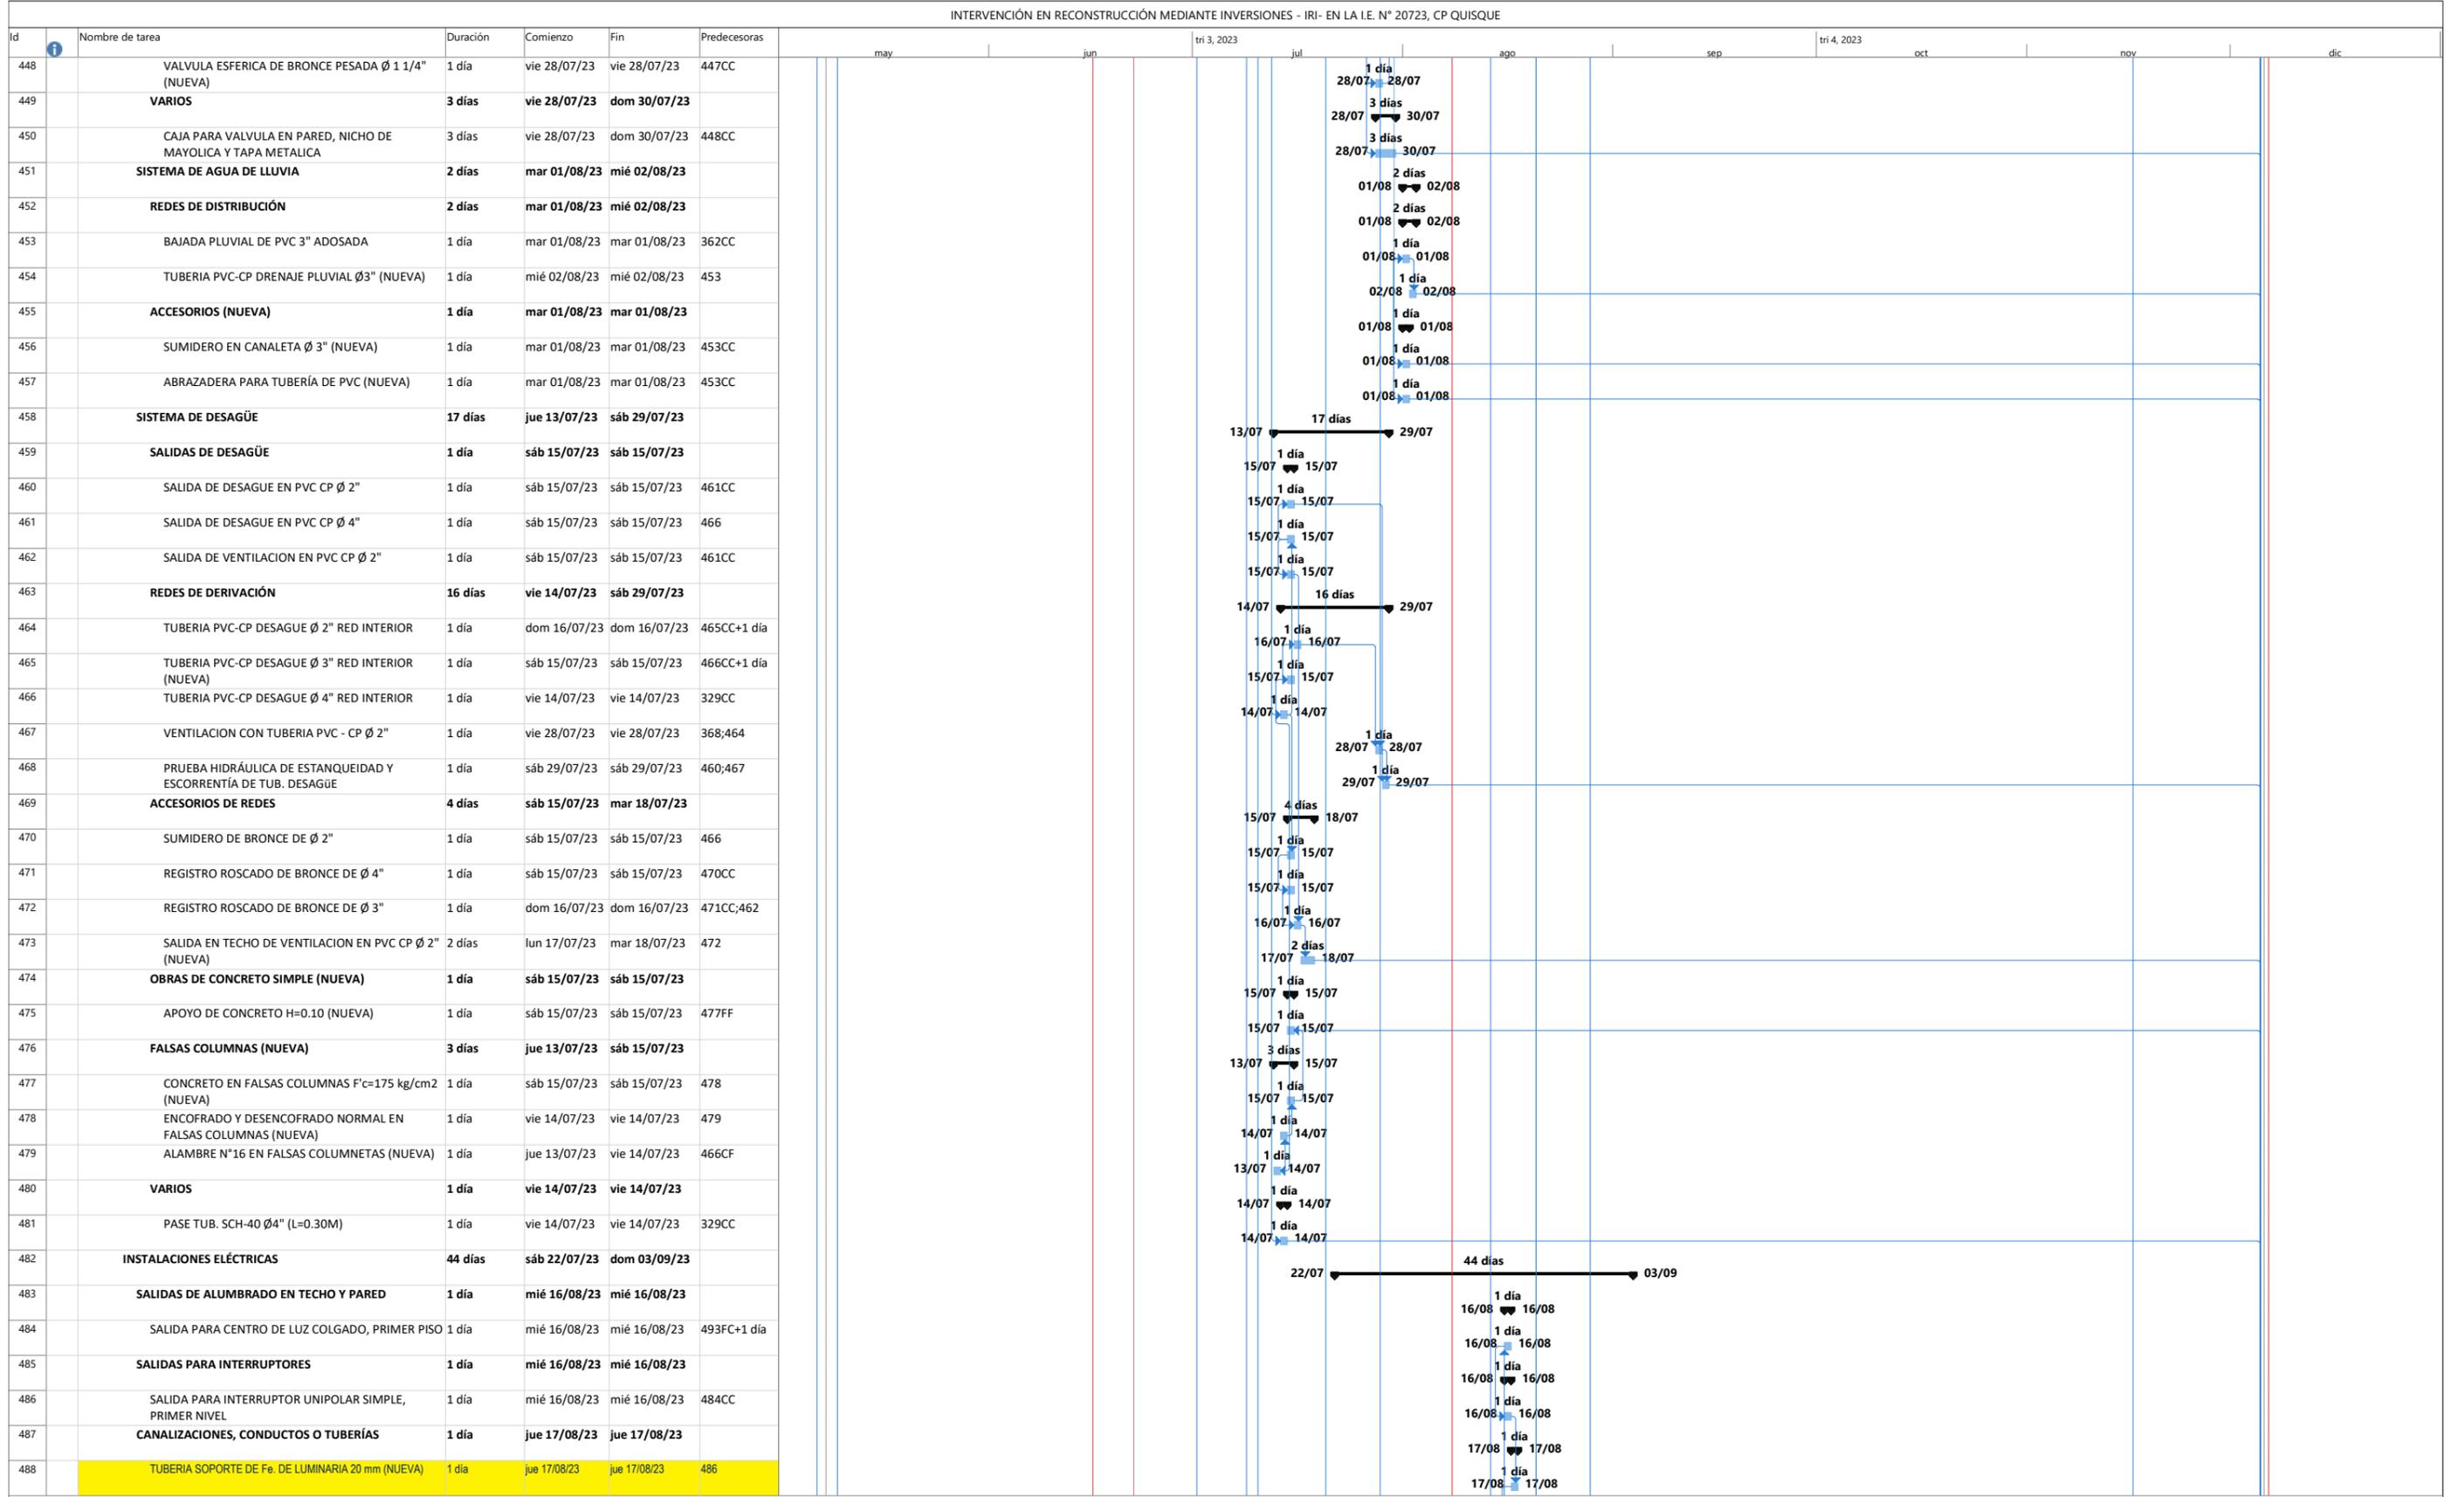

Proyecto: j|||||
 Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

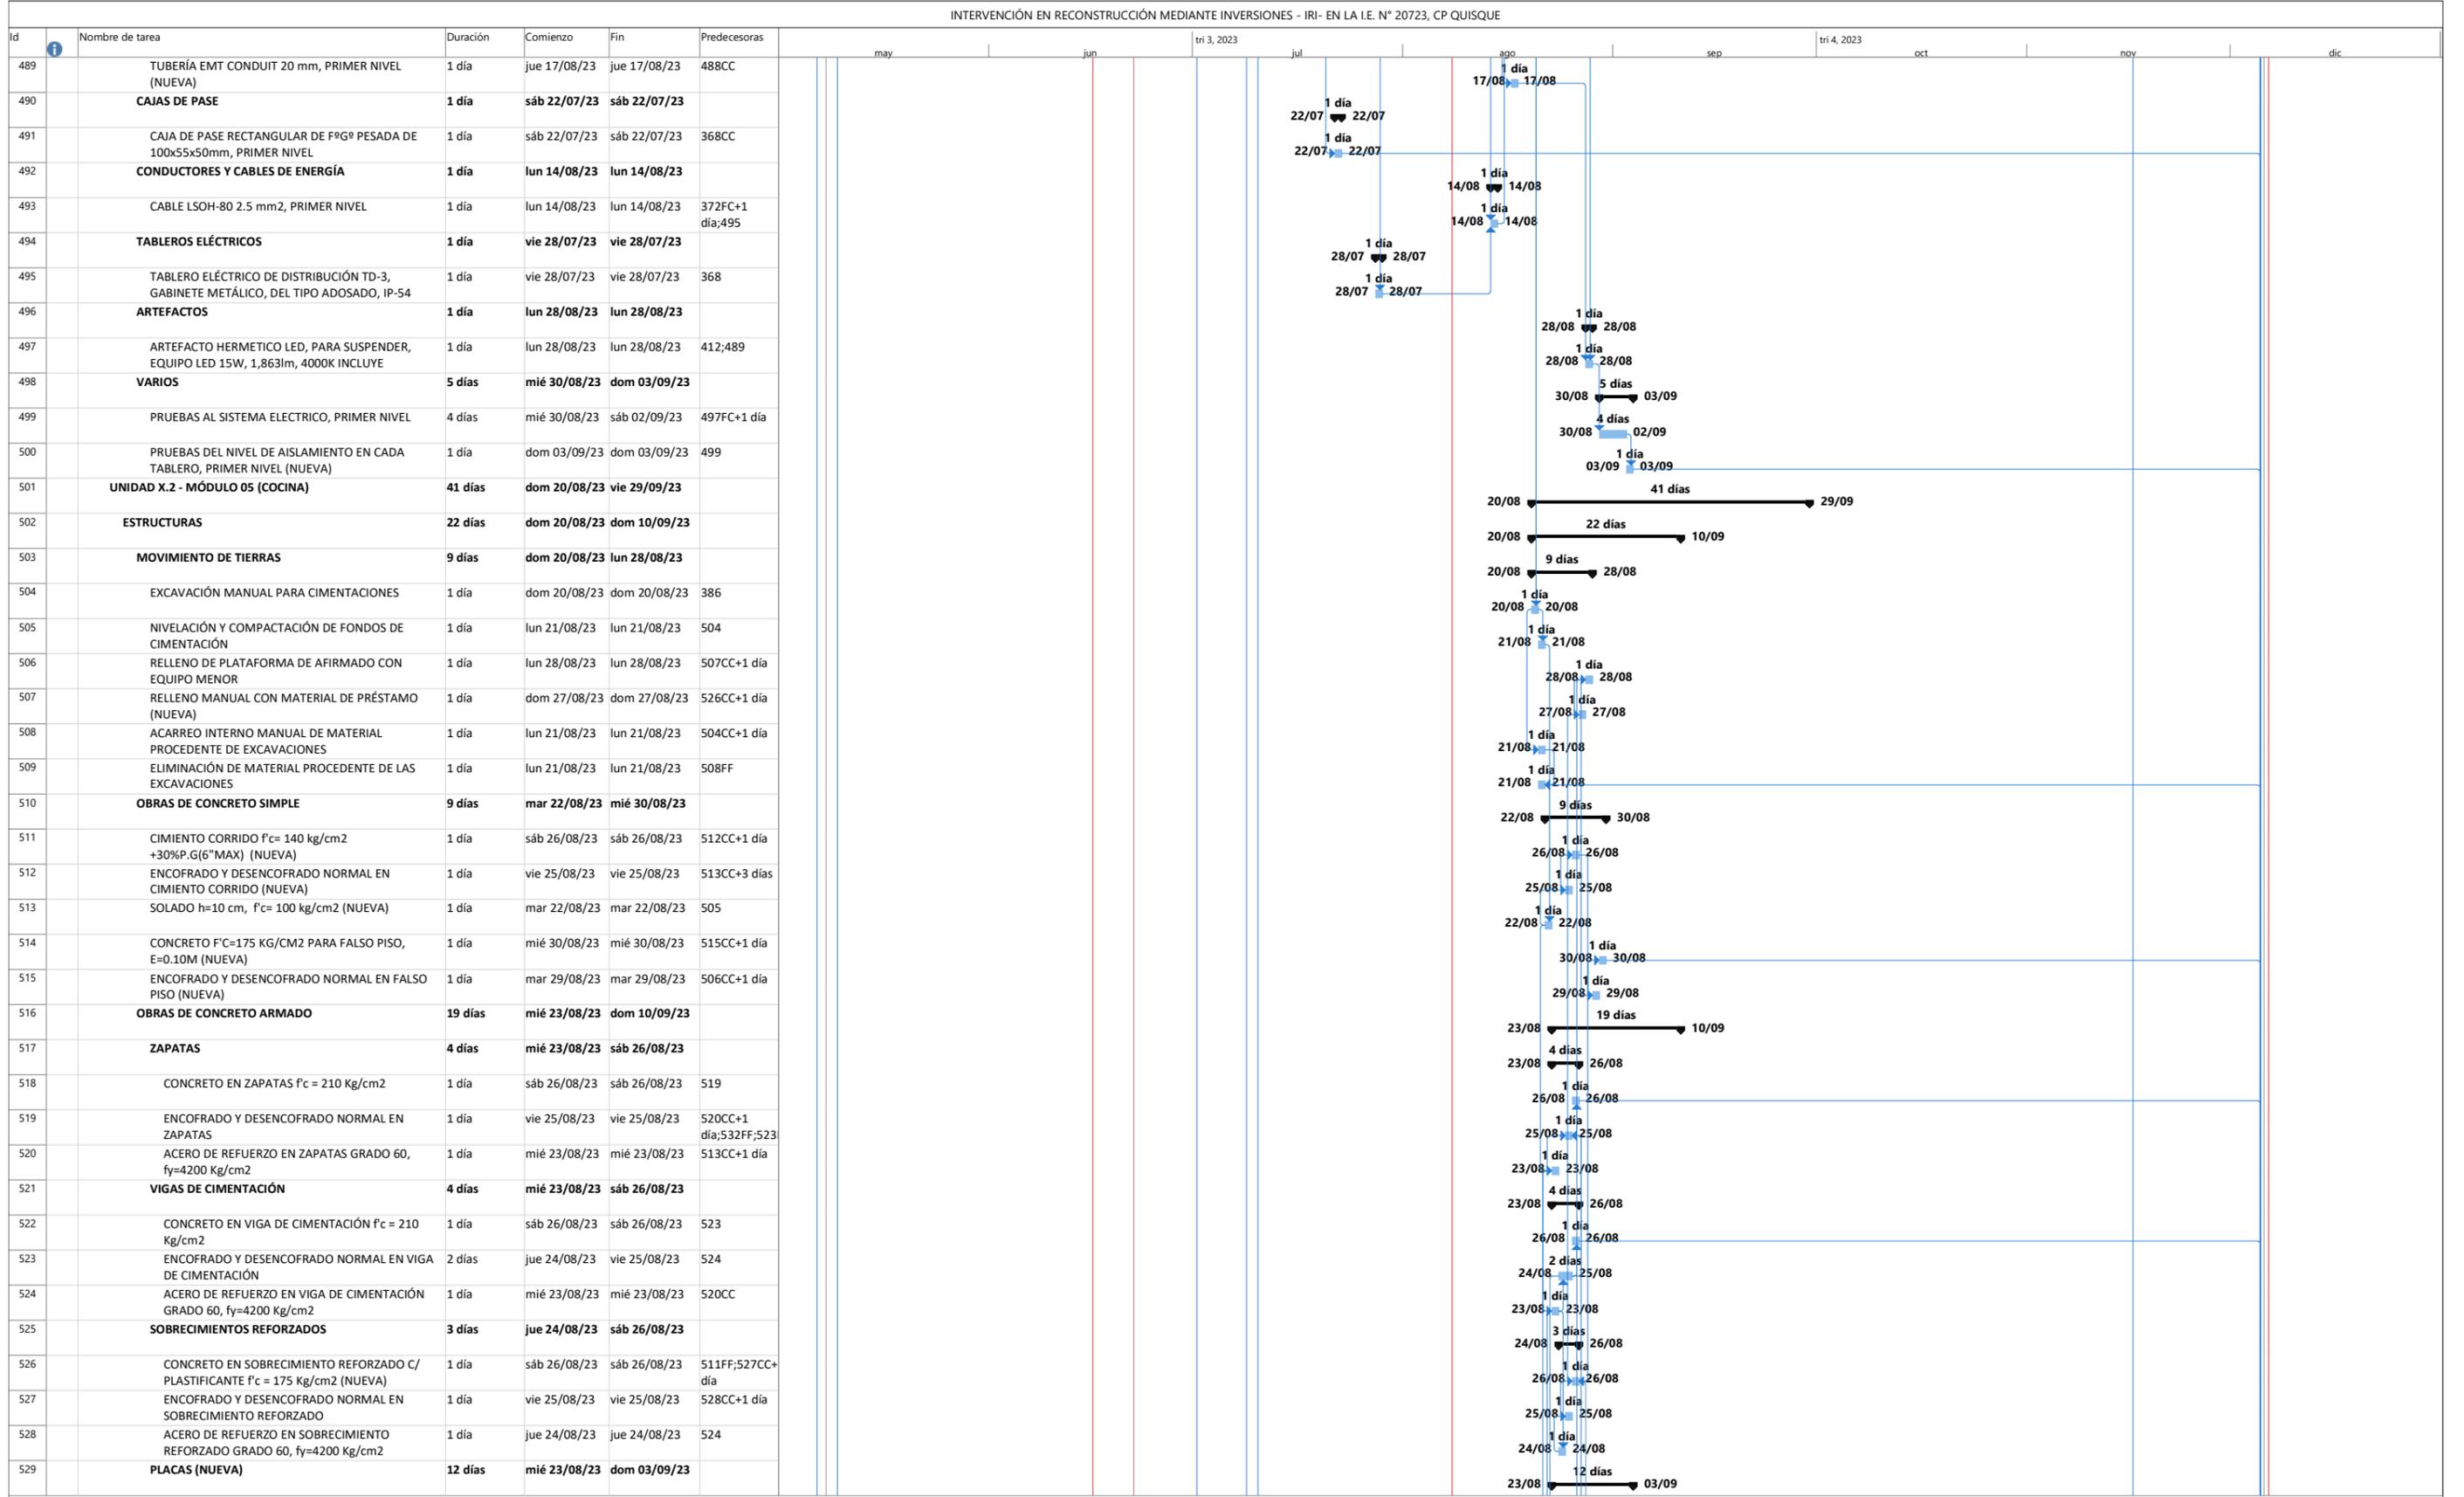

Proyecto: j|||||
 Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

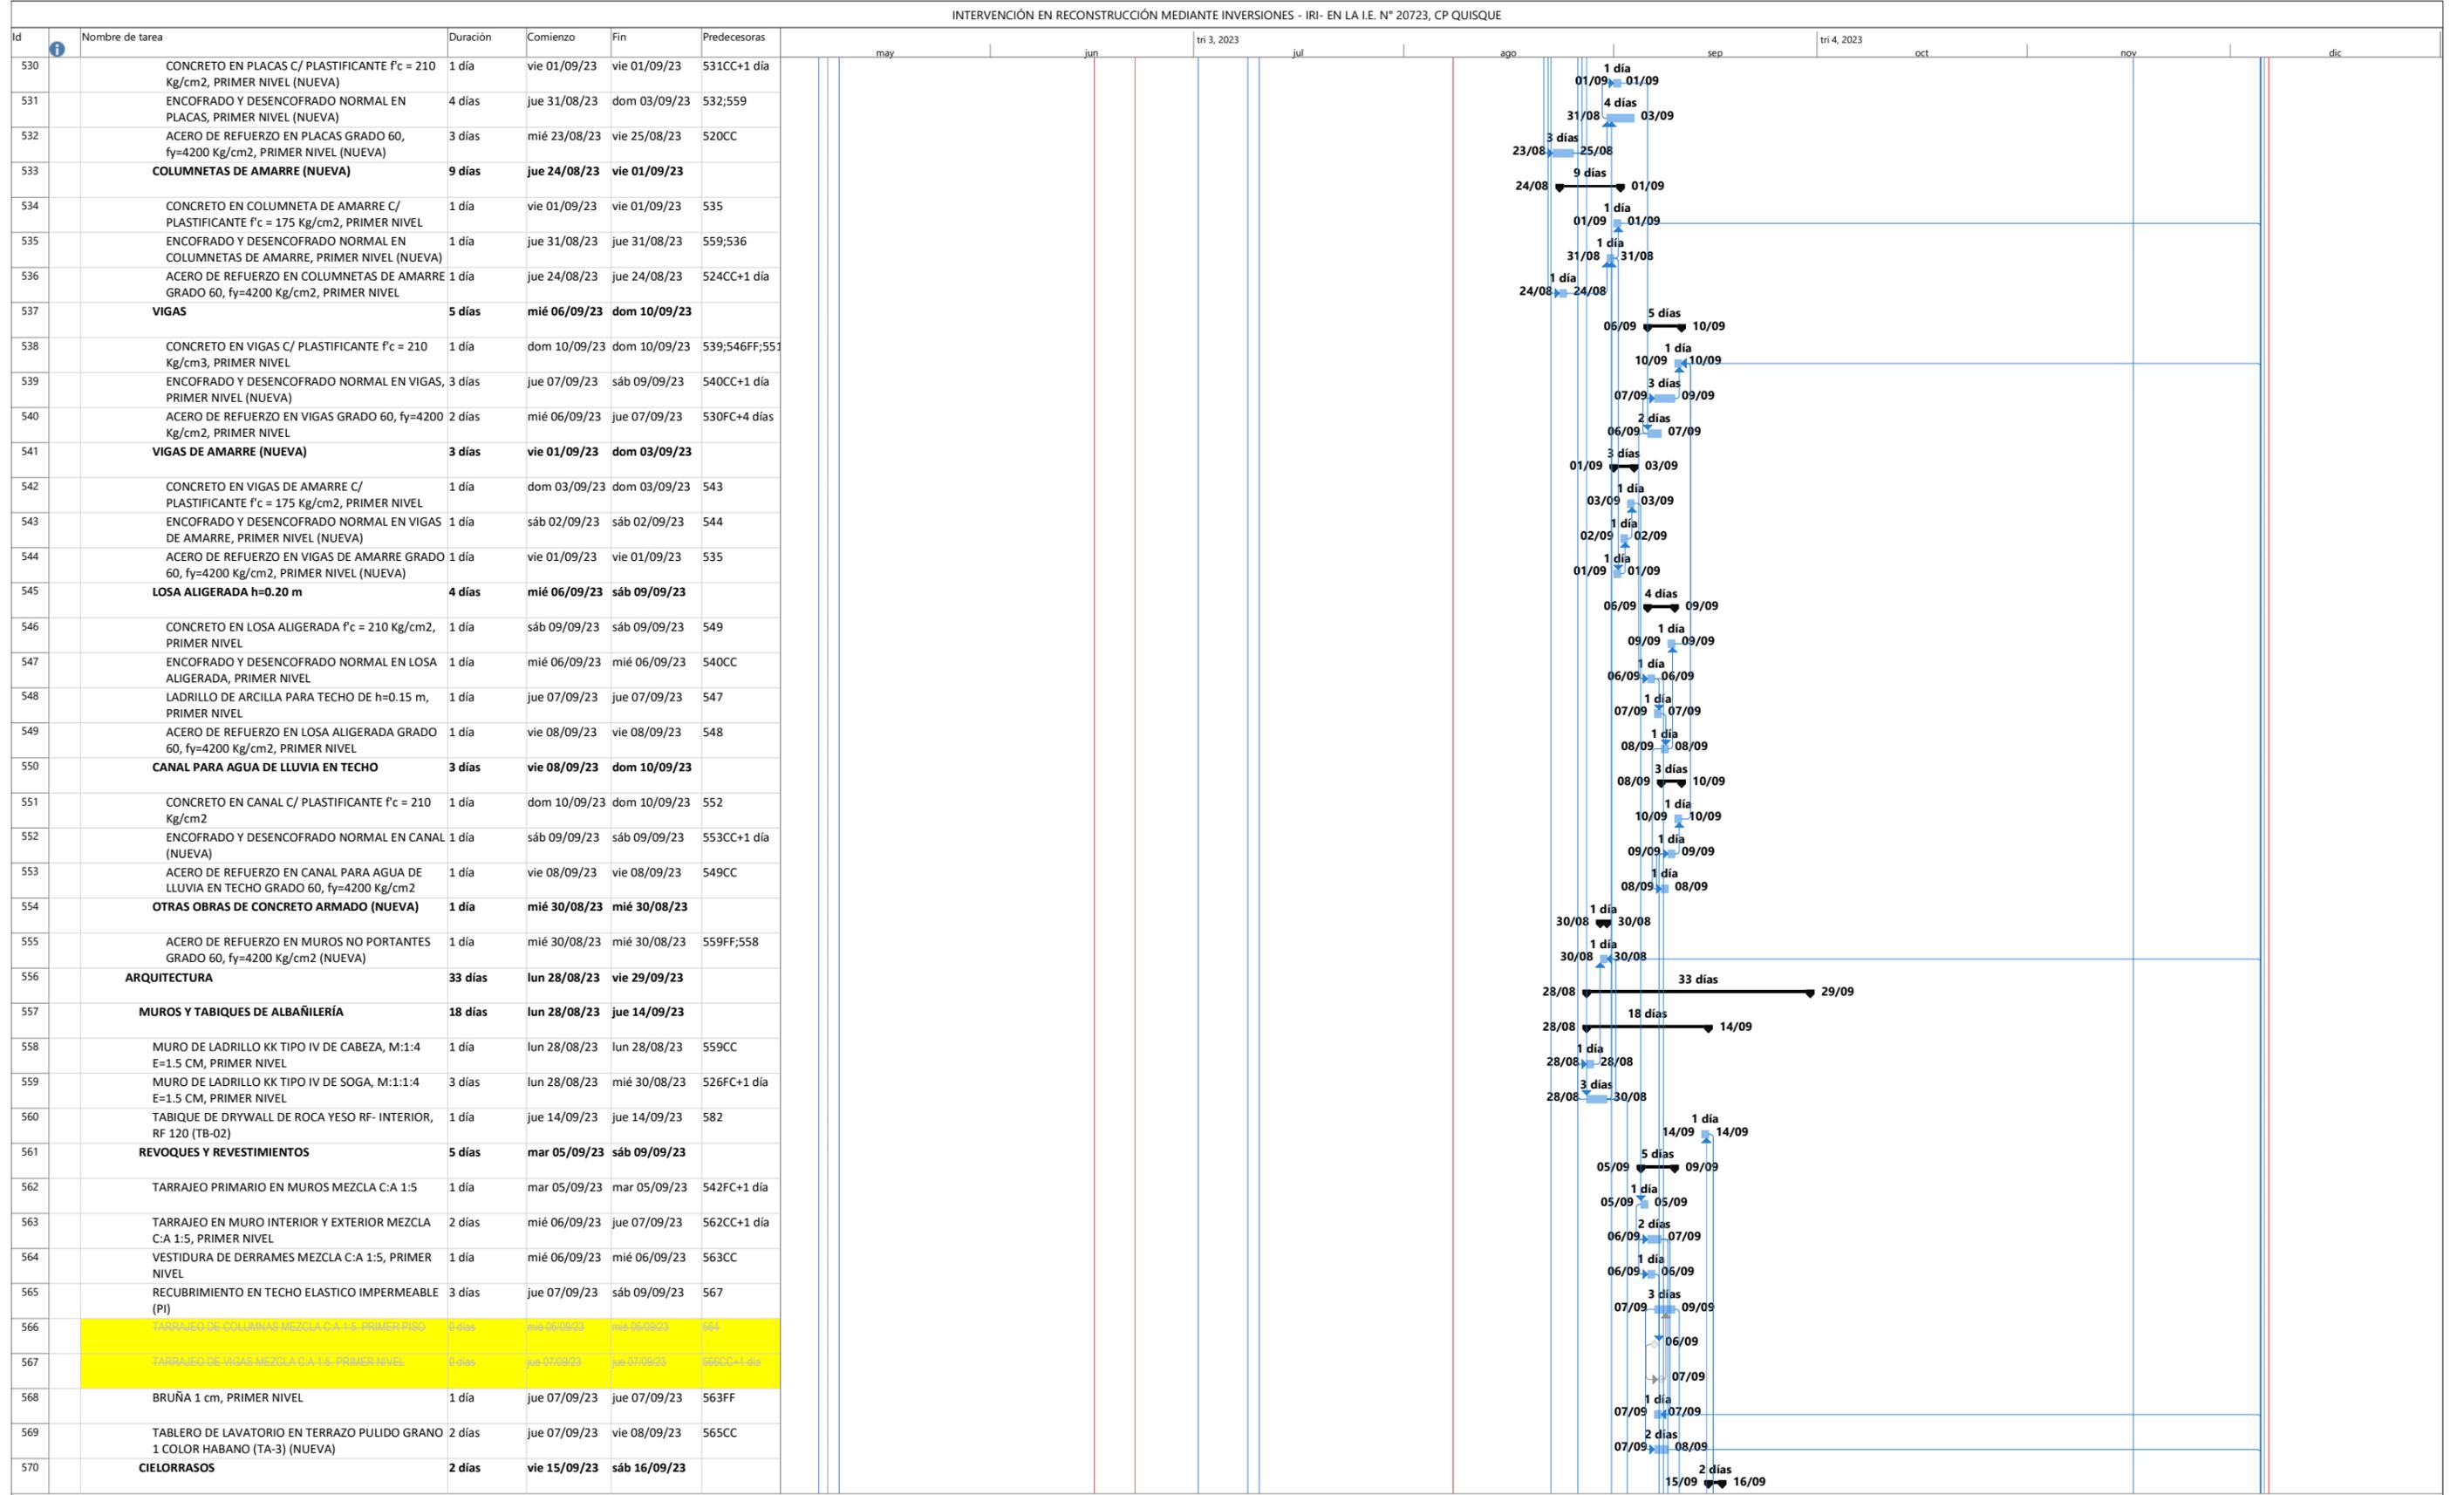

Proyecto: j|||||
 Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may	jun	tri 3, 2023	jul	ago	sep	tri 4, 2023	oct	nov	dic
571	CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5, PRIMER NIVEL (EN UNIDAD X.2)	2 días	vie 15/09/23	sáb 16/09/23	560						15/09				
572	PISOS Y PAVIMENTOS	4 días	dom 10/09/23	mié 13/09/23							10/09				
573	CONTRAPISO 35mm, C:A 1:6, PRIMER NIVEL	1 día	dom 10/09/23	dom 10/09/23	565						10/09				
574	BALDOSA VENECIANA DE 30x30cm e=1.5cm GRANO 23 - COLOR VERDE CLARO (PS-04) (NUEVA)	1 día	mar 12/09/23	mar 12/09/23	575						12/09				
575	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA CORREDOR 5 cm (PS-6), PRIMER NIVEL	1 día	lun 11/09/23	lun 11/09/23	573						11/09				
576	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-6), PRIMER NIVEL	1 día	lun 11/09/23	lun 11/09/23	575CC						11/09				
577	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS (NUEVA)	1 día	mar 12/09/23	mar 12/09/23	576						12/09				
578	VEREDA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2, h=0.10 m	1 día	mié 13/09/23	mié 13/09/23	577						13/09				
579	ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS	2 días	mié 13/09/23	jue 14/09/23							13/09				
580	CONTRAZÓCALO DE BALDOSA VENECIANA DE 10x30cm e=1.5cm GRANO 23 - COLOR VERDE CLARO, ZOCALO DE CERAMICO DE 30 x 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-5)	1 día	mié 13/09/23	mié 13/09/23	574						13/09				
581	CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6),	1 día	mié 13/09/23	mié 13/09/23	581CC						13/09				
582	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE R =5CM. (NUEVA)	2 días	mié 13/09/23	jue 14/09/23	582CC						13/09				
583	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE R =5CM. (NUEVA)	2 días	mié 13/09/23	jue 14/09/23	582CC						13/09				
584	COBERTURAS	1 día	dom 17/09/23	dom 17/09/23							17/09				
585	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO (RT)	1 día	dom 17/09/23	dom 17/09/23	571						17/09				
586	CARPINTERÍA DE MADERA	8 días	lun 18/09/23	lun 25/09/23							18/09				
587	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.97x2.10 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-01) (NUEVA)	4 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23	603						18/09				
588	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.78x2.10 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-06) (NUEVA)	4 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23	587CC						18/09				
589	MUEBLE ALTO DE COCINA DE MELAMINE DE 18mm, SECCIÓN 35 cm x 60 cm, INCLUYE ACCES. E	2 días	vie 22/09/23	sáb 23/09/23	588						22/09				
590	MUEBLE BAJO DE COCINA Y LAVATORIOS DE MELAMINE DE 18mm, SECCIÓN 58cm x 70 cm,	4 días	vie 22/09/23	lun 25/09/23	589CC						22/09				
591	CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA	12 días	lun 18/09/23	vie 29/09/23							18/09				
592	VENTANA CORREDIZA DE 3 PAÑOS, CRISTAL DE 6mm, CARPINTERÍA DE ALUMINIO 1.225x0.61 m, INCLUYE	4 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23	588CC						18/09				
593	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.60 X 1.00 m, INCLUYE	4 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23	592CC						18/09				
594	VENTANA CORREDIZA DE 2 PAÑOS, CRISTAL DE 6mm CARPINTERÍA DE ALUMINIO 1.20x1.00 m (V-19)	4 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23	593CC						18/09				
595	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 1.225x0.70 m (R-02) (NUEVA)	4 días	vie 22/09/23	lun 25/09/23	594						22/09				
596	REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.48x0.61 m (R-04) (NUEVA)	4 días	vie 22/09/23	lun 25/09/23	595CC						22/09				
597	REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.50x0.61 m (R-05) (NUEVA)	4 días	vie 22/09/23	lun 25/09/23	596CC						22/09				
598	PUERTA CON REJILLA DE ALUMINIO CON ESMALTE 0.60X0.80 (P-10) (NUEVA)	4 días	mar 26/09/23	vie 29/09/23	597						26/09				
599	PINTURA	3 días	dom 17/09/23	mar 19/09/23							17/09				
600	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1), PRIMER NIVEL	1 día	mar 19/09/23	mar 19/09/23	601						19/09				
601	PINTURA LATEX EN ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO (SD-1), PRIMER NIVEL (NUEVA)	1 día	lun 18/09/23	lun 18/09/23	571FC+1 día						18/09				
602	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1), PRIMER NIVEL	1 día	lun 18/09/23	lun 18/09/23	601CC						18/09				
603	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6), PRIMER NIVEL	1 día	dom 17/09/23	dom 17/09/23	571						17/09				
604	VARIOS	16 días	jue 31/08/23	vie 15/09/23							31/08				
605	PROTECCIÓN DE BASE DE TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL h = 1.20 m	1 día	vie 15/09/23	vie 15/09/23	571CC						15/09				
606	JUNTAS VERTICALES, PRIMER NIVEL	5 días	jue 31/08/23	lun 04/09/23	559						31/08				
607	JUNTA ASFÁLTICA DE 1" (NUEVA)	1 día	lun 11/09/23	lun 11/09/23	576CC						11/09				
608	PLATINA DE ALUMINIO DE 2"x 1/8" (NUEVA)	1 día	lun 11/09/23	lun 11/09/23	607CC						11/09				
609	SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN (NUEVA)	1 día	mar 19/09/23	mar 19/09/23							19/09				
610	SEÑAL DE SALIDA, PRIMER NIVEL (NUEVA)	1 día	mar 19/09/23	mar 19/09/23	602						19/09				

Proyecto: Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	Progreso
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso	Progreso manual
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	Progreso manual

INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
652	CÁMARAS DE INSPECCIÓN	1 día	sáb 26/08/23	sáb 26/08/23									
653	CAJA DE TRAMPA DE GRASAS DE 0.30x0.55m (NUEVA)	1 día	sáb 26/08/23	sáb 26/08/23	642								
654	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE (NUEVA)	1 día	sáb 26/08/23	sáb 26/08/23									
655	APOYO DE CONCRETO H=0.20 (NUEVA)	1 día	sáb 26/08/23	sáb 26/08/23	653CC								
656	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10 días	mié 06/09/23	vie 15/09/23									
657	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED	1 día	lun 11/09/23	lun 11/09/23									
658	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO, PRIMER PISO	1 día	lun 11/09/23	lun 11/09/23	661CC								
659	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA, PRIMER NIVEL	1 día	lun 11/09/23	lun 11/09/23	658CC								
660	SALIDAS PARA INTERRUPTORES	1 día	lun 11/09/23	lun 11/09/23									
661	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE, PRIMER NIVEL	1 día	lun 11/09/23	lun 11/09/23	674FC+1 día								
662	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES	1 día	mar 12/09/23	mar 12/09/23									
663	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y	1 día	mar 12/09/23	mar 12/09/23	673FC+2 días								
664	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO	1 día	mar 12/09/23	mar 12/09/23	663CC								
665	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS	1 día	dom 10/09/23	dom 10/09/23									
666	TUBERÍA SOPORTE DE Fc. DE LUMINARIA 20 mm (NUEVA)	0 días	sáb 09/09/23	sáb 09/09/23	674								
667	TUBERÍA EMT CONDUIT 20 mm, PRIMER NIVEL (NUEVA)	1 día	dom 10/09/23	dom 10/09/23	666								
668	TUBERÍA FLEX (NUEVA)	1 día	dom 10/09/23	dom 10/09/23	667CC								
669	CAJAS DE PASE	1 día	mié 06/09/23	mié 06/09/23									
670	CAJA DE PASE RECTANGULAR DE FºGº PESADA DE 100x55x50mm, PRIMER NIVEL	1 día	mié 06/09/23	mié 06/09/23	547FF								
671	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x55 mm (NUEVA)	1 día	mié 06/09/23	mié 06/09/23	670CC								
672	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA	1 día	sáb 09/09/23	sáb 09/09/23									
673	CABLE LSOH-80 4.0 mm2, PRIMER NIVEL	1 día	sáb 09/09/23	sáb 09/09/23	563FC+1 día;671								
674	CABLE LSOH-80 2.5 mm2, PRIMER NIVEL	1 día	sáb 09/09/23	sáb 09/09/23	673CC								
675	ARTEFACTOS	1 día	mar 12/09/23	mar 12/09/23									
676	ARTEFACTO HERMETICO LED, PARA SUSPENDER, EQUIPO LED 34W, 4,498lm, 4000K INCLUYE	1 día	mar 12/09/23	mar 12/09/23	658								
677	ARTEFACTO HERMETICO LED, PARA SUSPENDER, EQUIPO LED 20W, 2,493lm, 4000K INCLUYE	1 día	mar 12/09/23	mar 12/09/23	676CC								
678	LUZ DE EMERGENCIA LED PARA ADOSAR IP65, ALIMENTACION 230VAC +/- 10% CLASE II AUTONOMIA	1 día	mar 12/09/23	mar 12/09/23	677CC								
679	VARIOS	3 días	mié 13/09/23	vie 15/09/23									
680	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO, PRIMER NIVEL	3 días	mié 13/09/23	vie 15/09/23	678;689								
681	INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES (NUEVA)	10 días	dom 03/09/23	mar 12/09/23									
682	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES	1 día	lun 11/09/23	lun 11/09/23									
683	SALIDA DE DETECTOR DE TEMPERATURA (NUEVA)	1 día	lun 11/09/23	lun 11/09/23	661CC;685								
684	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA	1 día	lun 04/09/23	lun 04/09/23									
685	CABLE FLP 4X18AWG LSOH, PRIMER NIVEL (NUEVA)	1 día	lun 04/09/23	lun 04/09/23	687								
686	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS	1 día	dom 03/09/23	dom 03/09/23									
687	TUBERÍA PVC-P ELECTRICO 25 mm, PRIMER NIVEL	1 día	dom 03/09/23	dom 03/09/23	559FC+3 días								
688	ARTEFACTOS	1 día	mar 12/09/23	mar 12/09/23									
689	DETECTOR DE TEMPERATURA (INTELIGENTE) (NUEVA)	1 día	mar 12/09/23	mar 12/09/23	683								
690	INSTALACIONES DE GAS (NUEVA)	7 días	sáb 09/09/23	vie 15/09/23									
691	INSTALACIÓN DE GLP (NUEVA)	1 día	mié 13/09/23	mié 13/09/23									
692	CILINDRO DE GLP 10 KG CON VALVULA PARA REGULADOR PREMIUN (NUEVA)	1 día	mié 13/09/23	mié 13/09/23	703FF								

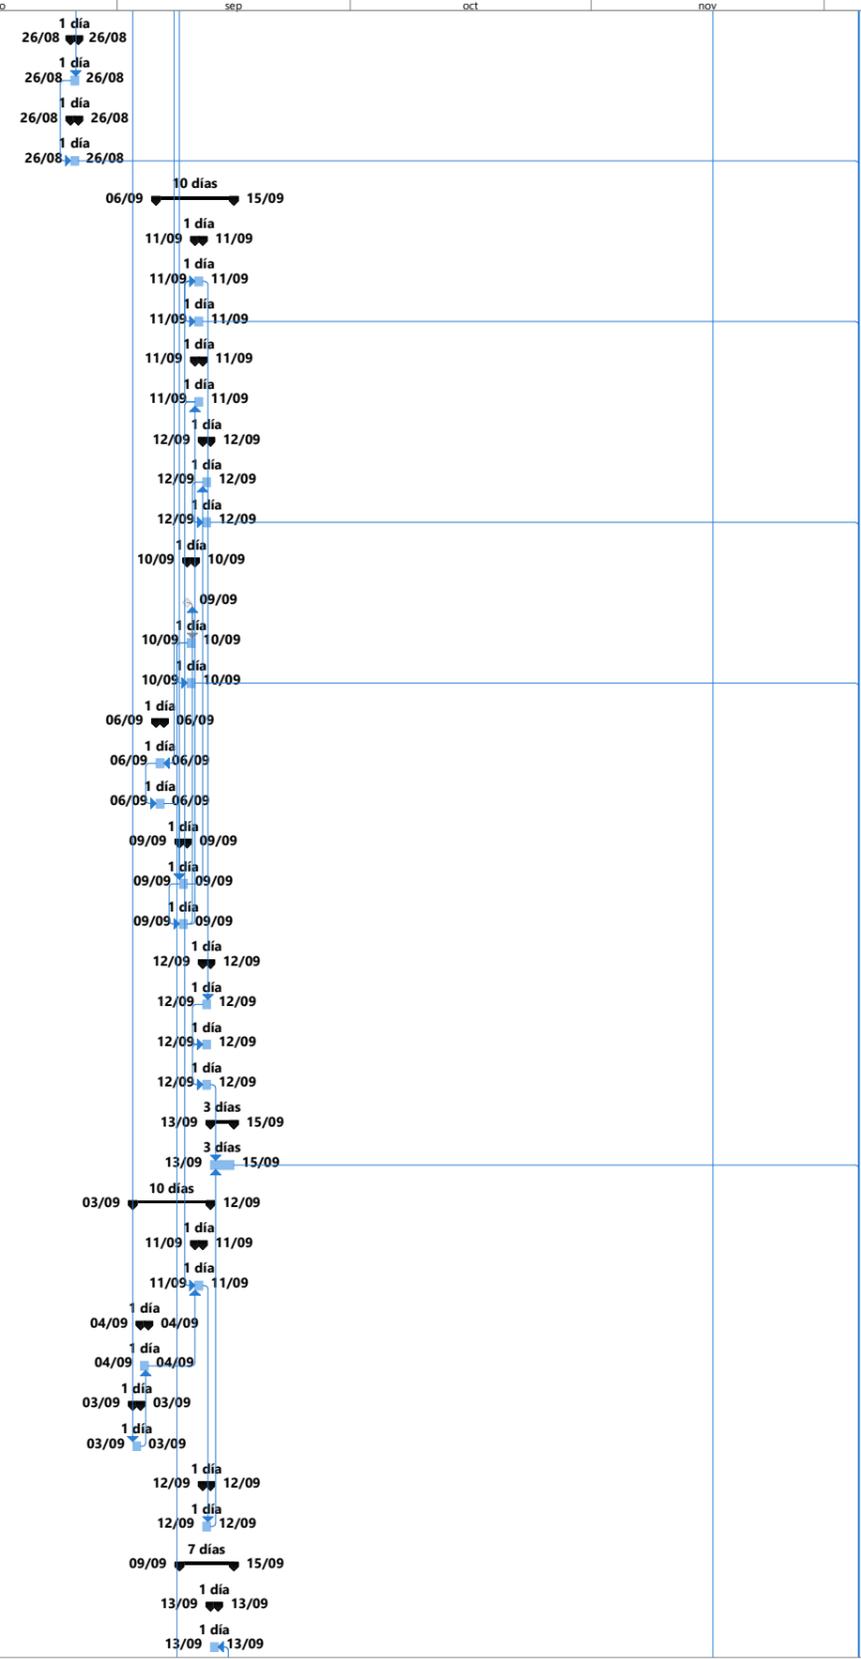

Proyecto: Fecha: mié 19/03/25

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		División crítica	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite		Progreso	
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Tareas críticas		Progreso manual	


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

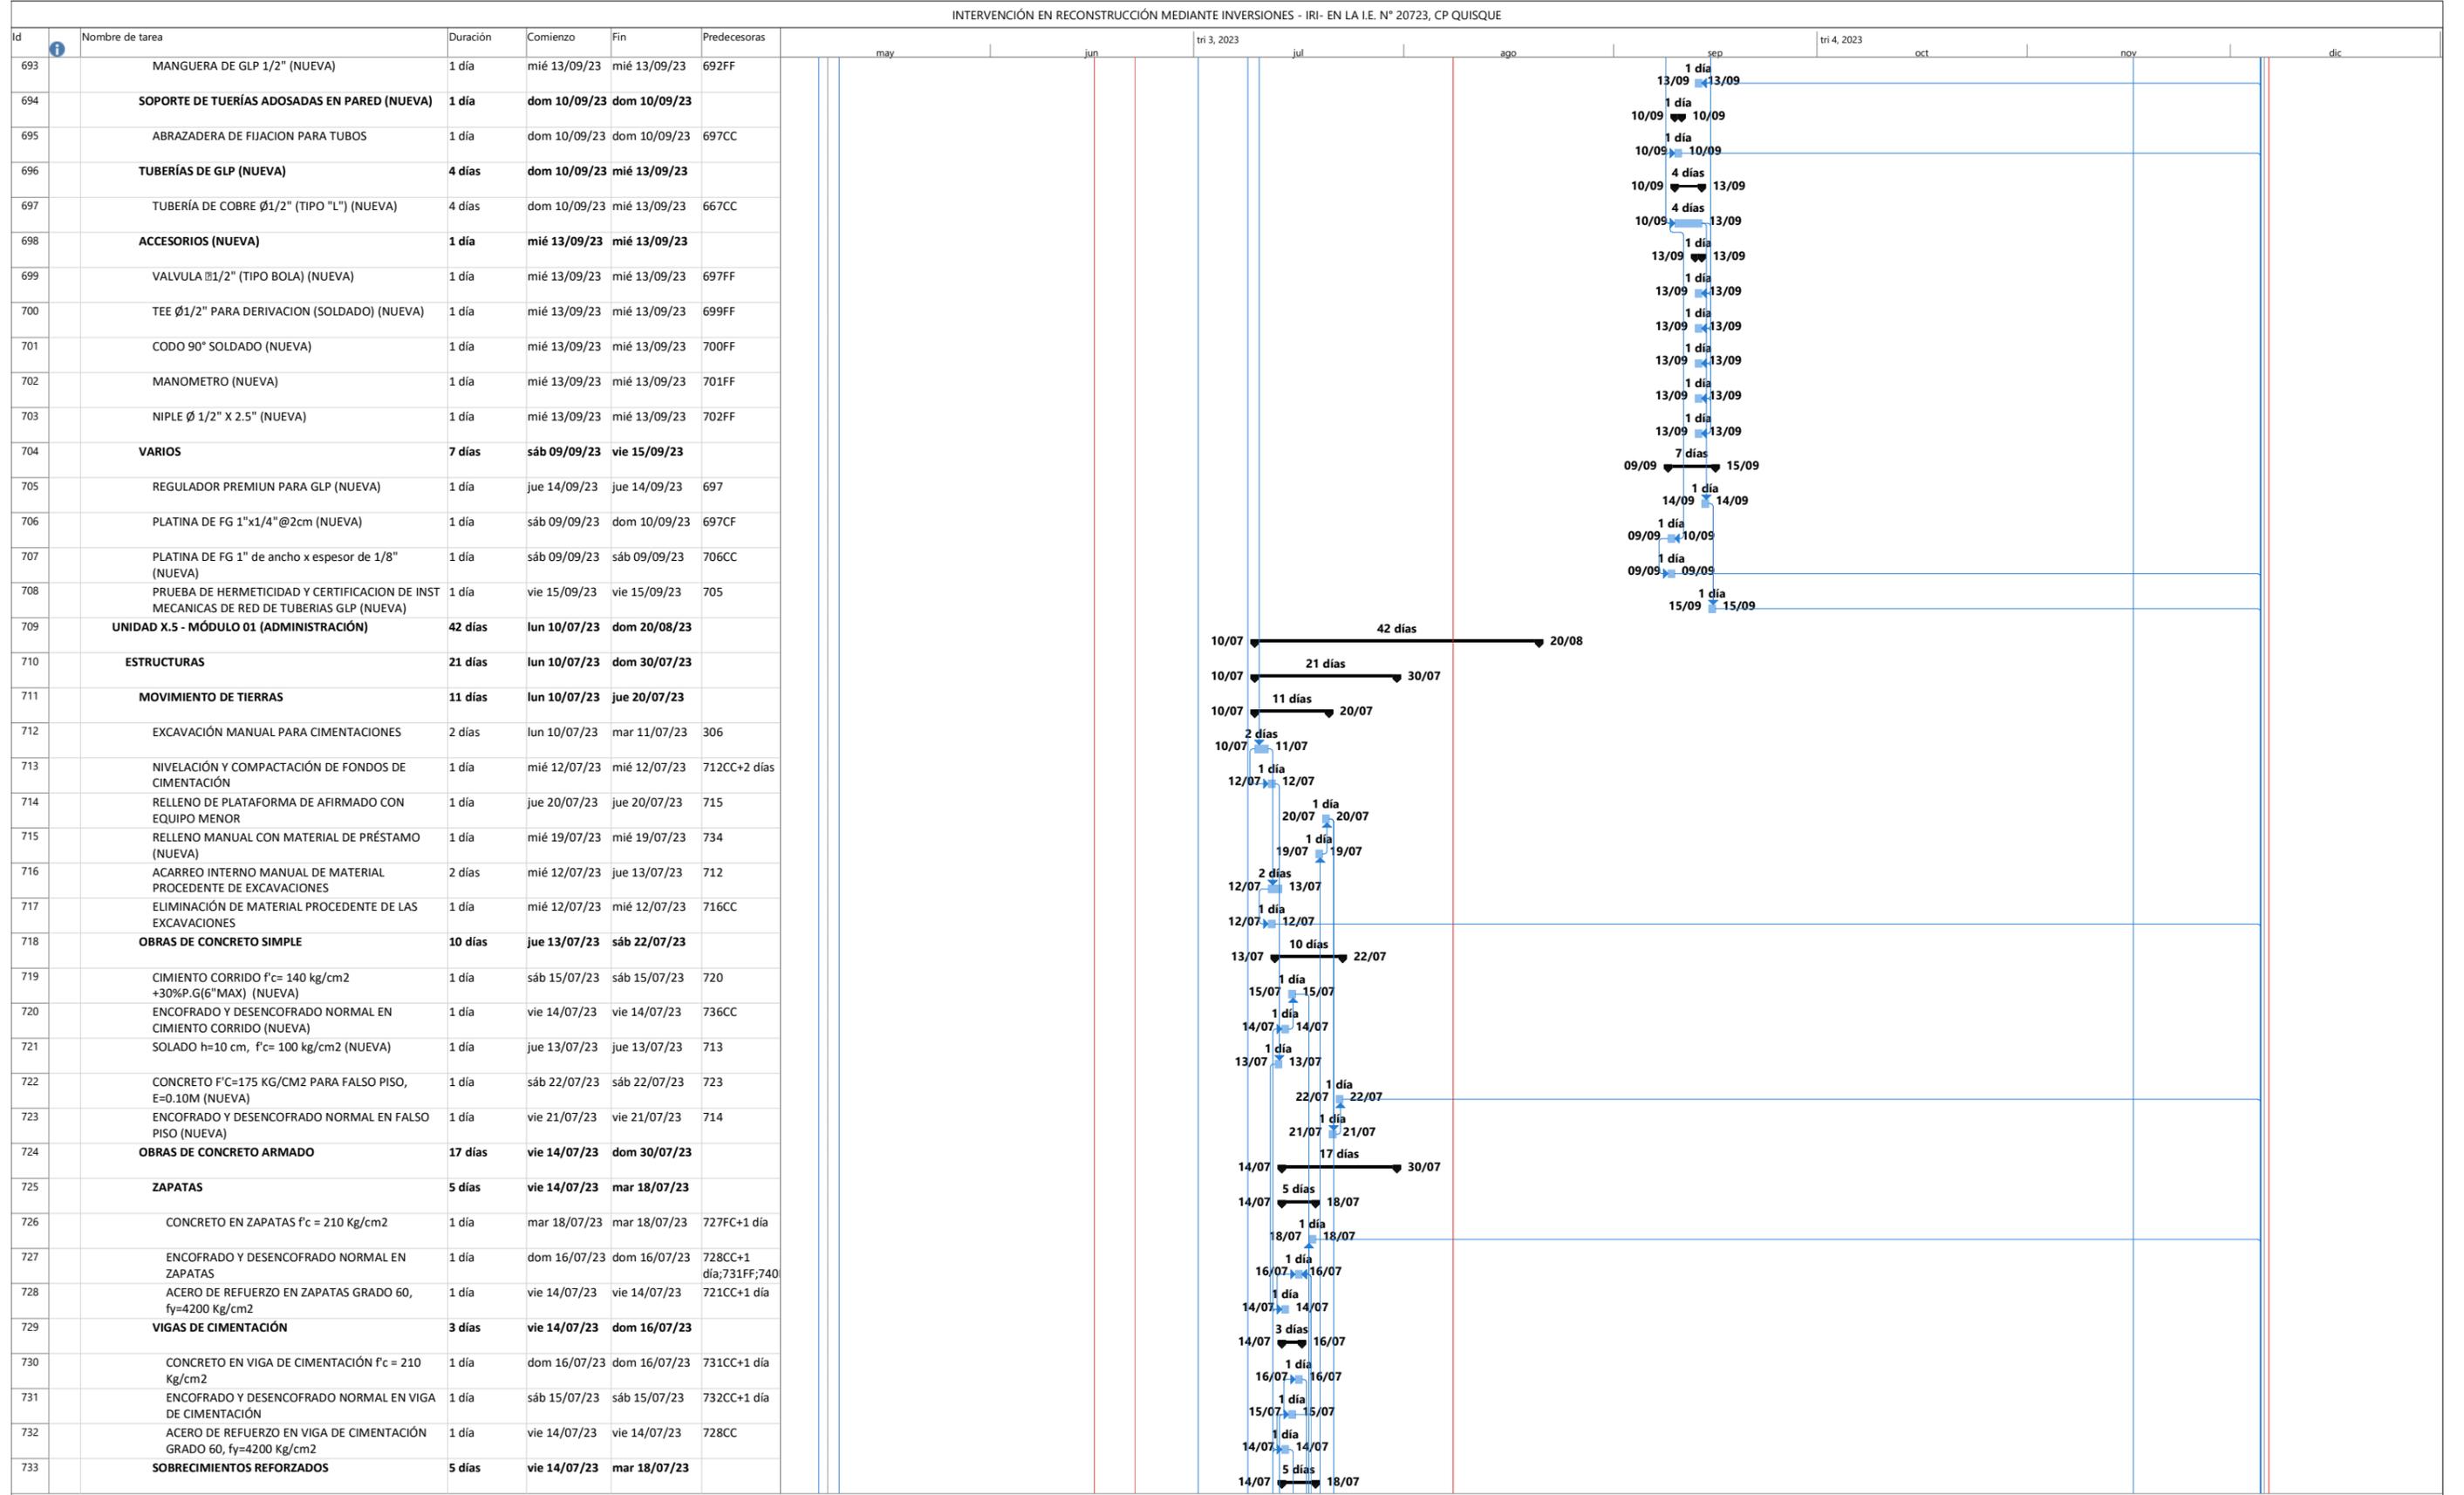

Proyecto: Fecha: mié 19/03/25

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		División crítica	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite		Progreso	
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Tareas criticas		Progreso manual	


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

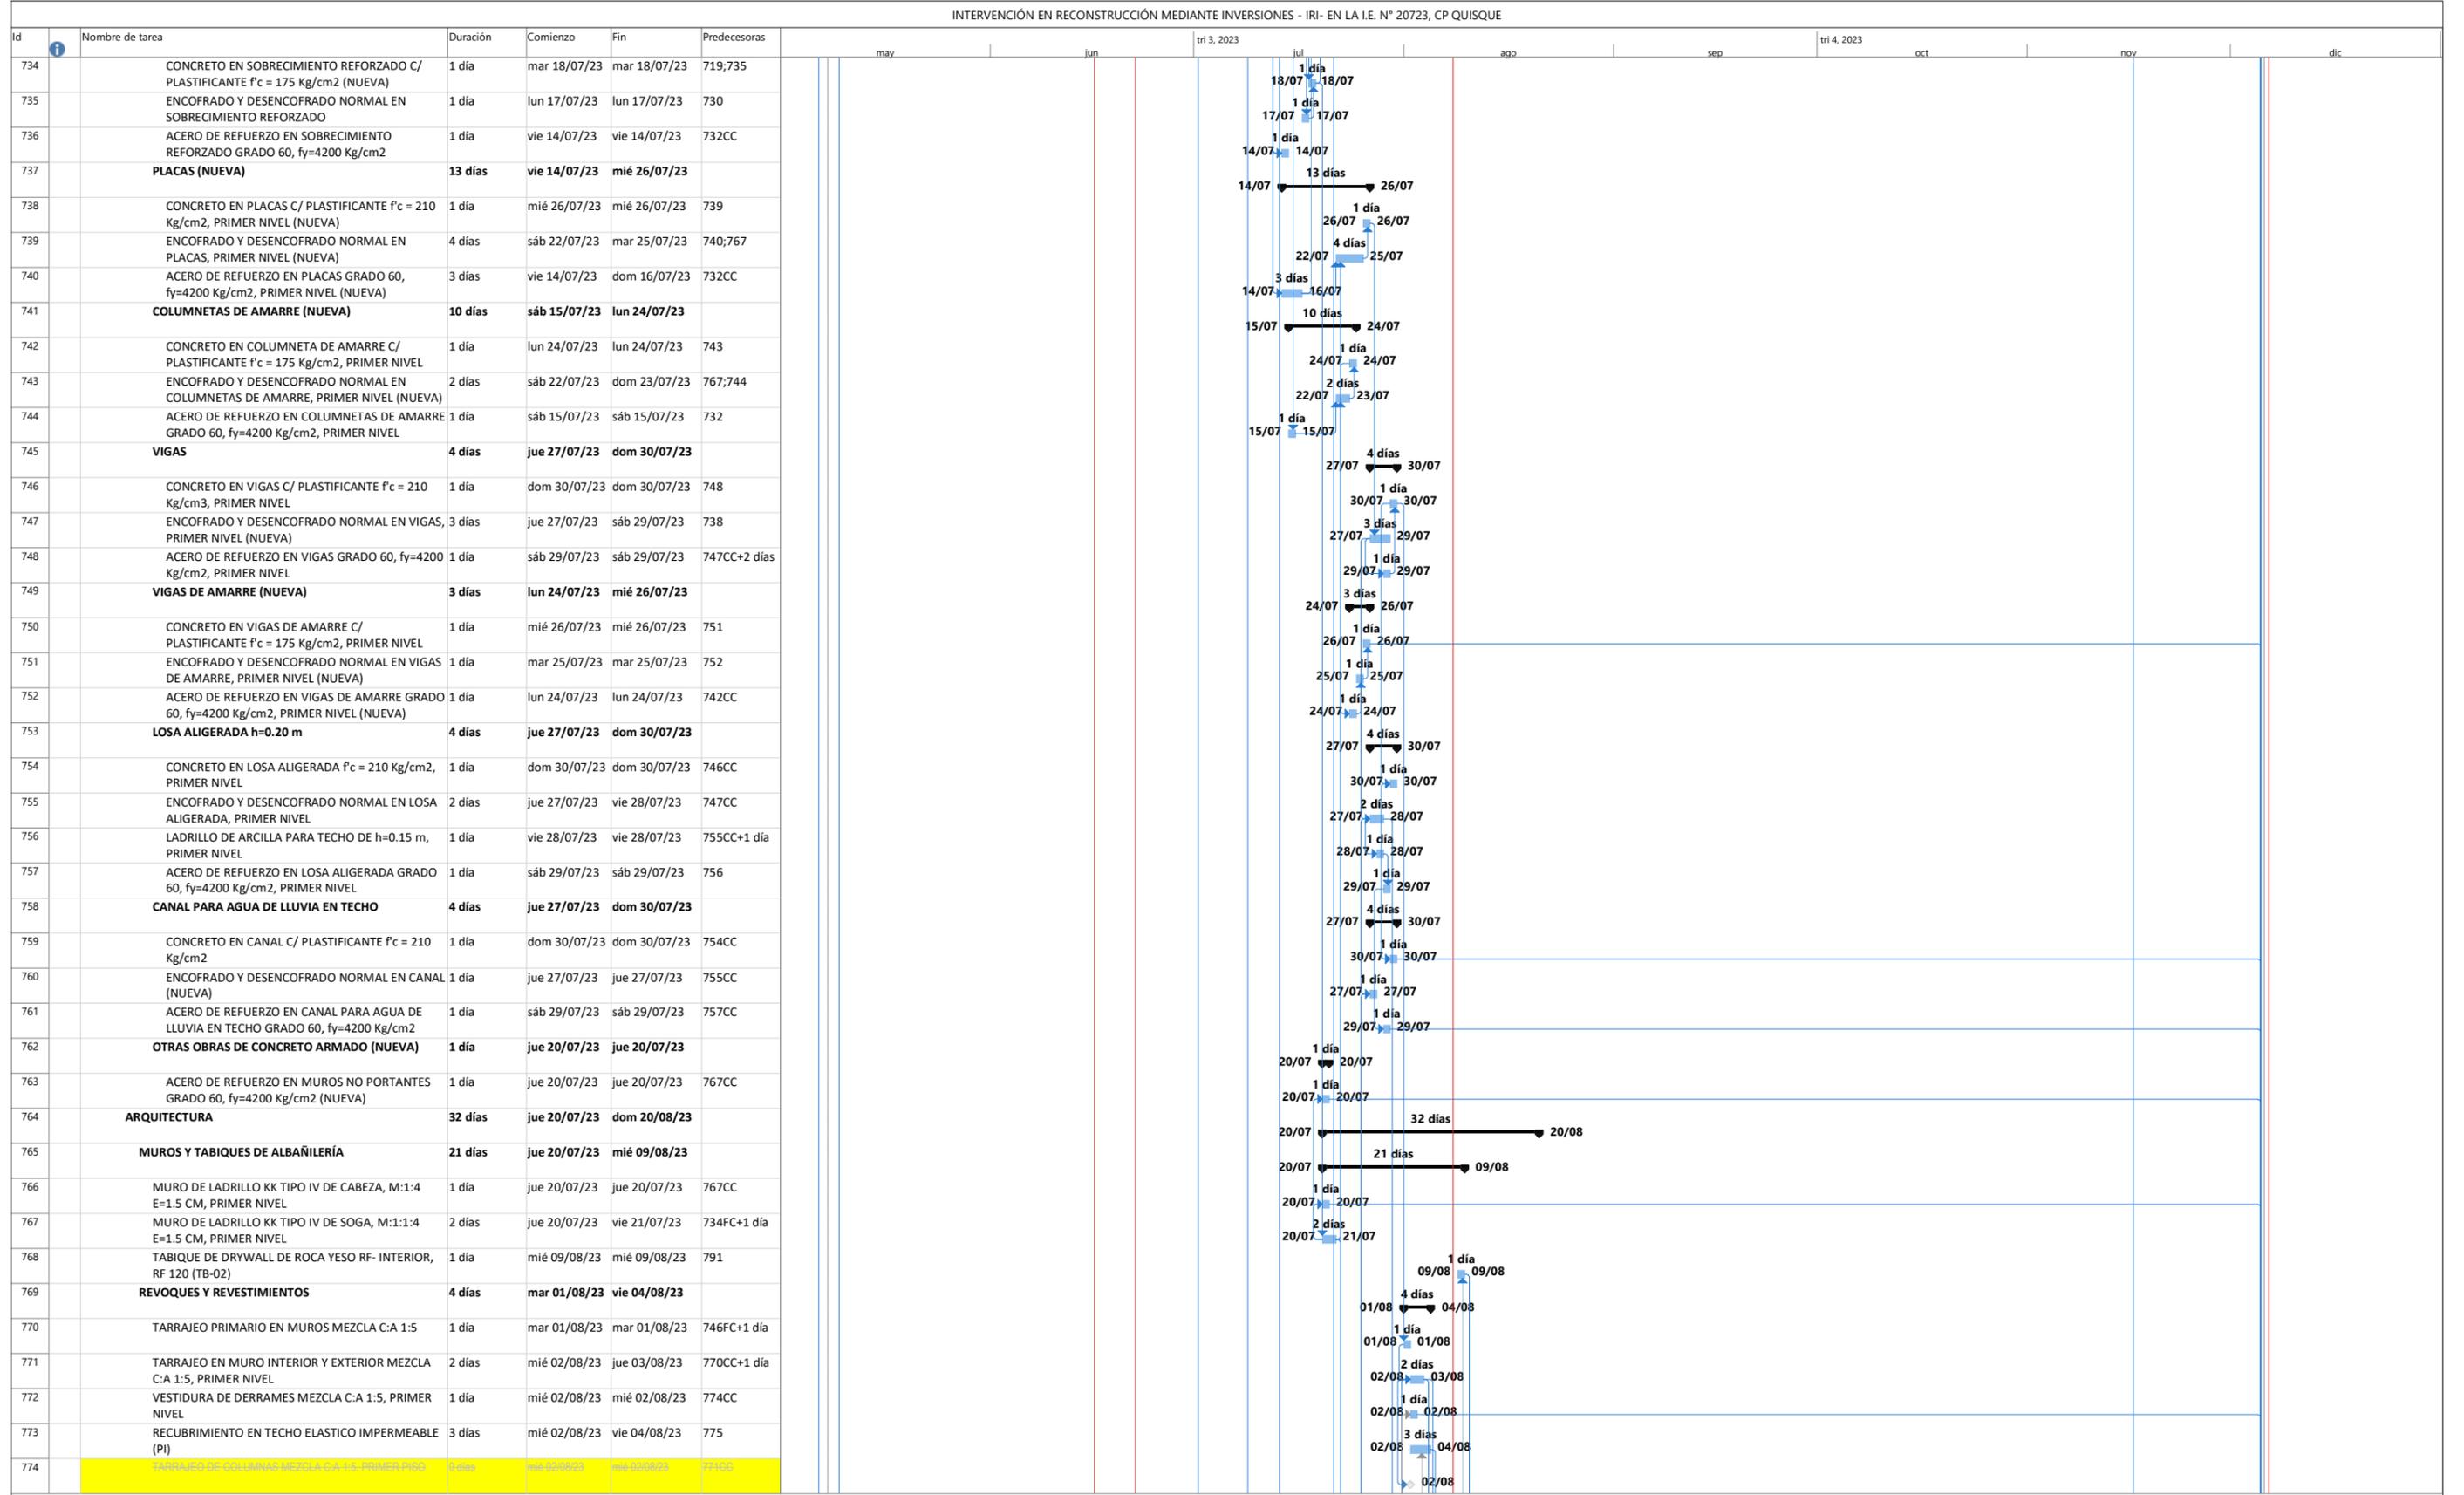

Proyecto: jujuj
Fecha: mié 19/03/25


Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual

INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

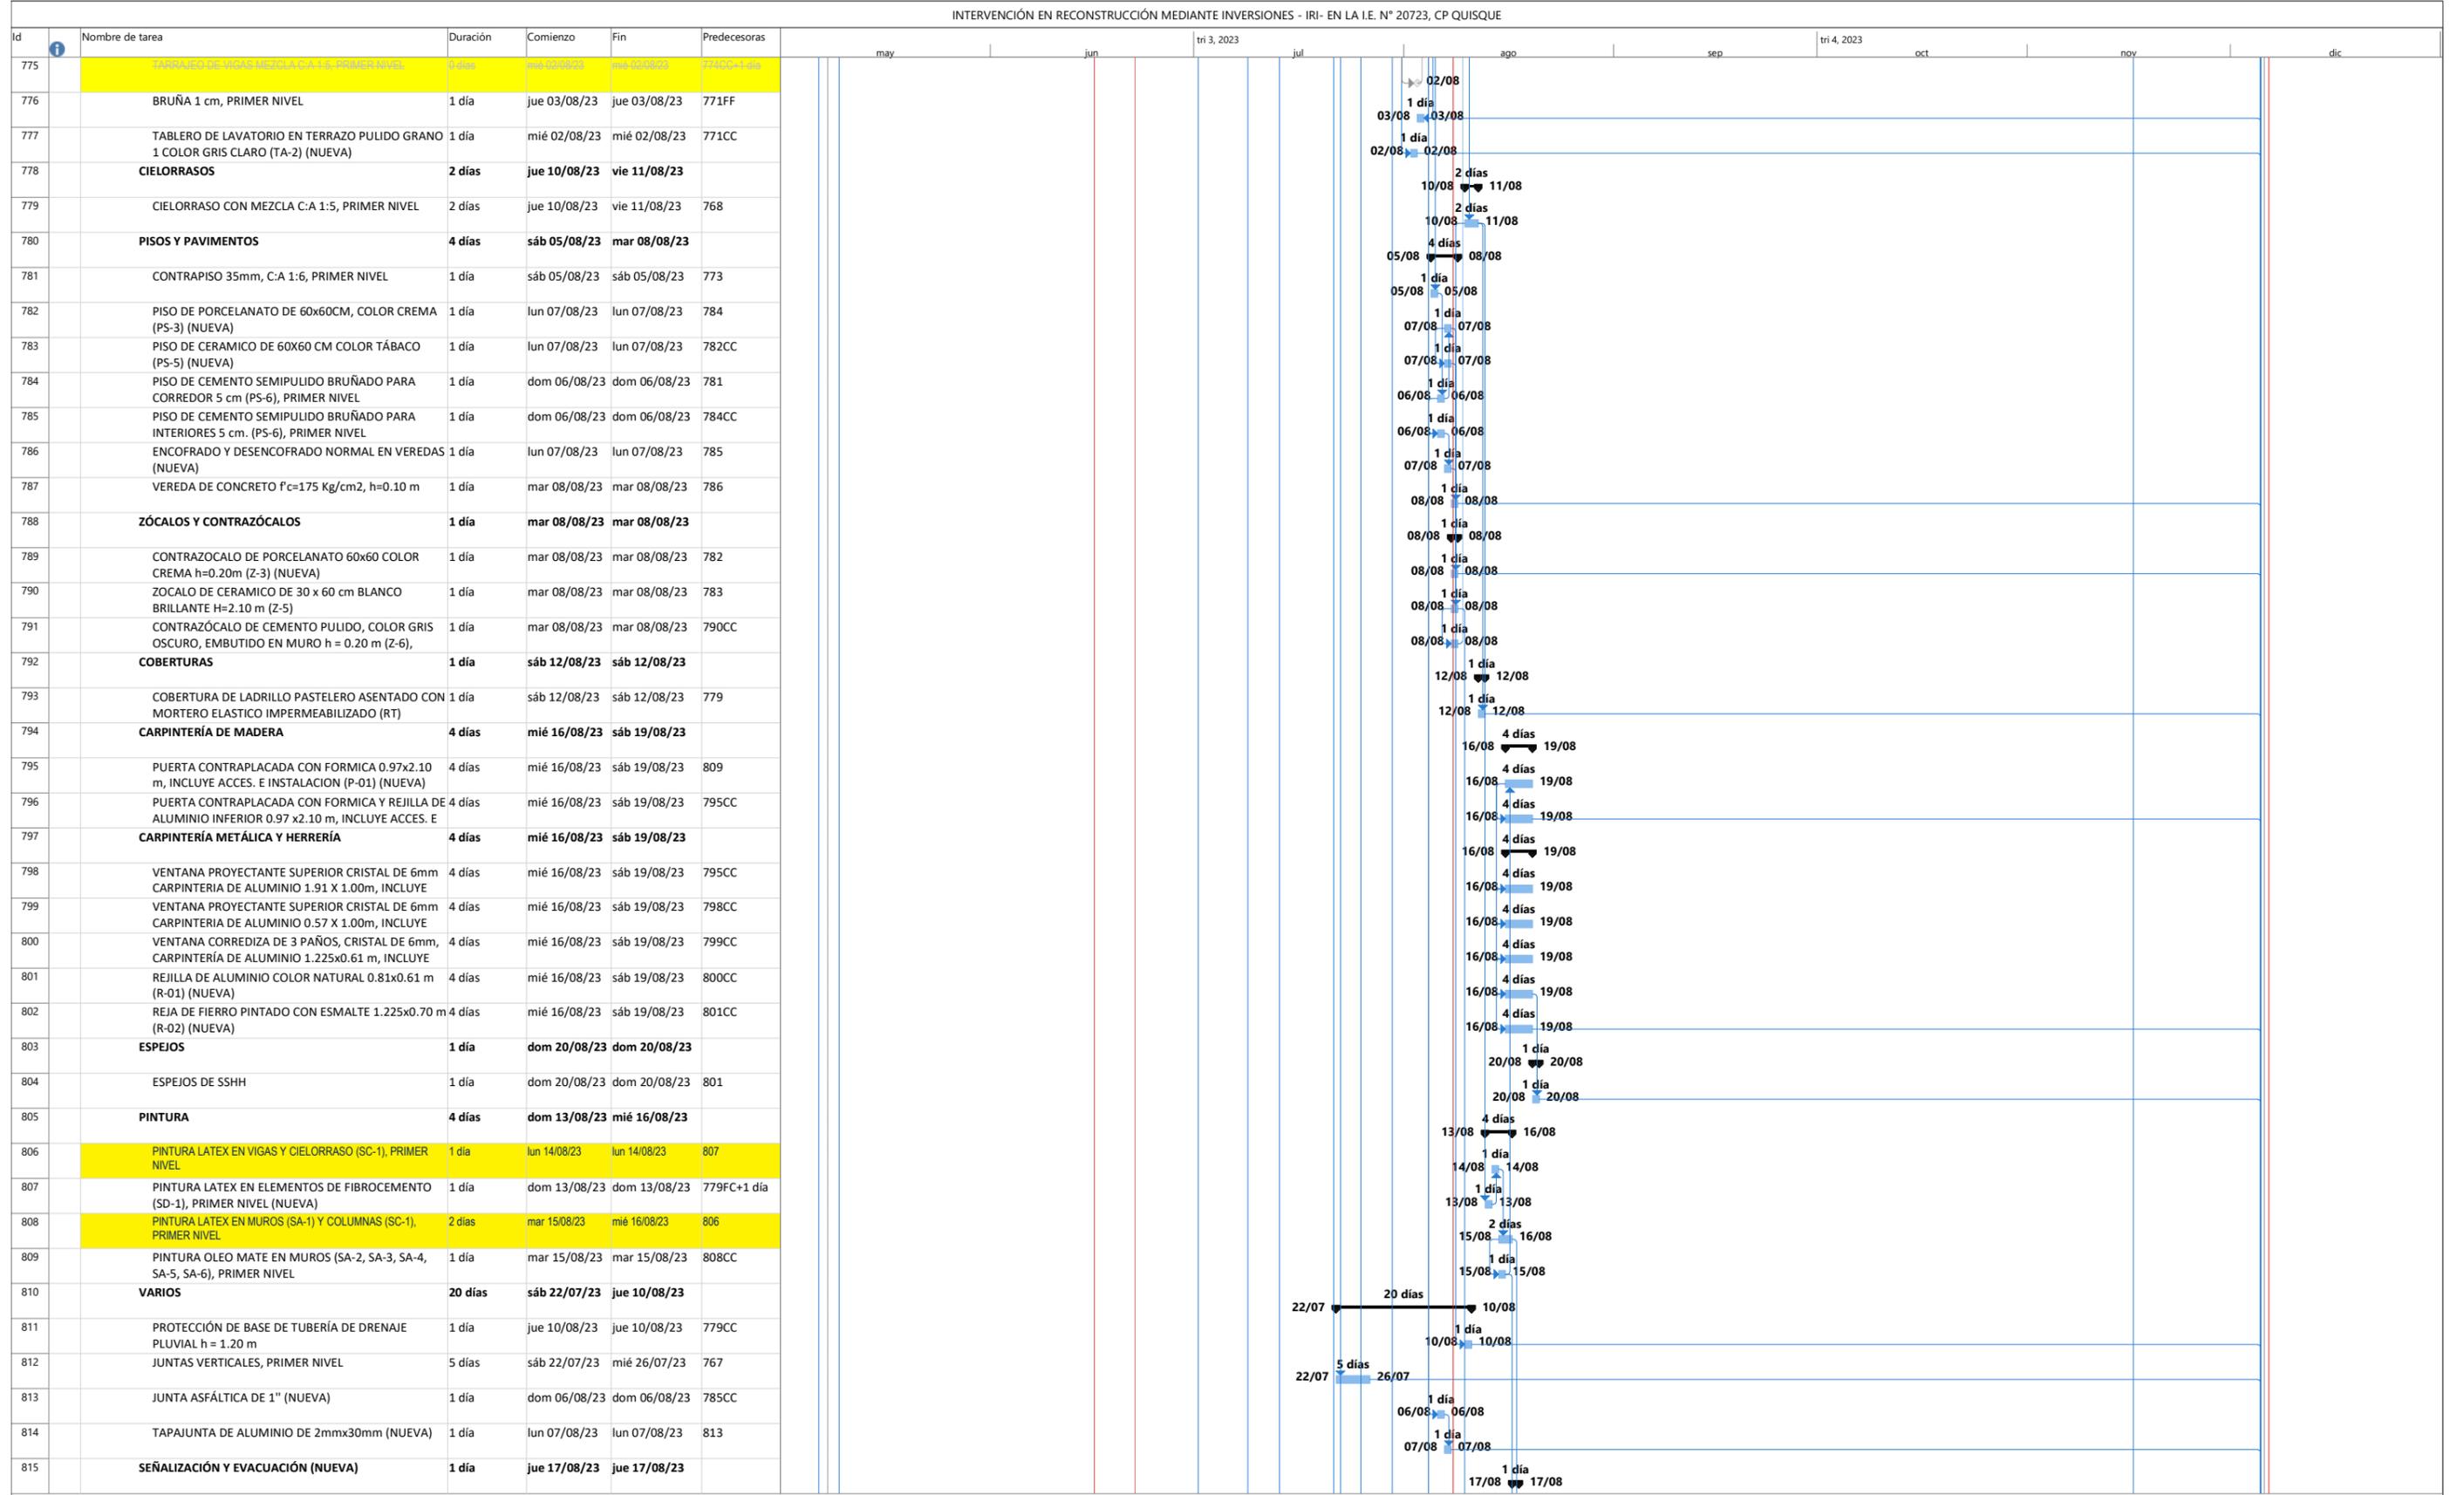

Proyecto: Fecha: mié 19/03/25
 Tarea: Resumen Hito inactivo solo duración solo el comienzo Hito externo División crítica
 División: Resumen del proyecto Resumen inactivo Informe de resumen manual solo fin Fecha límite Progreso
 Hito: Tarea inactiva Tarea manual Resumen manual Tareas externas Tareas críticas Progreso manual

INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

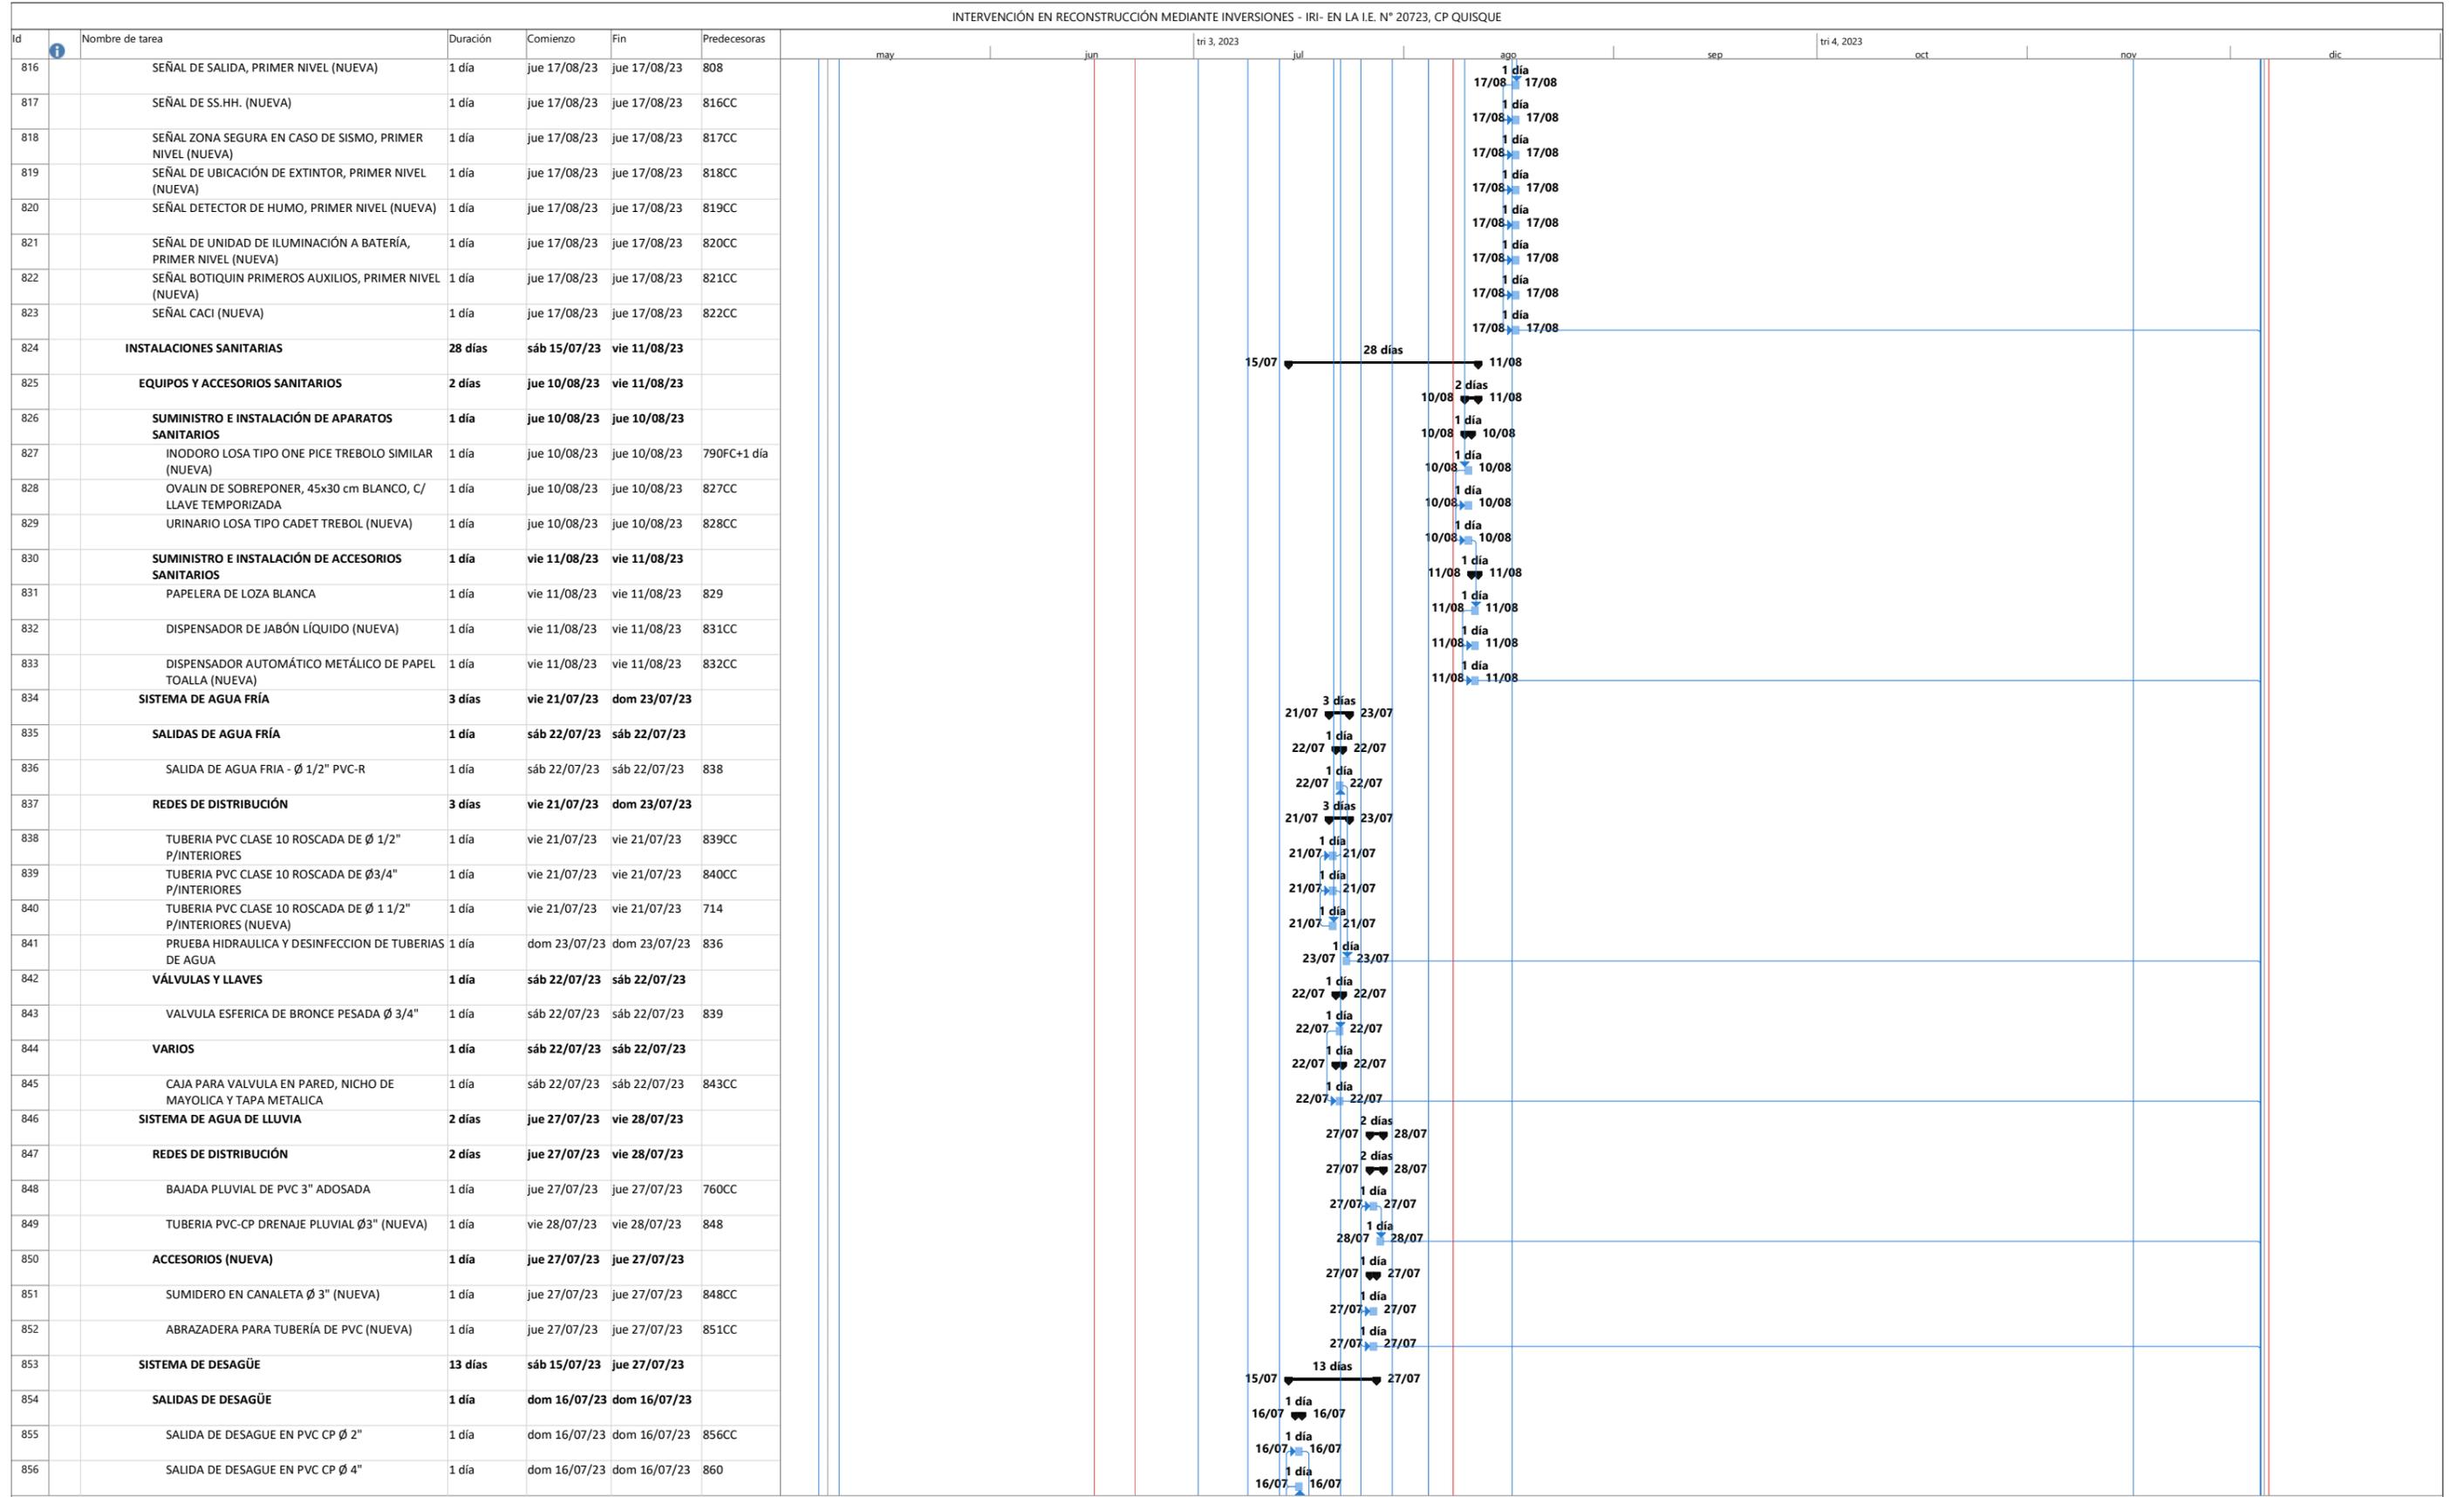

Proyecto: j|||||
 Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
857	SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2"	1 día	dom 16/07/23	dom 16/07/23	856CC			16/07					
858	REDES DE DERIVACIÓN	4 días	sáb 15/07/23	mar 18/07/23				15/07	18/07				
859	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 2" RED INTERIOR	1 día	dom 16/07/23	dom 16/07/23	860			16/07					
860	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 4" RED INTERIOR	1 día	sáb 15/07/23	sáb 15/07/23	731CC			15/07					
861	VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø 2"	1 día	dom 16/07/23	dom 16/07/23	860			16/07					
862	PRUEBA HIDRÁULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTÍA DE TUB. DESAGÜE	1 día	mar 18/07/23	mar 18/07/23	855FC+1 día			18/07					
863	ACCESORIOS DE REDES	2 días	dom 16/07/23	lun 17/07/23				16/07	17/07				
864	SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 2"	1 día	dom 16/07/23	dom 16/07/23	865CC			16/07					
865	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4"	1 día	dom 16/07/23	dom 16/07/23	860			16/07					
866	SALIDA EN TECHO DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2" (NUEVA)	1 día	lun 17/07/23	lun 17/07/23	865			17/07					
867	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE (NUEVA)	1 día	jue 27/07/23	jue 27/07/23				27/07					
868	APOYO DE CONCRETO H=0.10 (NUEVA)	1 día	jue 27/07/23	jue 27/07/23	848CC			27/07					
869	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	29 días	sáb 22/07/23	sáb 19/08/23				22/07	19/08				
870	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED	2 días	sáb 05/08/23	dom 06/08/23				05/08	06/08				
871	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO, PRIMER NIVEL	1 día	sáb 05/08/23	sáb 05/08/23	875CC			05/08					
872	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO, PRIMER PISO	1 día	sáb 05/08/23	sáb 05/08/23	871CC			05/08					
873	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA, PRIMER NIVEL	1 día	dom 06/08/23	dom 06/08/23	872			06/08					
874	SALIDAS PARA INTERRUPTORES	1 día	sáb 05/08/23	sáb 05/08/23				05/08					
875	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE, PRIMER NIVEL	1 día	sáb 05/08/23	sáb 05/08/23	887			05/08					
876	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES	1 día	dom 06/08/23	dom 06/08/23				06/08					
877	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y	1 día	dom 06/08/23	dom 06/08/23	886FC+1 día			06/08					
878	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS	1 día	vie 04/08/23	vie 04/08/23				04/08					
879	TUBERIA SOPORTE DE Fe. DE LUMINARIA 20 mm (NUEVA)	1 día	vie 04/08/23	vie 04/08/23	886CC			04/08					
880	TUBERÍA EMT CONDUIT 20 mm, PRIMER NIVEL (NUEVA)	1 día	vie 04/08/23	vie 04/08/23	879CC			04/08					
881	TUBERÍA FLEX (NUEVA)	1 día	vie 04/08/23	vie 04/08/23	880CC			04/08					
882	CAJAS DE PASE	7 días	sáb 22/07/23	vie 28/07/23				22/07	28/07				
883	CAJA DE PASE RECTANGULAR DE FºGº PESADA DE 100x55x50mm, PRIMER NIVEL	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	755FF			28/07					
884	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x55 mm (NUEVA)	1 día	sáb 22/07/23	sáb 22/07/23	767			22/07					
885	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA	1 día	vie 04/08/23	vie 04/08/23				04/08					
886	CABLE LSOH-80 4.0 mm2, PRIMER NIVEL	1 día	vie 04/08/23	vie 04/08/23	771			04/08					
887	CABLE LSOH-80 2.5 mm2, PRIMER NIVEL	1 día	vie 04/08/23	vie 04/08/23	886CC			04/08					
888	ARTEFACTOS	1 día	jue 17/08/23	jue 17/08/23				17/08					
889	ARTEFACTO PANEL LED RECTANGULAR, PARA ADOSAR/EMPOTRAR, EQUIPO LED 43W, 5909lm,	1 día	jue 17/08/23	jue 17/08/23	809FC+1 día;871;873			17/08					
890	ARTEFACTO HERMETICO LED, PARA SUSPENDER, EQUIPO LED 15W, 1,863lm, 4000K INCLUYE	1 día	jue 17/08/23	jue 17/08/23	889CC			17/08					
891	LUZ DE EMERGENCIA LED PARA ADOSAR IP65, ALIMENTACION 230VAC +/- 10% CLASE II AUTONOMIA	1 día	jue 17/08/23	jue 17/08/23	890CC			17/08					
892	VARIOS	2 días	vie 18/08/23	sáb 19/08/23				18/08	19/08				
893	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO, PRIMER NIVEL	2 días	vie 18/08/23	sáb 19/08/23	891			18/08	19/08				
894	INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES (NUEVA)	27 días	sáb 22/07/23	jue 17/08/23				22/07	17/08				
895	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES	1 día	sáb 05/08/23	sáb 05/08/23				05/08					
896	SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE (NUEVA)	1 día	sáb 05/08/23	sáb 05/08/23	875CC			05/08					
897	SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE	1 día	sáb 05/08/23	sáb 05/08/23	896CC			05/08					

Proyecto: j||||| Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

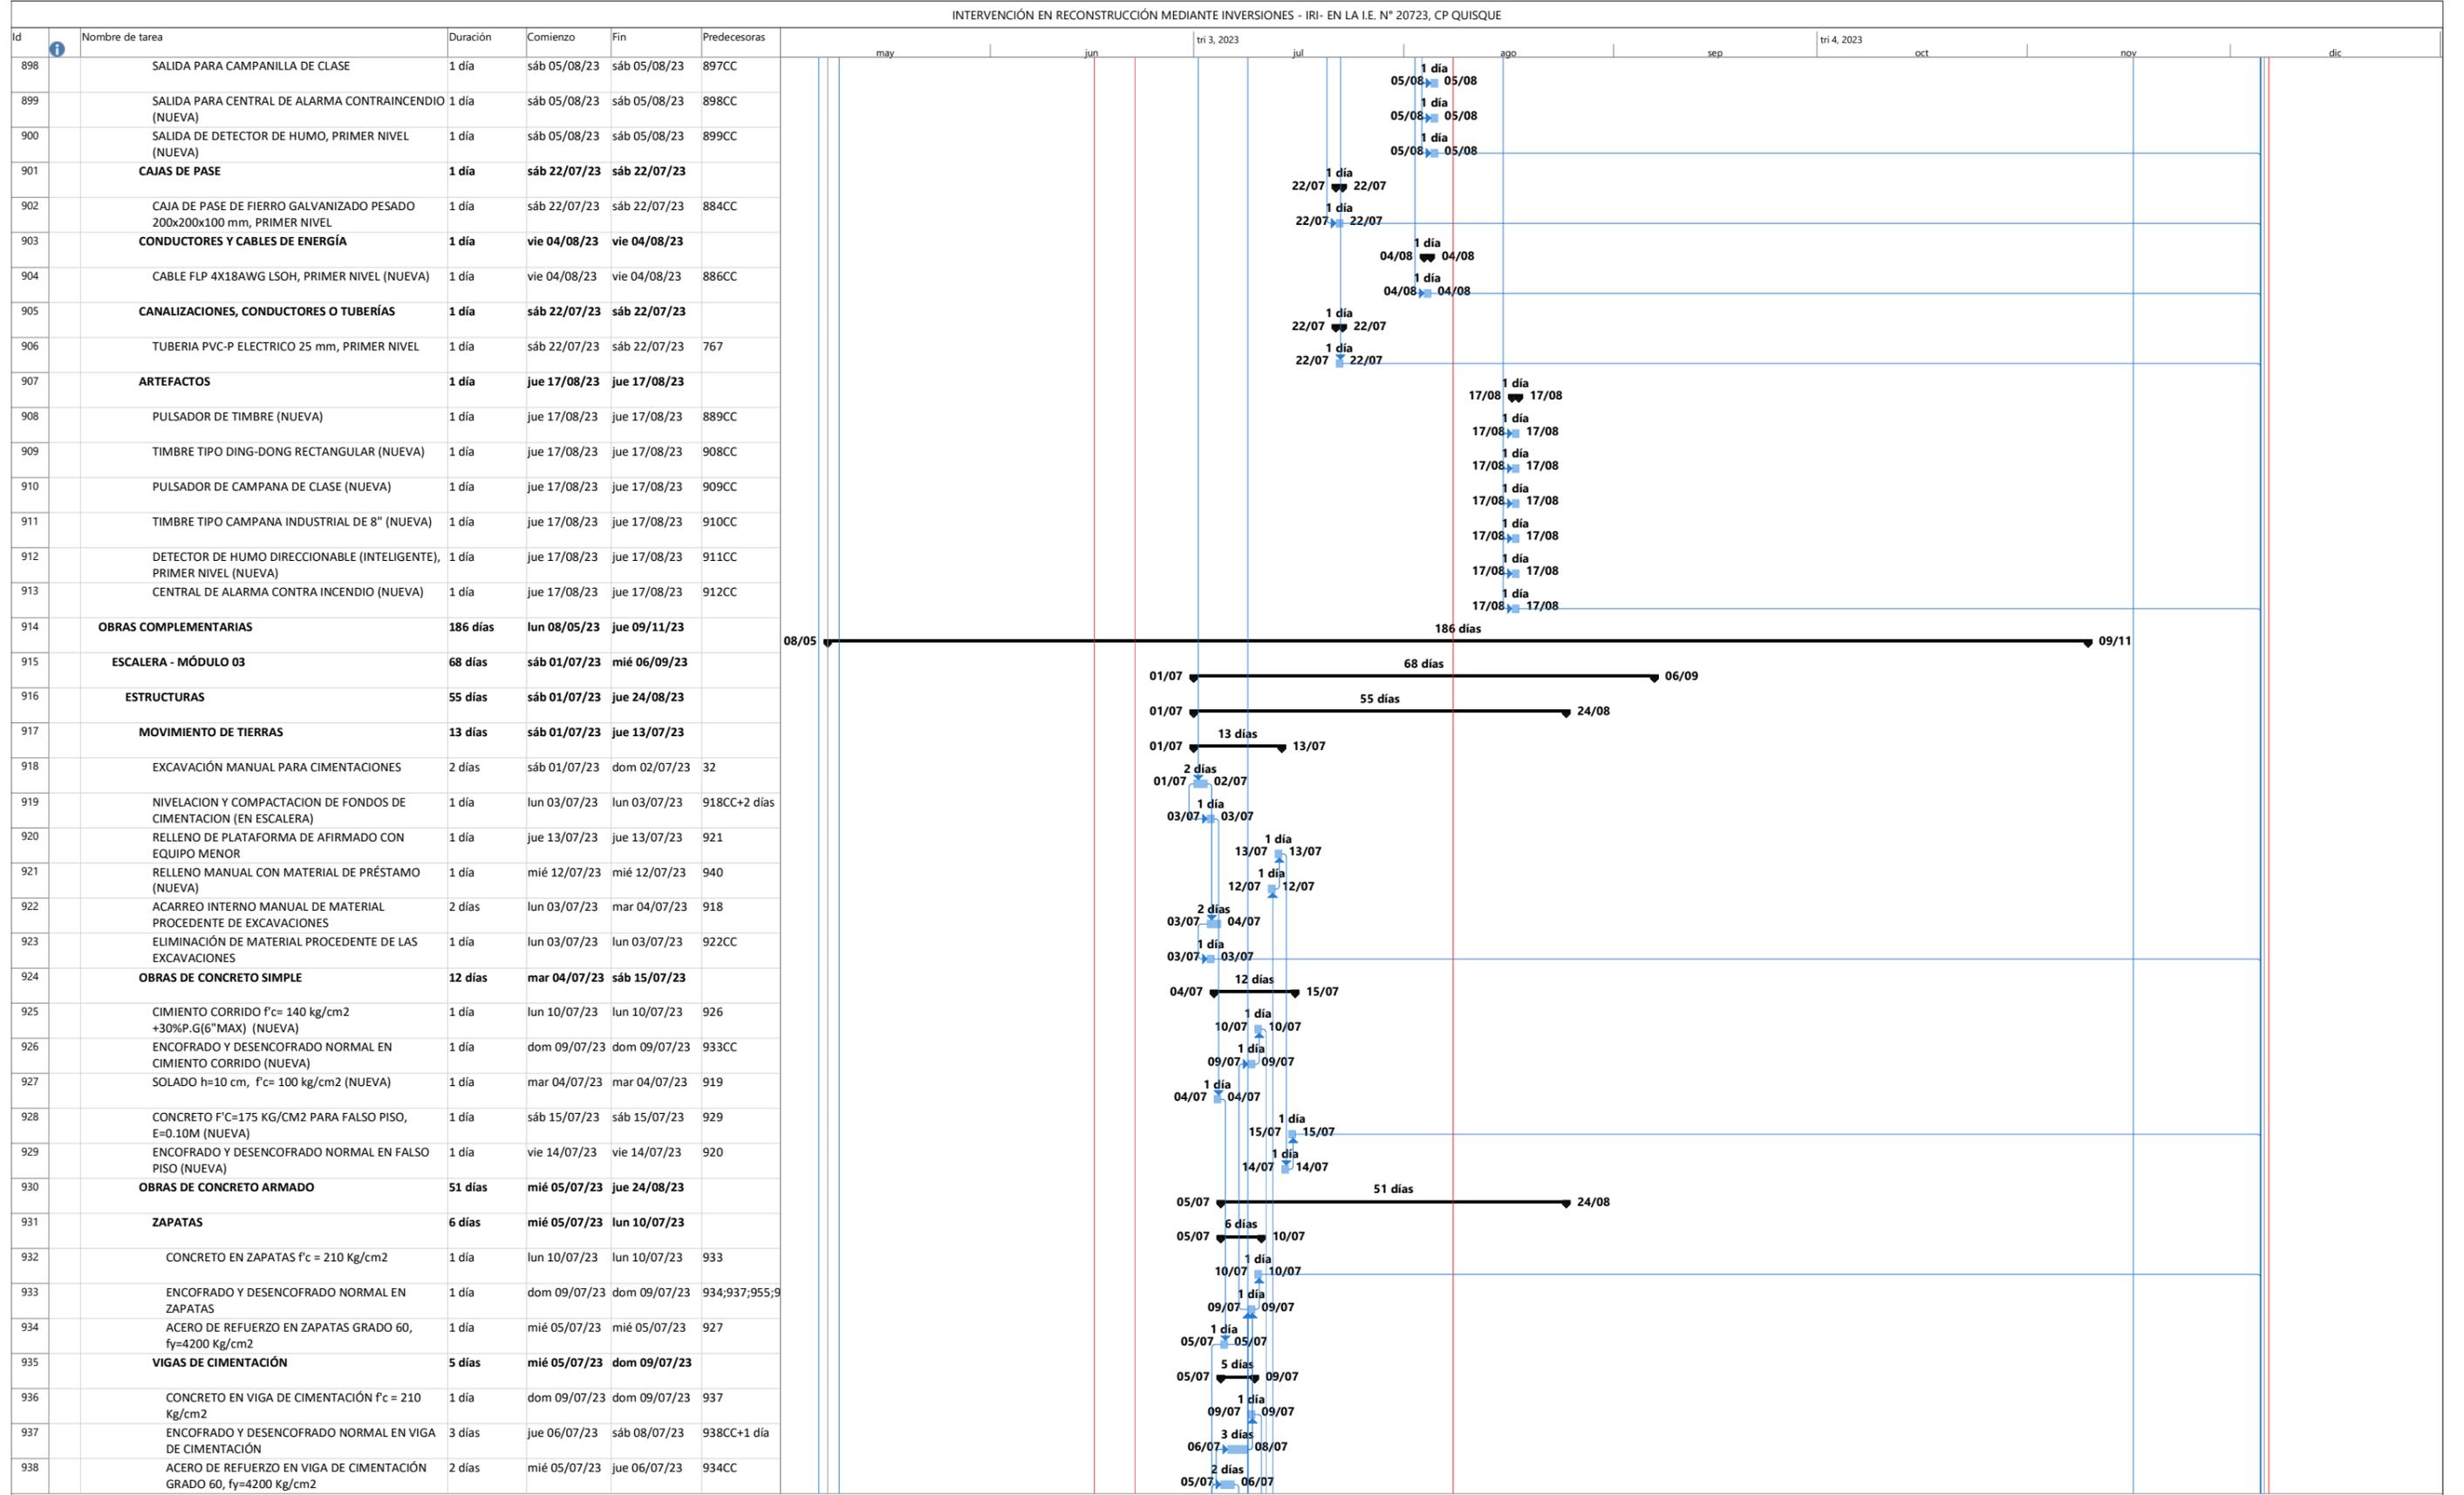

Proyecto: jujujj
 Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

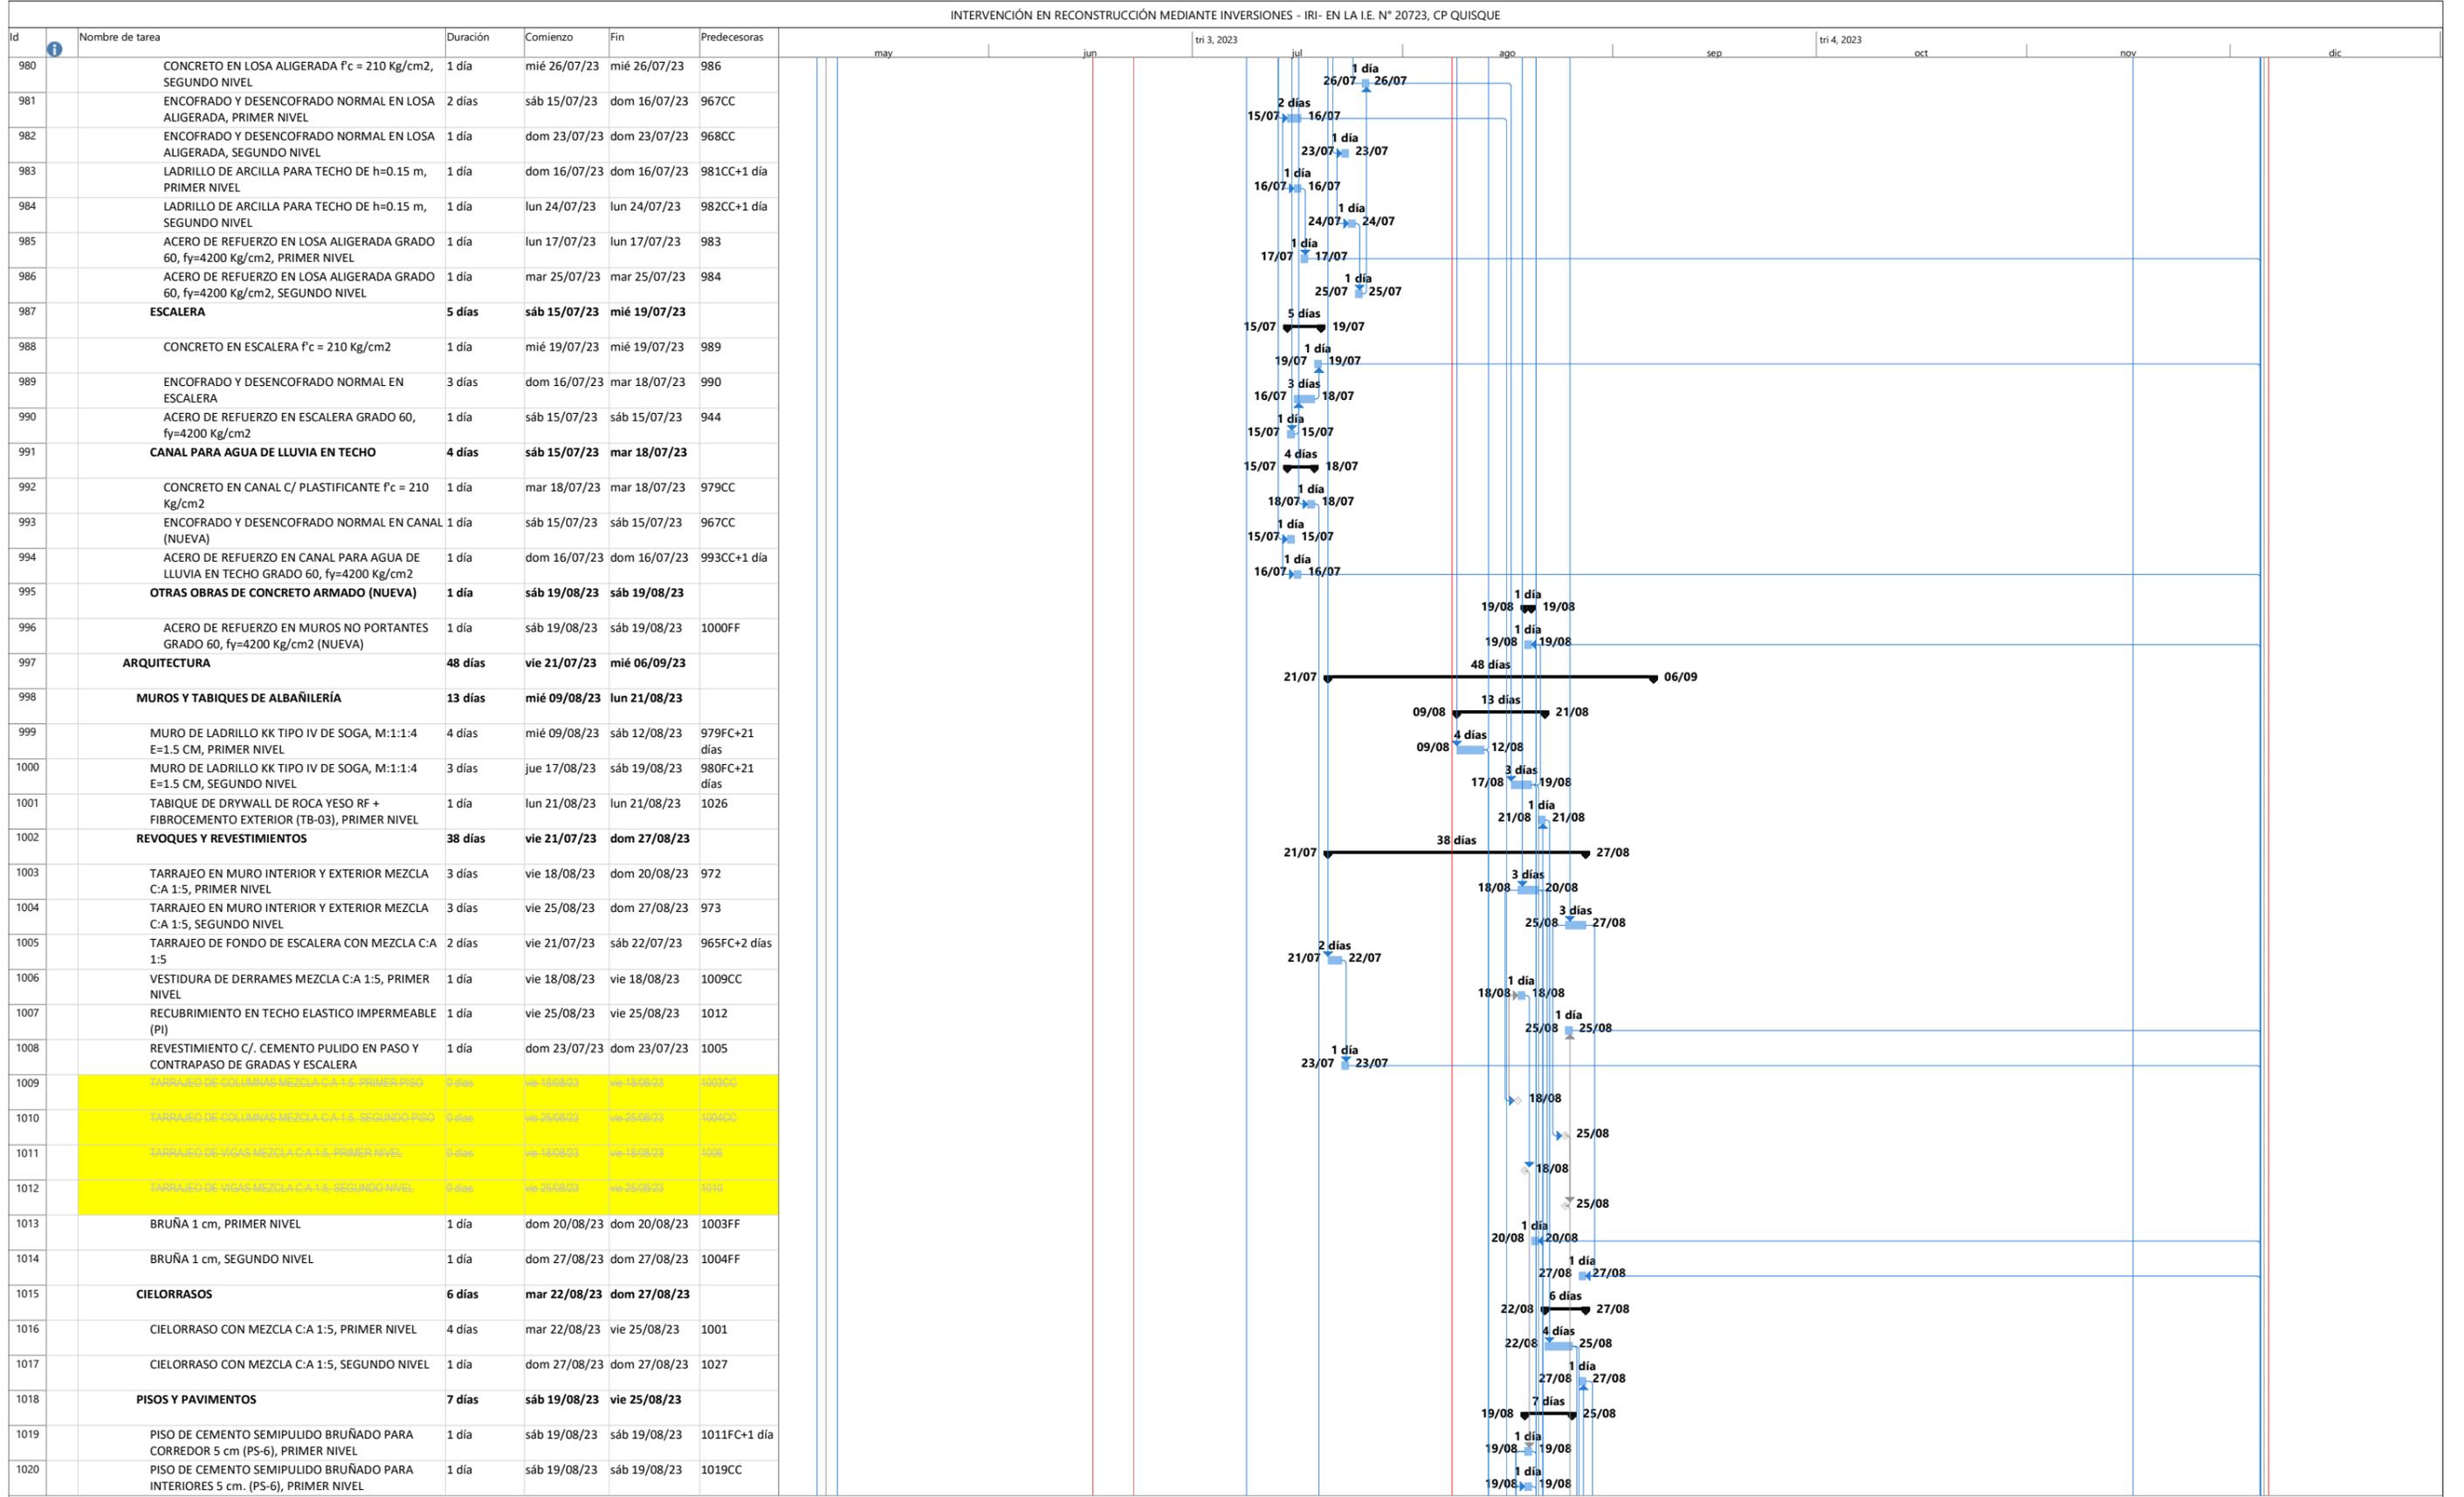

Proyecto: j||||| Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

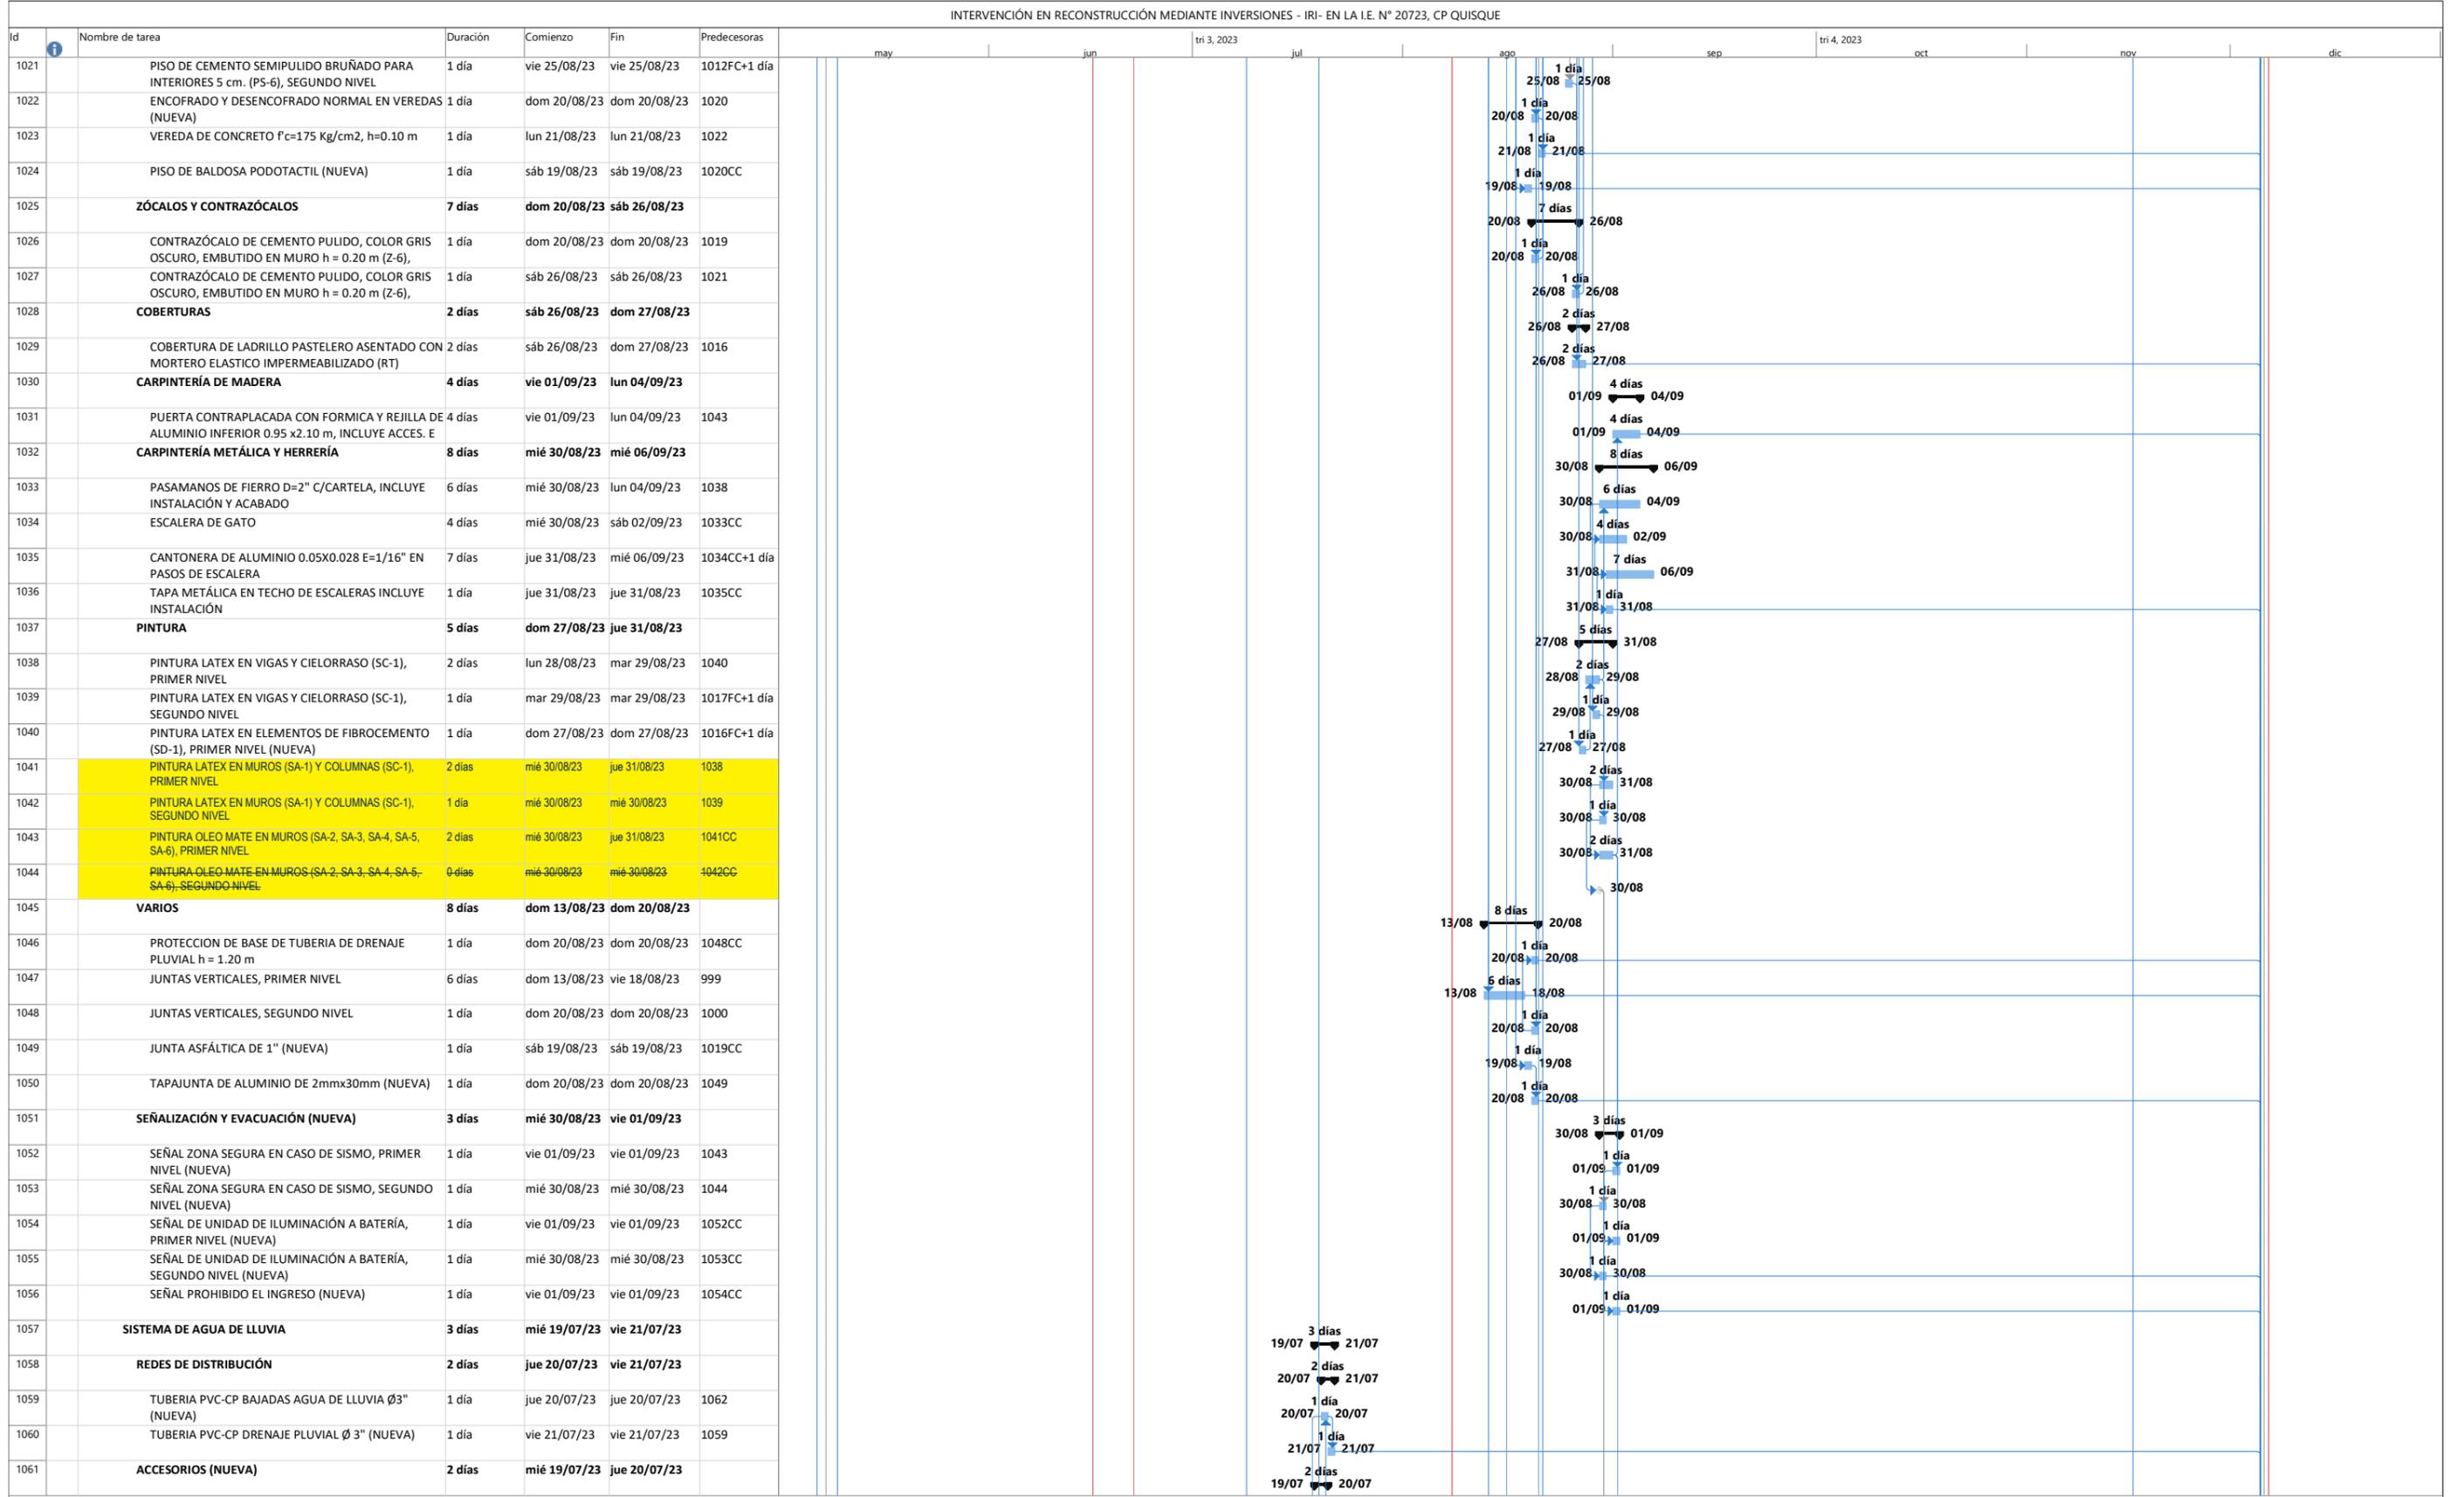

Proyecto: jujujj
Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

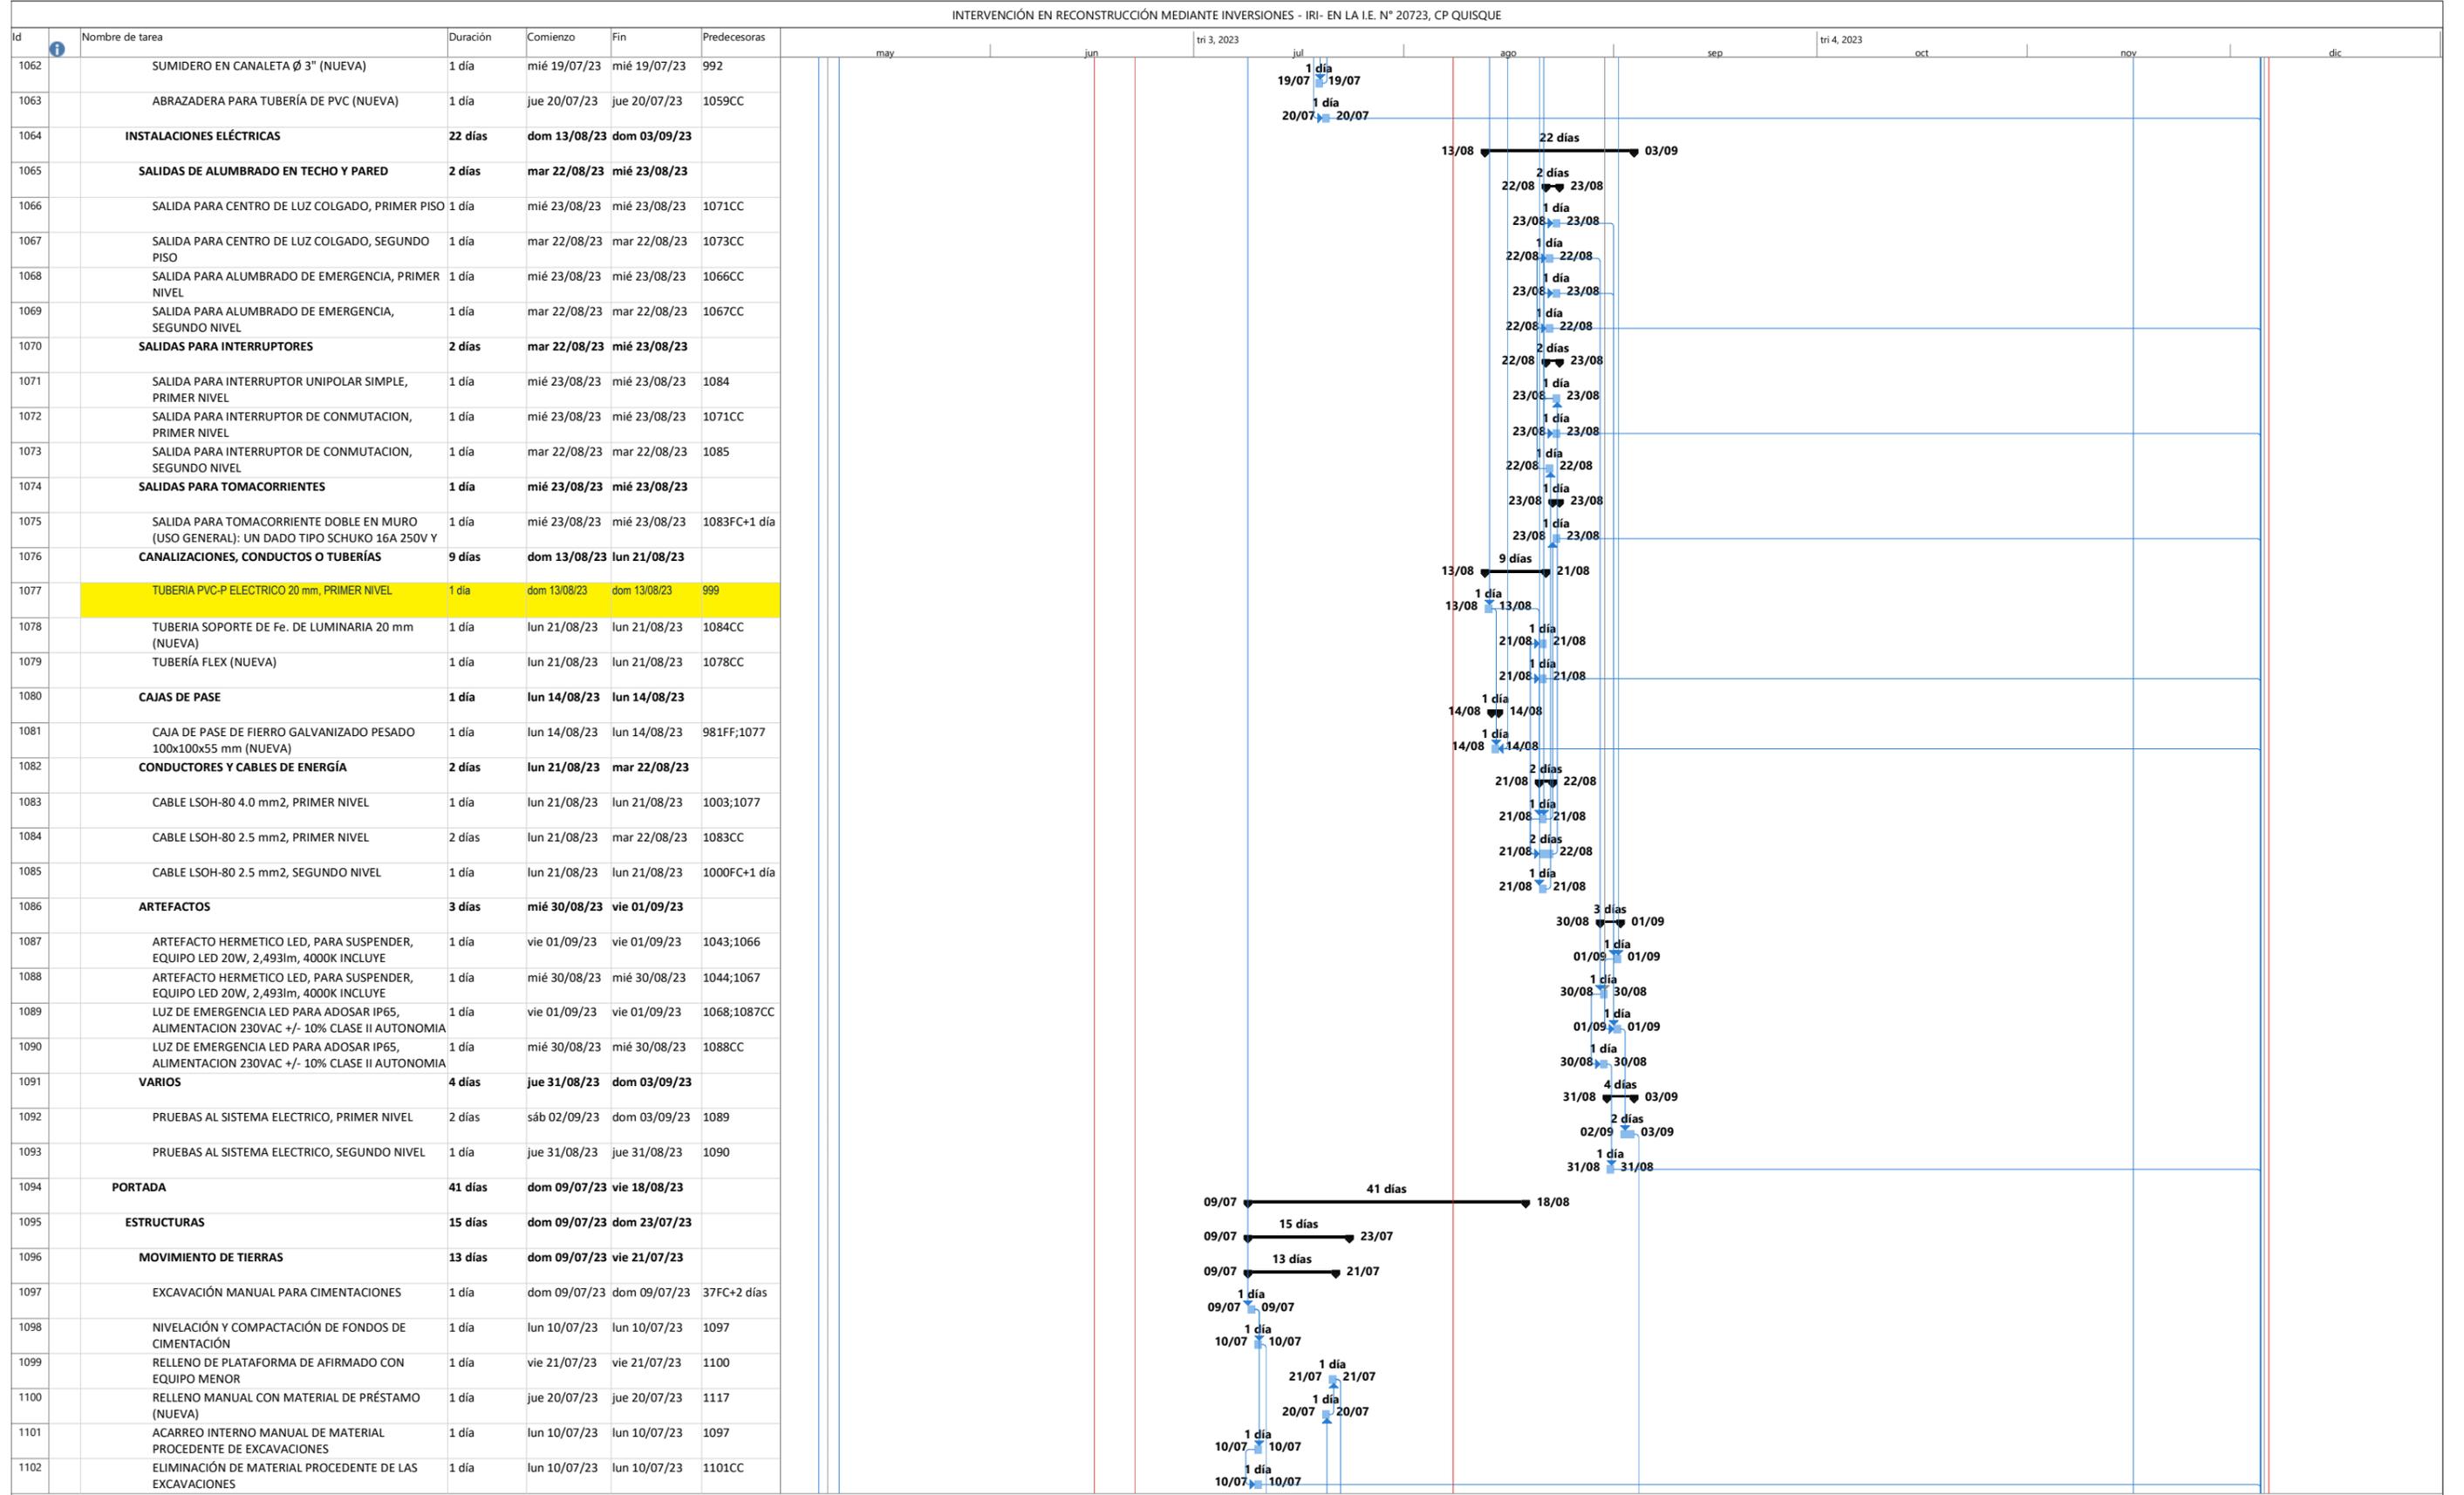

Proyecto: Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	Progreso
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso	Progreso manual
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	Progreso manual

INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

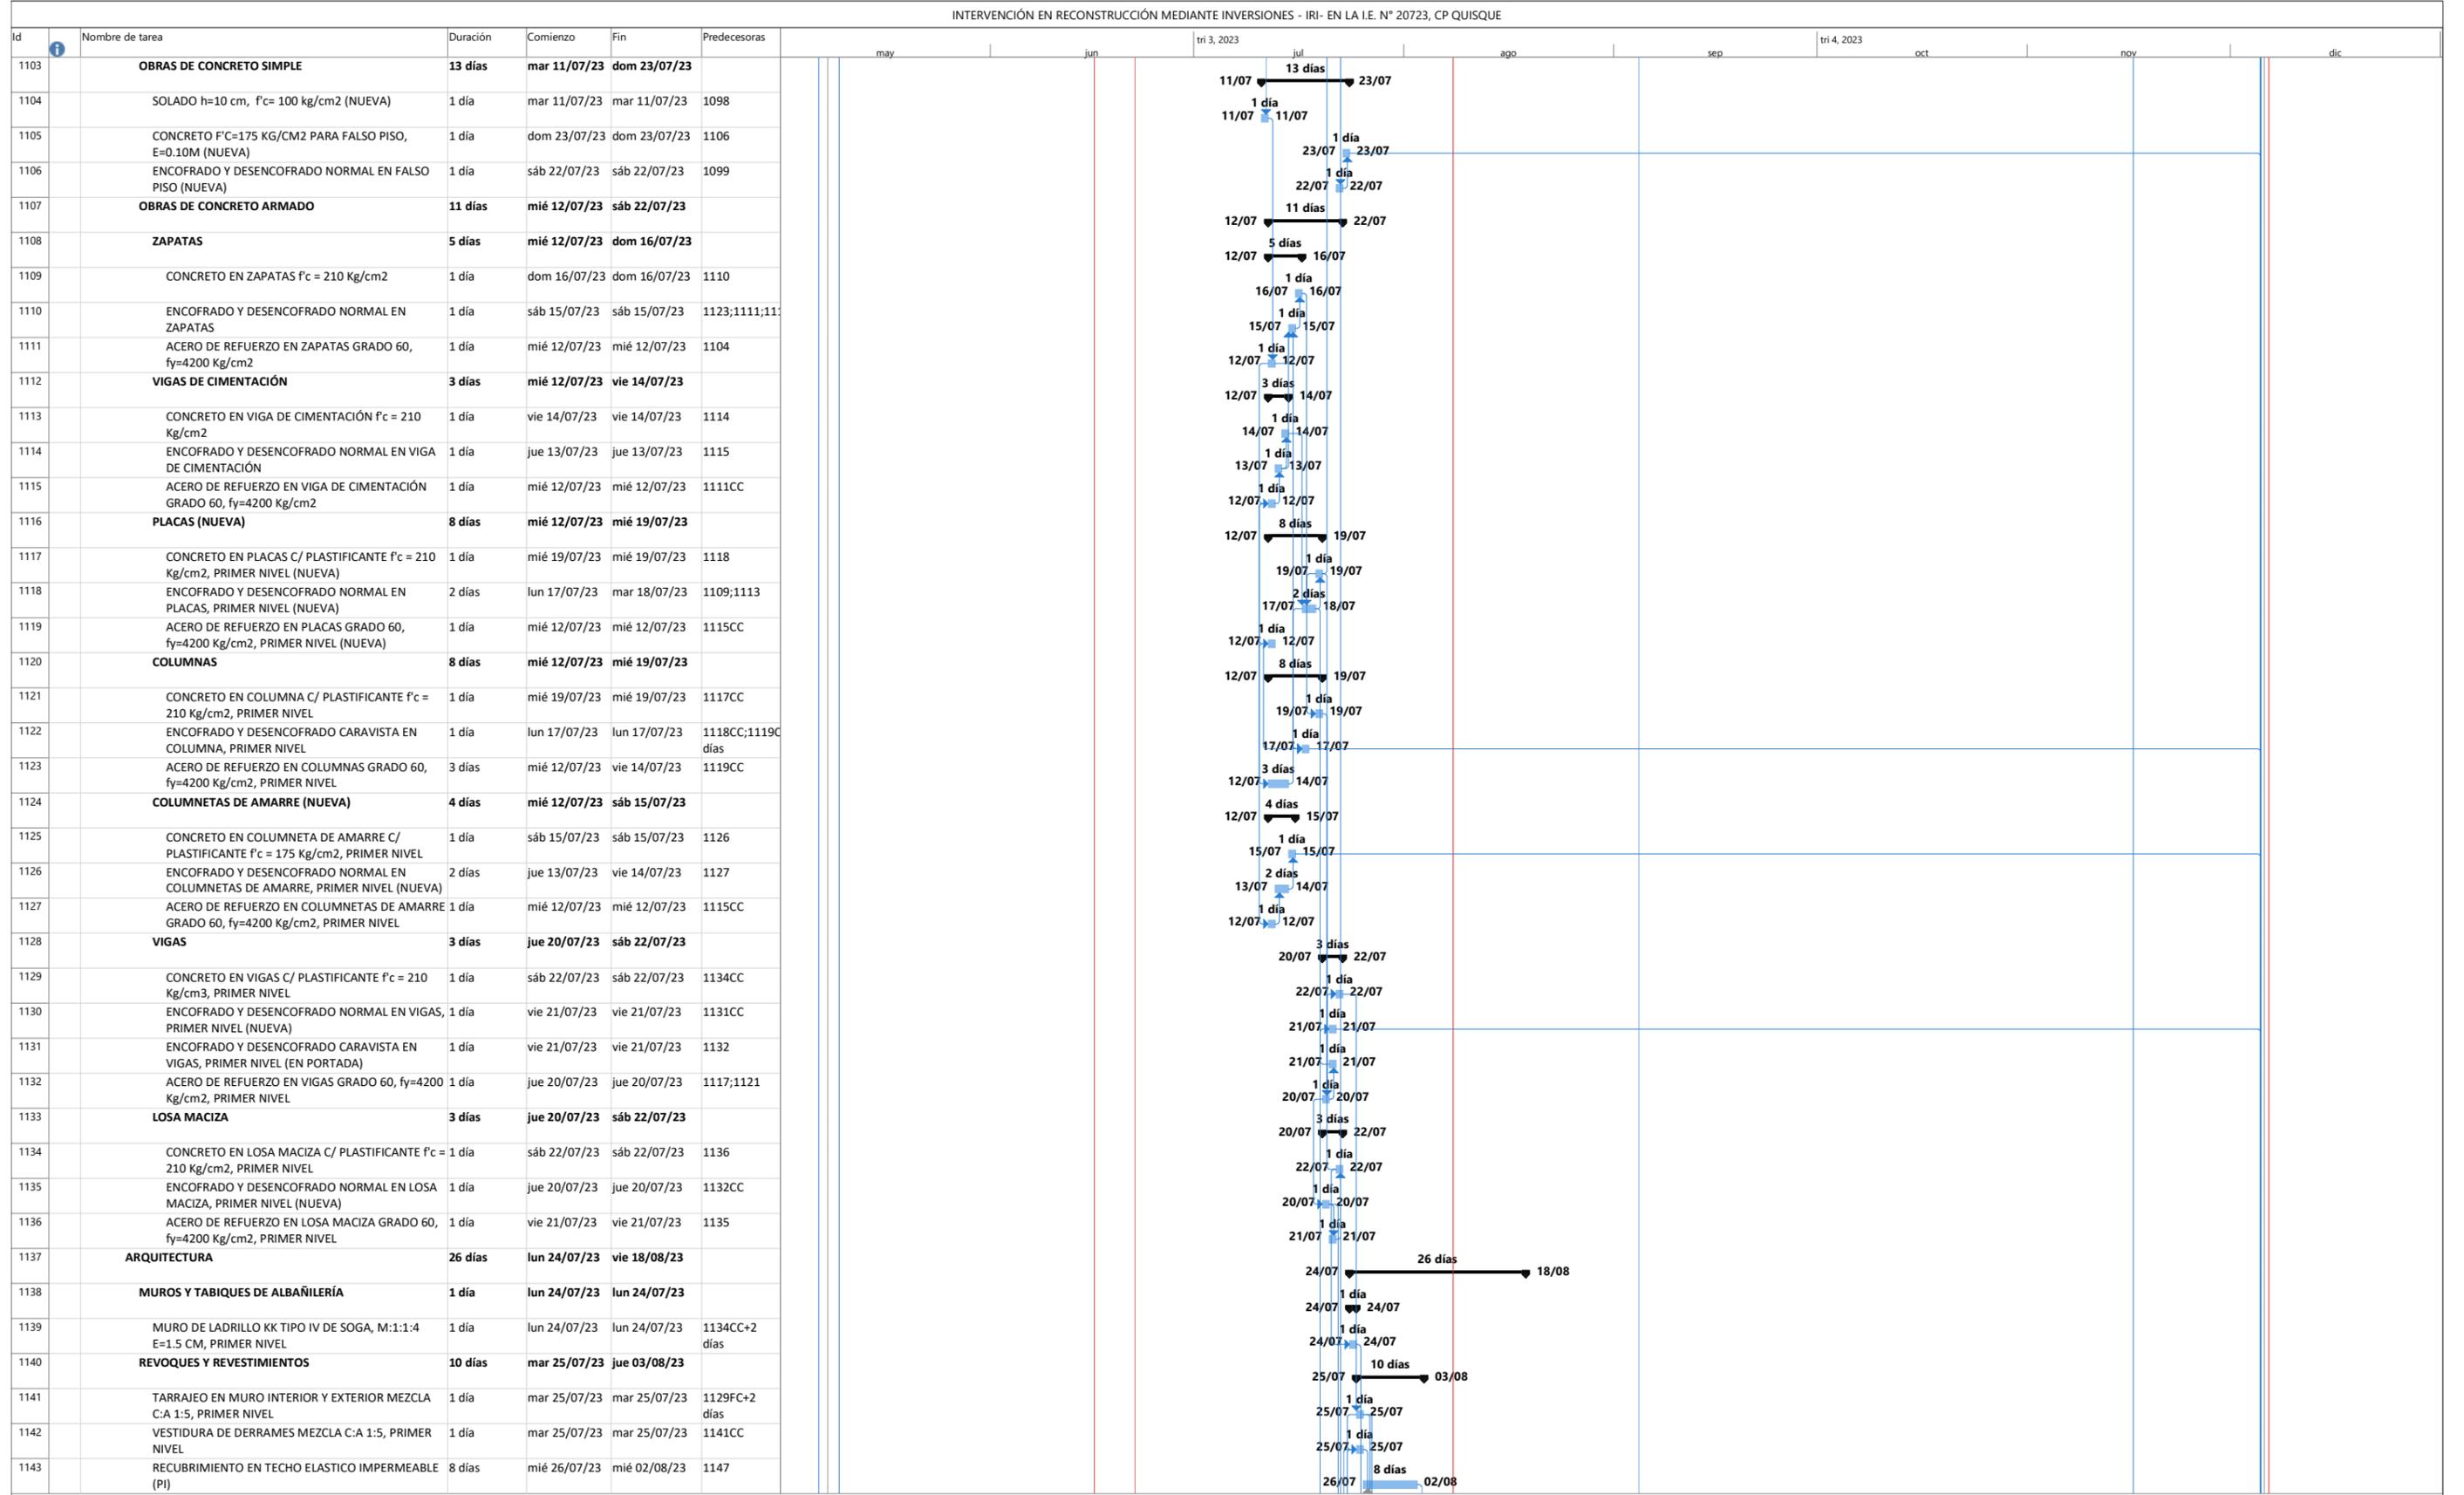


Proyecto: j||||| Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Página 28

INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

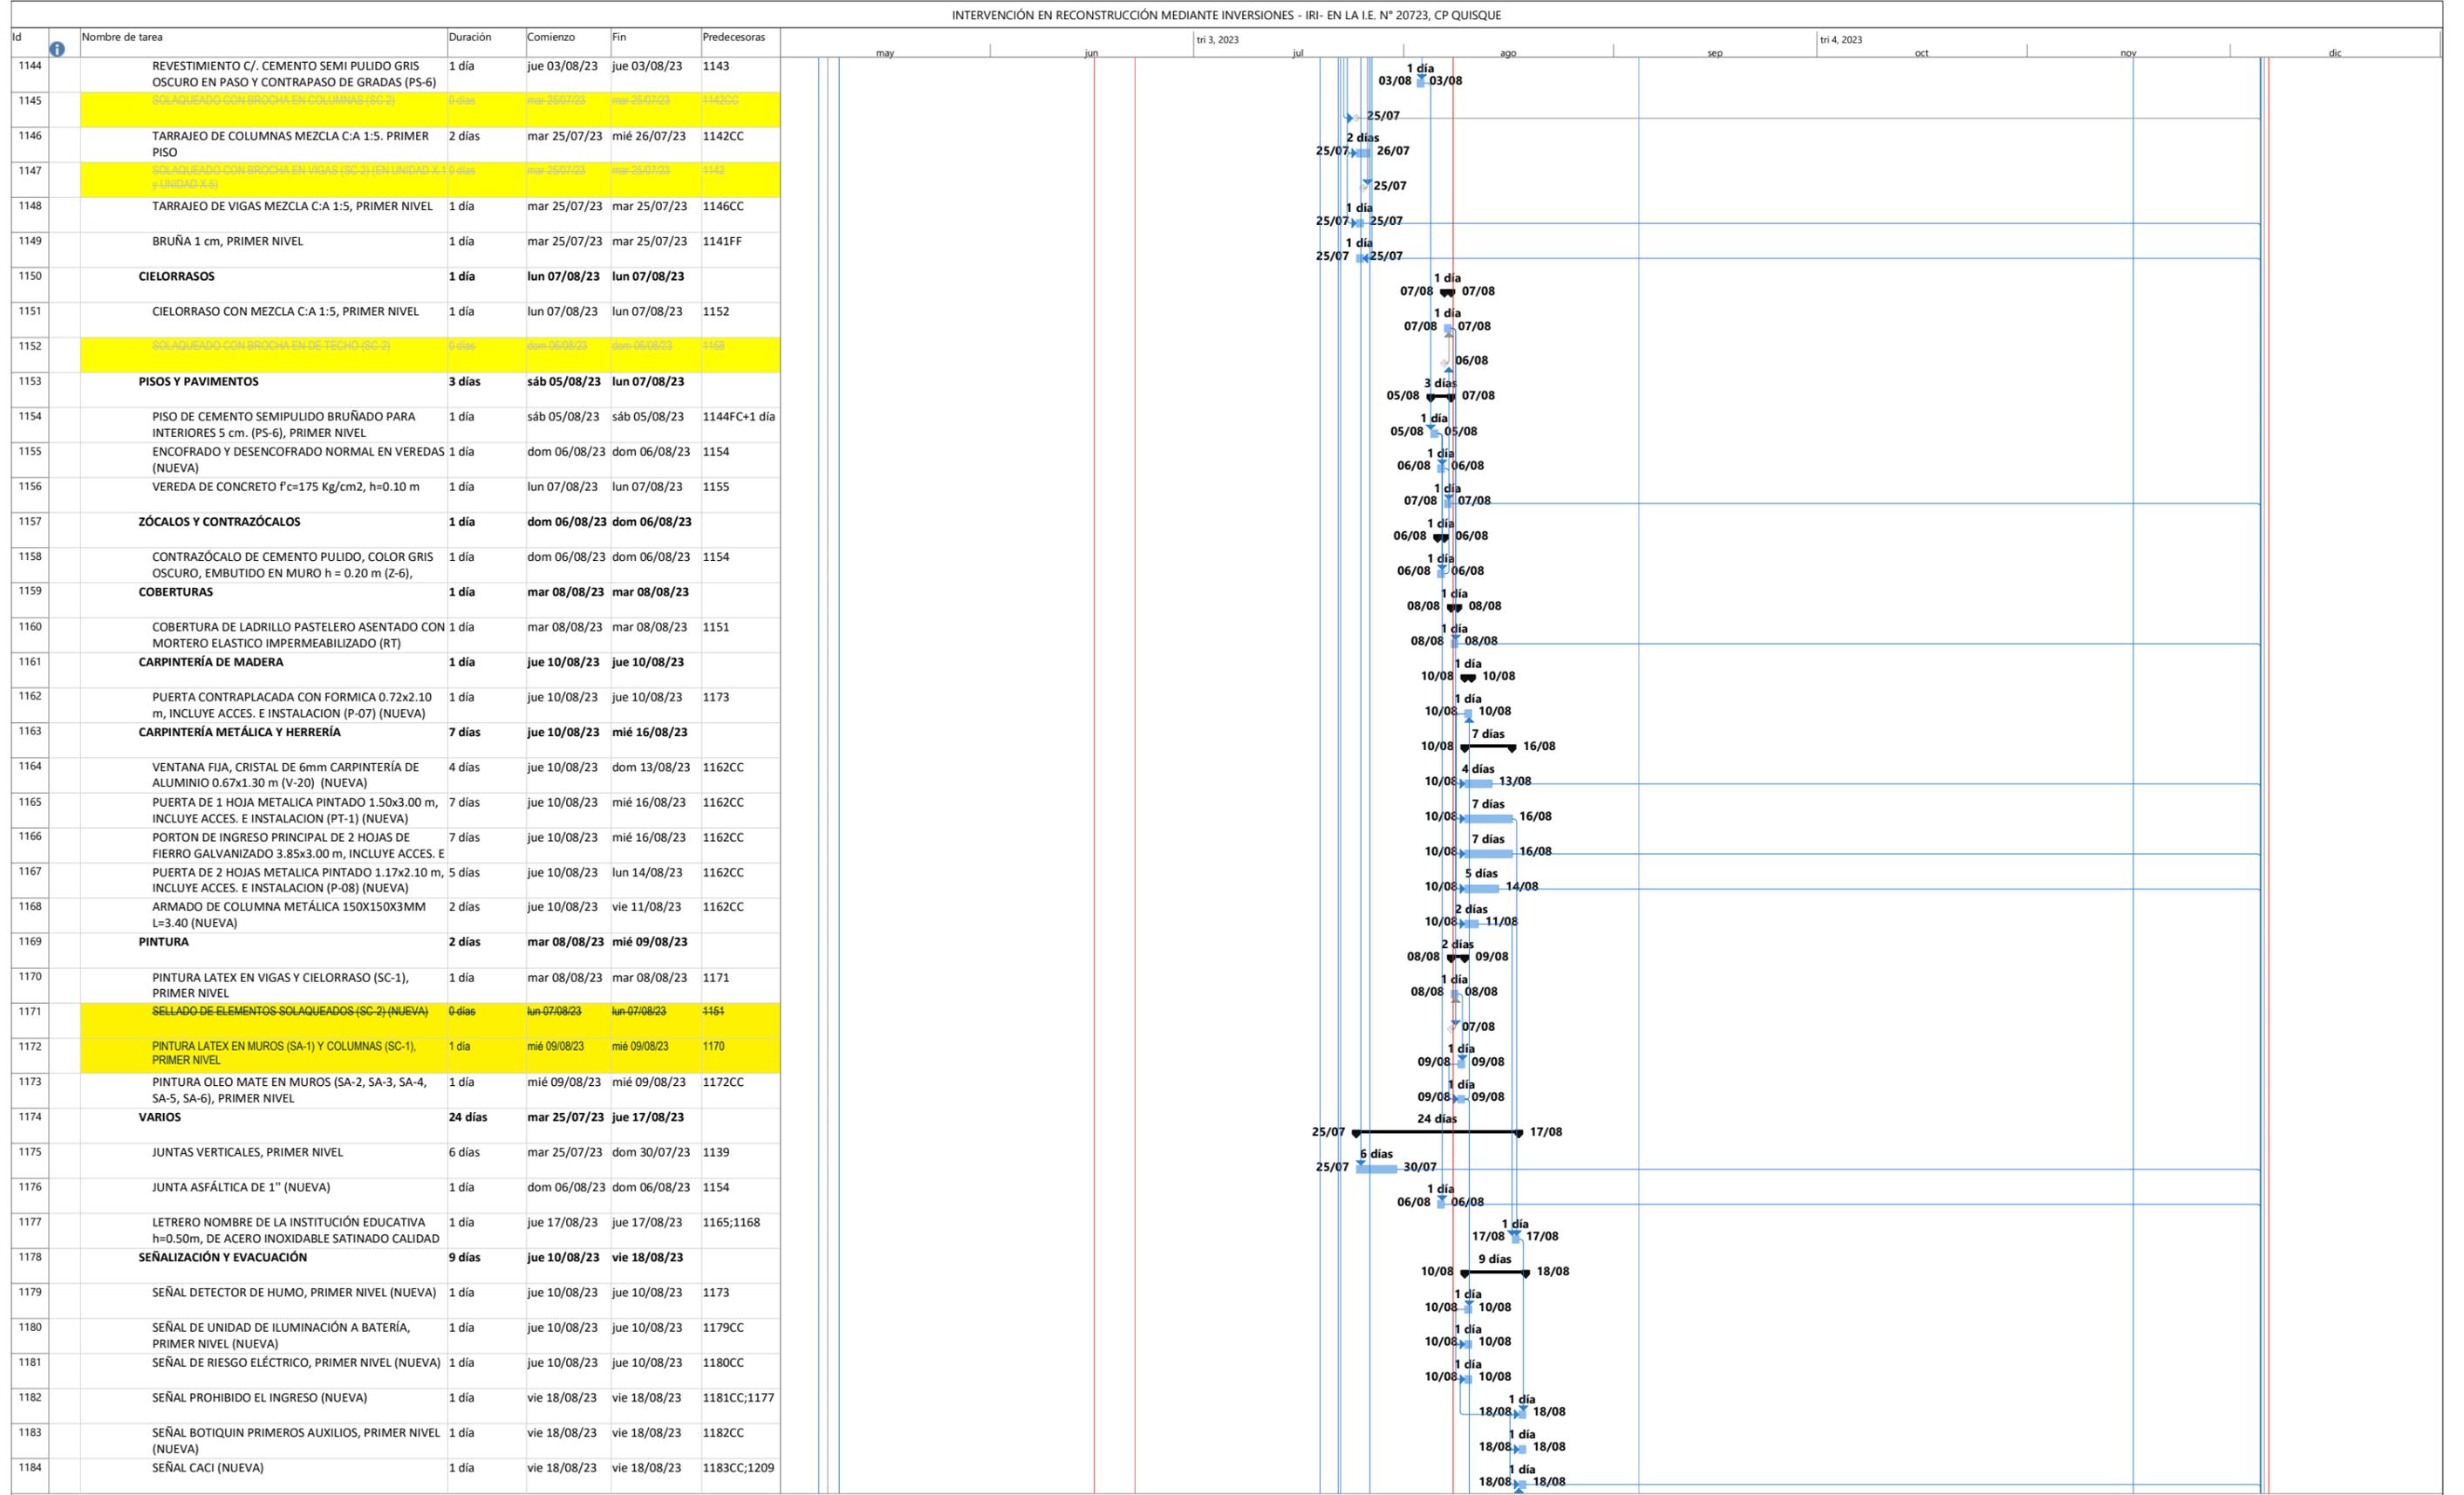

Proyecto: [icon] Fecha: mié 19/03/25

Tarea	[bar]	Resumen	[bar]	Hito inactivo	[diamond]	solo duración	[bar]	solo el comienzo	[C]	Hito externo	[diamond]	División crítica	[dotted]
División	[dotted]	Resumen del proyecto	[bar]	Resumen inactivo	[bar]	Informe de resumen manual	[bar]	solo fin	[C]	Fecha limite	[down]	Progreso	[bar]
Hito	[diamond]	Tarea inactiva	[bar]	Tarea manual	[bar]	Resumen manual	[bar]	Tareas externas	[bar]	Tareas criticas	[bar]	Progreso manual	[bar]


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1185	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	25 días	mié 19/07/23	sáb 12/08/23	
1186	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED	2 días	vie 28/07/23	sáb 29/07/23	
1187	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO, PRIMER PISO	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	1190CC
1188	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA, PRIMER NIVEL	1 día	sáb 29/07/23	sáb 29/07/23	1187
1189	SALIDAS PARA INTERRUPTORES	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	
1190	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE, PRIMER NIVEL	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	1201
1191	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES	1 día	sáb 29/07/23	sáb 29/07/23	
1192	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y	1 día	sáb 29/07/23	sáb 29/07/23	1200FC+1 día
1193	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	
1194	TUBERIA SOPORTE DE Fe. DE LUMINARIA 20 mm (NUEVA)	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	1201
1195	TUBERÍA EMT CONDUIT 20 mm, PRIMER NIVEL (NUEVA)	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	1194CC
1196	CAJAS DE PASE	2 días	mié 19/07/23	jue 20/07/23	
1197	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm, PRIMER NIVEL	1 día	jue 20/07/23	jue 20/07/23	1135FF;1198
1198	CAJA DE PASE RECTANGULAR DE FºGº PESADA DE 100x55x50mm, PRIMER NIVEL	1 día	mié 19/07/23	mié 19/07/23	1118
1199	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA	1 día	jue 27/07/23	jue 27/07/23	
1200	CABLE LSOH-80 4.0 mm2, PRIMER NIVEL	1 día	jue 27/07/23	jue 27/07/23	1141FC+1 día
1201	CABLE LSOH-80 2.5 mm2, PRIMER NIVEL	1 día	jue 27/07/23	jue 27/07/23	1200CC
1202	TABLEROS ELÉCTRICOS	1 día	vie 21/07/23	vie 21/07/23	
1203	TABLERO ELÉCTRICO GENERAL, GABINETE METALICO, DEL TIPO ADOSAR , IP-54, EQUIPADO CON	1 día	vie 21/07/23	vie 21/07/23	1197
1204	ARTEFACTOS	1 día	jue 10/08/23	jue 10/08/23	
1205	ARTEFACTO HERMETICO LED, PARA SUSPENDER, EQUIPO LED 15W, 1,863lm, 4000K INCLUYE	1 día	jue 10/08/23	jue 10/08/23	1173;1229
1206	LUZ DE EMERGENCIA LED PARA ADOSAR IP65, ALIMENTACION 230VAC +/- 10% CLASE II AUTONOMIA	1 día	jue 10/08/23	jue 10/08/23	1205CC
1207	VARIOS	2 días	vie 11/08/23	sáb 12/08/23	
1208	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO, PRIMER NIVEL	1 día	vie 11/08/23	vie 11/08/23	1206
1209	PRUEBAS DEL NIVEL DE AISLAMIENTO EN CADA TABLERO, PRIMER NIVEL (NUEVA)	1 día	sáb 12/08/23	sáb 12/08/23	1208
1210	INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES (NUEVA)	12 días	jue 20/07/23	lun 31/07/23	
1211	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES	3 días	vie 28/07/23	dom 30/07/23	
1212	SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE (NUEVA)	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	1220
1213	SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	1212CC
1214	SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE	1 día	dom 30/07/23	dom 30/07/23	1213CC;1195;
1215	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO (NUEVA)	1 día	dom 30/07/23	dom 30/07/23	1214CC
1216	SALIDA DE DETECTOR DE HUMO, PRIMER NIVEL (NUEVA)	1 día	dom 30/07/23	dom 30/07/23	1215CC
1217	CAJAS DE PASE	1 día	jue 20/07/23	jue 20/07/23	
1218	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 200x200x100 mm, PRIMER NIVEL	1 día	jue 20/07/23	jue 20/07/23	1197CC
1219	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA	1 día	jue 27/07/23	jue 27/07/23	
1220	CABLE FLP 4X18AWG LSOH, PRIMER NIVEL (NUEVA)	1 día	jue 27/07/23	jue 27/07/23	1201CC
1221	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS	1 día	jue 20/07/23	jue 20/07/23	
1222	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 25 mm, PRIMER NIVEL	1 día	jue 20/07/23	jue 20/07/23	1218CC
1223	ARTEFACTOS	3 días	sáb 29/07/23	lun 31/07/23	
1224	PULSADOR DE TIMBRE (NUEVA)	1 día	sáb 29/07/23	sáb 29/07/23	1212
1225	TIMBRE TIPO DING-DONG RECTANGULAR (NUEVA)	1 día	sáb 29/07/23	sáb 29/07/23	1224CC

Proyecto: j|||||
 Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

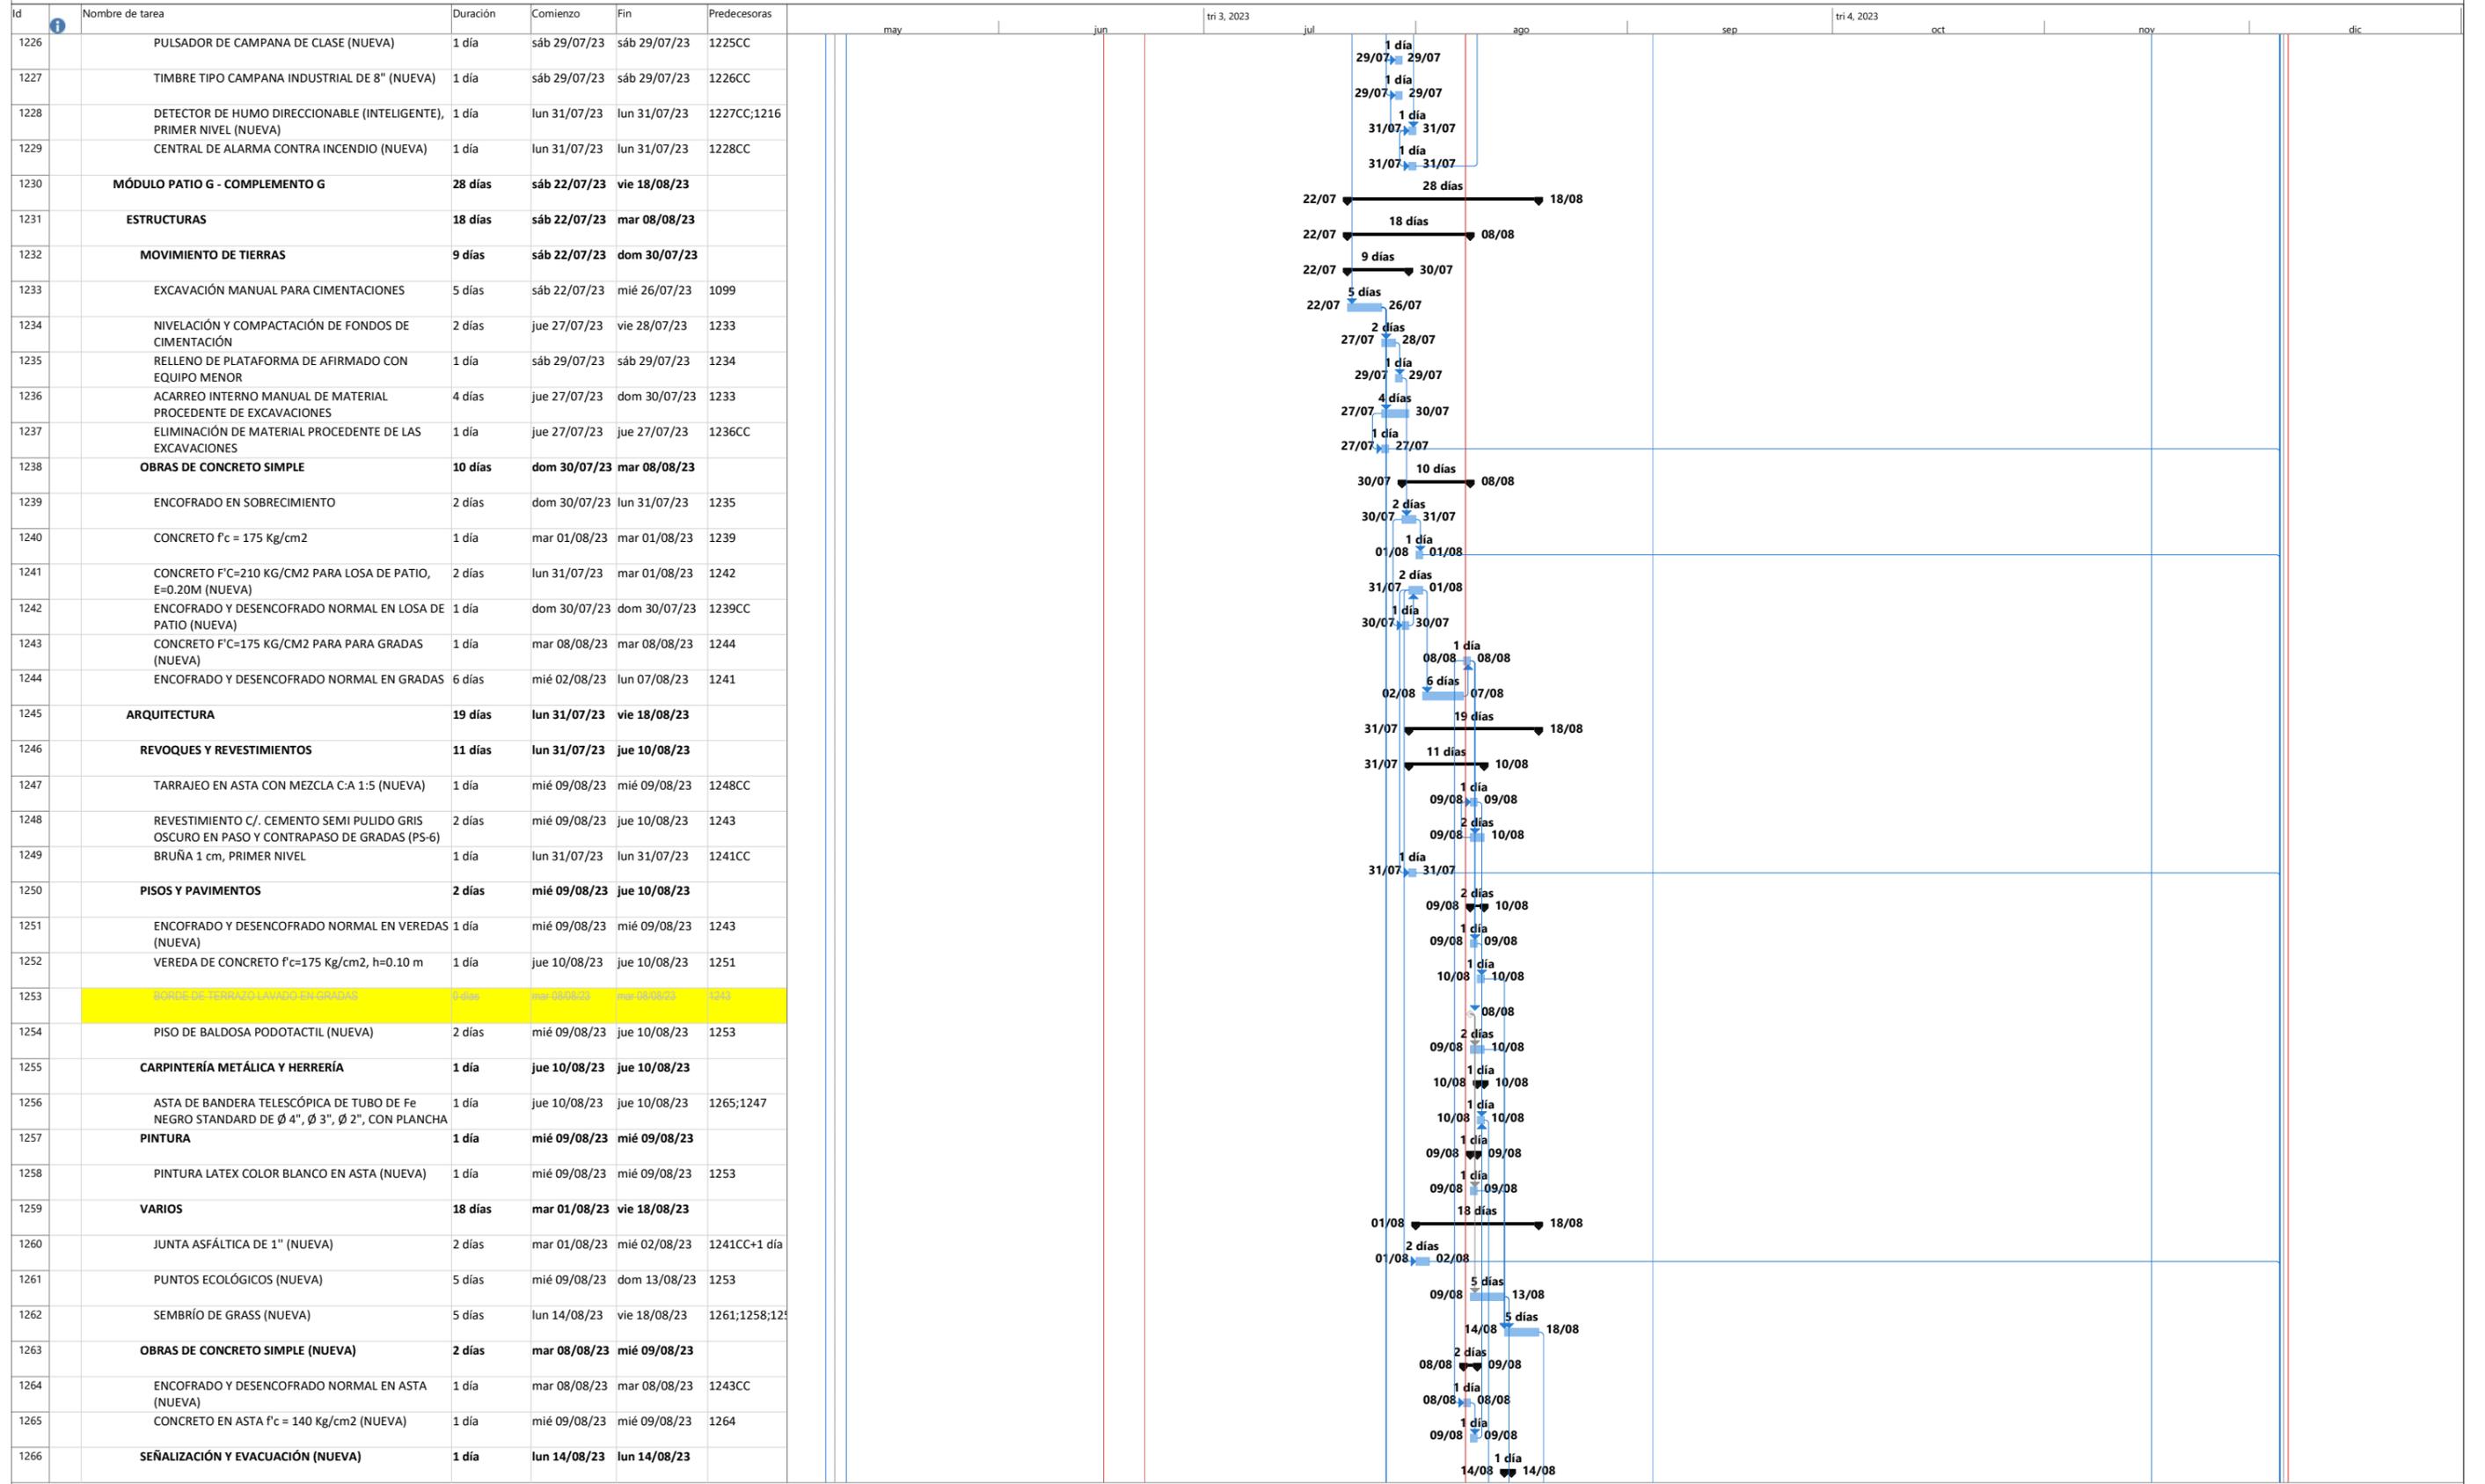

Proyecto: [icon] Fecha: mié 19/03/25

Tarea	[blue bar]	Resumen	[black diamond]	Hito inactivo	[grey diamond]	solo duración	[red bar]	solo el comienzo	[blue square]	Hito externo	[green diamond]	División crítica	[red dotted line]
División	[dotted line]	Resumen del proyecto	[grey diamond]	Resumen inactivo	[grey diamond]	Informe de resumen manual	[red bar]	solo fin	[blue square]	Fecha limite	[green diamond]	Progreso	[red bar]
Hito	[blue diamond]	Tarea inactiva	[grey diamond]	Tarea manual	[grey diamond]	Resumen manual	[red bar]	Tareas externas	[blue square]	Tareas críticas	[green diamond]	Progreso manual	[red bar]


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

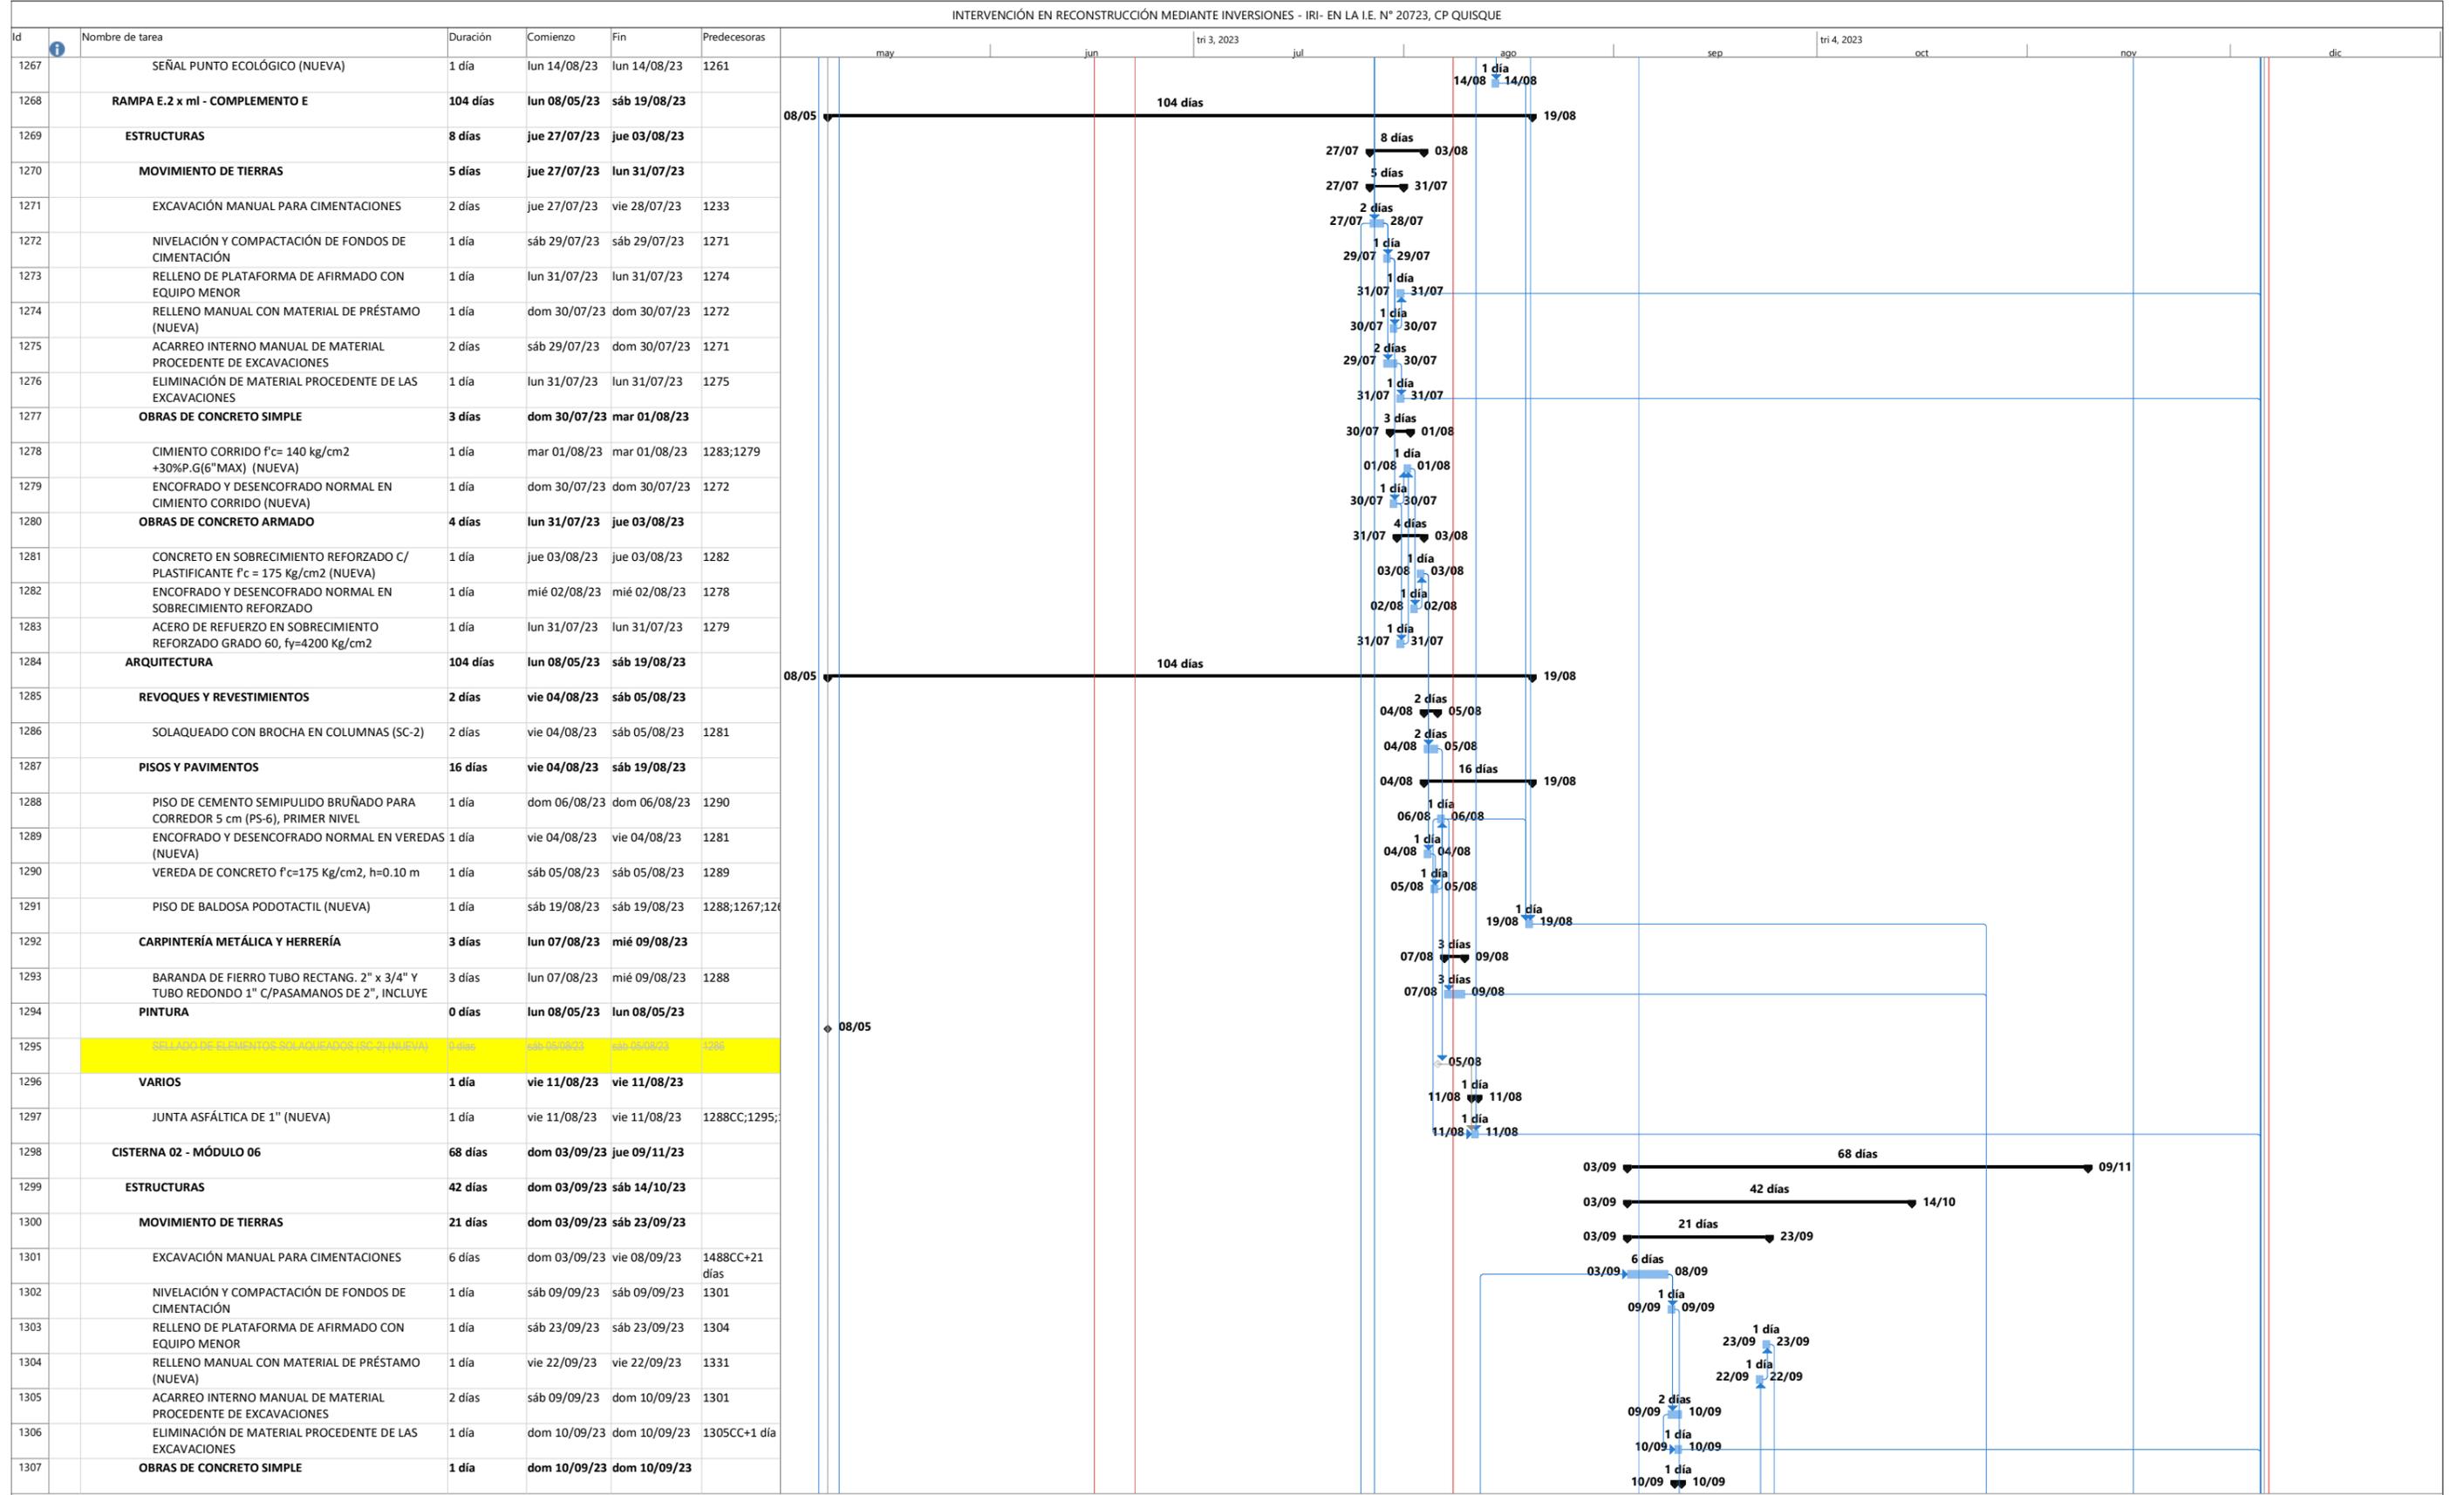

Proyecto: jujj
 Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

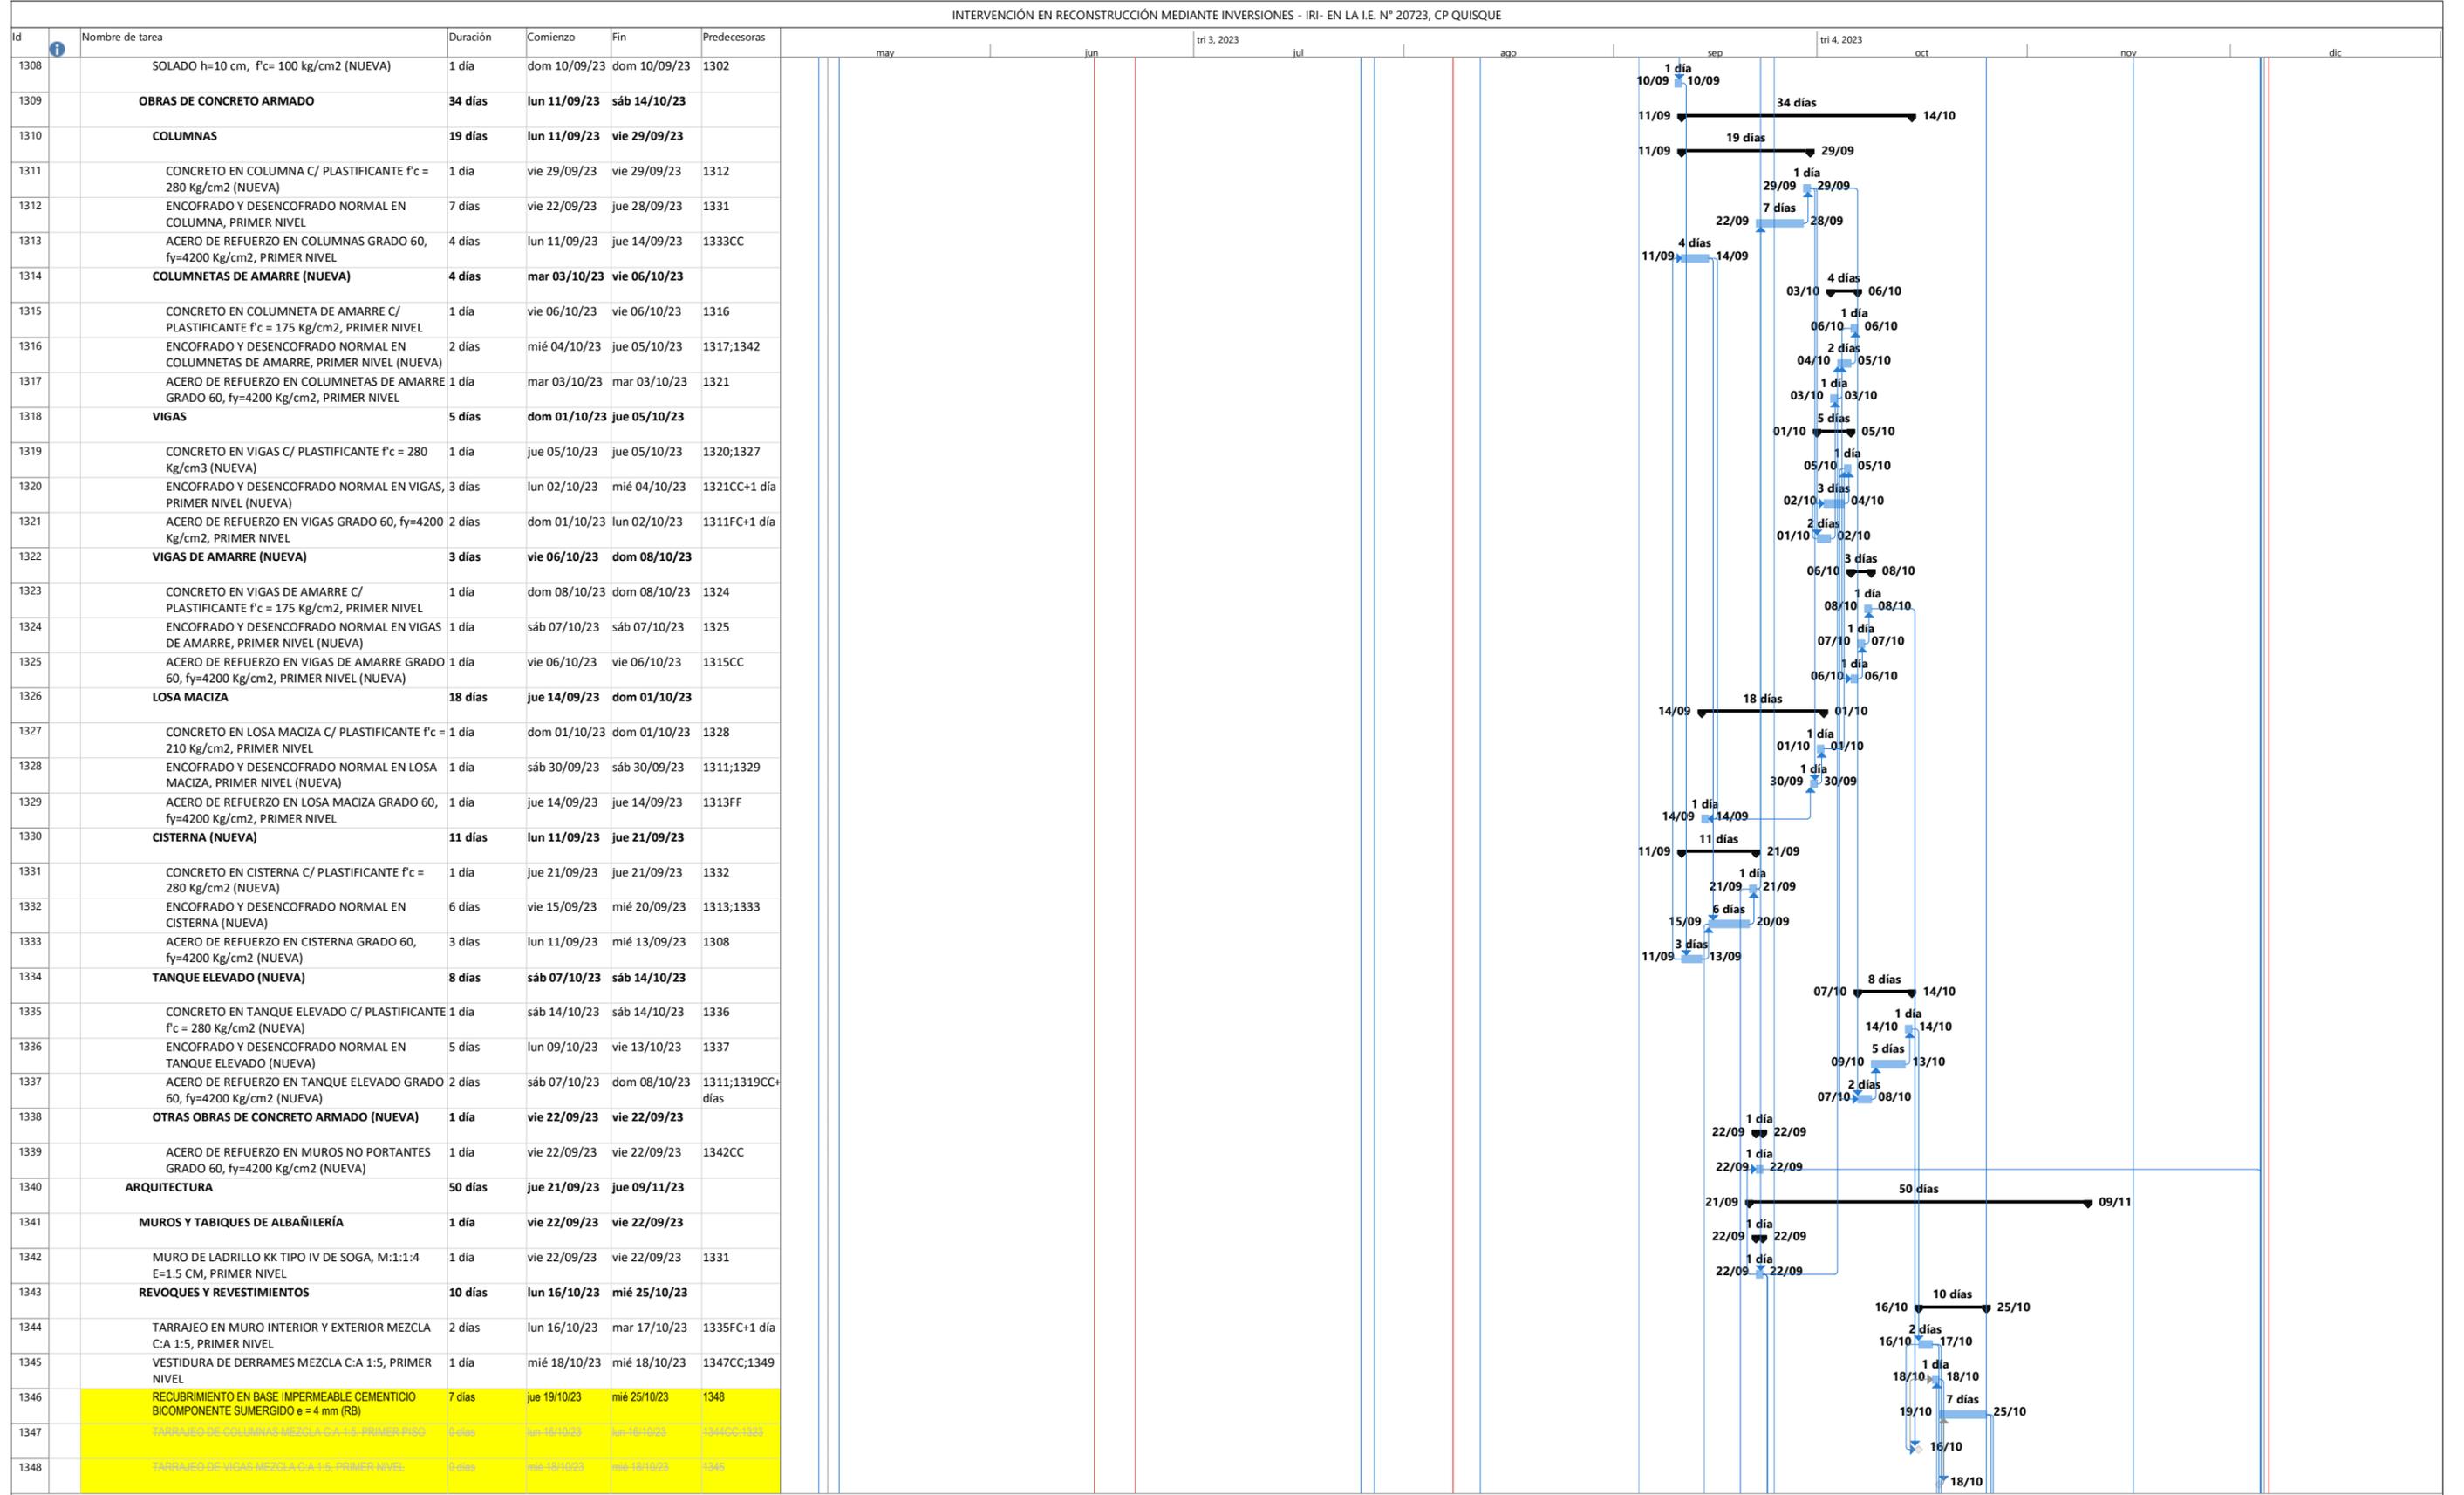

Proyecto: jiji
Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

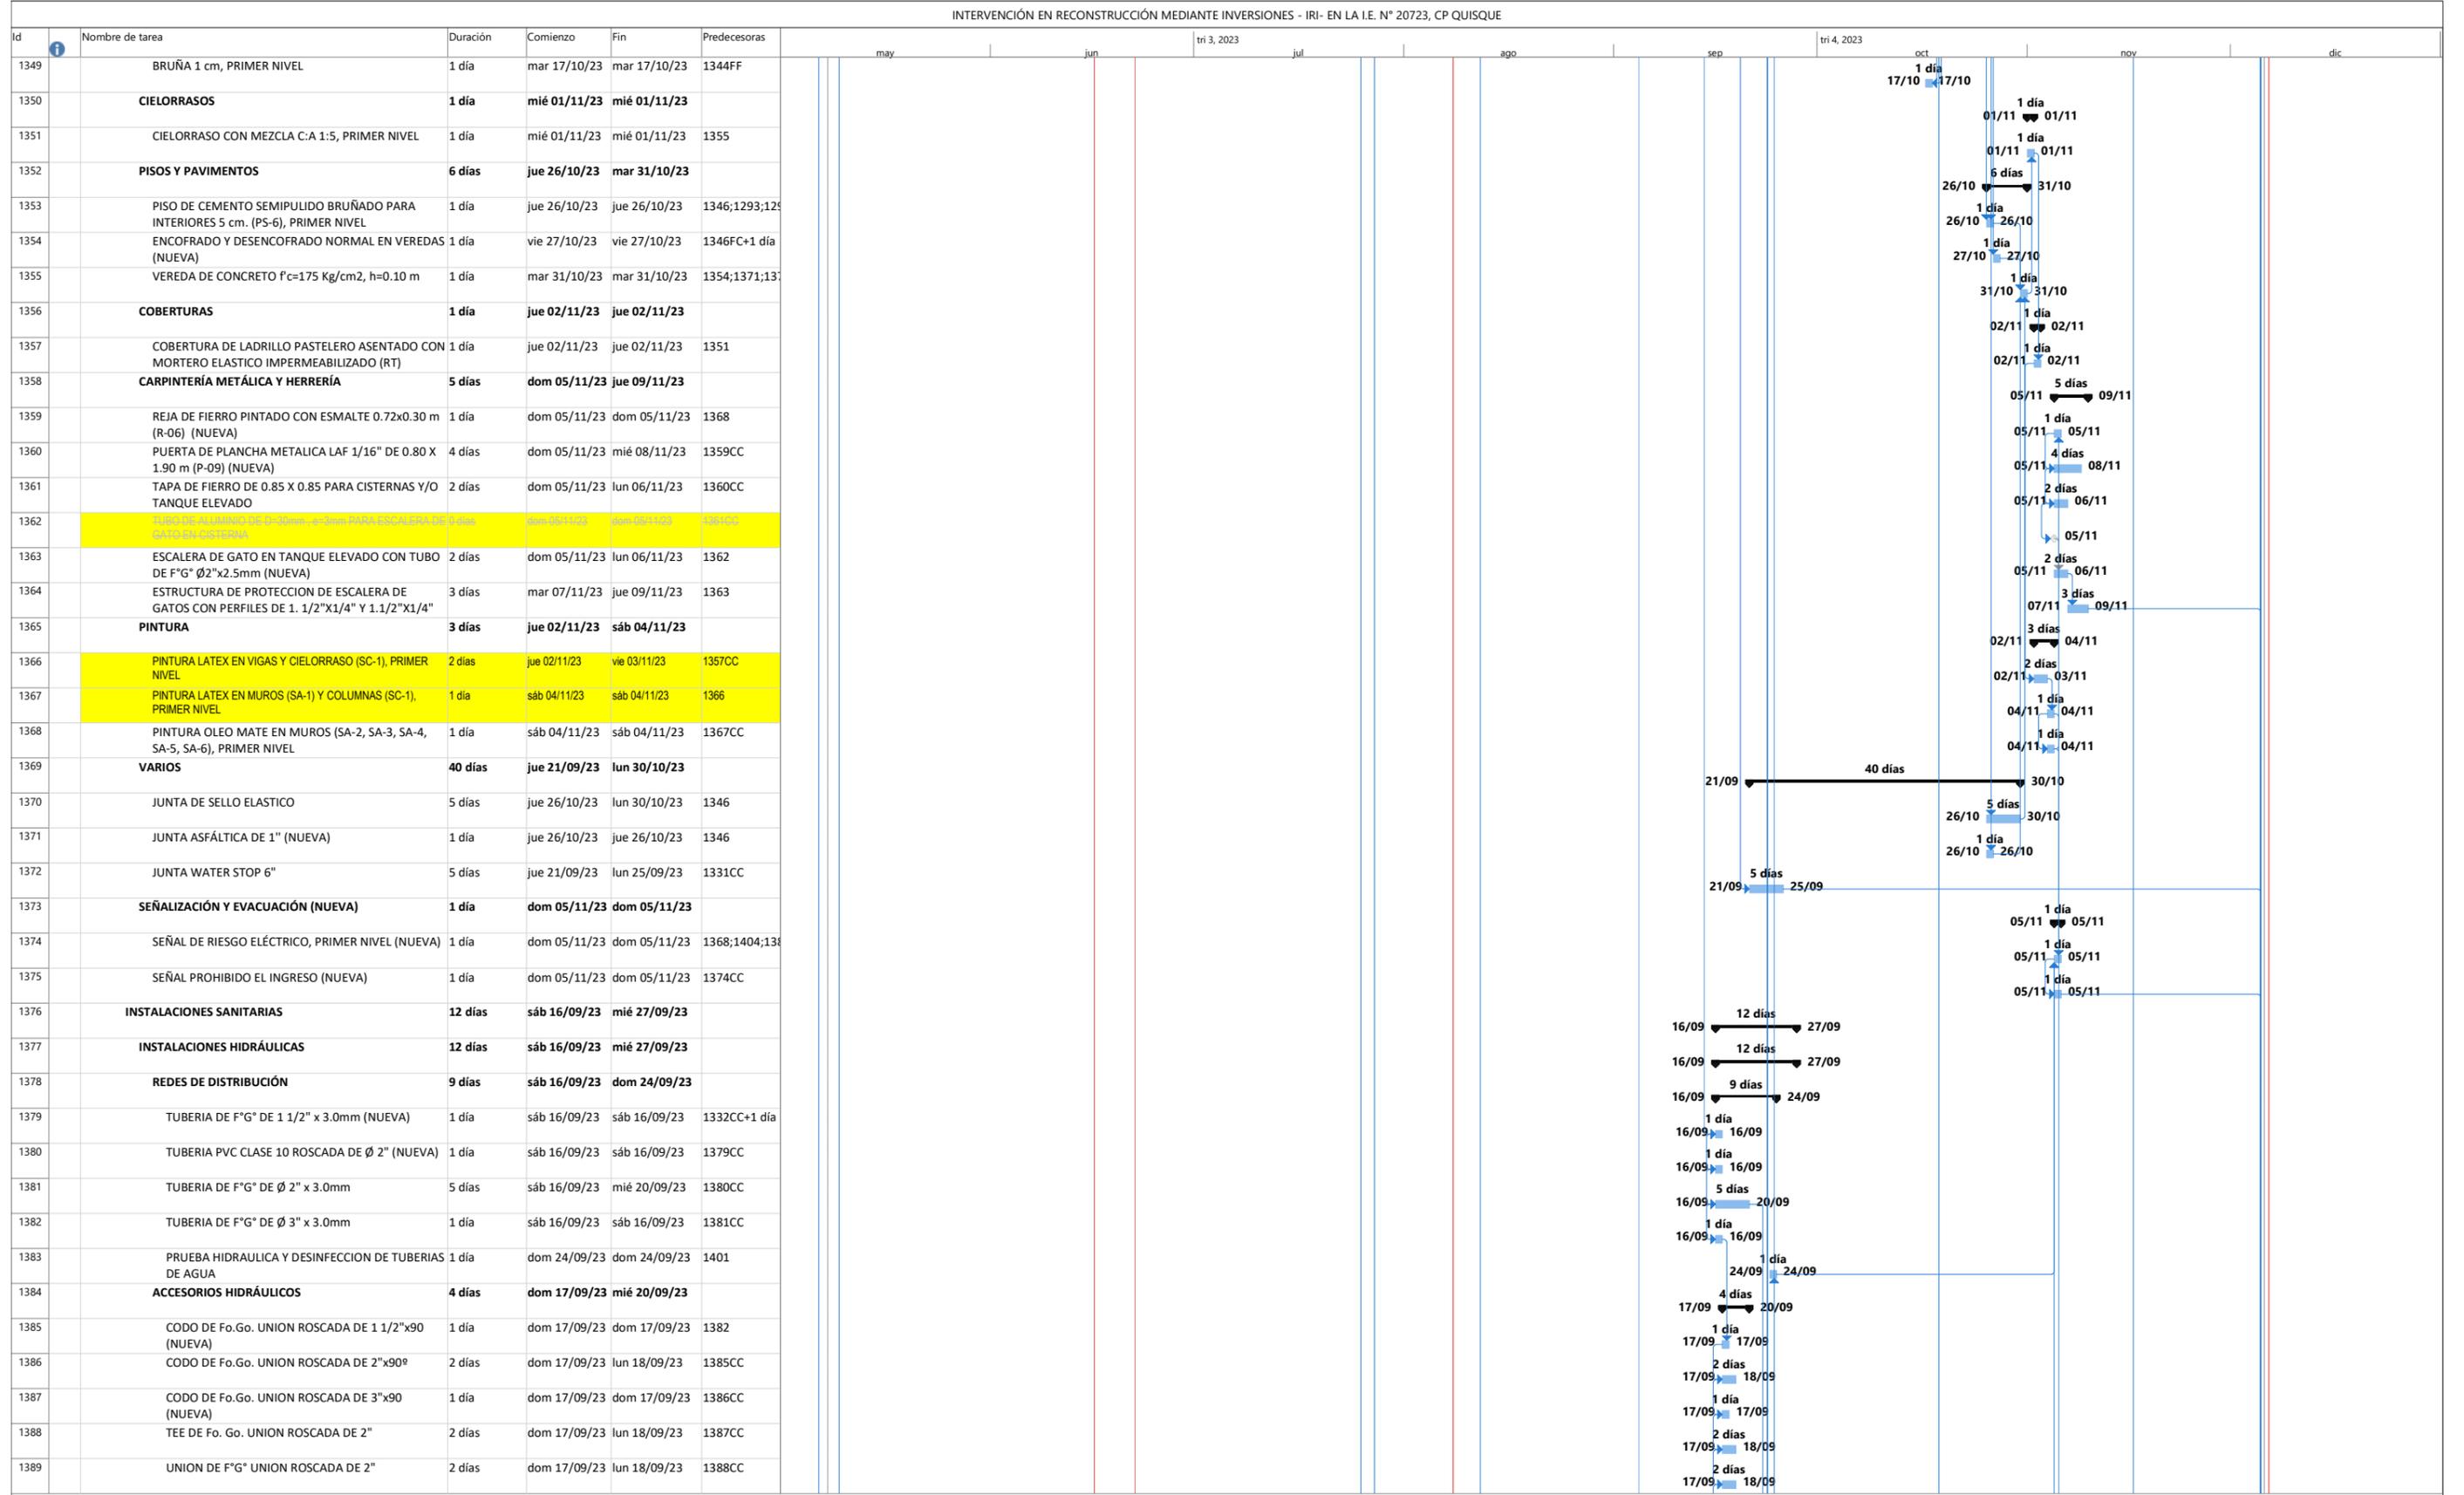

Proyecto: jujujj
 Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

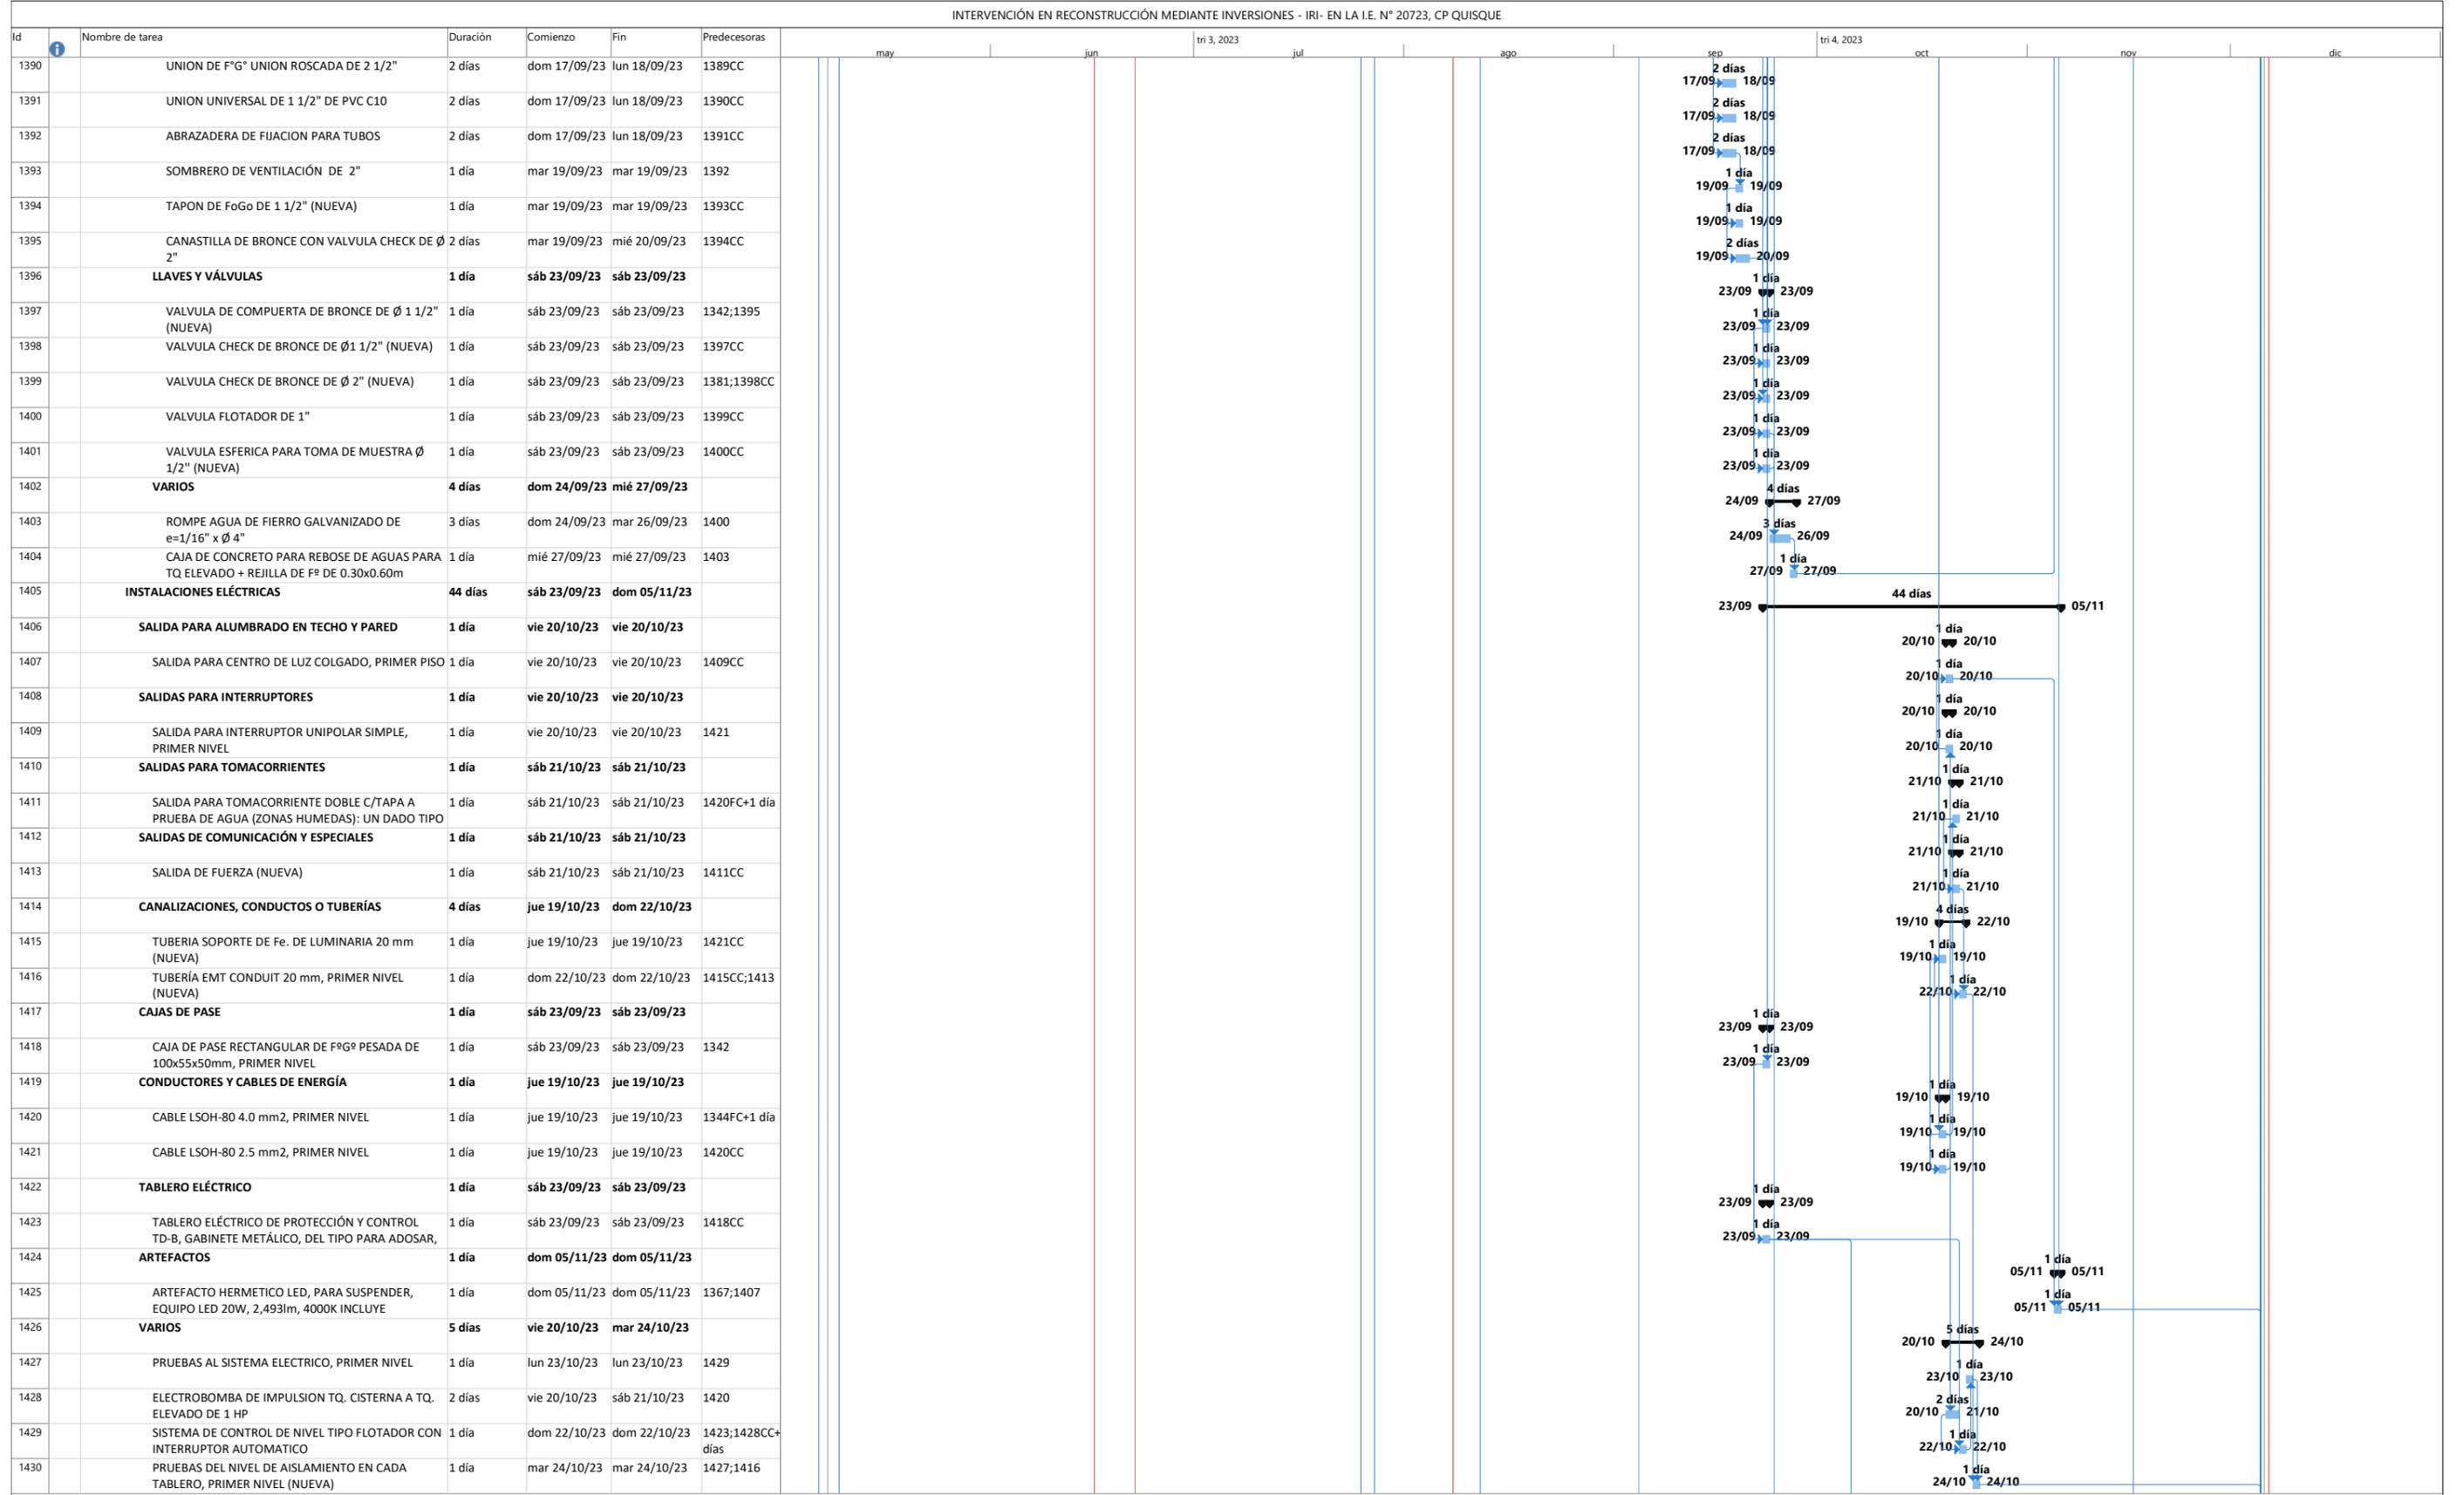

Proyecto: Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	Progreso
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso	Progreso manual
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	Progreso manual

INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

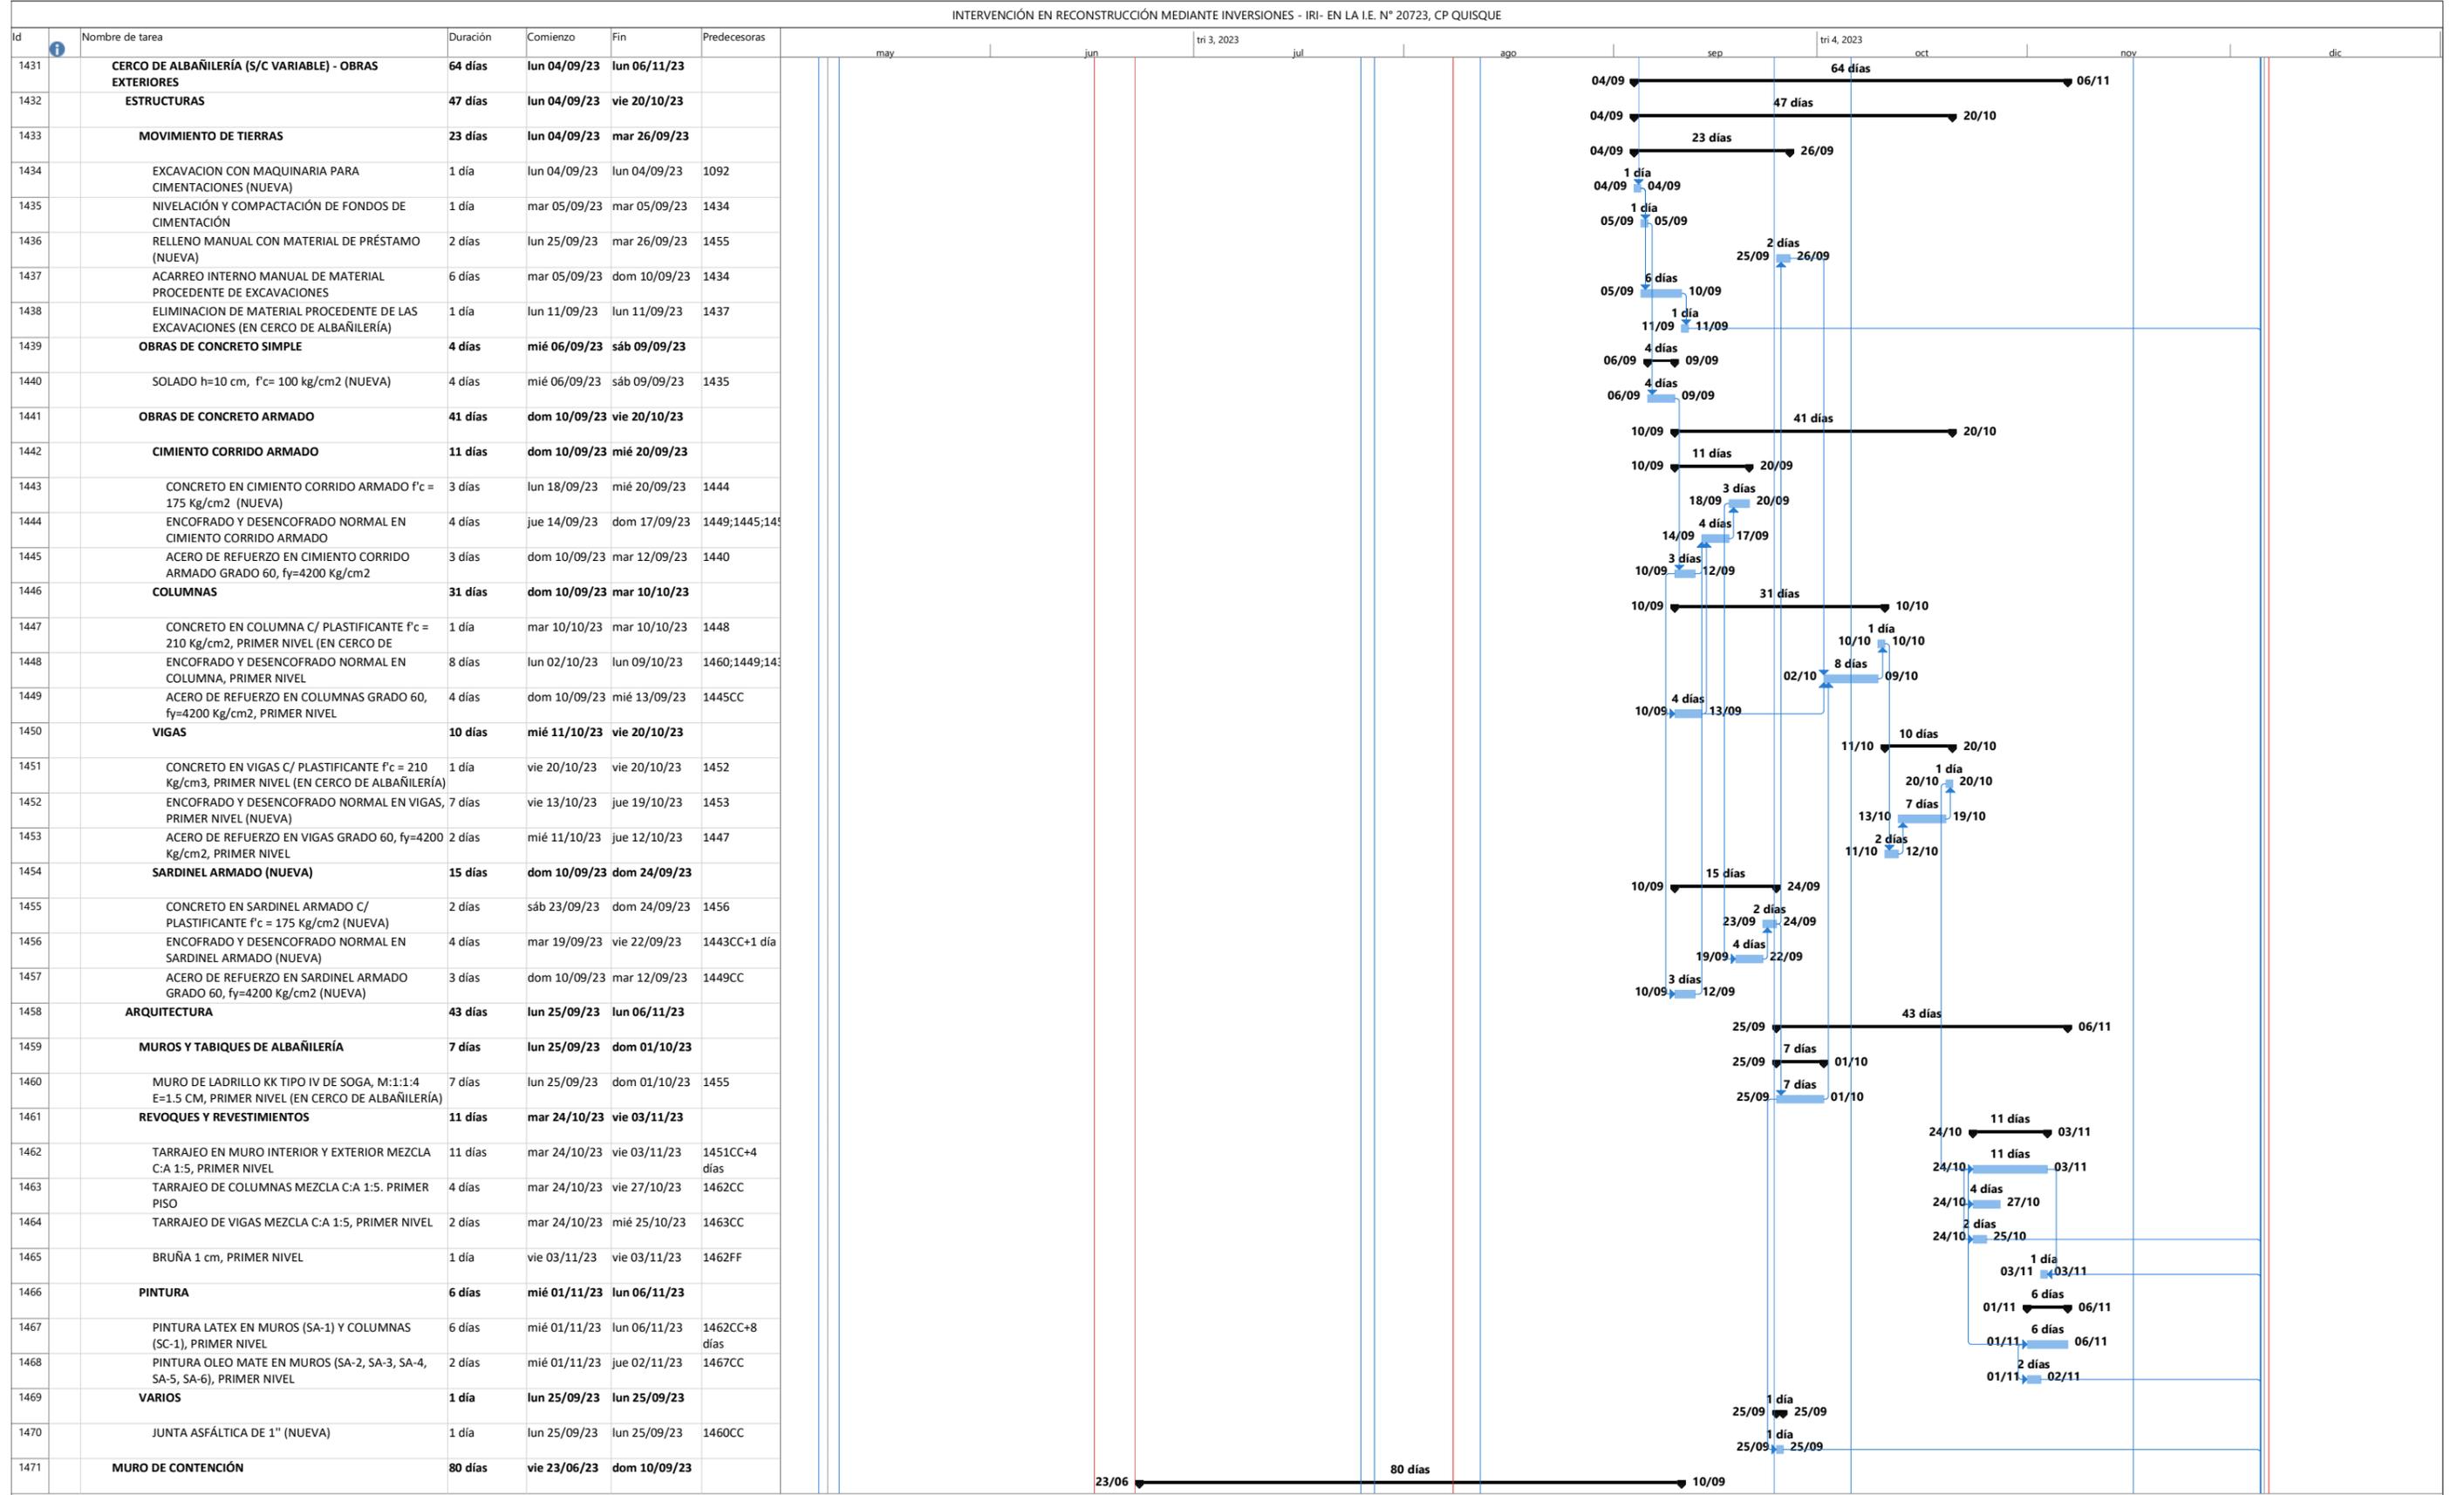


Proyecto: jujujj
Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual

Página 36


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

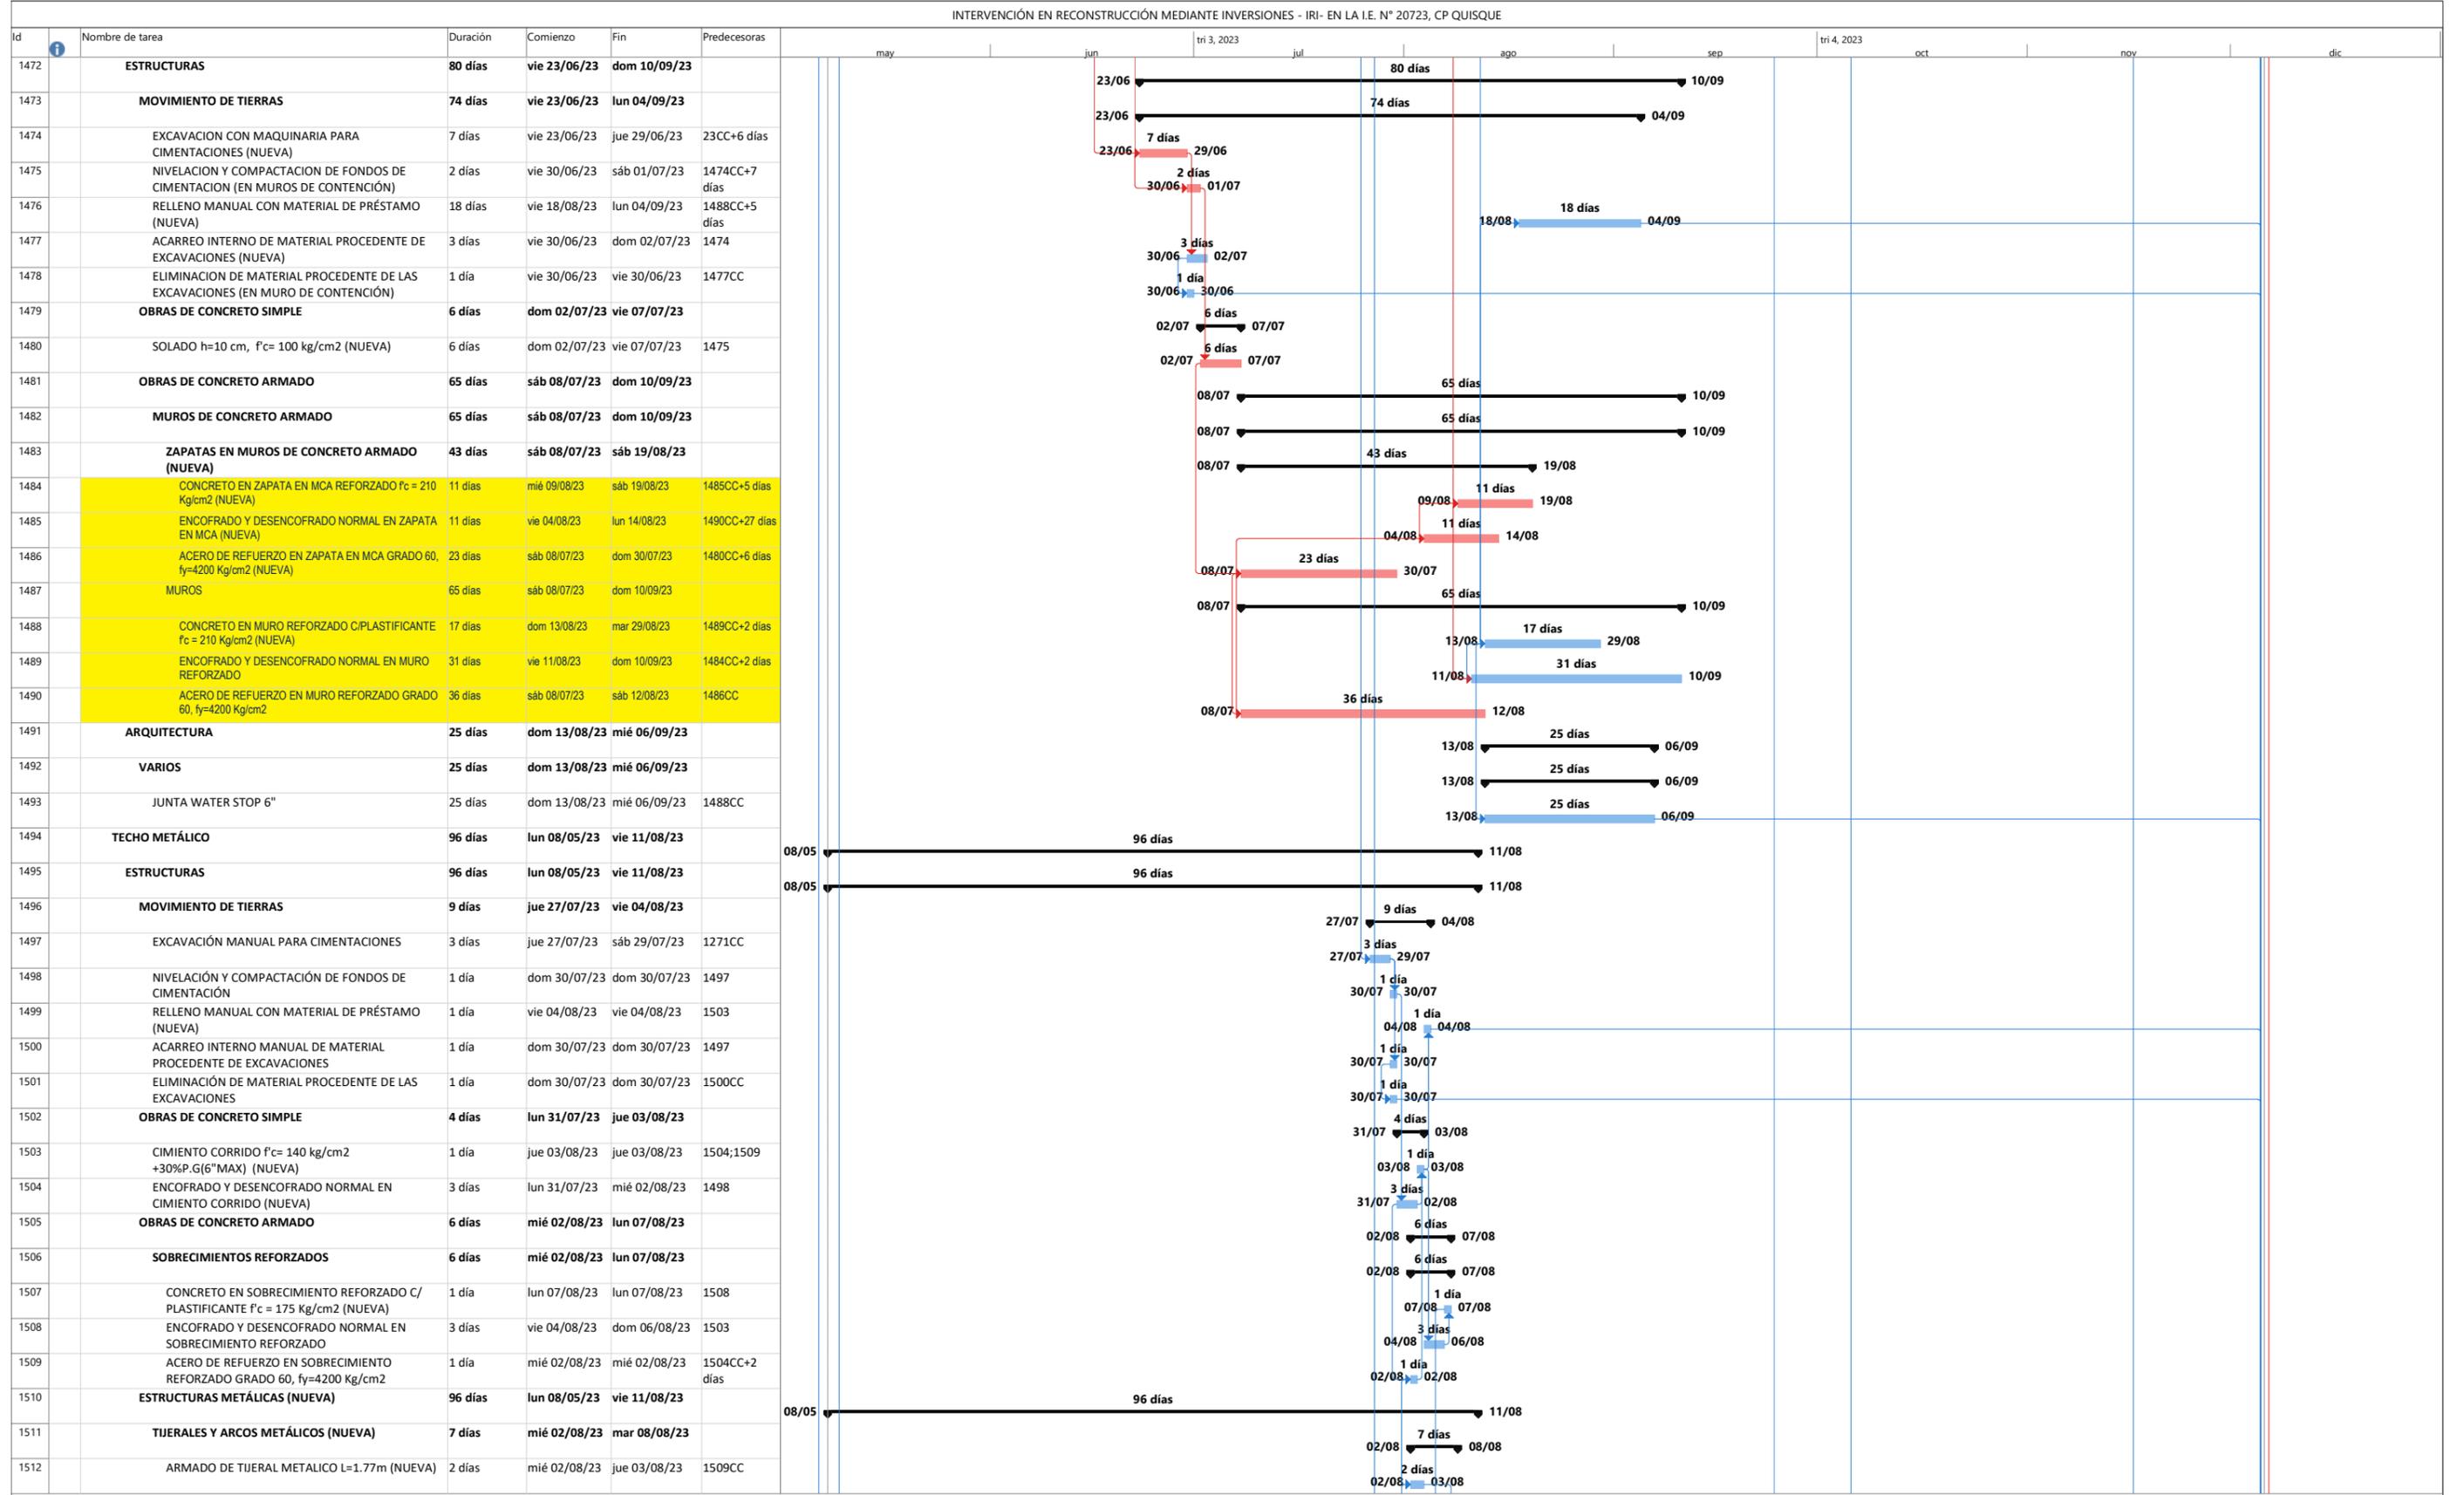

Proyecto: jujuj
 Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual


INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

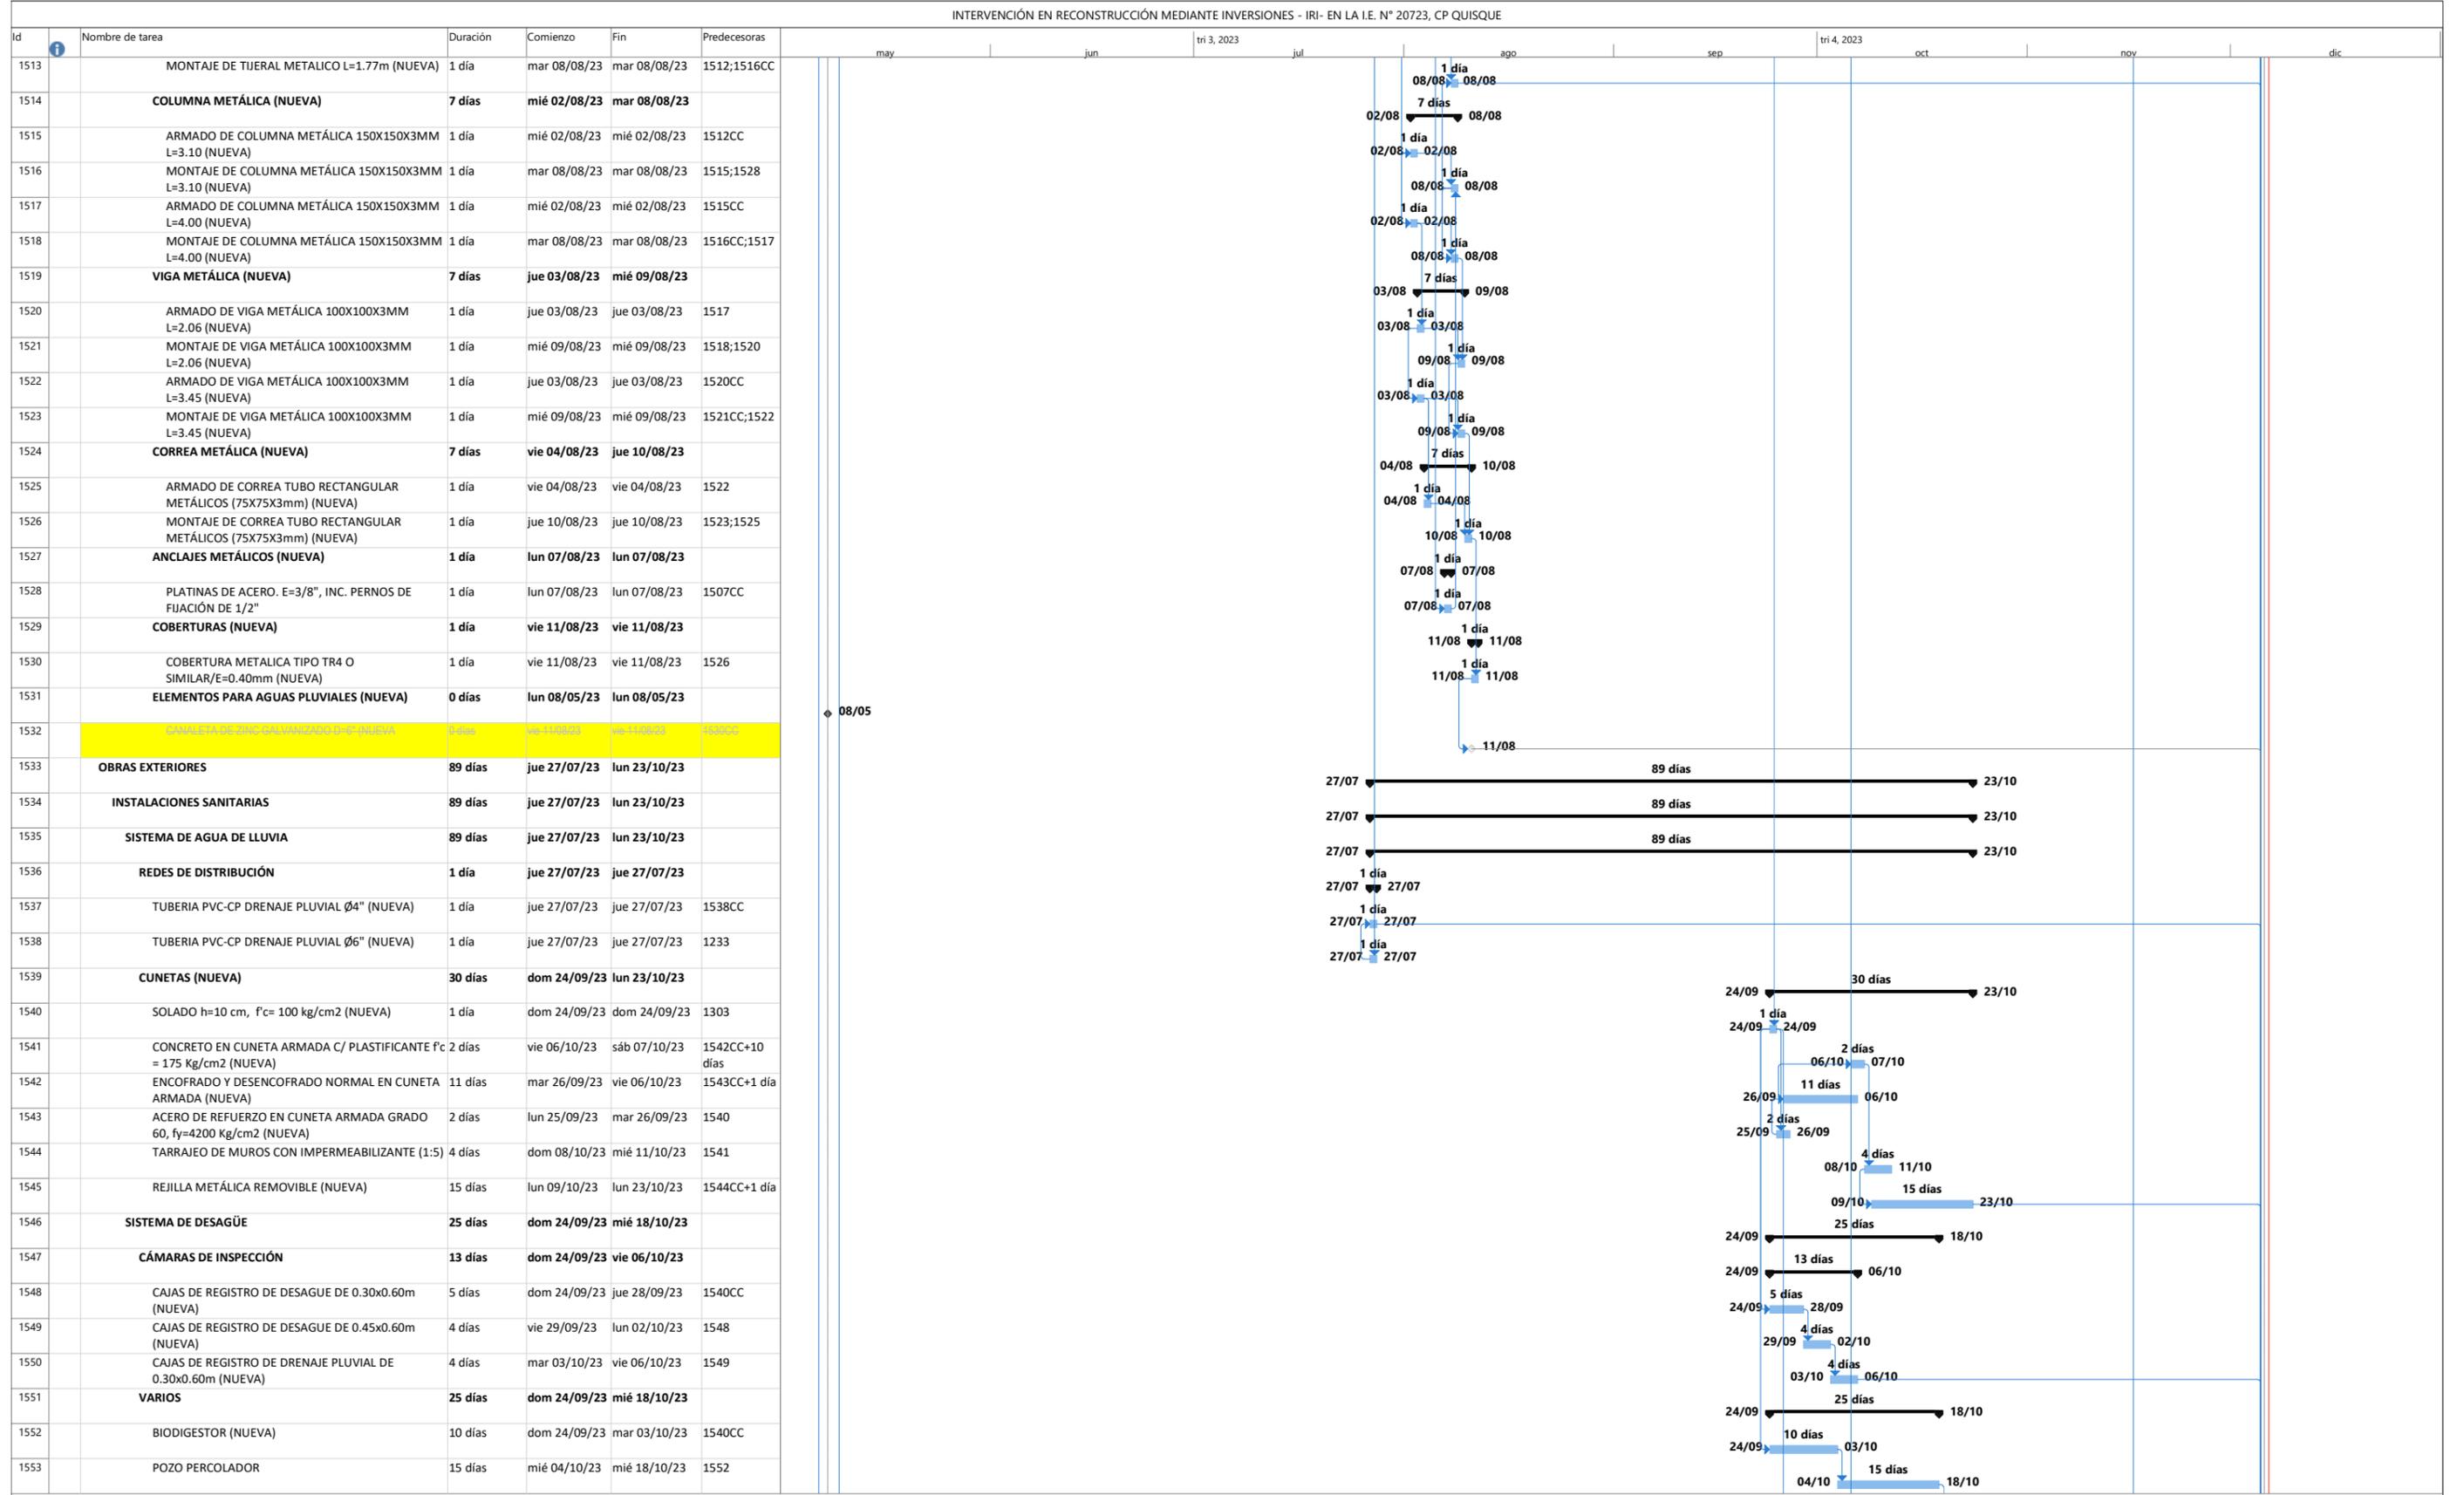

Proyecto: jujujj
 Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual

INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE

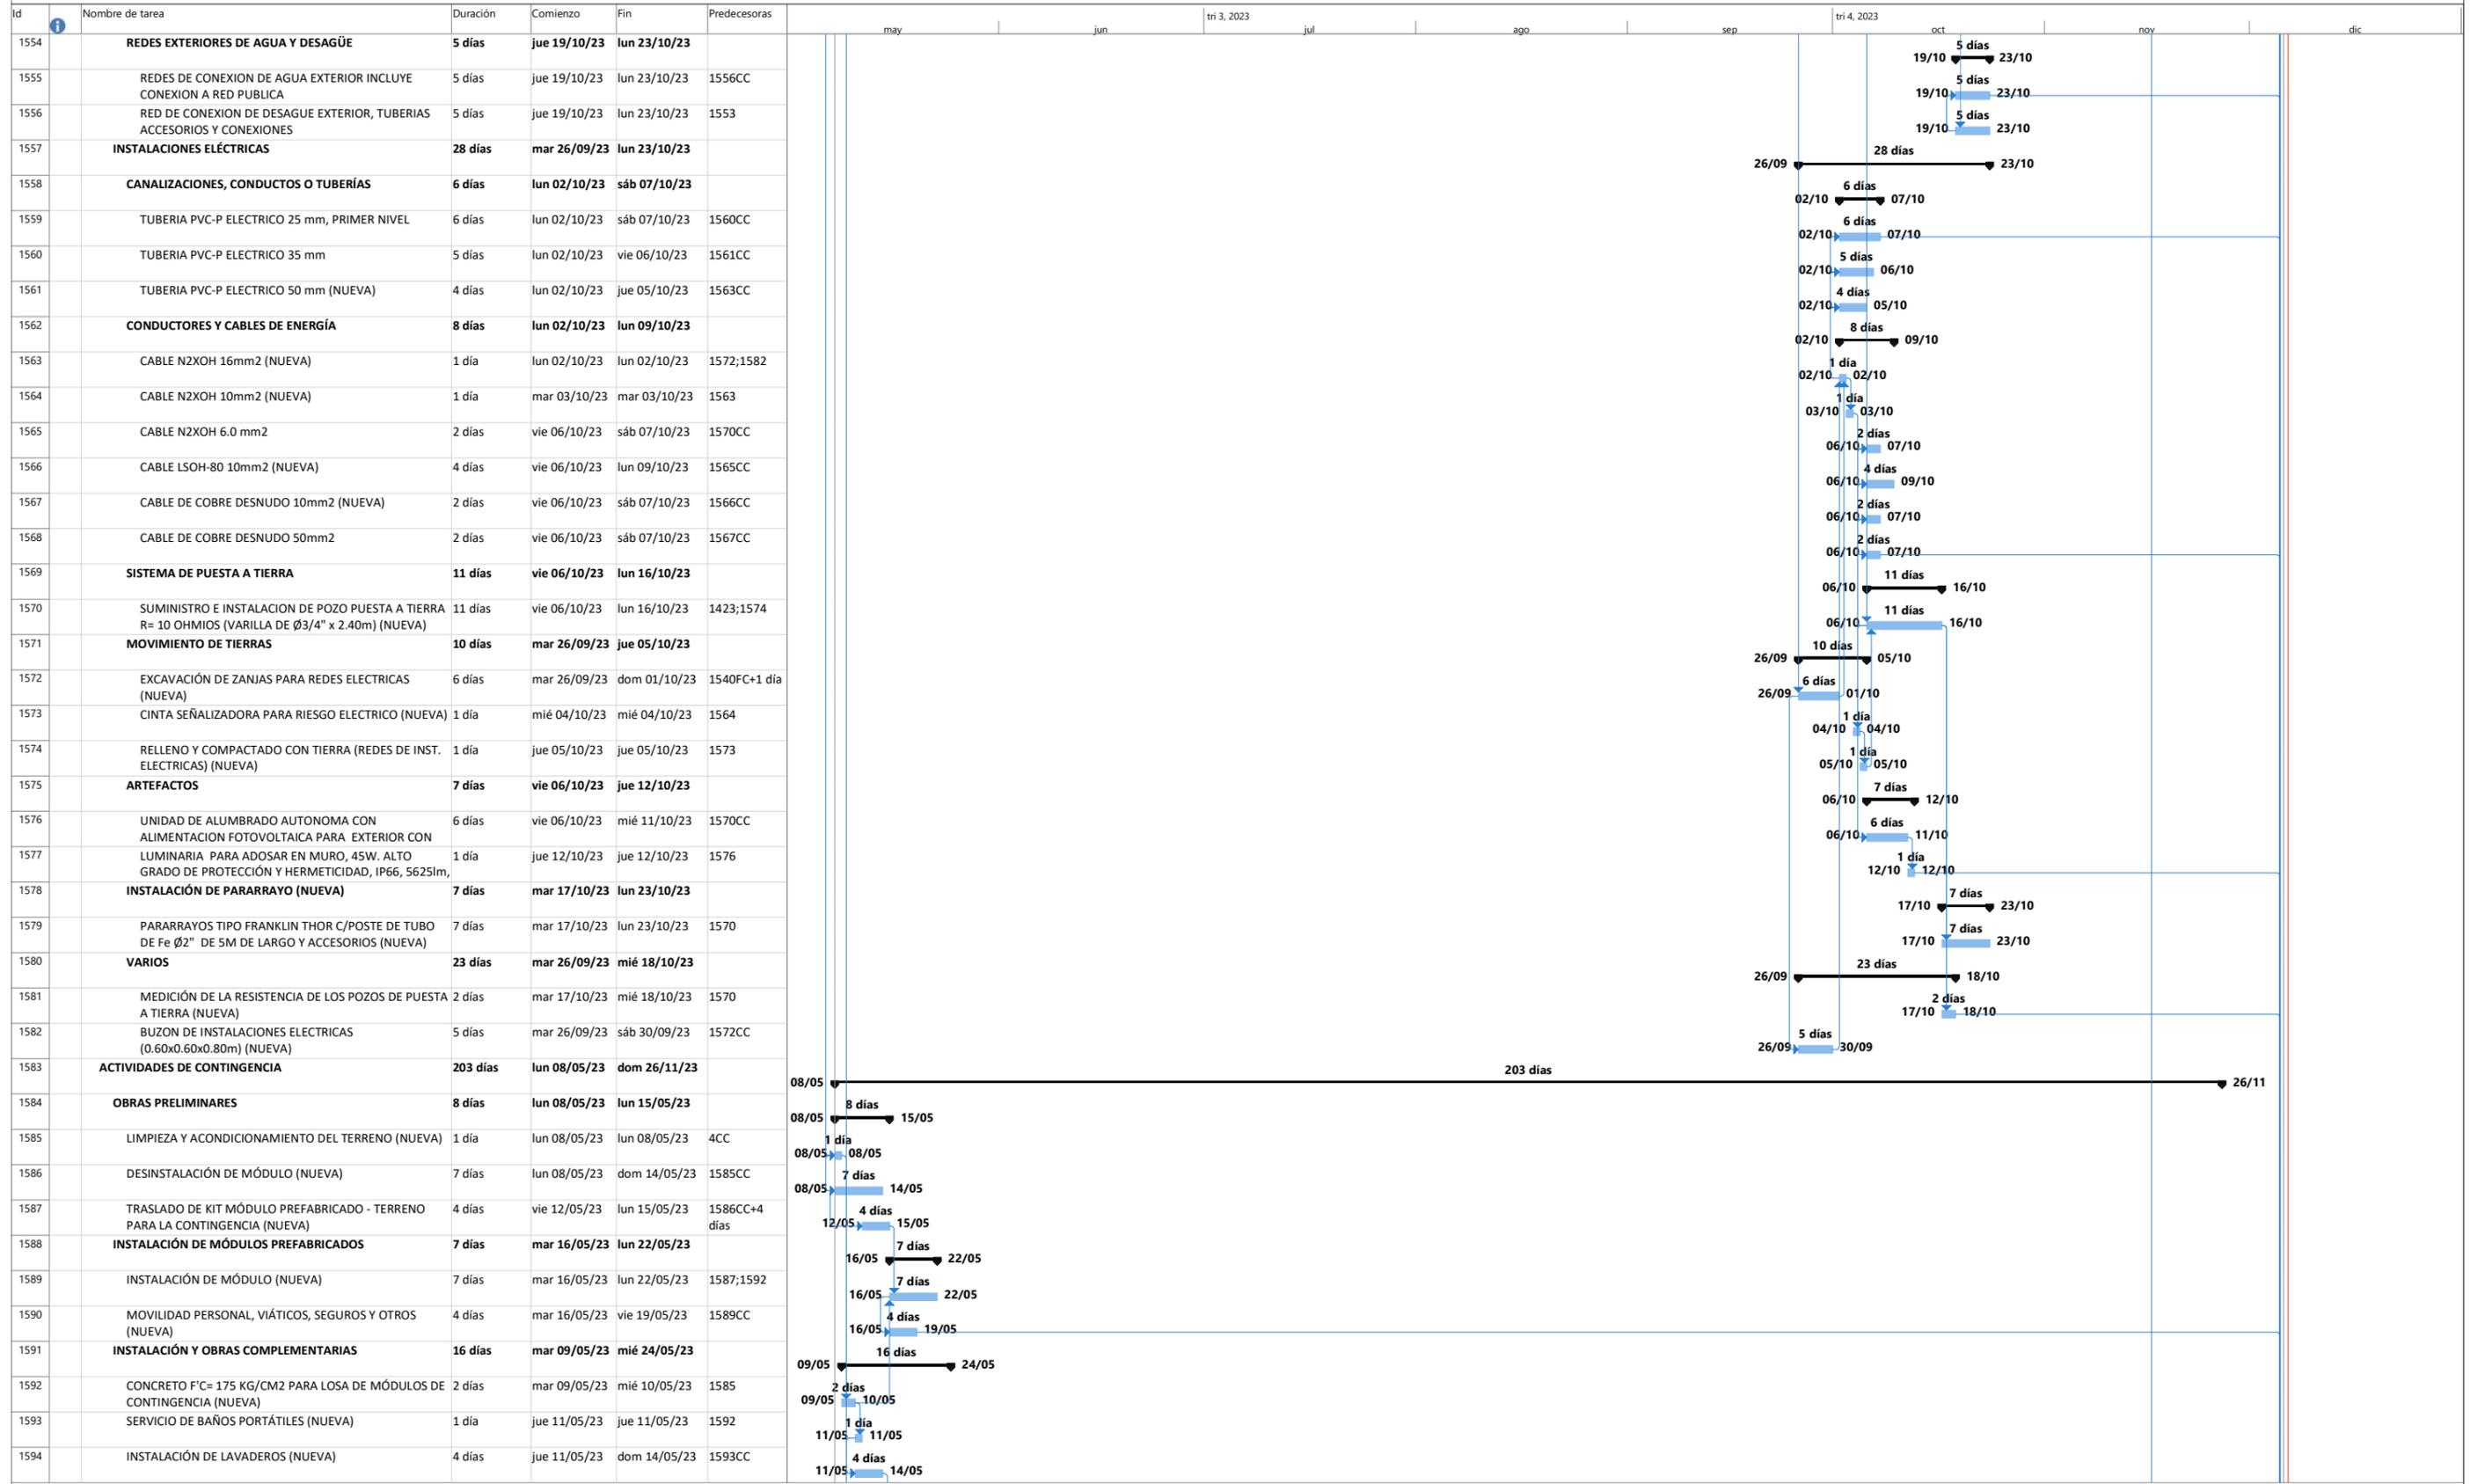

Proyecto: jujujj
Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual

INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA I.E. N° 20723, CP QUISQUE



Proyecto: jujujj
Fecha: mié 19/03/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual
