



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Secretaría
de Descentralización



I CONSEJO DE ESTADO REGIONAL

Decreto Supremo N.º 050-2021-PCM

Avances al 14 de marzo de 2025

"El Consejo de Estado Regional es una instancia operativa del Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI), donde el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales, convienen el desarrollo de acciones conjuntas en los territorios para la implementación de políticas, estrategias o intervenciones nacionales priorizadas en el marco del proceso de descentralización".

La temática central del I CER abordó a la Agenda para el Desarrollo Territorial y la emergencia nacional generada por desastres naturales.

Lima, 4 y 5 de mayo de 2023

INFORMACIÓN GENERAL**Asistentes al I CER**

Ministros **17**
Viceministros **15**



Gobernador Regional **24**
Equipo técnico del Gobierno Regional **182**



Equipo técnico del Sector **341**
Otros invitados **22**

COMPROMISOS ASUMIDOS


12
Compromisos



10
Ejecutados



2
En proceso

**AVANCES DE LAS MESAS BILATERALES**

155
Asistencias técnicas sectoriales



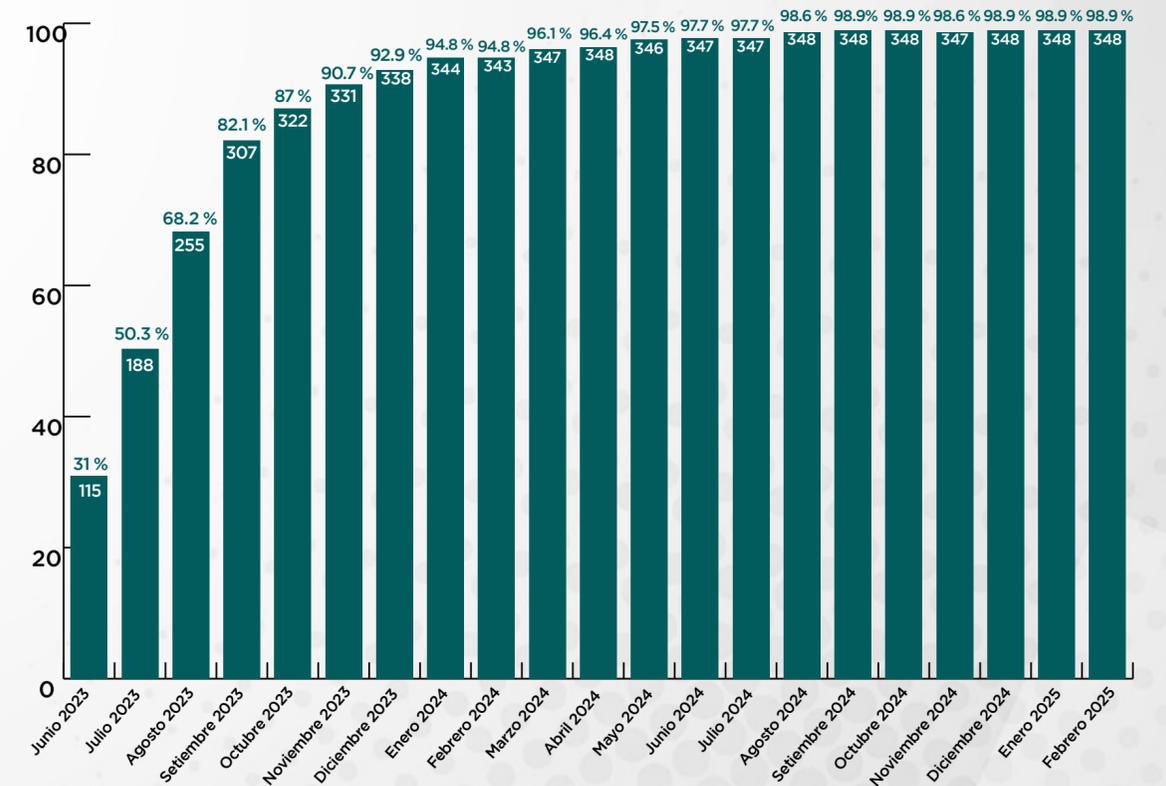
43
Reuniones complementarias



352*
Acuerdos
*Más 22 acuerdos desestimados



348
Ejecutados

**AVANCE DE CUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS**

Acuerdos de las mesas bilaterales por sector

	N° de acuerdos	Ejecutados	Avance
MEF-PROINVERSIÓN	11	11	100.0 %
MIDAGRI	24	24	100.0 %
MIDIS	9	9	100.0 %
MIMP	13	13	100.0 %
MINAM	10	10	100.0 %
MINCETUR	15	15	100.0 %
MINEDU	25	25	100.0 %
MINEM	3	3	100.0 %
MININTER	3	3	100.0 %
MINSA	83	83	100.0 %
MTC	51	51	100.0 %
MTPE	18	18	100.0 %
MVCS	10	10	100.0 %
PRODUCE	19	19	100.0 %
MINCUL	22	21	95.5 %
MINJUSDH	21	20	95.2 %
PCM	15	13	86.7 %
TOTAL	352	348	98.9 %



4
En proceso

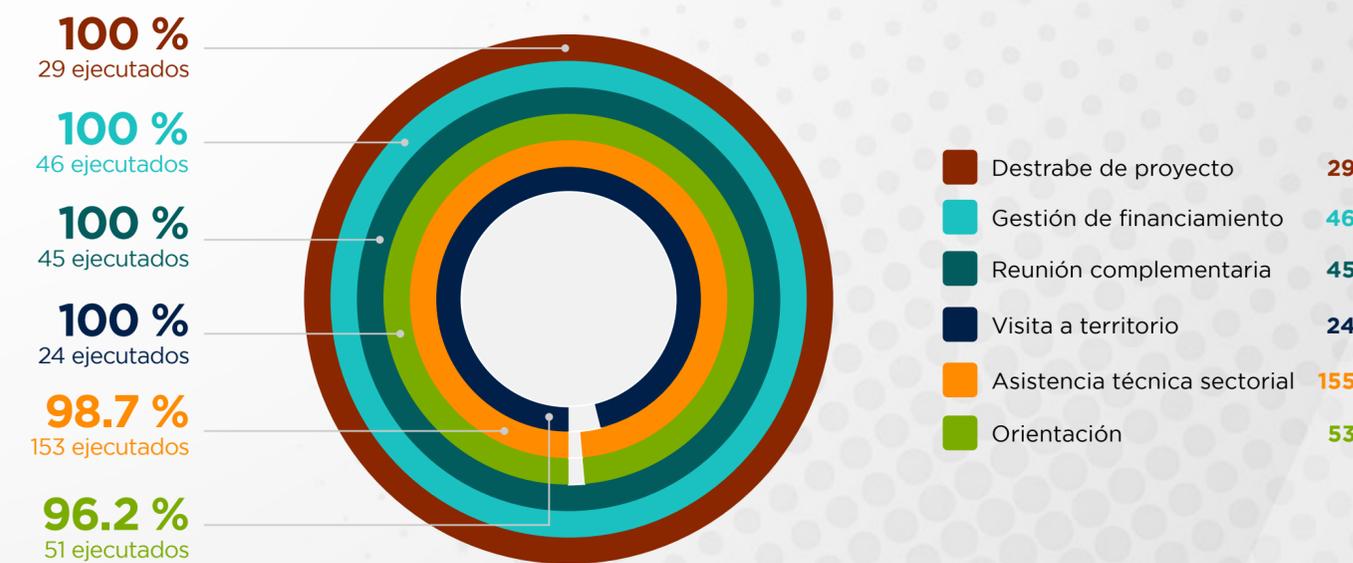


100%
a cargo del GN

% de acuerdos ejecutados por entidad responsable



% de ejecución por tipos de acuerdos



SEGUIMIENTO A LOS 12 COMPROMISOS

Ejecutado

Sector responsable: PCM | **Plazo:** 2023

Compromiso: Elaboración del proyecto de **Ley para Ordenamiento Territorial**

Cumplimiento: El 12 de marzo de 2025, el pleno del Congreso de la República aprobó la autógrafa de la Ley de Ordenamiento Territorial y de Creación del Sistema de Nacional de Ordenamiento Territorial (SINADOT), el cual responde al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en el 2023.

El 02 de abril de 2025 mediante Ley n.º 32279 se aprueba la Ley de Ordenamiento Territorial y de Creación del Sistema de Nacional de Ordenamiento Territorial (SINADOT).

<https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2386587-5>

Ejecutado

Sector responsable: PCM | **Plazo:** 2023

Compromiso: Fortalecer la gestión del riesgo de desastres mediante la **creación de una Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres y Ordenamiento Territorial**

Cumplimiento: Mediante Decreto Supremo n.º 107-2023-PCM se modificó el ROF de la PCM creando la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.

Ejecutado

Sector responsable: PCM | **Plazo:** Marzo 2024

Compromiso: Aprobación de la **Política Nacional de Ordenamiento Territorial**

Avance reportado: Mediante Decreto Supremo n.º 142-2024-PCM, de fecha 14 de diciembre de 2024, se aprobó la Política Nacional de Ordenamiento Territorial al 2050.

Ejecutado

Sector responsable: PCM | **Plazo:** 2023

Compromiso: Realización del **II CER para tratar los avances de los compromisos asumidos**

Cumplimiento: Se realizó el 17 y 18 de agosto.

Ejecutado

Sector responsable: PCM | **Plazo:** 2023

Compromiso: Elaboración del **Plan Multisectorial ante la Probabilidad de Ocurrencia del Fenómeno El Niño 2023-2024**

Cumplimiento: El Plan Multisectorial ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño 2023-2024 ha sido aprobado con el Decreto Supremo n.º 101-2023-PCM con fecha 02/09/2023.

Ejecutado

Sector responsable: PCM / MIDAGRI | **Plazo:** 2023

Compromiso: **Asistencia técnica al GORE Lambayeque** para ver proyectos enmarcados en reconstrucción (emergencias, destrabes, fenómeno El Niño)

Cumplimiento: PCM (DVGT - ARCC - SD): Mesa de Asistencia Técnica y Destrabe llevada a cabo el 16 y 17 Mayo. Definición conjunta con equipo técnico del GORE, ARA y ALA, entre otros, de puntos críticos en la región. Se asignó presupuesto para 90 puntos críticos por S/ 100 millones (DU 015-2023).

Ejecutado

Sector responsable: MEF | **Plazo:** 2023

Compromiso: Aprobación de una **reforma a la Ley de Contrataciones del Estado**

Cumplimiento: El proyecto de Ley de Contrataciones del Estado, ha sido enviado al Congreso de la República el 23/06/2023. El 24 de junio de 2024 se publica la Ley n.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Ejecutado

Sector responsable: MEF | **Plazo:** 2023

Compromiso: Ejecución del **Punche Huancavelica**

Cumplimiento: Se instaló la mesa de desarrollo territorial de Huancavelica 2023 - 2026.

SEGUIMIENTO A LOS 12 COMPROMISOS

- Ejecutado**
Sector responsable: MINCETUR / RREE | **Plazo:** 2024
Compromiso: Realización del **APEC 2024 en la ciudad del Cusco**
Cumplimiento: Del 10 al 16 de noviembre de 2024 se realizó la semana de cumbre de líderes de las 21 economías APEC, donde autoridades e importantes ejecutivos de los países del Asia y Pacífico llegaron a Lima para discutir las oportunidades y desafíos de la región en materia económica.
- Ejecutado**
Sector responsable: PCM | **Plazo:** 2023
Compromiso: Modificaciones normativas para **agilizar la atención de las emergencias**
Avance reportado: Mediante Ley n.º 31880 se aprobó la delegación de facultades en materia de gestión del riesgo de Desastres.
- En proceso**
Sector responsable: PCM | **Plazo:** 2024
Compromiso: Aprobación de la **Política Nacional de Descentralización**
Avance reportado: Se está redactando la sección situación futura deseada del Entregable n.º3 y sistematizando/analizando los resultados obtenidos en los talleres descentralizados con respecto a la formulación de los objetivos prioritarios de la PNMD.
Entregables 01 y 02 aprobados, aprobados por CEPLAN.
- En proceso**
Sector responsable: MINEM | **Plazo:** 2024
Compromiso: **Masificación del gas a nivel nacional**
Avance reportado: Al 28/02/2025 se ha construido 1475 km (92.3%) de 1 598.40 km., de redes de distribución de gas natural y se ha conectado a 483 462 usuarios residenciales.

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS



100 % de avance, 22 regiones



Mayor a 88 % y menor a 95 % de avance, 3 regiones



CONCLUSIONES

Se realizó el seguimiento y monitoreo de los avances del **I CER al 14 de marzo del 2025**, en coordinación con los ministerios y gobiernos regionales, apreciándose las siguientes conclusiones:



Se han **ejecutado diez (10) de doce (12) compromisos asumidos** en el I Consejo de Estado Regional.



Se han cumplido 348 acuerdos, lo que representa el **98.9 %** de avance. El **MEF, MIDAGRI, MIDIS, MIMP, MINAM, MINCETUR, MINEDU, MINEM, MININTER, MINSA, MTC, MTPE, MVCS y PRODUCE** son los sectores que han cumplido el **100% de sus acuerdos**.



En los departamentos son **Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali** se cumplió el **100% de acuerdos asumidos**.

RECOMENDACIONES



La Secretaría de Descentralización de la PCM, expondrá el esquema y los resultados del seguimiento y monitoreo de los acuerdos del Consejo de Estado Regional en los territorios.



Los **gobiernos regionales** deberán designar de manera permanente un **punto focal** para articular el seguimiento.



Realizar **reuniones de seguimiento permanente** con el punto focal de los GORE y equipo técnico de los sectores. La Secretaría de Descentralización propiciará el destrabe y cumplimiento de compromisos y acuerdos.



Difundir los resultados del seguimiento y monitoreo de los compromisos y acuerdos del Consejo de Estado Regional.



Realizar seguimiento a la cartera priorizada en el Consejo de Estado Regional, en coordinación con los sectores y los gobiernos regionales.

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MTC



Construcción de 1098.4 km de redes de distribución de gas natural cumpliendo la meta establecida en el plan con Punche Perú

N° 00396 - CER I

En marzo de 2024 se culminó la construcción de 1098.4 km de redes de distribución gas natural en las regiones de Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Lima, Callao, e Ica, a cargo de las empresas concesionarias bajo el seguimiento del MINEM y el FISE, beneficiando a más de 75 000 nuevos hogares, (marco del Decreto de Urgencia n.º 002-2023 - Programa con Punche Perú).

Se construyeron 371.6 km de redes de gas natural en el marco de la Ley n.º 31728.

Al 28/02/2025, en total se ha construido 1475 km de redes de distribución de gas natural (92.3 % de avance del total programado).

Se han conectado a un total de 483 462 usuarios residenciales al 31/12/2024, en las regiones de Lima, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, Cajamarca, Ancash, Arequipa, Moquegua y Tacna.



Ejecución del mejoramiento y conservación vial por niveles del servicio de Cajamarca - Dv. Celendín - Dv. Leimebamba - Dv. Pedro Ruiz - Chachapoyas / Dv. Caclic - Pte Ingenio Dv. Yanacanchilla Alta - Llaucan - Bambamarca.

N.º acuerdo - CER I - 00287

El 23/08/2023 se cumplió con publicar la convocatoria, el 29/04/2024 se firmó el contrato de ejecución con el Consorcio Sierra Centro; e inicio sus actividades el 09/06/2024 por un periodo de 5 años.



Unidad Ejecutora: PVN - MTC



Optimización del estudio de perfil aprobado del eje vial Iv: Amazonas: 1. Puente Durán - Puente Wawico, 2. Puente Wawico - Nuevo Siasme - Santa Maria de Nieva, 3. Nuevo Siasme - Saramiriza. CUI: 2509636 - 2480997 - 2555351

N.º acuerdo - CER I - 00289

- El 14/05/2024 se firmó el contrato de Estado a Estado con el Consorcio Eje Vial 4, por un monto de 27 millones de dólares.
- El 24/06/2024 inicio la primera fase: Revisión de Perfil (Procura Internacional y Gestión del contrato), y se estima su culminación para octubre del 2025.
- En el marco de la primera fase, se viene evaluando las ofertas de consultores para la revisión, actualización y optimización de los perfiles.



Unidad Ejecutora: PVN - MTC

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MTC



Reinicio de la obra carretera departamental: Emp. Pe - 18 (Dv. Uchumarca) - Emp. Pe 3n - (Dv. Cerro de Pasco) CUI 2234342

Nº acuerdo - CER I -00293

Obra en ejecución desde el 14/02/2024. Se tiene un plazo de ejecución de 720 días. A la fecha tiene una ejecución financiera acumulada de S/ 94.6 millones y un avance físico del 9.3%. Para el 2025, tiene un PIM de S/ 33 millones.

Para el año 2025, tiene un PIM asignado de 32.5 millones de soles.



Unidad Ejecutora: GORE Pasco



Obra financiada: Reinicio de la obra carretera departamental Ju - 108 Tramo: Palian - Vilcacoto - Acopalca-obra Huaytapallana - Pariahuanca, Huancayo, Junín

Nº acuerdo - CER I -00308

Se asignó un PIM 2025 de 80.2 millones de soles. Tiene un avance físico acumulado del 31.1%.

Reinicio de obra el 16/05/2024, firmando la entidad del GORE Junín y el contratista empresa CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU.



Unidad Ejecutora: GORE Junín



Otorgamiento de Buena Pro: Construcción de puente; en (La) ruta: Pe-6a, tramo: Chiclayo - Chongoyape - Puente Cumbil distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque CUI 2459360

Nº acuerdo - CER I -00310

Con fecha 28/02/25, se suscribió el contrato de obra del proceso de convocatoria LP-SM-8-2024-MTC/20-1, por un monto de S/ 85.2 millones.



Unidad Ejecutora: PVN - Dirección de Puentes

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MTC



Buena Pro para la ejecución de la inversión: Construcción de puente de carretera; en la red vial nacional, ruta Pe-1NR en el tramo Tambo Grande - Chulucanas - Morropón - CUI 2392435

CER I - 282

Con fecha 11/03/25, se suscribió contrato para la ejecución de la obra, por un monto de 533.3 millones de soles.



Unidad Ejecutora: PVN – Dirección de Puentes



ANIN



Culminación de la obra: creación y mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones en las zonas afectadas y expuestas al peligro de inundación en las localidades de Anchaclla, Lircay y Ocopa, distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica - CUI: 2344722

N.º acuerdo - CER I - 001

Obra culminada con fecha 08/01/25, mediante acta de terminación de obra, con deductivos al 86.3% acumulado al 04/02/25.



Unidad Ejecutora: GORE de Huancavelica



Iniciada la procura del establecimiento de salud Mancora a través del evento ROADSHOW de la ANIN CUI 2558584

Nº acuerdo - CER I-00016

Con fecha 19/07/2024 se da por iniciada la PROCURA, a través del evento ROADSHOW de la ANIN, en el que entre los proyectos en materia de convocatoria se encuentra el proyecto del GORE Piura "Establecimiento de Salud Máncora", que será ejecutado en el marco Gobierno a Gobierno (G2G).



Unidad Ejecutora: Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MINSA



Continuidad de ejecución de obra del Hospital de apoyo de Puquio "Felipe Huamán Poma de Ayala", distrito de Puquio - provincia de Lucanas - departamento de Ayacucho. CUI: 2194681

CER I - 00184

En el mes de enero se ejecuta la Contingencia por administración directa, se tiene un avance mensual de programación física de 16.84 % y acumulado de 84.45 %,

El 01/09/2023 se reinició la ejecución luego de la actualización de los costos para la obra de contingencia y obra principal del Hospital de Puquio.

Para el 2025 tiene un PIM asignado de 5.5 Millones de soles



Unidad Ejecutora: GORE Ayacucho



Destrahe del proyecto mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital Quillabamba distrito de Santa Ana, provincia de La Convención y departamento de Cusco - CUI 2183907

Nº acuerdo - CER I - 00214

El 16/12/2024 se dio inicio a la ejecución de obra, la cual a enero de 2025 tiene un avance de ejecución acumulada de 46.29%.

El 17/10/2024 se adjudicó a la empresa CONSORCIO HOSPITALARIO QUILLABAMBA por un monto de S/ 136'574,698.90 y un plazo de 540 días calendario

El 29/10/2024 se suscribe el contrato n.º51-2024-PRONIS del proyecto de saldo de obra



Unidad Ejecutora: Programa Nacional de Inversiones - PRONIS



Reinicio de obra: Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco- Nivel III-1 CUI 2130855

CER I - 228

Se reinició ejecución física con fecha 19/02/2025 de obra complementaria (cobertura liviana metálica ejecución física sobre el techo del hospital), que registra un avance acumulado de 65.74%.

En 2025 se cuenta con el contrato para adquisición de equipamiento biomédico.



Unidad Ejecutora: GORE Huánuco

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MINSA



Reinicio de obra: Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Tingo María - CUI 2094811

CER I - 227

Se reinicio obra con fecha 11/02/2025 en el marco del reformulado n.º 2 de saldo de obra (R.G.R n.º 790-2024-GRH-GRI), mediante Administración directa.



Unidad Ejecutora: GORE Huánuco



Suscripción del contrato para ejecución de obra: mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Nivel I- 4 de la localidad de Taraco, distrito de Taraco - provincia de Huancané - departamento de Puno - CUI 2490087

CER I - 228

Con fecha 24/02/25, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra, por un monto de 58.6 millones de soles.



Unidad Ejecutora: GORE Puno.



MIDAGRI



Mejoramiento de riego y generación hidroenergética del Alto Piura- CUI 2040186

N.º acuerdo - CER I 053

Con fecha 12/12/24 se suscribió el convenio para el desarrollo, ejecución y puesta en marcha de los componentes I, III y IV del proyecto: Cuenta con un PIM 2025 de S/ 51.9 millones.



Meta física: Presa Tronera y Túnel Trasandino

UEIs: Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI
