



16) La cifra "1" significa según el estado de cumplimiento de proyectos de inversión en el presente año con respecto al presupuesto de inversión en el presente año.

17) La cifra "2" significa según el estado de cumplimiento de proyectos de inversión en el presente año con respecto al presupuesto de inversión en el presente año.

18) La cifra "3" significa según el estado de cumplimiento de proyectos de inversión en el presente año con respecto al presupuesto de inversión en el presente año.

19) La cifra "4" significa según el estado de cumplimiento de proyectos de inversión en el presente año con respecto al presupuesto de inversión en el presente año.

20) La cifra "5" significa según el estado de cumplimiento de proyectos de inversión en el presente año con respecto al presupuesto de inversión en el presente año.

21) La cifra "6" significa según el estado de cumplimiento de proyectos de inversión en el presente año con respecto al presupuesto de inversión en el presente año.

22) La cifra "7" significa según el estado de cumplimiento de proyectos de inversión en el presente año con respecto al presupuesto de inversión en el presente año.

23) La cifra "8" significa según el estado de cumplimiento de proyectos de inversión en el presente año con respecto al presupuesto de inversión en el presente año.

24) La cifra "9" significa según el estado de cumplimiento de proyectos de inversión en el presente año con respecto al presupuesto de inversión en el presente año.

[Handwritten signature and stamp]
GOBIERNO REGIONAL PASCO
SECRETARÍA REGIONAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS
CALLE DE LA UNIÓN N.º 1000
PASCO - PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

[Handwritten signature]
Miguel Ángel Durán Carhuaz Loyola
SUB GERENTE DE OBRAS Y E.M.



MONITOREO DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

1. GENERALIDADES:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL ;	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO:	3999999 SIN PRODUCTO.
ACTIVIDAD / ACCIÓN:	5000689 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISIÓN FUNCIONAL:	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.
GRUPO FUNCIONAL:	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000689 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, REGIONAL.
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES
RUBRO:	00 RECURSOS ORDINARIOS
FUENTE FINANCIAMIENTO:	1.00 RECURSOS ORDINARIOS
GENÉRICA DE GASTO:	23 BIENES Y SERVICIOS



2. ANTECEDENTES:

La actividad operativa de monitoreo se realiza durante el proceso de la ejecución de obras por administración directa contemplándose los plazos de inicio y culminación de Obra, con informes técnicos presentados.

3. JUSTIFICACION:

La actividad operativa de monitoreo de consigna gastos operativos por varios conceptos, demandando gastos que corresponde en el proceso del seguimiento a las inversiones.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

El objetivo principal de esta actividad operativa fue de ejecutar obras por la modalidad de administración directa en beneficio de la población para un desarrollo social y económico en forma conjunta.

5. INFORME TECNICO

- Constatación y monitoreo de las obras en ejecución por la modalidad de administración directa.
- Informes de visita a obras durante el proceso de ejecución de obras a fin de visar el avance de obra con las valorizaciones de obra.
- Determinación del estado situacional de obras por administración directa.
- Presentación de Informe por las visitas realizadas del equipo de trabajo dirigidos a la Gerencia de Infraestructura.

6. RESULTADOS ALCANZADOS:

- a) Se presentó el plan de trabajo para el monitoreo de las obras según plazo establecido.
- b) Mediante informe de constatación de obra se presentó los avances físicos de obra con el trabajo de campo.
- c) Visitas constantes a las obras por administración directa.



GOBIERNO REGIONAL
PASCO

DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DIRECCION DE
ABASTECIMIENTOS
Y PATRIMONIO

UNIDAD CONTROL
PATRIMONIAL



94 34

7. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO – II SEMESTRE-2024

DESCRIPCION	MONTO S/.	DCTO. DE REFERENCIA
BIENES	21.180.00	REPORTE SIAF
SERVICIOS	102,000.00	REPORTE SIAF
TOTAL	123,180.0	

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
UNIDAD CONTROL PATRIMONIAL
OFICINA DE OBRAS Y
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA



**SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES A CARGO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS.****1. GENERALIDADES:**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL ;	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO:	3999999 SIN PRODUCTO.
ACTIVIDAD / ACCIÓN:	5000689 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISIÓN FUNCIONAL:	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.
GRUPO FUNCIONAL:	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000689 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, REGIONAL.
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES
RUBRO:	00 RECURSOS ORDINARIOS
FUENTE FINANCIAMIENTO:	1.00 RECURSOS ORDINARIOS
GENÉRICA DE GASTO:	23 BIENES Y SERVICIOS

**2. ANTECEDENTES:**

La actividad operativa de Seguimiento de las Inversiones a cargo de la Sub Gerencia de Obras se realiza durante el proceso de la ejecución de obras por administración directa contemplándose los plazos de inicio, reinicio, ampliación de plazo y culminación de Obra, con informes generados por los responsables de la obra.

3. JUSTIFICACION:

La actividad operativa de Seguimiento de las Inversiones a cargo de la Sub Gerencia de Obras es la acción en base al cumplimiento de directivas, normas, reglamentos y resoluciones para ejecutar la obra por administración directa, razón de ser de la institución de construir obras para el desarrollo económico y social en el departamento de Pasco a través del Gobierno Regional.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

El objetivo principal de esta actividad operativa es ejecutar obras por la modalidad de administración directa para el beneficio de la población para un desarrollo social y económico en forma conjunta en la Región Pasco.

5. INFORME TECNICO (Desarrollo de la Actividad)

- * Elaboración del Plan de Trabajo.
- * Determinación del estado situacional de obras por administración directa de obras por continuidad.
- * Constatación y seguimiento determinando saldos de obra para continuidad de obras en el presente ejercicio.
- * Informes de visitas a obras durante el proceso de ejecución de obras a fin de visar el avance con las valorizaciones de obras.



6. RESULTADOS ALCANZADOS:

- a) Se presentó el Plan de Trabajo para el seguimiento de la obra según plazo de ejecución de obra.
- b) Mediante informes de constatación de obra se presentó los avances físicos de obra con el trabajo de campo realizando visitas a obras.
- c) Visitas a las Obras por administración directa con el equipo profesional conjuntamente con el Sub Gerente de Obra.
- d) Presentación de Informes por la visita realizadas del equipo de trabajo dirigidos a la Gerencia de Infraestructura.

e) INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO I SEMESTRE-2024

DESCRIPCION	MONTO S/.	DCTO. DE REFERENCIA
COMBUSTIBLES	12,315.00	REPORTE SIAF.
VIATICOS	2,840.00	REPORTE SIAF
PASAJES	945.00	REPORTE SIAF
SERVICIOS NO PERSONALES	18,514.00	REPORTE SIAF.
TOTAL	34,614.00	



[Handwritten Signature]
 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 DRA. YSA NATIVIDAD GANEREA MENDOZA
 UNIDAD DE ADMINISTRATIVO
 GERENCIA DE OBRAS •
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO-PASCO.

1. GENERALIDADES:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACION.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO.
PRODUCTO / PROYECTO:	2084815 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROV. DE PASCO.PASCO.
ACTIVIDAD / ACCIÓN:	6000016 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
FUNCIÓN:	18 SANEAMIENTO.
DIVISIÓN FUNCIONAL:	040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL:	0089 SANEAMIENTO RURAL.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	40000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
UNIDAD DE MEDIDA:	081 OBRA
RUBRO:	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
FUENTE FINANCIAMIENTO:	00 RECURSOS ORDINARIOS Y 1.15 FONCOR
GENÉRICA DE GASTO:	26 BIENES Y SERVICIOS



2. ANTECEDENTES:

La actividad operativa de Mejoramiento de los Servicios de Saneamiento Básico para la Población de Pasco es una obra de inversión de gran envergadura que realiza el Gobierno Regional de Pasco por la modalidad de administración directa en diferentes etapas, desde el ejercicio 2020, los mismos que esta obra a la fecha es de continuidad, aprobados con Resolución los componentes de ejecución, determinando saldos de obra por cada ejercicio.

3. JUSTIFICACION:

La actividad operativa de Mejoramiento de los Servicios de Saneamiento Básico está a cargo de la Sub Gerencia de Obras, durante el proceso de ejecución se viene contemplando ampliaciones de plazo, deductivos a su vez los profesionales responsables de la obra los sustenta con informes técnicos de acuerdo al avance de Obra.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

El objetivo principal de esta obra es para beneficiar a la población de Pasco con el agua tratada para el desarrollo poblacional de la Región Pasco.

5. INFORME TECNICO (Desarrollo de la Actividad)

El proceso

- * Se adjunta el Resumen Ejecutivo de la Obra donde se señala datos necesarios del avance físico y financiero en forma acumulada que a la fecha se cuenta con un avance físico de 80.35% y un avance financiero de 90.55% en forma acumulada.
- * Determinación de estado situacional físico y financiero de obra por administración directa por ser obra de continuidad.



6. RESULTADOS ALCANZADOS:

- a) Se viene ejecutando la obra de las partidas aprobadas generándose el avance físico con el informe técnico.
- b) Mediante informes de constatación verificación de obra el avance físico de obra se contempla mediante un Calendario de obra.
- c) Visitas a las Obras por administración directa con el equipo profesional conjuntamente con el Sub Gerente de Obra.
- d) Vistas, fotografías Presentación de Informes resumidos por la visita de campo realizadas por el equipo técnico, profesional, donde se hace notar el avance físico y financiero en forma acumulada de la obra en continuidad.

e) INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO – II SEMESTRE-2024

DESCRIPCION	MONTO	DCTO. DE REFERENCIA
23.53 Planillas	718,826.00	REPORTE SIAF
23.54 Bienes	200,260.00	REPORTE SIAF.
23.55 Servicios	779,860.00	REPORTE DEL SIAF.
TOTAL	1'698,946.00	



[Handwritten Signature]
 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 OFICINA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS 05 BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA DISTRITO DE YANACANCHA PASCO - PASCO.

1. GENERALIDADES:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.03 -MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACION.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.
PRODUCTO / PROYECTO:	2313092. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS 5 BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA DISTRITO DE YANACANCHA , PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO.
ACTIVIDAD / ACCIÓN:	4000053 AGUA Y SANEAMIENTO
FUNCIÓN:	18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL:	040 SANEAMIENTO.
GRUPO FUNCIONAL:	0089 SANEAMIENTO RURAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
UNIDAD DE MEDIDA:	081 OBRA
RUBRO:	1.15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
FUENTE FINANCIAMIENTO:	1.15 FONCOR
GENERICA DE GASTO:	26 BIENES Y SERVICIOS



2. ANTECEDENTES:

La actividad operativa de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua y Desagüe de los 05 Barrios de Cajamarquilla es una obra con un presupuesto de S/. 5,563,019.00 donde se aprueba el expediente de obra con Resolución No. 0452-2019-GRPASCO/GGR, a ejecutarse por la modalidad de administración directa.

3. JUSTIFICACION:

La actividad operativa de del Sistema de Agua y Desagüe de los 05 Barrios de la Localidad de Cajamarquilla, el Expediente de Obra se ha modificado, donde la Oficina de Asesoría Jurídica ha elaborado opinión mediante un Informe Legal No. 1633-2024-GRP-GGR/DRAJ, donde recomienda levantar observaciones de acuerdo a la Ley de Contrataciones y determine responsabilidad ante los responsables de la elaboración, evaluación y aprobación del Expediente técnico de saldo de obra.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

El objetivo principal de esta actividad operativa fue de ejecutar la obra por la modalidad de administración directa en beneficio de la población para un desarrollo social y económico en forma conjunta.

5. INFORME TECNICO (De la continuidad de la Inversión)

A la fecha, el Proyecto de Inversión cuenta con lo siguiente:

- Avance de Físico acumulado : 31.96%
- Monto : S/. 1,602,019.45
- Saldo Por Valorizar : 68.04%
- Monto de Saldo : S/3'409,873.94 soles.



6. RESULTADOS ALCANZADOS:

Se solicitó el requerimiento para la contratación del Equipo técnico para la Elaboración del Expediente técnico reformulado a fin de subsanar las deficiencias del expediente técnico primigenio, para la culminación de esta obra.

7. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO – II SEMESTRE-2024

DESCRIPCION	MONTO S/.	DCTO. DE REFERENCIA
EJECUCION FINANCIERA	63,215.00	REPORTE SIAF
Semestre-2024	26,079.00	REPORTE SIAF
TOTAL	89,294.00	




GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
UNIDAD CONTROL PATRIMONIAL



MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA CERRO DE PASCO

1. GENERALIDADES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.09.03. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL :	0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO DE LA INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE.
PRODUCTO / PROYECTO:	2029684 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA CERRO DE PASCO.
ACTIVIDAD / ACCIÓN:	4000081 MEJORMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL.
FUNCIÓN:	15 TRANSPORTES.
DIVISIÓN FUNCIONAL:	033 TRANSPORTE TERRESTRE.
GRUPO FUNCIONAL:	0065 VIAS DEPARTAMENTALES.
FINALIDAD:	0000038 ACTIVIDADES DIVERSAS.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	4000079 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL.
UNIDAD DE MEDIDA:	081 OBRA.
RUBRO:	FONCOR
FUENTE FINANCIAMIENTO:	015 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL Y RECURSOS ORDINARIOS
GENÉRICA DE GASTO:	26 : BIENES Y SERVICIOS.



2. ANTECEDENTES:

Esta Obra se ejecuta en diferentes etapas por ser diferentes tramos que a la fecha para cada ejercicio presupuestal se determina Saldo de Obra, los mismos que se aprueba mediante Resolución de Gerencia General No. 0858-G.R.J/GGR de fecha 25/10/2024 se aprueba la actualización del Presupuesto Analítico para la culminación de Obra "Saldo de Obras Complementarias de la Carretera Yanahuanca Cerro de Pasco, para la continuidad con el proceso de levantamiento de observaciones, determinación de penalidades y realizar la recepción general de la Obra y el ordenamiento de toda la documentación del proceso constructivo de la obra desde el ejercicio 2021-2024.

3. JUSTIFICACION:

La actividad operativa esta en proceso de preliquidación, paralizada hasta la determinación se viene ejecutándose en diferentes etapas donde se cumplirá las metas de acuerdo al Calendario de Obras fijadas en Plazo de inicio y culminación de Obra de los componentes a ejecutarse, donde presentara los informes técnicos por cada avance físico de obra, acorde a las leyes y directivas aprobadas para ejecutar obras por administración directa.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

El objetivo principal de esta obra permitió cubrir las demanda existente de la población, con el servicio de transporte sobre una vía asfaltada dando solución a los ciudadanos entre las provincias de Pasco y Daniel A. Carrión.

5. INFORME TECNICO

* De parte del Inspector de Obra manifiesta en los informes generados todo el proceso del tiempo de ejecución de obra, avance físico y financiero, ejecución de obras complementarias, servicio de recapeo incluido bacheo para la



ejecución de estos componentes, al cual se adjunta el Informe No. 005-2025-FLAAIO-CARRETERA YANAHUANCA-CERRO DE PASCO.

6. RESULTADOS ALCANZADOS:

- Se Programa un PIAN DE Trabajo , donde se nombrara comisiones de trabajo para un proceso de preliquidación del ejercicio 2021-2024.

7. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO II SEMESTRE-2024

DESCRIPCION	MONTO	DCTO. DE REFERENCIA
26.23.25	63,215.00	REPORTE SIAF
26.23.26	26,079.00	REPORTE SIAF
TOTAL	89,294.00	REPORTE SIAF.



GOBIERNO REGIONAL PASCO
MAGISTRADO GABRIELA MENDOZA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SUB GERENCIA DE OBRAS Y
GESTION DE INFRAESTRUCTURA



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO

1. GENERALIDADES:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.09.03. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0138 REDUCCIÓN DE COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
PRODUCTO / PROYECTO:	2391837 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO.
ACTIVIDAD / ACCIÓN:	4000081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO.
FUNCIÓN:	15 TRANSPORTE.
DIVISIÓN FUNCIONAL:	033 TRANSPORTE TERRESTRE.
GRUPO FUNCIONAL:	0369 SERVICIOS DE TRANSPORTE.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000001 EXPEDIENTE TECNICO.
UNIDAD DE MEDIDA:	EQUIPOS
RUBRO:	CANON SOBRE CANON.
FUENTE FINANCIAMIENTO:	018 CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.
GENÉRICA DE GASTO	26 BIENES Y SERVICIOS



2. ANTECEDENTES:

Este proyecto consiste en la adquisición del pool de maquinarias pesadas desde el ejercicio presupuestal 2023-2024 con un presupuesto global de S/. 42'689,836.42 a fin de atender emergencias e intervenciones viales para la Región Pasco.

3. JUSTIFICACION

El Proyecto de aprueba mediante Expediente técnico donde se lleva a cabo procesos de selección otorgándose la buena pro al ganador mediante contratos establecidos de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

El objetivo principal de esta actividad, es que cuente el pool de maquinarias pesadas con la capacidad técnica operativa para desarrollar obras de emergencia en zonas de riesgo para el beneficio de la población de Pasco.

5. INFORME TECNICO

- La Sub Gerencia de Obras cuenta con el pool de maquinarias pesadas adquiridas en el ejercicio 2023-2024 a fin de atender las emergencias dentro de las 03 provincias: Pasco, Daniel A. Carrión y Oxapampa
- Se viene atendiendo con los convenios a las comunidades y Asentamientos Humanos mediante un cronograma con las respectivas aprobaciones de la superioridad.



- Con el Informe No. 005-2024-GRPASCO-GGR-GRI/SGOEM, presenta el reporte del Estado situacional del pool de maquinarias donde manifiestan los mantenimientos respectivos.

6. RESULTADOS ALCANZADOS:

- a) Se realiza convenios con los asentamientos humanos para cumplir con el apoyo de maquinarias para la reparación y mantenimiento de las vías afectadas en emergencia-
- b) Al desarrollar la actividad operativa atendiendo emergencias viales se viene generando informes técnicos demandando gastos financieros en las atenciones a la población de Pasco.



7. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO.

DESCRIPCION	MONTO S/.	DCTO. DE REFERENCIA
ADQUISICIONES DE BIENES	4'825,586.00	REPORTE SIAF
TOTAL	4'825,586.00	

[Handwritten Signature]
 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
 UNIDAD CONTROL PATRIMONIAL



**MANTENIMIENTO PERIODICO BELLO HORIZONTE QUEBRADA EL
ENCANTO VALLE NAZARETH RIO PUCCHARIN LONG 20. 700 KM. DISTRITO
DE PUERTO BERMUDEZ**

1. GENERALIDADES:

OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.09.03 GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE PASCO.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ;	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO:	3999999 SIN PRODUCTO.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000689 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISIÓN FUNCIONAL:	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.
GRUPO FUNCIONAL:	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.
ACTIVIDAD OPERATIVA	5000611 Mantenimiento Periódico de la Vía Vecinal Ruta B Bello Horizonte, Quebrada El Encanto Valle Nazaret, Rio Pucharin Long. 20.700 km, Puerto Bermúdez.
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES
RUBRO:	00 RECURSOS ORDINARIOS
FUENTE FINANCIAMIENTO:	00 RECURSOS ORDINARIOS
GENÉRICA DE GASTO:	23 BIENES Y SERVICIOS



2. ANTECEDENTES.

La actividad operativa de mantenimiento periódico se desarrolla en el Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa y Departamento de Pasco. en un proceso de ejecución de obras por administración directa contemplándose el apoyo social en esta actividad operativa por un monto de S/ 926,651.07 determinando un plazo de.....

3. JUSTIFICACION:

La actividad operativa de mantenimiento periódico en la zona selva de la región Pasco se desarrolla a razón del estado situacional de la carretera, dándose la prioridad de que las obras deben estar siempre a disposición de la población para el desarrollo de sus actividades económicas y sociales.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.

El objetivo principal de esta actividad operativa es mantener en buen estado las obras viales, para uso exclusivo de la población quienes serán beneficiados para sus actividades en desarrollo.

5. INFORME TECNICO

- * Elaboración del Plan de Trabajo.
- * Determinación del estado situacional de la vía vecinal en el distrito de Puerto Bermúdez.
- * Constatación y mantenimiento de la vía vecinal con el informe de los responsables técnicos.



6. RESULTADOS ALCANZADOS:

- Se presentó el Plan de Trabajo para el mantenimiento periódico en un plazo determinado con el pool de maquinarias adquiridas.
- Mediante informes de constatación de obra se presentó los avances físicos de obra con el trabajo de campo.
- Visitas a las Obras por los técnicos responsables conjuntamente con el Sub Gerente de Obras.
- Presentación de Informes por la visita realizadas del equipo de trabajo dirigidos a la Gerencia de Infraestructura.

7. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO – I SEMESTRE-2024

DESCRIPCION	MONTO S/.	DCTO. DE REFERENCIA
FITSA	10,000.00	REPORTE SIAF
SUPERVISION	59,924.90	REPORTE SIAF
EJECUCION	856,725.27	REPORTE SIAF
TOTAL	926,651.07	REPORTE SIAF.



[Handwritten signature]
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
UNIDAD CONTROL PATRIMONIAL
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



REFACCION DE LA COBERTURA DE LAS IE 31576 RICARDO PALMA CHAUPIMARCA PASCO.

1. GENERALIDADES:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.09.03 GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL ;	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO:	3999999 SIN PRODUCTO.
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA,
DIVISIÓN FUNCIONAL:	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.
GRUPO FUNCIONAL:	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000689 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL REGIONAL.
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES TECNICO
RUBRO:	00 RECURSOS ORDINARIOS
FUENTE FINANCIAMIENTO:	1.00 RECURSOS ORDINARIOS
GENERICA DE GASTO:	23 BIENES Y SERVICIOS



2. ANTECEDENTES:

La actividad operativa de Refacción de la Cobertura de la IE 31576, actividad desarrollado por la modalidad de administración directa con la fuente de financiamiento de recursos ordinarios.

3. JUSTIFICACION:

La actividad operativa se generó para realizar la cobertura de esta institución, justificando con el informe técnico generado por el profesional a cargo de esta actividad.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

El objetivo principal de esta actividad operativa es ejecutar la implementación con bienes por la modalidad de administración directa para el beneficio de la población educativa Ricardo Palma.

5. INFORME TECNICO

- * Determinación y Evaluación del estado situacional del centro educativo para dotar el presupuesto, y realizando su ejecución por la modalidad de administración directa de obras por continuidad.
- * Constatación y seguimiento determinando el avance físico y financiero de la presente actividad.
- * Informes de visita a campo del proceso de ejecución de obras mediante los informes técnicos.

6. RESULTADOS ALCANZADOS:

- a) Mediante informes de constatación de obra según el avance físico del trabajo en campo.
- b) Visitas a obra con el personal responsable de la actividad, para cumplir en un plazo programado.



GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

UNIDAD CONTROL PATRIMONIAL



7. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO II SEMESTRE-2024

DESCRIPCION	MONTO S/.	DCTO. DE REFERENCIA
Cobertura con Material de construcción .	62,005.00	Reporte SIAF.
TOTAL	S/. 62,005.00	


 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 R. S. CP. S. S. ACTIVIDAD GANADERA Y AGROPECUARIO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE USUARIOS
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA





MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS LOCALES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS JOSE CARLOS MARIATEGUI-TUPAC AMARU, EN LA PROVINCIA DE PASCO-PASCO.

1. GENERALIDADES:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9002 CCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO:	PRODUCTO :3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000689 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL:	0004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL:	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME TÉCNICO
RUBRO:	00 RECURSOS ORDINARIOS
FUENTE FINANCIAMIENTO:	00 Recursos Ordinarios
GENÉRICA DE GASTO:	23 BIENES Y SERVICIOS

2. ANTECEDENTES:

La actividad operativa de Mantenimiento Rutinario de las Vías Locales de los Asentamientos Humanos José Carlos Mariátegui, Tahuantinsuyo, de la Provincia de Pasco es una actividad en acción que realiza el Gobierno Regional de Pasco por la modalidad de administración directa con el apoyo de maquinarias pesadas.

3. JUSTIFICACION:

La actividad operativa de Mantenimiento rutinario está a cargo de la Sub Gerencia de Obras, durante el proceso de ejecución se brinda con el apoyo del pool de maquinarias generándose convenios entre el Gobierno Regional y el Asentamiento Humanos.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

El objetivo principal de esta actividad es generar y brindar apoyo con el pool de maquinarias en beneficio de la población de Pasco.

5. INFORME TECNICO

- * Informes técnicos de acuerdo al Convenio generándose acuerdo con el Asentamiento Humano en beneficio de la población.
- * Informes Técnicos por el apoyo al Asentamiento humano con el apoyo de maquinarias.

6. RESULTADOS ALCANZADOS:

- a) Se viene brindando el apoyo a esta población mediante convenio entre el Gobierno Regional Pasco y el asentamiento humano, realizando visitas de la operatividad del pool de maquinarias en el lugar programas.
- b) Mediante informes de constatación verificación del número de maquinarias pesadas para el apoyo a esta población.
- c) -



GOBIERNO REGIONAL
PASCO

DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DIRECCION DE
ABASTECIMIENTOS
Y PATRIMONIO

UNIDAD CONTROL
PATRIMONIAL



78 ~~21~~

7) INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO – I SEMESTRE-2024

DESCRIPCION	MONTO	DCTO. DE REFERENCIA
BIENES y SEVICIOS.	196,424.00	REPORTE SIAF
TOTAL	196,424.00	


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
GERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA





AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION. PPASCO.

1. GENERALIDADES:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	DEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.09.03 GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN PRODUCTOS, CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO:	3999999 SIN PRODUCTO.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000689 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO , GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL:	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL:	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME TECNICO
RUBRO:	00 RECURSOS ORDINARIOS
FUENTE FINANCIAMIENTO:	00 Recursos Ordinarios
GENERICA DE GASTO:	23 BIENES Y SERVICIOS



1. ANTECEDENTES:

La actividad operativa de Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal Pillao se ha desarrollado en etapas varias por la modalidad de administración directa, donde se viene realizando una evaluación para el reconocimiento de deudas. ta.

2. JUSTIFICACION:

La actividad operativa se viene programados una evaluación financiera tomando en cuenta la parte física y financiera a fin de determinar las deudas existentes de esta obra.

3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

El objetivo principal de esta obra es que permitirá cubrir las demandas existentes por deudas a proveedores en el proceso de ejecución de esta obra por la modalidad de administración directa.

4. INFORME TECNICO

- * Determinación de deudas contemplándose en la Evaluación por personal técnico.
- * Constatación y seguimiento sobre el avance físico por los gastos realizados en diferentes conceptos de pagos a Residentes, supervisores, equipos de personal profesional asistentes y a proveedores. Asegurándose el gasto con el informe de conformidad de pago por el servicio y/o por adquisición de bienes materiales.

6. RESULTADOS ALCANZADOS:

Mediante informes de constatación verificación de obra.



GOBIERNO REGIONAL
PASCO

DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DIRECCION DE
ABASTECIMIENTOS
Y PATRIMONIO

UNIDAD CONTROL
PATRIMONIAL



76 29

7. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO- II SEMESTRE-2024

DESCRIPCION	MONTOS/.	DCTO. DE REFERENCIA
Bienes y servicios	94,633.00	REPORTE SIAF
TOTAL	94,633.00	


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
UNIDAD CONTROL PATRIMONIAL
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



**MONITOREO DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA****1. GENERALIDADES:**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.09.03 GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL ;	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO:	3999999 SIN PRODUCTO.
ACTIVIDAD / ACCIÓN:	5000689 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISIÓN FUNCIONAL:	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.
GRUPO FUNCIONAL:	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000689 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, REGIONAL.
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES
RUBRO:	00 RECURSOS ORDINARIOS
FUENTE FINANCIAMIENTO:	1.00 RECURSOS ORDINARIOS
GENERICA DE GASTO:	23 BIENES Y SERVICIOS

**2. ANTECEDENTES:**

La actividad operativa de monitoreo se realiza durante el proceso de la ejecución de obras por administración directa contemplándose los plazos de inicio y culminación de Obra, con informes técnicos presentados.

3. JUSTIFICACION:

La actividad operativa de monitoreo de consigna gastos operativos por varios conceptos, demandando gastos que corresponde en el proceso del seguimiento a las inversiones.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

El objetivo principal de esta actividad operativa fue de ejecutar obras por la modalidad de administración directa en beneficio de la población para un desarrollo social y económico en forma conjunta.

5. INFORME TECNICO

- Constatación y monitoreo de las obras en ejecución por la modalidad de administración directa.
- Informes de visita a obras durante el proceso de ejecución de obras a fin de visar el avance de obra con las valorizaciones de obra.
- Determinación del estado situacional de obras por administración directa.
- Presentación de Informe por las visitas realizadas del equipo de trabajo dirigidos a la Gerencia de Infraestructura.

6. RESULTADOS ALCANZADOS:

- a) Se presentó el plan de trabajo para el monitoreo de las obras según plazo establecido.
- b) Mediante informe de constatación de obra se presentó los avances físicos de obra con el trabajo de campo.
- c) Visitas constantes a las obras por administración directa.



7. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO – II SEMESTRE-2024

DESCRIPCION	MONTO S/.	DCTO. DE REFERENCIA
BIENES	21,180.00	REPORTE SIAF
SERVICIOS	102,000.00	REPORTE SIAF
TOTAL	123,180.0	


GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD CONTROL PATRIMONIAL
MUNICIPALIDAD REGIONAL PASCO
SUB GERENCIA DE CUENTA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA





SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES A CARGO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS.

1. GENERALIDADES:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL ; PRODUCTO / PROYECTO:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 SIN PRODUCTO.
ACTIVIDAD / ACCIÓN:	5000689 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISIÓN FUNCIONAL:	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.
GRUPO FUNCIONAL:	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000689 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, REGIONAL.
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES
RUBRO:	00 RECURSOS ORDINARIOS
FUENTE FINANCIAMIENTO:	1.00 RECURSOS ORDINARIOS
GENÉRICA DE GASTO:	23 BIENES Y SERVICIOS



2. ANTECEDENTES:

La actividad operativa de Seguimiento de las Inversiones a cargo de la Sub Gerencia de Obras se realiza durante el proceso de la ejecución de obras por administración directa contemplándose los plazos de inicio, reinicio, ampliación de plazo y culminación de Obra, con informes generados por los responsables de la obra.

3. JUSTIFICACION:

La actividad operativa de Seguimiento de las Inversiones a cargo de la Sub Gerencia de Obras es la acción en base al cumplimiento de directivas, normas, reglamentos y resoluciones para ejecutar la obra por administración directa, razón de ser de la institución de construir obras para el desarrollo económico y social en el departamento de Pasco a través del Gobierno Regional.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

El objetivo principal de esta actividad operativa es ejecutar obras por la modalidad de administración directa para el beneficio de la población para un desarrollo social y económico en forma conjunta en la Región Pasco.

5. INFORME TECNICO (Desarrollo de la Actividad)

- * Elaboración del Plan de Trabajo.
- * Determinación del estado situacional de obras por administración directa de obras por continuidad.
- * Constatación y seguimiento determinando saldos de obra para continuidad de obras en el presente ejercicio.
- * Informes de visitas a obras durante el proceso de ejecución de obras a fin de visar el avance con las valorizaciones de obras.




6. RESULTADOS ALCANZADOS:

- a) Se presentó el Plan de Trabajo para el seguimiento de la obra según plazo de ejecución de obra.
- b) Mediante informes de constatación de obra se presentó los avances físicos de obra con el trabajo de campo realizando visitas a obras.
- c) Visitas a las Obras por administración directa con el equipo profesional conjuntamente con el Sub Gerente de Obra.
- d) Presentación de Informes por la visita realizadas del equipo de trabajo dirigidos a la Gerencia de Infraestructura.

e) INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO I SEMESTRE-2024


DESCRIPCION	MONTO S/.	DCTO. DE REFERENCIA
COMBUSTIBLES	12,315.00	REPORTE SIAF.
VIATICOS	2,840.00	REPORTE SIAF
PASAJES	945.00	REPORTE SIAF
SERVICIOS NO PERSONALES	18,514.00	REPORTE SIAF.
TOTAL	34,614.00	




 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
 UNIDAD CONTROL PATRIMONIAL

FICHAS DE IMPLEMENTACION AEI

SUB GERENCIA DE OBRAS				
03. MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACION				
03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA				
CODIGO Y NOMBRE DE LA UO	Alcance de la AO/ inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO/inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc) (D)	Recomendaciones para mejorar el cumplimiento (E)
AO/ inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Las Actividades Operativas realiza el seguimiento de la Sub Gerencia de Obras para fortalecer la Gestión Institucional hacia un gobierno en desarrollo frente a las necesidades poblacionales.	Las actividades operativas que se desarrollan es como optimizar los niveles de competencia de los recursos económicos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública para satisfacer las necesidades prioritarias de la población pasqueña, que será un desarrollo óptimo y social en forma conjunta.	Cabe señalar que los factores no afectaron se registra a través de las metas programadas en el Marco Presupuestal y su ejecución a través del SIAF, que incide en cada operación debidamente autorizada por el área usuaria, el mismo que se ejecuta según su estructura de gastos según el expediente técnico.	La Actividad operativa del centro de costos contribuye al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, cumpliendo con las normas de control y demás directivas.
AO100088500159 Mejoramiento y Ampliación de los servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de Emapa Pasco, Provincia de Pasco, Pasco.				




 SUB GERENTE DE OBRAS Y M.


 GOBIERNO REGIONAL PASCO


 SUB GERENTE DE OBRAS Y M.



FICHAS DE IMPLEMENTACION AEI

SUB GERENCIA DE OBRAS				
03. MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BSICO PARA LA POBLACION				
03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA				
CODIGO Y NOMBRE DE LA UO	Alcance de la AO/ inversión en contribucion a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO/inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc) (D)	Recomendaciones para mejorar el cumplimiento (E)
<p>AO/ inversiones clave en la implementación de la AEI (A)</p> <p>AO100088500 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua y Desague de los 05 Barrios de la localidad de Cajamarquilla distrito de Yanacancha-Pasco-Pasco</p> 	<p>La Actividad Operativa del seguimiento de Inversión de la Sub Gerencia de Obras, que cumple con los objetivos para beneficiar a la población rural y urbana. Donde debe cumplir con el expediente técnico a fin de fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno en desarrollo.</p>  <p>GOBIERNO REGIONAL PASCO Ing. Edwin David CAPHUAZ LOYOLA SUB GERENTE DE OBRAS Y E.M.</p>	<p>Se da cumplimiento de esta actividad que se desarrolla su ejecución en función al expediente técnico se viene realizando el seguimiento y monitoreo haciendo que el proyecto de continuidad es ejecutada en diferentes etapas, el mismo que representa una obra en beneficio de la población rural. A la fecha se cuenta con informes de opinión legal de parte de Asesoría Jurídica por contemplarse vicios en el expediente técnico.</p>	<p>En cuanto al desarrollo de esta actividad en el proceso de ejecución detectaron vicios donde hubo variación de partidas, generando modificación del expediente técnico, y así desarrollaron un análisis de los principales factores que contribuyeron para el cumplimiento de metas física y financieras. Asimismo se viene solicitando a la Gerencia de Infraestructura la determinación de acciones necesarias para la continuidad de esta obra.</p> 	<p>Proyecto que se encuentra en evaluación el Expediente Técnico del Saldo de Obra donde se genera un informe técnico No. 025-GRPASCO-GGR-GRI/SGOEM, donde se precisa el estado situacional de la obra, asimismo solicitando Adopte las acciones necesarias para garantizar la continuidad de la obra para beneficio de la población y si cponatar con el liquido delemento para su consumo.</p>

FICHAS DE IMPLEMENTACION AEI

SUB GERENCIA DE OBRAS							
03. MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACION							
03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA							
CODIGO Y NOMBRE DE LA UO	CODIGO Y DENOMINACION DE OEI	CODIGO Y DENOMINACION DE AEI	AO/ inversiones clave en la implementacion de la AEI (A)	Alcance de la AO/ inversion en contribucion a la AEI (B)	Situacion actual de cumplimiento de la AO/inversion (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformacion, distribucion, etc) (D)	Recomendaciones para mejorar el cumplimiento (E)

Cerro de Pasco, 24 de Febrero de 2025

[Handwritten signature]
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

 Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO

[Handwritten signature]
 SUB GERENTE DE OBRAS Y M.



FICHAS DE IMPLEMENTACION AEI

SUB GERENCIA DE OBRAS				
03. MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BSICO PARA LA POBLACION				
03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA				
CODIGO Y NOMBRE DE LA UO	Alcance de la AO/ inversión en contribucion a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO/inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc) (D)	Recomendaciones para mejorar el cumplimiento (E)
AO/ inversiones clave en la implementación de la AEI (A)				
AO100088500159 Mejoramiento y Ampliación de los servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de Emapa Pasco, Provincia de Pasco, Pasco.	Las Actividades Operativas realiza el seguimiento de la Sub Gerencia de Obras para fortalecer la Gestión Institucional hacia un gobierno en desarrollo frente a las necesidades poblacionales.	Las actividades operativas que se desarrollan es como optimizar los niveles de competencia de los recursos economicos en la ejecución de los Proyectos de inversión Publica para satisfacer las necesidades prioritarias de la población pasqueña, que sera un desarrollo optimo y social en forma conjunta.	Cabe señalar que los factores no afectaron se registra a través de las metas programadas en el Marco Presupuestal y su ejecución a través del SIAF, que incide en cada operación debidamente autorizada por el area usuaria, el mismo que se ejecuta según su estructura de gastos segun el expediente tecnico.	La Actividad operativa del centro de costos contribuye al cumplimiento de la acción estrategica del PEI, cumpliendo con las norma de control y demás directivas.



 SUB GERENTE DE OBRAS Y E.M.

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO



 Subgerente de Obras y E.M.



65 28

FICHAS DE IMPLEMENTACION AEI

SUB GERENCIA DE OBRAS				
03. MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACION				
03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA				
CODIGO Y NOMBRE DE LA UO	Alcance de la AO/ inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO/inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc) (D)	Recomendaciones para mejorar el cumplimiento (E)
<p>AO/ inversiones clave en la implementación de la AEI (A)</p> <p>AO100088500 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua y Desague de los 05 Barrios de la localidad de Cajamarquilla distrito de Yanacancha-Pasco-Pasco</p> 	<p>La Actividad Operativa del seguimiento de Inversión de la Sub Gerencia de Obras, que cumple con los objetivos para beneficiar a la población rural y urbana. Donde debe cumplir con el expediente técnico a fin de fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno en desarrollo.</p>  <p>Ing. Zilber Galicia CARHUAZ LOYOLA SUB GERENTE DE OBRAS Y E.M.</p>	<p>Se da cumplimiento de esta actividad que se desarrolla su ejecución en función al expediente técnico se viene realizando el seguimiento y monitoreo haciendo que el proyecto de continuidad es ejecutada en diferentes etapas, el mismo que representa una obra en beneficio de la población rural. A la fecha se cuenta con informes de opinión legal de parte de Asesoría Jurídica por contemplarse vicios en el expediente técnico.</p>	<p>En cuanto al desarrollo de esta actividad en el proceso de ejecución detectaron vicios donde hubo variación de partidas, generando modificación del expediente técnico, y así desarrollaron un análisis de los principales factores que contribuyeron para el cumplimiento de metas físicas y financieras. Asimismo se viene solicitando a la Gerencia de Infraestructura la determinación de acciones necesarias para la continuidad de esta obra.</p> 	<p>Proyecto que se encuentra en evaluación el Expediente Técnico del Saldo de Obra donde se genera un Informe técnico No. 025-GRPASCO-GGR-GRI/SGOEM, donde se precisa el estado situacional de la obra, asimismo solicitando Adopte las acciones necesarias para garantizar la continuidad de la obra para beneficio de la población y si contar con el líquido delemto para su consumo.</p>

04

FICHAS DE IMPLEMENTACION AEI

SUB GERENCIA DE OBRAS			
CODIGO Y NOMBRE DE LA UO	03. MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BSICO PARA LA POBLACION		
CODIGO Y DENOMINACION DE OEI	03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA		
AO/ inversiones clave en la implementacion de la AEI (A)	Alcance de la AO/ inversion en contribucion a la AEI (B)	Situacion actual de cumplimiento de la AO/inversion (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformacion, distribucion, etc) (D)
			Recomendaciones para mejorar el cumplimiento (E)

Cerro de Pasco, 24 de febrero de 2025

[Handwritten signature]
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
 GOBIERNO REGIONAL PASCO

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO

[Handwritten signature]
 ING. DOMINGO CARHUAZ LOYOLA
 SUPERINTENTE DE OBRAS Y E.M.



FICHAS DE IMPLEMENTACION AEI

CODIGO Y NOMBRE DE LA UO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y EQUIPO MECANICO	Situación actual de cumplimiento de la AO/inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc) (D)	Recomendaciones para mejorar el cumplimiento (E)
<p>AO/ inversiones clave en la implementación de la AEI (A)</p> <p>AO100088500614 PLAN DE MEJORAMIENTO Y APERTURA DE TROCHA CARROZABLE EN EL DISTRITO DE PAUCAR PROV. DANIEL A. CARRION REGION PASCO.</p>	<p>Alcance de la AO/ inversión en contribución a la AEI (B)</p> <p>Es una Actividad operativa donde fortalece la gestión institucional que sera en beneficio de los ciudadanos del distrito de Paucar.</p>	<p>Se da cumplimiento de esta actividad que se atiende con el Mejoramiento y Apertura de la Trocha Carrozable en el Distrito de Paucar.</p>	<p>En esta actividad operativa se desarrollo con un presupuesto que representa para la apertura de la trocha carrozable en Paucar en beneficio de la Población que sera el desarrollo de la población.</p>	<p>Con la atención del mantenimiento de estas Trocha carrozable se da para el beneficio de los lugareños de Paucar.</p>
<p>AO100088500620 PLAN DE TRABAJO CREACION DE ACCESO VEHICULAR DEMETRIO TEMPLADERA MARTINEZ DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE SUNECA REFACCION DE LA COBERTURA D DEL DISTRITO DE TICLACAYAN.</p>	<p>Es una Actividad operativa donde fortalece la gestión institucional que sera en beneficio de la población DE Sunece-Ticlacayán.</p>	<p>Se da cumplimiento de esta actividad que se atiende con la Creación del acceso Vehicular del centro Poblado de Sunece en el Distrito de Ticlacayán, beneficiando a la población de la zona.</p>	<p>En esta actividad operativa se desarrolla pedido de la población de Sunece Ticlacayán donde se procede con atenciones de equipos y maquinarias pesada. Donde la gestión atiende a esta población para el desarrollo de la población.</p>	<p>Con la atención de la creación del acceso vehicular para el beneficio de la población que sirve para el desarrollo económico y social.</p>

Cerro de Pasco, 24 de Febrero de 2025.


 DANIEL CARHUAZ LOYOLA
 GERENTE DE OBRAS Y E.M.


 GOBIERNO REGIONAL PASCO


 DANIEL CARHUAZ LOYOLA
 GERENTE DE OBRAS Y E.M.



FICHAS DE IMPLEMENTACION AEI

CODIGO Y NOMBRE DE LA UO/ SUB GERENCIA DE OBRAS Y EQUIPO MECANICO	CODIGO Y DENOMINACION DE O9. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	CODIGO Y DENOMINACION DE O9.03 GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.	Alcance de la AO/ inversion en contribucion a la AEI (B)	Situacion actual de cumplimiento de la AO/inversion (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformacion, distribucion, etc) (D)	Recomendaciones para mejorar el cumplimiento (E)
<p>AO/ inversiones clave en la implementacion de la AEI (A)</p> <p>AO100088500587 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA-CERRO DE PASCO</p>	<p>La Actividad operativa de inversion contribuye a la accion estrategica fortaleciendo al Gobierno Regional-Sub Gerencia de Obras, dando beneficio, ahorrando tiempo en el transporte de la poblacion de Cerro de Pasco.</p>	<p>La Actividad operativa da cumplimiento a un proceso de ejecucion de acuerdo al expediente de obra, ejecutandose en los plazos establecidos de acuerdo a un cronograma de calendario de obra.</p>	<p>Factores que afectan en estas obras de inversion es por el espacio de tiempo por la naturaleza, falta la ejecucion de partidas por no contratar con el Residente de Obra, falta evaluar la contratacion de servicios determinando la aplicacion de penalidades a los que corresponden, asimismo se contempla algunos tramites burocraticos que no se cumple el desarrollo de ejecucion.</p>	<p>En esta actividad siempre va de la mano con el monitoreo y seguimiento del proyecto, para una evaluacion contando con personal profesional para su desarrollo generando informes de responsabilidad en el proceso de ejecucion de obra, donde se programa la liquidacion de obra, a fin de determinar todo el proceso de gasto financiero.</p>	<p>En esta actividad existe la demora en atender con las certificaciones presupuestales generandose el incumplimiento de metas por falta de atencion oportuna.</p>	<p>En esta actividad a fin de cumplir oportunamente la ejecucion del gasto operativo es necesario contar en forma oportuna las certificaciones presupuestales.</p>
<p>AO100088500438 SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES A CARGO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS.</p>	<p>La Actividad Operativa del seguimiento de Inversion de la Sub Gerencia de Obras, que cumple con los objetivos donde fortalecera la gestion institucional hacia un gobierno en desarrollo.</p>	<p>Se da cumplimiento de esta actividad que se desarrolla su ejecucion en funcion a un cronograma de metas establecidas en lo que concierne a gastos operativos para que el personal realice su actividad de seguimiento de inversiones en obras.</p>	<p>En esta actividad existe la demora en atender con las certificaciones presupuestales generandose el incumplimiento de metas por falta de atencion oportuna.</p>	<p>En esta actividad a fin de cumplir oportunamente la ejecucion del gasto operativo es necesario contar en forma oportuna las certificaciones presupuestales.</p>	<p>En esta actividad a fin de cumplir oportunamente la ejecucion del gasto operativo es necesario contar en forma oportuna las certificaciones presupuestales.</p>	<p>En esta actividad a fin de cumplir oportunamente la ejecucion del gasto operativo es necesario contar en forma oportuna las certificaciones presupuestales.</p>



GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. Efraim Dávalos CARRIZAZ LOYOLA
SUB GERENTE DE OBRAS Y E.M.

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. Efraim Dávalos CARRIZAZ LOYOLA
SUB GERENTE DE OBRAS Y E.M.

FICHAS DE IMPLEMENTACION AEI

CODIGO Y NOMBRE DE LA AO/ inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO/ inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO/ inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc) (D)	Recomendaciones para mejorar el cumplimiento (E)
<p>AO100088500439 MONITOREO, EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA</p>	<p>La Actividad Operativa del Monitoreo de ejecución de obras por administración directa de la Sub Gerencia de Obras, que debe cumplir con los objetivos donde fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno en desarrollo.</p>	<p>Se da cumplimiento de esta actividad que se desarrolla su ejecución en función a un cronograma de metas establecidas en lo que concierne a gastos operativos para que el personal realice su actividad de monitoreo de inversiones en obras por administración directa.</p>	<p>En esta actividad existe la demora en atender con las certificaciones presupuestales generando el incumplimiento de metas por falta de atención oportuna.</p>	<p>En esta actividad a fin de cumplir oportunamente la ejecución del gasto operativo es necesario contar en forma oportuna las certificaciones pptaes.</p>
<p>AO100088500609 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS LOCALES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS JOSE CARLOS MARIA TEGUI, TAHUANTINSUYO, EN LA PROVINCIA DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO Y DEPARTAMENTO DE PASCO.</p>	<p>La Actividad Operativa de mantenimiento rutinario de las vías locales, donde se atiende con el pool dem aquinarias en beneficio de la población a fin de fortalecer la gestión institucional y así atender emergencia viales en zonas de riesgo.</p>	<p>Se da cumplimiento de esta actividad que se desarrolla su ejecución en función a un cronograma de actividades que concierne a gastos operativos previendo la atención oportuna en zonas de emergencia en la parte vial para el beneficio de la población de la región Pasco.</p>	<p>En esta actividad operativa de realizo apoyo con las maquinarias pesadas mediante convenio con el asentamiento humano que son en beneficio de la población cumpliendo así con la gestión institucional del Gobierno Regional Pasco.</p>	<p>En esta actividad operativa de inversiones por tratarse de pool de maquinarias pesadas es necesario cumplir con los mantenimientos preventivo y correctivo a las maquinarias para un buen uso y tener la duración para así atender a la población de Pasco en emergencias viales.</p>



Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. Elmer CARRIAZ LOYOLA
SUB GERENTE DE OBRAS Y E.M.

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. Elmer CARRIAZ LOYOLA
SUB GERENTE DE OBRAS Y E.M.

61

FICHAS DE IMPLEMENTACION AEI

CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD DE INVERSION	Alcance de la AO/ inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO/inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc) (D)	Recomendaciones para mejorar el cumplimiento (E)
<p>AO/ inversiones clave en la implementación de la AEI (A)</p> <p>AO100088500507 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.</p>	<p>La Actividad Operativa del Monitoreo de ejecución de obras por administración directa de la Sub Gerencia de Obras, que debe cumplir con los objetivos donde fortaleciera la gestión institucional hacia un gobierno en desarrollo.</p>	<p>Se da cumplimiento de esta actividad que se desarrolla su ejecución en función a un cronograma de metas establecidas en lo que concierne a gastos operativos para que el personal realice su actividad de monitoreo de inversiones en obras por administración directa.</p>	<p>En esta actividad existe la demora en atender con las certificaciones presupuestales generando el incumplimiento de metas por falta de atención oportuna.</p>	<p>En esta actividad a fin de cumplir oportunamente la ejecución del gasto operativo es necesario contar en forma oportuna las certificaciones pptaes.</p>
<p>AO100088500507 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.</p>	<p>La Actividad Operativa de Inversión fortalece la gestión institucional en la inversión pública eficiente que será en beneficio de los ciudadanos de Pasco, para atender emergencia viales donde contribuirán con el pool de maquinarias en zonas de riesgo y emergencia, dando solución a las poblaciones de Pasco.</p>	<p>Se da cumplimiento de esta actividad que se desarrolla su ejecución en función a un cronograma de metas con un expediente técnico aprobado en lo que concierne a gastos de inversiones preveyendo la atención oportuna en zonas de emergencia en la parte vial para el beneficio de la población de la región Pasco.</p>	<p>En esta actividad operativa de realización compra de activos que corresponde a maquinarias pesadas mediante proceso de selección cumpliendo a la Ley de contrataciones del Estado para así llevar un proceso con toda las formalidades desde la aprobación del expediente técnico</p>	<p>En esta actividad operativa de inversiones por tratarse de pool de maquinarias pesadas es necesario cumplir con los mantenimientos preventivo y correctivo a las maquinarias para un buen uso y tenga la duración para así atender a la población de Pasco en emergencias viales.</p>



Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO

[Firma]
Ing. Eusebio Carruaz Loyola
SECRETARÍA DE OBRAS Y E.M.

[Firma]
Ing. Eusebio Carruaz Loyola
SECRETARÍA DE OBRAS Y E.M.

FICHAS DE IMPLEMENTACION AEI

CODIGO Y NOMBRE DE LA UO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y EQUIPO MECANICO	CODIGO Y DENOMINACION DE	09. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	CODIGO Y DENOMINACION DE	09.03 GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.
AO/ Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO/ inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO/inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc) (D)	Recomendaciones para mejorar el cumplimiento (E)	
AO100088500599 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DE DANIEL A. CARRION.	La Actividad Operativa donde se viene generando informes técnicos a fin de fortalecer la gestión institucional en la inversión pública eficiente que será en beneficio de la población de San Pedro de Pillao y así atender en forma eficiente las evaluaciones necesarias.	Se da cumplimiento de esta actividad que se desarrolla su ejecución en función a una evaluación técnica a fin de determinar saldos y reconocimientos de deudas anteriores.	En esta actividad operativa es una actividad de inversión de ejercicios anteriores, donde se procede con liquidación, luego hay requerimientos de población donde han provisto manerisles, razon de ello se viene evaluando en forma técnica para determinar y atender estos pedidos.	En esta actividad operativa por tratarse de reconocimiento de deuda donde se optara con informes técnicos evaluando el estado situacional de esta obra	
AO100088500611 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA VECINAL RUTA B BELLO HORIZONTE QUEBRADA EL ENCANTO VALLE NAZARETH RIO PUCHARIN LONG. 20.700 KM DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ.	Es Una actividad operativa que representa emergencia por las temporadas de lluvias donde fortalece la gestión institucional en beneficio de la población del distrito de Puerto Bermudwz.	Se da cumplimiento de esta actividad que se procede con la ejecución en vista que es una actividad que representa emergencia de las vías vecinal mucho mas en esta temporada de lluvias.	En esta actividad operativa se desarrollo el mantenimiento periodico de la via vecinal uniendo varias rutas vecinales como es ruta Bello Horizonte, Quebrada el Encanto, Valle Nazareth, Rio Pucharin.	Con la atención del mantenimiento de estas vías vecinales en beneficio de la población para el desarrollo de todas sus actividades económica y sociales.	
AO100088500612 REFACCION DE LA COBERTURA DE LA IE 31576 RICARDO PALMA-CHAUPIMARCA PASCO.	Es una Actividad operativa donde fortalece la Gestión institucional que sera en beneficio de la población educativa Ricardo Palma.	Se da cumplimiento de esta actividad que se atiende con la refacción en vista que se trata de un centro educativo priorizando el gasto en forma eficiente.	En esta actividad operativa se desarrollo la refacción de la institución educativa atendiendo a la población estudiantil Ricardo Palma.	Con la atención del mantenimiento de estas vías vecinales en beneficio de la población para el desarrollo de todas sus actividades económica y sociales.	



GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. Eison Aguado CARHUAZ LOYOLA
SUB GERENTE DE OBRAS Y E.M.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DISTRITO DE CHAUPI MARCA PASCO
CALLE DE LA UNIÓN Nº 1001
TEL: 053 222 222 222
WWW.GOB.PASCO.GOV.PE

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Unidos

para Avanzar

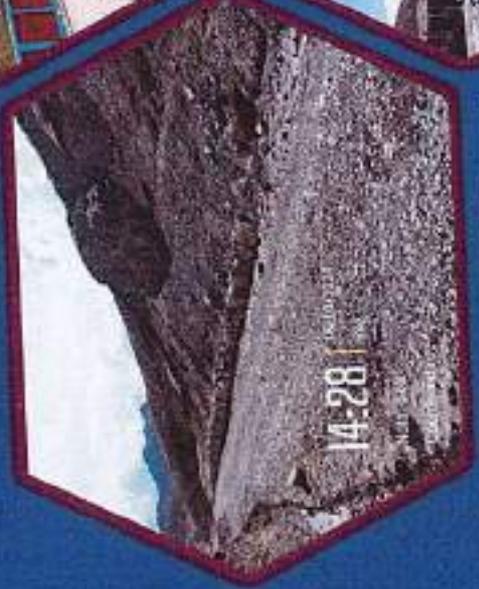


RESIDENTE DE OBRA: ING. IVAN BARZOLA ROSALES
INSPECTOR DE OBRA: ING. HUGO DAVID AGUI ROBLES





Unidos
para Avanzar

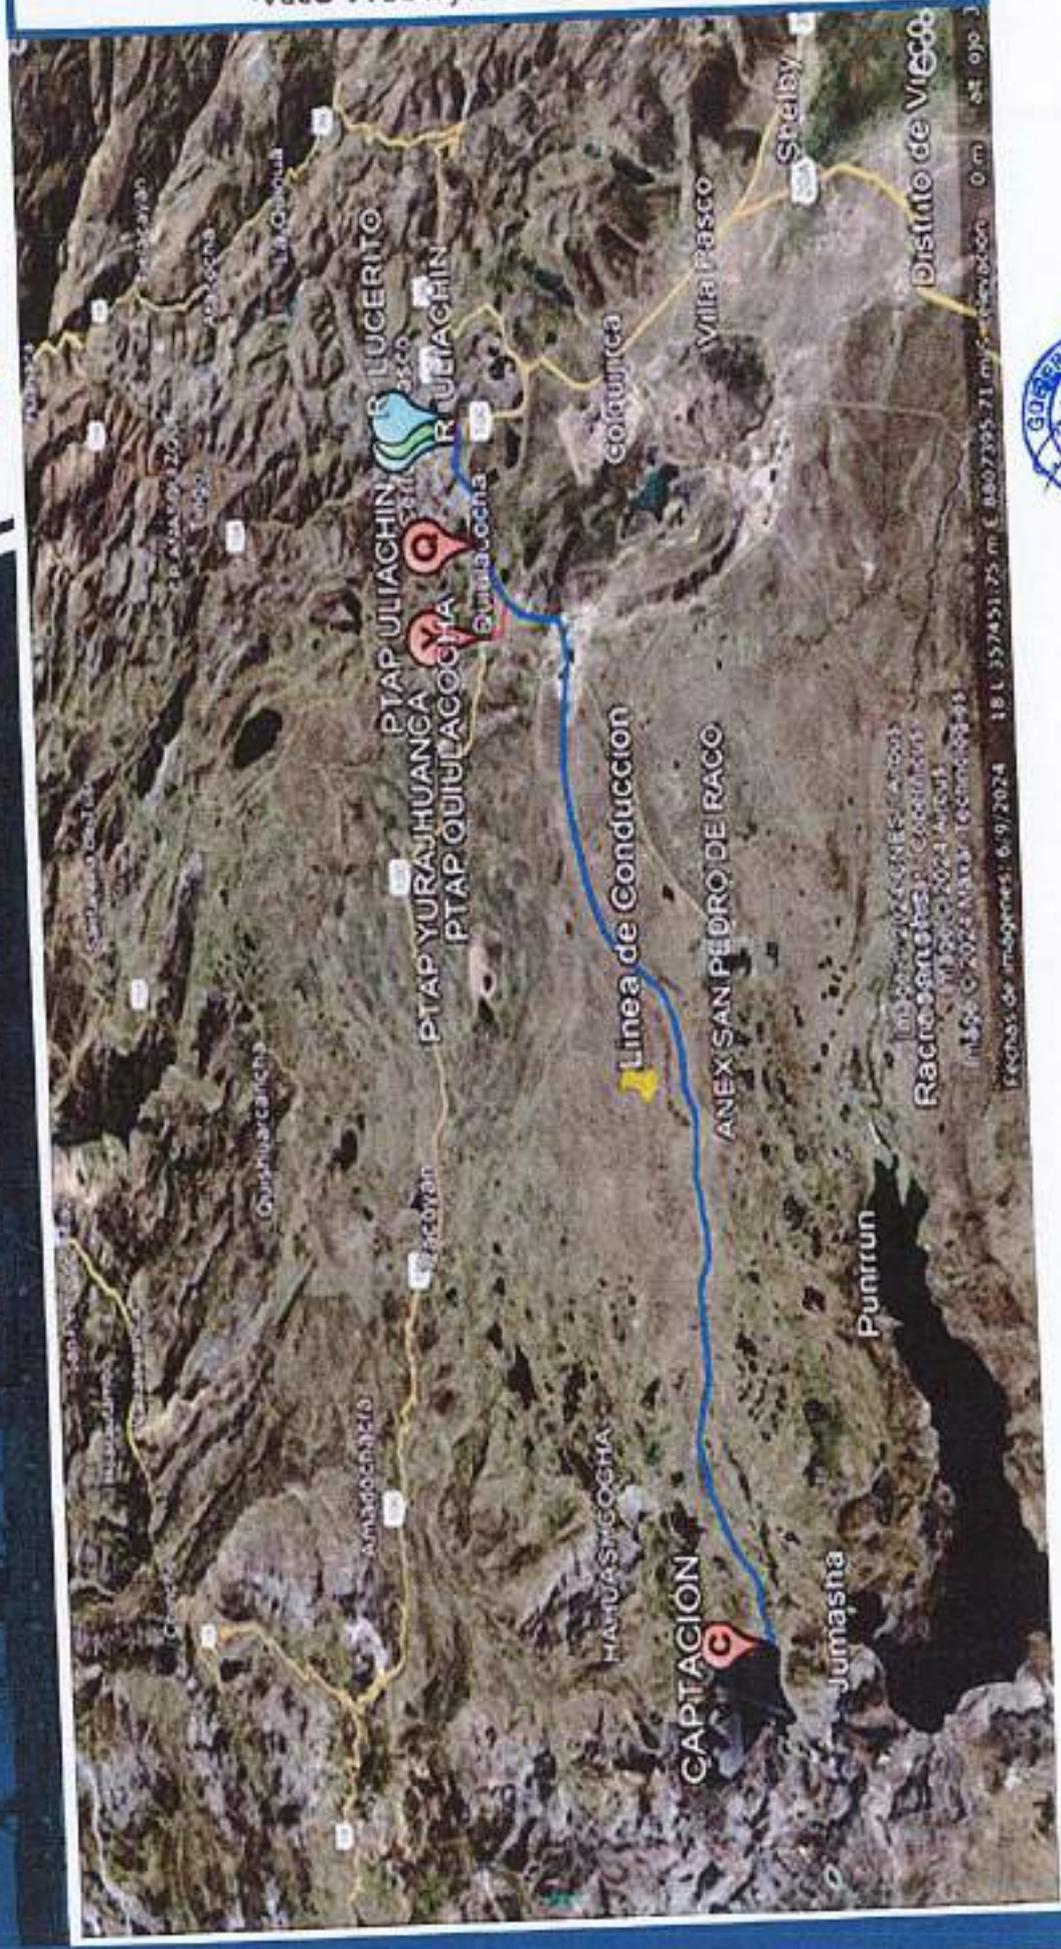


LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANAMIENTO -
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO -
PROVINCIA DE PASCO - PASCO"

50
STES LITENANC



Unidos
para Avanzar

**CAPTACION
LAGUNA ACUCOCHA**

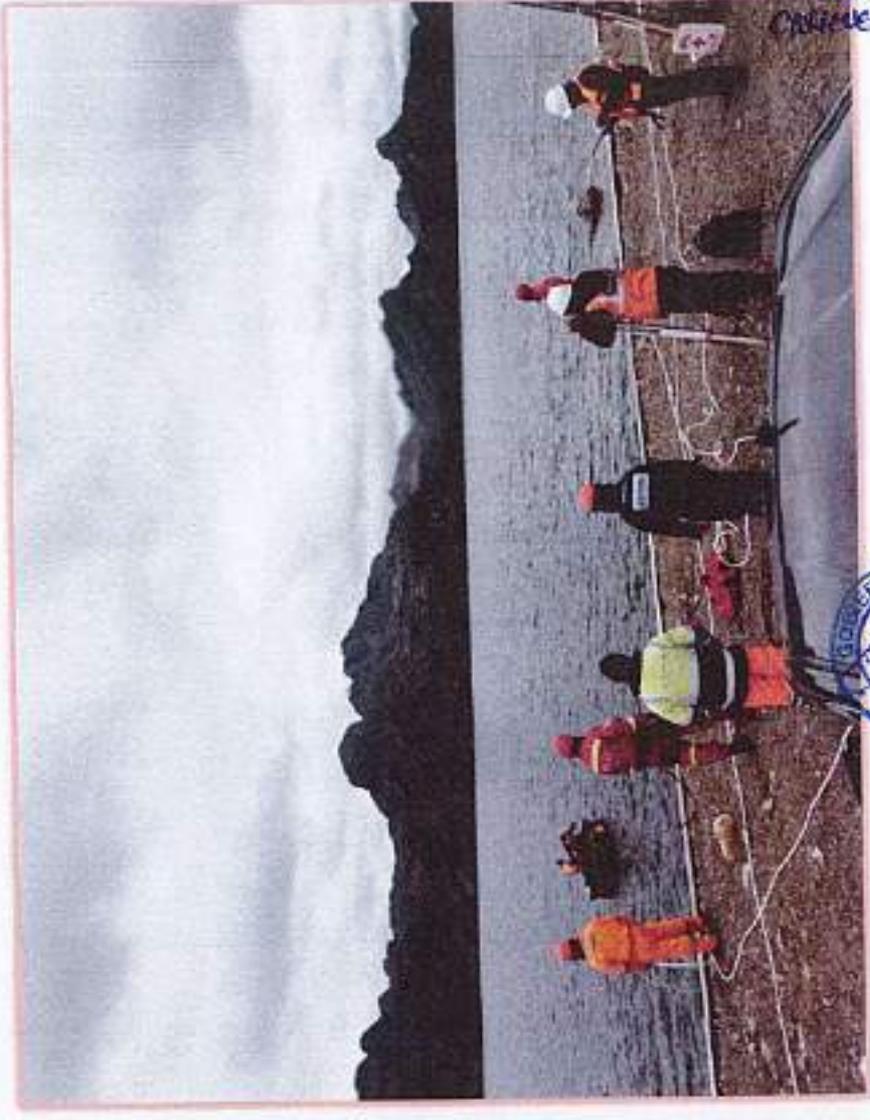

35
CRIMESTICLACD



Unidos
para Avanzar

LINEA DE CONDUCCION



54
CINCUENTY CUATRO



Unidos
para Avanzar

PTAP ULIACHIN



PTAP
ULIACHIN



RESERVORIO
QUILACOCHA



RESERVORIO
ULIACHIN



RESERVORIO
LUCERITO



RESERVORIO
YURAGHUANCA



33
CINCUENTITRES



Unidos
para Avanzar



INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA OBRA
2. ORGANIGRAMA
3. EDT - OBRAS
4. RESUMEN PRINCIPALES DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
5. CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA
6. PLAN DE TRABAJO
7. GESTIÓN DE LA CALIDAD
8. GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
9. ENTREGA DE TERRENO E INTERFERENCIAS





Unidos
para Avanzar

51
CONCUENTRANO



1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA OBRA

- | | |
|---|--|
| 1. Unidad ejecutora | : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO |
| 2. Ubicación | : CERRO DE PASCO – PASCO –
(CHAUPIMARCA-SIMON BOLIVAR-YANACANCHA) |
| 3. Modalidad de Ejecución | : ADMINISTRACION DIRECTA |
| 4. Sub Gerente de obra | : ING. ELVIN DANILO CARHUAZ LOYOLA |
| 5. Inspector de Obra | : ING. HUGO DAVID AGUI ROBLES |
| 6. Residente de Obra | : ING. WALTER IVAN BARZOLA ROSALES |
| 7. Inicio Contractual de Obra | : 07 DE JULIO DE 2020 |
| 8. Nueva fecha de Termino de Obra | : 27 DE ABRIL DE 2025 |
| 9. Expediente Técnico Saldo | |
| 10. Incremento y deductivo vinculante N° 01 | |
| 11. Incremento y deductivo vinculante N° 02 | |
| 12. Incremento y deductivo vinculante N° 03 | |
| 13. Incremento y deductivo vinculante N° 04 | |
| 14. Incremento y deductivo vinculante N° 05 | (POR APROBAR) |



Unidos
para Avanzar

1. RESUMEN ACTUAL DE EJECUCION

RESUMEN DE VALORIZACION ACTUAL

	% VALORIZADO ACUMULADO	MONTO VALORIZADO ACUMULADO	% DE EJECUCION (QUITANDO LOS DEDUCTIVOS)	MONTO DE EJECUCION (QUITANDO LOS DEDUCTIVOS)	SALDO POR EJECUTAR (S/.)	N° DE VALORIZACION	FECHA ULTIMA DE VALORIZACION
EXPEDIENTE CONTRACTUAL SALDO	60.92%	S/ 8,910,773.58	71.56%	S/ 10,467,886.40	S/ 1,557,112.82	VALORIZACIÓN N° 40	Dic-24
INCREMENTO DEDUCTIVO N° 01	91.02%	S/ 2,900,961.00	91.20%	S/ 2,906,783.76	S/ 5,822.76	VALORIZACIÓN N° 15	Jun-24
INCREMENTO DEDUCTIVO N° 02	60.94%	S/ 4,293,650.08	90.73%	S/ 6,417,122.60	S/ 2,123,472.52	VALORIZACIÓN N° 26	Ene-25
INCREMENTO DEDUCTIVO N° 03	81.51%	S/ 1,366,216.12	99.26%	S/ 1,663,726.19	S/ 297,510.07	VALORIZACIÓN N° 10	Nov-24
INCREMENTO DEDUCTIVO N° 04	73.06%	S/ 1,857,944.07	100.00%	S/ 2,543,001.91	S/ 685,057.84	VALORIZACIÓN N° 11	Oct-24



CINCUENTA



Unidos
para Avanzar

1.2 AVANCE FISICO- FINANCIERO

AVANCE FISICO	S/ 19,277,792.74	80.35%
AVANCE FINANCIERO	S/ 24,388,903.01	90.55%



1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA OBRA

1.1. Ubicación del Proyecto



Unidos
para Avanzar





1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA OBRA

1.1. Ubicación del Proyecto






Unidos
para Avanzar



2. ORGANIGRAMA

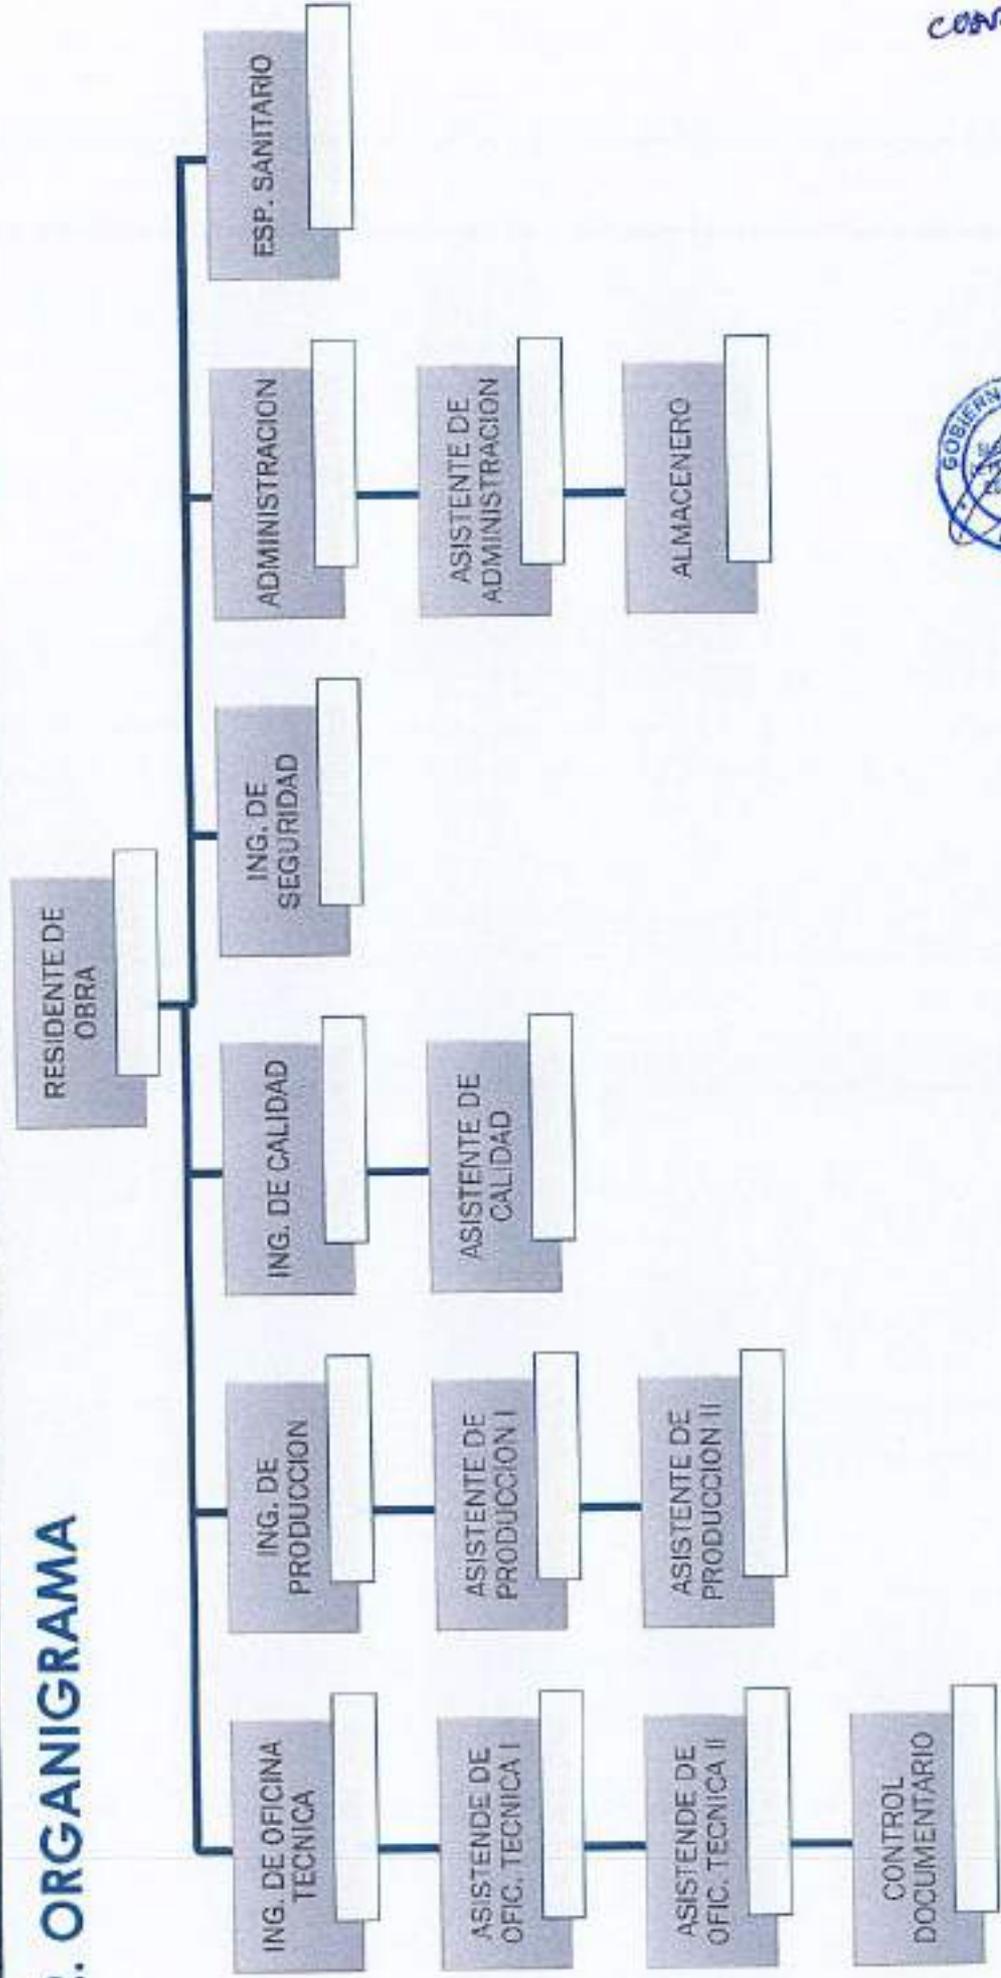


COMPLEMENTOS



Unidos
para Avanzar



5. CRONOGRAMA MASTER DE LA OBRA

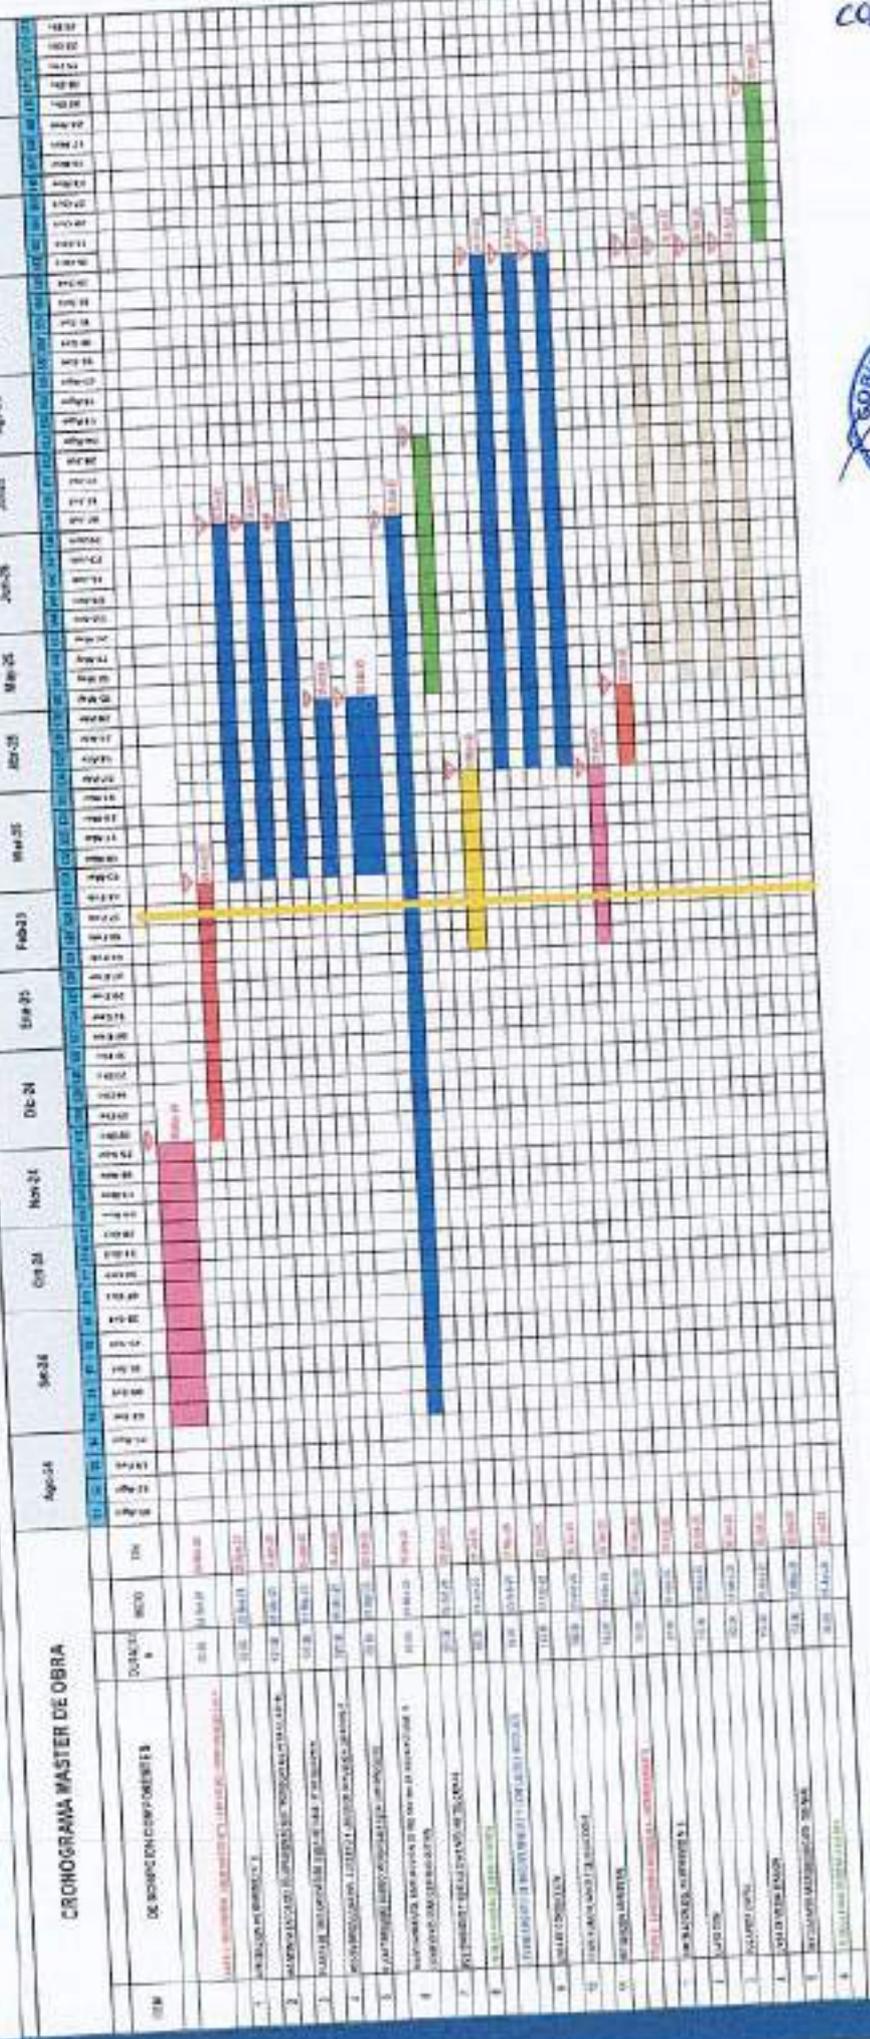


1.4



Unidos
para Avanzar

6. INTERFERENCIAS

COMUNIDADES CON RESTRICCIONES PARA DAR INICIO

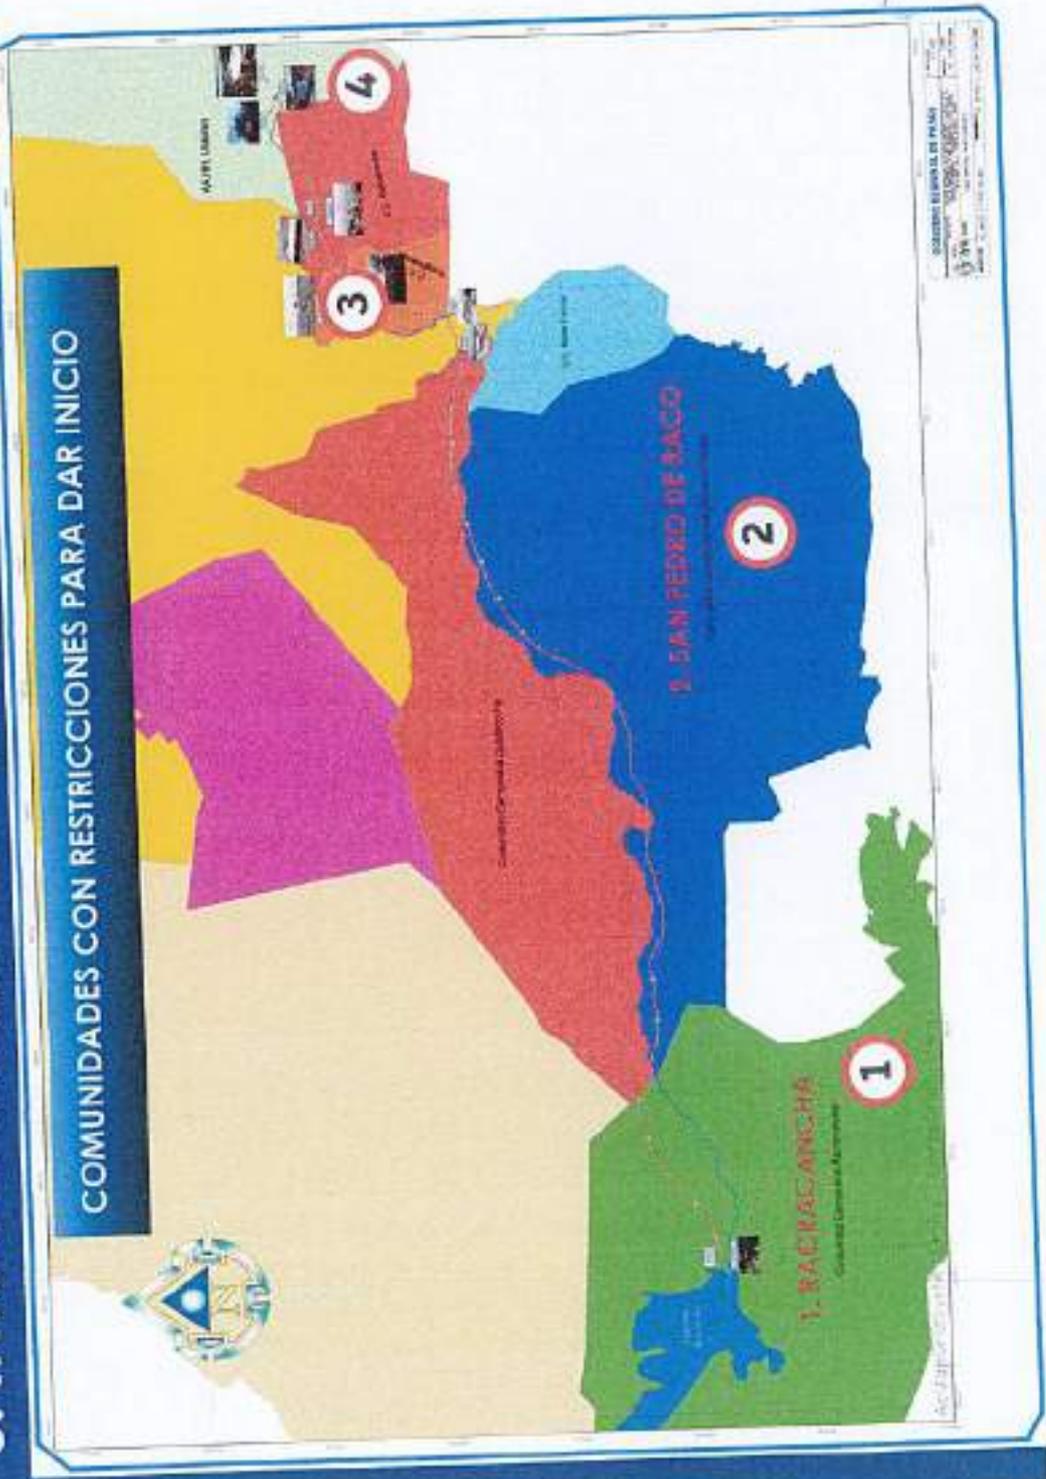

1. Comunidad Campesina Racracancha
2. Centro Poblado de San Pedro de Racco
3. Comunidad Campesina de Yurajhuanca
4. Cooperativa Agraria Yanamate






Unidos
para Avanzar

7. PLAN DE TRABAJO

7.1. 1RA ETAPA (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA)

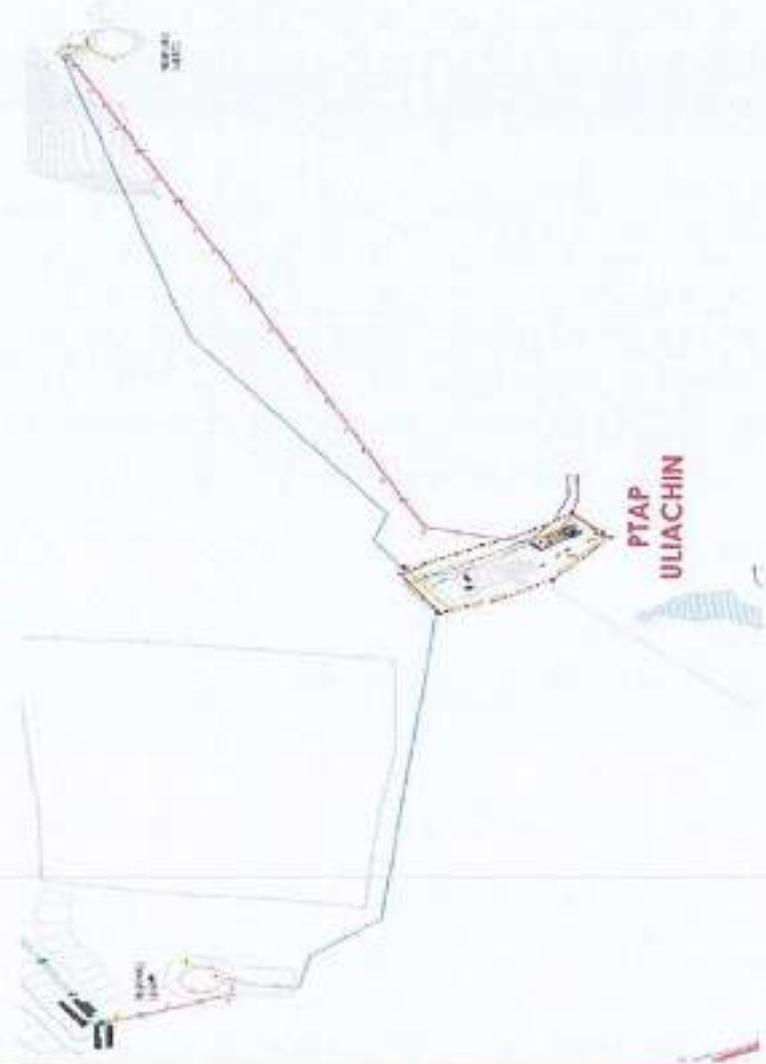

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1. <input type="checkbox"/> PTAP - ULIACHIN</p> <p><input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PTAP ULIACHIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SALDO PRINCIPAL ACCESORIOS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INCREMENTO 02</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> VALVULAS COMPUERTA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ESTRUCTRA DE SOPORTE CON GRAVA CLASIFICADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SISTEMA DE FILTROS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SISTEMA DE PROTECCION ANTE FUGAS DE CLORO GAS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESINFECION</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MEDIDOR DE CAUDAL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ESTABILIZACION DE TERRENO COLINDANTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> RESERVOIRIO POST LIMPIEZA</p> <p><input type="checkbox"/> INCREMENTO 04</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> LINEA DE CAUDALIMETRO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INSTALACIONES ELECTRICAS</p> | <p>2. RESERVOIRIO - ULIACHIN</p> <p><input type="checkbox"/> INCREMENTO 02</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO HIDRAULICO</p> | <p>3. RESERVOIRIO - LUCERIO</p> <p><input type="checkbox"/> INCREMENTO 02</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO HIDRAULICO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS</p> |
|---|---|--|

42
COBERTURAS





Unidos
para Avanzar

7. PLAN DE TRABAJO

7.2. 2DA ETAPA – INCREMENTO 06


1.- CAPTACION
(Elaboración de expediente técnico por consultoría)



2.- LINEA DE MEDIA TENSION A PTAP
(Elaboración de expediente técnico por consultoría)



4.- Microorganismos -
Daphnias
(Elaboración de expediente técnico por consultoría)

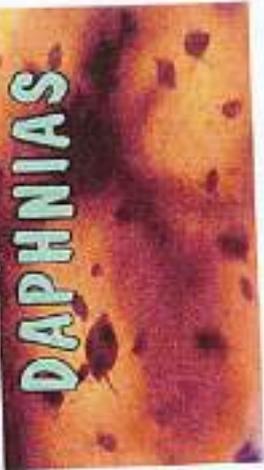

3.- POZA DE POST LIMPIA
(Elaboración de expediente técnico por consultoría)



CLARENTE 10/06/20




Unidos
para Avanzar

8. CONTROL DE CALIDAD

1.- Regularización de pruebas y protocolos de calidad en todos los componentes de la obra.

2.- Elaboración de planes de operación y mantenimiento de todos los componentes de la obra.

3. Elaboración de PLANOS As-Built, para la entrega parcial y liquidación de la obra.

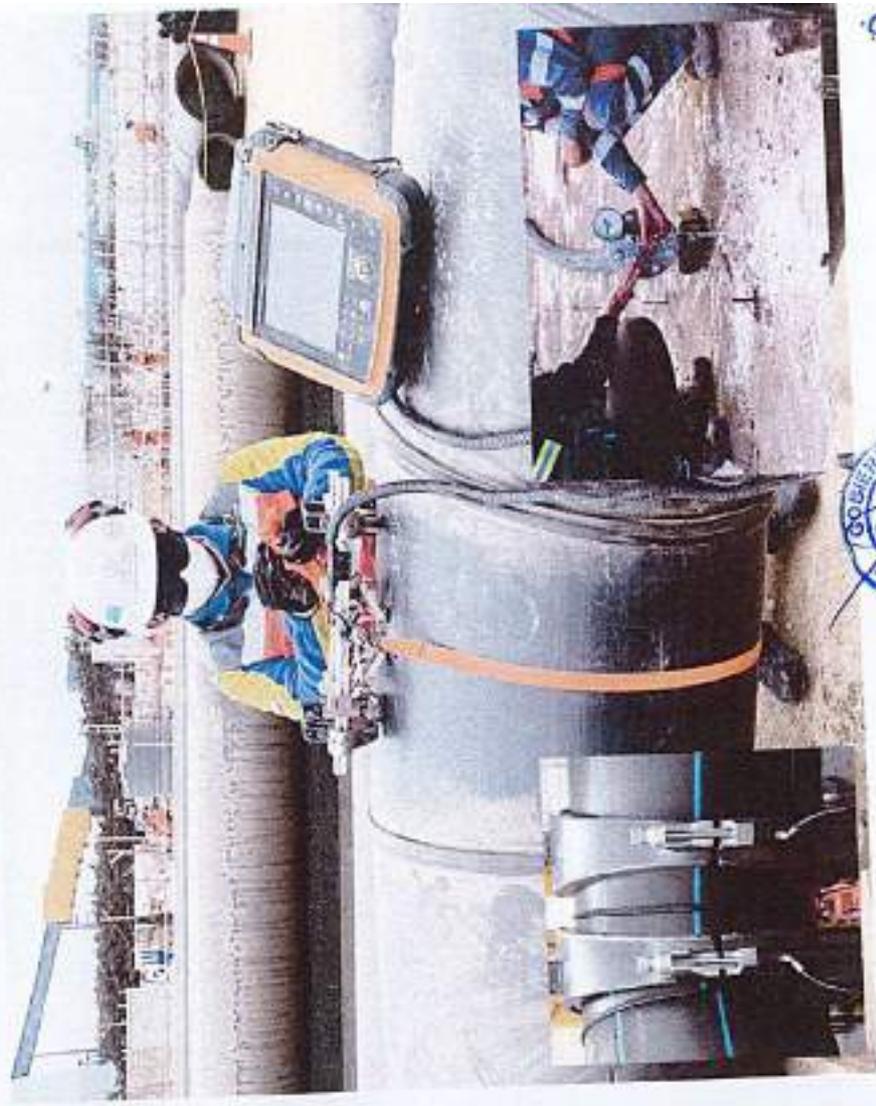

CUARRITA



Unidos
para Avanzar

9.- GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES

1.- Iniciar negociaciones a través de un intermediario con experiencia en conflictos sociales.

2.- Conformación de una mesa de dialogo, conformada con representantes al mas alto nivel del GORE PASCO



TREINTA Y OCHO



Unidos
para Avanzar



10.- PROGRAMACION PRESUPUESTAL

Avance	Año 2025				TOTAL
	ene	feb	mar	abr	
Avance financiero programado	S/ 43,000.00	S/ 80,000.00	S/ 200,000.00	S/ 1,440,540.00	S/ 1,763,540.00
Avance financiero actualizado	S/ 43,000.00	S/ 80,000.00	S/ 200,000.00	S/ 1,350,540.00	S/ 1,763,540.00
Avance final (Devengado/Girado) ***	S/ 43,657.00	S/ 54,017.00			

PROGRAMACION FINANCIERA PARA EL MES DE FEBRERO

1. Pago de planilla obrero del mes de enero.
2. Pago de suministro de energía eléctrica.



INFORME N° 004-2025-FLAA/IO-CARRETERA YANAHUANCA – CERRO DE PASCO

ATENCIÓN : Ing. Miguel A. TUFINO VILLANES
 Sub Gerente de Obras Y Equipo Mecánico

DE : Ing. Fernando Luis AGUILAR ACUÑA
 Inspector de Obra

SIGGEDO	
REG.DOC.	02892310
REG. EXP.	01681275



ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN SOLICITADA DEL PROYECTO CON CUI N° 2029684


REFERENCIA : a) OFICIO N°0000006-2025-CG/DC5348
 b) OBRA: SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS "MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE YANAHUANCA – CERRO DE PASCO"

FECHA : Pasco, 17 de enero del 2025

Me dirijo a usted con el cordial saludo y en atención al documento en referencia a), se REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA – CERRO DE PASCO" – CUI 2029684, se detalla lo siguiente:

1. Estado situacional de la ejecución de la obra, detalle avance: físico y financiero acumulados, así como avances mensuales físicos y financieros.

1.1 Estado situacional de obra desde el año 2021 al 2024



1.1.1 Datos generales de la obra.

- ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
- FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DETERMINADOS (FONCOR)

- CADENA FUNCIONAL : TRANSPORTES
- CUI : 2029684.
- MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
- OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA – CERRO DE PASCO

- UBICACIÓN : REGIÓN : PASCO
 PROVINCIA : PASCO Y DANIEL A. CARRION
 DISTRITO : SIMON BOLIVAR - YANAHUANCA

- CADENA PRESUPUESTAL : Resolución de Ap. : RGGR N°0420-2021- GRP/GGR
 Resolución de Ap. de : RGGR N°0210-2023- GRP/GGR
 mayores metrados
 Resolución de Ap. de : RGGR N°0209-2023- GRP/GGR
 Incremento N°1

1.1.2 Tiempo de ejecución de obra

- PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 105 DÍAS CALENDARIOS
- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 01/09/2021

Fernando Luis Aguilar Acuña
 Inspector de Obra



▪ FECHA DE INICIO DE OBRA	: 01/09/2021
▪ FECHA DE TERMINO PROGRAMADA	: 14/12/2021
▪ AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	: 45 DÍAS CALENDARIOS
▪ TERMINO AMPLIACIÓN PLAZO 01	: 29/01/2022
▪ PARALIZACIÓN DE OBRA N° 01	: 18/12/2021
▪ FECHA DE REINICIO DE OBRA	: 09/05/2022
▪ PARALIZACIÓN DE OBRA N° 02	: 10/05/2021
▪ REINICIO DE OBRA N° 2	: 17/08/2022
▪ PARALIZACIÓN DE OBRA N° 03	: 15/09/2022
▪ AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02	: 34 DÍAS
▪ FECHA DE REINICIO DE OBRA	: 10/10/2022
▪ NUEVA FECHA DE TERMINO	: 22/11/2022
▪ AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03	: 30 DÍAS CALENDARIOS
▪ PARALIZACIÓN DE OBRA N° 04	: 23/11/2022
▪ FECHA DE REINICIO DE OBRA	: 15/12/2022
▪ NUEVA FECHA DE TERMINO	: 13/01/2023
▪ AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04	: 62 DÍAS CALENDARIOS
▪ NUEVA FECHA DE TERMINO	: 13/03/2023
▪ PARALIZACIÓN DE OBRA N° 05	: 03/02/2023
▪ FECHA DE REINICIO DE OBRA	: 18/07/2023
▪ TERMINO DE OBRA TENTATIVO	: 30/09/2023
▪ PARALIZACIÓN DE OBRA N° 06	: 12/10/2023
▪ AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05	: 75 DÍAS CALENDARIOS
▪ FECHA DE REINICIO DE OBRA	: 02/11/2023
▪ PARALIZACIÓN DE OBRA N° 07	: 03/01/2024
▪ FECHA DE REINICIO DE OBRA	: 04/06/2024
▪ PARALIZACIÓN DE OBRA N° 08	: 03/08/2024
▪ FECHA DE REINICIO DE OBRA	: 19/09/2024
▪ TERMINO DE OBRA	: 29/09/2024



1.1.2 Base legal

- DIRECTIVA GENERAL N° 013-2017-GRP-GGR-GRI/SGO, Normas y Procedimiento para la Ejecución de Obras Publicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional de Pasco.
- DIRECTIVA GENERAL N° 008-2017-GRP-GGR-GRI/SGLT, Normas y Procedimiento para la transferencia de Infraestructura y Componentes de Proyectos de Inversión Publica Ejecutados y/o financiados por el Gobierno Regional de Pasco.

1.1.3 Avance físico y financiero acumulado mensualizado

En los siguientes cuadros se está enviando la información mediante resúmenes por año

Fernando Aguilar Acuña
INGENIERO CIVIL
CIP 141338



ING. FERNANDO LUIS AGUILAR ACUÑA
INGENIERO CIVIL - CIP N° 141338
INSPECTOR DE OBRAS

AÑO 2021 LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMAHUANCA - PASCO"

01 al 30 setiembre 2021			01 al 30 octubre 2021			01 al 30 noviembre 2021			01 al 18 diciembre 2021			Total Ejecutado	
Valorización 1 - sept. 2021			Valorización 2 octubre-2021			Valorización 3 noviembre 2021			Valorización 4 diciembre 2021				
Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Parcial	%
15407.43	475.43	3.1%	53097.27	1349.93	2.5%	29944.88	748.62	2.5%	37770.71	929.27	2.5%	140129.86	2.1%
15407.43	15407.43	100%	65347.30	65347.30	100%	39253.03	39253.03	100%	38059.08	38059.08	100%	143.633.11	2.1%

AÑO 2022 LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMAHUANCA - PASCO"

Del 17 al 31 agosto 2022			Del 01 al 31 setiembre 2022			Del 01 al 30 octubre 2022			Del 01 al 31 de noviembre 22			Del 1 al 01 febrero 2023		
Valorización 5 - agosto 2022			Valorización 6 - setiembre 2022			Valorización 7 - octubre 2022			Valorización 8 - noviembre 2022			Valorización 9 - febrero 2023		
Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%
6334.86	1788.81	28.2%	3013.02	5673.81	18.8%	3307.04	9085.85	27.2%	11649.79	41467.64	35.6%	19334.08	60801.72	61.2%
6334.86	6334.86	100%	8726.04	8726.04	100%	3307.04	3307.04	100%	11649.79	11649.79	100%	30783.16	30783.16	100%

AÑO 2022 SERVICIO DE RECAPEO INCLUIDO BACHEO-PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMAHUANCA - PASCO"
ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 001-2022-G.R.PASCO/GGR

CONTRATO N° 01 - 2022-G.R.PASCO/GGR- CONSORCIO VIAL YAMAHUANCA, FECHA 09-FEBRERO-2022			
Según Exp. Técnico	Contrato ofertado	Modificado al Ofertado	
Precio	Total	Precio U.	Total
5,938,035.31	5,690,226.84		10,279,643.95

MAYOR METRADO TOTAL	
Metrado	costo
708,367.82	10,988,010.78



30
TREINTI CINCO



- II. Estado situacional de los servicios contratados a razón de la ejecución de la obra: Indicar números de contrato, monto, descripción, si se encuentran ejecutados y liquidados, etc.

2.1 Antecedentes generales

- Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 0420-2021-GRP/GGR de fecha 27 de agosto de 2021, se aprueba el Expediente Técnico de Saldo y Obras Complementarias "Mejoramiento de la Carretera Yanahuanca - Cerro de Pasco" con CUI 2029684, por el monto de S/. 6'629,455.66 (Seis millones seiscientos veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 66/100 soles), a ejecutarse bajo la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de ciento cinco (105) días calendarios.
- Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 0646-2021-G.R.PASCO/GGR de fecha 08 de diciembre de 2021, se APRUEBA la ampliación de PLAZO N° 1 por cuarenta y cinco (45) días calendarios, correspondiente a la ejecución de la obra por administración directa: SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA – CERRO DE PASCO", con CUI N° 2029684, haciendo un plazo total de ciento cincuenta (150) días calendarios.
- Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 596-2022-GRP/GGR de fecha 20 de setiembre de 2022, se aprueba el Presupuesto Análítico Actualizado de la obra: Saldo y Obras Complementarias: "Mejoramiento de la Carretera Yanahuanca – Cerro de Pasco" con CUI 2029684, por el monto de S/. 11,071,063.30 (Once millones Sesenta y Un Mil Sesenta y Tres con 68/100 soles), a ejecutarse bajo la modalidad de administración directa.
- Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 0750-2022-GRP/GGR de fecha 09 de noviembre del 2022, se aprueba el Presupuesto Análítico Modificado de la obra: Saldo y Obras Complementarias: "Mejoramiento de la Carretera Yanahuanca – Cerro de Pasco" con CUI 2029684, por el monto de S/. 12,654,457.91 (Doce millones seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete con 91/100 soles), a ejecutarse bajo la modalidad de administración directa.
- Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 209-2022-GRP/GGR de fecha 19 de mayo de 2022, se aprueba el EXPEDIENTE DE INCREMENTO DE OBRA N° 01 para la Ejecución de la Obra: SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS "MEJORAMIENTO DE CARRETERA YANAHUANCA – CERRO DE PASCO" con CUI 2029684, por el monto de S/. 706,124.12 (Setecientos seis mil ciento veinticuatro con 12/100 soles).
- Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 210-2022-GRP/GGR de fecha 19 de mayo de 2022, se aprueba el EXPEDIENTE DE MAYORES METRADOS para la Ejecución de la Obra: SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS "MEJORAMIENTO DE CARRETERA YANAHUANCA – CERRO DE PASCO" con CUI 2029684, por el monto de S/. 1,370,386.86 (Un millón trescientos setenta mil trescientos ochenta y seis con 86/100 soles).
- Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 305-2023-GRP/GGR de fecha 26 de junio de 2023, se aclara la denominación correcta del proyecto consignado en la RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 210-2023-GRP/GGR de fecha 19 de



Fernando Aguilar Acuña



mayo de 2023, quedando establecido conforme al siguiente detalle: APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO DE INCREMENTO DE OBRA N° 02 POR MAYORES METRADOS para la Ejecución de la Obra: SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS "MEJORAMIENTO DE CARRETERA YANAHUANCA – CERRO DE PASCO" con CUI 2029684, por el monto de S/. 1,370,386.86 (Un millón trescientos setenta mil trescientos ochenta y seis con 86/100 soles).

- Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 352-2023-GRP/GGR de fecha 10 de julio de 2023, se aprueba el Presupuesto Analítico para la ejecución financiera del presente año fiscal 2023, por el monto S/. 2,076,510.98 (Dos millones setenta y seis mil quinientos diez con 98100 soles).
- Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 627-2023-GRP/GGR, de fecha 20 de octubre del 2023 se declara procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, por un periodo de 75 días calendarios contabilizados a partir del 17 de octubre al 30 de diciembre del 2023.
- Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 858-2024-GRP/GGR de fecha 25 de octubre de 2024, se aprueba la actualización del Presupuesto Analítico, por el monto de S/ 761,831.41 (Setecientos sesenta y un mil ochocientos treinta y uno con 41/100 soles) de la obra: Saldo y Obras Complementarias "Mejoramiento de la Carretera Yanahuanca – Cerro de Pasco" con CUI 2029684, Ejecutados bajo la modalidad de administración directa.
- Mediante el cuaderno de obra se tiene una ACTA DE PARALIZACION N° 08 DE OBRA ABIERTA, con fecha 03 de agosto del 2024, emitido por la Residenta de Obra Ing. Eliazar TAQUIRE CARLOS, teniendo la conformidad a la paralización N° 08 por el Ing. Fernando Luis Aguilar Acuña (Inspector de Obra).
- Con ACTA DE REINICIO DE OBRA, se reinició el 19 de septiembre del 2024 y culminó su ejecución el 29 de septiembre del 2024 la obra: Saldo y Obras Complementarias "Mejoramiento de la Carretera Yanahuanca – Cerro de Pasco" con CUI 2029684



2.2. Antecedentes de los servicios

- Mediante CONTRATO N° 043-2023-G.R.PASCO/GGR, de fecha 05 de octubre de 2023, en el cual se contrata el SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE ASFALTO PARA LA OBRA: "SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA – CERRO DE PASCO", por el monto de S/. 51,343.74 (Cincuenta y un mil trescientos cuarenta y tres con 74/100 soles).
- Mediante CONTRATO N° 057-2023-G.R.PASCO/GGR, de fecha 19 de octubre de 2023, en el cual se contrata el SERVICIO DE BACHEO 2° EN CALIENTE A TODO COSTO PARA LA OBRA: "SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA – CERRO DE PASCO", por el monto de S/. 218,988.00 (Doscientos dieciocho mil novecientos ochenta y ocho con 00/100 soles).
- Mediante CONTRATO N° 062-2023-G.R.PASCO/GGR, de fecha 25 de octubre de 2023, en el cual se contrata el SERVICIO DE PERALTE DE CURVAS (ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR, IMPRIMACIÓN Y ASFALTADO) PARA LA OBRA: "SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA –

Fernando Luis Aguilar Acuña
Inspector de Obra



- CERRO DE PASCO", por el monto de S/. 294,150.00 (Doscientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles).
- Mediante CONTRATO N° 064-2023-G.R.PASCO/GGR, de fecha 26 de octubre de 2023, en el cual se contrata el SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE HUAYCOS Y DESMONTE DE CUNETAS CON MAQUINARIAS PARA LA OBRA: "SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA – CERRO DE PASCO", por el monto de S/. 76,500.00 (Setenta y seis mil quinientos con 00/100 soles).
- Mediante CONTRATO N° 065-2023-G.R.PASCO/GGR, de fecha 31 de octubre de 2023, en el cual se contrata el SERVICIO DE TACHAS RETROREFLECTIVAS A TODO COSTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA – CERRO DE PASCO", por el monto de S/. 322,040.00 (Trescientos veintidós mil cuarenta con 00/100 soles).
- Mediante CONTRATO N° 077-2023-G.R.PASCO/GGR, de fecha 15 de diciembre de 2023, en el cual se contrata el SERVICIO DE (CORTE DE ASFALTO, MEJORAMIENTO DE BASE, IMPRIMACIÓN, ASFALTO EN CALIENTE, ELIMINACIÓN DE ASFALTO Y PINTADO EN MARCAS A TODO COSTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA – CERRO DE PASCO", por el monto de S/. 198,918.00 (Ciento noventa y ocho mil dieciocho con 00/100 soles).
- Mediante CONTRATO N° 069-2023-G.R.PASCO/GGR, de fecha 16 de noviembre de 2023, en el cual se contrata el SERVICIO DE INSTALACIONES DE GUARDAVIAS A TODO COSTO SEGÚN DISEÑO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA – CERRO DE PASCO", por el monto de S/. 300,532.40 (Trescientos mil quinientos treinta y dos con 40/100 soles).



2.2.1 Estado situacional de los servicios contratados

ESTADO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS EL 2023

Nº	SERVICIOS CONTRATADOS	Nº CONTRATO	Plazo Contr.	Monto Contratado	Fecha	Estado	Observaciones	Declaración
1	Eliminación de estado para obras complementarias	064-2023-G.R.PASCO/GGR - 05/10/2023	90	51,343.71	Adicional	Ejecutado 2024	Sin liquidar	Servicio ejecutado al 100%, según contrato, a la fecha está en solicitud para devolución de Fondo de Garantía que no se ejecuta por ausencia de Residente de Obra desde el mes de octubre 2024
2	Rechazo 2° en caliente en tachas	065-2023-G.R.PASCO/GGR - 09/10/2023	90	219,668.00	Adicional	Ejecutado 2023	Sin liquidar	Servicio ejecutado al 100%, según contrato, a la fecha está en solicitud para devolución de Fondo de Garantía que no se ejecuta por ausencia de Residente de Obra desde el mes de octubre 2024; sujeta a penalidades por no levantar el caso.
3	Pavimento en curvas (Escarificado, base, imprim y asfalto)	065-2023-G.R.PASCO/GGR - 25/10/2023	90	294,150.00	Adicional	Ejecutado 2024	Sin liquidar	Servicio ejecutado al 70%, según contrato, a la fecha está para Resolución de contrato y a la vez penalidades que no se ejecuta por ausencia de Residente de Obra desde el mes de octubre 2024.
4	Eliminación huaycos, desmonte en camelo y maquinaria	064-2023-G.R.PASCO/GGR - 26/10/2023	90	76,500.00	Adicional	Ejecutado 2023	Sin liquidar	Servicio ejecutado al 100%, según contrato, a la fecha está en solicitud para devolución de Fondo de Garantía que no se ejecuta por ausencia de Residente de Obra desde el mes de octubre 2024;
5	Tachas retroreflectivas	065-2023-G.R.PASCO/GGR - 09/10/2023	90	322,040.00	Adj. Matraco	Ejecutado 2023	Sin liquidar	Servicio ejecutado al 100%, según contrato, se devolvió fondo de garantía previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones.
6	Instalación de Guardavías MTC	069-2023-G.R.PASCO/GGR - 16/11/2023	26	300,532.40	Adj. Matraco	Ejecutado 2023	Sin liquidar	Servicio ejecutado al 100%, según contrato, se devolvió fondo de garantía previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones.
7	Corte Asfalto, base, imprimación y pintado marcas	077-2023-G.R.PASCO/GGR - 15/12/2023	90	246,000.00	Adj. Matraco	Ejecutado 2023	Sin liquidar	Servicio ejecutado al 100%, según contrato, a la fecha está en solicitud para devolución de Fondo de Garantía que no se ejecuta por ausencia de Residente de Obra desde el mes de octubre 2024;
			TOTAL:	S/. 1,879,224.14				

Fernando Luis Aguilar Acuña



2.2.3 Control financiero

El detallado del devengado de la ejecución de la obra: SALDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA – PASCO" CON CUI N° 2029684 en el periodo 2024, se muestra en el siguiente cuadro:



CUI OBRA	DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	SEGUN REPORTE INEF. (AFIRIGABLE)			EJECUCION SEGUN SIAF. (L.R. 8825)			SALDOS PENDIENTES DE EJECUCION				PENDIENTE DE EJECUCION S/. (PIA/DEV.)	EJECUCION DEVENG. % (PIA./DEV. I)
		PIA.	PIM	CERTIFICACION	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	POR CERTIFICAR	POR COMPROBETER	POR DEVENGAR	POR GIRAR		
2029684	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO	0.00	778,690	751,581	751,531	724,996	722,271	0.00	53,694		0.00	53,694	6.90%
	META 0287 - OBRA				751,531	724,996	722,271						

III. Acciones efectuadas por su representada a fin de culminar la ejecución de obra:

- Mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 858-2024-G.R.P./GGR, de fecha 25 de octubre del 2024 se aprueba la Actualización del Presupuesto Analítico para la culminación de obra: "Saldo de obras complementarias de la Carretera Yanahuanca-Cerro de Pasco" con CUI 2029684, para dar continuidad con el proceso de levantamiento de observaciones, determinación de penalidades y realizar la recepción general de la obra y el ordenamiento de toda la documentación del proceso constructivo de la obra desde el año 2021 al 2024. Teniendo en cuenta la culminación de los contratos de la Residencia de obra y el equipo técnico que permita culminar la ejecución de la obra.
- Se solicitó la realización del proceso de selección al área correspondiente para la contratación del residente de obra y el equipo técnico.
- En el presente año 2025 la obra "Saldo de obras complementarias de la Carretera Yanahuanca-Cerro de Pasco" con CUI 2029684, Mediante Informe N° 0132-2025-GR.PASCO-GGR-GRPAT/SGPT de fecha 14 de enero 2025 nos remiten la Opinión Presupuestal, mencionado "Que, consecuentemente con el análisis realizado esta Sub Gerencia conforme a su competencia informa que no se cuenta con recursos disponibles para la atención al presente sin embargo si la necesidad es de suma urgencia, La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), que a través del Art. 11 de la Ley 32185 deberá proponer un proyecto habilitador enmarcado a los lineamientos de modificaciones en materia de inversiones, enmarcado a los lineamientos en modificación de inversiones".
- Estamos preparando un Plan para realizar la preliquidación de la ejecución de la obra, hasta la habilitación del presupuesto por el monto del saldo pendiente de S/. 53, 694.00 Soles y su posterior cierre del proyecto.

IV. CONCLUSIONES

- La ejecución de la obra está pendiente por la falta de contratar al Residente de Obra y al equipo técnico, para evaluar la contratación de cada servicio, determinando la aplicación de penalidades a los que corresponden.
- Formar una comisión de recepción de todos los trabajos realizados de obra: "Saldo de obras complementarias de la Carretera Yanahuanca-Cerro de Pasco" con CUI 2029684.
- Realizar la Preliquidación Técnica y Financiera, para su posterior liquidación por el área competente, con la cual el cierre del proyecto y su transferencia.

[Handwritten signature]



ING. FERNANDO LUIS AGUILAR ACUÑA
INGENIERO CIVIL - CIP N° 141338
INSPECTOR DE OBRA



Sin otro particular y agradeciendo su atención me suscribo de usted.

Atentamente





"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

CARGO

INFORME N° 025-2025-G.R. PASCO-GGR-GRI/SGOEM

SIGGEDO	
REG. DOC.	02867885
REG. EXP.	01516380

A : Arc. Fredy Roland, TOLENTINO HUARANGA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DE : Ing. Miguel Ángel TUFINO VILLANES
SUB GERENTE DE OBRAS Y EQUIPO MECÁNICO

Asunto : SOLICITO CONTINUIDAD DEL CICLO DE INVERSIÓN

Referencia : (1) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE DE LOS BARRIOS DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA-PROVINCIA DE PASCO, REGIÓN DE PASCO" con CUI 2313092

Fecha : Cerro de Pasco, 13 de enero del 2025



RECIBIDO

Por medio del presente me dirijo a Usted a fin de saludarlo cordialmente a nombre de la SUB GERENCIA DE OBRAS Y EQUIPO MECÁNICO, para indicar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

- ✓ Mediante INFORME TECNICO N° 91-2023-GRP/JAGT/RO(e), de fecha 03 de octubre del 2023, el residente Ing. Jaime Antonio GALINDO TUNQUE presenta el expediente técnico del salto al supervisor Ing. Robinson Raúl Quiquia Condor
- ✓ Mediante INFORME N° 260-2023-RRQC-PASCO, de fecha 05 de octubre del 2023, el supervisor Ing. Robinson Raúl Quiquia Condor presenta a Gerencia Regional de Infraestructura Ing. Manuel Barionuevo y a la Sub Gerencia de Obras Ing. Wilmer Carhuas Loyola el expediente para su evaluación.
- ✓ Mediante INFORME N° 1689-2023-G.R.PASCO-GGR-GRI/SGOEM, con fecha 05 de octubre del 2023, el Sub Gerente de Obras Ing. Wilmer Carhuas Loyola, deriva el expediente técnico de saldo a la Sub Gerencia de Estudios.
- ✓ Mediante INFORME N° 2852-2023-GRP-GGR-GRI/SGE, de fecha 30 de noviembre del 2023, Sub Gerencia de Estudios, devuelve el expediente técnico, porque no se cuenta con la resolución de CORTE DE OBRA, a la Gerencia Regional de Infraestructura Ing. Wilmer Carhuas Loyola.
- ✓ Mediante CARTA N° 543-2023-G.R.PASCO-GGR-GRI/SGOEM, con fecha 30 de noviembre del 2023, la Sub Gerencia de Obras y Equipos Mecánicos, Ing. Wilmer Carhuaz Loyola, remite la devolución de expediente técnico, al supervisor de la obra Ing. Robinson QUIQUIA CONDOR.
- ✓ Mediante INFORME N° 377-2023-RRQC-PASCO, con fecha 30 de noviembre del 2023, el supervisor de la obra Ing. Robinson QUIQUIA CONDOR, remite devolución del expediente técnico al residente de la obra Ing. Jaime A. Galindo Tunque.
- ✓ Mediante CARTA N° 025-2023-JAGT/RESIDENTE, con fecha 30 de noviembre del 2023, residente de la obra Ing. Jaime A. Galindo Tunque remite expediente técnico para su evaluación y aprobación, a la Sub Gerencia De Obras Y Equipos Mecánicos, Ing. Wilmer Carhuaz Loyola.
- ✓ Mediante INFORME N° 001-2023-RPE-PASCO, de fecha 15 de diciembre del 2023, el evaluador del expediente técnico Ing. Rafael Prado Estrada, levanta las observaciones del expediente técnico y presenta al jefe de proyectos Ing. Michael Pacheco Quinto.
- ✓ Mediante CARTA N° 01-2023-GRP/IMPQJP, de fecha 15 de diciembre del 2023, el jefe de proyectos Ing. Michael Pacheco Quinto, presenta las observaciones subsanadas del expediente técnico de saldo.
- ✓ Mediante INFORME N° 002-2023-GRP/ROPE/EP, con fecha 21 de diciembre del 2023, el evaluador del expediente técnico Ing. RAFAEL PRADO ESTRADA, solicita aprobación mediante acto resolutorio del expediente técnico, a la Sub Gerencia de Obras y Equipos Mecánicos, Ing. Wilmer Carhuaz Loyola.
- ✓ Mediante CARTA N° 01-2023-GRP/ROPE/EP, con fecha 21 de diciembre del 2023, el evaluador del proyecto Ing. Rafael Prado Estrada, APRUEBA, el expediente técnico de saldo, y lo deriva al Gobierno Regional de Pasco.
- ✓ Mediante INFORME N° 2293-2023-G.R.PASCO-GGR-GRI/SGOEM, con fecha 22 de diciembre del 2023, el Sub Gerente de Obras Ing. Wilmer Carhuas Loyola, remite EXPEDIENTE TECNICO de saldo para su aprobación mediante acto resolutorio, a la Sub Gerencia Regional de Infraestructura.
- ✓ Mediante INFORME N° 2264-2023-G.R.PASCO-GGR/GRI, de fecha 28 de diciembre del 2023, la Gerencia General De Infraestructura, remite el expediente técnico de saldo para SU APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO.
- ✓ Mediante INFORME N° 013-2023-G.R.P-GGR/DRAJ, con fecha de 05 de enero del 2024, Dr. Waldemar Santos Espinoza, Director de Asesoría Jurídica, devuelve documento, pidiendo que Sub Gerencia de Estudios, sean los que evalúen el expediente técnico.



13 ENE 2025

N° REG. _____

FECHA _____ HORA 8:57

FIRMA _____



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

- ✓ Mediante CARTA N° 009-2024-G.R.PASCO-GGR-GR/SGOEM, con fecha 17 de enero del 2024 El Sub Gerente de Obras Ing. Wilmer Carhuas Loyola, remite pliego de observaciones al evaluador Ing. Rafael Prado Estrada.
- ✓ Mediante CARTA N° 002-2023-GRP/ROPE/EP, de fecha 23 de enero del 2024, el evaluador del expediente técnico de saldo Ing. Rafael Prado Estrada, remite el levantamiento de observaciones del expediente técnico de saldo.
- ✓ Mediante INFORME N° 071-2024-G.R.PASCO-GGR-GR/SGOEM, con fecha 24 de enero del 2024, el Sub Gerente de Obras Ing. Wilmer Carhuas Loyola, deriva el expediente técnico de saldo a la Gerencia General de Infraestructura.
- ✓ Mediante INFORME N° 0286-2024-GRP-GGR-GR/SGE, de fecha 28 de enero del 2024, Sub Gerencia de Estudios, devuelve el expediente técnico, AUN CON OBSERVACIONES, con respecto a la Resolución de Aprobación de Corte de Obra a la Gerencia Regional de Infraestructura.
- ✓ Mediante CARTA N° 023-2024-GRP-GGR-GR/SGOEM, con fecha 14 de febrero del 2024, el Sub Gerente de Obras, Ing. Wilmer Carhuas Loyola, remite opinión respecto al expediente técnico de saldo de la obra con CUI 2313092, al evaluador del expediente Ing. Rafael Prado Estrada.
- ✓ Con CARTA N° 02-GRP/ROPE/EP, con fecha 15 de febrero del 2024, el evaluador del expediente técnico Ing. Rafael Prado Estrada, APRUEBA, el expediente de saldo, y presenta el levantamiento de observaciones a la Sub Gerencia de Obras, Ing. Wilmer Carhuas Loyola.
- ✓ Mediante INFORME N° 167-2023-JAGT/RO, con fecha 04 de diciembre del 2023, el residente Ing. Jaime Antonio GALINDO TUNQUE presenta el informe de estado situacional y de corte de obra según cumplimiento de metas, al supervisor de obra Ing. Robinson Quiquia Condor.
- ✓ Mediante CARTA N° 003-2024-JAGT/RESIDENTE, con fecha 21 de febrero del 2024, el residente Ing. Jaime Antonio Galindo Tunque solicita la aprobación del informe de corte, presentando el estado situacional y de corte de obra según cumplimiento de metas, al supervisor de la obra Ing. Robinson Quiquia Condor.
- ✓ Mediante INFORME N° 031-2024-RRQC-PASCO, con fecha 22 de febrero del 2024, el supervisor de la obra Ing. Robinson Quiquia Condor, solicita aprobación del Informe de corte, a la Sub Gerencia De Obras, Ing. Wilmer Carhuas Loyola.
- ✓ Mediante CARTA N° 031-2024-G.R.PASCO-GGR-GR/SGOEM, con fecha 22 de febrero del 2024, el Sub Gerente de Obras, Ing. Wilmer Carhuas Loyola, aprueba informe de estado situacional y de corte de obra, y lo presenta al supervisor de obra Ing. Robinson Quiquia Condor.
- ✓ Mediante INFORME N° 00558-2024-GRP-GGR-GR/SGE, con fecha 01 de marzo del 2024, el Sub Gerente de Estudio Ing. Richard Quispe Casillón, remite CONFORMIDAD técnica al expediente técnico de saldo de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura.
- ✓ Mediante INFORME N° 258-2024-G.R.PASCO-GGR-GR/SGOEM, con fecha 04 de marzo del 2024, la SUB GERENCIA DE OBRAS Ing. WILMER CARHUAS LOYOLA, solicita aprobación mediante resolutive correspondiente al expediente técnico de saldo de obra.
- ✓ Mediante INFORME N° 0376-2024-G.R.PASCO-GGR/GR, con fecha 04 de marzo del 2024, la Gerencia Regional de Infraestructura, Ing. Wilmer Carhuas Loyola, APRUEBA el expediente técnico de saldo de obra mediante acto resolutive, y lo deriva al Director Regional de Asesoría Jurídica, Abog. Waldemar I. Santos Espinoza.
- ✓ Mediante INFORME N° 272-2024-G.R.P-GGR/DRAJ, con fecha de 05 de marzo del 2024, donde el Abog. Waldemar Santos Espinoza, Director de Asesoría Jurídica, devuelve documento, pidiendo que se adjunte el FORMATO 8A, y el informe de consistencia a la Sub Gerencia de Infraestructura.
- ✓ Mediante INFORME N° 00665-2024-GRP-GGR-GR/SGE, con fecha 07 de marzo del 2024, Sub Gerencia de Estudio, levanta las observaciones presentadas por Asesoría Jurídica del Abog. Waldemar Santos Espinoza, sin poder lograr acceder al INFORME DE CONSISTENCIA, a Gerencia Regional de Infraestructura.
- ✓ Mediante INFORME N° 00771-2024-GRP-GGR-GR/SGE, con fecha 13 de marzo del 2024, Sub Gerencia de Estudio, solicita revisión, evaluación, aprobación y consistencia del proyecto, a la Gerencia Regional de Infraestructura.
- ✓ Mediante MEMORANDO N° 1754-2024-G.R.PASCO-GGR/GR, con fecha 22 de marzo del 2024, La Gerencia Regional De Infraestructura, solicita revisión, evaluación, aprobación y consistencia del proyecto, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Ing. Fausto Atencio Aliaga.
- ✓ Mediante INFORME N° 013-2024-GRP-GGR-GRPPAT/SGEPI/LJCM, con fecha 01 de abril del 2024, el Ing. Bach. Cabello Martínez Loel, da respuesta a la solicitud, de evaluación y aprobación, y registro de consistencia del proyecto, negando que se necesite el informe de consistencia a la Gerencia de Estudios y Pre Inversiones.
- ✓ Mediante INFORME N° 0369-2024-GRP-GGR-GRPPAT/SGEPI, con fecha 02 de abril del 2024, el Lic. Adm. Ángel Romero García, Sub Gerente de Estudio y Pre Inversiones, remite informe de consistencia, al Gerente de Planeamiento.
- ✓ Mediante INFORME N° 002-2024-G.R.PASCO-GGR/GR, con fecha 05 de abril del 2024, Gerencia Regional de Infraestructura, presenta información solicitado sobre la consistencia, a Asesoría Jurídica al Abog. Waldemar Santos Espinoza



*"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"*

- ✓ Mediante INFORME N° 058-2024-GRP-GRISGE/JJRM, con fecha 22 de mayo del 2024, el especialista de Sub Gerencia de Estudio Ing. Joel J. Rivera Meléndez, presenta observaciones del expediente técnico de saldo de obra al Sub Gerencia de Estudios.
- ✓ Mediante INFORME N° 001474-2024-GRP-GGR-GRISGE, con fecha 22 de mayo del 2024, Sub Gerencia De Estudio, Ing. Richard V. Quispe Castillón, presenta OBSERVACIONES del expediente técnico de saldo de obra, derivando a la Sub Gerencia de Obras Ing. Wilmer Carhuas Loyola para que pueda levantar las observaciones del expediente técnico.
- ✓ Mediante INFORME N° 1289-2024-G.R.PASCO-GGR-GRISGOEM, con fecha 22 de agosto del 2024, donde el Sub Gerente de Obras y Equipos Mecánicos, Ing. Miquen Ángel Tufino Villanes, solicita notificar al jefe de proyectos, Ing. Michael Pacheco Quinto, con respecto a las observaciones realizadas al expediente técnico de saldo.
- ✓ Mediante MEMO 006064-2024-GRP-GGR/GRI de fecha 23 de agosto del 2024, el Arq. Frady Roland Tolentino Huaranga Gerente de Infraestructura solicita NOTIFICAR - al jefe de proyectos -observaciones del expediente técnico de saldo de obra con CUI N° 2313092.
- ✓ Mediante CARTA N° 383-2024-GRP-GOB/SG, de fecha 27 de agosto del 2024, donde la Abog. Victoria Carhuza Huamán Secretaria General del Gobierno Regional de Pasco, remite documento para su atención.
- ✓ Mediante INFORME N° 001-2024-MPQ, de fecha 28 de agosto del 2024, donde el Ing. Michael Pacheco Quinto, Jefe de Proyectos, remite respecto a las observaciones del expediente técnico de saldo de obra con cui N° 2313092.
- ✓ Mediante CARTA N° 001-2024-MPQ, con fecha 28 de agosto del 2024, el Jefe de Proyectos, Ing. Michael Pacheco Quinto, hace la pronunciamiento con respecto a las observaciones del expediente técnico de saldo de obra con CUI N° 2313092.
- ✓ Mediante INFORME N° 1459 -2024-G.R. PASCO-GGR-GRISGOEM, de fecha 25 de septiembre del 2024, donde el Ing. Miguel Ángel Tufino Villanes Sub Gerente de Obras y Equipo Mecánico, solicitud de opinión legal.
- ✓ Mediante INFORME N° 1625 -2024-G.R. PASCO-GGR-GRISGOEM, de fecha 03 de octubre del 2024, donde el Ing. Miguel Ángel Tufino Villanes Sub Gerente de Obras y Equipo Mecánico, solicita levantamiento de observaciones de expediente técnico de saldo de obra por ser de su competencia.
- ✓ Mediante INFORME N° 133-2024-GRP-GRISGE/JJRM, de fecha 14 de octubre del 2024, donde el Ing. Joel J. Rivera Meléndez Especialista de la Sub Gerencia de Estudios remite respuesta y devolución de la solicitud de levantamiento de observaciones del expediente técnico saldo de obra – proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS CINCO BARRIOS DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO YANACANCHA, PROVINCIA Y REGION PASCO" con CUI N° 2313092.
- ✓ Mediante MEMORANDO N°7505-2024-G.R.PASCO-GGR/GRI, de fecha 14 de octubre de 2024, la Gerencia Regional de Infraestructura solicita se remita información urgente con respecto a la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS CINCO BARRIOS DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO YANACANCHA, PROVINCIA Y REGION PASCO" con CUI N° 2313092.
- ✓ Mediante INFORME N°1575-2024-G.R.PASCO-GGR-GRISGOEM, de fecha 15 de octubre de 2024, la Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico, remite información solicitada de la obra con CUI N°2313092.Mediante INFORME N° 0028988-2024-GRP-GGR-GRISGE, de fecha 15 de octubre del 2024, donde el Ing. Harry John Gora Chamorro Sub Gerente de Estudios remite respuesta y devolución de la solicitud de levantamiento de observaciones del expediente técnico saldo de obra.
- ✓ Mediante INFORME N° 1718 -2024-G.R. PASCO-GGR-GRISGOEM, de fecha 12 de noviembre del 2024, donde el Ing. Miguel Ángel Tufino Villanes Sub Gerente de Obras y Equipo Mecánico, reitera solicitud de opinión legal.
- ✓ Mediante INFORME LEGAL N°1633-2024-G.R.P.-GGR/DRAJ, de fecha 14 de noviembre del 2024, donde el Director Regional de Asesoría Jurídica, remite opinión referente al Informe Legal.
- ✓ Mediante CARTA N°351-2024-G.R. PASCO-GGR-GRISGOEM, de fecha 22 de noviembre de 2024, la Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico notifica cumplimiento de funciones al Ing. Michael PACHECO QUINTO.
- ✓ Mediante MEMORANDO N°8522-2024-G.R. PASCO-GGR/GRI, de fecha 23 de noviembre de 2024, el Gerente Regional de Infraestructura, solicita inicio de proceso.
- ✓ Mediante INFORME N° 1834-2024-G.R. PASCO-GGR-GRISGOEM, de fecha 28 de noviembre de 2024, la Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico, solicita tomar acciones ante incumplimiento de funciones Organismo ante el Supervisor de las Contrataciones del Estado- OSCE.
- ✓ Mediante INFORME N° 1837-2024-G.R. PASCO-GGR-GRISGOEM, de fecha 28 de noviembre de 2024, la Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico, solicita tomar acciones ante incumplimiento de funciones de acuerdo a sus competencias ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios.
- ✓ Mediante INFORME N° 1920-2024-G.R. PASCO-GGR-GRISGOEM, de fecha 03 de diciembre del 2024, donde el la Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico solicita determinar acciones para la continuidad del ciclo de inversión.





II. BASE LEGAL

- o Ley N°26411 Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto.
- o Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024
- o Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
- o Ley N°27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
- o Ley N°28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
- o Código Civil- Artículo 1784°. Locación de Servicios
- o CONSEJO REGIONAL - ORDENANZA REGIONAL N° 408-2017-G.R.P./CR
- o Resolución Ejecutiva Regional N° 0762-2017-G.R.P./GOB
- o Directiva N°001-2019-EF/83.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

III. ANÁLISIS

1.1. FICHA TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE PRIMIGENIO



FICHA TÉCNICA

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS CINCO BARRIOS DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO YANACANCHA, PROVINCIA Y REGION PASCO"

I.- DATOS DEL PROYECTO

CODIGO UNICO DE INVERSIONES	: N° 2313092	
UBICACIÓN	LUGAR	C. P. CAJAMARQUILLA
	DISTRITO	YANACANCHA
	PROVINCIA	PASCO
	AREA GEOGRAFICA	PASCO

APROBACION EXPEDIENTE TECNICO	: 15/12/2021
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	: 225 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	: 01 DE DICIEMBRE DEL 2021
INICIO DE EJECUCION DE OBRA	: 01 DE DICIEMBRE DEL 2021
TERMINO DE EJECUCION DE OBRA	: 13 DE JULIO DEL 2022
FECHA DE PARALIZACION N° 01	: 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA N°01	: 03 DE MAYO DEL 2022
FECHA DE PARALIZACION N° 02	: 07 DE JUNIO DEL 2022
FECHA DE REINICIO DE OBRA N°02	: 01 DE SETIEMBRE DEL 2022
FECHA DE PARALIZACION N° 03	: 02 DE SETIEMBRE DEL 2022
FECHA DE REINICIO DE OBRA N° 03	: 10 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE NUEVO TERMINO DE OBRA	: 24 DE MAYO DEL 2023
FECHA DE PARALIZACION N° 04	: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE REINICIO DE OBRA N° 04	: 01 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE NUEVO TERMINO DE OBRA	: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE PARALIZACION N° 05	: 20 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE REINICIO DE OBRA N° 05	: 21 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE NUEVO TERMINO DE OBRA	: 12 DE OCTUBRE DEL 2023
SOLICITUD AMPLIACION DE PLAZO N°01	: 150 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE NUEVO TERMINO DE OBRA	: 10 DE MARZO DEL 2024
FECHA DE PARALIZACION N° 06	: 30 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE REINICIO DE OBRA N° 06	: 22 DE ENERO DEL 2024
FECHA DE PARALIZACION N° 07	: 20 DE FEBRERO DEL 2024
FECHA DE REINICIO N° 07	: 18 DE MARZO DEL 2024
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA	: 17 DE ABRIL DEL 2024

1.2. DE LOS RESPONSABLES

a) DEL JEFE DEL PROYECTO

Con ORDEN DE SERVICIO N°4162, de fecha 22 de noviembre de 2023, se remite el requerimiento de servicio de Jefe de Proyecto de Expediente Técnico Reformulado para la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua y Desagüe de los Cinco Barrios de Cajamarquilla, Distrito de Yanacancha, Provincia y Región Pasco". Donde dentro de los Términos de Referencia que originaron la Orden de Servicio, en el ítem 4. Servicio a Realizar, señala





"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

(...) Levantar las observaciones dadas por el Área evaluadora del Gobierno Regional de Pasco en el plazo establecido (...)

Sin embargo, con Informe N°058-2024-GRP-GR/SGE/JJRM, de fecha 22 de mayo de 2024, el Especialista de la Sub Gerencia de Estudios, remite Observaciones del Expediente Técnico de Saldo de Obra. El mismo que fue tramitado por la Sub Gerencia de Estudios, mediante INFORME N°1474-2024-GRP-GGR-GR/SGE, con asunto de Remito Observaciones del Expediente Técnico de Saldo de Obra. Por lo que, con INFORME N°1289-2024-G.R.PASCO-GGR-GR/SGOEM, la Sub Gerencia de Obras solicita la notificación al Jefe de Proyectos-Observaciones del Expediente Técnico de Saldo de Obra otorgándole un plazo de 05 días hábiles. Es así que, fue notificado a través del correo electrónico proporcionado en las Declaraciones Juradas para su contratación, con fecha 27 de agosto de 2024.

Con fecha 28 de agosto de 2024, el Jefe de Proyecto remite la CARTA N°001-2024-MPO, respecto a Observaciones del Expediente Técnico de Saldo de Obra con CUI 2313092, concluyendo que:

(...) En mi calidad de Jefe de Proyecto y conforme a mi Orden de Servicio N°4162, se levantaron oportunamente las observaciones emitidas por el Ing. Rafael Prado Estrada, evaluador del proyecto y la Sub Gerencia de Estudios, obteniendo los informes de conformidad correspondientes, los cuales se detallaron en el análisis de este Informe (...)

Por lo que, con INFORME N°1459-2024-G.R. PASCO-GGR-GR/SGOEM, de fecha 25 de setiembre de 2024, la Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico en referencia a la Orden de Servicio N°4162, donde se contrata al Ing. Michael Pacheco Quinto como Servicio Especializado en Evaluación de Expedientes Técnicos por el monto que asciende a S/. 10,000.00 soles.

Es así que, con INFORME LEGAL N°1633-2024-G.R.P.-GGR/DRAJ, de fecha 14 de noviembre de 2024, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica:

- Que, estando a lo señalado por la Ley de Contrataciones con el Estado, y los informes que forman parte del presente expediente administrativo, este despacho RECOMIENDA que el Ing. Michael PACHECO QUINTO, como Jefe del Proyecto del Expediente Técnico Reformulado del Proyecto denominado: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS 5 BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA- PASCO- PASCO", *sún até en el plazo de la responsabilidad del contratista es decir de 1 año, por lo que el proyectista está en la obligación de atender las consultas que la Entidad le remite, por lo que el indicado ingeniero tiene que cumplir con levantar las observaciones que se le remite, de conformidad al artículo 193.10) literal a) de la Ley de Contrataciones del Estado.*
- Asimismo, este *despacho RECOMIENDA que, a la falta de atención del proyectista, el área encargada de la ejecución, en el marco del Documento Bases de Datos de las Contrataciones del Estado (BDD) para las sanciones correspondientes.*

Asimismo, con INFORME N°1289-2024-G.R.PASCO-GGR-GR/SGOEM, se solicitó el cumplimiento del Levantamiento de Observaciones al JEFE DE PROYECTO. Asimismo, con CARTA N°001-2024-G.R. PASCO-GGR-GR/SGOEM, de fecha 22 de noviembre de 2024, la Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico notifica cumplimiento de funciones al Ing. Michael PACHECO QUINTO.

b) DEL EQUIPO TÉCNICO

Con Informe N°1289-2024-G.R.PASCO-GGR-GR/SGOEM, de fecha 22 de agosto de 2024, se solicitó notificar a los implicados en la formulación del Expediente Técnico:

- o JEFE DE PROYECTO DEL EXPEDIENTE DE SALDO
 - Ing. Michael PACHECO QUINTO
 - DNI N° 43676979
 - ORDEN DE SERVICIO N° 00004162
 - mipacheco@gmail.com





"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

- cel: 948946565
- Domicilio: Av. LOS INCAS S/N – HUANCAYO – JUNIN

○ ESPECIALISTAS ENCARGADOS:

❖ UN PROFESIONAL EN MEMORIA DE CÁLCULO – SIMULACIONES HIDRAULICAS

- Ing. Máximo RAMOS CONDORI
- DOMICILIO: Jr AUQUIMARCA S/N MZ A LT 2 -JUNIN – HUANCAYO
- DNI N° 42877480
- ORDEN DE SERVICIO N° 0002522
- CEL: 939750822

❖ UN ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

- Ing. Oscar LAZARO QUISPE
- Jr. FRANCISCO TOLEDO N° 294-CHILCA-JUNIN-HUANCAYO
- DNI N° 44137463
- ORDEN DE SERVICIO N° 000263B
- CEL: 920001148

❖ ESTUDIOS HIDROLOGICOS

- Ing. Roly Jaime NUÑEZ NUÑEZ
- CALLE CASACHUNA 189 CULLPA BAJA – EL TAMBO - HUANCAYO
- DNI N° 80232059
- CONTRATO N° 405-2023-G.R.PASCO/GGR
- CEL: 984627041

❖ UN ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO Y DESASTRES

- Ing. Paul Leonardo SANCHEZ ROMERO
- Av. CIRCUNVALACION N° 529 – DISTRITO DE HUANCAYO
- DNI N° 44529837
- CONTRATO N° 402-2023-G.R.PASCO/GGR
- CEL: 999390324

❖ UN ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

- Ing. Jean Paul MINAYA EUFRACIO
- Jr. LIMA 576, 574 – CHAUPIMARCA - PASCO
- DNI N° 72202489
- ORDEN DE SERVICIO N° 0001795
- CEL: 948354923

❖ UN INGENIERO SANITARIO

- Ing. Flavio Xavier VASQUEZ MENENDEZ
- Jr. 28 DE JULIO 749 - CHILCA
- DNI N° 43024997
- ORDEN DE SERVICIO N° 0001794
- CEL: 999390328

❖ UN ESPECIALISTA EN METRADOS

- Ing. David ZELADA GARCIA
- BQ ROCCO S/N PBLO ROCCO - YANAHUANCA
- DNI N° 46169636
- ORDEN DE SERVICIO N° 0001846
- CEL: 917086406

❖ UN DIBUJANTE CAD

- Ing. Sandy Kely LUIS PAZ
- AA.HH TAHUANTINSUYO S/N – CHAUPIMARCA - PASCO
- DNI N° 71888621
- ORDEN DE SERVICIO N° 0001847
- CEL: 999390328

❖ ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO TOPOGRAFICO

- Ing. Hilder M. SANCHEZ FERRER
- BQ ROCCO S/N PBLO ROCCO - YANAHUANCA
- DNI N° 46169636
- ORDEN DE SERVICIO N° 0001846





"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

➤ CEL: 917966406

Sin embargo, es necesario precisar que de acuerdo a los Términos de Referencia de la Orden de Servicio N°4162, mediante el que se contrata el Jefe de Proyecto, en el ítem 4. Servicio a realizar, indica que dentro de sus funciones (...) Coordinar con el Equipo Técnico, en el proceso de la elaboración del estudio (...)

c) **DEL SUPERVISOR**

Mediante Orden de Servicio N° 0004174, de fecha 23 de noviembre del 2023, se celebra la Contratación del Ing. Rafael PRADO ESTRADA como servicio de Evaluación de Expediente Técnico reformulado de Saldo de Obra del Proyecto con CUI N° 2313092, por el monto que asciende a S/. 10,000.00 (diez mil con 00/100 soles), donde especifica lo siguiente:

➤ Según su **TERMINO DE REFERENCIA (TDR) – INCISO 4. SERVICIO A REALIZAR** - especifique:

- Responsable de la consolidación de los trabajos del equipo técnico hasta obtener como producto final expediente técnico.
- Coordinar con el equipo técnico, en el proceso de elaboración del estudio.
- Levantar las observaciones dadas por el área evaluadora gobierno regional de pasco en el plazo establecido. Presentar los productos en los plazos establecidos y seguir su trámite hasta lograr la aprobación.
- Consolidar el estudio del proyecto, conjuntamente con los integrantes del equipo técnico y presentar a la sub gerencia de obras previamente al área evaluadora con la finalidad de su aprobación.



Por otro lado, con fecha 28 de agosto de 2024, el Jefe de Proyecto remite la CARTA N°001-2024-MPO, respecto a las Observaciones del Expediente Técnico de Saldo de Obra con CUI 2313092, concluyendo que:

(...) Con CARTA N°02-GRP/ROPE/EP, el Ing. Rafael Prado Estrada, en su calidad de Evaluador del Expediente Técnico, remite el Expediente de Saldo, con un presupuesto de S/. 10,042,269.40 (Diez millones cuarenta y dos mil doscientos sesenta y nueve con 40/100 soles). Con el plazo de ejecución de 385 días calendario (12 meses), bajo una modalidad de ejecución por Administración Directa (AD). Esta conformidad técnica certifica que el expediente ha sido evaluado y cumple con todos los requisitos técnicos necesarios para su correcta ejecución (...)



Asimismo, mediante CARTA N°01-GRP/ROPE/EP, el Evaluador de Proyecto, Ing. Rafael Orlando PRADO ESTRADA, remite aprobación del Expediente Técnico del Saldo de Obra, señalando:

(...) Mediante el presente es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez remitirle la presentación del EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS 5 BARRIOS DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA-PROVINCIA DE PASCO - REGIÓN DE PASCO" con CUI 2313092, para su debida aprobación al pronunciamiento técnico (...)

Sin embargo, este fue observado mediante INFORME N°288-2023-GRP-GGR-GRI/SGE, de fecha 29 de enero de 2024, donde concluye:

(...) El presente Expediente Técnico del Saldo de Obra "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS 5 BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA- PASCO", CUI 2313092, y en cumplimiento de las facultades de la DIRECTIVA N°012-2018-GRP-GGR-GRI/SGE, de la Sub Gerencia de Obras por todo lo mencionado líneas arriba (...)

Es así que, mediante CARTA N°02-GRP/ROPE/EP, el Evaluador de Proyecto, Ing. Rafael Orlando PRADO ESTRADA, remite

Sin embargo, al identificarse observaciones por la Sub Gerencia de Estudios, en el INFORME N°058-2024-GRP-GRI/SGE/JRM; la Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico, a través del INFORME N° 1810-2024-G.R.PASCO-GGR-GRI/SOEM, se notificó al Evaluador del Expediente Técnico de Saldo de Obra, para su pronunciamiento sobre bajo qué Criterios dio la aprobación del Expediente Técnico de Saldo. Empero, a la actualidad no se tiene respuesta.



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Por lo que, de lo señalado, se pueda hacer énfasis que en el T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado, en el Artículo 32.7, refiere:

(...) La conformidad por la adecuada fulfillment del Especialista Técnico y Estudios... de acuerdo al alcance de los respectivos contratos, y la aprobación a la Entidad. De igual modo, la entrega completa de la información que es puesta a disposición de los postores, corresponde a la Entidad (...)

d) DEL EX SUB GERENTE DE ESTUDIOS

Con fecha 28 de agosto de 2024, el Jefe de Proyecto remite la CARTA N°001-2024-MPQ, respecto a las Observaciones del Expediente Técnico de Saldo de Obra con CUI 2313092, concluyendo que:

(...) Mediante INFORME N°558-2024-GRP-GGR-GRI/SGE, de fecha 01 de marzo del 2024, el Sub Gerente de Estudios... Con un presupuesto de S/. 10,042,280.40 Soles. Con el plazo de ejecución de 365 días calendario, bajo una modalidad de ejecución por Administración Directa... (...)



Por lo que, de lo señalado, se pueda hacer énfasis que en el T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado, en el Artículo 168.2, refiere:

(...) La conformidad requiere del informe... dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de... Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento (...)



e) DEL EX SUB GERENTE DE OBRAS Y EQUIPO MECÁNICO

Mediante INFORME N°258-2024-G.R. PASCO-GGR-GRI/SGOEM, de fecha 04 de marzo de 2024, el Ex Sub Gerente de Estudios, Ing. Wilmer Carhuaz Loyola, solicita aprobación mediante acto resolutorio correspondiente al Expediente Técnico de Saldo de Obra, concluyendo:

(...) Se verifica el cumplimiento de las observaciones correspondientes al Expediente Técnico de Saldo de Obra "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS 5 BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA- PASCO- PASCO" CUI N°2313092. (...)

Sin embargo, mediante Informe N°058-2024-GRP-GRI/SGE/JRM, de fecha 22 de mayo de 2024, el Especialista de la Sub Gerencia de Estudios, remite Observaciones del Expediente Técnico de Saldo de Obra. Es así que, de lo señalado, se pueda hacer énfasis que en el T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado, en el Artículo 168.2, refiere:

(...) La conformidad requiere del informe... dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de... Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento (...)

1.3. DE LAS ACCIONES POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y EQUIPO MECÁNICO

- a) Con Memorando N°7505-2024-G.R.PASCO-GGR/GRI, de fecha 14 de octubre de 2024, la Gerencia Regional de Infraestructura, solicita se remita información con respecto al Estado Situacional de la Obra de CUI 2313092, por lo que, con INFORME N°1575-2024-G.R.PASCO-GGR-GRI/SGOEM, la Sub Gerencia de Obras y Equipo



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Mecánico, remite la información solicitada. Es así que, con MEMORANDO N°8522-2024-G.R. PASCO-GGR/IGRI, de fecha la Gerencia Regional de Infraestructura, solicita Inicio de Procesos, indicando:

(...) Debido al Estado Situacional presentado por la Sub Gerencia de Obras, donde menciona que en la actualidad la obra se encuentra PARALIZADO, se solicita Inicio de Procesos Administrativos de ser el caso con los responsables habiendo realizado el análisis técnico y legal (...)

Es así que, con INFORME N° 1837-2024-G.R. PASCO-GGR-GRI/SGOEM, de fecha 28 de noviembre de 2024, la Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico,

hacia los responsables de la evaluación y aprobación del Expediente Técnico deficiente del Saldo de Obra,



b) Por otro lado, con INFORME LEGAL N°1633-2024-G.R.P.-GGR/DRAJ, de fecha 14 de noviembre de 2024, Dirección Regional de Asesoría Jurídica QPINA

(...) Que, estando a lo señalado por la Ley de Contrataciones con el Estado, y los informes que forman parte del presente expediente administrativo, este despacho RECOMIENDA que el Ing. Michael PACHECO QUINTO, como Jefe del Proyecto del Expediente Técnico Reformulado del Proyecto denominado: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS 5 BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA- PASCO- PASCO", aún esté en el plazo de la responsabilidad del contratista es decir de 1 año, por lo que el proyectista está en la obligación de atender las consultas que la Entidad le remite, por lo que el indicado ingeniero tiene que cumplir con levantar las observaciones que se le remite, de conformidad al artículo 193.10) literal a) de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, este despacho RECOMIENDA que, a la falta de absolución del proyectista, el área usuaria está en la obligación, que se deriva al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado- OSCE, para las sanciones correspondientes (...)

Es así que, INFORME N° 1834-2024-G.R. PASCO-GGR-GRI/SGOEM, de fecha 28 de noviembre de 2024, la Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico,

en virtud del Artículo 5.- Funciones Generales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado- OSCE, ante los responsables de la elaboración, evaluación y aprobación del Expediente Técnico deficiente de Saldo de Obra "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS 5 BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA- PASCO- PASCO" CUI N°2313092.



1.4. DE LA CONTINUIDAD DE LA INVERSIÓN

A la actualidad, el Proyecto de Inversión cuenta con:

- Avance físico acumulado	:	31.96%
- Monto	:	S/ 1,602,019.45 soles
- Saldo por valorizar	:	68.04%
- Monto de saldo	:	S/ 3,409,873.94 soles.

Es así que, se remitió los requerimientos para la contratación del Equipo Técnico para la Elaboración del Expediente Técnico Reformulado para la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua y Desagüe de los Cinco Barrios de Cajamarquilla, Distrito de Yanacancha, Provincia y Región Pasco", cuyo objeto es la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, a efectos de subsanar las deficiencias del expediente técnico primigenio, para la culminación de la Ejecución de la Obra en su totalidad.

No obstante, como resultado de las contrataciones, se ha obtenido un Expediente Técnico de Saldo que presenta deficiencias significativas, incumpliendo los parámetros técnicos y normativos requeridos para su ejecución. Donde



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

esta situación pone en riesgo la viabilidad del proyecto, afectando tanto el cumplimiento del objeto de inversión como la finalidad de cerrar las brechas de acceso a servicios básicos que motivaron la formulación del proyecto.

Por lo que, en mérito al INFORME LEGAL N°1633-2024-G.R.P.-GGR/DRAJ de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica y Memorando N°7505-2024-G.R.PASCO-GGR/IGRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, se ha solicitado a los Órganos Correctivos que puedan tomar las acciones necesarias de acuerdo a sus competencias.

Sin embargo, resulta imperativo que la Gerencia Regional de Infraestructura, en coordinación con las áreas técnicas competentes, adopte las acciones necesarias para garantizar la culminación de la obra en su totalidad.

Toda vez que, hasta la fecha, la inversión destinada al proyecto aún no ha logrado cumplir con los objetivos previstos en su formulación, lo que afecta directamente a los beneficiarios y perpetúa las condiciones de desigualdad en el acceso a servicios esenciales.



IV. CONCLUSIONES

- ✓ En consecuencia, por todo lo señalado, se puede informar al respecto del Expediente Técnico de Saldo de Obra "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS 5 BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA- PASCO- PASCO" CUI N°2313092, por lo que se solicita a la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, determinar las acciones necesarias de acuerdo al MOF y ROF del Gobierno Regional de Pasco, para la continuidad del ciclo de inversión en la Elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra y Ejecución del Proyecto, a efectos de cumplir con el objeto de la inversión.

Es cuanto se informa. Agradeciendo su amable atención, me despido de usted sin antes reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

[Firma manuscrita]

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 SUB GERENCIA DE OBRAS
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

... y de la CONSTITUCIÓN DE LOS REGIDOS
batallas de Junín y Ayacucho

INFORME N°005-2024-G.R. PASCO-GGR-GRI/SGOEM

A : Ing. Miguel Ángel TUFINO VILLANES
SUB GERENCIA DE OBRAS Y EQUIPO MECÁNICO
DE : Ing. David Eduardo DIAZ ARCE
ÁREA DE MECÁNICA



ASUNTO : INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE MAQUINARIAS

Fecha : Cerro de Pasco, 13 de Diciembre del 2024



Por medio del presente me dirijo a Usted a fin de saludarlo cordialmente a nombre del **ÁREA DE MAQUINARIAS** de la SUB GERENCIA DE OBRAS Y EQUIPO MECÁNICO así mismo para informar sobre el estado situacional de maquinarias en el área de villa de pasco.

1. Objetivo

1.1. Informar el estado actual del POOL DE MAQUINARIAS DEL GOBIERNO REGIONAL.

2. Detalles del Informe

2.1 EQUIPOS:

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE MAQUINA /PLACA
1	TRACTOR ORUGA	CATERPILLAR	D6TX	CAT D6T OCT03357
2	CARGADOR FRONTAL	CATERPILLAR	950 GC	M5K07448
3	CARGADOR FRONTAL	CATERPILLAR	950 GC	M5K07447
4	CARGADOR FRONTAL	CATERPILLAR	950 GC	M5K07449
5	MOTONIVELADORA ARTICULADA	CATERPILLAR	140K	65401347
6	MOTONIVELADORA ARTICULADA	CATERPILLAR	140K	65401348
7	MOTONIVELADORA ARTICULADA	CATERPILLAR	140K	65401349
8	MOTONIVELADORA ARTICULADA	CATERPILLAR	140K	65401350
9	MOTONIVELADORA ARTICULADA	CATERPILLAR	140K	CAT0140KKSZL21119
10	MOTONIVELADORA ARTICULADA	CATERPILLAR	140K	CAT0140KKSZL21120

batañas de Junín y Ayacucho

11	EXCAVADORA HIDRAULICA	JHON DEERE	350 GLC	1F350GXCPD 808820
12	EXCAVADORA HIDRAULICA	JHON DEERE	350 GLC	1F9350GXJPD 808824
13	EXCAVADORA HIDRAULICA	JHON DEERE	350 GLC	1F9350GXTPD 808821
14	EXCAVADORA HIDRAULICA	JHON DEERE	350 GLC	1F9350GXKPD 808823
15	EXCAVADORA HIDRAULICA	JHON DEERE	350 GLC	1F9350GXKPD 808826
16	RETROEXCAVADORA	JHON DEERE	320 P	1YN320PAKPDA00051
17	RETROEXCAVADORA	JHON DEERE	320 P	1YN320PACPDA00036
18	RETROEXCAVADORA	JHON DEERE	320 P	1YN320PACPDA000
19	TRACTO CAMION CAMA BAJA AK-832	MERCEDES BENZ	ACTROS 2651	W1F9HPAD3P0614856
20	TRACTO CAMION CAMA BAJA AK-834	MERCEDES BENZ	ACTROS 2651	W1F9HPAD8P0619258
21	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	AROCS 3345 K	EAK-131
22	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	AROCS 3345 K	EAK-112
23	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	AROCS 3345 K	EAK-115
24	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	AROCS 3345 K	EAK-108
25	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	AROCS 3345 K	EAK-094
26	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	AROCS 3345 K	EAK-104
27	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	AROCS 3345 K	EAK-321
28	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	AROCS 3345 K	EAK-130
29	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	AROCS 3345 K	EAK-175
30	CAMION CISTENA	HUIYDAY	PAVISE QV255 180	BM-100
31	CAMION CISTENA	HUIYDAY	PAVISE QV255 180	
32	CAMION CISTENA	HUIYDAY	PAVISE QV255 180	W1F9HPAD3P0614856
33	CAMION CISTENA	HUIYDAY	PAVISE QV255 180	W1F9HPAD3P0614856
34	CAMION CISTENA	HUIYDAY	PAVISE QV255 180	W1F9HPAD3P0614856
35	TRACTO TALLER MOVIL	VOLKSWAGEN	TALLER MOVIL	55565826KR000007



batallas de Junin y Ayacucho

ITEM 01: TRACTOR ORUGA

MARCA:	CATERPILLAR
MODELO:	D6TX
SERIE:	CAT D6T OCT03357
HORAS DE TRABAJO:	530 HORAS
UBICACIÓN:	VILLA DE PASCO (364529E-8806834N)
MANTENIMIENTO:	500 HORAS (URGENTE MANTENIMIENTO)

Tracto Oruga (CATERPILLAR): OPERATIVO

- *Colocar candado para tanque de combustible.
- *Cambio de cantoneras de cuchillas (URGENTE)
- *Cambio de filtro de admisión



ITEM 02: CARGADOR FRONTAL

MARCA:	CATERPILLAR
MODELO:	950 GC
SERIE:	M5K07448
HORAS DE TRABAJO:	375.4 HORAS
UBICACIÓN:	PAUCARTAMBO (411278E-8809374N)
MANTENIMIENTO:	500 HORAS

Cargador Frontal (CATERPILLAR): OPERATIVO

- *Colocar candado para tanque de combustible.
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

ITEM 03: CARGADOR FRONTAL

MARCA:	CATERPILLAR
MODELO:	950 GC
SERIE:	M5K07447
HORAS DE TRABAJO:	340.2 HORAS
UBICACION:	MARITIRIANI (511380E-8033668N)

Cargador Frontal (CATERPILLAR): OPERATIVO

ITEM 04: CARGADOR FRONTAL

MARCA: CATERPILLAR
 MODELO: 950 GC
 SERIE: M5K07450
 HORAS DE TRABAJO: 669.2 HORAS
 UBICACIÓN: CHACAYAN (342661E-8846172N)
 MANTENIMIENTO: 750 HORAS

Cargador Frontal (CATERPILLAR): OPERATIVO

*Colocar candado para tanque de combustible.

*Cambio de filtros de admisión

*Engrasar

**ITEM 05: RODILLO LISO AUTOPROPULSADO**

MARCA: CATERPILLAR
 MODELO: CS54B
 SERIE: G5401201
 HORAS DE TRABAJO: 298.5 HORAS
 UBICACIÓN: COMUNIDAD NATIVA AGUACHINI (508797E-8838097N)
 MANTENIMIENTO: 500 HORAS

Rodillo Liso Autopropulsado (CATERPILLAR): OPERATIVO

*Colocar candado para tanque de combustible.

*Cambio de filtros de admisión

*Engrasar

ITEM 06: RODILLO LISO AUTOPROPULSADO

MARCA: CATERPILLAR
 MODELO: CS54B
 SERIE: G5401201
 HORAS DE TRABAJO: 298.5 HORAS
 UBICACIÓN: TAYUANINSUYO (508797E-8838097N)
 MANTENIMIENTO: 500 HORAS

Rodillo Liso Autopropulsado (CATERPILLAR): OPERATIVO

*Engrasar

*Colocar candado para tanque de combustible.

batallas de Junin y Ayacucho

ITEM 07: RODILLO LISO AUTOPROPULSADO

MARCA: CATERPILLAR
 MODELO: CS54B
 SERIE: G5401192
 HORAS DE TRABAJO: 171.2 HORAS
 UBICACIÓN: CHACAYAN (342661E-8846172N)
 MANTENIMIENTO: 250 HORAS

Rodillo Liso Autopropulsado (CATERPILLAR); OPERATIVO

- *Colocar candado para tanque de combustible.
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar



ITEM 08: MOTONIVELADORA ARTICULADA

MARCA: CATERPILLAR
 MODELO: 140K
 SERIE: CAT0140KKSZL21119
 HORAS DE TRABAJO: 354.4 HORAS
 UBICACIÓN: CHACAYAN (342661E-8846172N)
 MANTENIMIENTO: 500 HORAS

Motoniveladora Articulado (CATERPILLAR); OPERATIVO

- *En año posterior izquierdo
- *Colocar candado para tanque de combustible.
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

ITEM 09: MOTONIVELADORA ARTICULADA

MARCA: CATERPILLAR
 MODELO: 140K
 SERIE: CAT0140KKSZL21119
 HORAS DE TRABAJO: 354.4 HORAS
 UBICACIÓN: CHACAYAN (342661E-8846172N)
 MANTENIMIENTO: 500 HORAS

- *Colocar candado para tanque de combustible.
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

batallas de Junín y Ayacucho

ITEM 10: MOTONIVELADORA ARTICULADA

MARCA: CATERPILLAR
 MODELO: 140K
 SERIE: CAT0140KKSZL21120
 HORAS DE TRABAJO: 325.2 HORAS
 UBICACIÓN: TAHUANTINSUYO (364282E-8818522N)
 MANTENIMIENTO: 500 HORAS

Motoniveladora Articulada (CATERPILLAR): OPERATIVO

*Primer mantenimiento a las 250 HORAS realizada, próximo mantenimiento a las 500 HORAS.

- *Cambiar filtro de admisión
- *Engrasar
- *Colocar candado para tanque de combustible.



ITEM 11: EXCAVADORA HIDRÁULICA

MARCA: JHON DEERE
 MODELO: 350GLC
 SERIE: 1F9350GXCPD808820
 HORAS DE TRABAJO: 594 HORAS
 UBICACIÓN: VILLA DE PASCO (364529E-8806834N)
 MANTENIMIENTO: 500 HORAS (URGENTE)

Excavadora Hidráulica (JHON DEERE): OPERATIVO

- *Colocar candado para tanque de combustible.
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

ITEM 12: EXCAVADORA HIDRÁULICA

MARCA: JHON DEERE
 MODELO: 350GLC
 SERIE: 1F9350GXCPD808820
 HORAS DE TRABAJO: 594 HORAS
 UBICACIÓN: VILLA DE PASCO (364529E-8806834N)
 MANTENIMIENTO: 500 HORAS (URGENTE)

Excavadora Hidráulica (JHON DEERE): OPERATIVO

- *Colocar candado para tanque de combustible.
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

batallas de Junín y Ayacucho"

ITEM 13: EXCAVADORA HIDRÁULICA

MARCA: JHON DEERE
 MODELO: 350GLC
 SERIE: 1F9350GXCPD808821
 HORAS DE TRABAJO: 507 HORAS
 UBICACIÓN: LA QUINUA/YANACANCHA (371453E-8825537N)
 MANTENIMIENTO: PROGRAMAR MANTENIMIENTO A 500H

Excavadora Hidráulica (JHON DEERE): OPERATIVO

- *Claxon malogrado
- *Raspones alrededor de la parte inferior del monitor de la Excavadora
- *Oxidación de cadena de rodamiento
- *Reductor de traslación (izquierda y derecha) con aceite muy deteriorado el cual tiene consecuencias negativas para partes de la maquina directamente involucradas.
- *Colocar candado para tanque de combustible.
- *Cambiar filtro de admisión (URGENTE)

**ITEM 14: EXCAVADORA HIDRÁULICA**

MARCA: JHON DEERE
 MODELO: 350GLC
 SERIE: 1F9350GXCPD808823
 HORAS DE TRABAJO: 65 HORAS
 UBICACIÓN: VILLA DE PASCO (364529E-8806834N)
 MANTENIMIENTO: 250 HORAS

Excavadora Hidráulica (JHON DEERE): OPERATIVO

- *Vidrio interior de cabina roto
- *Lado inferior delantero izquierdo de cabina hundida
- *Lado inferior trasero izquierdo de cabina raspada
- *Lado inferior trasero derecho de cabina raspado
- *Lado inferior delantero derecho de cabina hundido
- *Colocar candado para tanque de combustible.

ITEM 15: EXCAVADORA HIDRÁULICA

MARCA: JHON DEERE
 MODELO: 350GLC
 SERIE: 1F9350GXCPD808824
 HORAS DE TRABAJO: 401 HORAS
 UBICACIÓN: CENTRO POBLADO DE UNIPA (360005E-8817450N)
 MANTENIMIENTO: 500 HORAS (URGENTE)

Excavadora Hidráulica (JHON DEERE): OPERATIVO

- *Colocar candado para tanque de combustible.
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

batallas de Junin y Ayacucho"

ITEM 16: RETROEXCAVADORA

MARCA: JHON DEERE
 MODELO: 320P
 SERIE: 1YN320PAKPDA00051
 HORAS DE TRABAJO: 526 HORAS
 UBICACIÓN: COMUNIDAD NATIVA PASCUALA (341981E-8853193N)
 MANTENIMIENTO: 500 HORAS URGENTE

Retroexcavadora (JHON DEERE): OPERATIVO

- *Colocar candado para tanque de combustible.
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar



ITEM 17: RETROEXCAVADORA

MARCA: JHON DEERE
 MODELO: 320P
 SERIE: 1YN320PAKPDA00036
 HORAS DE TRABAJO: 52 HORAS
 UBICACIÓN: PAUCAR (341981E-8853193N)
 MANTENIMIENTO: 250 HORAS

Retroexcavadora (JHON DEERE): OPERATIVO

- *Sin daños
- *Colocar candado para tanque de combustible
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

ITEM 16: RETROEXCAVADORA

MARCA: JHON DEERE
 MODELO: 320P
 SERIE: 1YN320PAKPDA00051
 HORAS DE TRABAJO: 526 HORAS
 UBICACIÓN: COMUNIDAD NATIVA PASCUALA (341981E-8853193N)
 MANTENIMIENTO: 500 HORAS URGENTE

- *Sin daños
- *Colocar candado para tanque de combustible
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

ITEM 19: TRACTO CAMIÓN CAMA BAJA

MARCA: MERCEDES BENZ
 MODELO: ACTROS 2651
 SERIE/PLACA: W1F9HPAD3P0614856/EAK-832
 HORAS DE TRABAJO: 439 HORAS / RECORRIDO (11975 KM)
 UBICACIÓN: VILLA DE PASCO (364529E-8806834N)
 MANTENIMIENTO: 1000 HORAS

Tracto Camión Cama Baja (MERCEDES BENZ): OPERATIVO

- *Parachoques lado derecho e izquierdo roto
- *Aro derecho delantero achatado
- *Tanque de gasolina achatado
- *Colocar candado para tanque de combustible.
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

**ITEM 20: TRACTO CAMIÓN CAMA BAJA**

MARCA: MERCEDES BENZ
 MODELO: ACTROS 2651
 SERIE/PLACA: W1F9HPAD8P0619258/EAK-834
 HORAS DE TRABAJO: 173 HORAS / RECORRIDO (5119 KM)
 UBICACIÓN: VILLA DE PASCO (364529E-8806834N)
 MANTENIMIENTO: 1000 HORAS

Tracto Camión Cama Baja (MERCEDES BENZ): OPERATIVO

- *Parachoques lado derecho roto
- *Sensor de pulmón de aire dañado
- *No hay extensiones de lado izquierdo
- *Colocar candado para tanque de combustible
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

✓ ITEM 21: CAMIÓN VOLQUETE

MARCA: MERCEDES BENZ
 MODELO: ACTROS 2651
 SERIE/PLACA: W1F9HPAD8P0619258/EAK-834
 HORAS DE TRABAJO: 173 HORAS / RECORRIDO (5119 KM)
 UBICACIÓN: COMUNIDAD NATIVA ALTO CHIVIS (602397E-0862459N)
 MANTENIMIENTO: 1000 HORAS

Camión Volquete (MERCEDES BENZ): OPERATIVO

- *Colocar candado para tanque de combustible
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

✓ **ITEM 22: CAMIÓN VOLQUETE**

MARCA: MERCEDES BENZ
 MODELO: AROCS 3345K
 PLACA: EAK-123
 HORAS DE TRABAJO: 512 HORAS / RECORRIDO (6275 KM)
 UBICACIÓN: MELLIZOS (480153E-8814199N)
 MANTENIMIENTO: 1000 HORAS (URGENTE)



Camión Volquete (MERCEDES BENZ): OPERATIVO

- *Colocar candado para tanque de combustible.
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

ITEM 23: CAMIÓN VOLQUETE

MARCA: MERCEDES BENZ
 MODELO: AROCS 3345K
 PLACA: EAK-115
 HORAS DE TRABAJO: 265 HORAS / RECORRIDO (2876 KM)
 UBICACIÓN: VILLA DE PASCO (364529E-8806834N)
 MANTENIMIENTO: 1000 HORAS

Camión Volquete (MERCEDES BENZ): OPERATIVO

- *Abolladura en rueda delantera derecha
- *Fuera izquierda achatada
- *Cubierta de batería rota
- *Escaleras para subir al lado del chofer hundido
- *Colocar candado para tanque de combustible.
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

ITEM 24: CAMIÓN VOLQUETE

MARCA: MERCEDES BENZ
 MODELO: AROCS 3345K
 PLACA: EAK-115
 HORAS DE TRABAJO: 265 HORAS / RECORRIDO (2876 KM)
 UBICACIÓN: VILLA DE PASCO (364529E-8806834N)
 MANTENIMIENTO: 1000 HORAS

Camión Volquete (MERCEDES BENZ): OPERATIVO

- *Sin daños
- *Colocar candado para tanque de combustible.
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

ITEM 25: CAMIÓN VOLQUETE

MARCA:	MERCEDES BENZ
MODELO:	AROCS 3345K
PLACA:	EAK-094
HORAS DE TRABAJO:	37 HORAS / RECORRIDO (578 KM)
UBICACIÓN:	VILLA DE PASCO (364529E-8806834N)
MANTENIMIENTO:	1000 HORAS



Camión Volquete (MERCEDES BENZ): OPERATIVO

- *Sin daños
- *Colocar candado para tanque de combustible
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

ITEM 26: CAMIÓN VOLQUETE

MARCA:	MERCEDES BENZ
MODELO:	AROCS 3345K
PLACA:	EAK-104
HORAS DE TRABAJO:	186 HORAS / RECORRIDO (1803 KM)
UBICACIÓN:	VILLA DE PASCO (364529E-8806834N)
MANTENIMIENTO:	1000 HORAS

Camión Volquete (MERCEDES BENZ): OPERATIVO

- *Ajustar en el protector del catalizador parte inferior izquierda
- *Colocar candado para tanque de combustible.
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

ITEM 27: CAMIÓN VOLQUETE

MARCA:	MERCEDES BENZ
MODELO:	AROCS 3345K
PLACA:	EAK-104
HORAS DE TRABAJO:	186 HORAS / RECORRIDO (1803 KM)
UBICACIÓN:	VILLA DE PASCO (364529E-8806834N)
MANTENIMIENTO:	1000 HORAS

Camión Volquete (MERCEDES BENZ): OPERATIVO

- *Ajustar en el protector del catalizador parte inferior izquierda
- *Colocar candado para tanque de combustible
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

batallas de Junín y Ayacucho"

ITEM 28: CAMIÓN VOLQUETE

MARCA: MERCEDES BENZ
 MODELO: AROCS 3345K
 PLACA: EAK-130
 HORAS DE TRABAJO: 408 HORAS / RECORRIDO (3056 KM)
 UBICACIÓN: PAUCAR (341981E-8853193N)
 MANTENIMIENTO: 1000 HORAS



Camión Volquete (MERCEDES BENZ): OPERATIVO

- *Colocar candado para tanque de combustible
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

ITEM 29: CAMIÓN VOLQUETE

MARCA: MERCEDES BENZ
 MODELO: AROCS 3345K
 PLACA: EAK-173
 HORAS DE TRABAJO: 190 HORAS / RECORRIDO (2210 KM)
 UBICACIÓN: TUPAC AMARU (384017E-8818086N)
 MANTENIMIENTO: 1000 HORAS

Camión Volquete (MERCEDES BENZ): OPERATIVO

- *Cambio de llanta urgente
- *Colocar candado para tanque de combustible
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

ITEM 30: CAMIÓN CISTERNA

MARCA: HYUNDAI
 MODELO: PAVISE DV25E 180
 HORAS DE TRABAJO: 800 HORAS
 UBICACIÓN: PARAGUAY (381244E-8818086N)

Camión Cisterna (HYUNDAI): OPERATIVO

- *Colocar candado para tanque de combustible
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

batañas de Junín y Ayacucho"

ITEM 31: CAMIÓN CISTERNA

MARCA: HYUNDAI
 MODELO: PAVISE QV255 180
 SERIE: EAM-051
 HORAS DE TRABAJO: 296.37 HORAS
 UBICACIÓN: VILLA DE PASCO (364529E-8806834N)
 MANTENIMIENTO: 250 HORAS URGENTE



Camión Cisterna (HYUNDAI): OPERATIVO

- *Sin daños
- *Colocar candado para tanque de combustible
- *Cambio de filtros de admisión
- *Engrasar

ITEM 32: CAMIÓN CISTERNA

MARCA: HYUNDAI
 MODELO: PAVISE QV255 180
 SERIE: EAM-023
 HORAS DE TRABAJO: 325 HORAS
 UBICACIÓN: PARAGSHA (361349E-8819639N)
 MANTENIMIENTO: 250 HORAS URGENTE

Camión Cisterna (HYUNDAI): OPERATIVO

- *Filtro de aire deteriorado
- *Jebes de apoyo de tanque de cisterna en mal estado de ambos lados
- *Tanque de hidrolina al mínimo
- *Separador de agua Hyundai en mal estado
- *Manguera de hidrolina con fuga en motor hidráulico
- *Aceite de motor con bajo nivel de lo permitido (no hay viscosidad)
- *Bajo nivel de refrigerante
- *Bomba de succión de cisterna con falta de mantenimiento
- *Guarda fango del lado derecho en deterioro

ITEM 33: TRACTOR TRACTOR MÓVIL

MARCA: VOLKSWAGEN
 MODELO: T4LTD 1000
 SERIE: H2305626AKH000100
 HORAS DE TRABAJO: RECORRIDO (10 KM)
 UBICACIÓN: VILLA DE PASCO (364529E-8806834N)
 MANTENIMIENTO: 1000KM

Tracto Taller Móvil (VOLKSWAGEN): OPERATIVO

- *Sin daños
- *Colocar candado para tanque de combustible

ITEM 34: TRACTO TALLER MOVIL

MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	TALLER MOVIL
SERIE:	95365826XRR066905
HORAS DE TRABAJO:	RECORRIDO (10 KM)
UBICACIÓN:	VILLA DE PASCO (364529E-8806834N)
MANTENIMIENTO:	1000KM



Tracto Taller Móvil (VOLKSWAGEN): OPERATIVO

- *Sin daños
- *Colocar candado para tanque de combustible

ITEM 35: TRACTO TALLER MOVIL

MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	TALLER MOVIL
SERIE:	95365826XRR066982
HORAS DE TRABAJO:	RECORRIDO (102 KM)
UBICACIÓN:	VILLA DE PASCO (364529E-8806834N)
MANTENIMIENTO:	1000KM

Tracto Taller Móvil (VOLKSWAGEN): OPERATIVO

- *Sin daños
- *Colocar candado para tanque de combustible

3. Conclusión:

- 3.1. Falta de mantenimiento en equipos.
- 3.2. Daños superficiales en algunos equipos por motivo de trabajo
- 3.3. Ciertos equipos paralizados por más 1 mes
- 3.4. Entregas y recepciones de equipos de manera informal (GOBIERNO - DISTRITO) ,
- viceversa
- 3.6. Falta de dotación de combustible al momento de transporte (entrega y recepción)

4. Observaciones

- 4.1. No se respetan los tiempos de mantenimiento
- 4.2. No se respetan los tiempos de descanso
- 4.3. No se respetan los tiempos de mantenimiento
- 4.4. No se respetan horas de descanso de maquinarias (entre trabajo y descanso) bajando así la vida útil promedio de las mismas.

5. Recomendación:

- 5.1. Se recomienda con urgencia el mantenimiento de las maquinas que sobrepasaron sus HORAS y KILOMETRAJE preventivo.
- 5.2. Las coordinaciones de municipio y gobierno regional deben ser más formales, tanto para la entrega y la recepción de las maquinas.
- 5.3. Utilizar UN CHECK LIST UNIVERSAL para entrega y la recepción de las maquinas.
- 5.4. Contratar personal calificado para el tema de operarios.
- 5.5. La administración de la **SUB GERENCIA DE OBRAS Y EQUIPO MECÁNICO** debe estar atenta y cumplir con los requerimientos del personal mecánico y operarios para mitigar los problemas de tiempo, transporte y mantenimiento de las maquinas.
- 5.6. La administración de la **SUB GERENCIA DE OBRAS Y EQUIPO MECÁNICO** debe velar por el bienestar del personal mecánico y operario, así mismo y no menos importantes por el de las maquinarias, dando todas las facilidades para los respectivos mantenimientos.
- 5.7. Mayor comunicación equipo administrativo, personal y municipios. Con el fin de coordinar aspectos menores internos y solucionarios de manera rápida y efectiva.




Esperando su amable atención, me despido de usted sin antes reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

*Jorge A. Ventura G.
Téc. Mecánico*

Ing. Edwin Eduardo DIAZ ARCE

batallas de Junín y Ayacucho"

6. Anexos:

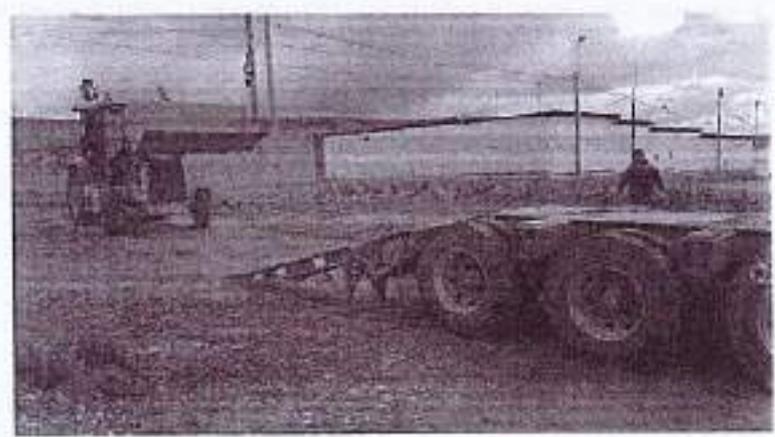

Retroexcavadora (1YN320PACPDA00036)



Tracto Camión Cama
Tracto Camión Cama

DECRETO/110350637 PD 8088237

batañas de Junín y Ayacucho™



Excavadora Hidráulica (JHON DEERE/1F9350GXTPD808823)



Camión Volquete (MERCEDES BENZ/EAK-321)
Camión Volquete (MERCEDES BENZ/EAK-104)
Camión Volquete (MERCEDES BENZ/EAK-115)



TRACTO TALLER MOVIL SERIE :95365826XRR065700
TRACTO TALLER MOVIL SERIE :95365826XRR066905
TRACTO TALLER MOVIL SERIE :95365826XRR066982

batallas de Junín y Ayacucho

CAMIÓN CISTERNA PLACA: EAM-051
VOLQUETES EN VILLA DE PASCO

NIVELADORA SERIE: CAT0140KKSZL21120
AVADORA SERIE: 1F9350GXKPD808823
RODILLO SERIE: G5401227



CAMIÓN VOLQUETE PLACA: EAK-173
MOTONIVELADORA SERIE: YN320PAL



Unidos
para Avanzar

SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD	FECHA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PASCO	2020-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PASCO	2020-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

061.05

II PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

061.05.01

II SENSIBILIZACION DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

ACTIVIDAD	FECHA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PASCO	2020-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PASCO	2020-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

061.06

II MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

061.06.01

II REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACION

ACTIVIDAD	FECHA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PASCO	2020-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PASCO	2020-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

061.09

II FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

061.09.03

II GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

ACTIVIDAD	FECHA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PASCO	2020-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PASCO	2020-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO"

1. **Ayuda Memoria:** Con respecto a la obra "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" con CUI 2435513 cuenta con un costo actualizado del proyecto: S/ 30'654,565.00, avance físico acumulado 51.6% y avance financiero 69.2%.
 - Cuenta con un PIM 2024 de s/ 11,796,152.00 y con una programación financiera actualizada 2024 por s/ 11,566,355.00 se tiene impedimento de gasto por los motivos que revisando el cronograma de gastos financieros de la ejecución de la obra el mismo que se ha realizado en función a una línea de tiempo respetando los plazos para el otorgamiento de buena pro e inicio de ejecución, se tiene programado gastar la suma de s/11,566,355.00 quedando un saldo de s/229,797.00; el mismo que se refleja en el formato N°12-B.
2. **Generalidades:**

Objetivo Estratégico	OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI.01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2435513	AÑO/PROYECTO: 2024-2435513
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO"	
FUNCIÓN: 22 – EDUCACION.	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 047 EDUCACION BASICA	
GRUPO FUNCIONAL: 0105 EDUCACION SECUNDARIA	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 15 FONDOS DE COMPENSACION REGIONAL – FONCOR	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 5 – RECURSOS DETERMINADOS.	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO"
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La Institución Educativa María Parado de Bellido, ubicado en el Distrito de Yanacancha Provincia y Departamento de Pasco, nivel inicial, primaria y secundaria, turno continuo mañana y tarde. Muestra una cifra del poco aprendizaje que reciben los estudiantes, debido a las condiciones inadecuadas de infraestructura educativa que reciben los estudiantes, limitados ambientes educativos y administrativos, que trae como consecuencia la baja calidad educativa. ➤ La Institución Educativa María Parado de Bellido del nivel secundaria cuenta con 05 infraestructura educativas de 2 niveles cada una, de turno continuo mañana y tarde, cuenta con 851 estudiantes y 82 docentes entre nombrados y contratados los mismos que necesitan una adecuada infraestructura educativa, acorde al avance científico y tecnológico. ➤ Constancia de fecha octubre 2018, el Director de la Dirección Regional de Pasco, hace constar que la institución Emblemática María Parado de Bellido, se encuentra en proceso de incorporación a las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa, según resolución N° 073-2017-MINEDU.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El proyecto se genera como resultado de la necesidad percibida por los alumnos, personal docente y padres de familia de la I.E. Maria Parado de Bellido, el Gobierno Regional de Pasco, acoge el pedido de los solicitantes y a través de la Oficina de la Subgerencia de Estudios Pre




4. Justificación	<p>Inversión se realizó el estudio a nivel de Perfil, dando cumplimiento a las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ (SNIP). Y se desarrolló a través de la Subgerencia de Estudios el estudio a nivel de Expediente Técnico. ➤ Por lo tanto se considera necesario un mejoramiento de dicha infraestructura, la cual será intervenida con Sustitución, Rehabilitación y mejoramiento de la manera integral, logrando así optimizar la actual infraestructura educativa.
5. Objetivos de Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Que la población tenga acceso a servicios que cumplan con estándares sectoriales. ➤ Adecuado servicio educativo en los niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Institución educativa María Parado de Bellido, ubicado en el Distrito de Yanacancha
6. Informe Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ En el mes de diciembre se vio un avance ejecutado parcial de 1.83% con un acumulado de 31.38% y con un programado de 29.76%, teniendo la obra adelantada por 1.62%. ➤ La valorización de adicional N°02 para el mes de diciembre se vio un avance ejecutado parcial de 27.80% con un acumulado de 30.54% y con un programado de 23.54%, teniendo la obra adelantada un 7.00%. ➤ Avance físico acumulado 51.6% y avance financiero 69.2%
7. Resultados Alcanzados	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sustitución de ambientes existente los cuales se han demolido para ser reemplazados debido al mal estado de la infraestructura como es el caso de los pabellones de aulas más antiguas, Así mismo, se considera obra nueva a la ampliación de nuevas aulas y ambientes complementarios a la infraestructura educativa.
8 Informe Presupuestal y Financiero	<ul style="list-style-type: none"> ➤ con una programación financiera actualizada para el 2024 por s/ 11,566,355.00, se tiene impedimento de gasto por los motivos que revisando el cronograma de gastos financieros de la ejecución de la obra Cuenta con un PIM 2024 de s/ 11,796,152.00 Costo actualizado del proyecto: s/ 30,654,565. ➤ Hasta el mes de diciembre se vio un gasto de S/ 479,971.56 con un avance acumulado de S/. 8,231,841.28 y con un saldo de S/ 18'000,897.12
9 ANEXO	



Cerro de Pasco, diciembre del 2024.


 Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y OBRAS PÚBLICAS

 C.P.C.C. Reyna LOPE BERNUY
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO


 Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

 Ing. Leonel BENITES DIEGO
 SU GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 31 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON DISEÑO ARQUITECTONICO BIOQUIMATICO EN LA URBANIZACION SAN JUAN, DISTRITO DE YANACANCHA – PASCO- PASCO".

- Ayuda Memoria:** La obra en mención actualmente se encuentra en ejecución normal con un avance de obra programado acumulado de 96.42 % y el avance real acumulado de 84.41 % (Según el Calendario de avance de obra actualizado).
En la obra se tiene un avance físico al 84.41% y un avance financiero 76.80%, la obra se encuentra en ejecución, así mismo se tiene un plazo de culminación para el 09 de mayo del 2025.
- Generalidades:**



Objetivo Estratégico	DELO1 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2301516	AÑO/PROYECTO: 2024-2301516
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 31 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON DISEÑO ARQUITECTONICO BIOQUIMATICO EN LA URBANIZACION SAN JUAN, DISTRITO DE YANACANCHA – PASCO- PASCO".	
FUNCIÓN: 22 – EDUCACION.	
DIVISION FUNCIONAL: 047 EDUCACION BASICA	
GRUPO FUNCIONAL: 0105 EDUCACION SECUNDARIA	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 15 FONDOS DE COMPENSACION REGIONAL – FONCOR	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 5 – RECURSOS DETERMINADOS.	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 31 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON DISEÑO ARQUITECTONICO BIOQUIMATICO EN LA URBANIZACION SAN JUAN, DISTRITO DE YANACANCHA – PASCO- PASCO".
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°0121-2021-G.R. PASCO/GGR, de fecha 28 de octubre del 2021, se APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO del proyecto, C.U.I N°340982, con una inversión total de 5/23'411,543.81 (Vientres Cuatrocientos Once Mil Quinientos Cuarenta y Tres con 81/100 soles), con un plazo de ejecución de 360 días calendario. ➤ Mediante CONTRATO N°025-2023-G.R.PASCO/GGR de fecha 19 de julio del 2023 se suscribe el contrato para el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NRO 31 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, CON DISEÑO ARQUITECTONICO BIOCLIMATICO EN LA URBANIZACION SAN JUAN, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO".
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El Gobierno Regional de Pasco (GOREPA), cumpliendo sus objetivos de brindar adecuadas condiciones de habitabilidad para la prestación de los servicios de equipamientos urbanos públicos en su jurisdicción y anexos, ha tenido a bien encargar por la modalidad de Adjudicación Simplificada la elaboración del presente expediente técnico, acorde a los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ley General de Educación Ley N°28044, del Reglamento de Educación Básica Regular aprobado por el Decreto Supremo N°013-2004-ED. ➤ Satisface la necesidad de la población local usuaria del servicio de educación inicial, Primaria y secundaria de la Institución Educativa N°31 Nuestra Señora del Carmen, Yanacancha – Pasco.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 C. P.C.C. **RODOLFO LOPEZ BERNUY**
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Ing. Leonel BENITES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS

5. Objetivos de Actividad	➤ El objetivo de esta actividad es priorizar la ejecución de los proyectos sin retraso y costos alguno, lograr con la meta propuesta, velar los intereses de la entidad.
6. Informe Técnico	➤ Actualmente la obra se encuentra en ejecución normal con un avance de obra programado acumulado de 96.42 % y el avance real acumulado de 84.41 % (Según el Calendario de avance de obra actualizado-Suspensión de Plazo N°(13).
7. Resultados Alcanzados	➤ En la obra se tiene un avance física al 84.41% y un avance financiero 76.80%, la obra se encuentra en ejecución, así mismo se tiene un plazo de culminación para el 09 de mayo del 2025
8. Informe Presupuestal y Financiero	➤ La obra asciende al monto de S/ 3'618,380.48, entrega parcial del nivel primario, media tensión del nivel secundaria, acondicionamiento del ingreso principal del nivel secundaria.
9. ANEXOS:	➤ Fotografías actuales correspondientes al mes de febrero del 2025 



Cerro de Pasco, diciembre del 2024


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

 C.P.C.C. Reyna LOPE BETINLY
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

 Ing. Leonel BENTES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N° 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA-PASCO".

1. **Ayuda Memoria:** La obra en mención estaba en ejecución, actualmente paralizado, según Carta N° 214-2024-CONSORCIO SAN ANTONIO/R.L. del 04 de noviembre de 2024. Dicho proyecto cuenta con varios módulos: Modulo I Aulas pedagógicas de nivel inicial, Modulo II Comedor del Nivel Inicial, Servicio Higiénico, instalaciones Eléctricas en todos los ambientes incluidos SS. HH; Modulo IV Aula de Psicología del Nivel Inicial, MODULO V: Comedor del Nivel Inicial, Modulo VI: SS. HH. Del Nivel Primaria, Modulo VII; Aulas Pedagógicas del Nivel Secundaria, Modulo VIII; Aulas Pedagógicas del Nivel Secundaria, Modulo IX; Laboratorios y Centro de Recursos Educativos y Modulo X; Talleres Ocupacionales y Servicios Generales. Modulo XI; Comedor del Nivel Secundario, Modulo XII; Oficinas Nivel secundario.
2. **Generalidades:**




Objetivo Estratégico OEI	OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION.
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2234723 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N° 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA-PASCO".	
AÑO/PROYECTO: 2024-2234723	
FUNCIÓN: 22 – EDUCACION.	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 047 EDUCACION BASICA	
GRUPO FUNCIONAL: 0105 EDUCACION SECUNDARIA	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 15 FONDOS DE COMPENSACION REGIONAL – FONCOR	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 5 – RECURSOS DETERMINADOS.	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N° 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA-PASCO".
3. Antecedentes	Código SNIP: 253160, Órgano que otorga la viabilidad: Gobierno Regional de Pasco; Ubicación: Departamento: Pasco, Provincia: Oxapampa, Distrito: Oxapampa, Localidad: Miraflores. Esto hace que continuamente ocurran accidentes con los menores por caídas. Los caminos de herradura conectan a la I.E. con la parte alta, de las comunidades campesinas cercanas como: Llamaquizu, Chacos, Cantarizu, Rio Tigre, Tambo Maria, etc. Siendo el más cercano Llamaquizu en promedio a una hora de caminata y el más alejado Tambo María a 5 horas de caminata.
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El problema central identificado es la insuficiencia e inadecuación de las condiciones físicas para el desarrollo de actividades educativas en la I.E. N° 53 San Francisco de Asís. ➤ Asimismo, benefician a 2,921 personas, entre niños y niñas de 6 a 17 años.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Garantizar que la población acceda a servicios educativos que cumplan estándares sectoriales ➤ Mejorar la prestación del servicio educativo en la I.E. N° 53

Unidad Gobierno Regional de Pasco

Ing. Dayra LOPE GERRERO
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidad GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Leonel BENITES DIEGO
SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS
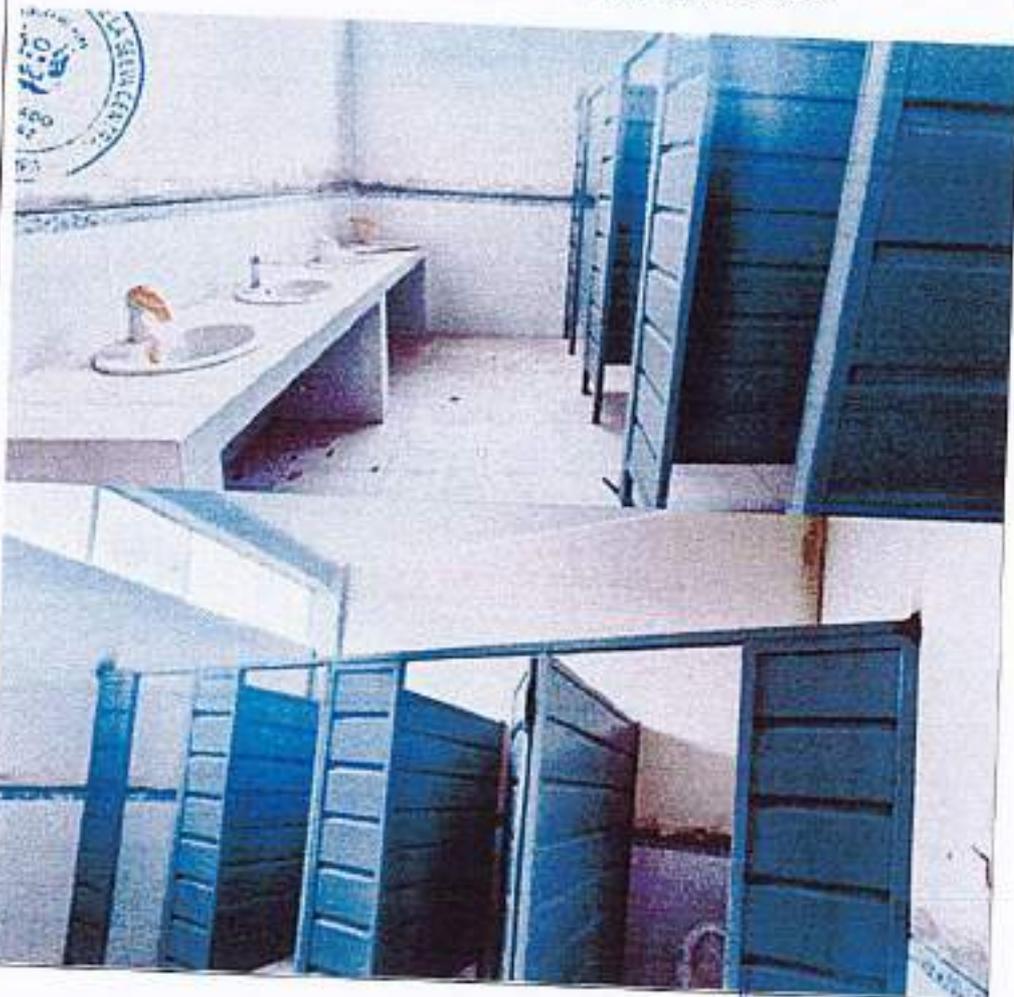
<p>5. Objetivo de la Actividad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elevar la calidad de vida de docentes, estudiantes y la comunidad en general ➤ Mejorar la imagen del Distrito de Oxapampa con infraestructura educativa adecuada ➤ Aumentar la población estudiantil
<p>6. Informe Técnico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El proyecto de Mejoramiento del Servicio Educativo se encuentra paralizado según la Carta N° 214-2024-CONSORCIO SAN ANTONIO/R.G. del 04 de noviembre de 2024. ➤ La estructura del proyecto es Nivel Inicial, Secundaria, según modulo I al XIII, del mismo existe módulos adicionales como XI4 Caseta de Vigilancia, módulo XV. Piscina.
<p>7. Resultados Alcanzados</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contrato principal: 63.23% de un 75.23%, Adicional de Obra N° 01: 94.22% de un 100%, Adicional de Obra N° 02: 96.46% de un 100%, Adicional de Obra N° 03: 35.55% de un 100%.
<p>8. Informe Presupuestal y Financiero</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El presupuesto analítico de gestión de dicho proyecto es por el monto 92,108.32, según Resolución General Gerencial Regional N° 717-2023. ➤ Este proyecto en lo presupuesto es un monto de S/ 12'329,419.25 Soles, en lo financiero es 75.23%, también hay adicionales de Modulo I, II, y III el monto es s/. 5'566,556.00 Soles. Con avance financiero al 18.21%
<p>9. ANEXO</p>	<p>Se adjunta fotografía de la Institución Educativa SAN FRANCISCO DE ASIS.</p> 




GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS
[Signature]
 G. PASC. Reyna LOPE BERNALY
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Cerro de Pasco, diciembre del 2024


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
[Signature]
 Ing. Leonel BENITES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA – DANIEL ALCIDES CARRION- PASCO".

1. Ayuda Memoria:

- Mediante CONTRATO N° 070-2023-G.R. PASCO/GGR, de fecha 20 de Noviembre del 2023, se firma el Contrato con el "CONSORCIO UNION" con RUC 20611825189, consorcio conformado por Sr. Walter YABAR BECERRA, con RUC: 10238484303 y el Sr. Eloy Justo ESPINOZA SALGADO con RUC: 10225104366 y representados por el Sr. Miguel Ángel PALMA MOSCOSO identificado con DNI N° 44376692 y el Gobierno Regional de Pasco con RUC: 20489252270 representado por el Ing. Osar Segundo CERVERA BERAUN identificado con DNI N° 04050172 en su calidad de Gerente General Regional para la Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRIÓN, CUI N° CUI N° 2282203



2. Generalidades:

Objetivo Estratégico OEI	OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION.
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2282203	AÑO/PROYECTO: 2024- 2282203
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA – DANIEL ALCIDES CARRION- PASCO".	
FUNCIÓN: 22 –EDUCACION.	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 047 EDUCACION BASICA	
GRUPO FUNCIONAL: 0104 EDUCACION PRIMARIA	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 15 FONDOS DE COMPENSACION REGIONAL – FONCOR	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 5 – RECURSOS DETERMINADOS.	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA – DANIEL ALCIDES CARRION- PASCO".
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N.º 0120-2020- G.R. PASCO. /GGR, de fecha 12 de marzo 2020, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO", con CUI: 2282203, con presupuesto total de S/. 12,338,143.60 (Doce millones trescientos treinta y ocho mil cientos cuarenta y tres con 60/100 soles), con un plazo de ejecución de Doscientos setenta (270) días calendario. ➤ Mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°638-2023-G.R.P/GGR, de fecha 24 de octubre del 2023, se designa como inspector de obra al Ing. Edwin A. ALMERCO PALACIOS, de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO".

GOBIERNO REGIONAL PASCO

 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PASCO

 Ing. Leonel BÉNITES DIEGO

 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inadecuadas condiciones para la prestación del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 34152 Marceliano Ríos Bianchi del Distrito de Vilcabamba - Daniel A. Carrión - Pasco. ➤ El Gobierno Regional de Pasco (GOREPA), cumpliendo sus objetivos de brindar adecuadas condiciones de habitabilidad para la prestación de los servicios de equipamientos urbanos públicos en su jurisdicción y anexos, ha tenido a bien encargar por la modalidad de Adjudicación Simplificada la elaboración del presente expediente técnico.
5. Objetivos de Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adecuadas condiciones para la prestación del servicio Educativo en la institución Educativa N° 34152 Marceliano Ríos Bianchi del Distrito de Vilcabamba - Daniel A. Carrión - Pasco.
6. Informe Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Actualmente la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO". Se encuentra en ejecución normal con un avance de obra ejecutado acumulado del 88.97% al 31 de enero del 2025.
7. Resultados Alcanzados	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Culminar al 100% la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO, el mismo que tiene un plazo de culminación para el 1 de marzo del 2025.
8. Informe Presupuestal y Financiero	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Actualmente la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO, con CUI N° 2282203. Se encuentra en ejecución normal con un avance financiero de 86.4%, el mismo que puede ser verificado en el formato 12-B.
9. ANEXO	<p>Fotografías actuales correspondientes al mes de febrero del 2025</p> <div style="text-align: center;">  <p>IMAGEN N°08. SE REALIZARON TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE GRASS SENTETICO EN EL MÓDULO DE CAMPO DEPORTIVO. FECHA :03/12/2024</p>  </div>

Cerro de Pasco, diciembre del 2024


Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
UNIDOS PASCO - PASCO AL SERVIDOR

 C.P.C.C. REYNA LOPE BERNUY
 MINISTRE CONTABLE ADMINISTRATIVO


Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

 Ing. Leon BENITES DIEGO
 SU GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTOS DEL SERVICIOS DE EDUCATIVOS PRIMARIA DE LA I.E. N° 34378 DEL CENTRO POBLADO, CENTRO ESPERANZA, DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA-DEPARTAMENTO DE PASCO"

1. Ayuda Memoria: En el segundo semestre no se ejecutó dicho proyecto.
2. Generalidades:



Objetivo Estratégico OEI	OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION.
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2319255	AÑO/PROYECTO: 2024- 2319255
"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIA DE LA I.E. N° 34378 DEL CENTRO POBLADO CENTRO ESPERANZA, DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA-DEPARTAMENTO PASCO"	
FUNCIÓN: 22 –EDUCACION.	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 047 EDUCACION BASICA	
GRUPO FUNCIONAL: 0104 EDUCACION PRIMARIA	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 15 FONDOS DE COMPENSACION REGIONAL – FONCOR	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 5 – RECURSOS DETERMINADOS.	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIA DE LA I.E. N° 34378 DEL CENTRO POBLADO CENTRO ESPERANZA, DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA-DEPARTAMENTO PASCO"
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La ejecución de la Obra está a cargo del Consorcio Esperanza mediante el Contrato N° 0087-2022 G.R. PASCO/GGR, por el monto 1'665,690.00 soles. ➤ La supervisión está a cargo del Consorcio Omega, según contrato N° 399-2023 G.R. PASCO/GGR, por el monto de 58,817.00 soles.
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se cuenta con los recursos financieros para la construcción e implementación de la infraestructura. - La DREP y UGEL considera dentro de su programa de operación y de mantenimiento de la I.E. Primario N°- 34378 del C.P, Centro Esperanza. - Existe interés de empresas contratistas y proveedores para la atención a los servicios
5. Objetivos de Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Construcción de ambientes pedagógicos, administrativos y ambientes complementarios y ss.hh. Construcción de cerco perimétrico y losa deportiva. Dotación de equipos e implementación de mobiliarios escolares y materiales didácticos
6. Informe Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Plan de trabajo, cronograma, informes.
7. Resultados Alcanzados	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La ejecución del proyecto es para 264 beneficiarios (personas).
8. Informe Presupuestal y Financiero	<ul style="list-style-type: none"> ➤ En el presente semestre 2024, no se ejecutó dicha obra.
9. ANEXO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ No tiene.

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO"

1. Ayuda Memoria:

- La obra se ejecutó a suma alzada, por el monto de S/ 13'136,475.72, por un plazo de ejecución 240 días calendario. Inicio de proyecto es el 27 de diciembre d del 2024.
- Contratista: "Consortio Salud", servicio de supervisión el Contratista es: Consortio Salud

2. Generalidades:



Objetivo Estratégico OEI	OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 02.05 ATENCION INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACION DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2194033	AÑO/PROYECTO: 2024- 2194033
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO"	
FUNCIÓN: 20 – SALUD	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 044 SALUD INDIVIDUAL	
GRUPO FUNCIONAL: 0096 ATENCION MEDICA BASICA	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS.	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO"
3. Antecedente	<ul style="list-style-type: none"> ➤ De fecha 17 de agosto del 2023 se firma el N° 078-2023-G.R. PASCO/GGR. Para la ejecución de la obra "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO". ➤ De fecha 12 de enero del 2024 se firma el N°008-2024-G.R. PASCO/GGR. Para la supervisión de la obra "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO".
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El proyecto se a dar atención de salud que plantea este estudio dotando con una buena infraestructura optima y cumpliendo los estándares mínimos y equipamiento para los servicios de atender de salud maternal infantil y así contribuyendo a mejorar la calidad del servicio a los pobladores de la Localidad Chinche Tingo.
5. Objetivos de Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adecuada prestación de servicios en el PUESTO DE SALUD CHINCHE TINGO, del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión, Departamento Pasco.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto supremo N°011-2006- VIVIENDA y N°006-2011-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 PRESUPUESTAL Y FINANCIERAS

C.F.C.C. Reyna LOPE BELEN JY
 AGENTE CONTRATAL ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Leonel BENTES INEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS

6. Informe Técnico	➤ Norma A. 010 "Condiciones Generales de Diseño, versión modificada y aprobada mediante D.S. N°010-2009-Vivienda, publica el 09 de mayo del 2009 y modificatorias como el D.S. N°005-2014-Vivienda del 09 de mayo del 2014.
7. Resultados Alcanzados	➤ Se han ejecutado toda la obra: provisionales, estructura, arquitectura, instalaciones eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Capacitación sensibilización, equipamiento y Plan de manejo ambiental.
8. Informe Presupuestal y Financiero	➤ El costo total de la obra actualizado de la obra es: S/ 13'951,335.00 Soles devengado acumulado fue S/ 332,324.00 Soles, ultimo devengado fue en el mes de agosto del 2024.
9. ANEXO	<p>➤ Fotografía.</p> <div data-bbox="593 551 1372 1191" data-label="Image"> </div> <p>FOTO 07: Retroexcavadora en Obra. - cumpliendo la partida de MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, puesta en el lugar de la Obra.</p>



Cerro de Pasco, diciembre del 2024


Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 C. P. CC. Reyna LOPE BERNUY
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO


Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 Ing. Leonel BERTES BIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO PUESTO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION-PASCO"

1. **Ayuda Memoria:** La obra en mención se encuentra en ejecución, realizando electrificación e instalación de cableado y otros.
2. **Generalidades:**



Objetivo Estratégico OEI	OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION. REGION PASCO. LA POBLACION.
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 02.05 ATENCION INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACION DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2198318	AÑO/PROYECTO: 2024- 2198318
"MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO PUESTO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION-PASCO"	
FUNCIÓN: 20 – SALUD	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 044 SALUD INDIVIDUAL	
GRUPO FUNCIONAL: 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD.	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS.	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO PUESTO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION-PASCO"
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Como antecedentes dentro de Salud podemos mencionar que se registra en el sistema de inversión es con fecha 27/7/2013, cuya viabilidad fue otorgada el 18/09/2014, con un costo aprobado del monto S/ 54'949,780.00 Soles. ➤ El sistema de Contratación a "Suma Alzada" bajo la modalidad "Llave en Mano". ➤ Contratista "Consortio Pasco Vida" mediante Contrato N° 0002-2019-G.r. PASCO-GGR.
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esta actividad se hace con la finalidad de mejorar el acceso y la capacidad resolutive de los servicios de salud.
5. Objetivos de Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El objetivo general de la obra es facilitar el avance en el monitoreo y el análisis de la situación y tendencias en el ámbito de salud.
6. Informe Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se realiza la vista a obra para la verificación de la valorización del mes de julio a diciembre del 2024.
7. Resultados Alcanzados	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El resultado verificado al mes de julio a diciembre se tiene la habilitación de tomacorrientes para su instalación respectiva, de igual forma el cableado de alimentadores de tableros eléctricos en los diferentes niveles de la edificación, por otro lado, las pruebas de aislamiento de los circuitos de tableros eléctricos con sus respectivos circuitos. ➤ En el segundo, cuarto y quinto nivel se hicieron instalación de cableado eléctrico para tomacorriente y el alumbrado y salida de fuerza.
8. Informe Presupuestal y Financiero	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El proyecto estaba valorizado por un monto de S/7'656,754.00, obra en ejecución al 69.25% acumulado a diciembre del 2024

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
 C. P.C.C. *Reyna LOPE BERNUY*
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 Ing. *Leonel BENITES DIEGO*
 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

9. ANEXO

➤ Se adjunta panel fotografía.



Cerro de Pasco, diciembre del 2024

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
[Signature]
C.P.C.C. Reyna LOPE BERNUY
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
[Signature]
Ing. Leonel BENTES DIEGO
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INTEGRADO DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO – PASCO"

1. **Ayuda Memoria:** La presente obra en la ejecución del 2do Semestre fue devengado el monto de S/ 1'763,959.00 Soles, así mismo debo informarle que la obra perdura desde el año 2011, a la fecha siempre hay problemas, el año pasado se ejecutó por administración Directa, estaba a cargo de la Subgerencia de Obras.
2. **Generalidades:**



Objetivo Estratégico OEI	OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACION.
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2084815	AÑO/PROYECTO: 2024- 2084815
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INTEGRADO DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO – PASCO"	
FUNCIÓN: 18 – SANEAMIENTO	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO	
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTBLE	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 18 CANO Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INTEGRADO DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO – PASCO"
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Los servicios de saneamiento básico de la ciudad de Cerro de Pasco son administrados por EMAPA PASCO, desde el año 1994, cuya área de servicios comprende los distritos de Chaupimarca, Yanacancha, Simón Bolívar, Huariaca y Vicco. ➤ El intento de solucionar el problema de abastecimiento de agua y alcantarillado data de varios años atrás, desarrollándose proyectos antes y después de la aprobación del estudio de factibilidad se han desarrollado varios proyectos.
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Motivo por las inexistencias de soluciones en el abastecimiento, tratamientos de agua potable, así como la recolección de agua servidas y su respectivo tratamiento (PTAR), úrgela realización de dichos proyectos de este sector.
5. Objetivos de Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El proyecto tiene como objeto de mejorar la calidad de vida de la población, mediante el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado que contribuirá al cierre de brechas y mejora de bienestar de la población.
6. Informe Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se realiza la vista a obra para la verificación que sea lo posible agua potable, para consumo humano, en el II Semestre el avance físico es de 28% julio a diciembre del 2024.
7. Resultados Alcanzados	<ul style="list-style-type: none"> ➤ En muchas regiones de mundo, la disponibilidad de agua es cada vez menos previsible. En algunas regiones las sequias agravan la escasez de agua y repercuten negativamente en la salud y la productividad en las personas, lo que a su vez amenaza el desarrollo sostenible y la biodiversidad en todo el mundo.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 SUBGERENCIA DE OBRAS
 C.P.D. Weyno LOPE BERNUY
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 Ing. Leonel BENITES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

8. Informe Presupuestal y Financiero	➤ Con respecto a la ejecución financiera fue devengado por el monto de 3'072,367.00 Soles, la fuente de financiamiento es Recursos Ordinario y FONCOR.
9. ANEXO	➤ Informes.

Cerro de Pasco, diciembre del 2024




 Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 ASISTENTE CONTABLE Y PERITO DE GASTOS


 C.P.C.C. Neyra LOPE BERNUY
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO


 Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO


 Ing. Leonar BENITES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA SEPTIMO UNIDO SANTA FE DE AGUACHINI, DEL DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

1. **Ayuda Memoria:** Con respecto al proyecto en mención anterior oportunidad estaba a cargo por el Ing. Hugo Bravo Chávez, como supervisor de Obra, la actualidad la obra se encuentra en ejecución por otros supervisores.
2. **Generalidades:**



Objetivo Estratégico OEI	OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACION.
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2235359	AÑO/PROYECTO: 2024- 2235359
"INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA SEPTIMO UNIDO SANTA FE DE AGUACHINI, DEL DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"	
FUNCIÓN: 18 – SANIAMIENTO	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO	
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 6000001 EXPEDIENTE TECNICO	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 15 FONDO DE COMPESACION REGIONAL - FONCOR	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA SEPTIMO UNIDO SANTA FE DE AGUACHINI, DEL DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"
3. Antecedentes	Con fecha 05 de julio del 2023, se aprueba la reformulación del expediente técnico de la obra, con un monto presupuestado de la inversión que asciende a S/, 2'910,736.42 Soles, con un plazo de 120 días calendario. Así mismo tiene devengado al 2do Semestre del 2024 el monto de S/ 1'003,962.00 Soles.
4. Justificación	La finalidad del proyecto corresponde la construcción de la obra denominada AGUACHINI, para mejora la calidad de vida de la comunidad nativa, la que se construirá en las inmediaciones del Distrito de Puerto Bermúdez.
5. Objetivos de Actividad	El objetivo del presente proyecto es mejor la calidad de vida de la población de la comunidad nativa de Aguachini a través de la ejecución de saneamiento básico. El proyecto tiene como objetivo proporcionar a la comunidad nativa acceso a servicios básicos de saneamiento, como agua potable, disposición de excretas y manejo de residuos sólidos, lo que mejorara significativamente la calidad de vida de la población.
6. Informe Técnico	➤ Con respecto al Informe se debe indicar que se ha pasado valorizaciones correspondientes al II semestre del 2024.
7. Resultados Alcanzados	➤ La obra a la fecha se cuenta con un avance físico acumulado de 95.7 %, así mismo con un acumulado financiero de 96.7 %.
8. Informe Presupuestal y Financiero	➤ Con respecto a la ejecución financiera correspondiente al II Semestre es de S/ 681,779.00 Soles, por el monto de 3'072,367.00 Soles, la fuente de financiamiento es Recursos Ordinario y FONCOR.
9. ANEXO	➤ Existe Informes.


 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTA
 C.P.C.C. Reyna LOPE BERNUY
 ASISTENTE DIRECTIVA ADMINISTRATIVO

Cerro de Pasco, diciembre del 2024


 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 Ing. Leonel BENITES DIEGO
 SUBGERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO"

1. **Ayuda Memoria:** La obra beneficia a los pobladores del Centro Poblado de Chupaca – Paucartambo, con respecto a los desastres posteriores.
2. **Generalidades:**



Objetivo Estratégico OEI	OEI.05 PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL DPTO. DE PASCO.
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 05.01 SENSIBILIZACION DE LA CULTURA DE PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2231959	AÑO/PROYECTO: 2024- 2231959
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO".	
FUNCIÓN: 23 – PROTECCION SOCIAL	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 023 AGRARIO	
GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLACION EN RIESGO	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS.	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 15 FONDO DE COMPEACION REGIONAL - FONCOR	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO"
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El proyecto corresponde a la Función Orden Público, como responsabilidad Funcional del Gobierno Regional de Pasco. Es netamente de tipo Orden Publico y Seguridad que definirá las condiciones de habilidad de la población local y población usuaria del servicio de gestión de Riesgo y Emergencia – prevención de desastre de inundaciones del área urbana de C.P. Chupaca – Paucartambo.
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La ejecución del proyecto beneficia a los pobladores del Centro Poblado de Chupaca, del Distrito de Paucartambo, Provincia y Departamento de Pasco.
5. Objetivos de Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Garantizar la operatividad y prestación continua de los servicios públicos a la sociedad. ➤ Proporcionar seguridad económica tanto al estado como a los beneficiarios del proyecto, reduciendo la incorporación de partidas presupuestales para acciones de rehabilitación y/o reposición de bienes y servicios públicos y privados.
6. Informe Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Como informe son las valorizaciones que se deriva cuando la obra se encuentra en ejecución. ➤ Teniendo en cuenta la ejecución de las partidas a valorizar desde de julio a diciembre del 2024, acumulado 6'323, 863.00
7. Resultados Alcanzados	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La ejecución de la presente obra es la protección en caso de inundaciones, facilitando a los pobladores del centro poblado de Chupaca – Paucartambo.

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 C.P.CC. Reyna LOPE BEPALLY
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 Ing. Leonel BENTES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS

8. Informe Presupuestal y Financiero	➤ La presente obra tiene un avance físico de 42.1% y la ejecución financiero a diciembre 2024 al 52.8%, el costo total de Inversión actual es 6'323,863.00 Soles.
9. ANEXO	➤ Se adjunta copias de Informes.

Cerro de Pasco, diciembre del 2024



Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

 C.P.D.C. Reyno LOPE BERNUY
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

 Ing. Leon BENITES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA"

1. Ayuda Memoria:

- La obra se aprueba con el Expediente Técnico (reformulado), según Resolución G.G. R N° 0188-2022 G.R. PASCO/GGR, Costo de Ejecucion es el monto de S/ 19'039,535.29, plazo de ejecucion es de 365 días calendarios.
- Contratista: "CONSORCIO VIAL SENDAS", monto del contrato es S/ 17'291,800.28, plazo de Ejecucion es de 365 días calendario, según Contrato de Ejecucion N° 29-2022-G.R.PASCO/GGR de fecha 07/12/2022.

2. Generalidades:

Objetivo Estratégico OEI	OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 06.01 REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACION
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2030472 "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA"	AÑO/PROYECTO: 2024- 2030472
FUNCIÓN: 03 – PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	
GRUPO FUNCIONAL: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 6000016 GESTION Y ADMINISTRACION	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA"
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El Gobierno Regional de Pasco suscribió el "CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION DE GESTION TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROMERICANOS PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA – OEI" de fecha de 03 de junio de 2009 para la administración de recursos y realizar procesos de selección de diversos proyectos entre ellos la elaboración de Expedientes Técnico, Ejecución de Obra, y Supervisión de Ejecución de Obra de la carretera Huachon - Huancabamba (Km 82+240).
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La justificación del estudio es el mejoramiento del camino HUACHON - HUANCABAMBA, distrito Huachon Huancabamba departamento de Pasco, en los distintos tramos de la carretera y sus principales características como composición por tipo de vehículo, relación de viaje origen - destino, frecuencia de viaje, etc.
5. Objetivos de Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mejorar el nivel de transpirabilidad vehicular de la carretera HUACHON - HUANCABAMBA, para que facilite el traslado de pasajeros y productos agropecuarios a los mercados de consumo. ➤ Elaboración de expedientes técnico, levantamiento topográfico, estudios de suelo, identificar y evaluar los impactos ambientales en la Zona. ➤ Se dotara de elementos de Seguridad Vial y Señalización al tramo en estudio y se dará solución a los problemas de drenaje.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indicar que la obra se encuentra culminada desde la fecha de 30/07/2024 con acta de recepción de fecha 30/10/2024, un avance físico final de 95.54%, no llegando al 100% por temas de reducciones.



GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 C.P.C.C. **FRANCA LOPE BERNUY**
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Ing. Leonel BERTES DIEGO
 SU GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

6. Informe Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Así mismo se tiene un mayor metrado N°01 con una incidencia de 4.46% que se encuentra observado a la fecha, por falta de justificación se devolvió al contratista. ➤ Actualmente la obra se encuentra en la etapa de liquidación.
7. Resultados Alcanzados	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El avance de la obra se encuentra al 97.9, proyecto que ya se encuentra culminado en el proceso de liquidación, monto acumulado de devengado al II Semestre del 2024 – S/ 89'233,341.00 Soles.
8. Informe Presupuestal y Financiero	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La obra tiene un costo total de inversión S/ 91'177,168.00 y un devengado acumulado de S/.89'233,341.00 Soles.
9. ANEXO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fotografía. <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <hr style="border: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>Fotografía N° 05: SE TIENE PRESENCIA DE LLUVIAS</p> </div>



Cerro de Pasco, diciembre del 2024


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

 C.P.C.C. REYIR LOPE BERNUY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

 Ing. Leonel BERNALES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO: MAJONTINI-VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO"

1. Ayuda Memoria:

- ✓ La mencionada obra debo mencionar que e por contrata, el costo de ejecución es S/ 40'640,133.34 Soles, plazo de ejecución 365 días calendario, inicio de ejecución el 01/04/2024.
- ✓ Contratista "Consortio INGECIMMET", contrato de Ejecución N° 003-2024-GR. PASCO/GGE.
- ✓ Servicio de supervisión "Consortio Supervisor MAJONTINI"

2. Generalidades:



Objetivo Estratégico OEI	OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 06.01 REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACION
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2334696 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO: MAJONTINI-VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO"	AÑO/PROYECTO: 2024- 2334696
FUNCIÓN: 15 TRANSPORTE	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 033 TRANSPORTE TERRETR	
GRUPO FUNCIONAL: 0066 VIAS VECINALES.	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 4000079 MEJORMIENTO DE CAMINO VECINAL.	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 15 FONDO DE COMPEACION - FONCOR	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO: MAJONTINI-VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO"
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El Estado, dentro del marco de lucha contra la pobreza y a través de sus diversas instituciones sub nacionales, tiene como objetivo implementar proyectos de infraestructura productiva, económica y social básica, a efectos de elevar el nivel de ingreso y mejorar las condiciones y calidad de vida de la población en las diversas zonas del país. Este propósito debe alcanzarse, especialmente, en los ejes y corredores de integración regional de nuestro país a través de la implementación de proyectos de mejoras de la capacidad de la infraestructura vial que permitan interconectar ciudades capitales regionales, provinciales, distritales y los numerosos centros poblados y anexos localizados en su área de influencia
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La justificación del estudio es el mejoramiento del camino vecinal tramo Majontini – valle Nazaret (empalme a la ruta B), distrito de puerto Bermudez – provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, en los distintos tramos de la carretera y sus principales características como composición por tipo de vehículo, relación de viaje origen – destino, frecuencia de viaje, etc.
5. Objetivos de Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mejorar el nivel de transpirabilidad vehicular de la carretera Majontini – Valle Nazaret, para que facilite el traslado de pasajeros y productos agropecuarios a los mercados de consumo. ➤ Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad incorporando a logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.
6. Informe Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Del Avance Físico y Financiero ejecutado a la fecha el avance correspondiente al mes de setiembre de la valorización N° 06 de obra programado acumulado es de 37.41 % (Segun

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.P.C.C. Reyno LOPE BERNILLY
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Leonel BENITES DIEGO
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

	<p>el Calendario de avance de obra), y el avance real acumulado es de 20.76%, la obra se encuentra Atrasado 16.65%.</p> <p>➤ La obra se suspendió el 13 de septiembre por falta de pago de valorizaciones al Consorcio Ingedimmet y se reinició el 05 de noviembre.</p>
7. Resultados Alcanzados	<p>➤ La meta alcanzada físicas, componente N° 1, sub estructuras, superestructura, Plan de Manejo Ambiental.</p>
8. Informe Presupuestal y Financiero	<p>➤ La obra tiene un costo total devengado acumulado 19'535,368.00 soles avance acumulado 47.7%.</p>
9. ANEXO	 <p><i>Figura N° 6: Colocación de material de préstamo lateral para ejecución de terraplenes, fendido y compactado de material de acuerdo a las especificaciones técnicas</i></p>

Cerro de Pasco, diciembre del 2024






 C.P.C.C. Deyvis LOPE BERNUY

 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO


 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



 Ing. Leonel BENITES DIEGO

 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA HUACHON, PROVINCIA PASCO – REGION PASCO"

1. **Ayuda Memoria:** La obra en mención se cuenta con el Acta de reinicio de plazo de ejecución de obra N°02: 02 de mayo del 2024, nueva fecha de término contractual: 23 de diciembre del 2024, con fecha 30 de noviembre del 2024 se suspende la ejecución de la obra por temas climatológicos.
2. **Generalidades:**



Objetivo Estratégico OEI	OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 06.01 REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACION
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2173359	AÑO/PROYECTO: 2024- 2173359
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA HUACHON, PROVINCIA PASCO – REGION PASCO"	
FUNCIÓN: 15 TRANSPORTE	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 033 TRANSPORTE TERRESTRE	
GRUPO FUNCIONAL: 0065 VIAS DEPARTAMENTALES	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 6000001 EXPEDIENTE TECNICO	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 15 FONDO DE COMPESACION - FONCOR	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA HUACHON, PROVINCIA PASCO – REGION PASCO"
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ APR. DEL EXP. TEC: R.G.G.R N°0612-2021-G.R.PASCO/GGR. costo de ejecución: s/. 91,646,303.62. Contrato de la ejecución: N°0074-2021-G.R. PASCO/GGR. (29 de diciembre del 2021). monto de contrato: s/. 87,979,956.18 (INCLUIDO IGV). contrato de la supervisión: contrato N° 004-2022-G.R. PASCO/GGR - 31 de marzo del 2022. monto de contrato supervisión: s/. 2,861,510.58 (incluido IGV). plazo de ejecución: 365 días calendario. ➤ Acta de reinicio de plazo de ejecución de obra N°02: 02 de mayo del 2024, nueva fecha de término contractual: 23 de diciembre del 2024, con fecha 30 de noviembre del 2024 se suspende la ejecución de la obra por temas climatológicos.
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La carretera antes del proyecto se encontraba en malas condiciones con múltiples baches en el afirmado sumado a ello la inseguridad propia de tipo de carreta que presenta problemas en el recorrido y afecta directamente el en tiempo de viaje por lo tanto nace da necesidad de construir una carretera con las condiciones que demanda las necesidades los distritos de Ninacaca – Huachon
5. Objetivos de Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Garantizar la operatividad y prestación continua de los servicios públicos a la sociedad. ➤ Proporcionar seguridad económica tanto al estado como a los beneficiarios del proyecto, reduciendo la incorporación de partidas presupuestales para acciones de rehabilitación y/o reposición de bienes y servicios públicos y privados.
6. Informe Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aquí debo comentar que han realizado visitas inopinadas al proyecto de la carreta Ninacaca – Huachon para verificar los trabajos realizados como son: mejoramiento, base, asfalto excavaciones en túnel.
7. Resultados Alcanzados	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El avance de la obra se encuentra al 69.6% lo cual indica que tiene un buen avance para concluir la obra.

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

C.P.C.C. Reyna LÓPEZ BERNILY
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Leonel BENITES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


8. Informe Presupuestal y Financiero	➤ La obra tiene un costo total de inversión actualizada S/. 199,030,989 y un devengado acumulado de S/. 161,121,135.
9. ANEXO	➤ Valorizaciones, informes técnicos.

Cerro de Pasco, diciembre del 2024




 Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 SECRETARÍA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

 C.P.C.C. Reyno LOPE BERNUY
 AGENTE ADMINISTRATIVO


 Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

 Ing. Leon BENITES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Actividad: "MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA, DISTRITO DE CHONTABAMBA – OXAPAMPA- PASCO".

1. Ayuda Memoria:

Actualmente la obra "MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA, DISTRITO DE CHONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO", con CUI 2234619. Se encuentra en ejecución normal con un avance de obra programado acumulado de 100 % y el avance real acumulado de 80.80 %

2. Generalidades:

Objetivo Estratégico	OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.	
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI.06.01 REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACION	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO		
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2234619 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA, DISTRITO DE CHONTABAMBA – OXAPAMPA- PASCO"		AÑO/PROYECTO: 2234619-2024
FUNCIÓN: 15 TRANSPORTE		
DIVISIÓN FUNCIONAL: 033 TRANSPORTES TERRESTRES		
GRUPO FUNCIONAL: 0065 VIAS DEPARTAMENTALES		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 6000001 EXPEDIENTE TECNICO		
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS		
RUBRO: 15 FONDOS DE COMPENSACION REGIONAL – FONCOR		
FUENTE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS.		
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.		
Nombre de la Actividad	" MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA, DISTRITO DE CHONTABAMBA – OXAPAMPA- PASCO"	
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La obra en la ejecución está a cargo del Consorcio Vial Chontabamba, así mismo la supervisión está a cargo del Consorcio Génesis, con el Contrato N° 0054 GR. PASCO/GGR de fecha 20/08/2021, por un monto de S/ 27'059,461.00, (Veintisiete Millones Cincuenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta con 57/100 soles) por el plazo de 300 días calendarios. ➤ Mediante CONTRATO N° 0063-2021-G.R. PASCO/GGR de fecha 26 de octubre del 2021, el GOBIERNO REGIONAL DE PASCO suscribe el referido con el CONSORCIO GENESIS legalmente representado por JESUS ANTONIO GONZALES VERGARA identificado con DNI 40101563 para supervisión de la obra, por un plazo de Ejecución de 270 días calendarios. ➤ La obra se ha iniciado EL 27/09/2021 	
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esta obra circuito vial facilita a los pobladores de Chontabamba, la construcción 10,114.972 km. de longitud con pavimento de concreto, con un ancho de superficie de calzada de 7.80 m y un espesor de 0.20 de concreto, bermas de 0.80 a cada lado de la vía, base de 20 cm. y una sub base de 20 cm, cuya pendiente máxima alcanza el 4.00%, se ha considerado cunetas laterales revestidas de forma triangular y cuadradas así mismo el mmejoramiento de superficie con carpeta asfáltica de 3 pulgadas y la aplicación de la política de mantenimiento mant1 que consiste en mantenimientos rutinarios anuales, bacheos al 100%. 	
5. Objetivos de Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mejoramiento de superficie a nivel de pavimento rígido y una política de mantenimiento que consiste en mantenimiento rutinario anual, reposición de losas cuando las grietas superen el 30%, sellado de juntas cada 12 años, y un cepillado de losas cuando llegue a 3.5, las intervenciones son a nivel de mejoramiento de 10,114.972 km. de longitud con pavimento de concreto, con un ancho de superficie de calzada de 7.80 m y un espesor de 0.20 de concreto, bermas de 0.80 a 	



Unidad Ejecutora Regional de Pasco
 DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS
 C.P.G.C. Deyna LOPE BERNIZ
 AGENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidad Ejecutora Regional de Pasco
 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 Ing. Leonel BENITES DIEGO
 SUPERVISOR DE OBRAS

	<p>cada lado de la vía, base de 20 cm. y una sub base de 20 cm., cuya pendiente máxima alcanza el 4.00%, se ha considerado cunetas laterales revestidas de forma triangular y cuadradas.</p>
6. Informe Técnico	<p>➤ Actualmente la obra "MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA, DISTRITO DE CHONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO" con CUI 2234619. Se encuentra en ejecución normal con un avance de obra programado acumulado de 100 % y el avance real acumulado de 80.80 %</p>
7. Resultados Alcanzados	<p>➤ La obra tiene un avance físico de 80.80%, financiero 89.90% actualmente el proyecto se encuentra suspendido.</p> <p>➤ Culminar al 100% la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA, DISTRITO DE CHONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO", con CUI 2234619, el mismo que tiene un plazo de culminación en mayo del 2025.</p>
8. Informe Presupuestal y Financiero	<p>➤ La obra se ejecutado las valorizaciones del mes de julio a diciembre del 2024 por el monto de S/ 13'000,153.00.</p> <p>➤ CHONTABAMBA, DISTRITO DE CHONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO", con CUI 2234619, Se encuentra suspendido con un avance financiero 88.10%, el mismo que puede ser verificado en el formato 12-B.</p>
9. ANEXO	<p>➤ Fotografías actuales correspondientes al mes de febrero del 2025</p> 



Cerro de Pasco, diciembre del 2024

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS

 C. P.C.C. Reyna LOPE BERNILLY
 AGENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

 Ing. Leon BENITES DIEGO
 SU GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PE-18 (DV UCHUMARCA)-GOLAC MAJADA – POCCO-UCHUMARCA-GORINA ALTA-HUANGUR-YURAC HUANCA-QUIULACOCHA- CERRO DE PASCO- EMP.PE 3N- (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO"



1. Ayuda Memoria:

- ✓ La obra en mención en mención la modalidad de Ejecucion es por Contrata, Costo de Ejecucion es por el monto de S/236'475,335.60 Soles, Plazo contratado es de 720 días calendarios.
- ✓ Datos del Contratista: Contratista "CONSORCIO VALCER UCHUMARCA", según Contrato de Ejecucion de Obra N° 0074-2023-G.R. PASCO/GGR, monto del contrato de S/ 11'110,912.47, plazo contractual: 792 días Calendarios.
- ✓ Los pobladores de las localidades de Golac Majada - Pocco - Uchumarca- Gorina Alta- Huangur - Yurac Huanca - Quiulacocha - Cerro De Pasco, se han organizado conjuntamente con sus autoridades y líderes de las diferentes organizaciones, para participar en el análisis de las necesidades más importantes que les aqueja y llegaron a la conclusión que el mejoramiento de sus vías debe estar en la primera prioridad del Plan del Gobierno Regional de Pasco, con la finalidad de contribuir a elevar el nivel de seguridad y traslado de personas y vehículos y la prevención de epidemias, además de contribuir a lograr el desarrollo económico propio de estas localidades, de las provincias de Daniel Alcides Carrión y Pasco, y por ende de la Región de Pasco.

2. Generalidades:

Objetivo Estratégico OEI	OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 06.01 REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACION
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2234342	AÑO/PROYECTO: 2024- 2234342
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PE-18 (DV UCHUMARCA)- GOLAC MAJADA – POCCO-UCHUMARCA-GORINA ALTA-HUANGUR-YURAC HUANCA-QUIULACOCHA- CERRO DE PASCO- EMP.PE 3N- (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO"	
FUNCIÓN: 15 TRANSPORTE	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 033 TRANSPORTE TERRETRE	
GRUPO FUNCIONAL: 0065 VIAS DEPARTAMENTALES	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 6000001 EXPEDIENTE TECNICO	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PE-18 (DV UCHUMARCA)-GOLAC MAJADA – POCCO-UCHUMARCA-GORINA ALTA-HUANGUR-YURAC HUANCA-QUIULACOCHA- CERRO DE PASCO- EMP.PE 3N- (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO"
3. Antecedentes	➤ La carretera PA-100 que inicia en la ruta Nacional EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO) y llega a la Carretera Departamental EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA), y que pertenece a la red vial de caminos departamentales del Gobierno Regional de Pasco y está ubicada entre los Distritos de Chaupimarca, Simón Bolívar, Yanahuanca, Provincias de Daniel Carrión y Pasco, en la Región de Pasco, en la República del Perú. La Carretera Departamental PA - 100 EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA- GORINA ALTA -

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
 C. P. CC. Reyna LUPE BERNILLY
 ASISTENTE ADMINISTRATIVA

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 Ing. Leonel BERNES DIEGO
 DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

	<p>HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACOCHA - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, REGION PASCO, tiene una longitud de 56.430 Km., entre altitudes 4,380 msnm variando las alturas de 3,800 m.s.n.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ El tramo se ubica en las Provincias Daniel Alcides Carrión y Pasco, Región Pasco. Asimismo, permite articularse con diversos accesos transversales logrando la interconexión de la sierra Central del país y consecuentemente con localidades de la misma zona
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El proyecto se encuentra en la PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO", longitud de intervención de 56+430 Km con proyecto entre vía con asfalto en caliente y rígido, así como también la construcción y remplazo de estructuras de obras de arte y estabilización de taludes de suelo reforzado necesarias. ➤ Actualmente los pobladores de las localidades de Golac Majada – Pocco – Uchumarca – Gorina Alta – Huangar – Yupac – Quiulacocha solo cuentan con algunas vías a nivel de afirmado y en su mayoría con vías sin ningún tipo de tratamiento superficial esto dificulta el traslado de productos agrícolas que produce en la zona. Esta situación además de causar incomodidad y peligro, también a causa de erosiones, hendidamientos, bacheos y encharcamientos de agua.
5. Objetivos de Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El objetivo del estudio es lograr que la vía sea pavimentada, pueda brindar un servicio de transporte adecuado en la zona local regional por lo tanto necesitan que la carretera este bien conservada, así las regiones generan mayores posibilidades de trabajo a los pobladores de las localidades cercanas, que se beneficiaran con el transporte de productos agrícolas, minería, etc.
6. Informe Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La obra se encuentra en etapa de suspensión, mediante ACTA DE SUSPECCION de fecha 20 de diciembre del 2024 y estando en un avance acumulado de 9.239% al mes de diciembre del 2024.
7. Resultados Alcanzados	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se ha trabajado con La norma de diseño seguidas para el diseño geométrico de la carretera son las correspondientes al Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 del MTC.
8. Informe Presupuestal y Financiero	<ul style="list-style-type: none"> ➤ En la presente obra la inversión actualizada es de un monto de S/ 246'375,316.00 Soles. El avance acumulado es 37.9%, devengado acumulado es S/ 93'447,316.00.
9. ANEXO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se adjunta panel fotográfico. 



FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA COVERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GONZALES, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO"

- Ayuda Memoria:** La Obra indicada arriba se reinició del día 27/12/2022 Se firma el ACTA DE REINICIO DE OBRA N°02, en la que dan concluida la suspensión de Plazo de ejecución, ya que el día 22/12/2022 se suscribió el Acta de Conciliación N° 114-2022. Por la cual la empresa Oficina de ingeniería y Servicios Técnicos S.A. reiniciará sus funciones; el Acta de Reinicio fue firmada por parte del CONSORCIO OXAPAMPA SALUD, el Sr. Ciro Gaspar Huánuco Representante legal y por parte del GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, Ing. Julio Cesar Barraza GERENTE REIGONAL DE INFRAESTRUCTURA y el Ing. Valentín Huayllani Requena SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS; la fecha de reinicio de obra contabilizará a partir del día siguiente de firmada el acta (28/12/2022).
- Generalidades:**



Objetivo Estratégico OEI	OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 09.03 GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2198319 "MEJORAMIENTO DE LA COVERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GONZALES, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO" FUNCIÓN: 20 – SALUD	AÑO/PROYECTO: 2024- 2198319
DIVISIÓN FUNCIONAL: 044 SALUD INDIVIDUAL	
GRUPO FUNCIONAL: 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD.	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS.	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	

Nombre de la Obra. "MEJORAMIENTO DE LA COVERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GONZALES, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO"

- Antecedentes**
 - Con fecha 01 de febrero del 2019, el GOBIERNO REGIONAL DE PASCO y el CONSORCIO OXAPAMPA SALUD suscribieron el CONTRATO N°0005-2019-G.R. PASCO-GGR para ejecutar la obra: "MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GONZALES-PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO", con un plazo de ejecución de 600 días calendarios y por el monto de S/. 104'783,192.84 Nuevos Soles, incluido el IGV.
 - CONTRATO N°049-2023-G.R.PASCO/GGR, de fecha 17 de octubre del 2023, se suscribió la contratación del saldo del servicio de supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES, PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO" CUI N°2198319, por el monto de S/1,153,003.72 (Un millón ciento cincuenta y tres mil tres con 72/100 soles), por 274 días calendarios

- Justificación**
 - El Gobierno Regional de Pasco (GOREPA), cumpliendo sus objetivos de brindar adecuadas condiciones de habitabilidad para la prestación de los servicios de equipamientos urbanos públicos en su jurisdicción y anexos, ha tenido a bien encargar por la modalidad de Adjudicación

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 C.P.C.C. Reyna LOPE BERNUY
 AGENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 Ing. Leonel BENITES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


	Simplificada la elaboración del presente expediente técnico, acorde a los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
5. Objetivos de Actividad	➤ Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad de la población del ámbito de influencia del hospital "Ernesto Germán Guzmán Gonzáles" de Oxapampa, Región Pasco. Y, adecuado acceso a los servicios de salud del hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzáles, en la provincia de Oxapampa, Región Pasco.
6. Informe Técnico	➤ A la fecha, se viene desarrollando la Constatación Física e Inventario de Obra: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES, PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO.
7. Resultados Alcanzados	➤ Culminar al 100% la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES, PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO.
8. Informe Presupuestal y Financiero	➤ Actualmente la obra "MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES, PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO, con CUI N° 2198319. Se encuentra en ejecución normal con un avance financiero de 59.1%, el mismo que puede ser verificado en el formato 12-B.
9. ANEXO	➤ Fotografías Actual.




 GOBIERNO REGIONAL PASCO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS

 C. P.C.C. Reyna LOPE BEHNUY
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Cerro de Pasco, diciembre del 2024


 GOBIERNO REGIONAL PASCO

 Ing. Leonel BEZERRA DIEGO
 SU GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

1. Ayuda Memoria:

- El proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad resolutiva y operativa del Hospital Román Egoavil Pando, ubicado en Villa Rica, Pasco, para fortalecer su infraestructura hospitalaria y brindar una atención de calidad a 88,315 personas. Se trata de un Hospital II-1 (obra nueva) con un sistema de contratación a suma alzada, situado en un terreno de 9,466.25 m² y con un área construida de 11,920.49 m². El costo total de la obra asciende a S/. 109,732,899.85. El hospital contará con 45 camas distribuidas en áreas de hospitalización, emergencia y centro quirúrgico.

2. Generalidades:

Objetivo Estratégico OEI	OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 09.03 GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2157301	AÑO/PROYECTO: 2024- 2157301
"MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"	
FUNCIÓN: 20 – SALUD	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 044 SALUD INDIVIDUAL	
GRUPO FUNCIONAL: 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD.	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS.	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El proyecto busca garantizar una adecuada capacidad diagnóstica y resolutiva mediante la modernización de la infraestructura y el equipamiento, así como brindar atención integral de salud con calidad y eficiencia para prevenir enfermedades y reducir la morbilidad en la población. Para ello, se ha planificado la demolición del hospital existente y la construcción de un nuevo complejo hospitalario en el mismo terreno. Este nuevo complejo contará con diez edificios distribuidos de la siguiente manera: cuatro edificios de 4 pisos, tres edificios de 3 pisos, dos edificios de 2 pisos y un edificio de 1 piso.
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La situación de salud de un distrito es el resultado de la interacción de múltiples factores determinantes, que con gran dinamismo modifican y determinan los perfiles epidemiológicos y los escenarios de salud-enfermedad de la población. La pobreza, la ruralidad, la globalización, la contaminación ambiental, la inaccesibilidad a servicios de agua y desagüe; las bajas coberturas de parejas protegidas por métodos modernos y de parto por personal entrenado; y otros determinantes de




Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL INVERSIÓN DE RECURSOS

[Signature]
 C. P. C. Reyna LOPE BERNUY
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

[Signature]
 Ing. Leonel BENITES DIEGO
 SUPERVISOR DE OBRAS

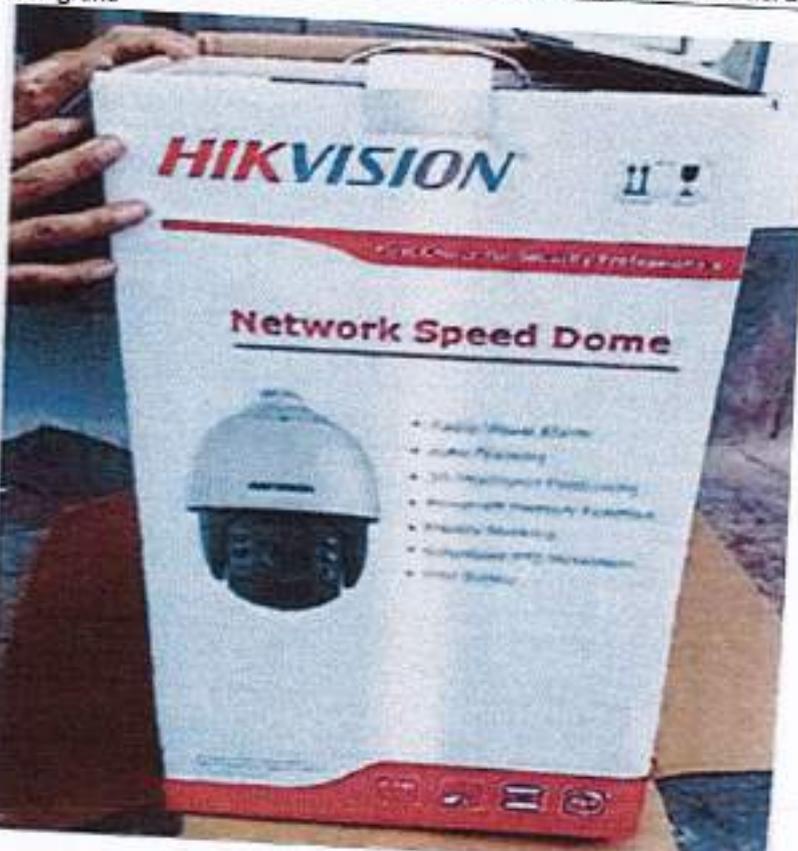

	gran impacto en la salud, establecen un estado de salud de transición epidemiológica, donde persisten juntas las enfermedades infecciosas y las crónicas degenerativas, además de las causas externas
5. Objetivos de Actividad	➤ ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO: Necesario en las diferentes unidades de servicios con la capacitación de uso de los mismos. Actualización, y acondicionamiento de los documentos de gestión del Hospital. Diseño, socialización y validación de protocolos y guías. Implementación de software e información de vigilancia y monitoreo hospitalario. Desarrollo de talleres a la población de salud comunitaria y medicina tradicional integrada a los sistemas de salud. Desarrollo de talleres de difusión de las guías y manuales para el sistema de referencia y vigilancia comuna. Pasantías en emergencias obstétricas, pediátricas y traumatismo.
6. Informe Técnico	➤ Dentro del informe se debe describir, que las puertas CORTAFUEGO han sido diseñados y construidas para resistir al juego sin permitir el paso de humos, llamas y temperaturas, se incluiría una barra antipática, según lo que indica el tipo de puerta en los planos de desarrollo.
7. Resultados Alcanzados	➤ La obra se ejecutó con estructuras, arquitecturas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas e instalaciones de comunicación.
8. Informe Presupuestal y Financiero	➤ En términos financieros y presupuestarios, los avances del proyecto han sido significativos. Hasta diciembre de 2024, la valorización N° 41 ha alcanzado un monto de S/. 66,985,265.26 y se ha devengado en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) 2024 un total de S/. 8,574,733.32. ➤ Mediante la Valorización N° 41 fue en el mes de diciembre del 2024.
9. ANEXO	Fotografía 

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
ESTABLECIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Rivera
C.P.C.C. Reyno LOPE BENIY
ASIS UNTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Cerro de Pasco, diciembre del 2024

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Benites
Ing. Leonel BENITES DIEGO
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO REGION RED POZUZO, DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAMPA- DEPARTAMENTO DE PASCO"

1. Ayuda Memoria:

- La obra la estuvo paralizada desde 13 de septiembre del 2024 hasta el 17 de noviembre del 2024, se desconocía sobre la falla geológica, la cual pasaba por el centro de salud de alto lagarto, el avance del mes de diciembre del 2024 es de 36.21%, estando por debajo del 80%; se nombra un interventor a fin de continuar con el proceso de ejecución de la obra. Se tiene aprobada una cuenta mancomunada a fin de realizar los pagos pendientes. Con fecha 27 de diciembre del 2024 se suspende la ejecución de la obra por temas climatológicos.

2. Generalidades:

Objetivo Estratégico OEI	OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI 09.03 GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN: 2232331	AÑO/PROYECTO: 2024- 2232331
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO REGION RED POZUZO, DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAMPA- DEPARTAMENTO DE PASCO"	
FUNCIÓN: 20 – SALUD	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 044 SALUD INDIVIDUAL	
GRUPO FUNCIONAL: 0096 ATENCION MEDICA BASICA	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 4000034 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD.	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR.	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS	
GENERICA DE GASTO: 6.26 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Nombre de la Obra.	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO REGION RED POZUZO, DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAMPA- DEPARTAMENTO DE PASCO"
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Expediente Técnico: aprobó mediante Resolución De Gerencia General Regional N° 0298-2022-G.R. PASCO/GGR (16/05/2022) monto según expediente técnico: 15'415,336.65 plazo de ejecución según expediente: 210 D.C. ejecutor de obra: contrato N° 027-2022-G.R. PASCO/GGR – monto: s/ 14'112,463.26 supervisor de obra: contrato N° 014-2023-G.R.PASCO/GGR. – monto: s/ 408,600.00 inicio de ejecución de obra: 08/09/2022 plazo de ejecución según contrato: 210 D.C. suspensión de plazo: 28/12/2022. reinicio de obra N° 01: 25/05/2023. ampliación de plazo 01: denegado ampliación de plazo 02: denegado ampliación de plazo 03: 53 D.C. - aprobado con R.G.G.R. N° 110-2023-G.R. P./GGR ampliación de plazo 04: 28 D.C. - aprobado con R.G.G.R. N° 583-2023-G.R. P./GGR ampliación de plazo 05: denegado (en trámite de conciliación) ampliación de plazo 06: 34 D.C. - aprobado con R.G.G.R. N° 870-2023-G.R.P./GGR nuevo termino de plazo de ejecución: 31/03/2024 (con la ampliación de plazo N° 05 que está en conciliación).
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Los trece puestos de salud carecen de los servicios adecuado para la atención al público estos puestos son: San Camilo, Ascensión, Buena



GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 C.P.C.C. Reyna LOPE BERNUY
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 Ing. Leonel BENTES DIEGO
 SU GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS

	Vista, Cushi, Rio Tigre, San José, San Salvador, Santa Rosa, Santa Virginia, Cañanchacra, Alto Lagarto, Tingo Malpaso, Osomoya
5. Objetivos de Actividad	➤ El objetivo principal es mejorar el servicio de la atención en las diferentes postas médicas que componen la Micro Red Pozuzo.
6. Informe Técnico	➤ Se hace la visita técnica a campo en las distintas obras para la verificación de los avances en obra.
7. Resultados Alcanzados	➤ El avance actual de la obra que es de 36.21% lo cual representa el trabajo realiza en los diferentes puestos de salud.
8. Informe Presupuestal y Financiero	➤ El costo total de inversión actualizado es de S/. 18,362,614 con un devengado acumulado de S/. 12,517,588.
9. ANEXO	➤ Valorizaciones, informes técnicos.

Cerro de Pasco, diciembre del 2024



Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS

 C.P.C.C. Meyna LDPE BERNILY
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

 Ing. Leonel BENTTES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Actividad: "SUPERVISAR Y CONTROL DE OBRA"

- Ayuda Memoria:** Con respecto a esta actividad en el segundo semestre se ha modificado el POI, por incremento de dos actividades; esto son: "Instalación de Aula Prefabricado en la Bilingüe Miguel Grau en la comunidad Nativa Buenaventura del Distrito de Puerto Bermúdez- Provincia de Oxapampa – Departamento de Pasco" y "Plan de Continuidad y Mantenimiento Preventivo para Funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PETAR) – Villa Rica.
Así mismo debo manifestar que nos ha rebajado el techo presupuestal, pese que en esta Sub Gerencia se necesita más presupuesto. Se sugiere que el techo presupuestario asignado se debe respetar.
- Generalidades:**

Objetivo Estratégico	OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI.09.03 - GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN:	
ACTIVIDAD: 5000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL.	AÑO/PROYECTO: 3999999 – SIN PRODUCTO - 2024
FUNCIÓN: 03 – PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 004 – PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.	
GRUPO FUNCIONAL: 5000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 0001433 "SUPERVISAR Y CONTROL DE OBRAS"	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS	
FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS	
GENÉRICA DE GASTO: 5 – 23 BIENES Y SERVICIOS	
Nombre de la Actividad	"SUPERVISAR Y CONTROL DE OBRAS"
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ De acuerdo al ROF la Sub Gerencia de Supervisión de Obras, está considerado en el Capítulo VIII, dentro de los Órganos de Línea, en el Art. 84; es un órgano de tercer nivel organizacional, depende de la Gerencia Regional de Infraestructura, encargada de supervisar los proyectos que se ejecuta directa o indirectamente de Gobierno Regional. ➤ Las Normas Técnicas que se aplican en la supervisión de obra en Perú es el Reglamento Nacional de Edificación (RNE), Y otra Norma Técnicas que debe cumplir todas las Entidades Públicas. ➤ Directiva N-2022 MDL ➤ El supervisor de Obra deberá conocer la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. ➤ Reglamento Nacional de Edificación – D.S. N° 011-2006- Vivienda.
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La supervisión es importante porque ayuda a que las personas y las obras se desempeña de la mejor manera y a que cumplan los objetivos. ➤ La supervisión genera información para tomar decisión oportuna. ➤ Debe justificar realizar el avance de la ejecución de acuerdo a lo programado, así mismo el control de calidad, control de tiempo de ejecución, para evitar la ampliación de plazos en el ejecución de las obras.
5. Objetivos de Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que debe satisfacer la expectativa en la ejecución de las obras ➤ El objetivo de esta actividad es que debe cumplir en los plazos establecidos con las especificaciones y detalles plasmada en el expediente técnico de la obra.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aquí debo comentar que han realizado visitas inopinadas al proyecto del Hospital Ernesto G. Guzmán- Oxapampa, al Hospital Fredy Valle –



Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

C.P. CC. Reyna LOPE BERNLIV
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Leonel BENTES DIEGO
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

6. Informe Técnico	Yanahuanca, Carretera Huachon – Huancabamba. Informe de Viáticos de acuerdo a la RER N° 068 de fecha 15/02/2024 ➤ También en esta actividad se pagó por servicios Administrativa, encargatura de S.G.S.O.; Doc. Presentados O/S,
7. Resultados Alcanzados	➤ 24 Supervisiones en diferentes proyectos, se ha monitoreado para cumplir con las metas trazadas que las obras se culminan a tiempo programados. Este resultado corresponde de julio a diciembre del 2024
8. Informe Presupuestal y Financiero	➤ Con respecto al Presupuesto financiero del presente semestre se ha gastado el monto de S/ 24,462.00, en viáticos, servicios, Fluido Eléctrico (PETAR).
9. ANEXO	➤ Informes de asignación comisión de Viáticos, Informe de labores de supervisión, Ordenes de servicio.



Cerro de Pasco, diciembre del 2024


 Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE INGENIERÍA DE OBRAS


 C.P.C. EVELYN LOPE BEHNUY
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO


 Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO


 Ing. Leonel BENITES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Actividad: La presente actividad del Plan de Contingencia, en por una necesidad de los estudiantes de la Institución Educativa "INSTALACIÓN DE AULA PREFABRICADO EN LA BILINGÜE MIGUEL GRAU EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENAVENTURA DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ- PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO"

1. **Ayuda Memoria:** Con respecto a la obra "Instalación de Aula Prefabricado en la Bilingüe Miguel Grau en la comunidad Nativa Buenaventura del Distrito de Puerto Bermúdez- Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco", tenía como objetivo satisfacer la necesidad de ambientes para poder tener un ambiente, pero, sin embargo, no se ejecutó, quedando pendiente a la fecha.
2. **Generalidades:**

Objetivo Estratégico	OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI.09.03 - GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 – ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN:	
ACTIVIDAD: 5000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	AÑO/PROYECTO: 3999999 – SIN PRODUCTO - 2024
FUNCIÓN: 03 – PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 004 – PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	
GRUPO FUNCIONAL: 5000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS	
RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS	
FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS	
GENÉRICA DE GASTO: 5 – 23 BIENES Y SERVICIOS	
Nombre de la Actividad	INSTALACIÓN DE AULA PREFABRICADA EN LA IE BILINGÜE "MIGUEL GRAU" EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENAVENTURA DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ En el distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa y Departamento de Pasco, la Institución Educativa Bilingüe "Miguel Grau" del nivel secundaria se viene presentando un incremento de población estudiantil en los 5 grados, donde la actual no cuenta con la suficiente cantidad de aulas e infraestructura. ➤ Ante estos hechos, el Gobernador Regional decide impulsar a realizar un plan, denominado: "INSTALACIÓN DE AULA PREFABRICADA EN LA IE BILINGÜE "MIGUEL GRAU" EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENAVENTURA, DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO".
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El presente Plan de Contingencia, nace por crecimiento estudiantil he ahí la falta de espacio, falta aulas que tienen cada grado en la Institución Educativa Bilingüe "Miguel Grau" de la Comunidad Nativa Buenaventura.
5. Objetivos de Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El objetivo de la actividad con la instalación de Aula prefabricado brindará una mejor calidad de vida a la población estudiantil de la Institución Educativa Bilingüe "Miguel Grau" de la Comunidad Nativa Buenaventura del distrito de Puerto Bermúdez.
6. Informe Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Para informarle que se hizo un Plan de trabajo, cronograma de ejecución, se consideró en obras provisionales, construcción de modulo prefabricado.
7. Resultados Alcanzados	<ul style="list-style-type: none"> ➤ No se ha alcanzado con resultados porque no se ha contado con presupuesto, estuvo programado para los meses de noviembre y diciembre 2024.
8. Informe Presupuestal y financiero	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Con respecto al Presupuesto para la ejecución del Plan se ha elaborado afectando al costo directo por los porcentajes correspondiente a Gastos generales, asciende a la suma de: CUARENTA Y UN MIL CIENTO



UNIDOS GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 C.P.O.C. REYNA LOPE BERNUY
 AGENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

UNIDOS GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Leonel BERNIERES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

	OCHENTA Y NUEVE CON 92/100 SOLES. (S/ 41,189.92), con precios vigentes al mes de agosto 2024.
9. ANEXO	➤ Plan de trabajo del proyecto, cronograma, POI por incremento y modificación.

9 1 DIC 2024

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
OFICINA GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

C.P.C.C. Reyna LOPE BERNUY
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Leonel BENITES DIEGO
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



FICHA DE TRABAJO

Nombre de la Actividad: "PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR)- VILLA RICA"

1. Ayuda Memoria: Actual siendo el titular el Gobierno Regional de Pasco, es el responsable en la operatividad de la unidad fiscalizable de dicha Planta (PTAR), así mismo debo mencionar que en el mes de diciembre se ha pagado la suma de S/. 17,974.81.
2. Generalidades:

Objetivo Estratégico	OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO
Acciones Estratégicas Institucional AEI	AEI.09.03 - GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN:	
ACTIVIDAD: 5000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL.	AÑO/PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO - 2024
FUNCIÓN: 03 - PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	
DIVISIÓN FUNCIONAL: 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.	
GRUPO FUNCIONAL: 5000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	
UNIDAD DE MEDIDA: 086: PERSONAS.	
RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS	
FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS	
GENÉRICA DE GASTO: 5 - 23 BIENES Y SERVICIOS	
Nombre de la Actividad	"PLAN DE COTINUIDAD OPERATIVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR)- VILLA RICA"
3. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Con fecha 10 de marzo del 2013, BCP y el GOREPA PASCO suscribieron el convenio de la inversión pública regional y local para el funcionamiento y ejecución de la obra: "RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE VILLA RICA -OXAPAMPA-PASCO" con CUI 2133205. ➤ Luego de realizar seguimiento mediante Oficios y Cartas, el Sr. Jhon Jairo WETREICHER POTESTA en calidad de operador de planta - PTAR VILLA RICA. ➤ Para el periodo del segundo semestre del 2024, se solicitó presupuesto de (setiembre a noviembre) en calidad urgente, actual indicando el titular del proyecto sigue el Gobierno Regional de Pasco y por ende la operatividad de la unidad fiscalizable: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR - VILLA RICA., DISTRITO DE VILLA RICA.
4. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se debe justificar para asegurar la continuidad del servicio de tratamiento de aguas residuales, frente a diferentes hechos mediante la utilización de bienes y servicios en diferentes actividades críticas.
5. Objetivos de Actividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El objetivo es garantizar la continuidad operativa, correcto mantenimiento preventivo, salud y seguridad del personal operador, para el adecuado y eficiente funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales (PETAR) - VILLA RICA.
6. Informe Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se ha realizado Ordenes de Servicios para pagos del personal de la (PTAR).
7. Resultados Alcanzados	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cumplimiento de monitoreo periódicos según corresponda del afluente y de aguas tratadas en el PTAR.
8. Informe Presupuestal y Financiero	<ul style="list-style-type: none"> ➤ De acuerdo a la evaluación sobre la asignación presupuestal en la genérica 2.3 23.12 y 2.3 27.14.98, vigilante 1, 2 y operario. Por el monto de (Veinticinco Mil Quinientos con 00/100 Soles).
9. ANEXO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fichas de Trabajo, Cuadro de Costo, ordenes de servicio, pedido de servicios.



Cerro de Pasco, diciembre del 2024

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. CC. Reyna LOPE BENLUI
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Leonor BENITES DIEGO
 SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

**INFORME, EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2024**

000885- REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Ficha de implementación de la AEI.01.01:

SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS

Correspondiente al Segundo Semestre del año 2024.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Cuadro N° 1

Código y nombre de UO		10.04 SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS		
Código y denominación de OEI		OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION		
Código y denominación de AEI		AEI.01.01 SERVICIO EDUCATIVO CON ACCESO PARA LA POBLACION DES A 16 AÑOS.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / Inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	La I.E. M.P.M. mejor calidad de aprendizaje en todos los niveles. Se logra adecuados ambientes para los estudiantes.	En la I. E. del M. P. B se ha programado 10 actividades y se ejecutó los 10.	A consecuencias de diversos factores: climáticos, materiales etc.	Se recomienda que deben proporcionar materiales de buena calidad.
2. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 31 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON DISEÑO ARQUITECTONICO BIOQUIMATICO EN LA URBANIZACION SAN JUAN, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO.	Satisface la necesidad de la población local usuaria del servicio de educación inicial, Primaria y secundaria de la Institución Educativa N°31 Nuestra Señora del Carmen, Yanacancha - Pasco.	En esta I. E. Nuestra Sra. de Carmen, se ha programado 12 actividades y se ha ejecutado los 12.	Retraso en ejecución del proyecto por materiales.	actividad es priorizar la ejecución de los proyectos sin retraso y costos alguno, prevenir oportunamente de los materiales necesario.
3. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N° 33 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - PASCO.	Garantizar que la población acceda a servicios educativos que cumplan estándares sectoriales.	En esta Institución Educativa se ha programado 11 actividades y se ejecutó las 11 actividades.	El proyecto de Mejoramiento del Servicio Educativo se encuentra paralizado según la Carta N° 214-2024-CONSORCIO SAN ANTONIO/R.L del 04 de noviembre de 2024.	Se está exigiendo a los contratistas que levantan sus observaciones a fin de dar solución, para el reinicio de obra.
4. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO.	Culminar al 100% la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 34152 MARCELIANO RIOS.	En esta Institución Educativa se ha programado 11 actividades y se ejecutó las 11 actividades.	Inadecuadas condiciones para la prestación del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 34152 Marceliano Ríos Bianchi del Distrito de Vilcabamba - Daniel A. Carrión - Pasco.	El Gobierno Regional de Pasco (GOREPA), brindar adecuadas condiciones de habitabilidad para la prestación de los servicios para los alumnos.
5. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 34378 DEL CENTRO POBLADO CENTRO ESPERANZA, DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE	Se cuenta con los recursos financieros para la construcción e implementación de la infraestructura. - La DREP y UGEL considera dentro de su programa de operación y de	En esta Institución Educativa se ha programado 1 actividades y se ejecutó las 1 actividades.	En el II Semestres del 2024, no se ejecutó dicha obra.	En el ejercicio fiscal se considera para dicha ejecución.



GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

 C.P.C.D. **OSYR LOPE BERNLY**

 ASISTENTE GENERAL ADMINISTRATIVO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

 Ing. **Leonel BENITES DIEGO**

 SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS

PASCO.	mantenimiento de la I.E. Primario N° 34378.			
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna

Cuadro 2:

Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.01	SERVICIO EDUCATIVO CON ACCESO PARA LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS.	05	05	100
2435513	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	10	10	100
23011516	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 31 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON DISEÑO ARQUITECTONICO BIOQUIMATICO EN LA URBANIZACION SAN JUAN, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO- PASCO.	12	12	100
2234723	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N° 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA-PASCO.	11	11	100
2282203	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALODES CARRION-PASCO.	11	11	100
2319255	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 34378 DEL CENTRO POBLADO CENTRO ESPERANZA, DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO DE PASCO.	01	01	100

- 1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
- 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
- 3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

Cuadro 3:

Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.01	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS	0	0	05	0	0
10.04	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS	0	0	05	0	0

- 1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
- 2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
- 3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que están activas
- 4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
- 5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

UNIDOS GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN Y OBRAS
[Firma]
C.P.G.C. Reyna LOPE BERNUY
ASISTENTE GENERAL ADMINISTRATIVO

UNIDOS GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
[Firma]
Ing. Leonel BENITES DIEGO
SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS

- i. *Determine las principales modificaciones realizadas en el POI de la UO relacionadas a la AEI (considere la creación, inactivación, modificación de metas de las AO entre otros, durante la etapa de ejecución del POI).*

En el Plan Operativo Institucional no hubo modificaciones de metas de las Actividades operativas entre otros durante la ejecución, se creó cinco (05) actividades y los cinco apoyaron a la acción.

- ii. *Analice las principales causales de las modificaciones identificadas*

No se realizó modificaciones.

- iii. *Analice de qué manera las modificaciones identificadas afectan o afectarán a la implementación de la AEI.*

No se considera modificaciones, por tal motivo no hay argumentación.

2. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

- i. *Analizar la contribución de las AO e inversiones a la implementación de las AEI, para ello considere el o los productos en los que se hace concreto la AEI.*

El servicio educativo en la Educación se justifica en la necesidad que tiene los estudiantes, con resultados inicia las consecuencias de sus acciones, logros de meta para la preparación escolar, los resultados de aprendizaje, logros de aprendizaje adquiriendo los conocimientos y habilidades necesarios para avanzar en su desarrollo académico y profesional.

- ii. *Analice si son necesarios la formulación de AO adicionales a fin de mejorar la contribución de la UO a la implementación de la AEI.*

No son necesario crear actividad.

3. Recomendaciones

- Dentro de los proyectos de Educación podemos indicar con respecto a las paralizaciones, evitar realizando conciliaciones.
- Priorizar la ejecución de los proyectos sin retraso y costos alguno, prevenir oportunamente de los materiales necesario.

4. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.

- El contratista debe presentar sus valorizaciones oportunamente, para no devolución de presupuesto.
- Los supervisores deben exigir al contratista que deben cumplir en presentaciones sus valorizaciones oportunamente de acuerdo al contrato y de acuerdo a las normas vigentes.


5. CONCLUSION

- La ejecuciones de las obras debe ser supervisados para que la ejecución sea de acuerdo a lo programado y debe hacer cumplir de acuerdo al contrato y normas vigentes.

Cerro de Pasco, febrero del 2025

 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

C.P. UO. Reyna LOPE BERNUY
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Leonel BENITES DIEGO
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



**INFORME, EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2024**

000885- REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Ficha de implementación de la AEI.02.05

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACION DE PASCO

Correspondiente al Segundo Semestre del año 2024.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Cuadro N° 1

Código y nombre de UO		10.04 SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS		
Código y denominación de OEI		OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.		
Código y denominación de AEI		AEI.02.05 ATENCION INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACION DE PASCO.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	La obra debe dar atención de salud y cumpliendo los estándares mínimos y equipamiento para los servicios.	En la obra del Puesto de Salud, Nivel I-3 Chinche Tingo, se ha programado 01 actividad y se ha ejecutado 1.	En las condiciones Generales de diseño hubo modificación en el PUESTO DE SALUD CHINCHE TINGO.	Se debe basar al Decreto Supremo N° 010-2009 Vivienda
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO PUESTO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION-PASCO	Contribuye en mejorar el acceso y la capacidad resolutive de los servicios de salud.	En esta obra se ha programado 11 actividades, así mismo se ha ejecutado los 11.	Faltaba cableado de electrificación	Para dicho cableado debe proporcionar los materiales respectivos.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna

Cuadro 2:

Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.02.05	ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACION DE PASCO.	02	02	100
2194033	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	01	01	100

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS

Ing. Leonel BENITES DIEGO
SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS

C. P. CC. Reyna LOPE BERNUY
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
2198318	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO PUESTO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION-PASCO	11	11	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

Cuadro 3:

Modificaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.05	ATENCION INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACION DE PASCO	0	0	02	0	0
10.04	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS	0	0	02	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

i. Determine las principales modificaciones realizadas en el POI de la UO relacionadas a la AEI (considere la creación, inactivación, modificación de metas de las AO entre otros, durante la etapa de ejecución del POI).

En el Plan Operativo Institucional no hubo modificaciones de metas de las Actividades operativas entre otros durante la ejecución, se creó cinco (02) actividades y los dos apoyaron a la acción.

ii. Analice las principales causales de las modificaciones identificadas

No se realizó modificaciones.

iii. Analice de qué manera las modificaciones identificadas afectan o afectarán a la implementación de la AEI.

No se considera modificaciones, por tal motivo no hay argumentación.

2. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

i. Analizar la contribución de las AO e Inversiones a la implementación de las AEI, para ello considere el a los productos en los que se hace concreto la AEI.

Con la firma del contrato, se hará realidad la ejecución del puesto de Salud, Nivel I-3 Chinche Tingo.

ii. son necesarios la formulación de AO adicionales a fin de mejorar la contribución de la UO a la implementación de la AEI.

En este caso no tenemos adicionales de la actividad operativa, por cuanto no hay argumento.

3. Recomendaciones.

Se recomienda a los hospitales que deben atenderse a la población en cuando funciona, con los profesionales competentes.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 C. P. C. Reyna LUPE BERNUY
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 Ing. Leonel BENITES DÍAZ
 SUB GERENTE DE INVERSIÓN

4. **Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.**

A los contratistas deben exigir para la presentación oportuna de sus valorizaciones de acuerdo a su cronograma.

5. **CONCLUSION:**

La ejecución de las obras deben exigirse que se cumplan de acuerdo a su cronograma, la recepción de los proyectos deben ser de acuerdo a los convenios.

Cerro de Pasco, febrero del 2025

 **GOBIERNO REGIONAL DE PASCO**
UNIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL
Reyna Lope Bernuy
C.P.C. Reyna LOPE BERNUY
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

 **Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO**
Ing. Leonel Benites
Ing. Leonel BENITES P. BGC
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN



**INFORME, EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2024**

000885- REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Ficha de implementación de la AEI.03.02

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA

Correspondiente al Segundo Semestre del año 2024.



1. RESUMEN EJECUTIVO

Cuadro N° 1

Código y nombre de UD		10.04 SUJB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS		
Código y denominación de OEI		OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACION		
Código y denominación de AEI		AEI.03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / Inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO.	En la presente actividad operativa es muy tedioso comentar que a la fecha no se ha podido dar solución a la fecha.	En la obra respectiva se inició la segunda etapa.	Se ha tenido que realizar licitación para tomar a los contratistas.	Se debe tomar a contratistas que son conocedores del tema para dar solución respectiva.
INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA SEPTIMA UNIDO SANTA FE DE AGUACHINI DEL DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO.	Este proyecto también es de las gestiones anteriores, que se debe evaluar y ya debe ser concluidos.	En la actualidad la obra se encuentra con otros supervisores.	Los supervisores actuales están realizando corte de obra, para seguir con la ejecución.	Es necesario la supervisión continua a fin de concluir dicha obra.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna

Cuadro 2:

Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.03.02	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA	02	02	100
2084815	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO.	11	11	100

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 C. F. C. Reyna LÓPEZ BENÍLY
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 Ing. Leonel BENITES DIEGO
 SU GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
2235359	INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA SEPTIMA UNIDO SANTA FE DE AGUACHINI DEL DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO.	08	08	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se contabilizan las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.



Cuadro 3:

Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.03.02	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA	0	0	02	0	0
10.04	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS	0	0	02	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

- i. *Determine las principales modificaciones realizadas en el POI de la UO relacionadas a la AEI (considere la creación, inactivación, modificación de metas de las AO entre otras, durante la etapa de ejecución del POI).*

Con respecto a la obra de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional e Integral de la EMAPA PASCO, para la segunda etapa, se licito a otros contratistas.

- ii. *Analice las principales causales de las modificaciones identificadas*

No se realizó modificaciones.

- iii. *Analice de qué manera las modificaciones identificadas afectan o afectarán a la implementación de la AEI.*

No se considera modificaciones, por tal motivo no hay argumentación.

2. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

- i. *Analizar la contribución de las AO e inversiones a la implementación de las AEI, para ello considere el o los productos en los que se hace concreto la AEI.*

En el presente proyecto tiene la finalidad de acceder a los servicios básicos de saneamiento, como agua potable.

- ii. *son necesarios la formulación de AO adicionales a fin de mejorar la contribución de la UO a la implementación de la AEI.*

En este caso no tenemos adicionales de la actividad operativa, por cuanto no hay argumento.

3. Recomendaciones

Se recomienda que se concluya los proyectos dando la facilidad a los pobladores para el consumo de agua tratadas.

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 C.P.CO. Reyna LOPE BERNUY
 AGENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 Ing. Leonel BERNITIS BIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS

4. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.

Que la contraloría de acuerdo a sus funciones de control concurrente debe hacer el seguimiento del proceso de licitación pública en lo que concierne en la obra de agua potable.

5. CONCLUSION


Desde el proceso de adjudicación de la obra hasta la culminación de la misma debe existir el seguimiento y control paralelo de parte de las entes fiscalizadoras, como son la OCI, Contraloría y los Concejeros Regionales.

Cerro de Pasco, febrero del 2025



Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

C. P. CC. Reyna LOPE BERINUY
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Leona BENITES DIEGO
SUI GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

**INFORME, EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2024**

000885- REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Ficha de implementación de la AEI.05.01

**SENSIBILIZACION DE LA CULTURA DE PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA
POBLACION EN EL DEPARTAMENTO.**

Correspondiente al Segundo Semestre del año 2024.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Cuadro N° 1

Código y nombre de UO		10.04 SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS		
Código y denominación de OEI		OEI.05. PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.		
Código y denominación de AEI		AEI.05.01 SENSIBILIZACION DE LA CULTURA DE PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRE EN LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	La Acción Estratégica Institucional de esta obra es de función pública y seguridad que defiere las condiciones de la población y gestión de riesgo y emergencia.	Garantiza la prestación continua de los servicios públicos a la población.	Certificaciones presupuestarias destiempo.	Certificaciones Presupuestarias oportuna.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna

Cuadro 2:

Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.05.01	SENSIBILIZACION DE LA CULTURA DE PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO.	01	01	100
2231959	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	03	03	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al

Unidad Ejecutora INSTITUCION DE PASCO
AL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS
Rosario
C.P. CC. Reyna LOPE RECINJY
AGENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Ing. Leonel BENTES DIEGO
SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS

primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

Cuadro 3:
Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.05.01	SENSIBILIZACION DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO.	0	0	01	0	0
10.04	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS	0	0	01	0	0

- 1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
 2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
 3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
 4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
 5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).



i. Determine las principales modificaciones realizadas en el POI de la UO relacionadas a la AEI (considere la creación, inactivación, modificación de metas de las AO entre otros, durante la etapa de ejecución del POI).

En el Plan Operativo Institucional no hubo modificaciones de metas de las Actividades operativas entre otros durante la ejecución, se creó uno (01) actividad.

ii. Analice las principales causales de las modificaciones identificadas

No se realizó modificaciones.

iii. Analice de qué manera las modificaciones identificadas afectan o afectarán a la implementación de la AEI.

No se considera modificaciones, por tal motivo no hay argumentación.

2. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

i. Analizar la contribución de las AO e inversiones a la implementación de las AEI, para ello considere el o los productos en los que se hace concreto la AEI.

La Actividad Operativa e inversión a la implementación de los Actividades Estratégicas Institucional se considera muy importante en esto de los huaycos y otros casos inoportunos.

ii. son necesarios la formulación de AO adicionales a fin de mejorar la contribución de la UO a la implementación de la AEI.

En este caso no tenemos adicionales de la actividad operativa, por cuanto no contamos con adicionales.

3. Recomendaciones

Que se debe implantar más proyectos para apoyar a las diferentes regiones dentro del departamento de Pasco para los años posteriores.

4. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.

Las medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la Actividad Estratégica Institucional en este proyecto deben tomarse con bastante responsabilidad, porque en estos tiempos de inundaciones se necesita apoyar a los pueblos afectados dentro de la Región. ser

5. CONCLUSION

Se deben cumplir con apoyo de emergencia en los riezos y desastre en las zonas afectadas de emergencia.

Cerro de Pasco, febrero del 2025

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 SECRETARÍA REGIONAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
 C.P.C.C. Reyna LOPE BERNALI
 ASISTENTE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 Ing. Leonel BENTES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS

**INFORME, EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2024**

000885- REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Ficha de implementación de la AEI.06.01

REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACION

Correspondiente al Segundo Semestre del año 2024.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Cuadro N° 1

Código y nombre de UO		10.04 SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS		
Código y denominación de OEI.06		OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO		
Código y denominación de AEI.06.01		AEI.06.01 REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACION		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA	Esta obra apoya en los traslados de sus materiales a los pobladores.	Con respecto a la situación actual se ha programado 02 actividades y se ha ejecutado 02	A la fecha la obra no se concluye por clima.	Se ha programado remitir las ejecuciones en cuanto calma la lluvia.
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VEONAL TRAMO: MAJONTINI-VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ- PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	Mejora la transpirabilidad vehicular de la carreta Majontini.	La situación actual programado 9 y del mismo modo se ejecutó 9.	La obra fue suspendida por falta de pago de la Valorización.	Se debió solicitar con anticipación la Certificación de Crédito Presupuestaria.
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA HUACHON, PROVINCIA PASCO - REGION PASCO	Nace la necesidad de construir una carretera con las condiciones necesarias.	En esta obra se ha programado 11 Actividades y se ha ejecutado las 11 actividades.	La obra fue paralizada por falta de presupuesto.	Se solicita la Certificación Presupuestal.
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA, DISTRITO DE CHONTABAMBA- OXAPAMPA - PASCO.	Con dicho circuito vial favorece a la población de Chontabamba.	En este proyecto se ha considerado 07 Actividad y 07 se ha ejecutado.	Estos proyectos apoyan con el circuito vial para el traslado de la población.	Se solicita apoyo en el mantenimiento para que se puedan conservar.
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE-18 (DV.UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCOCUCHUMARCA-GORINA ALTA- HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACOCHA - CERRO DE PASCO- EMP. PE 3N-(DV CERRO DE PASCO) PROVINCIA DANIEL CARBON Y PASCO, DPTO. PASCO	Con este proyecto reduce el costo, tiempo e inseguridad en el transporte.	En la presente obra se ha programado 11 Actividades y se ha ejecutado las 11 actividades.	En la presente obra apoyan a realizar a la mejora de transpirabilidad vehicular.	para ello es necesario estar en constante mantenimiento de los lodos y/o caída de piedras en los huacos.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados que impiden el cumplimiento de la AEI y la situación descrita en la columna

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
Ruane
C.P. DR. Reyna LOPE BERNUY
PRESIDENTE COMITÉ ADMINISTRATIVO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
Ing. Leonel BENITES DIEGO
SU GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS



Cuadro 2:
Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.06.01	REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACION	05	05	100
2030472	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA	02	02	100
2334696	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO: MAJONTINI-VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	09	09	100
2173359	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA HUACHON, PROVINCIA PASCO – REGION PASCO	11	11	100
2234619	MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA, DISTRITO DE CHONTABAMBA- OXAPAMPA – PASCO.	07	07	100
2234342	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE-18 (DV.UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCOCO- UCHUMARCA-BORINA ALTA- HUANGUR YURAC HUANCA – QUIULACOOHA –CERRO DE PASCO EMP. PE 3N-(DV CERRO DE PASCO) PROVINCIA DANIEL CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO PASCO.	11	11	100



- 1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
 3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

Cuadro 3:
Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO Inactiva das	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.06.01	REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACION	0	0	05	0	0
10.04	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS	0	0	05	0	0

- 1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
 2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
 3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
 4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
 5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

i. Determine las principales modificaciones realizadas en el POI de la UO relacionadas a la AEI (considere la creación, inactivación, modificación de metas de las AO entre otros, durante la etapa de ejecución del POI).

En el Plan Operativo Institucional no hubo modificaciones de metas de las Actividades operativas entre otros durante la ejecución, se creó cinco (05) actividades y los (5) apoyaron a la acción.

ii. Analice las principales causales de las modificaciones identificadas

No se realizó modificaciones.

iii. Analice de qué manera las modificaciones identificadas afectan o afectarán a la implementación de la AEI.

No se considera modificaciones, por tal motivo no hay argumentación.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 C. P.C.C. Heyna LOPE BERNLIV
 ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 Ing. Leonel BENITES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS

2. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

i. *Analizar la contribución de las AO e inversiones a la implementación de las AEI, para ello considere el o los productos en los que se hace concreto la AEI.*

Con este proyecto reduce el costo, tiempo e inseguridad en el transporte, también apoyan a realizar a la mejora de transpirabilidad vehicular.

ii. *son necesarios la formulación de AO adicionales a fin de mejorar la contribución de la UO a la implementación de la AEI.*

En este caso no tenemos adicionales de la actividad operativa, por cuanto no hay argumento.

3. Recomendaciones:

Se recomienda que la vía de acceso debe ser de supervisión y mantenimiento para la transitor permanente y normal.



4. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.

Las ejecuciones de los proyectos deben ser realizadas conforme a las normas establecidas por el OSE, de acuerdo a los contratos realizados y debe ser valorizados de acuerdo a su cronograma de ejecución.

5. CONCLUSION

El proyecto de carretera debe ser recepcionadas de acuerdo a lo establecidos en los convenios realizados entre el contratista y la institución.

Cerro de Pasco, febrero del 2025


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
C.P.C.C. Reyna LOPE BERNUY
PUNTO CONTABLE ADMINISTRATIVO


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Ing. Leonel BENITES DIEGO
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

**INFORME, EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2024**

000885- REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Ficha de implementación de la AEI.09.03

**GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL
DEPARTAMENTO DE PASCO,**

Correspondiente al Segundo Semestre del año 2024.



1. RESUMEN EJECUTIVO

Cuadro N° 1

Código y nombre de UO		10.04 SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS		
Código y denominación de OEI.09		OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.		
Código y denominación de AEI.09.03		AEI.09.03 GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.		
AO / Inversiones dave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / Inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURADE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO, GERMAN GUZMAN GONZALES, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO.	La presente obra beneficia a los ciudadanos con respecto a salud, brinda adecuada condiciones de habitabilidad.	El Hospital Ernesto German Gonzales se ha programado 11 actividades y se ha concluido las 11 actividades.	La demora en su entrega de la obra, pero ahora ya tenemos como se va en la fotografía.	Debe supervisarse para su ejecución y evitar la demora en dicha ejecución.
MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO, DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA.	Brindar atención integral de salud con calidad y eficiencia para prevenir enfermedades y reducir la morbilidad	En el Hospital Román Egoavil, Pando se ha programado 11 actividades y los 11 fueron ejecutados.	La contaminación ambiental, la inaccesibilidad a servicios de agua y desagüe.	Solicitar a los pobladores que deben ver este caso en forma general con la población para solicitar para abastecer con el líquido elemento.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO, DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA – DEPARTAMENTO DE PASCO.	Mejorar el servicio de la atención en las diferentes postas médicas que componen la Micro Red Pozuzo.	En este Puesto de Salud Micro Red Pozuzo se ha programado 11 actividades y se ha ejecutado las 11 actividades.	Los puestos de salud carecen de los servicios adecuados para la atención al público.	Se requiere más Puestos de Salud, con personal profesional para su atención al público.
SUPERVISAR Y CONTROL DE OBRAS	En esta acción Estratégico ha contribuido para la gestión administrativa en la Sub Gerencia de Supervisión de Obra.	En esta actividad de SUPERVISAR Y CONTROL DE OBRA se ha programado 12 actividades y se ejecutó los 12.	Hemos tenido mucha dificultad porque nos han asignaron un Techo presupuestal muy infimo.	Incremento de presupuesto y/o Techo Presupuestal.
INSTALACION DE AULA PREFABRICADA EN LA I.E. BILINGUE MIGUEL GRAU EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENAVENTURA, DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA – DEPARTAMENTO DE PASCO.	A solicitud de la población de Puerto Bermúdez, se efectuó la realización de los trámites pertinentes.	Esta actividad se consideró en el mes de setiembre, programado 01 actividad y no se ejecutó.	En la I. E. "Miguel Grau" del nivel secundaria se viene incremento de la población estudiantil en los 5 grados donde no cuenta, con la suficiente cantidad de aulas.	Que se cumple lo solicitado por ser de necesidad para los alumnos de la I. E. "Miguel Grau" de Puerto Bermúdez.

Comité de Supervisión de Obras
C. P. CC. Reyna LOPE BERNIUY
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Ing. Leonel BENITES DIEGO
SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS

PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) VILLA RICA.	Para mantenimiento de Funcionamiento de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales (PETAR)	En esta actividad del (PETAR), se ha programado 12 actividades y se ejecutó 3 actividades.	No se ha concluido por falta de presupuesto, nos recortó dicho presupuesto en el mes de noviembre del 2024.	Se solicita que nos asigne dicho presupuesto que no abonaron.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye, Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna E.



Cuadro 2:
Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.09.03	GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.	06	06	100
2198319	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURADE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO, GERMAN GUZMAN GONZALES, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO.	11	11	100
2157301	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO, DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA.	11	11	100
2232331	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZLUZO, DISTRITO DE POZLUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO.	11	11	100
3999999	SUPERVISAR Y CONTROL DE OBRAS	12	12	100
3999999	INSTALACION DE AULA PREFABRICADA EN LA I.E. BILINGUE MIGUEL GRAU EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENAVENTURA, DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO.	01	0	0
3999999	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) VILLA RICA.	12	3	25

- 1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
- 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
- 3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

Cuadro 3:
Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.09.03	GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.	0	0	06	0	2
10.04	SUB GERENCIA DE SUPERVICION DE OBRAS	0	0	06	0	2

Unidad GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

C.P. CC. Reyna LOPE BERNAL
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

Unidad GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Leonel BENITES DIEGO
SUB GERENTE DE SUPERVICION DE OBRAS

- 1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
- 2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
- 3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
- 4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
- 5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

i. Determine las principales modificaciones realizadas en el POI de la UO relacionadas a la AEI (considere la creación, inactivación, modificación de metas de las AO entre otros, durante la etapa de ejecución del POI).

En la Acción Estratégica Institucional se ha considerado seis (06) actividades, dentro de ella se ha modificado dos (02) actividades.

ii. Analice las principales causales de las modificaciones identificadas

En el Plan Operativo Institucional de la UO de la Sub Gerencia de Supervisión de Obras si hubo modificaciones por dos motivos: uno por necesidad de ambientes y el otro fue por el tratamiento de aguas residuales.

iii. Analice de qué manera las modificaciones identificadas afectan o afectarán a la implementación de la AEI.

Afectan a la implementación de la Acciones Estratégicas la falta y prioridad del presupuesto para realizar lo considerado en la Actividad Operativa.

2. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

i. Analizar la contribución de las AO e inversiones a la implementación de las AEI, para ello considere el o los productos en las que se hace concreto la AEI.

➤ Con respecto a los Hospitales dan facilidades de servicio de la atención a los usuarios en los diferentes hospitales de la región.

ii. son necesarios la formulación de AO adicionales a fin de mejorar la contribución de la UO a la implementación de la AEI.

Si son necesario la Actividad Operativa a fin de mejorar de la unidad operativa.

3. Recomendaciones

Se recomienda que toda ejecución de proyectos debe ser supervisado en el tiempo programado en bien de la población.

4. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.

Como medidas correctivas pueda indicar que debe supervisarse todos los proyectos que sean ejecutados en el tiempo programado.

5 CONCLUSION

Para la que se pueda concluir a cabalidad los proyectos también debe participar los entes respectivos: así como DCI, las Concejeros.

Cerro de Pasco, febrero del 2025

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

 S. P. CC. Reyna LOPE BERNUY
 JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

 Ing. Leonel BENITES DIEGO
 SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



Unidos
para Avanzar

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES



VALIDACION DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNO REGIONALES
 PLEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
 UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
 CC: 10.05 - SUB GERENCIA LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Estado: **Final** **Final**

miércoles, 19 de febrero de 2025

Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	MAY DE	JUN DE	JUL DE	AGO DE	SEPT DE	OCT DE	NOV DE	DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO
02.09.03	II FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	4.00	2.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	36.00
	PROGRAMADO	4.00	2.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	36.00
	EJECUTADO	4.00	2.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	36.00
	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
	EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
	PROGRAMADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	PROGRAMADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	PROGRAMADO	4.00	2.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	28.00
	EJECUTADO	4.00	2.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	28.00

ACTIVIDADES OPERATIVAS (Ejecución física)	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AO EN EJECUCIÓN	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA
Acciones Estratégicas	1	1	0	0
Actividades Operativas (Ejecución física)	1	1	0	0
TOTAL	2	2	0	0



NOTA:
 (1) Formas parte del reporte solo las AO activas y con estado físico en ejecución o en estado "aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
 (2) La columna AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA, muestra los valores que dependen de la información de la columna 1990 DE SUBGERENCIA.
 (3) El % en "Avance Acumulado" muestra los valores de: Avance a Ejecución.

- (1) Si es "Acumulada Mensual" se suma el último valor mayor a uno de estos a excepción:
- (1) Si es "No acumulada" se muestra el valor ingresado como total anual.
- (2) Las rubros de la columna **ANEXOS AJUSTADOS** dependiente de su configuración en **TRM DE ACTIVACION**:
- (1) Si es "Acumulada Anual" o "Acumulada Mensual" se calcula como **Reposición acumulada / programación acumulada * 100**
- (2) Si es "No acumulada", como el promedio de (1) y (2) de cada mes desde enero a diciembre. Considerada solo a los 40 días de programación del mes y 10.
- (3) Para todos los casos, **mostrar "S.C."** si falta registro el porcentaje es **alguna vez más plazo entre enero y diciembre** ya lista recibida.
- (4) La regla "S.C." significa **aproximadamente igual**. Se presenta en 40 con registros de seguimiento solo en el mes de los meses que plazo ha recibido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (5) La regla "S.C." significa **programación y se presenta en 40 que tiene programación como en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.**
- (6) Los rubros de **REPOSICION FINANCIERA** son calculados como el promedio del **APORTE AJUSTADO** de cada mes.
- (7) Se calcula un valor calculado como **regimen en sus 40 días en "S.C."**
- (8) Los rubros en el promedio de **40 días "S.C."**
- (9) La regla de ejecución financiera mensual es calculado como el promedio de la ejecución financiera cada día.
- (10) La regla de ejecución financiera mensual es calculado como el promedio de la ejecución financiera de todos los 40 periodos mensuales en el año.
- (11) La regla de ejecución financiera mensual con el "TRM" es calculado como el promedio de la ejecución financiera de todos los 40 periodos mensuales en el año.



[Handwritten Signature]
Jorge Plas Berlanda



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

1. EVALUACION Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES(EXPEDIENTE TECNICO, SUPERVISION, EJECUCION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS) DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Se realizado en un 90% de Proyectos en Liquidar en sus diferentes Componentes (Expedientes técnico, Supervisión, Ejecución y gastos Administrativos) de proyectos de Inversión.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.09.03. GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:9002: ASIGNACIONES	PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO/ACTIVIDAD/ACCION	ACTIVIDAD 3999999 SIN PRODUCTO
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISION FUNCIONAL	001-PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL:	0005-PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000689-DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL
UNIDAD DE MEDIDA	001-ACCION
RUBRO	R.D (RECURSOS ORDINARIOS)
FUENTE FINANCIAMIENTO:	R.D (RECURSOS ORDINARIOS)
GENERICA DE GASTO:	5-25 OTROS GASTOS
ANTECEDENTES	Según el Artículo 85° del ROF-2017-GOREPA , la Sub Gerencia de Liquidación y Transferencia es encargada de liquidar y transferir las obras a los sectores correspondientes, para su mantenimiento y administración en cumplimiento a las normas técnicas y legales vigentes.
JUSTIFICACIÓN	Liquidación eficaz en todos los proyectos de inversión tanto técnica como financiera.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Realizar al 2024 45 Liquidaciones técnica y financiera (Expediente técnico, Supervisión, Ejecución y Gastos Administrativos).
INFORME TECNICO	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidación de proyectos antiguos y que tengan dificultades que no se resolvió en su momento. • Realizar la formulación y evaluación de proyectos que no contengan pre liquidación por parte de los contratistas. • Atención a la población en todas sus consultas.
RESULTADOS ALCANZADOS	Se realiza en el 2024 la culminación de 45 Liquidaciones técnica y financiera.
INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	S/. 360,000.00
ANEXO	POI




 Unidad GOBIERNO REGIONAL PASCO
 Silvia Daniela CARRERA COYOLA
 SUB GERENTE DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA


 Silvia Daniela Carrera

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

2. ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR

Se realizó la Transferencia de los Proyectos que la entidad del Gobierno Regional de Pasco como Unidad Ejecutora es la encargada de transferir los Proyectos física y financiera a la Unidad correspondiente como las entidades Municipalidades Distritales y Provinciales, esto sin Observaciones en la entrega del acervo documentario.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.09.03. GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO/ACTIVIDAD/ACCION	ACTIVIDAD 3999999 SIN PRODUCTO
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISION FUNCIONAL	004-PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL:	0005-PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000689-DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL
UNIDAD DE MEDIDA	001-ACCION
RUBRO	R.O (RECURSOS ORDINARIOS)
FUENTE FINANCIAMIENTO:	R.O (RECURSOS ORDINARIOS)
GENERICA DE GASTO:	5-25 OTROS GASTOS
ANTECEDENTES	Según el Artículo 85° del ROF-2017-GOREPA , la Sub Gerencia de Liquidación y Transferencia es encargada de liquidar y transferir las obras a los sectores correspondientes, para su mantenimiento y administración en cumplimiento a las normas técnicas y legales vigentes.
JUSTIFICACIÓN	Liquidación eficaz en todos los proyectos de inversión tanto técnica como financiera.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Se Realizó 3 Proyectos en proceso de Transferencia.
INFORME TECNICO	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la Transferencia del Proyecto tanto física como Financiera a la Unidad como Municipalidades Distritales y Provinciales. Se entrega el acervo documentario y este en regla y sin Observaciones .
RESULTADOS ALCANZADOS	Se realizo en el Segundo Semestre del 2024 la culminación de 3 Proyectos de Inversion en proceso de Transferencia.
INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	S/ 6,000.00
ANEXO	POI




 Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO
 Eivin Danilo CARRUJAS LOYOLA
 SUB GERENTE DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA (I)


 John Blas BELTRÁN

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

3. CIERRE DE PROYECTOS

Se realizado 16 Cierre de Proyectos en este Segundo semestre del 2024 en que no hubo dificultades en el momento del Cierre de los Proyectos en el Sistema del MEF.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.09.03. GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:9002: ASIGNACIONES	PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO/ACTIVIDAD/ACCION	ACTIVIDAD 3999999 SIN PRODUCTO
FUNCION:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISION FUNCIONAL	004-PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL:	0005-PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000689-DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL
UNIDAD DE MEDIDA	001-ACCION
RUBRO	R.O (RECURSOS ORDINARIOS)
FUENTE FINANCIAMIENTO:	R.O (RECURSOS ORDINARIOS)
GENERICA DE GASTO:	5-25 OTROS GASTOS
ANTECEDENTES	Según el Artículo 85° del ROF-2017-GOREPA , la Sub Gerencia de Liquidación y Transferencia es encargada de liquidar y transferir las obras a los sectores correspondientes, para su mantenimiento y administración en cumplimiento a las normas técnicas y legales vigentes.
JUSTIFICACIÓN	Liquidación eficaz en todos los proyectos de inversión tanto técnica como financiera.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Se Realizó 53 Proyectos en proceso de Cierre de Proyectos.
INFORME TECNICO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se elaboró Plan de trabajo de los Proyectos a Liquidar. ▪ Realizar la Transferencia del Proyecto tanto Física como Financiera a la Unidad para el proceso de Cierre de Proyectos.
RESULTADOS ALCANZADOS	Se realizo en el 2024 la culminacion de 45 Liquidaciones tecnica y financiera.
INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	S/3,900.00
ANEXO	POI



 **GOBIERNO REGIONAL PASCO**

[Signature]

Elmira Dávalos CARITUAZ LOYOLA
SUB GERENTE DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA (D)

[Signature]

Jorge Elva DEVALDES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

4. EVALUACION Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES(EXPEDIENTE TECNICO, SUPERVISION, EJECUCION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Se ha liquidado Técnica y Financiera 37 Proyectos en este último trimestre del año 2024 para esta etapa final de esta actividad realizada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.09.03. GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO/ACTIVIDAD/ACCION	ACTIVIDAD 3999999 SIN PRODUCTO
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISION FUNCIONAL	004-PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL:	0005-PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000689-DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL
UNIDAD DE MEDIDA	001-ACCION
RUBRO	R.O (RECURSOS ORDINARIOS)
FUENTE FINANCIAMIENTO:	R.O (RECURSOS ORDINARIOS)
GENERICA DE GASTO:	5-25 OTROS GASTOS
ANTECEDENTES	Según el Artículo 85° del ROF-2017-GOREPA, la Sub Gerencia de Liquidación y Transferenda es encargada de liquidar y transferir las obras a los sectores correspondientes, para su mantenimiento y administración en cumplimiento a las normas técnicas y legales vigentes. En este año 2023 se realizó la liquidación técnica y financiera de 25 proyectos de inversión.
JUSTIFICACIÓN	Liquidación eficaz en todos los proyectos de inversión tanto técnica como financiera.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Se ha realizado la liquidacion de Proyectos en el Segundo Semestre llegando a 90 % de lo programado.
INFORME TECNICO	<ul style="list-style-type: none"> Se ha realizado la formulación y evaluación de los proyectos. Realizar la Transferencia del Proyecto tanto Fisica como Financiera a la Unidad para el proceso de Cierre de Proyectos.
RESULTADOS ALCANZADOS	Se realizado en el segundo semestre del 2024 la culminacion de 51 liquidaciones tecnica financiera entre los diferentes componentes (expediente tecnico, Supervision , Ejecucion y Gastos Administrativos) de los Proyectos de Inversion.
INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	S/ 56,000.00
ANEXO	PCI



GOBIERNO REGIONAL PASCO
 Subgerencia de Liquidación y Transferencia (S)

John Blas Becerra

000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

**Ficha de implementación de la AEL.09.03:
GESTION DE LA INVERSION
PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO
DE LOS CIUDADANOS DEL
DEPARTAMENTO DE PASCO**



Correspondiente al segundo semestre del año 2024

febrero, 2025

1. RESUMEN EJECUTIVO

Cuadro N° 1

Código y nombre de UO		10.05 SUB GERENCIA LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA		
Código y denominación de OEI		OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO		
Código y denominación de AEI		AEI.09.03. GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar el cumplimiento (E)
AO100088500315-EVALUACION Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES (EXPEDIENTE TECNICO, SUPERVISION, EJECUCION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	Se realizado la Evaluación de los diferentes Componentes de los Proyectos de Inversión.	Cada comienzo de año se actualiza el SIAF MEF en que modifica las formas de analizar los comprobantes de pagos de los componentes de los diferentes proyectos de Inversión.	El factor importante es estar capacitado del Sistema SIGA y SIAF MEF.	Manejar el Sistema del MEF de forma correcta para hacer la Liquidación de los diferentes Componentes.
AO100088500027-EVALUACION Y/O ELABORACION DE LA LIQUIDACION DE OBRAS (ADMINISTRACION DIRECTA, CONTRATA Y CONVENIOS), LIQUIDACION DE CONSULTORIAS (EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISOR) PARA SER TRANSFERIDOS A SU SECTOR	Se ha realizado la evaluación y/o elaboración la Liquidación de Obras para ser transferidos al Sector correspondiente.	Se tiene que tener de conocimiento las Normas de Ejecución de Obras para realizar la Transferencia al Sector Correspondiente.	El proceso que para el cumplimiento es interpretar de forma adecuada las Normas de ejecución de OBRAS.	Conocimiento de las Normas del proceso de la Ejecución de Obras.
AO100088500028-ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	Se ha realizado la elaboración de Expedientes de las Obras Liquidadas para la Transferencia a Sector Correspondiente.	Se tiene los recursos de personal administrativo para armar los expedientes para la transferencia a las Obras Liquidadas para la transferencia al Sector correspondiente	El factor es lo recursos de personal administrativo adecuado para armar los expedientes.	Tener el personal administrativo adecuado.
AO100088500029-CIERRE DE PROYECTOS	Se ha realiza el Cierre del Proyecto en el Formato del MEF.	Se tiene los Sistematecnológico en su ingreso al Sistema del MEF en la versión actualizada.	El factor es que no se ingresa al Sistema del MEF en la versión actualizada.	Tener el apoyo de TIC para el servicio del Internet y entrara a la página del MEF.



De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

(A) Las AO e Inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
 (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
 (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
 (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
 (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna

Cuadro 2:
Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$		Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	
AEL09.03	GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	4	2	88%
AO100088500315	EVALUACION Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES (EXPEDIENTE TECNICO, SUPERVISION, EJECUCION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	49	45	91.84%
AO100088500027	EVALUACION Y/O ELABORACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRAS (ADMINISTRACION DIRECTA, CONTRATA Y CONVENIOS), LIQUIDACION DE CONSULTORIAS (EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISOR) PARA SER TRANSFERIDOS A SU SECTOR	5	3	60.00 %
AO100088500028	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	50	53	100.00%
AO100088500029	CIERRE DE PROYECTOS	60	62	100.00%



1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
 3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

Cuadro 3:
Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEL09.03	GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	4	3	0	0	0
10.05	SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA	4	3	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
 2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
 3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
 4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
 5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).



- i. *Determine las principales modificaciones realizadas en el POI de la UO relacionadas a la AEI (considere la creación, inactivación, modificación de metas de las AO entre otros, durante la etapa de ejecución del POI).*

AO100088500315-EVALUACION Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES (EXPEDIENTE TECNICO, SUPERVISION, EJECUCION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, existe modificaciones donde se viene garantizando su ejecución con ampliaciones presupuestales para ejecutar actividades de Evaluación y Liquidación de las Obras donde se ha ejecutado en el II Semestre del 2024 de S/360,000.00. En esta Actividad los gastos se tiene un Avance en la ejecución Física 91.84 % además está considerado en esta actividad los gastos de locación de Servicios del personal técnico y otros servicios.



- ii. *Analice las principales causas de las modificaciones identificadas*

Las Principales causas de las modificables es la necesidad de optimizar los niveles de recursos económicos para la Liquidaciones de las Obras asignadas para así satisfacer las necesidades prioritarias de la Poblacion Pasqueñas que será el desarrollo social.

- iii. *Analice de qué manera las modificaciones identificadas afectan o afectarán a la implementación de la AEI.*

Si afectara en cierto modo estas modificaciones, pero si se hace un plan de acción se afectará en un factor positivo en las necesidades de la Poblacion Pasqueña que quiere un Cierre del Proyecto de Inversión Publica y así continúe con un nuevo presupuesto para la continuación del Proyecto.

2. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

- i. *Analizar la contribución de las AO e inversiones a la implementación de las AEI, para ello considere el o los productos en los que se hace concreto la AEI.*

Se tiene estas creaciones de las Actividades Operativas a la Implementacion de las AEI en que se tiene que seguir un proceso o entregar un producto en el que el fin es la Liquidaciones de un proyecto de administración Directa y/o Contrata para el Bienestar de la Poblacion del Departamento de Pasco.



- ii. *Analice si son necesarios la formulación de AO adicionales a fin de mejorar la contribución de la UO a la implementación de la AEI*

Si es necesario la formulación de la Actividad Operativa adicionales a fin de mejorar la UO a la Implementacion de la AEI ya que producirá mejoras en este proceso a la Implementación de la AEI.

3. Recomendaciones

Se da cumplimiento al II Semestre a las Actividades Operativas programadas por la Sub Gerencia de Liquidaciones y Transferencia en que se alcanzó las metas programadas en el proceso de obras por Liquidación en forma física por A.E.I 09.03 de 88.00%.

4. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

Se tendría que hacer Medidas correctivas y preventivas para una mejora en la Implementación Anual de la AEI en que las AO deben contribuir hacia el fin de Gestión de la Inversión Pública eficiente en Beneficio de la Población de Pasco.

5. CONCLUSION

Se ha culminado con las liquidaciones de Obras y Transferencias programadas es así que se ha cumplido con los plazos programados a fin de cumplir con los objetivos Estratégicos de la Subgerencia de Liquidaciones y Transferencia.




 **GOBIERNO REGIONAL PASCO**

Elvin Danilo CARHUAZ LOYOLA
SUB GERENTE DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA (B)



Unidos
para Avanzar



GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO AMBIENTAL CALENDARIO AMBIENTAL

1. Generalidades:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.07 – MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.07.01. ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO:	3999999 SIN PRODUCTO.
ACTIVIDAD / ACCIÓN:	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA.
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISION FUNCIONAL	004 PLANIAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL:	0005 PLANIAMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000689 DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y REGIONAL
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME
RUBRO:	00 RECURSOS ORDINARIOS
FUENTE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
GENERICA DE GASTO:	26-23 BIENES Y SERVICIOS



2. ANTECEDENTES

El calendario ambiental peruano 2024 se publica cada año por el Ministerio del Ambiente, es una herramienta que permite a instituciones públicas y privadas, así como a organizaciones de la sociedad civil, organizar actividades ambientales en fechas conmemorativas priorizadas.

3. JUSTIFICACION

Para orientar y motivar a la ciudadanía a actuar responsablemente en favor de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Fomentar la conciencia pública respecto a la conservación y la protección de la diversidad biológica y demás recursos naturales, los recursos hídricos y la gestión integral del cambio climático y la calidad ambiental.

5. INFORME TECNICO

- Se realizó la Sensibilización a la población sobre un mayor respeto hacia la Naturaleza.
- se Fomento las actividades a desarrollarse del calendario ambiental.
- se Realizo las actividades del calendario ambiental con el personal del GORE Pasco.-
- Se realizó coordinación con otras identidades SUNASS OEFA ANA AMSAC MDY HMPP NEXA DIREPRO DREMh DIRESA DIRCETUR para realizar actividades de calendario ambiental



6. RESULTADOS ALCANZADOS

población consentida que se ve el orden y cuidado al medio ambiente.

Sensibilizar a las personas sobre las diferentes temas y problemáticas que atraviesa el mundo sobre la protección del medio ambiente.

7. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Descripción	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	DIC	TOTAL
Coffe break	S/ 2400.00						
servicio de coordinación administrativa		S/ 2000.00					
servicio de coordinación administrativa				S/ 3000.00			
TOTAL	S/ 2400.00	S/ 2000.00		S/3000.00			S/ 7400.00

8. ANEXO: Se incluye relación de asistencia técnica, informe de labores, panel de fotografías, otros.



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

1. GENERALIDADES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.07 – MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.07.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL – PROGRAMA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISION FUNCIONAL	004 PLANIAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL:	0005 PLANIAMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000689 DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y REGIONAL
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME
RUBRO	RECURSOS ORDINARIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS ORDINARIOS
GENERICA DE GASTOS	BIENES Y SERVICIOS



2. ANTECEDENTES

Mediante resolución de consejo directivo N° 004-2019-OEFA/CD, de fecha de 31 Enero 2019 se aprobó los lineamiento para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental – PLANEFA

3. JUSTIFICACION

Para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales y jurídica. El Numeral 5.1 del Artículo 6° del régimen común de fiscalización ambiental, aprobado por la resolución ministerial N° 247-2013-MINAM, establece que los planes anuales de fiscalización ambiental - PLANEFA, son los instrumentos de planificación a través de los cuales cada entidad de fiscalización ambiental - EFA programa las acciones a su cargo en materia de fiscalización ambiental a ser afectado durante el año fiscal, asimismo señala que el EFA tiene la obligación de formular, aprobar y reportar su PLANEFA

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados del GORE PASCO..

5. INFORME TECNICO

1. Informe de respuesta sobre denuncia ambientales
2. Desarrollar monitorios ambientales a las cuatro direcciones encargados de fiscalizar a sus administrados



3. Subir en la plataforma del OEFA cada trimestre de las cuatro direcciones DREMH, DIRESA, DIREPRO y DICERTUR.


7. RESULTADOS ALCANZADOS

Se cumplió con registrar los reportes en la plataforma OEFA AL 100%

Descripción	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
SCTR - SALUD	S/ 472.00	S/ 472.00	S/236.00	S/ 236.00	S/ 236.00	S/ 236.00	S/ 1888.00
SCTR - PENSION	S/ 366.00	S/ 488.00	S/244.00	S/244.00	S/244.00	S/244.00	S/1830.00
SERVICIO EDPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	S/2500.00	S/ 2500.00					S/ 5000.00
ASISTENTE AMBIENTAL.	S/ 1250.00	S/ 1250.00					S/ 2500.00
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA (P)		S/30000.00					S/ 3000.00
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA (C)							
VIATICOS)	S/ 580.00	S/ 580.00	S/1400.00	S/1060.00	S/ 340.00	S/1700.00	S/ 3960.00
TOTAL	S/ 5168.00	S/7710.00	S/1880.00	S/ 1540	S/ 820.00	S/ 2180.00	S/



ANEXO Se incluye relación de asistencia técnica, informe de labores panel de fotografías, otros.



Nombre de la Actividad: MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO DE REFORESTACION EN 42 COMUNIDADES - PASCO

1. Generalidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO	DEI.07 – MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.07.01 : ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL – PROGRAMA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	SIN PRODUCTO
FUNCION:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISION FUNCIONAL	004 PLANIAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL:	0005 PLANIAMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000889 DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y REGIONAL
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME
RUBRO:	00 RECURSOS ORDINARIOS



2. ANTECEDENTES

La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, viene ejecutando el proyecto "Reforestación con fines de Protección de Suelos en 42 Comunidades Campesinas de la Provincia de Pasco-Región Pasco", en la modalidad de administración directa, desde el año 2016, programado su culminación el año 2024

3. JUSTIFICACION

Se realiza con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento de las metas programadas, los cambios realizados y la eficiencia de la ejecución presupuestal, a través de la evaluación in situ y la entrevista a los trabajadores y beneficiarios del proyecto.

La información obtenida servirá para la toma de decisiones, así como para orientar a mejorar la eficiencia del proyecto en relación con sus objetivos y fines, además de promover una mayor eficiencia en el usos de los recursos asignados, el impacto y la sostenibilidad

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

- Evaluar y medir el resultado del avance de las metas del proyecto, a partir de la comparación entre el estado actual y el estado previsto planificadas en el expediente técnico (metas planeadas).

- Valorar el cumplimiento de los objetivos y los impactos basados en indicadores

5. INFORME TECNICO



1. Elaboración trimestral del plan operativo para la actividad de monitoreo y evaluación trimestral.
2. Monitoreo y evaluación mensual de la ejecución física del proyecto
3. Reunión de trabajo cada 2 meses, con los beneficiarios, funcionarios, ejecutores del proyecto
4. Informe técnico mensual de la actividad de monitoreo y evaluación realizada. 5. Memorial anual de la ejecución física y financiera del proyecto


6. RESULTADOS ALCANZADOS

Se cumplió los informes la memoria anual de la ejecución física y financiera del proyecto que consolida la información

Descripción	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Total							



Anexo

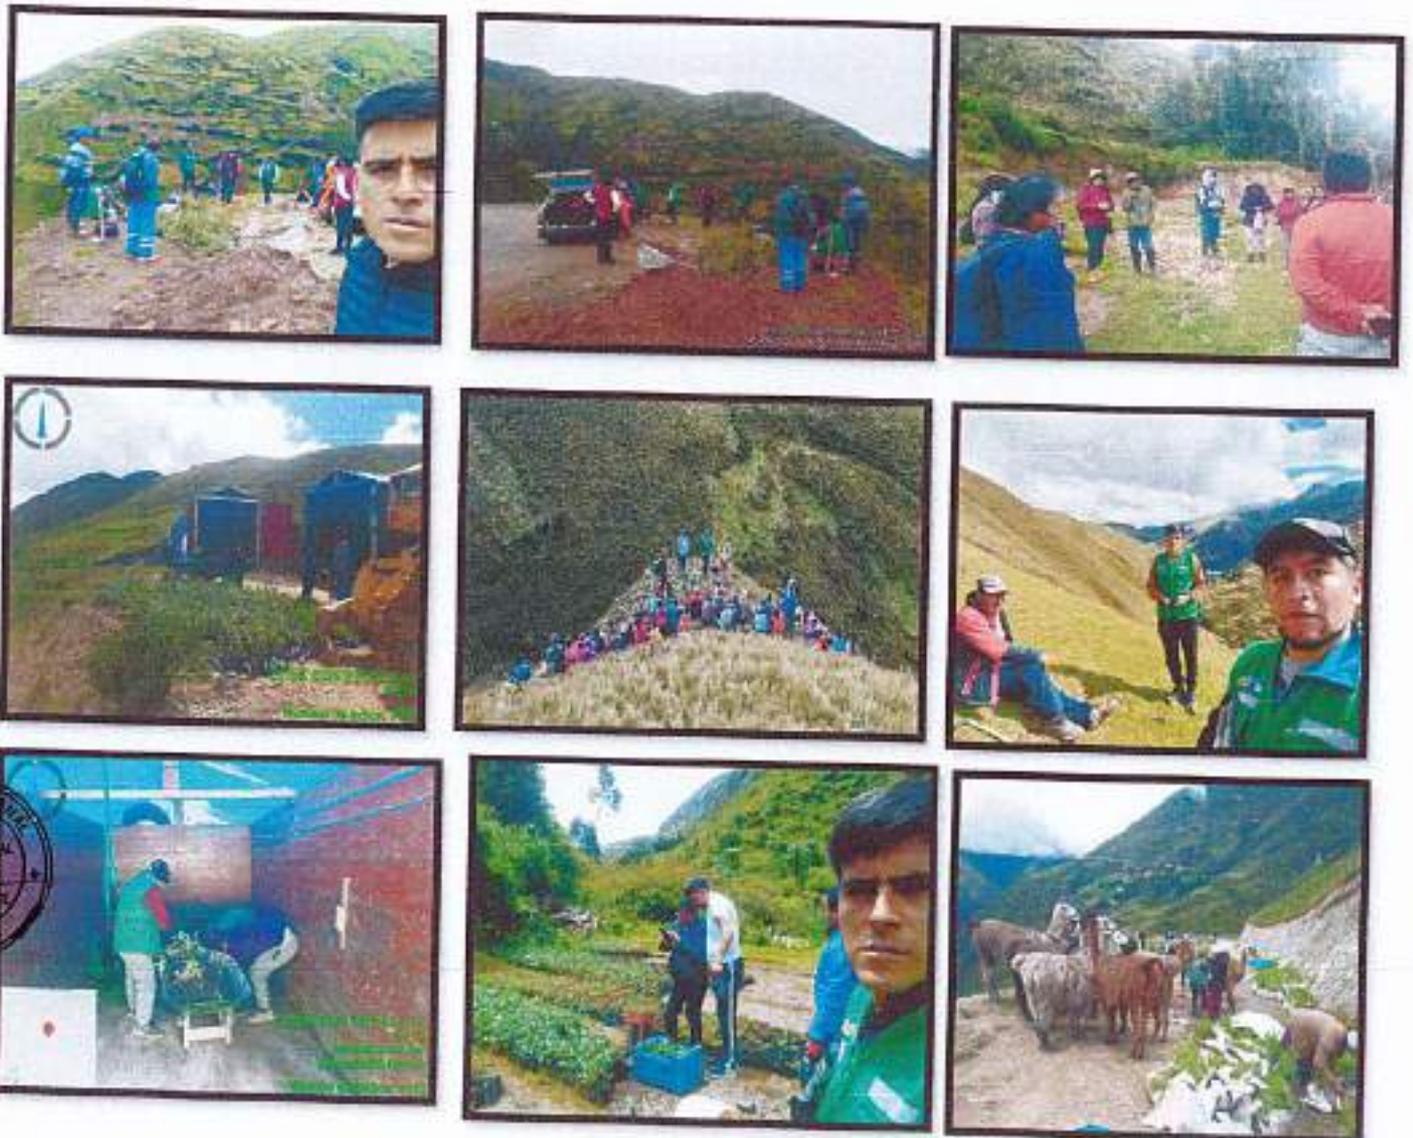

NOMBRE DE LA ACTIVADA: FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA REGIONAL DEL CAMBIO CLIMATICO

1. GENERALIDADES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.07 – MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.07.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL – PROGRAMA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISION FUNCIONAL	004 PLANIAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL:	0005 PLANIAMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000689 DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y REGIONAL
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME
RUBRO	RECURSOS ORDINARIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS ORDINARIOS
GENERICA DE GASTOS	BIENES Y SERVICIOS



2. ANTECEDENTES

Mediante Ordenanza Regional N° 259-2010-G.R. PAACO/CR, se aprobó la reestructuración de la Comisión Ambiental Regional Pasco (CAR-Pasco)

Mediante Ordenanza Regional N° 455-2020-G.R. PASCO/CR, se aprobó la actualización del Sistema Regional de Gestión Ambiental (SRGA) de Pasco.

Tras la reactivación de la CAR Pasco se procedió de su Reglamento, así como la elección de su presidente los mismos que a la fecha se encuentran vigente.

3. JUSTIFICACION

Las Comisiones Ambientales Regionales son las instancias de gestión ambiental encargadas de coordinar y concertar la Política Ambiental de sus jurisdicciones. Tienen la finalidad de promover el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado y la sociedad civil.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Promover el diálogo y el acuerdo entre los sectores público, privado y la sociedad civil para llevar la gestión ambiental a un nivel de eficacia real, y que resuelva los problemas ambientales que solo pueden ser enfrentados bajo mecanismos transectoriales y participativos

5. INFORME TECNICO

1. 03 taller participativos multiactor para elaborar el estudio del inventario de gases de efecto invernadero
2. Trabajo con ONG conservación internacional



3. Elaboración del planeamiento y saneamiento para la mitigación de datos de efecto invernadero

6. RESULTADOS ALCANZADOS

Se logro realizar el inventario de impacto invernadero.

Descripción	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC
Asistente ambiental					s/1,200.00	s/1,200.00
Viaticos	S/ 560.00	S/ 580.00	S/ 580.00			
TOTAL	S/ 560.00	S/ 580.00	S/ 580.00		S/ 1,200.00	S/1,200.00

7. ANEXO Se incluye relación de asistencia técnica, informe de labores panel de fotografías, otros.



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD BIOLOGICA (FLORA Y FAUNA)

1. Generalidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.07 – MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.07.01. ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES
PRODUCTO/ PROYECTO/	3999999
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISION FUNCIONAL	004 PLANIAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL:	0005 PLANIAMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000689 DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y REGIONAL
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME
RUBRO:	00 RECURSOS ORDINARIOS
FUENTE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
GENERICA DE GASTO:	26-23 BIENES Y SERVICIOS



2. ANTECEDENTES

La flora y la fauna del departamento de Pasco varían mucho por la diversidad de las regiones naturales presentes en nuestro territorio.

Éstas van desde las punas hasta la selva baja, pasando por todas las regiones intermedias. Esta diversidad de ambientes crea una gran variedad de ecosistemas que hacen del departamento una importante reserva natural, la que debe ser protegida para evitar su depredación. En las zonas alto andinas existen gramíneas y rodales de queñuales, pero en mayor variedad se encuentra el ichu, planta que sirve como forraje para los animales. En la región selva del departamento crecen diversos árboles madereros como moena, nogal, caoba, tomillo, cedro e ishpingo, utilizados en actividades extractivas.

La fauna, si bien no es muy numerosa, si es variada, pues en su territorio habitan animales andinos y selváticos. En las zonas de alta montaña es posible observar cóndores, pumas, venados y vizcachas. En la zona de ceja de selva, la diversidad aumenta considerablemente. Ronsocos, sachavacas, loros, añujes o agutles, armadillos, picuros, osos hormigueros, ardillas, etc. han hecho de este territorio su hábitat natural; y gracias a que esta parte del departamento es de difícil acceso, estos animales han podido desarrollarse sin ser perturbados por el hombre.

3. JUSTIFICACION

La biodiversidad contempla la riqueza biológica de todos los ecosistemas, especies y genes que nos rodean, y representa un factor crucial del patrimonio natural cuyos servicios eco sistémicos garantizan nuestro bienestar. Así, los diversos componentes eco sistémicos, sus interacciones y funciones favorecen una óptima calidad de vida, tanto individual como colectiva, asegurando servicios básicos de primera necesidad (agua potable, alimentos naturales, etc). Por tanto, la conservación y protección de



nuestra flora y fauna es proteger nuestra riqueza biológica es proteger nuestro legado a la Humanidad a las futuras generaciones.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Implementar acciones de conservación de fauna y flora amenazada, estas acciones se implementan con el fin de promover la conservación de especies que se encuentren en peligro de extinción.

5. INFORME TECNICO

- Se elaboro una línea base de datos
- Se realizo el inventario de la flora en la región Pasco
- Se realizo el inventario de la fauna en la región Pasco
- Talleres de fortalecimiento a las municipalidades


6. RESULTADOS ALCANZADOS

Planes de protección y conservaciones de la flora y fauna de nuestra región pasco

Descripción	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Asistente Técnico Ambiental	S/ 1,500.00						
TOTAL	S/ 1,500.00						



ANEXO. Se incluye relación de asistencia técnica, informe de labores panel de fotografías, otros.



Nombre de la Actividad: FORTALECIMIENTO DE LA CAR PASCO

1. Generalidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.07 – MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.07.01. ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO:	3999999 SIN PRODUCTO.
ACTIVIDAD / ACCIÓN:	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA.
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISION FUNCIONAL	004 PLANIAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL:	0005 PLANIAMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000689 DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y REGIONAL
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME
RUBRO:	00 RECURSOS ORDINARIOS
FUENTE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
GENERICA DE GASTO:	26-23 BIENES Y SERVICIOS



2. ANTECEDENTES

Mediante Ordenanza Regional N° 259-2010-G.R. PASCO/CR, se aprobó la reestructuración de la Comisión Ambiental Regional Pasco (CAR-Pasco).

Mediante Ordenanza Regional N° 455-2020-G.R. PASCO/CR, se aprobó la actualización del Sistema Regional de Gestión Ambiental (SRGA) de Pasco.

Tras la reactivación de la CAR Pasco se procedió con la aprobación de su Reglamento, así como la elección de su presidente los mismos que a la fecha se encuentran vigente.

3. JUSTIFICACION

Las Comisiones Ambientales Regionales son las instancias de gestión ambiental encargadas de coordinar y concertar la Política Ambiental de sus jurisdicciones. Tienen la finalidad de promover el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado y la sociedad civil.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Promover el diálogo y el acuerdo entre los sectores público, privado y la sociedad civil para llevar la gestión ambiental a un nivel de eficacia real, y que resuelva los problemas ambientales que solo pueden ser enfrentados bajo mecanismos transectoriales y participativos.

5. INFORME TECNICO

- 05 reuniones Ordinarias en el Marco de la Gestión Ambiental
- Fortalecimiento de Capacidades a los Grupos Técnicos

6. RESULTADOS ALCANZADOS

Avance en un 80% de la formulación de la política ambiental climática regional

7. RESULTADOS ALCANZADOS



Se cumplió con registrar los reportes en la plataforma OEFA AL 100%

Descripción	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC
SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERA AMBIENTAL			S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
SERVICIO DE IMPRESIÓN					S/ 3,700.00	
VIATICOS	S/ 480.00					
TOTAL			S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	S/ 6,200.00	S/ 2,500.00

ANEXO Se incluye relación de asistencia técnica, informe de labores panel de fotografías, otros.



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: MONITOREO Y SEGUIMIENYO DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA REGION DE PASCO

1. Generalidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE1.07 – MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI	AEI.07.01. ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO:	30009999 SIN PRODUCTO.
ACTIVIDAD / ACCIÓN:	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA.
FUNCIÓN:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISION FUNCIONAL	004 PLANIAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL:	0005 PLANIAMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	5000689 DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y REGIONAL
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME
RUBRO:	00 RECURSOS ORDINARIOS
FUENTE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
GENERICA DE GASTO:	26-23 BIENES Y SERVICIOS



2. ANTECEDENTES



Hasta la fecha, se refleja que la situación de la gestión y manejo de residuos sigue siendo crítica y prioritaria en su intervención, eso se refleja con mayor énfasis en la cantidad de municipios que no disponen de infraestructura de disposición final de residuos sólidos.

Lo anteriormente indicado, ha servido para que el Ministerio del Ambiente, tenga un mayor protagonismo en su intervención, a través de diversas acciones entre ellas: apoyando a los gobiernos locales en la búsqueda de financiamiento ante organismos internacionales, asistiendo técnicamente en el desarrollo de proyectos de inversión; en la generación de capacidades sobre manejo operativo de los residuos sólidos a funcionarios municipales, desarrollando y promoviendo instrumentos legales que ordenen el sector, apoyando la formalización del sector informal; entre otras líneas actividades, que permitan revertir la situación antes mencionada

3. JUSTIFICACION

Los resultados del presente plan permitirán dar un diagnóstico del estado situacional del manejo de residuos sólidos a nivel municipal, y la eficiencia de su accionar sobre cómo se maneja los residuos sólidos en las municipalidades distritales de la Región de Pasco.

4. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Realizar el monitoreo y seguimiento de cumplimiento de manejo de residuos solidos en la Región de Pasco

5. INFORME TECNICO

- Se realizo una reunión con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA y el equipo técnico del Gobierno Regional de Pasco para poder ver temas relacionados a la gestión de residuos sólidos
- Se realizo una reunión con las municipalidades provinciales con el fin de ver el estado situacional de la gestión de residuos sólidos
- Se realizo una reunión con el MINAM y el equipo técnico del Gobierno Regional para que ellos puedan dar capacitación, fortalecimiento de conocimientos a las municipalidades sobre temas de gestión de residuos sólidos.
- Se realizo la Asistencia Técnica en temas de Residuos Sólidos a través del Ministerio del Ambiente al personal de la Gerencia, Sub Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, funcionarios de las municipalidades provinciales y municipalidades distritales de la región de Pasco.

6. RESULTADOS ALCANZADOS

Se logro identificar el estado situacional de cada municipalidad distrital pertenecientes a la provincia de Oxapampa y Pasco para luego con ello tener una capacitación de fortalecimiento con el MINAM en temas de infraestructuras de disposición final de residuos sólidos y áreas degradadas por residuos sólidos que cuentan con plan de reconversión o recuperación.



Descripción	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC
TOTAL						



ANEXO Se incluye relación de asistencia técnica, informe de labores panel de fotografías, otros.

000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL



**Ficha de implementación de la
AEI.04.01: ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA CONSERVACIÓN DE
RECURSOS NATURALES EN
BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES**

Correspondiente al segundo semestre del año 2024

febrero, 2025

1. RESUMEN EJECUTIVO

Cuadro N° 1

Código y nombre de UO		GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		
Código y denominación de OEI		OEI.07 - MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO		
Código y denominación de AEI		AEI.07.01- ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / Inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00088500402: FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO AMBIENTAL	Realizar que la población interactúe reconozca y conserve los recursos naturales, a través de las actividades programadas dentro del GOREPA	Se Ha Programado 09 Informes Y Se Realizo 09 De Informes	Se tiene limitación económica	
AOI00088500414 : MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REFORESTACIÓN EN 42 COMUNIDADES - PASCO	medir el resultado del avance de las metas del proyecto, a partir de la comparación entre el estado actual y el estado previsto planificadas en el expediente técnico	Se Ha Programado 03 Informes Y Se Realizo 02 De Informes	Limitación, el proceso administrativo	Se recomienda hacer más fluido los documentos para acelerar las metas respectivas
AOI00088500415: FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA REGIONAL DEL CAMBIO CLIMATICO	Disminuir los gases de impacto efecto invernadero, en el departamento de Pasco	Se Ha Programado 04 Informes Y Se Realizo 04 De Informes		
AOI00088500416 : FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA (FLORA Y FAUNA	promover la conservación de especies que se encuentren en peligro de extinción.	Se Ha Programado 09 Informes Y Se Realizo 06 De Informes	Limitación económica	Se recomienda a todas la autoridades de la región de Pasco se realice más concientización para el cuidado de la (flora y fauna)
AOI00088500417 : FORTALECIMIENTO DE LA CAR PASCO	La incorporación concertación multisectorial en la que se realiza actividades de gestión ambiental y conflicto socioambientales,	Se Ha Programado 05 Informes Y Se Realizo 05 De Informes		
AOI00088500418 : MONITOREO Y SEGUIMIENYO DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REGION DE PASCO	Realizar el monitoreo y seguimiento de cumplimiento de manejo de residuos sólidos en la Región de Pasco	Se Ha Programado 01 Informes Y Se Realizo 01 De Informes		
AOI00088500419 :	Nos permite planificar las	Se Ha		



Código y nombre de AO	Descripción de acciones	Programa
FORTALECIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	acciones de fiscalización ambiental que se realizarán en un año, esto contribuye a la protección del ambiente y al cumplimiento de las obligaciones ambientales	Programado 20 Informes Y Se Realizo 20 De Informas

De manera integral, en base a la información anterior, ¿Cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

Por lo mencionado anteriormente, con la ejecución de las actividades lo que se busca es contribuir, concientizar a la población lo cual incide directamente en la implementación de la AEI 07.01 Asistencia Técnica Para La Conservación De Recursos Naturales En Beneficio De Las Instituciones

De acuerdo con lo que se tiene en las actividades se recomienda incrementar el presupuesto para llegar a los objetivos y metas trazadas ya que los recursos sostenibles son importantes dentro de la región de Pasco.

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna



Cuadro 2:
Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	Número de AO con		Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES	51	47	90.48%
AOI00088500402	FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO AMBIENTAL	9	9	100%
AOI00088500414	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REFORESTACIÓN EN 42 COMUNIDADES -PASCO	3	2	66.67%
AOI00088500415	FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA REGIONAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO	4	4	100%
AOI00088500416	FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA (FLORA Y FAUNA)	9	6	66.67%
AOI00088500417	LA INCORPORACIÓN CONCERTACIÓN MULTISECTORIAL EN LA QUE SE REALIZA ACTIVIDADES DE GESTIÓN ACTIVIDAD AMBIENTAL Y CONFLICTO SOCIOAMBIENTALES.	5	5	100%
AOI00088500418	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REGIÓN DE PASCO	1	1	100%
AOI00088500419	FORTALECIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	20	20	100%



1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.

AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

Cuadro 3:
Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO Inactiva das	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES	7	0	0	0	7
11.01	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	7	0	0	0	7

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).



- i. *Determine las principales modificaciones realizadas en el POI de la UO relacionadas a la AEI (considere la creación, inactivación, modificación de metas de las AO entre otros, durante la etapa de ejecución del POI).*

No se efectuaron modificaciones que afecten el desarrollo de las acciones estratégicas institucionales

- ii. *Analice las principales causales de las modificaciones identificadas*

No se cometieron modificaciones que afecten el desarrollo de las acciones estratégicas institucionales

- iii. *Analice de qué manera las modificaciones identificadas afectan o afectarán a la implementación de la AEI.*

No se realizaron modificaciones que afecten al desarrollo de las acciones estratégicas

2. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

- i. *Analizar la contribución de las AO e inversiones a la implementación de las AEI, para ello considere el o los productos en los que se hace concreto la AEI.*

Para realizar las actividades al 100%, se debe de contar más presupuesto para lograr las metas y objetivos trazadas, así mismo en el trámite documentario para agilizar los requerimientos obtenidos

- ii. *Analice si son necesarios la formulación de AO adicionales a fin de mejorar la contribución de la UO a la implementación de la AEI*

No son necesarios dentro de la Gerencia de Recursos Naturales

3. Recomendaciones



- Realizar mayor capacitación a instituciones públicas y privadas para concientizar a la población a nivel de toda la Región.
- contar con mayor presupuesto financiero y personal idóneo para realizar lo programado en las actividades durante el año.
- Fortalecer el seguimiento y monitoreo de las actividades programadas en cada año, así como la implementación de planes de mejora continua

4. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

- Contar con estrategia regional de biodiversidad biológica realizando la utilización de energía renovable,
- Evitar incendios forestales en diferentes puntos
- Proveer educación ambiental en diversas entidades públicas y/o privadas
- Proteger el ecosistema
- Una buena gestión de residuos sólidos



5. CONCLUSION

Se procedera con mayores coordinaciones dentro de la Gerencia de Recursos Naturales Gestion de Medio Ambiente, para el cumplimiento de las brechas, como cumplir al 100% según programación realizada dentro nuestra Gerencia.

