

ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4



MEMORIA ANUAL 2025

PROYECTO ESPECIAL HULLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO



MEJORAMIENTO I.E 0106 ALFONSO UGARTE

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Documento Nro: 4348666020-2026415867. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=1314dbdedc6beD4ce9Ja169r8ccd739bb90b&anex=4348666>

ÍNDICE

RESÚMEN EJECUTIVO

PRESENTACIÓN

CAPÍTULO I: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CAPÍTULO II: FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

CAPÍTULO III: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN

CAPÍTULO V: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ESTADOS FINANCIEROS

ANEXOS



RESÚMEN EJECUTIVO

El presente documento es de carácter público, cuya finalidad es dar a conocer a la población de San Martín los resultados y logros más relevantes de la gestión durante el año fiscal 2025 de los diferentes proyectos ejecutados por la Unidad Ejecutora 018 – Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (001263). Se presenta una estructura de cinco (05) capítulos, los cuales tienen el siguiente contenido:

Capítulo I.- El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; describe información general, creación, miembros del Consejo Directivo, Base Legal y Estructura Orgánica.

Capítulo II.- Fases del Proceso de Planeamiento, Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico

Capítulo III.- Lineamientos Estratégicos; descripción de la Visión Institucional, Misión Institucional, Componentes y Objetivos Estratégicos.

Capítulo IV.- Resultados de la gestión, se realiza la descripción de los logros obtenidos en los diferentes proyectos ejecutados, por los órganos de Línea, representado por las Direcciones que conforman el PEHCBM. Los Componentes se encuentran alineados a los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

Capítulo V.- Ejecución Presupuestal del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo en el año fiscal 2025, y los estados financieros.

Finalizando el documento presentamos el panel fotográfico ordenado de los principales proyectos en ejecución, actividades realizadas y otros, en cada uno de los componentes



PRESENTACIÓN

La Memoria Anual 2025, es un documento consolidado resultante de la sistematización de la información proporcionada y actividades oficiales, informadas por las Direcciones de Línea del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; con el objetivo de presentar y publicar los resultados de la gestión durante el año fiscal 2025, los mismos que están orientados al cumplimiento progresivo de las metas, objetivos y visión contemplados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado.

El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo ha consolidado y sistematizado la presente MEMORIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2025, dentro del Marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, teniendo en común alcanzar objetivos y metas planteadas de acuerdo a la visión Regional e Institucional, nuestras Autoridades, funcionarios, profesionales y técnicos han contribuido con su esfuerzo para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos del año 2025.

Es importante indicar que la gestión se ha orientado a realizar acciones concretas con el fin de lograr los Objetivos Estratégicos planteados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Estratégico Institucional, donde se definen componentes de acuerdo a los lineamientos que establece el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

En este contexto, de manera sistematizada y sintetizada, la Gerencia General de la Entidad, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, presenta este documento de carácter público donde se describe las ejecuciones de programas, proyectos actividades y presupuestos con sus respectivos resultados y logros durante el año fiscal 2025, finalmente presentamos los estados financieros al pliego; aspectos que ponemos a disposición de la sociedad regional y nacional en cumplimiento a la práctica de nuestros principios y valores.



CAPITULO I: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en adelante el PEHCBM, es la unidad ejecutora del Gobierno Regional de San Martín, según el Artículo 1º del MOP el PEHCBM es un organismo desconcentrado de ejecución del Pliego Gobierno Regional San Martín, cuya finalidad es contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región, con innovación, productividad y competitividad, mediante la ejecución de inversión pública y promoción de la inversión privada, con enfoque territorial y gestión de cuencas, cierre de brechas económico social, con transparencia, equidad y responsabilidad dentro de su ámbito geográfico de acción. Desarrolla sus actividades en las provincias de Tocache, Mariscal Cáceres, Bellavista, Picota, Huallaga, el Dorado, San Martín y Lamas del departamento de San Martín.

Dirección : Jr. Proyecto N° 347 –Tarapoto – San Martín
N° de RUC : 20148168955
Teléfonos : (042) 522508
Página Web : <http://www.pehcbm.gob.pe>

1.1.1. CREACIÓN

Mediante Decreto Ley N° 22517 del 01 de mayo del año 1979, se crea la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; con el encargo de ejecutar el Proyecto de Desarrollo de las Tierras de Ceja de Selva en el área de Huallaga Central y Bajo Mayo, en el departamento de San Martín.

Mediante Decreto Supremo N° 019-2007, a partir del 1 de abril del 2007 el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en el marco del proceso de descentralización, es transferido al Gobierno Regional de San Martín. Desde entonces venimos trabajando conforme a los lineamientos de desarrollo del Gobierno Regional en la búsqueda de la competitividad con inclusión social y sostenibilidad ambiental, manteniendo su autonomía técnica, económica y administrativa como unidad ejecutora; siendo su ámbito de aplicación las siguientes Provincias: Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, San Martín, El Dorado, Bellavista, Picota y Tocache, conforme a la demarcación política vigente.



1.2. MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2025



1.3. DIRECTORIO DEL PEHCBM 2025

	Ing. JAVIER SINTI FLORES Gerente General
	Ing. JHON ERICK RAMIREZ DEL CASTILLO Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	Abog. PIERYNA CHAVEZ RUIZ Oficina de Asesoría Jurídica
	Lic. LUIS AUGUSTO GARCIA MEZA Oficina de Administración
	ING. CESAR AUGUSTO CORAL RENGIFO Dirección de Gestión Ambiental
	ING. VICTOR HUGO PAREDES TENAZOA Dirección de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión Privada
	ING. OMAR JAVIER CAJO MARTINEZ Dirección de Infraestructura
	Ing. JITLER ULISES VALVERDE MONTOYA Dirección de Estudios de Inversiones



1.4. BASE LEGAL

- Decreto Ley N°22517 Creación del PEHCBM.
- Decreto Supremo N°044-2007-EF, que como Unidad Ejecutora del Pliego Gobierno Regional de San Martín al Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
- Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley N° 27867.
- La Constitución Política del Perú; Ley N°27680.
- Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902 y N° 28013, reconocen que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
- La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, establece que los Gobiernos Regionales tienen la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de sus competencias.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias
- Ley Marco del Presupuesto Participativo
- Ley N° 32185 de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025
- Ley N° 29785 Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política de Modernización.
- Directiva N° 002-2022-GRSM/GRPyP-SGDI, Normas y Procedimientos para la presentación de la Memoria Anual de Gestión Institucional del Gobierno Regional de San Martín.



1.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

01. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

01.1. Consejo Directivo

01.2. Gerencia General

02. ÓRGANOS DE CONTROL

02.1. Oficina de Control Institucional

03. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

03.1. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

03.1.1. Área de Planeamiento

03.1.1. Área de Presupuesto

03.2. Oficina de Asesoría Jurídica

04. ÓRGANO DE APOYO

04.1. Oficina de Administración

0.4.1.1 Área de Recursos Humanos

0.4.1.2 Área de Abastecimiento

0.4.1.3 Área de Contabilidad

0.4.1.4 Área de Tesorería

0.4.1.5 Área de Patrimonio

0.4.1.6 Área de Gestión Documental, Archivo y Atención al Ciudadano

0.4.1.7 Área de Tecnologías de Información

05. ÓRGANOS DE LINEA

0.5.1 Dirección de Estudios de Inversiones

0.5.1.1 Área de Maquinaria y Taller

0.5.2 Dirección de Infraestructura

0.5.2.1 Área de Ejecución y Supervisión de obras

0.5.2.2 Área de Liquidación de Obras

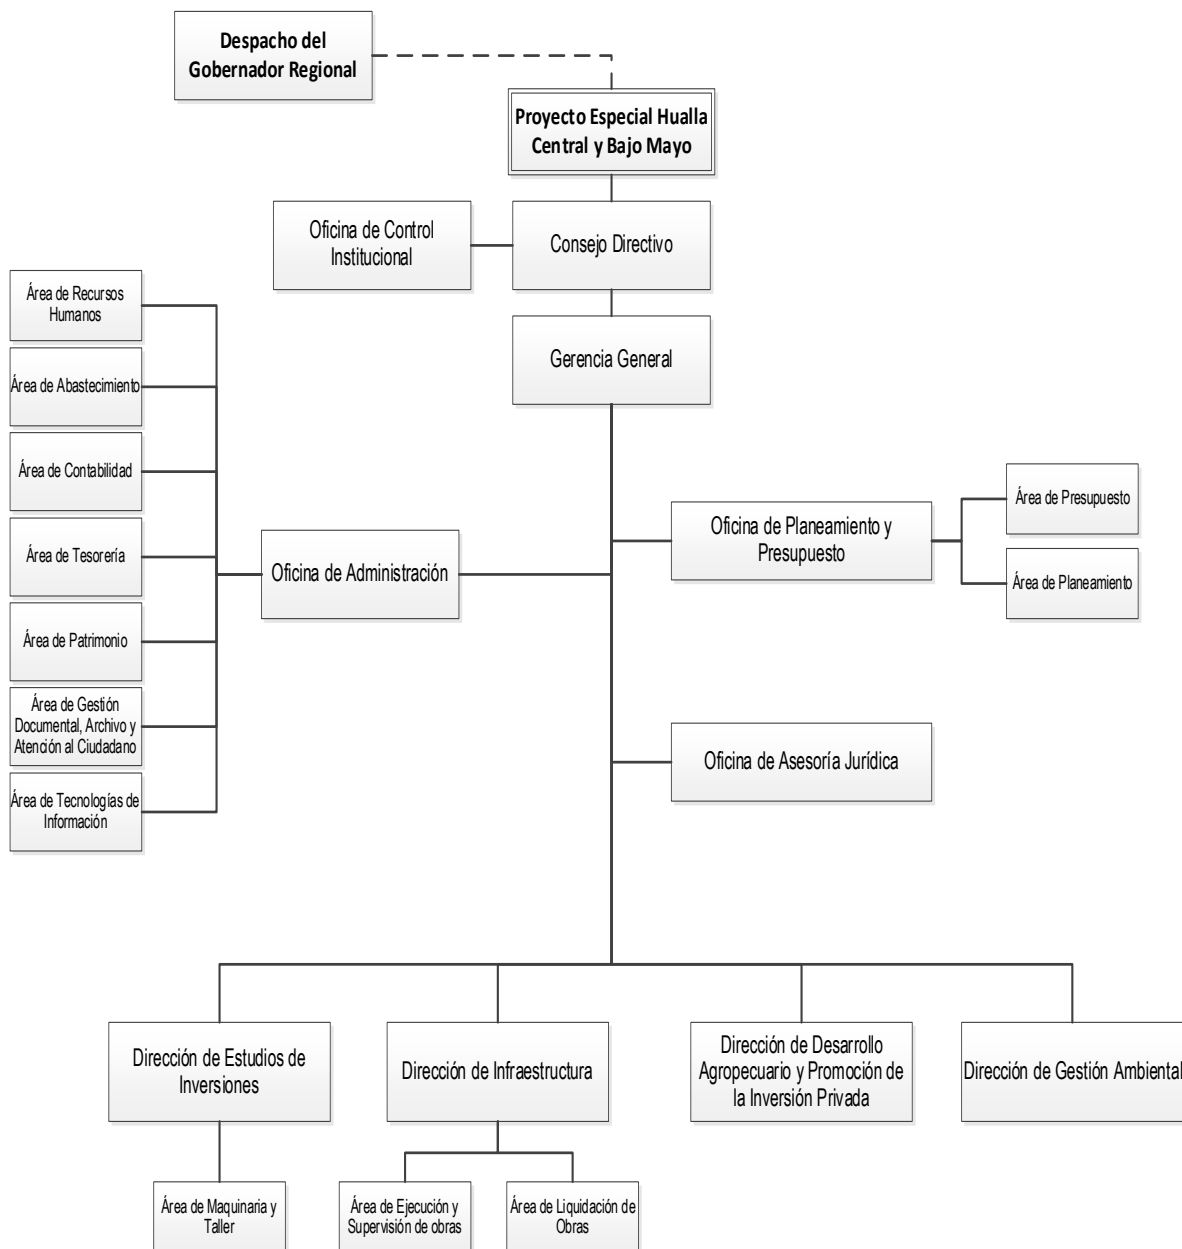
0.5.3 Dirección de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión Privada

0.5.4 Dirección de Gestión Ambiental



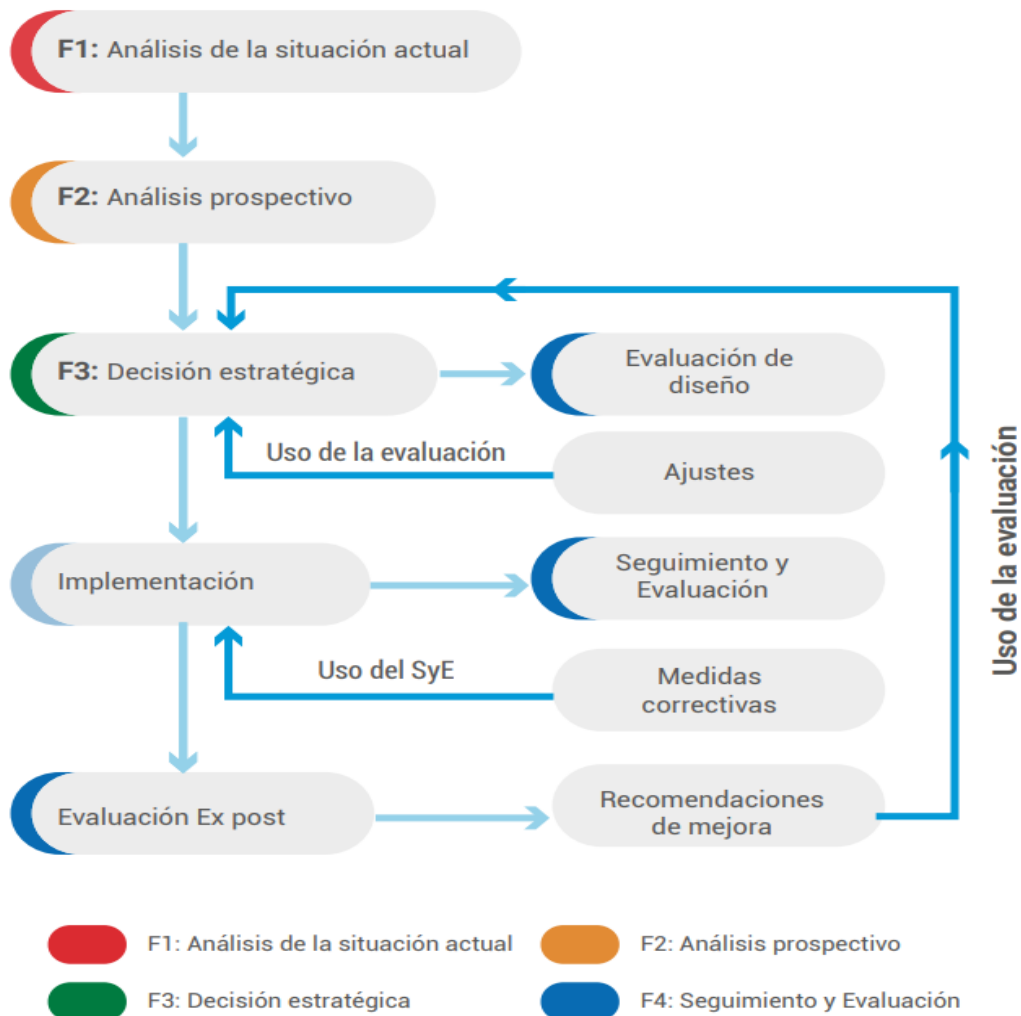
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo

Estructura Orgánica



CAPÍTULO II: FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Seguimiento y evaluación en el ciclo de planeamiento



Para la actualización de políticas y planes estratégicos, se aplica un ciclo compuesto por las cuatro fases siguientes:

Fase 1: Análisis de la situación actual

Se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar, mediante la caracterización y el diagnóstico de variables que definen la situación actual. Se describe el territorio, los recursos disponibles (físicos, ambientales, económicos, sociales, culturales), sus interrelaciones y las condiciones de vida de su población. Mediante el diagnóstico, se relevan los problemas, las necesidades y prioridades de la población; las brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos de calidad que deben ser cerradas para mejorar su calidad de vida; y las



intervenciones de actores que operan en el territorio (sector público, privado y sociedad civil). Mediante este análisis, se obtiene una imagen del territorio actual que reconoce y valora la diversidad de las realidades locales.

Fase 2: Análisis prospectivo

Se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se define la imagen del territorio deseado. El análisis de futuro identifica tendencias, oportunidades, riesgos, escenarios contextuales, escenarios disruptivos y alertas tempranas que podrían afectar, en forma positiva o negativa, la provisión de servicios y el bienestar de las personas. La imagen del territorio deseado representa una situación más favorable que la actual, factible de ser alcanzada en un periodo dado mediante la acción coordinada del Estado. Se construye de forma concertada, a partir del conocimiento integral de la realidad y el análisis de futuro.

Fase 3: Decisión estratégica

Se definen las políticas públicas, de forma articulada entre sectores y niveles de gobierno, orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado, a través de objetivos prioritarios y lineamientos. Las políticas se reflejan en planes con objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y acordes con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) y en acciones de orden estratégico priorizadas. Al actualizar los planes, se incluyen acciones de prevención de riesgo de desastres y evaluaciones de simulacros de eventos que podrían causar pérdidas en el bienestar de las personas (contingencias) y afectar el logro del futuro deseado.

Fase 4: Seguimiento y evaluación.

Se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, así como el uso de los recursos asignados con ese fin. Además, se analizan los cambios ocurridos en la vida de las personas (esperados o no esperados) y se generan informes periódicos que permiten identificar alternativas para mejorar políticas y planes, con respecto a su diseño o implementación, para el logro de los objetivos planteados. De esta manera, los informes de seguimiento y evaluación retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que está orientado a resultados favorables para el bienestar de las personas.



CAPITULO III: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN INSTITUCIONAL

VISIÓN INSTITUCIONAL

Al 2030, San Martín es modelo de región en bienestar social, competitividad y valoración de nuestros recursos naturales y diversidad. (PDRC SM AL 2030)

MISIÓN INSTITUCIONAL

Organizar y conducir la gestión pública regional promoviendo el desarrollo integral sostenible a través de la inversión pública y privada, el empleo, el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades en el departamento de San Martín, de manera íntegra, transparente, competitiva e inclusiva. (PEI 2024-2028)

MAPA DEL MODELO CONCEPTUAL SAN MARTÍN: COMPONENTES Y SUB COMPONENTES



CAPITULO IV: RESULTADOS DE GESTIÓN

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

RESULTADOS DE LA GESTIÓN PERIODO 2025

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 10 AGROPECUARIA

2134084 CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra	: 25 de enero del 2013
Fecha de Culminación Programada	: 31 de abril del 2014
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 15 de junio del 2014
Fecha de Transferencia Programada	: 9 de agosto del 2014
Avance Físico Acumulado al 2025	: 100%

El Proyecto beneficiará a 1,298 personas. El área del proyecto está ubicada en una zona pobre, la falta del recurso hídrico hace que no puedan tener mayores posibilidades de producción agrícola, debido a que cultivan al secano poniendo en riesgo los sembríos en un medio de altas temperaturas, debido a que están condicionados a la lluvia. La Infraestructura de Riego- Captación Construcción de Estructura de Captación en el Río Ponaza ubicado en el Km 42.00 de la carretera Picota , aguas arriba del centro poblado Alfonso Ugarte, que comprende la Estructura del barraje mixto (fijo y móvil) de concreto armado de 27.70 m ,bocal de captación de concreto armado ,con dos ventanas de captación , mecanismo de izaje y compuertas metálicas ,con una poza disipadora aguas abajo del barraje , un desarenador y un canal de aproximación con una longitud de 44.30 m, que permitirá captar permitirá asegurar el ingreso continuo de un caudal máximo de 2.60 m3/s, que permitirá cubrir la demanda de los cultivos. - Conducción Está conformado por un canal principal telescópico de sección trapezoidal revestida con fc 175 kg/cm2, con una longitud de 38.50 Km, presenta tres tramos: Tramo I del Km 0+000 al Km16+880, de capacidad de condición de 2.60 m3/ seg. y longitud de 16880 m, Tramo II del Km 18+155 al Km 27+910 de capacidad de 1.70 m3/seg.

EVALUACIÓN FINANCIERA (\$/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	65,000	65,000	100.00	Informe	3.000	3.000

Proyecto **culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 65,000** que significa el **100 %** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2025.



RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 15 TRASPORTE

2280937 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN.

Inicio de obra principal	: 24 de enero del 2010
Fecha de Culminación Programada de obra Principal	: 16 de julio del 2021
Inicio de Saldo de Obra	: 14 de diciembre del 2024
Fecha de Culminación de saldo de obra	: 11 de agosto del 2025
Avance Físico Acumulado al 2025	: 100.00%

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 6,229 personas; La población afectada esa conformada por las localidades Chazuta, Tununtunumba, LLucanayacu, Shilcayo, Túpac Amaru, Curiyacu los cuales al año 2,014 suman 6229 personas, actualmente dedicadas a la agricultura y ganadería. Los principales productos que se cultivan en la zona son: El Cacao, Maíz Amarillo Duro, Plátano, Yuca, Café y a la crianza de ganado vacuno, siendo actualmente el mercado de consumo la ciudad de Tarapoto y Yurimaguas su producción lo trasladan a través del río Huallaga hasta la localidad Chazuta y desde ahí en vehículos hasta la ciudad de Tarapoto y a la ciudad de Yurimaguas a través del Río Huallaga, el distrito de Chazuta según el mapa de pobreza distrital publicado por FONCODES se encuentra en el Quintil 1 mientras que para la cobertura de servicios básicos: población sin agua es de 88%, sin desagüe / letrinas es de 19%, sin electricidad es de 56 %, con respecto a la tasa de analfabetismo de mujeres es de 17%.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
6,315,004	9,688,304.00	9,671,296.42	99.82	kilómetro	19.95	19.95

Este Proyecto se encuentra en **culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 9,671,296.42** que significa el **99.82 %** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2025.

Con fecha 29/11/2024 se firmó el contrato N° 024-2024-GRSM-PEHCBM/PS para la ejecución del saldo de obra, con el consorcio ejecutor CURIYACU y el 05/12/2024 se firmó el contrato N° 027-2024-GRSM-PEHCBM/PS para la supervisión de la ejecución del saldo de obra, con el consorcio vial san Martín. Se encuentra recepcionada y con con R.D.N° 201-2025-GRSM-PEHCBM/DI por aprobación de liquidación de contrato de obra de fecha 10 del noviembre 2025 por un monto de s/ 11,700,449.19 y con R.D.N° 224-2025-GRSM-PEHCBM/DI por liquidación de supervisión de fecha 12 de diciembre 2025, por un monto de s/ 1,141.64 soles

2342702 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN

Inicio de obra principal	: 10 de mayo del 2022
Fecha de Culminación de obra Principal	: 14 de marzo del 2024
Inicio de Obra Complementaria	: 28 de diciembre del 2024



Fecha de Culminación de obras complementaria : 30 de abril del 2025
Avance Físico Acumulado a Dic 2025 : 100.00%

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 10,229 personas; El presente estudio nace ante por la necesidad de proveer una adecuada vía de transitabilidad de vehículos menores, así como mejorar las condiciones de habitabilidad y el uso adecuado de las áreas públicas; que se presentan entre las localidades de Santa Rosa, Santa Fe, limón, la primavera, Nuevo Chanchamayo, La Divisoria, El Ponal. Los habitantes de los centros poblados Santa Rosa, Santa Fe, limón, la primavera, Nuevo Chanchamayo, La Divisoria, El Ponal, pertenecen al distrito de Bajo Biavo, Provincia de Bellavista - San Martín. Desde hace mucho tiempo vienen sufriendo las fuertes crecidas de los ríos para poder acceder de un lugar a otro.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	1,615,936	1,615,934.10	100.00	kilómetro	15.912	15.912

Proyecto se encuentra en **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 1,615,934.10** que significa el **100 %** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2025.

Con fecha 05/11/2024 mediante RD N°111-2024-GRSM-PEHCBM/DEYP se aprueba el expediente técnico de obras complementarias del proyecto, por el monto de s/ 2,816,246.30 con IGV, y un plazo de ejecución de 90 días calendario. Con liquidación final del contrato de obras mediante resolución directoral N° 117-2025-GRSM-PEHCBM/DI, pendiente transferencia y cierre en el banco

2491462 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. (SALDO DE OBRA)

Inicio de Obra : 25 de noviembre del 2025
Fecha de Culminación Programada : 20 de junio del 2026
Avance Físico Acumulado al 2025 : 10.09%

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 1,450 personas; el proyecto facilitará en el transporte de pasajeros y productos para acceder a los mercados de San Martín y Lima y otros Mercados Locales, de manera que se logre mejorar las condiciones sociales y económicas de la población ubicada específicamente en el área de influencia del proyecto.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
1,511,742.00	2,674,157.00	2,674,156.37	100.00	kilómetro	0.1	0.1

Este Proyecto se encuentra en **ejecución física el saldo de obra** presentando una ejecución de gastos de **S/. 193,208.68** que significa el **100 %** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2025.

Con fecha 18/07/2024 fue suscrito el contrato N° 15-2024-GRSM-PEHCBM/PS para la elaboración del servicio de peritaje técnico – financiero y expediente técnico de saldo de obra. con fecha 25/11/2025 inicio la ejecución física del saldo de obra, tiene un avance físico acumulado de 10.09%



2492668 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. (SALDO DE OBRA)

Inicio de Obra : 18 de noviembre del 2025
Fecha de Culminación Programada : 16 de junio del 2026
Avance Físico Acumulado al 2025 : 6.79%

Cuenta con los siguientes componentes: A. COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO
Acción 01: Se realizarán trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 4.166 km, en la partida movimiento de tierras se realizarán actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (4.17 ha), corte y desquinche en material suelto (15352.34m³), conformación de terraplén (384.88 m³), en la partida de transporte se realizarán las actividades de : transporte de material propio seleccionado DP>=2.0km (500.34m³), transporte de material excedente para eliminación DP>=5.0KM (19958.04m³), transporte de material afirmado DP>=2.0 km (6448.53m³), transporte de material granular DP>=2.0 KM (9396.17m³), Transporte de mezcla asfáltica DP>=2.0 km (2035.49m³), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (31315.20m²), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (7227.82m³), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (4960.41m³), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (31315.20m²), carpeta asfáltica e=0.05m (31315.20m²), ensayos de deflectometría (4.17km). B. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 02: Construcción de alcantarillas rectangulares de concreto armado f'c= 210 kg/cm². Tipo cajón MCA 1.20x1.20 (09 und), construcción de badenes de concreto f'c= 210 kg/cm² de dimensiones: 7.00 de ancho por 10.00m de largo (05 und), construcción de cunetas revestidas de concreto f'c= 175 kg/cm² (2499.34 ml). C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Acción 03: Implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (15 und), señales reglamentarias (25 und), señales informativas (30 und), señales reguladoras (10 und), captafaros para pavimento (550 und), marcas en el pavimento con micro esferas (600 m²), hitos kilométricos (5 Und) y guardianía (65 m) y un plan de seguridad (06 estudios). Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental (04 estudios), que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (4500 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (4 und). Así mismo se realizara el Control de calidad (5 estudios), Plan de monitoreo arqueológico (01 estudio), Plan de compensación por expropiación de terrenos (01 estudios), Capacitación en mantenimiento (capacitación técnica en mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y conservación vial de carreteras vecinales).

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
4,116,095.00	2,887,450.00	2,862,140.64	99.12	obra	0.2	0.2

Este Proyecto se encuentra **en ejecución física del saldo de obra**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 2,862,140.64** que significa el **99.12 %** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2025.



2493059 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. (SALDO DE OBRA)

Inicio de Obra : 15/11/2025
Fecha de Culminación Programada : 14/05/2026
Avance Físico Acumulado al 2025 : 9.41%

Descripción: A. COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO Acción 01: Se realizarán trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 2.616 km, en la partida movimiento de tierras se realizarán actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (2.62 ha), corte y desquinche en material suelto (9595.21 m³), conformación de terraplén (240.55 m³), en la partida de transporte se realizarán las actividades de : transporte de material propio seleccionado DP>=1.0km (312.72m³), transporte de material excedente para eliminación DP>=5.0KM (12473.77m³), transporte de material afirmado DP>=1.0 km (5210.80m³), transporte de material granular DP>=1.0 KM (5810.65m³), Transporte de mezcla asfáltica DP>=1.0 km (1208.97m³), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (18599.60m²), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (4469.73m³), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (4008.31m³), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (18599.60m²), carpeta asfáltica e=0.05m (18599.60m²), ensayos de deflectometría (2.62km). B. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 02: construcción de alcantarillas rectangulares de concreto armado MCA 1.20x1.20 (03 und), construcción de cunetas revestidas de concreto f'c=175 kg/cm² (1569.60 ml). C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Acción 03: Implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (5 und), señales reglamentarias (3 und), señales informativas (3 und), señales reguladoras (3 und), marcas en el pavimento con micro esferas (734.85 m²), hitos kilométricos (3 Und). Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental, que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (2000 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (3 und).

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
5,067,607.00	91,284.00	73,684.00	80.72	Informe	3	3

Este Proyecto se encuentra **en ejecución física del saldo de obra**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 73,684.00** que significa el **80.72 %** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2025.



2530935 CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

Fecha Inicio Elab Exp. Téc. : 11 de noviembre de 2022

Fecha Culminación Exp. Téc. : Diciembre 2025

Avance físico Acumulado Exp. : 100 %

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 424 habitantes; Construcción de 01 Puente Vehicular sobre la Quebrada Santa Flor de 40.0 m. de luz, sub estructura tipo estribos en cantiléver y súper estructura tipo sección compuesta con vigas de acero estructural y losa de concreto armado, Capa de Rodadura de Pavimento Flexible.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
4,202,635.00	118,606.00	118,600.00	99.99	Exp. Téc	1	3

Este Proyecto se encuentra con **Expediente Técnico** culminado y se convocó a proceso de selección, presentando una ejecución de gastos de **S/ 118,600.00** que significa el **99.99%** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2025.

Se suscribió contrato N° 023-2022-GRSM-PEHCBM/PS con el consorcio SAN MARTÍN, para elaboración de Expediente Técnico y contrato N° 001-2022-GRSM-PEHCBM del 18.11.2022 con la empresa PAJATÉN CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES EIRL. Para la supervisión del Expediente Técnico, se culminó el E.T y con fecha 31 de diciembre del 2025 con previsión presupuestal se convocó el proceso de selección para la ejecución física de la obra y de acuerdo al cronograma del proceso la buena pro está programada para febrero 2026

2604850 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMO EMP. PE-5NB(KM.2+520)- LA UNION-EMP. PE-5N(KM.624+900)-SECTOR CASCADA UNION-BELLO HORIZONTE- EMP. PE 5N(KM.630+060) DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de elaboración Exp. Téc. : 2025

Fecha de Culminación Programada Exp. Téc : 2026

Avance Físico Acumulado Exp. Téc. al 2025 : 63.24%

El proyecto consiste en el mejoramiento de la vía barrio a nivel bicapa mediante el índice diario promedio anual (imd) que muestra la vía que es de 362 vehículos, además de la construcción de 47,101.40 ml de cunetes, 420 ml de alcantarillados, 364 ml de badenes, un muro de contención de 120.90 ml, señalización vertical y horizontal, así como la construcción de un puente de sección compuesta de 40 ml de luz, además de su mitigación del impacto ambiental.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	500,000.00	474,998.64	95.00	Exp. Téc	1	0.89





PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"



Este Proyecto se encuentra en elaboración **Expediente Técnico** por administración directa presentando una ejecución de gastos de **S/ 474,998.64** que significa el **95.00%** del PIM asignado. Con un avance físico del **89%** de lo programado en el 2025.

2617638 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR IZQUIERDO DEL BARRIO HUAYCO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra : 01/04/2025
Fecha de Culminación Programada : 02/2026
Avance Físico Acumulado al 2025 : 89.02%

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 4,090 personas. EL PROYECTO COMPRENDE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: - Asfaltado de 16,347.22 m² de capa de rodadura. - Construcción de 1,322.56 ml de Cuneta Armada Abierta de (0.40 x 0.40) - Construcción de 1,236.10 ml de Cuneta Armada con tapa de (1.00x1.00) ml - Construcción de 334.64 ml de Cuneta Armada con tapa de (1.20x1.20) ml - Construcción de 207.89 ml de Alcantarilla Armada de (1.00 x 1.00) ml - Construcción de 207.89 ml de Alcantarilla Armada (1.20x1.20) ml - Construcción de 1,049.55 m² de accesos de concreto. - Construcción de 3,666.55 m² de veredas longitudinales. - Construcción de 1,597.57 m² de veredas tipo martillo - Construcción de 120.91 m² de rampas de acceso. - Construcción de 2820.04 ml de sardineles de concreto - Sembrío de 7,564.08 m² de áreas verdes. - Sembrío de 1,006.00 plantas ornamentales. - Instalación de 30 señales preventivas - Reposición de postes de concreto 15 unidades

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	14,474,705.00	14,141,972.87	97.70	obra	0.9	0.895

Este Proyecto se encuentra en **ejecución física**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 14,141,972.87** que significa el **97.70%** del PIM asignado. Con un avance físico del **99.44%** de lo programado en el 2025.

Con fecha 25/11/2024, mediante RD N°116-2024-GRSM-PEHCBM/DEYP se aprueba la modificación del expediente técnico, por el monto de s/ 18,454,837.46 con precios al mes de noviembre 2024, y un plazo de ejecución de 300 días calendario, para ser ejecutado bajo la modalidad de ejecución presupuestaria por contrata. se proyecta culminar la ejecución física en el mes de febrero 2026

2647085 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON C_07 A C_13 EN EL BARRIO HUAYCO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra : 12/02/2025
Fecha de Culminación Programada : 03/2026
Avance Físico Acumulado al 2025 : 55.49%

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 3,783 habitantes; Mejoramiento de JR. MARTÍNEZ DE COMPAGÑON C-07 A C-13 EN EL BARRIO HUAYCO EN EL DISTRITO DE



TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 12,317.52 m2 de vías con pavimento flexible (carpeta asfáltica en caliente e= 5 cm), Adicional a eso se tendrá EN CUENTA LAS OBRAS DE ARTE, ADEMAS DE LA construcción de veredas, martillos y rampas de acceso Y OTROS.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	12,702,418.00	12,220,714.70	96.21	obra	0.6	0.554

Este Proyecto se encuentra en **ejecución física**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 12,220,714.70** que significa el **96.21%** del PIM asignado. Con un avance físico del **92.33%** de lo programado en el 2025.

2698317: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL SM-798- TRAMO: SAUCE -SANTA ROSA DE HUAYALI-ALTO SAUCE, EN EL DISTRITO DE SAUCE DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de elaboración Exp. Téc. : 2025
 Fecha de Culminación Programada Exp. Téc. : 2026
 Avance Físico Acumulado Exp. Téc. al 2025 : 80%

Se plantea la siguiente alternativa de solución, construcción de 17.231 km de pavimento flexible tipo mac, así como 1,536.50 ml de cuneta rectangular en zona urbana, 19,250.83 ml de cuneta triangular revestida en zona rural, así como 04 badenes de concreto armado y mampostería, 77 alcantarillas tipo mtc y 14 alcantarillas tipo mca, 150 ml de muro de contención de concreto armado, 1,212 ml de bordillo de concreto simple, así como 03 puentes de 25ml, 10 ml y 8 ml respectivamente, además de dispositivos de control de tráfico, señalización vertical, horizontal y acciones de mitigación de impacto ambiental.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	589,005.00	589,004.13	100.00	Exp. Téc.	0.9	0.89

Este Proyecto se encuentra en **elaboración del expediente técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 589,004.13** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico del **98.89%** de lo programado en el 2025.



RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 17 AMBIENTE

2294298 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS , REGION SAN MARTIN

Inicio de Act. Exp. Téc : 2025
Fecha De Culminación de Act. Exp. Téc : 2026
Avance Físico Acumulado al 2025 de Act. Exp. Téc : 30%

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 50,427 habitantes; con la recuperación de los servicios eco sistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante reforestación en zonas de protección con producción de plántones, prácticas de manejo y conservación de suelos en zonas de recuperación, mejoramiento de capacidades de los actores para conservación y usos sostenibles, así como el fortalecimiento institucional.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	42,383.00	42,381.85	100.00	Exp. Téc.	0.3	0.3

Este Proyecto se encuentra en **Actualización del Expediente Técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 42,381.85** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2025.

El proyecto cuenta con resolución de aprobación de expediente técnico del 2018, por lo que a la fecha perdió vigencia. Se viene realizando la actualización del expediente técnico, por administración directa a cargo de la dirección de medio ambiente, actualmente presenta avance del 30% y su culminación está prevista para el 2026.

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 18 SANEAMIENTO

2082525 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN

Fecha Inicio Elab Exp. Téc. : 21 de junio de 2024
Fecha Culminación Exp. Téc. : Junio 2026
Avance físico Acumulado Exp. Téc. : 59.05 %

El Proyecto beneficiará a 5,054 personas. El proyecto será para garantizar la sostenibilidad del proyecto en la fase de operación y mantenimiento, los responsables serán los propios involucrados, para lo cual estos conformarán una junta de usuarios del servicio de saneamiento (jass), su inscripción y



reconocimiento por la municipalidad distrital de uchiza y su capacitación en temas de operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. la estructura orgánica para el nivel directivo se planteó de la siguiente manera: presidente de la jass, secretario, tesorero, 2 vocales y un fiscal, las cuales serán elegidos por los beneficiarios en la asamblea de conformación y/o ratificación de la jass, con la mayoría de votos; los cuales se encargarán de administrar, controlar y supervisar la correcta operación del servicio, se suscribieron actas de compromiso

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
12,804,215.00	81,628.00	81,626.99	100.00	Informe	6	6

Este Proyecto se encuentra en elaboración del **Expediente Técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 81,626.99** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2025.

El proyecto cuenta con expediente técnico aprobado mediante resolución N°034-2023-GRSM PEHCBM/DEYP, de fecha 12 de abril del 2023, en la actualidad se subsano las observaciones en la etapa de calidad registrado en la plataforma PRESET del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por lo que la dirección de Estudios y Proyectos presentó el requerimiento con la finalidad de contratar los servicios para levantar las observaciones, se registró en la PRESET el E.T.

2469597 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YARINA DEL DISTRITO DE CHIPURANA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Fecha Inicio Obra : 04/11/2025
Fecha Culminación Obra Programada : 31/10/2026
Avance físico Acumulado al 2025 : 9.25 %

Descripción del Proyecto: AGUA POTABLE 1. Captación. Se construirá una captación con barraje de toma lateral de concreto armado que constará con una cámara de reunión y una caja de válvulas. Con una tubería de salida de 140mm. 2. Sedimentador Se construirá un sedimentador de 01 unidades de concreto armado de resistencia $f'c=210\text{kg/cm}^2$, cada unidad tendrá un ancho de 3.50m y una longitud total de 18.30m con muros de 0.30m, la cual tendrá la función de sedimentar las arenas que van suspendidas en el agua 3. Filtro lento Se construirá 01 unidades de filtro lento de concreto armado de resistencia $f'c=210\text{kg/cm}^2$, el ancho de cada unidad será de 6.40m, con un largo de 8.60m y una altura de 3.15m, el espesor de los muros será de 0.25m; la cual tendrá la función de remover las partículas que vuelven que el agua sea turbia 4. Línea de Conducción. Se localizará desde la captación proyectada de la quebrada "Torrepunta", en la en la progresiva 0+0.00 hasta el reservorio proyectado de $V= 60 \text{ M}^3$ Tiene una longitud total de 2244.95 metros. De tubería PVC-U NTP ISO 4422 CLASE 10 $\varnothing 140\text{mm} = 2244.95\text{m}$. Los Factores considerados para la localización son los siguientes: 5. Válvulas de aire : 6 6. Válvula de Purga Tipo I : 6 7. Pases Aéreos Se instalará 03 pases aéreos 8. Almacenamiento A continuación de la Línea de conducción se proyectará un reservorio cuya capacidad es de 60 m3 para abastecer a toda la población de la localidad del Yarina 9. Línea de Aducción Se localizará desde el Reservorio proyectado de $V= 60 \text{ M}^3$, , con una cota 231.30 m.s.n.m hasta el primer punto de distribución. Tiene una longitud de 302.43 metros de tubería PVC $\varnothing$ de 160mm. 10. Red de Distribución



Se ha previsto el tendido de 7,866.58 m de tubería PVC – U C10, como red de distribución de $\varnothing$ 160mm, 140mm, 110mm, 90mm, 75mm y 63mm; que permite transportar el agua desde la línea de aducción a las viviendas. La tubería estará enterrada a una profundidad de 0.60 m x 0.40 m de ancho 11. Conexiones Domiciliarias. Las conexiones domiciliarias son 467 para las viviendas e instituciones de las cuales 461 son conexiones domiciliarias, 04 conexiones para instituciones estatales y 02 conexiones sociales SANEAMIENTO 1. Redes Colectoras 2. BUZONES EN REDES COLECTORES 3. CONEXIONES DOMICILIARIAS SE PLANTEA LA INSTALACIÓN DE 467 CONEXIONES DOMICILIARIAS. PARA TAL FIN SE INSTALARÁ TUB. PVC-U SN-4 $\varnothing$ 200MM. 5. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Cada localidad tendrá su propia PTAR, del cual consta de los siguientes componentes: ¿ Tanque Imhoff (01 Und.) ¿ Lecho de Secado (02 Und.) ¿ Filtro Biológico (01 Und.) ¿ Cámara de cloración (01 Und.) 4. ESTACIONES DE BOMBEO.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
8,238,572.00	11,101,442.00	10,185,423.49	91.75	obra	0.1	0.062

Este Proyecto se encuentra **en ejecución física**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 10,185,423.49** que significa el **91.75%** del PIM asignado. Con un avance físico del **62%** de lo programado en el 2025.

2587904 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE CUADRA N° 7, PASAJE 3 Y PROLONGACION JR. YURIMAGUAS DISTRITO DE LAMAS DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra : 18 de octubre del 2024
Fecha de Culminación Programada : 15 de enero del 2025
Avance Físico Acumulado al 2025 : 100%

El Proyecto beneficiará a 10 habitantes. El proyecto será con construcción de Alcantarillas de CONCRETO armado de forma rectangular, de resistencia $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$, construcción de MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO armado de resistencia $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	170,002.00	170,000.64	100.00	informe	3	3

Este Proyecto se encuentra **culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 170,000.64** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2025.

2657137 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE SISA Y ANEXOS, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA DE LA PROVINCIA DE EL DORADO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Fecha Inicio Elab Exp. Téc. : 15 de agosto de 2024
Fecha Culminación Exp. Téc. : Marzo 2026
Avance físico Acumulado Exp. Téc. : 39.38 %



El Proyecto beneficiará a 10,836 habitantes. El proyecto será con Construcción de 01 captación para una capacidad de 131.75 l/s. Desarenador: Con capacidad de desarenar un caudal de 131.75 l/s, en un área de 174.72 m². Línea de conducción: 20.63 km de distancia. Planta de tratamiento de agua: Potable. Planta integral tipo CEPIS con capacidad de trata 131.75 l/s. Reservorio. Reservorio de 200 m³. Reservorio de 750 m³. Reservorio de 1050 m³. Línea de aducción. Con longitud de 5,498.51 ml. Red de distribución. Con longitud de 45193.57 ml. Conexiones domiciliarias. Construcción de 2763 conexiones domiciliarias. Caseta de Bombeo. Construcción de 01 caseta de bombeo de 144 m². Micromedición. Micromedición para 2763 conexiones domiciliarias. Sistema de Alcantarillado Sanitario: Redes de alcantarillado: Estación de bombeo

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	1,114,433.00	1,113,601.00	99.93	Exp. Téc.	0.7	0.67

Este Proyecto se encuentra **en Expediente Técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 1,113,601.00** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico del **95.71%** de lo programado en el 2025.

Proyecto con fecha 14/08/2024 fue declarado la viabilidad del proyecto la cual dio paso para la elaboración del expediente técnico, solo se cuenta con la conformidad del primer entregable, respecto al segundo entregable se encuentra en revisión por el equipo de inspección. Se entregó el cuarto entregable el cual cuenta con conformidad, pendiente la conformidad del quinto entregable debido a que se encuentra vinculado a la obtención del permiso de derecho de uso de vía

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 20 SALUD

2234510 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.

Inicio de Obra : 13/08/2015
Fecha de Culminación : 2017
Avance Físico acumulado al 2025 : 100%

La alternativa contempla: la construcción de una nueva infraestructura sobre un terreno nuevo, la adquisición de equipamiento biomédico, informático (incluido software) y mobiliario, programa de capacitación en el mantenimiento periódico de los equipos e infraestructura, implementación de un sistema que optimice el uso de los servicios de salud, capacitación general del personal asistencial en nuevas metodologías en atención integral de salud, capacitación al personal administrativo en nuevas técnicas de gestión administración y logística de establecimientos de salud y un programa de difusión de la cartera de salud del establecimiento y un plan integral de promoción y sensibilización a la población en los servicios de salud.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	1,192,307.00	1,192,306.27	100.00	informe	1	1



Este Proyecto se encuentra **culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 1,192,306.27** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2025.

El proyecto culminó en el año 2017, con fecha 26 de agosto de 2017 se suscribió el acta de entrega y recepción física (transferencia física) de la obra queda pendiente el pago de saldo de liquidación del contrato n° 083-2013-GRSM-PEHCBM/PS, contrato para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra por un total de s/1,192,306.27, sin embargo, ya se cuenta con los recursos, solo está pendiente solicitar al MINSA su programación de los recursos, con este pago se procederá a realizar la liquidación financiera final y cierre del proyecto.

2377760 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN

Inicio de Obra : 23 de noviembre del 2024
Fecha de Culminación Programada : 14/09/2026
Avance Físico Acumulado al 2025 : 9.73%

Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno • Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios. • Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura. • Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los servicios de salud. • Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud. • Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. • Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios. • Adquisición de ambulancia terrestre debidamente equipada • Adquisición de movilidad de transporte terrestre tipo todo terreno. El Proyecto beneficiará directamente a 8,003 habitantes.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	3,405,892.00	3,405,891.71	100.00	obra	0.1	0.082

Este Proyecto se encuentra **en Ejecución Física**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 3,405,891.71** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico de **82%** de lo programado en el 2025.

2377762 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN

Inicio de Obra : 07 de noviembre de 2024
Fecha de Culminación Programada : 30/08/2026
Avance Físico Acumulado a dic.. 2025 : 9.99%

Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno. - Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios. - Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura. - Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y



administrativos de los servicios de salud. - Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud. - Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. - Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios. - Adquisición de ambulancia terrestre y fluvial debidamente equipada. El Proyecto beneficiará directamente a 8,218 habitantes.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	4,273,046.00	4,127,956.41	96.60	obra	0.1	0.088

Este Proyecto se encuentra en **Ejecución Física**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 4,127,956.41** que significa el **96.60%** del PIM asignado. Con un avance físico de **88%** de lo programado en el 2025.

2377764 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra : 5 de setiembre del 2024
Fecha de Culminación Programada : 07/06/2026
Avance Físico Acumulado al 2025 : 14.36%

Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno, Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios, Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura, Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los servicios de salud, Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud, Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales, Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios, Adquisición de ambulancias terrestre debidamente equipada, Adquisición de movilidad de transporte terrestre tipo todo terreno.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	5,801,449.00	5,326,203.94	91.81	obra	0.1	0.1

Este Proyecto se encuentra en **Ejecución Física**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 5,326,203.94** que significa el **91.81%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2025.

2486486 ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra : 8 de julio del 2020
Fecha de Culminación : 30 de junio del 2022



Avance Físico Acumulado al 2025 : 100%

Ante la emergencia sanitaria nacional por el covid 19, se habilitó el área de expansión del establecimiento de salud a través de la unidad productora de salud hospital ii-2 tarapoto con código ipress n° 00006918, la cual cuenta con infraestructura potencial para brindar la primera atención apacientes covid 19, faltando el equipamiento necesario como es el coche de paro equipado mas accesorios, para la atención a pacientes covid 19 que presentaron un paro cardiorrespiratorio.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	285,000.00	285,000.00	100.00	informe	1	1

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 285,000.00** que significa el **100.00%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2025.

RESULTADOS DE LOS IOARRs y PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 22 EDUCACIÓN

2464324 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra : 14 de diciembre de 2024
Fecha de Culminación Programada : 12 de junio de 2026
Fecha de Recepción De Obra Programada : 27 de junio de 2026
Fecha de Transferencia Programada : 11 de julio de 2026
Avance Físico Acumulado al 2025 : 42.91%

Demolición total de la infraestructura actual y construcción de nueva infraestructura, adquisición de mobiliarios y equipamiento para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. El Proyecto beneficiará directamente a 1,430 habitantes, Alumnos adecuadamente atendidos en los servicios de educación inicial, primaria y secundaria. Demolición total de la infraestructura actual y Construcción de nueva infraestructura, adquisición de mobiliarios y equipamiento para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
10,964,769.00	15,089,846.00	14,653,689.03	97.11	obra	0.4	0.4

Este Proyecto se encuentra **en Ejecución Física**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 14,653,689.03** que significa el **97.11%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2025.

Con fecha 04 de diciembre de 2024, se firma el contrato n° 026-2024-GRSM-PEHCBM/PS para ejecución de la obra, entre el PEHCBM y el consorcio ejecutor ALFONSO UGARTE, cuyo monto total



asciende a S/ 36,000,000.00 y un plazo de ejecución 540 días calendario. la ejecución física inicio el 14/12/2024.

2472445 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E. SANTA ROSA, DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio Elab. Exp. Téc. : Agosto 2025

Fecha de Culminación Programada Elab. Exp. Téc.: Mayo 2026

Avance Físico Acumulado al 2025 Elab. Exp. Téc. : 60%

Construcción de 50 Aula de Educación Secundaria, Construcción de 5 Aula de Innovación Pedagógica, Construcción de 12 Laboratorios y/o Talleres, Construcción de 1 Biblioteca Escolar, Construcción de 1 Sala de Usos Múltiples, Construcción de 45 Espacios de circulación interior, Construcción de 10 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica, Construcción de 2 Ambiente de preparación y expendio de alimentos, Construcción de 4 Ambientes de Servicios Generales, Construcción de 2 Depósito, Construcción de 10 SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.), Construcción de 1 Cercos y/o Portadas, Construcción de 1 Espacios Deportivos - con cobertura, Construcción de 1 Espacios Exteriores, Construcción de 1 Instalaciones exteriores de Servicios Básicos, Adquisición de 50 Mobiliario de Aula de Educación Secundaria, Adquisición de 5 Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica, Adquisición de 12 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 15 Mobiliario de Ambientes Complementarios, Adquisición de 50 Equipamiento de Aula de Educación Secundaria, Adquisición de 5 Equipamiento de Aula de Innovación Pedagógica, Adquisición de 4 Equipamiento de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 312 Equipamiento de Ambientes Complementarios.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	738,169.00	658,276.73	89.18	Exp. Téc.	1	1

Este Proyecto se encuentra **en elaboración expediente técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 658,276.73** que significa el **89.18%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2025.

2473315 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0031 MARIA ULISES DAVILA PINEDO, EN EL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio Elab. Exp. Téc. : 2025

Fecha de Culminación Programada Elab. Exp. Téc.: Diciembre 2025

Avance Físico Acumulado al 2025 Elab. Exp. Téc. : 100%

Construcción de 12 Aula de Educación Primaria, Construcción de 10 Aula de Educación Secundaria, Construcción de 3 Aula de Innovación Pedagógica, Construcción de 6 Laboratorios y/o Talleres, Construcción de 2 Biblioteca Escolar, Construcción de 2 Sala de Usos Múltiples, Construcción de 27 Espacios de circulación interior, Construcción de 2 Ambiente de Administración y/o Gestión



Pedagógica, Construcción de 4 Ambiente de preparación y expendio de alimentos, Construcción de 2 Ambientes de Servicios Generales, Construcción de 5 Depósito, Construcción de 10 SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.), Construcción de 1 Cercos y/o Portadas, Construcción de 1 Muro de contención, Construcción de 1 Espacios Deportivos - sin cobertura, Construcción de 1 Espacios Deportivos - con cobertura, Construcción de 1 Espacios Exteriores, Construcción de 1 Instalaciones exteriores de Servicios Básicos, Adquisición de 1020 Mobiliario de Aula de Educación Primaria, Adquisición de 854 Mobiliario de Aula de Educación Secundaria, Adquisición de 199 Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica, Adquisición de 258 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 563 Mobiliario de Ambientes Complementarios, Adquisición de 48 Equipamiento de Aula de Educación Primaria, Adquisición de 40 Equipamiento de Aula de Educación Secundaria, Adquisición de 140 Equipamiento de Aula de Innovación Pedagógica, Adquisición de 20 Equipamiento de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 47 Equipamiento de Ambientes Complementarios

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
13,989,137.00	953,975.00	953,975.00	100.00	Exp. Téc.	1	1

Este Proyecto se encuentra **en elaboración expediente técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 953,975.00** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2025.

2617851 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 315, DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra : 27 de mayo de 2025
Fecha de Culminación : 25/07/2025
Avance Físico Acumulado al 2025 : 100%

La IE 315, cuenta con una losa deportiva de hormigón (286.18 m²). el edificio no cuenta con cubierta, lo que les pone en condición a los alumnos por la exposición directa a los rayos solares y a la lluvia en sus actividades. Además, el edificio (losa deportiva) sufre un mayor deterioro por la exposición directa al sol y a la lluvia. Por lo tanto, se ha proporcionado cobertura para continuar con los estándares de calidad del servicio educativo.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	322,847.00	320,880.66	99.39	porcentaje	100	100

Es una IOARR se encuentra **culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 320,880.66** que significa el **99.39%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2025.



2666332 RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. MIGUEL CHUQUISENGO RAMIREZ DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra : 22 de mayo de 2025
Fecha de Culminación : 04/08/2025
Avance Físico Acumulado al 2025 : 100%

La I.E. tiene una losa deportiva de concreto de 506.37 m², la losa deportiva se encuentra deteriorada y no cuenta con cobertura, situación negativa que afrontan los estudiantes porque se encuentran expuestos de manera directa a los rayos del sol en su actividades y precipitaciones pluviales, además existe mayor detrimento del activo (losa deportiva) por la exposición directa al sol y lluvias. por tanto, se ha planteado dotar de cobertura para contrinuir con los estándares de calidad de servicio.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	557,972.00	553,266.75	99.16	porcentaje	100	100

Es una IOARR se encuentra **culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 553,266.75** que significa el **99.16%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2025.

2673955 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 0426 INMACULADA CONCEPCION DE CENTRO POBLADO UCHIZA DISTRITO DE UCHIZA DE LA PROVINCIA DE TOCACHE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio Elab. Exp. Téc. : Mayo 2025
Fecha de Culminación Programada Elab. Exp. Téc.: Junio 2026
Avance Físico Acumulado al 2025 Elab. Exp. Téc. : 64.49%

Demolición total de la infraestructura actual y construcción de ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios bajo un sistema estructural aporticado: construcción de 11 aulas de nivel primario y 10 aulas de nivel secundaria, sum ¿ comedor, cocina escolar, servicios higiénicos (alumnos ¿ docentes), vestidores, laboratorio de ciencias, taller de educación para el trabajo, dirección, subdirección, sala de reuniones, secretaría -espera, sala de docentes, espacio multiuso, biblioteca escolar, aulas de innovación pedagógica, taller de arte, módulo de conectividad, losa multiuso primaria, losa multiuso secundaria. , obras complementarias + equipamiento y mobiliario pedagógico y administrativo.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	337,065.00	335,063.42	99.41	Exp. Téc.	0.9	0.89

El proyecto se encuentra **en elaboración del expediente técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 335,063.42** que significa el **99.41%** del PIM asignado. Con un avance físico de **98.89%** de lo programado en el 2025.



2676363 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 0656 JUAN A. MORENO RENGIFO DE CENTRO POBLADO SAPOSOA DISTRITO DE SAPOSOA DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio Elab. Exp. Téc. : Abril 2025
Fecha de Culminación Programada Elab. Exp. Téc.: Diciembre 2025
Avance Físico Acumulado al 2025 Elab. Exp. Téc. : 100%

Demolición total de la infraestructura actual y construcción de ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios bajo un sistema estructura aporticado: Construcción de 6 aulas de nivel inicial y 8 aulas de nivel primario, sala de psicomotricidad, aula de innovación pedagógica, módulo de conectividad, taller creativo, psicología, biblioteca escolar, dirección, sala de reuniones, sala de docentes, sum ¿ comedor primaria, sum ¿ comedor inicial, cocina escolar, despensa, servicios higiénicos para alumnos, servicios higiénicos para docentes, tópicos, cuarto de limpieza, losa deportiva primaria, patio de juegos inicial, obras complementarias + equipamiento y mobiliario pedagógico y administrativo.

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	186,275.00	186,275.00	100.00	Exp. Téc.	1	1

El proyecto se encuentra **en elaboración del expediente técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 186,275.00** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2025.

2698160 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 0410, DE CENTRO POBLADO BAGAZAN DISTRITO DE PACHIZA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio Elab. Exp. Téc. : Setiembre 2025
Fecha de Culminación Programada Elab. Exp. Téc.: Mayo 2026
Avance Físico Acumulado al 2025 Elab. Exp. Téc. : 35%

Demolición, cambio, reemplazo, renovación de toda la infraestructura actual instalada y construcción de ambientes básicos, complementarios (gestión administrativa y pedagógica, bienestar, servicios generales, y SSHH), 8 aulas de nivel primaria, 06 aulas de nivel secundaria, Biblioteca Escolar - Tipo I, 02 aulas de Aula de Innovación Pedagógica, 01 Laboratorio de Ciencia y Tecnología (S), ambientes de talleres, SUM, losa deportiva multiusos con cobertura, ambientes administrativos y pedagógicos, Cocina, 01 módulo de conectividad, 01 almacén general, Servicios higiénicos para estudiantes y personal administrativos, obras exteriores, elevador para personas con discapacidad física, sistema de abastecimiento de agua. Adquisición de equipamiento y mobiliario educativo por cada nivel de servicio (primaria y secundaria).



EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	271,040.00	192,645.91	71.08	Exp. Téc.	1	0.89

El proyecto se encuentra **en elaboración del expediente técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 192,645.91** que significa el **71.08%** del PIM asignado. Con un avance físico de **89%** de lo programado en el 2025.

2698321 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. CLEOFÉ AREVALO DEL AGUILA DE CENTRO POBLADO LA BANDA DE SHILCAYO DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio Elab. Exp. Téc. : Octubre 2025

Fecha de Culminación Programada Elab. Exp. Téc.: Mayo 2026

Avance Físico Acumulado al 2025 Elab. Exp. Téc. : 70%

Construcción de 7 Aula de Educación Inicial, Construcción de 18 Aula de Educación Primaria, Construcción de 19 Aula de Educación Secundaria, Construcción de 1 Sala de Psicomotricidad, Construcción de 4 Aula de Innovación Pedagógica, Construcción de 8 Laboratorios y/o Talleres, Construcción de 2 Biblioteca Escolar, Construcción de 1 Auditorio, Construcción de 3 Sala de Usos Múltiples, Construcción de 63 Espacios de circulación interior, Construcción de 12 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica, Construcción de 3 Ambiente de preparación y expendio de alimentos, Construcción de 21 Ambientes de Servicios Generales, Construcción de 19 Depósito, Construcción de 19 SS.HH. y/o Vestidores, Construcción de 1 Cercos y/o Portadas, Construcción de 1 Espacios Deportivos - con cobertura, Construcción de 1 Espacios Exteriores, Construcción de 1 Instalaciones exteriores de Servicios Básicos, Adquisición de 511 Mobiliario de Aula de Educación Inicial, Adquisición de 1404 Mobiliario de Aula de Educación Primaria, Adquisición de 1482 Mobiliario de Aula de Educación Secundaria, Adquisición de 45 Mobiliario de Sala de psicomotricidad, Adquisición de 168 Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica, Adquisición de 396 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 796 Mobiliario de Ambientes Complementarios, Adquisición de 42 Equipo de Aula de Educación Inicial, Adquisición de 108 Equipo de Aula de Educación Primaria, Adquisición de 114 Equipo de Aula de Educación Secundaria, Adquisición de 8 Equipo de Sala de psicomotricidad, Adquisición de 184 Equipo de Aula de Innovación Pedagógica, Adquisición de 133 Equipo de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 195 Equipo de Ambientes Complementarios

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	929,756.00	929,755.70	100.00	Exp. Téc.	1	0.89

El proyecto se encuentra **en elaboración del expediente técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/ 929,755.70** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico de **89%** de lo programado en el 2025.



RESULTADOS DE LA GESTIÓN

POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARRs

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

ANEXO N° 1 A: PROYECTOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIADA	MONTO S/	AVANCE	
			FÍSICO	FINANCIERO
2082525 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	5,054	81,628	0	100.00
2134084 CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,298	65,000	100.00	100.00
2234510 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.	38,354	1,192,307	100.00	100.00
2280937 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	6,229	9,688,304	100.00	99.82
2294298 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS, REGION SAN MARTIN	50,427	42,383	100.00	100.00
2342702 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	10,299	1,615,936	100.00	100.00
2377760 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	8,003	3,405,892	100.00	100.00
2377762 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	8,218	4,273,046	100.00	96.60
2377764 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS,	20,977	5,801,449	100.00	91.81



PROVINCIA DE LAMAS-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN				
2464324 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,430	15,089,846	100.00	97.11
2469597 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YARINA DEL DISTRITO DE CHIPURANA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	2,929	11,101,442	100.00	91.75
2472445 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E. SANTA ROSA, DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,486	738,169	100.00	89.18
2473315 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0031 MARIA ULISES DAVILA PINEDO, EN EL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,154	953,975	100.00	100.00
2474363 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE LA CUMBRE DEL DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	225	2	0	0.00
2486486 ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0	285,000	100.00	100.00
2491462 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,450	2,674,157	100.00	100.00
2492668 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	3,479	2,887,450	100.00	99.12
2493059 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	750	91,284	100.00	80.72



2524121 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA RUTA N° SM-653, TRAYECTORIA: EMP. PE-5N (MAYOCHAPANA) - PUENTE RIO MAYO - BETANIA, LOCALIDADES DE RAMIREZ Y BETANIA, DISTRITOS DE JEPELACIO Y PINTO RECODO, DE LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	3,230	2	0	0.00
2530935 CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	424	118,606	100.00	99.99
2587904 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE CUADRA N° 7, PASAJE 3 Y PROLONGACION JR. YURIMAGUAS DISTRITO DE LAMAS DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	10	170,002	100.00	100.00
2604850 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMO EMP. PE-5NB(KM.2+520)- LA UNION-EMP. PE-5N(KM.624+900)-SECTOR CASCADA UNION-BELLO HORIZONTE- EMP. PE 5N(KM.630+060) DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	2,661	500,000	89.00	95.00
2617638 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR IZQUIERDO DEL BARRIO HUAYCO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	4,090	14,474,705	100.00	97.70
2617834 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 304, EN LA LOCALIDAD DE LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0	3	0	0.00
2617841 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 404 DIVINO NIÑO, EN EL CENTRO POBLADO BANDA DE PISHUAYA (SISA), DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0	1	0	0.00
2617851 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 315, DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0	322,847	100.00	99.39
2617888 RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0004 TUPAC AMARU, EN EL SECTOR 9 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0	2	0	0.00
2647085 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON C07 A C13 EN EL BARRIO HUAYCO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA	3,783	12,702,418	100.00	96.21



PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN				
2657137 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE SISA Y ANEXOS, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA DE LA PROVINCIA DE EL DORADO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MA	20,822	1,114,433	100.00	99.93
2665018 CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL SM-849 (PUENTE YANCHAMA), RUTA: NUEVA VIDA -NUEVA ILUSION, DISTRITO DE ALTO SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0	1	0	0.00
2666332 RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. MIGUEL CHUQUISONGO RAMIREZ DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0	557,972	100.00	99.16
2668712 CONSTRUCCION DE AULA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y ESCALERA/ESCALINATA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E. JOSE ANTONIO RAMIREZ AREVALO DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0	44,062	0	0.00
2669933 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE COCO, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA DEL PEHCBM, DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO	1,169	554,534	90.00	100.00
2673955 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 0426 INMACULADA CONCEPCION DE CENTRO POBLADO UCHIZA DISTRITO DE UCHIZA DE LA PROVINCIA DE TOCACHE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	613	337,065	100.00	99.41
2676363 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 0656 JUAN A. MORENO RENGIFO DE CENTRO POBLADO SAPOSOA DISTRITO DE SAPOSOA DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	331	186,275	100.00	100.00
2698160 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 0410 , DE CENTRO POBLADO BAGAZAN DISTRITO DE PACHIZA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	662	271,040	89.00	71.08



2698317 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL SM-798- TRAMO: SAUCE ¿SANTA ROSA DE HUAYALI-ALTO SAUCE, EN EL DISTRITO DE SAUCE DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	6,063	589,005	100.00	100.00
2698321 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CLEOFÉ AREVALO DEL AGUILA DE CENTRO POBLADO LA BANDA DE SHILCAYO DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	2,342	929,756	89.00	100.00
2711529 CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. 0418 VICTOR M. PEREZ MORALES DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0	1	0	0.00

ANEXO N° 1-B PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA	META		RESULTADOS/ LOGROS	
	PROGRAMADA	EJECUTADA		
0042 APROVECHAMIE NTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 65,000.00	65,000.00	100.00	EL CONTRATO PRINCIPAL SE ENCUENTRA CULMINADO EN SU TOTALIDAD CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA APROBADA MEDIANTE RD N° 020-2024-GRSM-PEHCBM/DO DE FECHA 16/02/2024 CON UN SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/ 2,298,038 EN LA CUAL ESTÁ INCLUIDO EL LAUDO ARBITRAL.
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE CUADRA N° 7, PASAJE 3 Y PROLONGACION JR. YURIMAGUAS DISTRITO DE LAMAS DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 170,002.00	170,000.64	100.00	LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE CULMINADO Y RECEPCIONADO AL 100%, CON SU RESPECTIVA LIQUIDACIÓN Y ACTA DE TRANSFERENCIA Y ENTREGA FÍSICA DE LA INVERSIÓN A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS CON FECHA 09/10/2025
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE SISA Y ANEXOS, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA DE LA PROVINCIA DE EL	1,113,601.00	99.93	EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ,SE ENTREGÓ EL CUARTO ENTREGABLE EL CUAL CUENTA CON CONFORMIDAD, PENDIENTE LA CONFORMIDAD DEL QUINTO ENTREGABLE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA VINCULADO A LA OBTENCION DEL PERMISO DE DERECHO DE USO DE VIA



	DORADO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MA, SE PROGRAMÓ S/ 1,114,433.00			
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 81,628.00	81,626.99	100.00	ACTUALIZACIÓN DEL E.T. SE ELABORÓ POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, MISMA QUE FUE APROBADO EL 15/11/2024 MEDIANTE RD N°113-2024-GRSM-PEHCBM/DEYP, POR EL MONTO DE S/ 73,037,898.91, PLAZO DE EJECUCIÓN DE 540 DÍAS CALENDARIO, SE REGISTRÓ EN LA PRESET EL ET
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE LA CUMBRE DEL DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 2.00	0.00	0.00	CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 SE CONVOCO CON PREVISION PRESUPUESTAL EL PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO SE TIENE PROGRAMADO OTORGAR LA BUENA PRO EN ENERO 2026
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 15,089,846.00	14,653,689.03	97.11	EN EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 42.91% , EJECUTADA POR CONTRATISTA
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E. SANTA ROSA, DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 738,169.00	658,276.73	89.18	EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE CUANTA CON LA CONFORMIDAD DEL TERCER ENTREGABLE DE UN TOTAL DE CINCO, FALTA REALIZAR EL PAGO DEL TERCER, CUARTO Y QUINTO ENTREGABLE
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0031 MARIA ULISES DAVILA PINEDO, EN EL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 953,975.00	953,975.00	100.00	EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO , EL CONSULTOR CUMPLIÓ CON PRESENTAR EL ULTIMO ENTREGABLE, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN PARA LUEGO SER EVALUADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO Y POSTERIOR APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO



	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 0426 INMACULADA CONCEPCION DE CENTRO POBLADO UCHIZA DISTRITO DE UCHIZA DE LA PROVINCIA DE TOCACHE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 337,065.00	335,063.42	99.41	EL E.T SE DESARROLLA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN DE DME (DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE). SE HA SOLICITADO EL PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO CON EL DIRECTOR Y PADRES DE FAMILIA DE LA I.E. DEL CUAL SE ESTÁ DESARROLLANDO LA ARQUITETURA DEL PROYECTO EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA, A SU VEZ SE INSPECCIONÓ EL LOCAL DE PLAN DE CONTINGENCIA
	UNDEFINED DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 0656 JUAN A. MORENO RENGIFO DE CENTRO POBLADO SAPOSOA DISTRITO DE SAPOSOA DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 186,275.00	186,275.00	100.00	SE CUENTA CON LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO , POR LO QUE REQUIERE PRIORIZACION PARA SU FINANCIAMIENTO
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 0410 , DE CENTRO POBLADO BAGAZAN DISTRITO DE PACHIZA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 271,040.00	192,645.91	71.08	EL PROYECTO FUE VIABILIZADO EL 21 DE JULIO DEL 2025 Y PARA LA ELABORACIÓN DEL E.T SE PROGRAMÓ REALIZARLO EN 03 ENTREGABLES, DE LOS CUALES SE EMITIÓ LA CONFORMIDAD DEL SEGUNDO ENTREGABLE EL 24/09/2025, PENDIENTE EL 3er ENTREGABLE
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CLEOFE AREVALO DEL AGUILA DE CENTRO POBLADO LA BANDA DE SHILCAYO DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 929,756.00	929,755.70	100.00	VIABILIZADO EL 01/08/2025, ESTA APTO PARA CONTINUAR CON LA ELABORACION DEL E.T. TODA VEZ QUE PRESENTA CONTRATO VIGENTE ,POR LO QUE SE ESTA GESTIONANDO LA ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES.
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 3,405,892.00	3,405,891.71	100.00	EN EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 9.73% , EJECUTADA POR CONTRATA
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE	4,127,956.41	96.60	EN EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 9.99% , EJECUTADA POR CONTRATA



	SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 4,273,046.00			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 5,801,449.00	5,326,203.94	91.81	EN EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 14.36% , EJECUTADA POR CONTRATA
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 9,688,304.00	9,671,296.42	99.82	SE ENCUENTRA RECEPCIONADA Y CON CON R.D.N° 201-2025-GRSM-PEHCBM/DI POR APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA DE FECHA 10 DEL NOVIEMBRE 2025 POR UN MONTO DE S/ 11,700,449.19 Y CON R.D.N° 224-2025-GRSM-PEHCBM/DI POR LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2025, POR UN MONTO DE S/ 1,141.64 SOLES
	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 1,615,936.00	1,615,934.10	100.00	CULMINO EL 30.04.2025, CON LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 117-2025-GRSM-PEHCBM/DI, PENIDNTE TRANSFERENCIA Y CIERRE EN EL BANCO
	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 2,674,157.00	2,674,156.37	100.00	CON FECHA 25/11/2025 INICIO LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL SALDO DE OBRA, TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 10.09%
	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 2,887,450.00	2,862,140.64	99.12	CON FECHA 18/11/2025 INICIO LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL SALDO DE OBRA, TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 6.79%
	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 91,284.00	73,684.00	80.72	CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2025 SE REALIZÓ LA ENTREGA DE TERRENO Y CON FECHA 15 DE DICIEMBRE 2025 SE DIÓ INICIO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 9.41%



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA RUTA N° SM-653, TRAYECTORIA: EMP. PE-5N (MAYOCHAPANA) - PUENTE RIO MAYO - BETANIA, LOCALIDADES DE RAMIREZ Y BETANIA, DISTRITOS DE JEPELACIO Y PINTO RECODO, DE LAS PROVINCIAS DE LAMAS, SE PROGRAMÓ S/ 2.00	0.00	0.00	SE CULMINÓ EL E.T Y CON FECHA 19/12/2025 SE CONVOCÓ CON PREVISIÓN PRESUPUESTAL EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 118,606.00	118,600.00	99.99	SE CULMINÓ EL E.T Y CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 CON PREVISION PRESUPUESTAL SE CONVOCO EL PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO LA BUENA PRO ESTA PROGRAMADA PARA FEBRERO 2026
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMO EMP. PE-5NB(KM.2+520)- LA UNION-EMP. PE-5N(KM.624+900)-SECTOR CASCADA UNION-BELLO HORIZONTE- EMP.PE 5N(KM.630+060) DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 500,000.00	474,998.64	95.00	SE ENCUENTRA VIABLE, APTO PARA CONTINUAR CON LA ELABORACIÓN DEL E.T. BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON C07 A C13 EN EL BARRIO HUAYCO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 12,702,418.00	12,220,714.70	96.21	EN EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 55.49% , EJECUTADA POR CONTRATA
CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL SM-849 (PUENTE YANCHAMA), RUTA: NUEVA VIDA -NUEVA ILUSION, DISTRITO DE ALTO SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 1.00	0.00	0.00	LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ,
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL SM-798- TRAMO: SAUCE ¿SANTA	589,004.13	100.00	LA INVERSION FUE VIABILIZADO EL 21/08/2025, ASIMISMO, AL ESTAR CONTEMPLADO EN EL CONTRATO LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO ,



	ROSA DE HUAYALI-ALTO SAUCE, EN EL DISTRITO DE SAUCE DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 589,005.00			SE ENCUENTRA EN DESARROLLO EN CUARTO Y ULTIMO ENTREGABLE
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS, REGION SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 42,383.00	42,381.85	100.00	EN ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION, SE PROGRAMÓ S/ 7,777,413.00	7,659,575.24	98.48	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, PRINCIPAL EL AGUA TARAPOTO
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 1,192,307.00	1,192,306.27	100.00	PROYECTO CULMINADO Y RECEPCIONADO AL 100%
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YARINA DEL DISTRITO DE CHIPURANA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 11,101,442.00	10,185,423.49	91.75	CON FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025 INICIO LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA, AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 9.25%
	ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, SE PROGRAMÓ S/ 285,000.00	285,000.00	100.00	EL SERVICIO PARA LA HABILITACIÓN DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (AGUA BLANDA, AGUA OSMOTIZADA Y AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL), PARA LA PUESTA EN SERVICIO, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE LOS 09 EQUIPOS LACRADOS SE ENCUENTRA CULMINADO
	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR IZQUIERDO DEL BARRIO HUAYCO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 14,474,705.00	14,141,972.87	97.70	EN EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 89.02% , EJECUTADA POR CONTRATA
	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 304, EN LA LOCALIDAD DE LA BANDA, DISTRITO DE LA	0.00	0.00	INVERSIÓN CONVOCADO A PROCESO DE SELECCIÓN



BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 3.00			
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 404 DIVINO NIÑO, EN EL CENTRO POBLADO BANDA DE PISHUAYA (SISA), DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 1.00	0.00	0.00	CON FECHA 30/12/2025, SE SUSCRIBIO EL CONTRATO PARA LA EJECUCION FISICA , ASIMISMO, SE ESTIMA INICIAR LA EJECUCION EL 01/02/2026
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 315, DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 322,847.00	320,880.66	99.39	A IOARR SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100% CON LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA R.D.N° 183-2025-GRSM-PEHCBM DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2025 Y LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN CON R.D.N° 214-2025-GRSM-PEHCBM/DI DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 , CON ACTA DE TRANSFERENCIA A LA UGEL SAN MARTÍN DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2025
RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0004 TUPAC AMARU, EN EL SECTOR 9 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 2.00	0.00	0.00	CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON PREVISIÓN PRESUPUESTAL FUE CONVOCADO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO LA BUENA PRO ESTA PROGRAMADO A OTORGARSE EL 2026
RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. MIGUEL CHUQUISONGO RAMIREZ DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 557,972.00	553,266.75	99.16	CON FECHA 22 DE MAYO DEL 2025 SE DIO INICIO LA OBRA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EMISIÓN LA R.D. DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN .
CONSTRUCCION DE AULA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y ESCALERA/ESCALINATA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E. JOSE ANTONIO RAMIREZ AREVALO DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 44,062.00	0.00	0.00	CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025, SE CONVOCO EL PROCESO DE SELECCION CON PREVISION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION FISICA DE LA INVERSION IOARR
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA	554,532.62	100.00	LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA SE



	DE COCO, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA DEL PEHCBM, DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 554,534.00			ENCUENTRA EN SU FASE FINAL PARA LA CULMINACION
	CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. 0418 VICTOR M. PEREZ MORALES DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 1.00	0.00	0.00	IOARR CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, ASIMISMO, EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 SE CONVOCA EL PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA CON PREVISION PRESUPUESTAL

ANEXO N° 1 D: PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS

FUNCION 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA

SECTOR	AVANCES
GESTION DE PROYECTOS	PAGOS DE PERSONAL, ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE COCO, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA DEL PEHCBM, DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO	LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA SE ENCUENTRA EN SU FASE FINAL PARA LA CULMINACION
SIN PRODUCTO	PAGOS DE PERSONAL CAP

FUNCION 09: AGROPECUARIA

SECTOR	AVANCES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	EL CONTRATO PRINCIPAL SE ENCUENTRA CULMINADO EN SU TOTALIDAD CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA APROBADA MEDIANTE RD N° 020-2024-GRSM-PEHCBM/DO DE FECHA 16/02/2024 CON UN SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/ 2,298,038 EN LA CUAL ESTÁ INCLUIDO EL LAUDO ARBITRAL.



FUNCION 15: TRANSPORTE

SECTOR	AVANCES
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	RECEPCIONADA Y CON CON R.D.N° 201-2025-GRSM-PEHCBM/DI POR APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA DE FECHA 10 DEL NOVIEMBRE 2025 POR UN MONTO DE S/ 11,700,449.19 Y CON R.D.N° 224-2025-GRSM-PEHCBM/DI POR LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2025, POR UN MONTO DE S/ 1,141.64 SOLES
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	CULMINO EL 30.04.2025, CON LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 117-2025-GRSM-PEHCBM/DI, PENIDNTE TRANSFERENCIA Y CIERRE EN EL BANCO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	CON FECHA 25/11/2025 INICIO LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL SALDO DE OBRA, TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 10.09%
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	CON FECHA 18/11/2025 INICIO LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL SALDO DE OBRA, TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 6.79%
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2025 SE REALIZÓ LA ENTREGA DE TERRENO Y CON FECHA 15 DE DICIEMBRE 2025 SE DIÓ INICIO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 9.41%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA RUTA N° SM-653, TRAYECTORIA: EMP. PE-5N (MAYOCHAPANA) - PUENTE RIO MAYO - BETANIA, LOCALIDADES DE RAMIREZ Y BETANIA, DISTRITOS DE JEPELACIO Y PINTO RECODO, DE LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y	SE CULMINÓ EL E.T Y CON FECHA 19/12/2025 SE CONVOCÓ CON PREVISIÓN PRESUPUESTAL EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SE CULMINÓ EL E.T Y CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 CON PREVISION PRESUPUESTAL SE CONVOCO EL PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO LA BUENA PRO ESTA PROGRAMADA PARA FEBRERO 2026
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMO EMP. PE-5NB(KM.2+520)- LA UNION-EMP. PE-5N(KM.624+900)-SECTOR CASCADA UNION-BEL	SE ENCUENTRA VIABLE, APTO PARA CONTINUAR CON LA ELABORACIÓN DEL E.T. BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR IZQUIERDO DEL BARRIO HUAYCO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	EN EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 89.02% , EJECUTADA POR CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON C07 A C13 EN EL BARRIO HUAYCO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	EN EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 55.49% , EJECUTADA POR CONTRATA
CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL SM-849 (PUENTE YANCHAMA), RUTA: NUEVA VIDA -NUEVA ILUSION, DISTRITO DE ALTO SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO,
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL SM-798- TRAMO: SAUCE ¿SANTA ROSA DE HUAYALI-ALTO SAUCE, EN EL DISTRITO DE SAUCE DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	LA INVERSION FUE VIABILIZADO EL 21/08/2025, ASIMISMO, AL ESTAR CONTEMPLADO EN EL CONTRATO LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN DESARROLLO EN CUARTO Y ULTIMO ENTREGABLE

FUNCION 17: AMBIENTE

SECTOR	AVANCES
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS, REGION SAN MARTIN	EN ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

FUNCION 18: SANEAMIENTO

SECTOR	AVANCES
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	ACTUALIZACIÓN DEL E.T. SE ELABORÓ POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, MISMA QUE FUE APROBADO EL 15/11/2024 MEDIANTE RD N°113-2024-GRSM-PEHCBM/DEYP, POR EL MONTO DE S/ 73,037,898.91, PLAZO DE EJECUCIÓN DE 540 DÍAS CALENDARIO, SE REGISTRÓ EN LA PRESET EL ET
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YARINA DEL DISTRITO DE CHIPURANA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	CON FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025 INICIO LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA, AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 9.25%



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE LA CUMBRE DEL DISTRITO DE	CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 SE CONVOCO CON PREVISION PRESUPUESTAL EL PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO SE TIENE PROGRAMADO OTORGAR LA BUENA PRO EN ENERO 2026
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE CUADRA N° 7, PASAJE 3 Y PROLONGACION JR. YURIMAGUAS DISTRITO DE LAMAS DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE CULMINADO Y RECEPCIONADO AL 100%, CON SU RESPECTIVA LIQUIDACIÓN Y ACTA DE TRANSFERENCIA Y ENTREGA FÍSICA DE LA INVERSIÓN A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS CON FECHA 09/10/2026
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE SISA Y ANEXOS, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA DE LA PROVINCIA DE EL DORADO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE ENTREGÓ EL CUARTO ENTREGABLE EL CUAL CUENTA CON CONFORMIDAD, PENDIENTE LA CONFORMIDAD DEL QUINTO ENTREGABLE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA VINCULADO A LA OBTENCION DEL PERMISO DE DERECHO DE USO DE VIA

FUNCION 20: SALUD

SECTOR	AVANCES
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.	PROYECTO CULMINADO Y RECEPCIONADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	EN EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 9.73% , EJECUTADA POR CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	EN EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 9.99% , EJECUTADA POR CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	EN EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 14.36% , EJECUTADA POR CONTRATA
ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCI	EL SERVICIO PARA LA HABILITACIÓN DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (AGUA BLANDA, AGUA OSMOTIZADA Y AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL), PARA LA PUESTA EN SERVICIO, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE LOS 09 EQUIPOS LACRADOS SE ENCUENTRA CULMINADO



FUNCION 22: EDUCACIÓN

SECTOR	AVANCES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 15,089,846.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E. SANTA ROSA, DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E. SANTA ROSA, DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 738,169.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0031 MARIA ULISES DAVILA PINEDO, EN EL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0031 MARIA ULISES DAVILA PINEDO, EN EL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE PROGRAMÓ S/ 953,975.00
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 304, EN LA LOCALIDAD DE LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INVERSIÓN CONVOCADO A PROCESO DE SELECCIÓN
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 404 DIVINO NIÑO, EN EL CENTRO POBLADO BANDA DE PISHUAYA (SISA), DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	CON FECHA 30/12/2025, SE SUSCRIBIO EL CONTRATO PARA LA EJECUCION FISICA, ASIMISMO, SE ESTIMA INICIAR LA EJECUCION EL 01/02/2026
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 315, DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	A IOARR SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100% CON LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA R.D.N° 183-2025-GRSM-PEHCBM DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2025 Y LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN CON R.D.N° 214-2025-GRSM-PEHCBM/DI DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 , CON ACTA DE TRANSFERENCIA A LA UGEL SAN MARTÍN DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2025
RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0004 TUPAC AMARU, EN EL SECTOR 9 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON PREVISIÓN PRESUPUESTAL FUE CONVOCADO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO LA BUENA PRO ESTA PROGRAMADO A OTORGARSE EL 2026



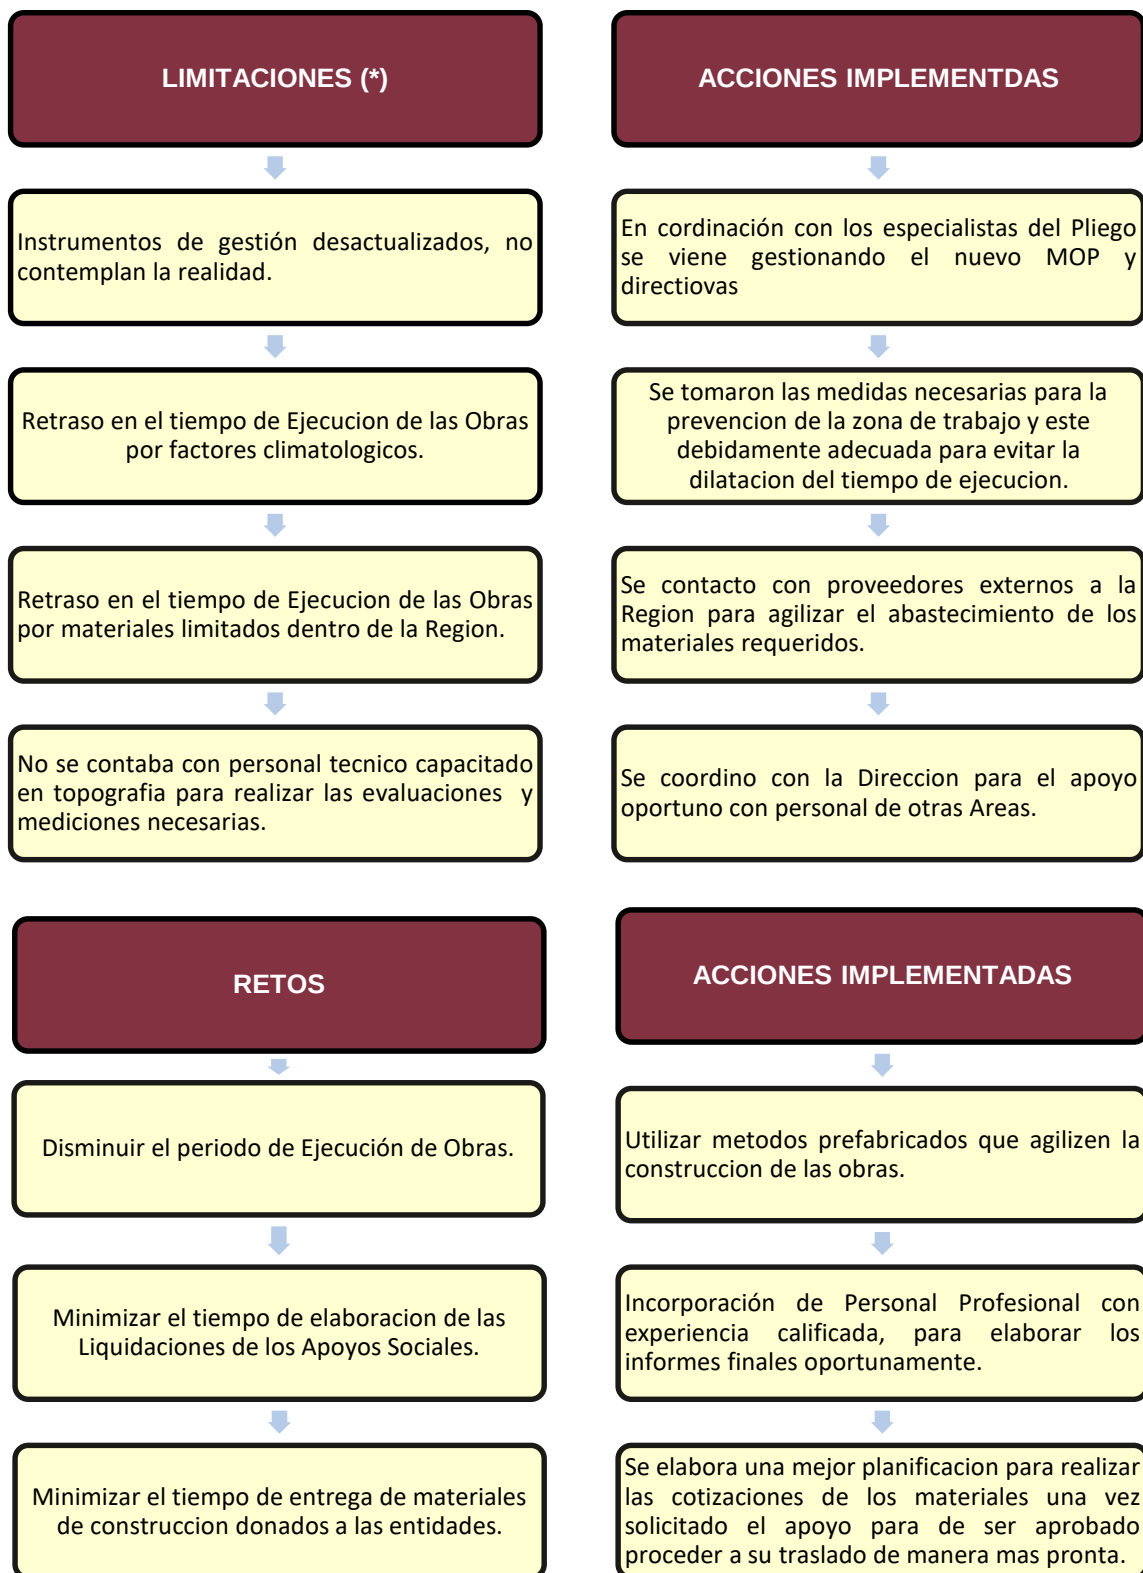
RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. MIGUEL CHUQUISONGO RAMIREZ DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	CON FECHA 22 DE MAYO DEL 2025 SE DIO INICIO LA OBRA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EMISIÓN LA R.D. DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN.
CONSTRUCCION DE AULA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y ESCALERA/ESCALINATA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E. JOSE ANTONIO RAMIREZ AREVALO DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025, SE CONVOCO EL PROCESO DE SELECCION CON PREVISION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION FISICA DE LA INVERSION IOARR
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 0426 INMACULADA CONCEPCION DE CENTRO POBLADO UCHIZA DISTRITO DE UCHIZA DE LA PROVINCIA DE TOCACHE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	EL E.T SE DESARROLLA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN DE DME (DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE). SE HA SOLICITADO EL PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO CON EL DIRECTOR Y PADRES DE FAMILIA DE LA I.E. DEL CUAL SE ESTÁ DESARROLLANDO LA ARQUITETURA DEL PROYECTO EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA, A SU VEZ SE INSPECCIONÓ EL LOCAL DE PLAN DE CONTINGENCIA
UNDEFINED DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 0656 JUAN A. MORENO RENGIFO DE CENTRO POBLADO SAPOSOA DISTRITO DE SAPOSOA DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SE CUENTA CON LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, POR LO QUE REQUIERE PRIORIZACION PARA SU FINANCIAMIENTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 0410 , DE CENTRO POBLADO BAGAZAN DISTRITO DE PACHIZA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	EL PROYECTO FUE VIABILIZADO EL 21 DE JULIO DEL 2025 Y PARA LA ELABORACIÓN DEL E.T SE PROGRAMÓ REALIZARLO EN 03 ENTREGABLES, DE LOS CUALES SE EMITIÓ LA CONFORMIDAD DEL SEGUNDO ENTREGABLE EL 24/09/2025, PENDIENTE EL 3er ENTREGABLE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CLEOFE AREVALO DEL AGUILA DE CENTRO POBLADO LA BANDA DE SHILCAYO DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	VIABILIZADO EL 01/08/2025, ESTA APTO PARA CONTINUAR CON LA ELABORACION DEL E.T. TODA VEZ QUE PRESENTA CONTRATO VIGENTE ,POR LO QUE SE ESTA GESTIONANDO LA ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES.
CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. 0418 VICTOR M. PEREZ MORALES DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, ASIMISMO, EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 SE CONVOCO EL PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA CON PREVISION PRESUPUESTAL



ANEXO N° 1E: RETOS Y LIMITACIONES

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)



ANEXO N° 4A: INFORMACIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

- POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	24,353,742	22,993,901.72	94.42
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,062,841	842,827.02	79.30
5 RECURSOS DETERMINADOS	87,157,026	84,575,778.17	97.04
TOTAL	112,573,609	108,412,506.91	96.30

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2025

- POR GENERICA DE GASTO**

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,137,351	1,427,297.69	66.78
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,436,258	106,985,209.22	96.88
TOTAL	112,573,609	108,412,506.91	96.30

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2025



CAPITULO IV: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ESTADOS FINANCIEROS

5.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PEHCBM – 2025

ANEXO N° 6: PRESUPUESTO EJECUTADO EN INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

RECURSOS ORDINARIOS		22,993,901.72
2.000270	GESTION DE PROYECTOS	8,706,551.97
2.377760	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	3,405,891.71
2.377762	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	4,127,956.41
2.377764	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	5,326,203.94
3.999999	SIN PRODUCTO	1,427,297.69
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		842,827.02
2.000270	GESTION DE PROYECTOS	842,827.02
RECURSOS DETERMINADOS		84,575,778.17
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	7,659,575.24
2.082525	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	81,626.99
2.134084	CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	65,000.00
2.234510	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.	1,192,306.27
2.280937	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	9,671,296.42
2.294298	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS, REGION SAN MARTIN	42,381.85
2.342702	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	1,615,934.10
2.464324	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	14,653,689.03
2.469597	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YARINA DEL DISTRITO DE CHIPURANA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	10,185,423.49



2.472445	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E. SANTA ROSA, DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	658,276.73
2.473315	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0031 MARIA ULISES DAVILA PINEDO, EN EL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	953,975.00
2.486486	ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA	285,000.00
2.491462	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	2,674,156.37
2.492668	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	2,862,140.64
2.493059	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	73,684.00
2.530935	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	118,600.00
2.587904	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE CUADRA N° 7, PASAJE 3 Y PROLONGACION JR. YURIMAGUAS DISTRITO DE LAMAS DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	170,000.64
2.604850	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMO EMP. PE-5NB(KM.2+520)- LA UNION-EMP. PE-5N(KM.624+900)-SECTOR CASCADA UNION-BEL	474,998.64
2.617638	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR IZQUIERDO DEL BARRIO HUAYCO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	14,141,972.87
2.617851	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 315, DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	320,880.66
2.647085	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON C07 A C13 EN EL BARRIO HUAYCO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	12,220,714.70
2.657137	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE SISA Y ANEXOS, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA DE LA PROVINCIA DE EL DORADO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MA	1,113,601.00
2.666332	RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. MIGUEL CHUQUISSENGO RAMIREZ DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	553,266.75
2.669933	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE COCO, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA DEL PEHCBM, DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO	554,532.62
2.673955	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 0426 INMACULADA CONCEPCION DE CENTRO POBLADO UCHIZA DISTRITO DE UCHIZA DE LA PROVINCIA DE TOCACHE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	335,063.42
2.676363	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 0656 JUAN A. MORENO RENGIFO DE CENTRO	186,275.00



	POBLADO SAPOSOA DISTRITO DE SAPOSOA DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
2.698160	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 0410 , DE CENTRO POBLADO BAGAZAN DISTRITO DE PACHIZA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	192,645.91
2.698317	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL SM-798- TRAMO: SAUCE ¿SANTA ROSA DE HUAYALI-ALTO SAUCE, EN EL DISTRITO DE SAUCE DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	589,004.13
2.698321	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CLEOFE AREVALO DEL AGUILA DE CENTRO POBLADO LA BANDA DE SHILCAYO DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	929,755.70
TOTAL		108,412,506.91

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2025

5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL ANTERIOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO

ANEXO N° 7: INFORMACIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

AÑO: 2024

- POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	52,789,608	50,520,681.15	95.70
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,247,155	980,815.06	78.64
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,333,966	183,741.12	13.77
5 RECURSOS DETERMINADOS	26,585,163	25,877,167.23	97.34
TOTAL	81,955,892	77,562,404.56	94.64

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2024

- POR GENERICA DE GASTO

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,955,892	77,562,404.56	94.64
TOTAL	81,955,892	77,562,404.56	94.64



FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2024

5.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIÓN

ANEXO N° 8: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIÓN

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

AÑO: 2025

FUNCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	20,268,143	19,190,784.54	94.68
AGROPECUARIA	65,000	65,000.00	100.00
TRANSPORTE	45,341,868	44,442,501.87	98.02
AMBIENTE	42,383	42,381.85	100.00
SANEAMIENTO	12,467,507	11,550,652.12	92.65
SALUD	14,957,694	14,337,358.33	95.85
EDUCACION	19,431,014	18,783,828.20	96.67
TOTAL	112,573,609	108,412,506.91	96.30

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2025



ANEXO N° 6: PANEL FOTOGRAFICO EN PROYECTOS 2025



Nombre del Proyecto:	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2082525	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	5,054	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	73,037,898.91	
Monto Ejecutado:	950,392.40	
Avance Físico :	59.05% (Exp. Téc)	
Avance Financiero :	1.3 %	
Estado del Proyecto:	Expediente Técnico	

Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN				
Código UNIFICADO:	2134084				
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM				
Población Beneficiada:	1298				
Horizonte del Proyecto:	10 años				
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta				
Inversión Total:	68,273,510.84				
Monto Ejecutado:	65,960,472.84				
Avance Físico :	100.00%				
Avance Financiero :	96.6 %				
Estado del Proyecto:	Culminada				

CÓDIGO UNICO	CÓDIGO	CÓDIGO SUP	EST	FECHA DE REGISTRO	ESTADO
NOMBRE DE LA INVERSIÓN					
CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN					
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMP?	☒

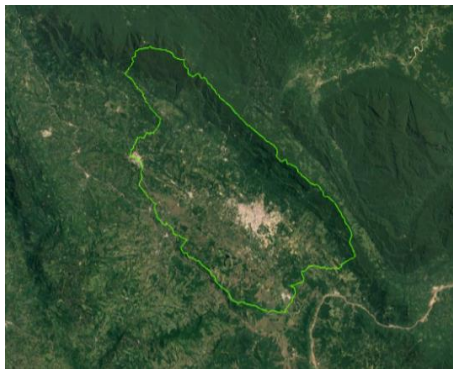
LIMITACIONES	
OPM	OPM DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
UNIDAD FORMULADORA (UF)	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UE)	EL PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN			
SITUACIÓN	VALOR	COSTO DE INVERSIÓN VISIBLE / APROBADO (USD)	30/07/2018
FECHA DE VALIDACIÓN/REVISIÓN	30/11/2018	COSTO DE CONTROL CONCURRENTE (USD)	0.00
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETTO DE EMERGENCIA	NO	COSTO TOTAL DE INVERSIÓN VISIBLE / APROBADO (USD)	30/07/2018
CATEGORÍA FONCIARIA	AGROPECUARIO - PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA - IRRIGACIÓN	BENEFICIARIOS (MILES DE HABITANTES)	1.776

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.	
Código UNIFICADO:	2234510	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	38,354	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	55,985,849.94	
Monto Ejecutado:	55,985,849.21	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	Culminada	



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2280937	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	6,229	
Horizonte del Proyecto:	09 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	53,632,953.77	
Monto Ejecutado:	53,207,382.7	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	99.20%	
Estado del Proyecto:	Culminada	

Nombre del Proyecto:	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS, REGION SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2294298	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	50,427	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Directa	
Inversión Total:	35,953,830.06	
Monto Ejecutado:	684,329.07	
Avance Físico :	32.00% (Exp. Téc)	
Avance Financiero :	1.90%	
Estado del Proyecto:	Expediente Técnico	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2342702	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	10,299	
Horizonte del Proyecto:	09 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	34,750,998.34	
Monto Ejecutado:	34,550,665.16	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	99.40%	
Estado del Proyecto:	Culminada	



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2377760	 Network: 20 dic 2025 9:58:53 a.m. GMT-05:00 18M 357298 9299699 254° W Pt Cercado de Pongo de Caynarachi Sector 2 Pongo de Caynarachi Lamas San Martín	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM		
Población Beneficiada:	8,003		
Horizonte del Proyecto:	10 años		
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta		
Inversión Total:	57,590,905.37		
Monto Ejecutado:	16,660,559.46		
Avance Físico :	9.73%		
Avance Financiero :	28.92%		
Estado del Proyecto:	En ejecución física		

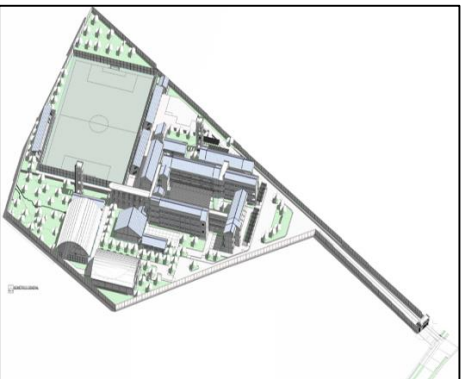
Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2377762	 18/2/2026 11:56 a.m. 6.5704S - 76.1326W Chazuta, San Martín 22310 #Estructuras PEHCBM
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	8,218	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	54,173,589.55	
Monto Ejecutado:	18,232,758.24	
Avance Físico :	9.99%	
Avance Financiero :	33.66%	
Estado del Proyecto:	En ejecución física	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS-DEPARATAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2377764	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	20,977	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	54,556,030.67	
Monto Ejecutado:	18,189,052.44	
Avance Físico :	14.36%	
Avance Financiero :	33.34%	
Estado del Proyecto:	En ejecución física	

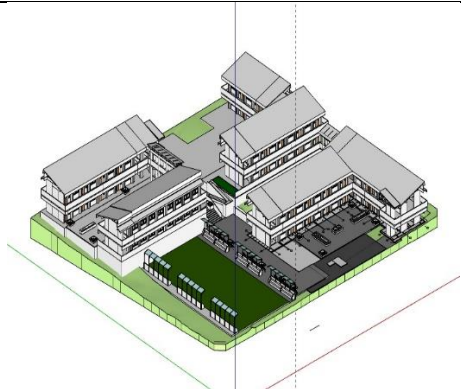


Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2464324	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	1,430	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	40,510,147.95	
Monto Ejecutado:	24,288,689.03	
Avance Físico :	42.91%	
Avance Financiero :	59.96%	
Estado del Proyecto:	En ejecución física	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YARINA DEL DISTRITO DE CHIPURANA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2469597	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	2,929	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	33,442,972.77	
Monto Ejecutado:	10,747,174.71	
Avance Físico :	9.25%	
Avance Financiero :	32.14%	
Estado del Proyecto:	En ejecución física	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA I.E. SANTA ROSA, DE LA CIUDAD DE TARAPOTO , DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2472445	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	1,486	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	47,269,839.95	
Monto Ejecutado:	1,217,219.73	
Avance Físico :	60.00% (Exp. Téc)	
Avance Financiero :	2.58%	
Estado del Proyecto:	Expediente Técnico	



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0031 MARÍA ULISES DAVILA PINEDO, EN EL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2473315	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	1,154	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	20,949,990.01	
Monto Ejecutado:	1,234,405.00	
Avance Físico :	80.00% (Exp. Téc)	
Avance Financiero :	5.90%	
Estado del Proyecto:	Expediente Técnico	

Nombre del Proyecto:	ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN				
Código UNIFICADO:	2486486				
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM				
Población Beneficiada:	0				
Horizonte del Proyecto:	05 meses				
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta				
Inversión Total:	10,335,692.41				
Monto Ejecutado:	10,285,692.41				
Avance Físico :	100.00%				
Avance Financiero :	99.50%				
Estado del Proyecto:	Culminada				

CÓDIGO UNICO	2486486	CÓDIGO DAP	2486486	FECHA DE REGISTRO	23/04/2020
NOMBRE DE LA INVERSIÓN		ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN			
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	IGAR	USE ENCUESTA PROGRAMADA EN EL IMPI	

I. INSTITUCIONALIDAD	
OPM	OPM DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
UNIDAD FORMULADORA (UF)	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	UEI PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN			
SITUACIÓN	APROBADO 	COSTO DE INVERSIÓN VÍABLE / APROBADO (\$/MIL)	1,020,000.00
FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	23/04/2020	COSTO DE CONTROL CONCIENCIA (\$/MIL)	0.00
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETOS DE EMERGENCIA	SI, NO O N/A 2020 PCM	COSTO TOTAL DE INVERSIÓN VÍABLE / APROBADO (\$/MIL)	1,020,000.00
CADENA FUNCIONAL	SAÚDE - SAÚDE INDIVIDUAL - ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	0
		UBICACIÓN	



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2491462	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	1,450	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	12,762,963.28	
Monto Ejecutado:	6,254,256.70	
Avance Físico :	10.09% (Saldo de obra)	
Avance Financiero :	49.00%	
Estado del Proyecto:	En ejecución física	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N-SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2492668	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	3,479	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	15,264,775.08	
Monto Ejecutado:	7,518,607.04	
Avance Físico :	6.79% (Saldo de obra)	
Avance Financiero :	49.25%	
Estado del Proyecto:	En ejecución física	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2493059	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	750	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	9,942,907.46	
Monto Ejecutado:	706,218.28	
Avance Físico :	9.41% (Saldo de obra)	
Avance Financiero :	7.10%	
Estado del Proyecto:	En ejecución física	



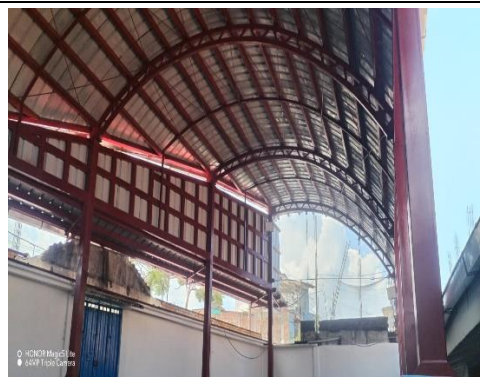
Nombre del Proyecto:	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2530935	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	424	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	11,931,691.43	
Monto Ejecutado:	376,000.00	
Avance Físico :	100.00% (Exp. Téc)	
Avance Financiero :	3.20%	
Estado del Proyecto:	Expediente Técnico	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE CUADRA N° 7, PASAJE 3 Y PROLONGACION JR. YURIMAGUAS DISTRITO DE LAMAS DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2587904	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	10	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	1,121,494.01	
Monto Ejecutado:	966,418.19	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	86.20%	
Estado del Proyecto:	Culminada	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMO EMP. PE-5NB(KM.2+520)- LA UNION-EMP. PE-5N(KM.624+900)-SECTOR CASCADA UNION-BELLO HORIZONTE- EMP. PE-5N(KM.630+060) DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2604850	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	2,661	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	44,298,642.78	
Monto Ejecutado:	474,998.64	
Avance Físico :	63.24% (Exp. Téc)	
Avance Financiero :	1.10%	
Estado del Proyecto:	Expediente Técnico	



Nombre del Proyecto:	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR IZQUIERDO DEL BARRIO HUAYCO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2617638	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	4,090	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	18,319,847.63	
Monto Ejecutado:	14,276,929.57	
Avance Físico :	89.02%	
Avance Financiero :	77.93%	
Estado del Proyecto:	En ejecución física	

Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 315, DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2617851	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:		
Horizonte del Proyecto:	03 meses	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	395,197.00	
Monto Ejecutado:	320,880.66	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	81.20%	
Estado del Proyecto:	Culminada	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON C_07 A C_13 EN EL BARRIO HUAYCO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2647085	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	3,783	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	21,719,774.36	
Monto Ejecutado:	12,407,714.70	
Avance Físico :	55.49%	
Avance Financiero :	57.13%	
Estado del Proyecto:	En ejecución física	



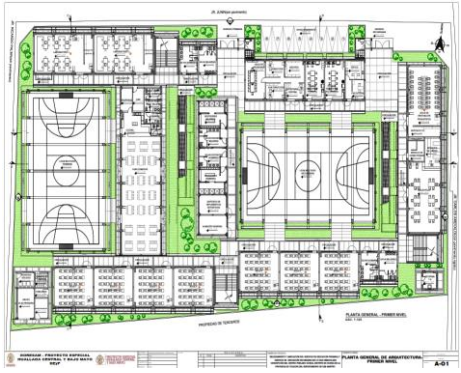
Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE SISA Y ANEXOS, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA DE LA PROVINCIA DE EL DORADO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2657137	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	20,822	
Horizonte del Proyecto:	20 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	103,921,831.93	
Monto Ejecutado:	1,477,552.00	
Avance Físico :	39.38% (Exp. Téc)	
Avance Financiero :	1.40%	
Estado del Proyecto:	Expediente Técnico	

Nombre del Proyecto:	RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. MIGUEL CHUQUISONGO RAMIREZ DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2666332	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:		
Horizonte del Proyecto:	03 meses	
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta	
Inversión Total:	676,369.00	
Monto Ejecutado:	553,266.75	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	81.80%	
Estado del Proyecto:	Culminada	

Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION DE AULA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y ESCALERA/ESCALINATA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E. JOSE ANTONIO RAMIREZ AREVALO DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2668712	PRESUPUESTO RESUMEN	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM		
Población Beneficiada:			
Horizonte del Proyecto:	04 meses		
Modalidad de ejecución:	Administración Indirecta		
Inversión Total:	1,935,820.17	COSTO DIRECTO (CD)	1,289,383.62
Monto Ejecutado:	0.00	GASTOS GENERALES (GG = 12.58% CD)	162,204.46
Avance Físico :	0.00%	UTILIDAD (UT) = 5% CD)	64,469.18
Avance Financiero :	0.00%	COSTO PARCIAL (CP = CD+GG+UT)	1,516,057.26
Estado del Proyecto:	Expediente Técnico	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV = 18% CP)	272,890.31
		COSTO DE EJECUCION DE OBRA (CO=CP+IGV)	1,788,947.57
		COSTO DE SUPERVISION DE OBRA (S.21% CO)	146,872.60
		PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION	1,935,820.17



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE COCO, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA DEL PEHCBM, DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2669933	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	1,169	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Directa	
Inversión Total:	23,271,313.04	
Monto Ejecutado:	554,532.62	
Avance Físico :	90.00% (Act. Exp. Téc)	
Avance Financiero :	2.40%	
Estado del Proyecto:	Expediente Técnico	

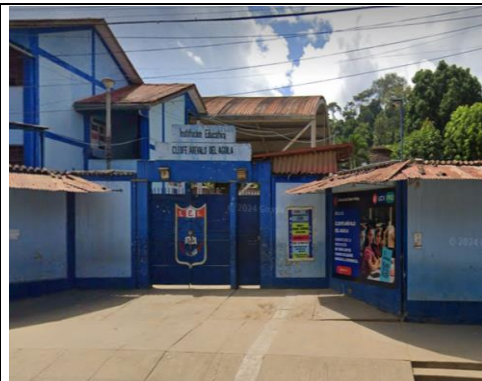
Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 0426 INMACULADA CONCEPCION DE CENTRO POBLADO UCHIZA DISTRITO DE UCHIZA DE LA PROVINCIA DE TOCACHE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2673955	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	613	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Directa	
Inversión Total:	12,572,561.18	
Monto Ejecutado:	335,063.42	
Avance Físico :	64.49% (Exp. Téc)	
Avance Financiero :	2.70%	
Estado del Proyecto:	Expediente Técnico	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 0656 JUAN A. MORENO RENGIFO DE CENTRO POBLADO SAPOSOA DISTRITO DE SAPOSOA DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2676363	FICHA TÉCNICA 1. Nombre del Proyecto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 0656 JUAN A. MORENO RENGIFO DE CENTRO POBLADO SAPOSOA DISTRITO DE SAPOSOA DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 2. Código Único de Inversiones : 2676363 3. Modalidad de Ejecución : Por Contrata 4. Ubicación Geográfica : Departamento: San Martín Provincia: Huallaga Distrito: Saposoa 5. Unidad Ejecutora : PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	331	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Directa	
Inversión Total:	20,431,624.96	
Monto Ejecutado:	186,275.00	
Avance Físico :	45.00% (Exp. Téc)	
Avance Financiero :	0.90%	
Estado del Proyecto:	Expediente Técnico	



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 0410 , DE CENTRO POBLADO BAGAZAN DISTRITO DE PACHIZA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2698160	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	662	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Directa	
Inversión Total:	19,603,542.47	
Monto Ejecutado:	192,645.91	
Avance Físico :	35.00% (Exp. Téc)	
Avance Financiero :	1.00%	
Estado del Proyecto:	Expediente Técnico	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL SM-798- TRAMO: SAUCE ¿SANTA ROSA DE HUAYALI-ALTO SAUCE, EN EL DISTRITO DE SAUCE DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2698317	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	6,063	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Directa	
Inversión Total:	72,686,070.78	
Monto Ejecutado:	589,004.13	
Avance Físico :	80.00% (Exp. Téc)	
Avance Financiero :	0.80%	
Estado del Proyecto:	Expediente Técnico	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CLEOFE AREVALO DEL AGUILA DE CENTRO POBLADO LA BANDA DE SHILCAYO DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2698321	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	2,342	
Horizonte del Proyecto:	10 años	
Modalidad de ejecución:	Administración Directa	
Inversión Total:	55,720,105.15	
Monto Ejecutado:	929,755.7	
Avance Físico :	70.00% (Exp. Téc)	
Avance Financiero :	1.70%	
Estado del Proyecto:	Expediente Técnico	

