

ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4



MEMORIA ANUAL 2024

PROYECTO ESPECIAL HULLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



MEJORAMIENTO I.E 0106 ALFONSO UGARTE



ÍNDICE

RESÚMEN EJECUTIVO

PRESENTACIÓN

CAPÍTULO I: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CAPÍTULO II: FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

CAPÍTULO III: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN

CAPÍTULO V: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ESTADOS FINANCIEROS

ANEXOS



RESÚMEN EJECUTIVO

El presente documento es de carácter público, cuya finalidad es dar a conocer a la población de San Martín los resultados y logros más relevantes de la gestión durante el año fiscal 2024 de los diferentes proyectos ejecutados por el Unidad Ejecutora 018 – Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (001263). Se presenta una estructura de cinco (05) capítulos, los cuales tienen el siguiente contenido:

Capítulo I.- El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; describe información general, creación, miembros del Consejo Directivo, Base Legal y Estructura Orgánica.

Capítulo II.- Fases del Proceso de Planeamiento, Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico

Capítulo III.- Lineamientos Estratégicos; descripción de la Visión Institucional, Misión Institucional, Componentes y Objetivos Estratégicos.

Capítulo IV.- Resultados de la gestión, se realiza la descripción de los logros obtenidos en los diferentes proyectos ejecutados, por los órganos de Línea, representado por las Direcciones que conforman el PEHCBM. Los Componentes se encuentran alineados a los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

Capítulo V.- Ejecución Presupuestal del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo en el año fiscal 2024, y los estados financieros.

Finalizando el documento presentamos el panel fotográfico ordenado de los principales proyectos en ejecución, actividades realizadas y otros, en cada uno de los componentes



PRESENTACIÓN

La Memoria Anual 2024, es un documento consolidado resultante de la sistematización de la información proporcionada y actividades oficiales, informadas por las Direcciones de Línea del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; con el objetivo de presentar y publicar los resultados de la gestión durante el año fiscal 2024, los mismos que están orientados al cumplimiento progresivo de las metas, objetivos y visión contemplados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado.

El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo ha consolidado y sistematizado la presente MEMORIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2024, dentro del Marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, teniendo en común alcanzar objetivos y metas planteadas de acuerdo a la visión Regional e Institucional, nuestras Autoridades, funcionarios, profesionales y técnicos han contribuido con su esfuerzo para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos del año 2024.

Es importante indicar que la gestión se ha orientado a realizar acciones concretas con el fin de lograr los Objetivos Estratégicos planteados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Estratégico Institucional, donde se definen componentes de acuerdo a los lineamientos que establece el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

En este contexto, de manera sistematizada y sintetizada, la Gerencia General de la Entidad, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, presenta este documento de carácter público donde se describe las ejecuciones de programas, proyectos actividades y presupuestos con sus respectivos resultados y logros durante el año fiscal 2024, finalmente presentamos los estados financieros al pliego; aspectos que ponemos a disposición de la sociedad regional y nacional en cumplimiento a la práctica de nuestros principios y valores.



CAPITULO I: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en adelante el PEHCBM, es la unidad ejecutora del Gobierno Regional de San Martín, según el Artículo 1º del MOP el PEHCBM es un organismo desconcentrado de ejecución del Pliego Gobierno Regional San Martín, cuya finalidad es contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región, con innovación, productividad y competitividad, mediante la ejecución de inversión pública y promoción de la inversión privada, con enfoque territorial y gestión de cuencas, cierre de brechas económico social, con transparencia, equidad y responsabilidad dentro de su ámbito geográfico de acción. Desarrolla sus actividades en las provincias de Tocache, Mariscal Cáceres, Bellavista, Picota, Huallaga, el Dorado, San Martín y Lamas del departamento de San Martín.

Dirección : Jr. Proyecto N° 347 –Tarapoto – San Martín
N° de RUC : 20148168955
Teléfonos : (042) 522508
Página Web : <http://www.pehcbm.gob.pe>



1.1.1. CREACIÓN

Mediante Decreto Ley N° 22517 del 01 de mayo del año 1979, se crea la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; con el encargo de ejecutar el Proyecto de Desarrollo de las Tierras de Ceja de Selva en el área de Huallaga Central y Bajo Mayo, en el departamento de San Martín.

Mediante Decreto Supremo N° 019-2007, a partir del 1 de abril del 2007 el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en el marco del proceso de descentralización, es transferido al Gobierno Regional de San Martín. Desde entonces venimos trabajando conforme a los lineamientos de desarrollo del Gobierno Regional en la búsqueda de la competitividad con inclusión social y sostenibilidad ambiental, manteniendo su autonomía técnica, económica y administrativa como unidad ejecutora; siendo su ámbito de aplicación las siguientes Provincias: Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, San Martín, El Dorado, Bellavista, Picota y Tocache, conforme a la demarcación política vigente.



1.2. MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2024



1.3. DIRECTORIO DEL PEHCBM 2024

	Ing. JAVIER SINTI FLORES Gerente General
	Ing. JHON ERICK RAMIREZ DEL CASTILLO Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	Abog. PIERYNA CHAVEZ RUIZ Oficina de Asesoría Jurídica
	Lic. LUIS AUGUSTO GARCIA MEZA Oficina de Administración
	Ing. LEYDY TORRES MENDOZA Dirección de Gestión Ambiental
	Ing. HOMERO MENDOZA PINCHI Dirección de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión Privada
	Ing. EDWIN ERNESTO PÉREZ ZAVALETA Dirección de Infraestructura
	Ing. JITLER ULISES VALVERDE MONTOYA Dirección de Estudios de Inversiones



1.4. BASE LEGAL

- Decreto Ley N°22517 Creación del PEHCBM.
- Decreto Supremo N°044-2007-EF, que como Unidad Ejecutora del Pliego Gobierno Regional de San Martín al Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
- Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley N° 27867.
- La Constitución Política del Perú; Ley N°27680.
- Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902 y N° 28013, reconocen que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
- La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, establece que los Gobiernos Regionales tienen la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de sus competencias.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias
- Ley Marco del Presupuesto Participativo
- Ley N° 31953 de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024
- Ley N° 29785 Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política de Modernización.
- Directiva N° 002-2022-GRSM/GRPyP-SGDI, Normas y Procedimientos para la presentación de la Memoria Anual de Gestión Institucional del Gobierno Regional de San Martín.



1.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

01. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

- 01.1. Consejo Directivo
- 01.2. Gerencia General

02. ÓRGANOS DE CONTROL

- 02.1. Oficina de Control Institucional

03. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- 03.1. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 - 03.1.1. Área de Planeamiento
 - 03.1.1. Área de Presupuesto

- 03.2. Oficina de Asesoría Jurídica

04. ÓRGANO DE APOYO

- 04.1. Oficina de Administración
 - 0.4.1.1 Área de Recursos Humanos
 - 0.4.1.2 Área de Abastecimiento
 - 0.4.1.3 Área de Contabilidad
 - 0.4.1.4 Área de Tesorería
 - 0.4.1.5 Área de Patrimonio
 - 0.4.1.6 Área de Gestión Documental, Archivo y Atención al Ciudadano
 - 0.4.1.7 Área de Tecnologías de Información


05. ÓRGANOS DE LINEA

- 0.5.1 Dirección de Estudios de Inversiones
 - 0.5.1.1 Área de Maquinaria y Taller
- 0.5.2 Dirección de Infraestructura
 - 0.5.2.1 Área de Ejecución y Supervisión de obras
 - 0.5.2.2 Área de Liquidación de Obras
- 0.5.3 Dirección de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión Privada
- 0.5.4 Dirección de Gestión Ambiental




Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo

Estructura Orgánica

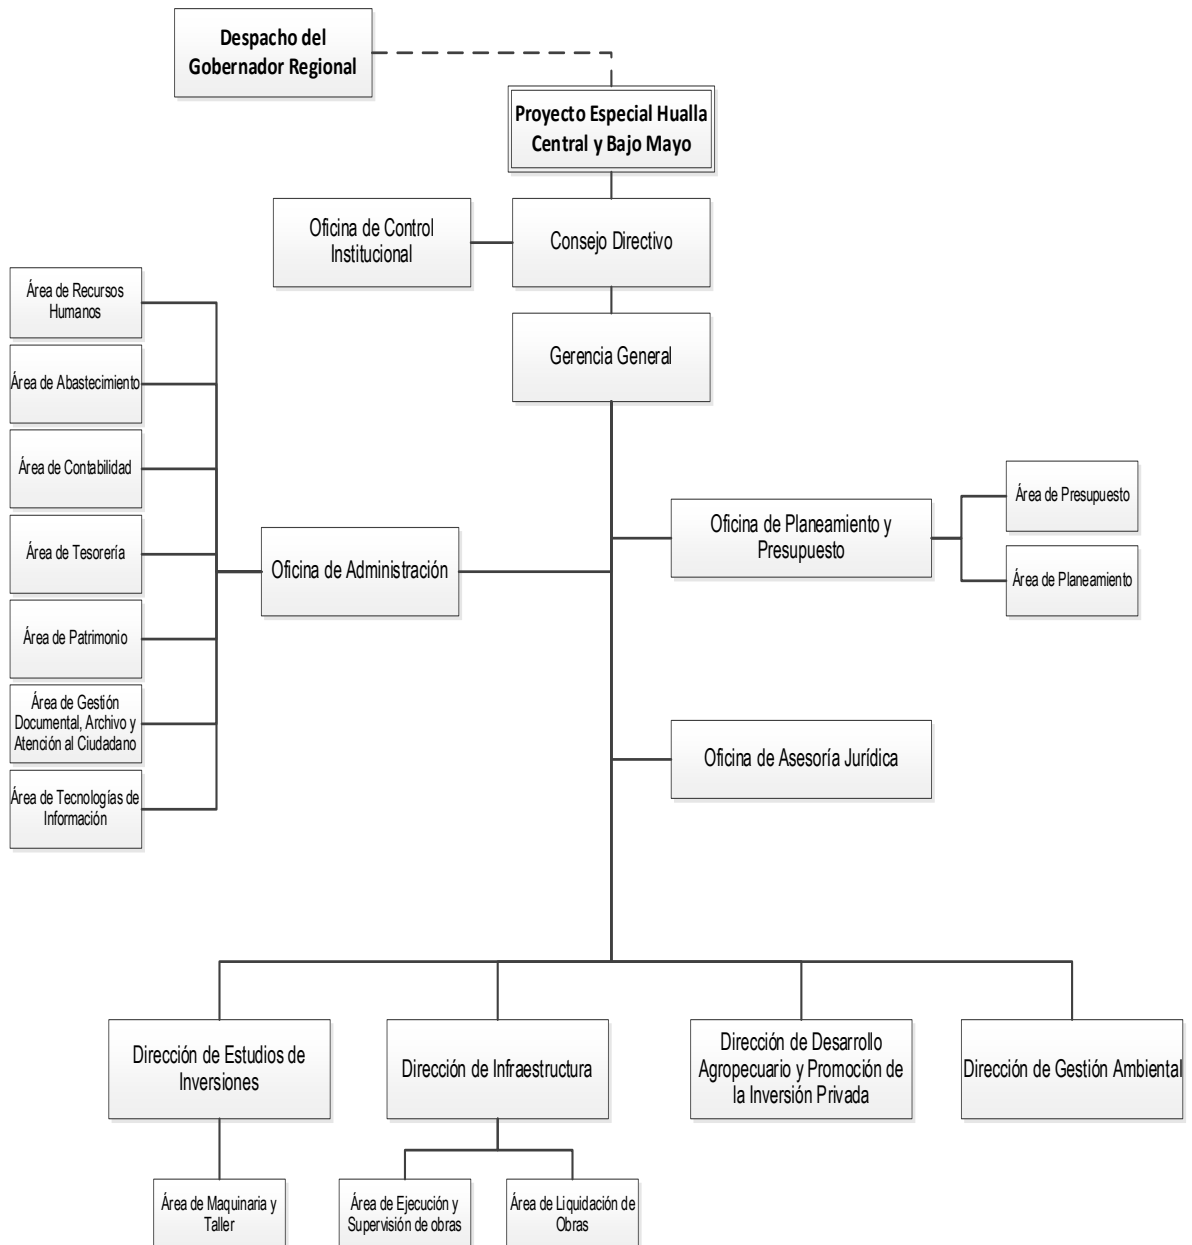

CAPÍTULO II: FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Seguimiento y evaluación en el ciclo de planeamiento

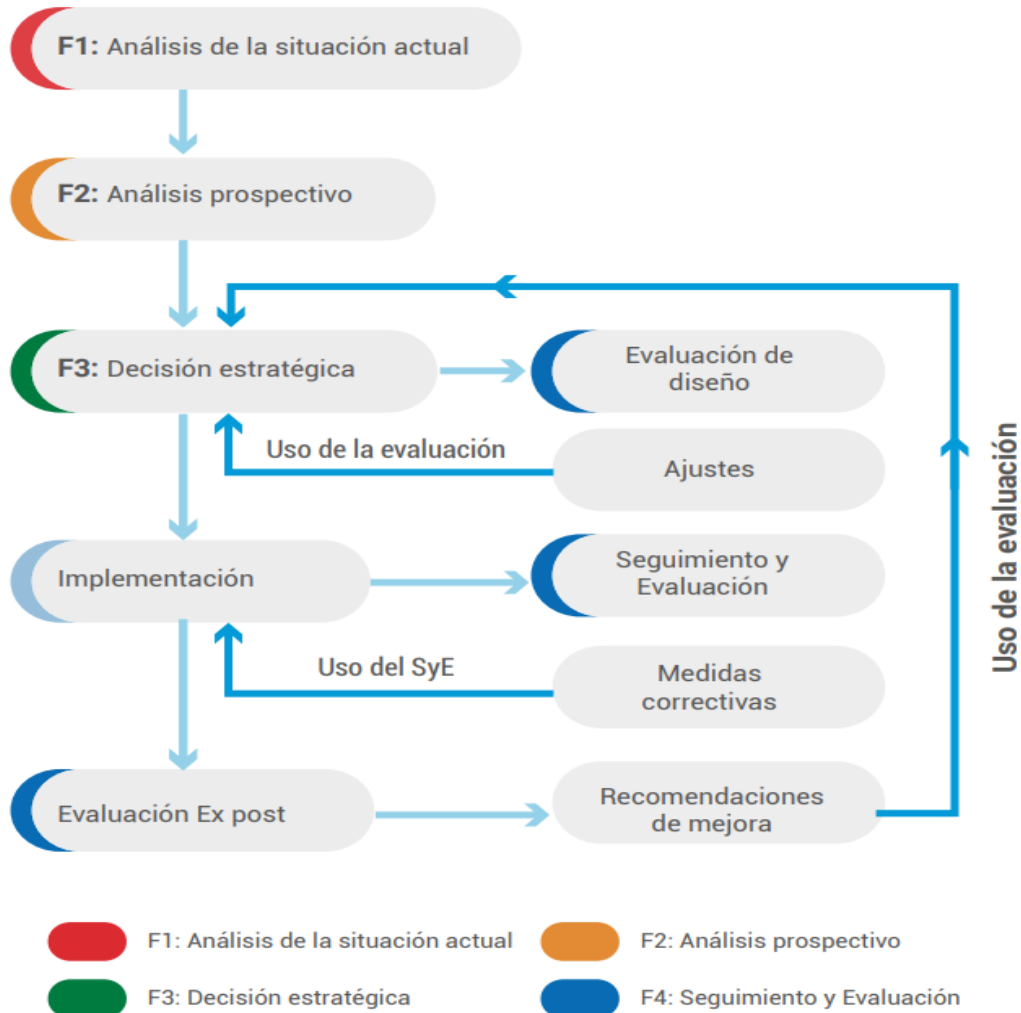

Para la actualización de políticas y planes estratégicos, se aplica un ciclo compuesto por las cuatro fases siguientes:

Fase 1: Análisis de la situación actual

Se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar, mediante la caracterización y el diagnóstico de variables que definen la situación actual. Se describe el territorio, los recursos disponibles (físicos, ambientales, económicos, sociales, culturales), sus interrelaciones y las condiciones de vida de su población. Mediante el diagnóstico, se relevan los problemas, las necesidades y prioridades de la población; las brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos de calidad que deben ser cerradas para mejorar su calidad de vida; y las intervenciones de actores que operan en el territorio (sector público, privado y sociedad civil). Mediante este análisis, se obtiene una imagen del territorio actual que reconoce y valora la diversidad de las realidades locales.



Fase 2: Análisis prospectivo

Se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se define la imagen del territorio deseado. El análisis de futuro identifica tendencias, oportunidades, riesgos, escenarios contextuales, escenarios disruptivos y alertas tempranas que podrían afectar, en forma positiva o negativa, la provisión de servicios y el bienestar de las personas. La imagen del territorio deseado representa una situación más favorable que la actual, factible de ser alcanzada en un periodo dado mediante la acción coordinada del Estado. Se construye de forma concertada, a partir del conocimiento integral de la realidad y el análisis de futuro.

Fase 3: Decisión estratégica

Se definen las políticas públicas, de forma articulada entre sectores y niveles de gobierno, orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado, a través de objetivos prioritarios y lineamientos. Las políticas se reflejan en planes con objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y acordes con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) y en acciones de orden estratégico priorizadas. Al actualizar los planes, se incluyen acciones de prevención de riesgo de desastres y evaluaciones de simulacros de eventos que podrían causar pérdidas en el bienestar de las personas (contingencias) y afectar el logro del futuro deseado.

Fase 4: Seguimiento y evaluación.

Se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, así como el uso de los recursos asignados con ese fin. Además, se analizan los cambios ocurridos en la vida de las personas (esperados o no esperados) y se generan informes periódicos que permiten identificar alternativas para mejorar políticas y planes, con respecto a su diseño o implementación, para el logro de los objetivos planteados. De esta manera, los informes de seguimiento y evaluación retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que está orientado a resultados favorables para el bienestar de las personas.



CAPITULO III: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN INSTITUCIONAL

VISIÓN INSTITUCIONAL

Al 2030, San Martín es modelo de región en bienestar social, competitividad y valoración de nuestros recursos naturales y diversidad. (PDRC SM AL 2030)

MISIÓN INSTITUCIONAL

Organizar y conducir la gestión pública regional promoviendo el desarrollo integral sostenible a través de la inversión pública y privada, el empleo, el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades en el departamento de San Martín, de manera íntegra, transparente, competitiva e inclusiva. (PEI 2024-2028)

MAPA DEL MODELO CONCEPTUAL SAN MARTÍN: COMPONENTES Y SUB COMPONENTES



CAPITULO IV: RESULTADOS DE GESTIÓN

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

RESULTADOS DE LA GESTIÓN PERIODO 2024

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 10 AGROPECUARIA

2134084 CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra	: 25 de enero del 2013
Fecha de Culminación Programada	: 31 de abril del 2014
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 15 de junio del 2014
Fecha de Transferencia Programada	: 9 de agosto del 2014
Avance Físico Acumulado al 2024	: 0%
Avance Físico Solo 2024	: 100%

El Proyecto beneficiará a 1,298 personas. El área del proyecto está ubicada en una zona pobre, la falta del recurso hídrico hace que no puedan tener mayores posibilidades de producción agrícola, debido a que cultivan al secano poniendo en riesgo los sembríos en un medio de altas temperaturas, debido a que están condicionados a la lluvia. La Infraestructura de Riego- Captación Construcción de Estructura de Captación en el Río Ponaza ubicado en el Km 42.00 de la carretera Picota , aguas arriba del centro poblado Alfonso Ugarte, que comprende la Estructura del barraje mixto (fijo y móvil) de concreto armado de 27.70 m ,bocal de captación de concreto armado ,con dos ventanas de captación , mecanismo de izaje y compuertas metálicas ,con una poza disipadora aguas abajo del barraje , un desarenador y un canal de aproximación con una longitud de 44.30 m, que permitirá captar permitirá asegurar el ingreso continuo de un caudal máximo de 2.60 m3/s, que permitirá cubrir la demanda de los cultivos. - Conducción Está conformado por un canal principal telescópico de sección trapezoidal revestida con fc 175 kg/cm2, con una longitud de 38.50 Km, presenta tres tramos: Tramo I del Km 0+000 al Km16+880, de capacidad de condición de 2.60 m3/ seg. y longitud de 16880 m, Tramo II del Km 18+155 al Km 27+910 de capacidad de 1.70 m3/seg

EVALUACION FINANCIERA (\$)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	115,000	50,000	43.48	Informe	1.000	1.000



Este Proyecto se cuenta **culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 50,000** que significa el **43.48 %** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2024.

:

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 12 ENERGIA

2626982 REUBICACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA) RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (POSTES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN), EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, PUERTO LIMON, NUEVO CHANCHAMAYO Y LA DIVISORIA, DISTRITO DE BAJO BIAVO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.

Inicio de Obra : 24 de febrero del 2024
Fecha de Culminación Programada : 18 de marzo del 2024
Fecha de Recepción De Obra Programada : 17 de mayo del 2024
Fecha de Transferencia Programada : 6 mayo del 2025
Avance Físico Acumulado al 2024 : 100%
Avance Físico Solo 2024 : 100%

La presente IOARR, consiste en la reubicación de interferencias constituidas por redes e infraestructuras eléctricas de baja y media tensión que interfieren con la construcción de la Obra "Mejoramiento del camino vecinal Santa Rosa, Santa Fé, Limón, la Primavera, Nuevo Chanchamayo, la Divisora, el Ponal del Valle del Bombonajillo, distrito de Bajo Biavo – Bellavista – San Martín".

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	130,003	130,000	99.99	Porcentaje	100.000	100.000

Este Proyecto se cuenta **culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 130,000** que significa el **99.99 %** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2024.

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 15 TRASPORTE

2280937 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN.

Inicio de obra principal : 24 de enero del 2010
Fecha de Culminación Programada de obra Principal : 16 de julio del 2021
Inicio de Saldo de Obra : 14 de diciembre del 2024
Fecha de Culminación Programada de saldo de obra : 11 de junio del 2025
Fecha de Recepción De Obra Programada : 11 de agosto del 2025
Fecha de Transferencia Programada : 11 de noviembre del 2025
Avance Físico Acumulado al 2024 : 80.00%



Avance Físico Solo 2024

: 0.47%

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 6,229 personas; La población afectada esa conformada por las localidades Chazuta, Tununtunumba, LLucanayacu, Shilcayo, Túpac Amaru, Curiyacu los cuales al año 2,014 suman 6229 personas, actualmente dedicadas a la agricultura y ganadería. Los principales productos que se cultivan en la zona son: El Cacao, Maíz Amarillo Duro, Plátano, Yuca, Café y a la crianza de ganado vacuno, siendo actualmente el mercado de consumo la ciudad de Tarapoto y Yurimaguas su producción lo trasladan a través del río Huallaga hasta la localidad Chazuta y desde ahí en vehículos hasta la ciudad de Tarapoto y a la ciudad de Yurimaguas a través del Río Huallaga, el distrito de Chazuta según el mapa de pobreza distrital publicado por FONCODES se encuentra en el Quintil 1 mientras que para la cobertura de servicios básicos: población sin agua es de 88%, sin desagüe / letrinas es de 19%, sin electricidad es de 56 %, con respecto a la tasa de analfabetismo de mujeres es de 17%.

EVALUACION FINANCIERA (\$)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
3,038,759	3,998,479	3,998,478.59	100	Kilometro	0.100	0.100

Este Proyecto se encuentra en **ejecución física**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 3,998,478.59** que significa el **100 %** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2024.

Con fecha 29/11/2024 se firmó el contrato N° 024-2024-GRSM-PEHCBM/PS para la ejecución del saldo de obra, con el consorcio ejecutor CURIYACU y el 05/12/2024 se firmó el contrato N° 027-2024-GRSM-PEHCBM/PS para la supervisión de la ejecución del saldo de obra, con el consorcio vial san martin. Asimismo, la obra inicio el 14/12 2024, la valorización N°01 del periodo 14-31 de diciembre se encuentra en evaluación.

2342702 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN

Inicio de obra principal	: 10 de mayo del 2022
Fecha de Culminación Programada de obra Principal	: 14 de marzo del 2024
Inicio de Obra Complementaria	: 27 de diciembre del 2024
Fecha de Culminación Programada de obras complementaria	: 27 de marzo del 2025
Fecha de Recepción De Obra Programada de obra complementaria	: 27 de mayo del 2025
Fecha de Transferencia Programada de obra complementaria	: 27 de julio del 2025
Avance Físico Acumulado a Dic 2024 de la obra principal	: 87.94%
Avance Físico Solo 2024	: 10.76%

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 10,229 personas; El presente estudio nace ante por la necesidad de proveer una adecuada vía de transitabilidad de vehículos menores, así como mejorar las condiciones de habitabilidad y el uso adecuado de las áreas públicas; que se presentan entre las localidades de Santa Rosa, Santa Fe, limón, la primavera, Nuevo Chanchamayo, La Divisoria, El Ponal. Los habitantes de los centros poblados Santa Rosa, Santa Fe, limón, la primavera,



Nuevo Chanchamayo, La Divisoria, El Ponal, pertenecen al distrito de Bajo Biavo, Provincia de Bellavista - San Martín. Desde hace mucho tiempo vienen sufriendo las fuertes crecidas de los ríos para poder acceder de un lugar a otro.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
2,428,451	2,428,451	1,971,982.59	81.20	Kilometro	2.480	2.480

Este Proyecto se encuentra en **ejecución física**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 1,971,982.59** que significa el **81.20 %** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2024.

Con fecha 05/11/2024 mediante RD N°111-2024-GRSM-PEHCBM/DEYP se aprueba el expediente técnico de obras complementarias del proyecto, por el monto de s/ 2,816,246.30 con IGV, y un plazo de ejecución de 90 días calendario. Además, se cuenta en proceso de selección la AS-SM-12-2024-GRSM-PEHCBM/CS-1 para la ejecución de obras complementarias del proyecto, inicio la ejecución física. Con respecto a la AS-SM-13-2024-GRSM-PEHCBM/CS-1 para la supervisión, tiene fecha programada para el otorgamiento de la buena pro el 15/01/2025

2491462 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

Inicio de Obra	: 23 de marzo del 2023
Fecha de Culminación Programada	: 30 de setiembre del 2023
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 30 de noviembre del 2023
Fecha de Transferencia Programada	: 31 de diciembre del 2023
Avance Físico Acumulado al 2024	: 55.33%
Avance Físico Solo 2024	: 0%

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 1,450 personas; el proyecto facilitará en el transporte de pasajeros y productos para acceder a los mercados de San Martín y Lima y otros Mercados Locales, de manera que se logre mejorar las condiciones sociales y económicas de la población ubicada específicamente en el área de influencia del proyecto.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
233,346	193,209	193,208.68	100	Informe	3.000	3.000

Este Proyecto se encuentra en **Expediente Técnico del saldo de obra** presentando una ejecución de gastos de **S/. 193,208.68** que significa el **100 %** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2024.

Con fecha 18/07/2024 fue suscrito el contrato N° 15-2024-GRSM-PEHCBM/PS para la elaboración del servicio de peritaje técnico – financiero y expediente técnico de saldo de obra. Con respecto al cuarto entregable de la segunda fase: expediente de saldo de obra, a la fecha se encuentra en proceso de elaboración por el consultor encontrándose en plazo vigente según contrato



2491620 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

Inicio de Obra	: 05 de abril del 2022
Fecha de Culminación Programada	: 20 de enero del 2023
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 19 de diciembre del 2023
Fecha de Transferencia Programada	: 5 de diciembre del 2024
Avance Físico Acumulado al 2024	: 100%
Avance Físico Solo 2024	: 0%

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 1,334 personas; El mejoramiento facilitará en el transporte de los productos agropecuarios hacia los mercados locales y regionales de la zona, mejorando las condiciones de su transitabilidad para una vida útil de 10 años y con ello incrementar el comercio, la atención médica, educativa y de servicios; contribuyendo al desarrollo de la zona, para lo cual se realizaron, el estudio final de ingeniería y estudio ambiental de la zona, análisis de suelos, planos, especificaciones técnicas, presupuesto y demás documentos que permitan llevar a cabo la ejecución de las obras.

EVALUACION FINANCIERA (\$/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	10,853	10,852.30	100	Informe	1.000	1.000

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 10,852.30** que significa el **100 %** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2024.

La obra culminó físicamente el 15 de mayo de 2023, en la actualidad cuenta con aprobación de liquidación de contrato de obra, asimismo, cuenta con liquidación de contrato de supervisión aprobado mediante Resolución Directoral N° 061-2024-GRSM-PEHCBM/DO, teniendo un saldo a favor del supervisor de **S/ 10,852.30** pagado y liquidado

2491751 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

Inicio de Obra	: 5 de abril del 2022
Fecha de Culminación Programada	: 31 de marzo del 2023
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 6 de julio del 2023
Fecha de Transferencia Programada	: 5 de setiembre del 2024
Avance Físico Acumulado al 2024	: 100%
Avance Físico Solo 2024	: 0%

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 2,261 personas; El mejoramiento facilitará en el transporte de los productos agropecuarios hacia los mercados locales y regionales de la zona, mejorando las condiciones de su transitabilidad para una vida útil de 10 años y con ello incrementar el comercio, la atención médica, educativa y de servicios; contribuyendo al desarrollo de la zona, para lo cual se realizaron, el estudio final de ingeniería y estudio ambiental de la zona, análisis de suelos, planos, especificaciones técnicas, presupuesto y demás documentos que permitan llevar a cabo la ejecución de las obras.



Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 25,137.47** que significa el **100 %** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2024.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	25,138	25,137.47	100	Informe	1.000	1.000

El proyecto cuenta con liquidación de supervisión aprobado mediante Resolución Directoral N°010-2024-GRSM-PEHCBM/DO, de fecha 19 de enero del 2024 con un saldo final del contrato a favor del supervisor de S/ 25,137.47 pagado y liquidado

2492668 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

Inicio de Obra	: 4 de enero del 2022
Fecha de Culminación Programada	: 3 de junio del 2023
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 2 de agosto del 2023
Fecha de Transferencia Programada	: 31 d diciembre del 2023
Avance Físico Acumulado al 2024	: 31.15%
Avance Físico Solo 2024	: 0%

Cuenta con los siguientes componentes: A. COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO Acción 01: Se realizarán trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 4.166 km, en la partida movimiento de tierras se realizarán actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (4.17 ha), corte y desquinche en material suelto (15352.34m3), conformación de terraplén (384.88 m3), en la partida de transporte se realizarán las actividades de : transporte de material propio seleccionado DP>=2.0km (500.34m3), transporte de material excedente para eliminación DP>=5.0KM (19958.04m3), transporte de material afirmado DP>=2.0 km (6448.53m3), transporte de material granular DP>=2.0 KM (9396.17m3), Transporte de mezcla asfáltica DP>=2.0 km (2035.49m3), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (31315.20m2), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (7227.82m3), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (4960.41m3), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (31315.20m2), carpeta asfáltica e=0.05m (31315.20m2) , ensayos de deflectometría (4.17km). B. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 02: Construcción de alcantarillas rectangulares de concreto armado f'c= 210 kg/cm2. Tipo cajón MCA 1.20x1.20 (09 und), construcción de badenes de concreto f'c= 210 kg/cm2 de dimensiones: 7.00 de ancho por 10.00m de largo (05 und), construcción de cunetas revestidas de concreto f'c= 175 kg/cm2 (2499.34 ml). C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Acción 03: Implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (15 und), señales reglamentarias (25 und), señales informativas (30 und), señales reguladoras (10 und), captafaros para pavimento (550 und), marcas en



el pavimento con micro esferas (600 m²), hitos kilométricos (5 Und) y guardianía (65 m) y un plan de seguridad (06 estudios). Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental (04 estudios), que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (4500 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (4 und). Así mismo se realizara el Control de calidad (5 estudios), Plan de monitoreo arqueológico (01 estudio), Plan de compensación por expropiación de terrenos (01 estudios), Capacitación en mantenimiento (capacitación técnica en mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y conservación vial de carreteras vecinales).

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	485,561	485,559.99	99.99	Informe	4.000	4.000

Este Proyecto se encuentra en **Expediente Técnico del saldo de obra**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 485,559.99** que significa el **99.99 %** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2024.

Este Proyecto cuenta con contrato para el servicio de consultoría para el peritaje técnico – financiero y elaboración de expediente de saldo de obra, respecto al peritaje técnico y financiero, el consultor está subsanando las observaciones del quinto entregable de la segunda fase: expediente de saldo de obra, de no encontrarse más observaciones se procederá a la aprobación mediante acto resolutivo

2493059 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra	: 21/03/2023
Fecha de Culminación Programada	: 31/05/2025
Fecha de Recepción De Obra Programada	: -----
Fecha de Transferencia Programada	: -----
Avance Físico Acumulado al 2024	: 8.4%
Avance Físico Solo 2024	: 0.00%

Descripción: A. COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO Acción 01: Se realizaran trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 2.616 km, en la partida movimiento de tierras se realizaran actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (2.62 ha), corte y desquinche en material suelto (9595.21 m³), conformación de terraplén (240.55 m³), en la partida de transporte se realizaran las actividades de : transporte de material propio seleccionado DP>=1.0km (312.72m³), transporte de material excedente para eliminación DP>=5.0KM (12473.77m³), transporte de material afirmado DP>=1.0 km (5210.80m³), transporte de material granular DP>=1.0 KM (5810.65m³), Transporte de mezcla asfáltica DP>=1.0 km (1208.97m³), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (18599.60m²), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (4469.73m³), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (4008.31m³), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (18599.60m²), carpeta asfáltica e=0.05m (18599.60m²) , ensayos de deflectometría (2.62km). B.



COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 02: construcción de alcantarillas rectangulares de concreto armado MCA 1.20x1.20 (03 und), construcción de cunetas revestidas de concreto $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$ (1569.60 ml). C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Acción 03: Implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (5 und), señales reglamentarias (3 und), señales informativas (3 und), señales reguladoras (3 und), marcas en el pavimento con micro esferas (734.85 m²), hitos kilométricos (3 Und). Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental, que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (2000 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (3 und).

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	198,000	198,000	100	Informe	2.000	2.000

Este Proyecto se encuentra en **Expediente Técnico del saldo de obra**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 198,000** que significa el **100 %** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2024.

2530935 CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

Fecha Inicio Elab Exp. Téc. : 11 de noviembre de 2022
Fecha Culminación Exp. Téc. : 30 de mayo de 2025
Avance físico Acumulado Exp. :Téc. : 72 %
Exp. Téc. Solo 2024 : 72 %

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 424 habitantes; Construcción de 01 Puente Vehicular sobre la Quebrada Santa Flor de 40.0 m. de luz, sub estructura tipo estribos en cantiléver y súper estructura tipo sección compuesta con vigas de acero estructural y losa de concreto armado, Capa de Rodadura de Pavimento Flexible.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
6,506,850	0.00	0.00	0.00	Expediente Técnico	1.000	0.000

Este Proyecto se encuentra en **Expediente Técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 0.00** que significa el **0%** del PIM asignado. Con un avance físico del **0%** de lo programado en el 2024.

Se suscribió contrato N° 023-2022-GRSM-PEHCBM/PS con el consorcio SAN MARTÍN, para elaboración de Expediente Técnico y contrato N° 001-2022-GRSM-PEHCBM del 18.11.2022 con la empresa PAJATÉN CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES EIRL. para la supervisión del Expediente



Técnico, actualmente se encuentra con suspensión contractual por el proceso de certificación ambiental – el consultor presentó la documentación al SERNANP y al MINAM, en respuesta se elaboró la EVAP solicitada para su revisión de la clasificación ante el SENACE, mediante la Dirección Ambiental para proyectos de infraestructura, por lo que los tramites se encuentran en su etapa final y proceder con la aprobación del expediente técnico

2647085 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON C_07 A C_13 EN EL BARRIO HUAYCO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra : 12/02/2025
Fecha de Culminación Programada : 12/12/2025 (300 DÍAZ)
Fecha de Recepción De Obra Programada :
Fecha de Transferencia Programada :
Avance Físico Acumulado al 2024 : 0%
Avance Físico Solo 2024 : 0%

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 3,783 habitantes; Mejoramiento de JR. MARTÍNEZ DE COMPAGÑON C-07 A C-13 EN EL BARRIO HUAYCO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 12,317.52 m2 de vías con pavimento flexible (carpeta asfáltica en caliente e= 5 cm), Adicional a eso se tendrá EN CUENTA LAS OBRAS DE ARTE, ADEMAS DE LA construcción de veredas, martillos y rampas de acceso Y OTROS.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	187,000	187,000	100	Expediente Técnico	1.000	1.000

Este Proyecto se encuentra en **Proceso de Selección**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 187,000** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2024.

Se consintió la buena pro, por lo tanto se encuentra en plazo para el perfeccionamiento del contrato; con respecto al CP-SM-5-2024-GRSM-PEHCBM/CS-1 para la supervisión de la obra, se encuentra en absolución de consultas, teniendo como fecha prevista para el otorgamiento de la BUENA PRO SEACE el 29/01/2025

2617638 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR IZQUIERDO DEL BARRIO HUAYCO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra : 14/03/2025
Fecha de Culminación Programada : 14/01/2026 (300 DÍAZ)
Fecha de Recepción De Obra Programada :



Fecha de Transferencia Programada :
Avance Físico Acumulado al 2024 : 0%
Avance Físico Solo 2024 : 0%

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 4,090 personas. EL PROYECTO COMPRENDE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: - Asfaltado de 16,347.22 m² de capa de rodadura. - Construcción de 1,322.56 ml de Cuneta Armada Abierta de (0.40 x 0.40) - Construcción de 1,236.10 ml de Cuneta Armada con tapa de (1.00x1.00) ml - Construcción de 334.64 ml de Cuneta Armada con tapa de (1.20x1.20) ml - Construcción de 207.89 ml de Alcantarilla Armada de (1.00 x 1.00) ml - Construcción de 207.89 ml de Alcantarilla Armada (1.20x1.20) ml - Construcción de 1,049.55 m² de accesos de concreto. - Construcción de 3,666.55 m² de veredas longitudinales. - Construcción de 1,597.57 m² de veredas tipo martillo - Construcción de 120.91 m² de rampas de acceso. - Construcción de 2820.04 ml de sardineles de concreto - Sembrío de 7,564.08 m² de áreas verdes. - Sembrío de 1,006.00 plantas ornamentales. - Instalación de 30 señales preventivas - Reposición de postes de concreto 15 unidades

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	134,957	134,956.70	100	Expediente Técnico	1.000	1.000

Este Proyecto se encuentra en **Proceso de Selección**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 134,956.70** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2024.

Con fecha 25/11/2024, mediante RD N°116-2024-GRSM-PEHCBM/DEYP se aprueba la modificación del expediente técnico, por el monto de s/ 18,454,837.46 con precios al mes de noviembre 2024, y un plazo de ejecución de 300 días calendario, para ser ejecutado bajo la modalidad de ejecución presupuestaria por contrata. Con respecto a la IP-SM-3-2024-GRSM-PEHCBM/CS-1 para la ejecución de la obra, se encuentra con las bases integradas, teniendo programado el otorgamiento de la buena PRO SEACE para el 28/01/2025

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 17 AMBIENTE

2294298 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS , REGION SAN MARTIN

Inicio de la Obra : 01/04/2019
Fecha De Culminación Programada : 31/03/2028
Fecha de Recepción de la Obra Programada :
Avance Físico Acumulado al 2024 :

El Proyecto a su culminación beneficiará a un total de 50,427 habitantes; con la recuperación de los servicios eco sistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante reforestación en zonas de protección con producción de plántones, prácticas de manejo y conservación de suelos en



zonas de recuperación, mejoramiento de capacidades de los actores para conservación y usos sostenibles, así como el fortalecimiento institucional.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	142,680	142,646.70	99.98	Expediente Técnico	0.700	0.700

Este Proyecto se encuentra en **Actualización del Expediente Técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 142,646.70** que significa el **99.98%** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2024.

El proyecto cuenta con resolución de aprobación de expediente técnico del 2018, por lo que a la fecha perdió vigencia. Se viene realizando la actualización del expediente técnico, por administración directa a cargo de la dirección de medio ambiente, actualmente presenta avance del 70% y su culminación está prevista para fines de enero del 2025

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 18 SANEAMIENTO

2082525 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN

Fecha Inicio Elab Exp. Téc. : 21 de junio de 2024

Fecha Culminación Exp. Téc. : 30 de junio de 2025

Avance físico Acumulado Exp. Téc. : 80.81 %

Avance físico Exp. Téc. Solo 2024 : 80.81 %

El Proyecto beneficiará a 5,054 personas. El proyecto será para garantizar la sostenibilidad del proyecto en la fase de operación y mantenimiento, los responsables serán los propios involucrados, para lo cual estos conformarán una junta de usuarios del servicio de saneamiento (jass), su inscripción y reconocimiento por la municipalidad distrital de uchiza y su capacitación en temas de operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. la estructura orgánica para el nivel directivo se planteó de la siguiente manera: presidente de la jass, secretario, tesorero, 2 vocales y un fiscal, las cuales serán elegidos por los beneficiarios en la asamblea de conformación y/o ratificación de la jass, con la mayoría de votos; los cuales se encargarán de administrar, controlar y supervisar la correcta operación del servicio, se suscribieron actas de compromiso

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	72,609	71,377.32	98.30	Informe	6.000	6.000



Este Proyecto se encuentra en **Expediente Técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 71,377.32** que significa el **98.30%** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2024.

El proyecto cuenta con expediente técnico aprobado mediante resolución N°034-2023-GRSM PEHCBM/DEYP, de fecha 12 de abril del 2023, en la actualidad presenta observaciones en la etapa de calidad registrado en la plataforma PRESET del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por lo que la dirección de Estudios y Proyectos presentó el requerimiento con la finalidad de contratar los servicios para levantar las observaciones.

2113014 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA

Inicio de Obra	: 13 de marzo del 2013
Fecha de Culminación Programada	: 31 julio del 2028
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 30 de setiembre del 2018
Fecha de Transferencia Programada	: 31 de diciembre del 2018
Avance Físico Acumulado al 2024	: 100%
Avance Físico Solo 2024	: 0%

El Proyecto beneficiará a 7,877 personas. El proyecto será sostenible ante el adecuado manejo por la empresa EMAPA San Martín sucursal Saposoa, quien garantiza su participación como administradora de servicios de saneamiento de Saposoa por los muchos años de experiencia que tiene laborando con eficiente personal técnico y administrativo, para la el decrecimiento de las enfermedades diarreicas, parasitarias y dérmicas de la población de Saposoa.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	120,876	120,875.36	100	Informe	1.000	1.000

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 120,875.36** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2024.

Proyecto culminado en su totalidad, presenta liquidación de contrato y pendiente de liquidación de la reingeniería, se realizó el pago de **S/ 120,785.36** de intereses legales a la contratista CONSORCIO ALIANZA, se espera al cierre del proyecto en el banco de inversiones

2234843 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA, LIMON Y PÓRVENIR - BELLAVISTA-SAN MARTIN

Fecha Inicio Elab Exp. Téc.	: 28 de setiembre de 2023
Fecha Culminación Exp. Téc.	: 30 de julio de 2025
Avance físico Acumulado Exp. Téc.	: 80 %
Avance físico Exp. Téc. Solo 2024	: 80 %



El Proyecto beneficiará en forma directa a una población de 13,297 personas. La zona en estudio cuenta con un total de 2,199 lotes domésticos, 222 lotes comerciales, 12 locales sociales, 36 locales institucionales y 2 lotes industriales, siendo la densidad promedio para el área de estudio de 4.418 hab/viv. el 87% de la población de la localidad de bellavista y el porvenir son propietarios de sus viviendas y el 13% la alquila mientras que la localidad de limón el 81% es propietaria de su vivienda y el 19% tiene otra forma de ocupación, el material predominante en las viviendas en las localidades de bellavista y el provenir es de material noble con un 72%, seguido de material triplay con un 9% y de un 19% con materiales diversos y en la localidad de limón predomina material noble en un 51% seguido del adobe en un 35% y de la madera o triplay en un 14%. la ocupación principal es la agricultura en un 37%, el comercio en un 19%, trabajos independientes en un 7%, seguido de limpieza del hogar en un 4% y el 5% a la docencia.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
2,755,324	2,716,000	2,176,000	100	Expediente Técnico	0.800	0.700

Este Proyecto se encuentra en **Expediente Técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 2,176,000** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico del **87.50%** de lo programado en el 2024.

Con fecha 28.09.2023 se firmó el **CONTRATO N° 006-2023-GRSM-PEHCBM/PS** con el consorcio los valdicos para la elaboración del expediente técnico, y con el consorcio Limón **CONTRATO N° 007-2023-GRSM-PEHCBM/PS** de fecha 06.10.2023 para la supervisión de la actualización y complementación del expediente técnico, a la fecha se cuenta con la conformidad del tercer entregable, el cuarto y último entregable está programado su presentación en marzo del 2025

2469597 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YARINA DEL DISTRITO DE CHIPURANA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Fecha Inicio Elab Exp. Téc. : 12 de marzo de 2024

Fecha Culminación Exp. Téc. : 30 de junio de 2025

Avance físico Acumulado Exp. Téc.: 71.36 %

Avance físico Exp. Téc. Solo 2024 : 71.36 %

Descripción del Proyecto: AGUA POTABLE 1. Captación. Se construirá una captación con barraje de toma lateral de concreto armado que constará con una cámara de reunión y una caja de válvulas. Con una tubería de salida de 140mm. 2. Sedimentador Se construirá un sedimentador de 01 unidades de concreto armado de resistencia $f'c=210\text{kg/cm}^2$, cada unidad tendrá un ancho de 3.50m y una longitud total de 18.30m con muros de 0.30m, la cual tendrá la función de sedimentar las arenas que van suspendidas en el agua 3. Filtro lento Se construirá 01 unidades de filtro lento de concreto armado de resistencia $f'c=210\text{kg/cm}^2$, el ancho de cada unidad será de 6.40m, con un largo de 8.60m y una altura de 3.15m, el espesor de los muros será de 0.25m; la cual tendrá la función de remover las partículas que vuelven que el agua sea turbia 4. Línea de Conducción. Se localizará desde la captación proyectada de la quebrada "Torrepunta", en la en la progresiva 0+0.00 hasta el reservorio proyectado



de V= 60 M3 Tiene una longitud total de 2244.95 metros. De tubería PVC-U NTP ISO 4422 CLASE 10 $\varnothing$ 140mm =2244.95m. Los Factores considerados para la localización son los siguientes: 5. Válvulas de aire : 6 6. Válvula de Purga Tipo I : 6 7. Pases Aéreos Se instalará 03 pases aéreos 8. Almacenamiento A continuación de la Línea de conducción se proyectará un reservorio cuya capacidad es de 60 m3 para abastecer a toda la población de la localidad del Yarina 9. Línea de Aducción Se localizará desde el Reservorio proyectado de V= 60 M3, , con una cota 231.30 m.s.n.m hasta el primer punto de distribución. Tiene una longitud de 302.43 metros de tubería PVC $\varnothing$ de 160mm. 10. Red de Distribución Se ha previsto el tendido de 7,866.58 m de tubería PVC – U C10, como red de distribución de $\varnothing$ 160mm, 140mm, 110mm, 90mm, 75mm y 63mm; que permite transportar el agua desde la línea de aducción a las viviendas. La tubería estará enterrada a una profundidad de 0.60 cm x 0.40 cm de ancho 11. Conexiones Domiciliarias. Las conexiones domiciliarias son 467 para las viviendas e instituciones de las cuales 461 son conexiones domiciliarias, 04 conexiones para instituciones estatales y 02 conexiones sociales SANEAMIENTO 1. Redes Colectoras 2. BUZONES EN REDES COLECTORES 3. CONEXIONES DOMICILIARIAS SE PLANTEA LA INSTALACIÓN DE 467 CONEXIONES DOMICILIARIAS. PARA TAL FIN SE INSTALARÁ TUB. PVC-U SN-4 $\varnothing$ 200MM. 5. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Cada localidad tendrá su propia PTAR, del cual consta de los siguientes componentes: ¿ Tanque Imhoff (01 Und.) ¿ Lecho de Secado (02 Und.) ¿ Filtro Biológico (01 Und.) ¿ Cámara de cloración (01 Und.) 4. ESTACIONES DE BOMBEO.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
10,000,000	575,576	410,751.22	71.36	Expediente Técnico	0.897	0.700

Este Proyecto se encuentra **en Expediente Técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 410,751.22** que significa el **71.36%** del PIM asignado. Con un avance físico del **78.03%** de lo programado en el 2024.

Se cambiaron los parámetros de rural a urbano incrementándose la demanda, motivo por la cual, la dirección de estudios y proyectos está reformulando el proyecto bajo la modalidad de administración directa, se realizó la contratación de los servicios necesarios, las mismas que a la fecha vienen presentando su producto

2587904 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE CUADRA N° 7, PASAJE 3 Y PROLONGACION JR. YURIMAGUAS DISTRITO DE LAMAS DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra	: 18 de octubre del 2024
Fecha de Culminación Programada	: 15 de enero del 2024
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 17 de febrero del 2025
Fecha de Transferencia Programada	: 17 de abril del 2025
Avance Físico Acumulado al 2024	: 86.87%
Avance Físico Solo 2024	: 86.87%



El Proyecto beneficiará a 10 habitantes. El proyecto será con construcción de Alcantarillas de CONCRETO armado de forma rectangular, de resistencia $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$, construcción de MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO armado de resistencia $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	1,071,421	796,417.55	73.92	Obra	1.000	1.000

Este Proyecto se encuentra **en Ejecución Física**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 796,417.55** que significa el **73.92%** del PIM asignado. Con un avance físico del **100%** de lo programado en el 2024.

Proyecto se culminó el 15.01.2025; durante el año 2024 la obra se encuentra adelantada y representa un 38.57% de la valorización programada, análisis realizado con el cao n°01, asimismo, la valorización n°03 correspondiente a diciembre se encuentra observada

2657137 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE SISA Y ANEXOS, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA DE LA PROVINCIA DE EL DORADO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Fecha Inicio Elab Exp. Téc. : 15 de agosto de 2024
 Fecha Culminación Exp. Téc. : 30 de agosto de 2025
 Avance físico Acumulado Exp. Téc. : 53.00 %
 Avance físico Exp. Téc. Solo 2024 : 53.00 %

El Proyecto beneficiará a 10,836 habitantes. El proyecto será con Construcción de 01 captación para una capacidad de 131.75 l/s. Desarenador: Con capacidad de desarenar un caudal de 131.75 l/s, en un área de 174.72 m². Línea de conducción: 20.63 km de distancia. Planta de tratamiento de agua: Potable. Planta integral tipo CEPIS con capacidad de trata 131.75 l/s. Reservorio. Reservorio de 200 m³. Reservorio de 750 m³. Reservorio de 1050 m³. Línea de aducción. Con longitud de 5,498.51 ml. Red de distribución. Con longitud de 45193.57 ml. Conexiones domiciliarias. Construcción de 2763 conexiones domiciliarias. Caseta de Bombeo. Construcción de 01 caseta de bombeo de 144 m². Micromedición. Micromedición para 2763 conexiones domiciliarias. Sistema de Alcantarillado Sanitario: Redes de alcantarillado: Estación de bombeo

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	363,951	363,951	100	Expediente Técnico	0.530	0.500

Este Proyecto se encuentra **en Expediente Técnico**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 363,951** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico del **94.33%** de lo programado en el 2024.



Proyecto con fecha 14/08/2024 fue declarado la viabilidad del proyecto la cual dio paso para la elaboración del expediente técnico, solo se cuenta con la conformidad del primer entregable, respecto al segundo entregable se encuentra en revisión por el equipo de inspección

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 20 SALUD

2.234509 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN

Inicio de Obra : 17 de diciembre del 2014
Fecha de Culminación Programada : 31 diciembre del 2019
Fecha de Recepción De Obra Programada : 30 de marzo del 2020
Fecha de Transferencia Programada : 30 julio del 2020
Avance Físico Acumulado al 2024 : 100%
Avance Físico Solo 2024 : 0%

El Proyecto a su culminación beneficiará a una población de 150,858 habitantes; la población beneficiaria del proyecto es aquella que se encuentra en la jurisdicción de la provincia de Tocache, que de acuerdo al censo 2,007, cuentan con 72,346 habitantes (distritos de Tocache, Nuevo Progreso, Pólvora, Shunte y Uchiza); que proyectada al 2,012 es de 74,159 habitantes, estos pobladores son lo que buscan mejores condiciones de atención hospitalaria y seguridad en el área de salud. Distintos caseríos de la provincia de Tocache y poblaciones anexas que están constituidas por poblaciones migrantes, especialmente de la sierra con costumbres, creencias e idiosincrasias muy arraigadas, ahora tienen un mayor acceso a los servicios de salud ejemplo y que ha posibilitado la reducción de la atención del parto domiciliario y el incremento de partos institucionales

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
468,427	468,427	0.00	0.00	Informe	1.000	0.000

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 0.00** que significa el **0%** del PIM asignado. Con un avance físico de **0%** de lo programado en el 2024. asimismo, presenta conformidad de liquidación de contrato de supervisión; respecto a la liquidación de contrato de obra, se encuentra en arbitraje.

2.377760 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN

Inicio de Obra : 23 de noviembre del 2024
Fecha de Culminación Programada : 16 de mayo del 2026
Fecha de Recepción De Obra Programada : 15 de julio del 12026
Fecha de Transferencia Programada : 30 octubre del 2026
Avance Físico Acumulado al 2024 : 0.26%



Avance Físico Solo 2024

: 0.26%

Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno • Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios. • Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura. • Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los servicios de salud. • Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud. • Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. • Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios. • Adquisición de ambulancia terrestre debidamente equipada • Adquisición de movilidad de transporte terrestre tipo todo terreno. El Proyecto beneficiará directamente a 8,003 habitantes.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	12,661,099	12,651,098.49	99.92	Obra	0.260	0.260

Este Proyecto se encuentra **en Ejecución Física**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 12,651,098.49** que significa el **99.92%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024.

La valorización N°02 correspondiente a diciembre, fue presentado dentro de plazo, sin embargo, no se cuenta con personal para su respectiva evaluación toda vez que el proyecto no cuenta con presupuesto para el 2025, debido a que no se consideró en la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025 por lo que se viene gestionando al sector demanda adicional de recursos

2.377762 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN

Inicio de Obra	: 07 de noviembre de 2024
Fecha de Culminación Programada	: 30 de abril de 2026
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 15 de mayo de 2026
Fecha de Transferencia Programada	: 30 de mayo 2026
Avance Físico Acumulado a nov. 2024	: 0.37%
Avance Físico 2024	: 0.37%

Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno. - Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios. - Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura. - Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los servicios de salud. - Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud. - Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. - Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios. - Adquisición de ambulancia terrestre y fluvial debidamente equipada. El Proyecto beneficiará directamente a 8,218 habitantes.



EVALUACION FINANCIERA (\$/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	13,493,095	13,483,095	99.93	Obra	0.070	0.070

Este Proyecto se encuentra **en Ejecución Física**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 13,483,095** que significa el **99.93%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024.

La valorización N°02 correspondiente a diciembre, fue presentado dentro de plazo, sin embargo, no se cuenta con personal para su respectiva evaluación toda vez que el proyecto no cuenta con presupuesto para el 2025, debido a que no se consideró en la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025 por lo que se viene gestionando al sector demanda adicional de recursos

2.377764 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra	: 5 de setiembre del 2024
Fecha de Culminación Programada	: 26 de febrero del 2026
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 1 de julio del 2026
Fecha de Transferencia Programada	: 30 de agosto del 2026
Avance Físico Acumulado al 2024	: 5.12%
Avance Físico Solo 2024	: 5.12%

Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno, Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios, Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura, Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los servicios de salud, Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud, Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales, Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios, Adquisición de ambulancias terrestre debidamente equipada, Adquisición de movilidad de transporte terrestre tipo todo terreno.

EVALUACION FINANCIERA (\$/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	13,619,690	12,297,469.43	90.29	Obra	5.120	5.120

Este Proyecto se encuentra **en Ejecución Física**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 12,297,469.43** que significa el **90.29%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024.

Con la valorización N°04 del periodo del 01 al 31 de diciembre, presenta un avance físico real acumulado de 5.12% (s/ 2,410,127.76) frente a un avance programado acumulado acelerado de 2.12% (s/ 999,518.96), la obra se encuentra adelantada, asimismo, se debe informar que el proyecto no cuenta con presupuesto para el 2025, toda vez que no se consideró en la ley de presupuesto del sector público



para el año fiscal 2025 por lo que se viene gestionando al sector demanda adicional de recursos presupuestales.

2.486486 ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra : 8 de julio del 2020
 Fecha de Culminación Programada : 30 de junio del 2022
 Fecha de Recepción De Obra Programada : 30 de setiembre del 2023
 Fecha de Transferencia Programada : 31 de diciembre del 2022
 Avance Físico Acumulado al 2023 : 100%
 Avance Físico Solo 2023 : 0%

Ante la emergencia sanitaria nacional por el covid 19, se habilitó el área de expansión del establecimiento de salud a través de la unidad productora de salud hospital ii-2 tarapoto con código ipress n° 00006918, la cual cuenta con infraestructura potencial para brindar la primera atención a pacientes covid 19, faltando el equipamiento necesario como es el coche de paro equipado mas accesorios, para la atención a pacientes covid 19 que presentaron un paro cardiorrespiratorio.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	165366	0.00	0.00	Informe	1.00	0.00

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 0.00** que significa el **0.00%** del PIM asignado. Con un avance físico de **0.00%** de lo programado en el 2024.

2.496582 CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra : 2 de agosto del 2021
 Fecha de Culminación Programada : 31 de julio del 2022
 Fecha de Recepción De Obra Programada : 30 de setiembre del 2022
 Fecha de Transferencia Programada : 31 de diciembre dl 2022
 Avance Físico Acumulado al 2024 : 98.40%
 Avance Físico Solo 2024 : 0%

Construcción de infraestructura de sala de hospitalización en el marco de la emergencia COVID 19. El hospital de Tarapoto de la Región San Martín para la atención oportuna de los servicios de la unidad de cuidados intensivos y hospitalización, del Hospital de Lamas, debido a la pandemia COVID-19, considerando las características y comportamiento de la pandemia en otros países. Asimismo, debido al alto riesgo de la propagación del coronavirus COVID-19, en la provincia y Departamento de San Martín.



EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	1,580	1,579.28	100	Informe	1.000	1.000

Este Proyecto se encuentra **culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 1,579.28** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024. La IOARR se encuentra culminada físicamente en su totalidad, recepcionada y transferido a la unidad operativa, respecto a la supervisión cuenta con liquidación de contrato con un saldo a favor producto de la liquidación de s/ 1,579.28 la misma que se encuentra pagado

RESULTADOS DE LOS IOARRs y PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 22 EDUCACIÓN

2.464324 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra	: 20 de diciembre de 2024
Fecha de Culminación Programada	: 12 de junio de 2026
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 27 de junio de 2026
Fecha de Transferencia Programada	: 11 de julio de 2026
Avance Físico Acumulado al 2024	: 0.31%
Avance Físico Solo 2024	: 0.31%

Demolición total de la infraestructura actual y construcción de nueva infraestructura, adquisición de mobiliarios y equipamiento para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. El Proyecto beneficiará directamente a 1,430 habitantes, Alumnos adecuadamente atendidos en los servicios de educación inicial, primaria y secundaria. Demolición total de la infraestructura actual y Construcción de nueva infraestructura, adquisición de mobiliarios y equipamiento para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
3,265,456	9,687,317	9,490,000	97.96	Obra	0.100	0.100

Este Proyecto se encuentra **en Ejecución Física**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 9,490,000** que significa el **97.96%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024.

Con fecha 04 de diciembre de 2024, se firma el contrato n° 026-2024-grsm-pehcbm/ps para ejecución de la obra, entre el PEHCBM y el consorcio ejecutor ALFONSO UGARTE, cuyo monto total asciende a S/ 36,000,000.00 y un plazo de ejecución 540 días calendario. la ejecución física inicio el 14/12/2024,



respecto a la valorización N°01 correspondiente al periodo 14-31 de diciembre del 2024 se encuentra en evaluación

2.599122 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0444 JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD COSTA RICA, DISTRITO DE PAJARILLO, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra : 29/01/24
Fecha de Culminación Programada : 28/03/24
Fecha de Recepción de Obra Programada : 17/06/24
Fecha de Transferencia Programada : 31/03/25
Avance Físico Acumulado al 2024 : 100%
Avance Físico Solo 2024 : 100%

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física. La población estudiantil del 1° al 6° grado de la Institución Educativa – total población 208 (año 2022).

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	440,494	440,492.88	99.99	Porcentaje	100.000	100.000

Este Proyecto se encuentra **Culminado** presentando una ejecución de gastos de **S/. 440,492.88** que significa el **99.99%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024.

La IOARR se encuentra culminada al 100%, y recepcionada. Con fecha 23/10/2024 mediante RD N°107-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de obra practicado por la entidad, por s/ 422,165.40 respecto al CONTRATO N°005-2024-GRSM-PEHCBM/PS, con un saldo final de contrato por s/ 9,633.33 a favor del contratista. También, con fecha 22/11/2024 mediante RD N°114-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de supervisión practicado por la entidad, por s/ 28,079.48 respecto al CONTRATO N°008-2023-GRSM-PEHCBM/OA, con un saldo final de contrato por s/ 3,699.48 a favor del supervisor

2.599172 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0326 EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra : 08/02/24
Fecha de Culminación Programada : 07/04/24
Fecha de Recepción de Obra Programada : 20/05/24
Fecha de Transferencia Programada : 31/03/25
Avance Físico Acumulado al 2024 : 100%
Avance Físico Solo 2024 : 100%



El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física, La población estudiantil del 1° al 6° grado de la Institución Educativa – total población 184 (año 2022).

EVALUACION FINANCIERA (\$/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	559,841	559,839.63	99.99	Porcentaje	100.000	100.000

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 559,839.63** que significa el **99.99%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024.

La IOARR se encuentra culminada al 100%, y recepcionada. Con fecha 23/10/2024 mediante RD N°086-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de obra practicado por la entidad, por s/ 533,592.54 respecto al CONTRATO N°001-2024-GRSM-PEHCBM/PS, con un saldo final de contrato por s/ 15,185.47 a favor del contratista. También, con fecha 10/10/2024 mediante RD N°102-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de supervisión practicado por la entidad, por s/ 26,247.09 respecto al CONTRATO N°005-2023-GRSM-PEHCBM/OA, con un saldo final de contrato por s/ 3,611.09 a favor del supervisor

2.599208 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0309 TUPAC AMARU II , EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 08/02/24
Fecha de Culminación Programada	: 11/04/24
Fecha de Recepción de Obra Programada	: 23/05/24
Fecha de Transferencia Programada	: 31/03/25
Avance Físico Acumulado al 2024	: 100%
Avance Físico Solo 2024	: 100%

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física, La población estudiantil del 1° al 6° grado de la Institución Educativa – total población 356 (año 2022).

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 454,832.8** que significa el **99.99%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024.

EVALUACION FINANCIERA (\$/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	454,834	454,832.8	99.99	Porcentaje	100.000	100.000

La IOARR se encuentra culminada al 100%, y recepcionada. Con fecha 09/09/2024 mediante RD N°089-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de obra practicado por la entidad, por s/ 431,264.15 respecto al CONTRATO N°006-2024-GRSM-PEHCBM/PS, con un saldo final por s/ 5,055.47 a favor del contratista. También, con fecha 09/10/2024 mediante RD N°101-2024-



GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de supervisión practicado por la entidad, por s/ 24,890.52 respecto al CONTRATO N°011-2023-GRSM-PEHCBM/OA, con un saldo final de contrato por s/ 2,487.52 a favor del supervisor

2.599215 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. ANGEL CUSTODIO GARCIA RAMIREZ EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada : 08/02/24
Fecha de Culminación Programada : 09/04/24
Fecha de Recepción de Obra Programada : 13/05/24
Fecha de Transferencia Programada : 31/03/25
Avance Físico Acumulado al 2024 : 100%
Avance Físico Solo 2024 : 100%

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física. La población estudiantil del 1° al 6° grado de la Institución Educativa – total población 522 (año 2022).

EVALUACION FINANCIERA (\$/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	426,328	426,326.58	99.99	Porcentaje	100.000	100.000

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 426,326.58** que significa el **99.99%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024.

La IOARR se encuentra culminada al 100%, y recepcionada. Con fecha 30/07/2024 mediante RD N°069-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de obra practicado por la entidad, por s/ 402,492.12 respecto al CONTRATO N°007-2024-GRSM-PEHCBM/PS, con un saldo final por s/ 10,842.13 a favor del contratista. También, con fecha 05/09/2024 mediante RD N°084-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de supervisión practicado por la entidad, por s/ 23,834.16 respecto al CONTRATO N°010-2023-GRSM-PEHCBM/OA, con un saldo final de contrato por s/ 4,634.16 a favor del supervisor

2.599286 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0202 EN LA LOCALIDAD CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada : 27/12/23
Fecha de Culminación Programada : 24/02/24
Fecha de Recepción de Obra Programada : 10/04/24
Fecha de Transferencia Programada : 31/03/25
Avance Físico Acumulado al 2024 : 100%
Avance Físico Solo 2024 : 100%



El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física. La población estudiantil del 1° al 6° grado de la Institución Educativa – total población 389 (año 2022).

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	498,619	498,332.53	99.94	Porcentaje	100.000	100.000

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 498,332.53** que significa el **99.94%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024.

:

Cuenta con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°115-2024-GRSM-PEHCBM/DO, aprueba la liquidación financiera final de la IOARR. Además, se encuentra en trámite la aprobación de la transferencia definitiva de infraestructura y otros componentes mediante resolución ejecutiva regional, con ello se procederán a realizar el registro del cierre en el banco de inversiones

2.599293 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0075 EKE PEDRO GIRANO PIRO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE SISA, DISTRITO DE SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

nicio de Obra Programada	: 25/01/24
Fecha de Culminación Programada	: 24/03/24
Fecha de Recepción de Obra Programada	: 29/04/24
Fecha de Transferencia Programada	: 31/03/25
Avance Físico Acumulado al 2024	: 100%
Avance Físico Solo 2024	: 100%

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física, La población estudiantil del 1° al 6° grado de la Institución Educativa – total población 396 (año 2022).

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	463,559	463,557.77	99.99	Porcentaje	100.000	100.000

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 463,557.77** que significa el **99.99%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024.

La IOARR se encuentra culminada al 100%, y recepcionada. Con fecha 19/07/2024 mediante RD N°067-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de obra practicado por la entidad, por S/ 443,275.22 respecto al CONTRATO N°002-2024-GRSM-PEHCBM/PS, con un saldo final por s/ 12,885.22 a favor del contratista. También, con fecha 19/08/2024 mediante RD N°075-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de supervisión practicado por la entidad, por S/ 20,282.55 respecto al CONTRATO N°007-2023-GRSM-PEHCBM/OA, con un saldo final de contrato por S/ 184.55 a favor del supervisor



2.607931 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0757 ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD SHATOJA, DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 08/02/24
Fecha de Culminación Programada	: 07/04/24
Fecha de Recepción de Obra Programada	: 23/05/24
Fecha de Transferencia Programada	: 31/03/25
Avance Físico Acumulado al 2024	: 100%
Avance Físico Solo 2024	: 100%

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física. La población estudiantil del 1° al 6° grado de la Institución Educativa – total población 396 (año 2022).

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	463,559	463,557.77	99.99	Porcentaje	100.000	100.000

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 463,557.77** que significa el **99.99%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024.

La IOARR se encuentra culminada al 100%, y recepcionada. Con fecha 19/07/2024 mediante RD N°067-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de obra practicado por la entidad, por S/ 443,275.22 respecto al CONTRATO N°002-2024-GRSM-PEHCBM/PS, con un saldo final por s/ 12,885.22 a favor del contratista. También, con fecha 19/08/2024 mediante RD N°075-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de supervisión practicado por la entidad, por S/ 20,282.55 respecto al CONTRATO N°007-2023-GRSM-PEHCBM/OA, con un saldo final de contrato por S/ 184.55 a favor del supervisor

2.607953 RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 08/02/24
Fecha de Culminación Programada	: 07/04/24
Fecha de Recepción de Obra Programada	: 31/05/24
Fecha de Transferencia Programada	: 31/03/25
Avance Físico Acumulado al 2024	: 100%
Avance Físico Solo 2024	: 100%

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física. La población estudiantil del 1° al 5° grado de la Institución Educativa – total población 167 (año 2022).



EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	611,390	607,686.37	99.39	Porcentaje	100.000	100.000

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 607,686.37** que significa el **99.39%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024.

La IOARR se encuentra culminada al 100%, y recepcionada. Con fecha 09/09/2024 MEDIANTE RD N°087-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de obra practicado por la entidad, por S/ 579,214.84 respecto al CONTRATO N°004-2024-GRSM-PEHCBM/PS, con un saldo final de contrato por S/ 3,939.56 a favor del contratista. También, con fecha 25/09/2024 mediante RD N°094-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de supervisión practicado por la entidad, por S/ 32,174.73 respecto al CONTRATO N°006-2023-GRSM-PEHCBM/OA, con un saldo final de contrato por S/ 7,486.73 a favor del supervisor

:

2.608214 CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. CARLOS WIESSE, DE LA LOCALIDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 03/01/24
Fecha de Culminación Programada	: 02/03/24
Fecha de Recepción de Obra Programada	: 29/04/24
Fecha de Transferencia Programada	: 31/03/25
Avance Físico Acumulado al 2024	: 100%
Avance Físico Solo 2024	: 100%

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física. La población estudiantil del 1° al 5° grado de la Institución Educativa – total población 1,395 (año 2022).

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	416,825	416,246.54	99.86	Porcentaje	100.000	100.000

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 416,246.54** que significa el **99.86%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024.

La IOARR se encuentra culminada al 100%, y recepcionada el 29/04/2024. Con fecha 13/09/2024 mediante RD N°091-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de obra practicado por la entidad, por s/ 436,774.17 respecto al CONTRATO N°009-2023-GRSM-PEHCBM/PS, con un saldo final por s/ 9,939.02 a favor del contratista. También, con fecha 30/09/2024 mediante RD N°096-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de supervisión practicado por



la entidad, por s/ 22,155.89 respecto al CONTRATO N°001-2023-GRSM-PEHCBM/OA, con un saldo final de contrato por s/ 1,229.69 a favor del supervisor, pendiente de efectuar por la Entidad.

2.608239 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0010 JULIO PIZARRO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE TINGO DE SAPOSOA, DISTRITO DE TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 09/01/24
Fecha de Culminación Programada	: 08/03/24
Fecha de Recepción de Obra Programada	: 19/04/24
Fecha de Transferencia Programada	: 31/03/25
Avance Físico Acumulado al 2024	: 100%
Avance Físico Solo 2024	: 100%

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física. La población estudiantil del 1° al 5° grado de la Institución Educativa – total población 84 (año 2022).

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	567,563	567,562.28	100	Porcentaje	100.000	100.000

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 567,562.28** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024.

La IOARR se encuentra culminada al 100%, y recepcionada. Con fecha 15/07/2024 mediante RD N°066-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de obra practicado por la entidad, por S/ 542,073.41 respecto al CONTRATO N°011-2023-GRSM-PEHCBM/PS, con un saldo final por S/ 8,050.57 a favor del contratista. También, con fecha 22/08/2024 mediante RD N°078-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de supervisión practicado por la entidad, por S/ 25,488.87 respecto al CONTRATO N°004-2023-GRSM-PEHCBM/OA, con un saldo final de contrato por S/ 3,858.87 a favor del supervisor, pendiente de efectuar por la Entidad

2.608249 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0707 EMILIO SAN MARTIN, DE LA LOCALIDAD DE TABALOSOS, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 24/02/24
Fecha de Culminación Programada	: 23/04/24
Fecha de Recepción de Obra Programada	: 31/05/24
Fecha de Transferencia Programada	: 31/03/25
Avance Físico Acumulado al 2024	: 100%
Avance Físico Solo 2024	: 100%



El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física. La población estudiantil del 1° al 5° grado de la Institución Educativa – total población 913 (año 2022).

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
0.00	525,849	525,848.31	100	Porcentaje	100.000	100.000

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 525,848.31** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2024.

La IOARR se encuentra culminada al 100%, y recepcionada. Con fecha 21/08/2024 mediante RD N°077-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de obra practicado por la entidad, por S/ 499,831.41 respecto al CONTRATO N°008-2024-GRSM-PEHCBM/PS, con un saldo final de contrato por S/ 7,333.98 a favor del contratista. También, con fecha 30/09/2024 mediante RD N° 095-2024-GRSM/PEHCBM/DO aprueba la liquidación final de contrato de supervisión practicado por la entidad, por S/ 26,016.86 respecto al CONTRATO N°003-2023-GRSM-PEHCBM/OA, con un saldo final de contrato por S/ 4,312.86 a favor del supervisor, pendiente de efectuar por la Entidad.



RESULTADOS DE LA GESTIÓN

POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARRs

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

ANEXO N° 1 A: PROYECTOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICADA	MONTO /S	AVANCE	
			FÍSICO	FINANCIERO
2.000270 GESTION DE PROYECTOS		12,350,861	100.00	89.85
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		1,438,161	100.00	100.00
2.082525 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	5,054	72,609	100.00	98.30
2.113014 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA	7,877	120,876	100.00	100.00
2.134084 CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,298	115,000	100.00	43.48
2.234509 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN	150,858	468,427	0.00	0.00
2.234843 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA, LIMON Y PORVENIR - BELLAVISTA-SAN MARTIN	13,297	2,176,000	87.50	100.00
2.280937 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	6,229	3,998,479	100.00	100.00
2.294298 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS, REGION SAN MARTIN	50,427	142,680	100.00	99.98
2.301043 MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL	18,623	183,763	100.00	99.99
2.342702 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	10,299	2,428,451	100.00	81.20
2.377760 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	8,003	12,661,099	100.00	99.92



2.377762 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	8,218	13,493,095	100.00	99.93
2.377764 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	20,977	13,619,667	100.00	90.29
2.464324 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,430	9,687,317	100.00	97.96
2.469597 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YARINA DEL DISTRITO DE CHIPURANA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	2,929	575,576	78.03	71.36
2.486486 ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCI		165,366	0.00	0.00
2.491462 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,450	193,209	100.00	100.00
2.491620 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,334	10,853	100.00	99.99
2.491751 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	2,261	25,138	100.00	100.00
2.492668 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	3,479	485,561	100.00	100.00
2.493059 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	750	198,000	100.00	100.00
2.496582 CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS		1,580	0.00	99.95
2.530935 CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL	424		0.00	0.00



DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN				
2.587904 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE CUADRA N° 7, PASAJE 3 Y PROLONGACION JR. YURIMAGUAS DISTRITO DE LAMAS DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	10	1,071,421	100.00	74.33
2.599122 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0444 JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD COSTA RICA, DISTRITO DE PAJARILLO, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		440,494	100.00	100.00
2.599172 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0326 EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		559,841	100.00	100.00
2.599208 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0309 TUPAC AMARU II, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		454,834	100.00	100.00
2.599215 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. ANGEL CUSTODIO GARCIA RAMIREZ EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		426,328	100.00	100.00
2.599286 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0202 EN LA LOCALIDAD CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	355	498,619	100.00	99.94
2.599293 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0075 EKE PEDRO GIRANO PIRO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE SISA, DISTRITO DE SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		463,559	100.00	100.00
2.607931 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0757 ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD SHATOJA, DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		491,490	100.00	100.00
2.607953 RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		611,390	100.00	99.39
2.608214 CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. CARLOS WIESSE, DE LA LOCALIDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		416,825	100.00	99.86
2.608239 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E.	73	567,563	100.00	100.00



0010 JULIO PIZARRO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE TINGO DE SAPOSOA, DISTRITO DE TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN				
2.608249 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0707 EMILIO SAN MARTIN, DE LA LOCALIDAD DE TABALOSOS, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		525,849	100.00	100.00
2.617638 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR IZQUIERDO DEL BARRIO HUAYCO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	4,090	134,957	100.00	100.00
2.626982 REUBICACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA) RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (POSTES DE BAJA Y MEDIA TENSION), EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, PUERTO LIMON, NUEVO CHANCHAMAYO Y LA DIVISORIA, DISTRITO DE BAJO BIAVO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEP		130,003	100.00	100.00
2.647085 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON C07 A C13 EN EL BARRIO HUAYCO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	3,783	187,000	100.00	100.00
2.657137 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE SISA Y ANEXOS, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA DE LA PROVINCIA DE EL DORADO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MA	20,822	363,951	94.33	100.00



ANEXO N° 1-B PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA	META		RESULTADOS/ LOGROS
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA, SE PROGRAMÓ S/ 115,000	SE EJECUTÓ S/ 50,000 (43.48%)	PROYECTO CULMINADO
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	REUBICACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA) RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (POSTES DE BAJA Y MEDIA TENSION) SE PROGRAMÓ S/ 130,003	SE EJECUTÓ S/ 130,000 (100%), SE REUBICO 25 POSTES	IOARR CULMINADA Y BENEFICIA A LOCALIDADES DE SANTA ROSA, PUERTO LIMON, NUEVO CHANCHAMAYO Y LA DIVISORIA, DISTRITO DE BAJO BIAVO Y PROVINCIA BELLAVISTA
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAPOSOA, SE PROGRAMÓ S/ 120,876	SE EJECUTÓ S/ 120,876 (100%)	PROYECTO CULMINADO, BENEFICA A 7,877 HABITANTES
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, SE PROGRAMÓ S/ 1,071,421	SE EJECUTÓ S/ 1,071,421 (74.33%)	PROYECTO CULMINADO, BENEFICA A TODA LA POBLACIÓN DE LAMAS
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DE SISA Y ANEXOS, SE PROGRAMÓ S/ 363,951	SE EJECUTÓ S/ 363,951 (100%)	PROYECTO EN EXPEDIENTE TÉCNICO
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS, SE PROGRAMÓ S/ 72,609	SE EJECUTÓ S/ 71,377.32 (98.30%)	PROYECTO EN ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL, SE PROGRAMÓ S/ 9,687,317	SE EJECUTÓ S/ 9,490,000.00 (97.96%)	EN EJECUCIÓN, MONTO REFELAJADO ES DEL ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES, BENEFICARÁ A 1,430 ESTUDIANTES
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, SE PROGRAMÓ S/ 12,661,099	SE EJECUTÓ S/ 12,651,098.49 (99.92%)	PROYECTO EN EJECUCIÓN, MONTO REFLEJA EL PAGO EL ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES, BENEFICIARÁ A 8,003 HABITANTES
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, SE PROGRAMÓ S/ 13,493,095	SE EJECUTÓ S/ 13,483,095.00 (99.93%)	PROYECTO EN EJECUCIÓN, MONTO REFLEJA EL PAGO EL ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES,



			BENEFICIARÁ A 8,218 HABITANTES
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, SE PROGRAMÓ S/ 13,619,667	SE EJECUTÓ S/ 12,297,469.43 (90.29%)	PROYECTO EN EJECUCIÓN, MONTO REFLEJA EL PAGO EL ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES, BENEFICIARÁ A 20,977 HABITANTES
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, SE PROGRAMA S/ 3,998,479	SE EJECUTÓ S/ 3,998,478.59 (100%)	SE APROBO EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, ACTUAMENTE ESTA EN EJECUCIÓN Y BENEFICIARA A 6,229 HABITANTES
	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, SE PROGRAMA S/ 2,428,451	SE EJECUTÓ S/ 1,971,982.59 (81.20%)	ACTUAMENTE ESTA EN EJECUCIÓN, BENEFICIARA A 10,299 HABITANTES
	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO, SE PROGRAMA S/ 193,209	SE EJECUTÓ S/ 193,208.68 (100%)	EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA, FALTA PAGAR EL 5TO ENTREGABLE
	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR, SE PROGRAMA S/ 10,853	SE EJECUTÓ S/ 10,852.30 (99.99%)	PROYECTO CULMINADO Y BENEFICIA A 1,334 HABITANTES
	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO, SE PROGRAMA S/ 25,138	SE EJECUTÓ S/ 25,137.47 (100%)	PROYECTO CULMINADO Y BENEFICIA A 2,261 HABITANTES
	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N-SARITA COLONIA, SE PROGRAMA S/ 485,561	SE EJECUTÓ S/ 485,559.99 (100%)	EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA.
	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS, SE PROGRAMA S/ 198,000	SE EJECUTÓ S/ 198,000.00 (100%)	EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA.
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON C07 A C13 EN EL BARRIO HUAYCO, SE PROGRAMÓ S/ 187,000	SE EJECUTÓ S/ 187,000.00(100%)	PROYECTO EN EJECUCIÓN, BENEFICIARÁ A 3,783 HABITANTES
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, SE PROGRAMÓ S/ 142,680	SE EJECUTÓ S/ 142,646.70(99.98%)	PROYECTO EN ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, BENEFICIARÁ A 50,427 HABITANTES
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	GESTION DE PROYECTOS, SE PROGRAMA S/ 12,350,861	SE EJECUTÓ S/ 11097850.7 (89.85%)	GASTOS ADMINISTRATIVOS (COMPRA DE BIENES,



QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			SERVICIOS Y PLANILLA DE PERSONAL)
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION, SE PROGRAMA S/ 1,438,161	SE EJECUTÓ S/ 1438159.59 (100%)	GASTOS EN ESTUDIOS DE INVERSIONES
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, SE PROGRAMA S/ 468,427	SE EJECUTÓ S/ 0.00 (0.00%)	PROYECTO CULMINADO
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE BELLAVISTA, SE PROGRAMA S/ 2,176,000	SE EJECUTÓ S/ 2176000 (100%)	PROYECTO EN ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL, SE PROGRAMA S/ 183,763	SE EJECUTÓ S/ 183741.12 (99.99%)	PROYECTO CULMINADO
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YARINA, SE PROGRAMA S/ 575,576	SE EJECUTÓ S/ 410751.22 (71.36%)	PROYECTO EN ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
	ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, SE PROGRAMA S/ 165,366	SE EJECUTÓ S/ 0.00 (0.00%)	PROYECTO CULMINADO
	CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, SE PROGRAMA S/ 1,580	SE EJECUTÓ S/ 1579.28 (99.95%)	PROYECTO CULMINADO
	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0444 JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD COSTA RICA, SE PROGRAMA S/	SE EJECUTÓ S/ 440492.88 (100%)	IOARR CULMINADO
	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0326 EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	SE EJECUTÓ S/ 559839.63 (100%)	IOARR CULMINADO
	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0309 TUPAC AMARU II, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ALAO, SE PROGRAMA S/	SE EJECUTÓ S/ 454832.8 (100%)	IOARR CULMINADO
	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. ANGEL CUSTODIO GARCIA RAMIREZ EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, SE PROGRAMA S/	SE EJECUTÓ S/ 426326.58 (100%)	IOARR CULMINADO



REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0202 EN LA LOCALIDAD CONSUELO, SE PROGRAMA S/	SE EJECUTÓ S/ 498332.53 (99.94%)	IOARR CULMINADO
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0075 EKE PEDRO GIRANO PIRO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE SISA, SE PROGRAMA S/	SE EJECUTÓ S/ 463557.77 (100%)	IOARR CULMINADO
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0757 ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD SHATOJA, SE PROGRAMO S/	SE EJECUTÓ S/ 491489.79 (100%)	IOARR CULMINADO
RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SHAPAJA, SE PROGRAMA S/	SE EJECUTÓ S/ 607686.37 (99.94%)	IOARR CULMINADO
CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. CARLOS WIESSE, DE LA LOCALIDAD DE JUANJUI, SE PROGRAMO S/	SE EJECUTÓ S/ 416246.54 (99.96%)	IOARR CULMINADO
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0010 JULIO PIZARRO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE TINGO DE SAPOSOA, DISTRITO DE TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	SE EJECUTÓ S/ 567562.28 (100%)	IOARR CULMINADO
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0707 EMILIO SAN MARTIN, DE LA LOCALIDAD DE TABALOSOS, SE PROGRAMO S/	SE EJECUTÓ S/ 525848.31 (100%)	IOARR CULMINADO
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR IZQUIERDO DEL BARRIO HUAYCO DISTRITO DE TARAPOTO, SE PROGRAMA S/	SE EJECUTÓ S/ 134956.7 (100%)	PROYECTO SE CULMINO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, A LA FECHA EN EJECUCIÓN



ANEXO N° 1 D: PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS

FUNCION 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA

SECTOR	AVANCES
GESTIÓN	
GESTION DE PROYECTOS	PAGOS DE PERSONAL, ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
2.301043 MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL	PROYECTO DE INNOVATE A NIVEL NACIONAL

FUNCION 09: AGROPECUARIA

SECTOR	AVANCES
AGROPECUARIA	
2.134084 CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SE LOGRÓ RECEPCIONAR LA OBRA POR MANDATO JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA , TOMÁNDOSE COMO FECHA DE RECEPCIÓN EL 12.05.15, FECHA DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

FUNCION 12: ENERGÍA

SECTOR	AVANCES
ENERGÍA	
2.626982 REUBICACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA) RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (POSTES DE BAJA Y MEDIA TENSION), EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, PUERTO LIMON, NUEVO CHANCHAMAYO Y LA DIVISORIA, DISTRITO DE BAJO BIAVO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEP	SE LOGRÓ CULMINAR Y RECEPCIONAR LA OBRA



FUNCION 15: TRANSPORTE

SECTOR	AVANCES
TRANSPORTE	
2.280937 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	SE LOGRÓ SUBSANAR LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA MEDIANTE UN NUEVO CONTRATO DE SALDO DE OBRA QUE SE VIENE EJECUTANDO.
2.342702 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	SE LOGRO EJECUTAR EL EXPEDIENTE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE DIO INICIÓ EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS QUE TIENE UN PLAZO DE CULMINACIÓN DE 27 DE MARZO DEL 2025.
2.491462 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SE AVANSO HASTA EL 4TO ENTREGABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA
2.491620 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	INVERSIÓN CERRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES.
2.491751 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	INVERSIÓN CERRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES.
2.492668 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SE AVANSO HASTA EL 5TO ENTREGABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA, AUN CON OBSERVACIONES
2.493059 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SE VIENE REALIZANDO EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA QUE SE DEBE DE ENTREGAR HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025.



2.617638 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR IZQUIERDO DEL BARRIO HUAYCO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SE CULMINÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE LANZO LA CONVOCATORIA PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA
2.647085 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON C07 A C13 EN EL BARRIO HUAYCO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SE CULMINÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE LANZO LA CONVOCATORIA PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

FUNCION 17: AMBIENTE

SECTOR	AVANCES
AMBIENTE	
2.294298 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS, REGION SAN MARTIN	SE VIENE REALIZANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ACTUALMENTE PRESENTA AVANCE DEL 70% Y SU CULMINACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA FINES DE ENERO DEL 2025

FUNCION 18: SANEAMIENTO

SECTOR	AVANCES
SANEAMIENTO	
2.082525 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	SE ESTÁ ACTUALIZANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONCERNIENTE A LA TOPOGRAFÍA Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS
2.113014 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA	PROYECTO CULMINADO EN SU TOTALIDAD, PRESENTA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Y PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE LA REINGENIERÍA
2.234843 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE	SE HA APROBADO Y PAGADO HASTA EL TERCER ENTREGABLE Y LA PRESENTACIÓN DEL 4TO (ULTIMO) SERÁ 20/06/2025 APROXIMADAMENTE



BELLAVISTA, LIMON Y PORVENIR - BELLAVISTA-SAN MARTIN	
2.469597 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YARINA DEL DISTRITO DE CHIPURANA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SE ESTÁ ACTUALIZANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, CON PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIONES.
2.587904 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE CUADRA N° 7, PASAJE 3 Y PROLONGACION JR. YURIMAGUAS DISTRITO DE LAMAS DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.
2.657137 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE SISA Y ANEXOS, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA DE LA PROVINCIA DE EL DORADO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MA	SE CONCLUYÓ LA FASE DE REINVERSIÓN, POSTERIORMENTE SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONFORMIDAD Y PAGADO HASTA EL PRIMER ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 5 ENTREGABLES

FUNCION 20: SALUD

SECTOR	AVANCES
SALUD	
2.234509 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADO
2.377760 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA
2.377762 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	AVANCES EN OBRAS PROVISIONALES Y EN LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.



2.377764 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS- DEPARATAMENTO DE SAN MARTIN	PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA
2.486486 ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCI	IOARR SE ENCUENTRA CULMINADO
2.496582 CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS	IOARR SE ENCUENTRA CULMINADO

FUNCION 22: EDUCACIÓN

SECTOR	AVANCES
EDUCACION	
2.464324 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	AVANCE SIGNIFICATIVO EN TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO; MOVIMIENTO DE TIERRAS COMO EXCAVACIONES MASIVAS; MEJORAMIENTO DE TERRENO Y PEQUEÑAS CIMENTACIONES
2.599122 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0444 JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD COSTA RICA, DISTRITO DE PAJARILLO, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	SE LOGRÓ TERMINAR LA REPARACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA
2.599172 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0326 EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	SE LOGRÓ TERMINAR LA REPARACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA



2.599208 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0309 TUPAC AMARU II, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	SE LOGRÓ TERMINAR LA REPARACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA
2.599215 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. ANGEL CUSTODIO GARCIA RAMIREZ EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	SE LOGRÓ TERMINAR LA REPARACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA
2.599286 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0202 EN LA LOCALIDAD CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	SE LOGRÓ TERMINAR LA REPARACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA
2.599293 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0075 EKE PEDRO GIRANO PIRO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE SISA, DISTRITO DE SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	SE LOGRÓ TERMINAR LA REPARACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA
2.607931 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0757 ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD SHATOJA, DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	SE LOGRÓ TERMINAR LA REPARACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA
2.607953 RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	SE LOGRÓ TERMINAR LA REPARACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA
2.608214 CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. CARLOS WIESSE, DE LA LOCALIDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	SE LOGRÓ TERMINAR LA REPARACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA
2.608239 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0010 JULIO PIZARRO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE TINGO DE SAPOSOA, DISTRITO DE TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	SE LOGRÓ TERMINAR LA REPARACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA



2.608249 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA;
CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA)
I.E. 0707 EMILIO SAN MARTIN, DE LA
LOCALIDAD DE TABALOSOS, DISTRITO DE
TABALOSOS, PROVINCIA LAMAS,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN


SE LOGRÓ TERMINAR LA REPARACIÓN DE LA LOSA
DEPORTIVA



ANEXO N° 1E: RETOS Y LIMITACIONES

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

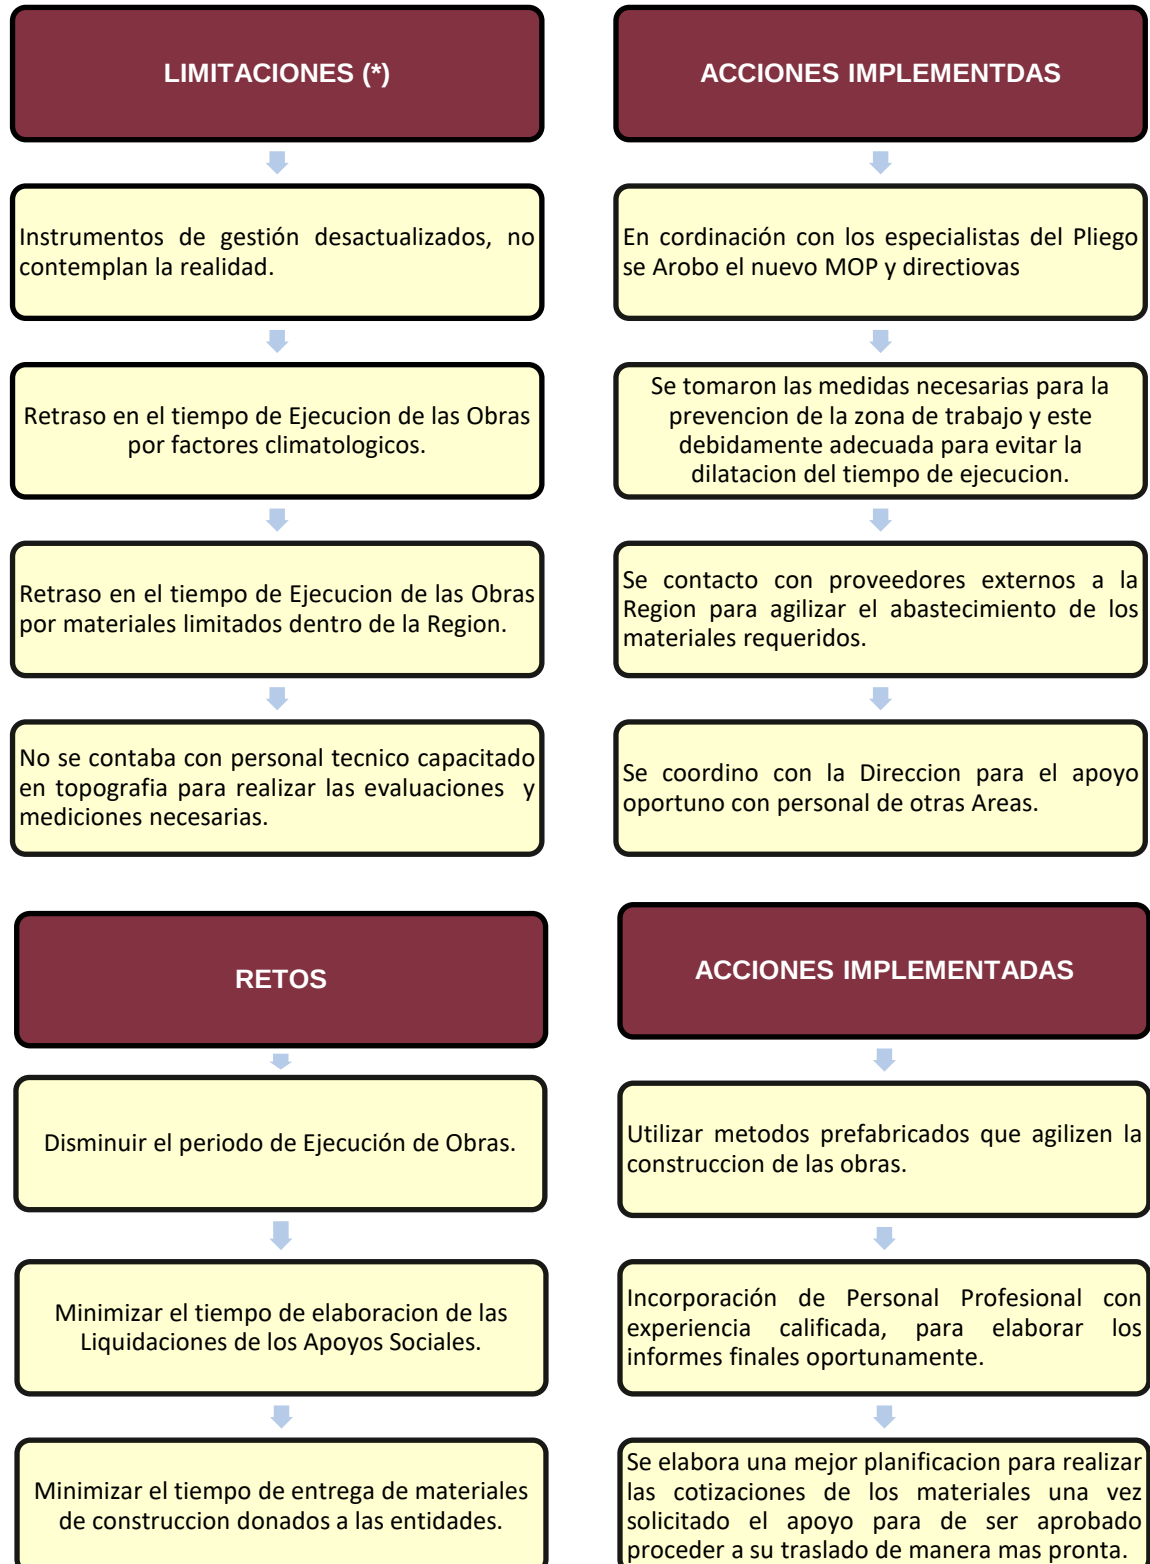

ANEXO N° 4A: INFORMACIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

- POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	52,789,608	50,520,681.15	95.70
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,247,155	980,815.06	78.64
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,333,966	183,741.12	13.77
5 RECURSOS DETERMINADOS	26,585,163	25,877,167.23	97.34
TOTAL	81,955,892	77,562,404.56	94.64

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2024

- POR GENERICA DE GASTO

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,955,892	77,562,404.56	94.64
TOTAL	81,955,892	77,562,404.56	94.64

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2024



CAPITULO IV: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ESTADOS FINANCIEROS

5.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PEHCBM – 2024

ANEXO N° 6: PRESUPUESTO EJECUTADO EN INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

RECURSOS ORDINARIOS		50,520,681.15
2.000270	GESTION DE PROYECTOS	10,117,035.64
2.342702	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	1,971,982.59
2.377760	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	12,651,098.49
2.377762	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	13,483,095.00
2.377764	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	12,297,469.43
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		980,815.06
2.000270	GESTION DE PROYECTOS	980,815.06
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		183,741.12
2.301043	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL	183,741.12
RECURSOS DETERMINADOS		25,877,167.23
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,438,159.59
2.082525	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	71,377.32
2.113014	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA	120,875.36
2.134084	CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	50,000.00
2.234843	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA, LIMON Y PORVENIR - BELLAVISTA-SAN MARTIN	2,176,000.00
2.280937	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	3,998,478.59
2.294298	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS, REGION SAN MARTIN	142,646.70
2.464324	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA,	9,490,000.00



	TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
2.469597	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YARINA DEL DISTRITO DE CHIPURANA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	410,751.22
2.491462	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	193,208.68
2.491620	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	10,852.30
2.491751	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	25,137.47
2.492668	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	485,559.99
2.493059	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	198,000.00
2.496582	CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS	1,579.28
2.587904	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE CUADRA N° 7, PASAJE 3 Y PROLONGACION JR. YURIMAGUAS DISTRITO DE LAMAS DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	796,417.55
2.599122	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0444 JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD COSTA RICA, DISTRITO DE PAJARILLO, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	440,492.88
2.599172	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0326 EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	559,839.63
2.599208	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0309 TUPAC AMARU II, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	454,832.80
2.599215	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. ANGEL CUSTODIO GARCIA RAMIREZ EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	426,326.58
2.599286	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0202 EN LA LOCALIDAD CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	498,332.53
2.599293	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0075 EKE PEDRO GIRANO PIRO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE SISA, DISTRITO DE SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	463,557.77
2.607931	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0757 ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD SHATOJA, DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	491,489.79
2.607953	RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	607,686.37
2.608214	CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. CARLOS WIESSE, DE LA LOCALIDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	416,246.54
2.608239	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0010 JULIO PIZARRO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE TINGO DE SAPOSOA,	567,562.28



	DISTRITO DE TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
2.608249	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0707 EMILIO SAN MARTIN, DE LA LOCALIDAD DE TABALOSOS, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	525,848.31
2.617638	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR IZQUIERDO DEL BARRIO HUAYCO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	134,956.70
2.626982	REUBICACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA) RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (POSTES DE BAJA Y MEDIA TENSION), EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, PUERTO LIMON, NUEVO CHANCHAMAYO Y LA DIVISORIA, DISTRITO DE BAJO BIAVO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEP	130,000.00
2.647085	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON C07 A C13 EN EL BARRIO HUAYCO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	187,000.00
2.657137	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE SISA Y ANEXOS, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA DE LA PROVINCIA DE EL DORADO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MA	363,951.00
TOTAL		77,562,404.56

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2024



5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL ANTERIOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO

ANEXO N° 7: INFORMACIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

AÑO: 2023

- POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	21,411,630	21,307,981.34	99.52
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	809,934	761,309.62	94.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	11,868,168		0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,116,919	933,156.23	83.55
5 RECURSOS DETERMINADOS	25,084,030	15,011,243.37	59.84
TOTAL	60,290,681	38,013,690.56	63.05

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2023

- POR GENERICA DE GASTO

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,400	19,200.00	94.12
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	389,560	389,558.00	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,880,721	37,604,932.56	62.80
TOTAL	60,290,681	38,013,690.56	63.05

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2023



5.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIÓN

ANEXO N° 8: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIÓN

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

AÑO: 2024


FUNCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13,972,785	12,719,751.41	91.03
AGROPECUARIA	115,000	50,000.00	43.48
ENERGIA	130,003	130,000.00	100.00
TRANSPORTE	7,661,648	7,205,176.32	94.04
AMBIENTE	142,680	142,646.70	99.98
SANEAMIENTO	4,380,433	3,939,372.45	89.93
SALUD	40,409,234	38,433,242.20	95.11
EDUCACION	15,144,109	14,942,215.48	98.67
TOTAL	81,955,892	77,562,404.56	94.64


FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2024




ANEXO N° 10: PANEL FOTOGRÁFICO EN PROYECTOS 2024

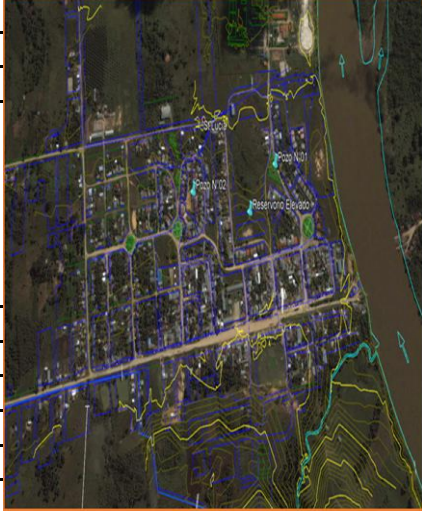

Nombre del Proyecto:	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2082525	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	5,054	
Horizonte del Proyecto:	POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCÍA ACCEDEN A SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE CUMPLEN CON ESTÁNDARES DE CALIDAD	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA	
Inversión Total:	72,609.00	
Monto Ejecutado:	71,377.00	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	98.30%	
Estado del Proyecto:	EXPEDIENTE TÉCNICO	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA	
Código UNIFICADO:	2113014	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	7,877	
Horizonte del Proyecto:	INCREMENTO DE LAS	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	120,876.00	
Monto Ejecutado:	120,875.00	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	

Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2134084	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	1,298	
Horizonte del Proyecto:	BAJOS RENDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL VALLE DE PONAZA	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA.	
Inversión Total:	115,000.00	
Monto Ejecutado:	50,000.00	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	43.50%	
Estado del Proyecto:	EXPEDIENTE TÉCNICO	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2234509	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	150,858	




Documento Nro: 2742680020-2025915987. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en

concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=435c5358Ce807j4ce208796Qc893a195adac&anex=2742680>

Horizonte del Proyecto:	POBLACION ACCEDE A INADECUADOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE.	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	468,427.00	
Monto Ejecutado:	0.00	
Avance Físico :	0.00%	
Avance Financiero :	0.00%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	

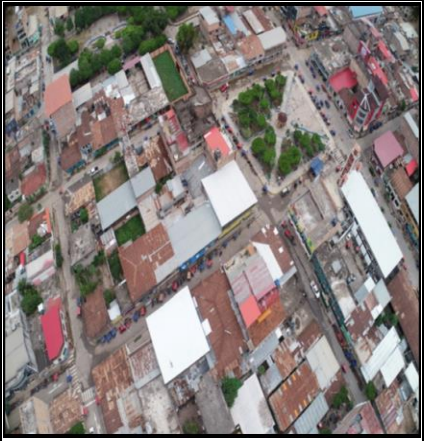Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA, LIMON Y PORVENIR - BELLAVISTA-SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2234843	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	13,297	
Horizonte del Proyecto:	ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	2,176,000.00	
Monto Ejecutado:	2,176,000.00	
Avance Físico :	87.50%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	EXPEDIENTE TÉCNICO	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2280937	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	6,229	
Horizonte del Proyecto:	Limitadas condiciones de Transitabilidad y accesibilidad para el traslado de carga y pasajeros	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	3,998,479.00	
Monto Ejecutado:	3,998,479.00	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	EJECUCIÓN FÍSICA	

Nombre del Proyecto:	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS, REGION SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2294298	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	50,427	



Horizonte del Proyecto:	LA POBLACIÓN TIENE ACCESO LIMITADO A LOS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y DE CONTROL DE LA EROSIÓN DEL SUELO EN LA SUB CUENCA DEL RÍO CUMBAZA.	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	142,680.00	
Monto Ejecutado:	142,647.00	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	EXPEDIENTE TÉCNICO	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2342702	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	10,299	
Horizonte del Proyecto:	INADECUADA ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	2,428,451	
Monto Ejecutado:	1,971,983	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	81.20%	
Estado del Proyecto:	EJECUCIÓN FISICA	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2377760		
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM		
Población Beneficiada:	8,003		
Horizonte del Proyecto:	Limitada cobertura de los servicios de salud del Centro de Salud Pongo de Caynarachi, ubicado en el Distrito de Caynarachi, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin.		
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA		
Inversión Total:	12,661,099		
Monto Ejecutado:	12,651,098		
Avance Físico :	100.00%		
Avance Financiero :	99.90%		
Estado del Proyecto:	EJECUCIÓN FÍSICA		


Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2377762	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	8,218	



Documento Nro: 2742680020-2025915987. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en

concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=435c5358Ce807j4ce208796Qc893a195adac&anex=2742680>

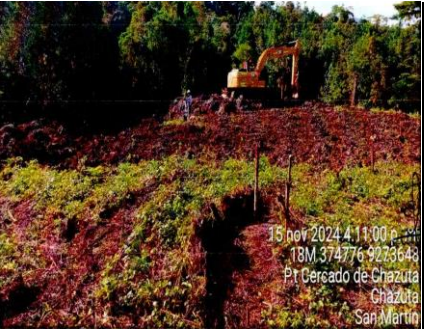Horizonte del Proyecto:	Limitada cobertura de los servicios de salud del Centro de Salud Chazuta, ubicado en el distrito de Chazuta, provincia de San Martín, departamento de San Martín.	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	13,493,095	
Monto Ejecutado:	13,483,095	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	99.90%	
Estado del Proyecto:	EJECUCIÓN FÍSICA	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS-DEPARATAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2377764	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	20,977	
Horizonte del Proyecto:	LIMITADA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TABALOSOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	13,619,667	
Monto Ejecutado:	12,297,469	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	90.30%	
Estado del Proyecto:	EJECUCIÓN FÍSICA	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2464324		
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM		
Población Beneficiada:	1,430		
Horizonte del Proyecto:	Población estudiantil accede a servicios que cumplen estándares sectoriales en la Institución Educativa N° 106 Alfonso Ugarte Vernal		
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA		
Inversión Total:	9,687,317.00		
Monto Ejecutado:	9,490,000.00		
Avance Físico :	100.00%		
Avance Financiero :	98.00%		
Estado del Proyecto:	EJECUCIÓN FÍSICA		

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YARINA DEL DISTRITO DE CHIPURANA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2469597		
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM		
Población Beneficiada:	2,929		
Horizonte del Proyecto:	El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a un adecuado servicio de agua potable y alcantarillado en la localidad de yarina.		



Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	575,576	
Monto Ejecutado:	12,870	
Avance Físico :	78.03%	
Avance Financiero :	170.00%	
Estado del Proyecto:	EXPEDIENTE TÉCNICO	

Nombre del Proyecto:	ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2486486	FOTO
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	0	
Horizonte del Proyecto:		
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	165,366	
Monto Ejecutado:	0.00	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	0.00%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2491462	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	1,450	
Horizonte del Proyecto:	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM -923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N (NUEVO HORIZONTE)-CAÑUTO, DEL DISTRITO DE POLVORA, PROVINCIA DE TOCACHE, DPTO. SAN MARTIN	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	193,209	
Monto Ejecutado:	193,209	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	0.00%	
Estado del Proyecto:	EXPEDIENTE TÉCNICO	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2491620	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	1,334	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N -NUEVO HORIZONTE – BOLIVAR, del Distrito de POLVORA - Provincia de TOCACHE - Departamento de SAN MARTIN.	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	10,853	
Ejecutado:	10,852	



Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2491751		
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM		
Población Beneficiada:	2,261		
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE - SANTA ROSA DE MISHOLLO, del Distrito de POLVORA - Provincia de TOCACHE - Departamento de San Martín		
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA		
Inversión Total:	25,138		
Monto Ejecutado:	25,137		
Avance Físico :	100.00%		
Avance Financiero :	100.00%		
Estado del Proyecto:	CULMINADO		

Nombre del Proyecto:	2492668: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2492668		
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM		
Población Beneficiada:	3,479		
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N (SARITA COLONIA) – SAN AGUSTÍN DE HUAQUISHA, del Distrito de TOCACHE - Provincia de TOCACHE - DPTO SAN MARTIN		
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA		
Inversión Total:	485,561		
Monto Ejecutado:	485,560		
Avance Físico :	100.00%		
Avance Financiero :	100.00%		
Estado del Proyecto:	EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA		

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2493059		
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM		
Población Beneficiada:	750		
Horizonte del Proyecto:	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE – ALMENDRAS, DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.		
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA		
Inversión Total:	198,000		
Monto Ejecutado:	198,000		
Avance Físico :	100.00%		
Avance Financiero :	100.00%		



Documento Nro: 2742680020-2025915987. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en

concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=435c5358Ce807j4ce208796Qc893a195adac&anex=2742680>

Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA	

Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2496582	FOTO
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:		
Horizonte del Proyecto:		
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	1,580	
Monto Ejecutado:	1,579	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	99.95%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	

Nombre del Proyecto:	2587904: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE CUADRA N° 7, PASAJE 3 Y PROLONGACION JR. YURIMAGUAS DISTRITO DE LAMAS DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2587904	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	10	
Horizonte del Proyecto:	EVITAR LAS CONSTANTES INUNDACIONES DE LAS VIVIENDAS DE LOS MORADORES EN EN JR. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE CUADRA N° 7, PASAJE 3 Y PROLONGACION JR. YURIMAGUAS, EN EPOCAS DE LLUVIAS.	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	1,071,421	
Monto Ejecutado:	796,418	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	74.30%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	


Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0444 JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD COSTA RICA, DISTRITO DE PAJARILLO, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2599122	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	0	
Horizonte del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE COBERTURA EN EL(LA) I.E. 0444 JUAN PABLO II	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	440,494	
Monto Ejecutado:	440,493	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	



Nombre del Proyecto:	2599172: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0326 EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2599172	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	0	
Horizonte del Proyecto:	REPARAR LA LOZA EN EL(LA) I.E. 0326 EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	559,841	
Monto Ejecutado:	559,840	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	

Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0309 TUPAC AMARU II, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2599208	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:		
Horizonte del Proyecto:	REPARACIÓN DE LOZA EN EL(LA) I.E. 0309 TUPAC AMARU II	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	454,834	
Monto Ejecutado:	454,833	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	

Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. ANGEL CUSTODIO GARCIA RAMIREZ EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2599215	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	0	
Horizonte del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. ANGEL CUSTODIO GARCIA RAMIREZ	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	426,328	
Monto Ejecutado:	426,327	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	

Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0202 EN LA LOCALIDAD CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2599286	



Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	355	
Horizonte del Proyecto:	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0202 EN LA LOCALIDAD CONSUELO	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	498,619	
Monto Ejecutado:	498,333	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	99.94%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	

Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0075 EKE PEDRO GIRANO PIRO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE SISA, DISTRITO DE SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2599293	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	0	
Horizonte del Proyecto:	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0075 EKE PEDRO GIRANO PIRO	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	463,559	
Monto Ejecutado:	463,558	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	

Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0757 ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD SHATOJA, DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2607931	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	0	
Horizonte del Proyecto:	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0757 ALFONSO UGARTE	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	491,490	
Monto Ejecutado:	491,490	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	

Nombre del Proyecto:	RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2607953	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	0	
Horizonte del Proyecto:	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. SAN JUAN BAUTISTA	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	



Documento Nro: 2742680020-2025915987. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en

concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=435c5358Ce807j4ce208796Qc893a195adac&anex=2742680>

Inversión Total:	611,390
Monto Ejecutado:	607,686
Avance Físico :	100.00%
Avance Financiero :	99.39%
Estado del Proyecto:	CULMINADO



Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. CARLOS WIESSE, DE LA LOCALIDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2608214	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	0	
Horizonte del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. CARLOS WIESSE	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	416,825	
Monto Ejecutado:	416,247	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	99.86%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	

Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0010 JULIO PIZARRO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE TINGO DE SAPOSOA, DISTRITO DE TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2608239	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	73	
Horizonte del Proyecto:	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0010 JULIO PIZARRO CARDENAS	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	567,563	
Monto Ejecutado:	567,562	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	

Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0707 EMILIO SAN MARTIN, DE LA LOCALIDAD DE TABALOSOS, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2608249	
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	0	
Horizonte del Proyecto:	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0707 EMILIO SAN MARTIN	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	525,849	
Monto Ejecutado:	525,848	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	



Documento Nro: 2742680020-2025915987. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en

concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=435c5358Ce807j4ce208796Qc893a195adac&anex=2742680>

Nombre del Proyecto:	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR IZQUIERDO DEL BARRIO HUAYCO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2617638	FOTO
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	4,090	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el JR. RICARDO PALMA10,11, 12, 13, 14, JR. ABANCAY 01,02, JR. VENCEDORES DE COMAINA, JR. SANTA EUFRACIA CUADRAS 02,03, JR. TACNA C03 -	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	134,957	
Monto Ejecutado:	134,957	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	EN PROCESO DE SELECCIÓN	

Nombre del Proyecto:	REUBICACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA) RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (POSTES DE BAJA Y MEDIA TENSION), EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, PUERTO LIMON, NUEVO CHANCHAMAYO Y LA DIVISORIA, DISTRITO DE BAJO BIAVO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2626982	FOTO
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	0	
Horizonte del Proyecto:	REUBICACIÓN DE 25 POSTES	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	130,003	
Monto Ejecutado:	130,000	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	

Nombre del Proyecto:	2647085: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON C07 A C13 EN EL BARRIO HUAYCO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2647085	FOTO
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	3,783	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON C_07 A C_13 EN EL BARRIO HUAYCO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	187,000	
Monto Ejecutado:	187,000	
Avance Físico :	100.00%	
Avance Financiero :	100.00%	
Estado del Proyecto:	EN PROCESO DE SELECCIÓN	



Nombre del Proyecto:	2657137: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE SISA Y ANEXOS, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA DE LA PROVINCIA DE EL DORADO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2657137		
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM		
Población Beneficiada:	20,822		
Horizonte del Proyecto:	POBLACIÓN CON SUFICIENTE Y ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE SISA Y ANEXOS.		
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA		
Inversión Total:	363,951		
Monto Ejecutado:	363,951		
Avance Físico :	94.33%		
Avance Financiero :	100.00%		
Estado del Proyecto:	EXPEDIENTE TÉCNICO		

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL	
Código UNIFICADO:	2301043	FOTO
Unidad Ejecutora:	1263-PEHCBM	
Población Beneficiada:	18,623	
Horizonte del Proyecto:	INSUFICIENTE NIVEL DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA EN LOS SECTORES DE MANUFACTURA Y SERVICIOS	
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACION INDIRECTA	
Inversión Total:	183,763	
Monto Ejecutado:	183,741	
Avance Físico :	0.00%	
Avance Financiero :	99.99%	
Estado del Proyecto:	CULMINADO	

