

CAMINO VECINAL NUEVO CHANCHAMAYO



MEMORIA ANUAL 2023

PROYECTO ESPECIAL HULLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



MEJORAMIENTO I.E 0106 ALFONSO UGARTE



ÍNDICE

	RESÚMEN EJECUTIVO
	PRESENTACIÓN
	CAPÍTULO I: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
	CAPÍTULO II: FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
	CAPÍTULO III: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
	CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN
	CAPÍTULO V: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ESTADOS FINANCIEROS
	ANEXOS



RESÚMEN EJECUTIVO

El presente documento es de carácter público, cuya finalidad es dar a conocer a la población de San Martín, los resultados y logros más relevantes de la gestión durante el año fiscal 2023 de los diferentes proyectos ejecutados por el Unidad Ejecutora 018 – Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (001263). Se presenta una estructura de cinco (05) capítulos, los cuales tienen el siguiente contenido:

Capítulo I.- El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; describe información general, creación, miembros del Consejo Directivo, Base Legal y Estructura Orgánica.

Capítulo II.- Fases del Proceso de Planeamiento, Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico

Capítulo III.- Lineamientos Estratégicos; descripción de la Visión Institucional, Misión Institucional, Componentes y Objetivos Estratégicos.

Capítulo IV.- Resultados de la gestión, se realiza la descripción de los logros obtenidos en los diferentes proyectos ejecutados, por los órganos de Línea, representado por las Direcciones que conforman el PEHCBM. Los Componentes se encuentran alineados a los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

Capítulo V.- Ejecución Presupuestal del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo en el año fiscal 2023, y los estados financieros.

Finalizando el documento presentamos el panel fotográfico ordenado de los principales proyectos en ejecución, actividades realizadas y otros, en cada uno de los componentes.


PRESENTACIÓN

La Memoria Anual 2023, es un documento consolidado resultante de la sistematización de la información proporcionada por las Direcciones de Línea del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; con el objetivo de presentar y publicar los resultados de la gestión durante el año fiscal 2023, los mismos que están orientados al cumplimiento progresivo de las metas, objetivos, misión y visión contemplados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2030.

El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo ha consolidado y sistematizado la presente MEMORIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2023, dentro del Marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, teniendo en común alcanzar objetivos y metas planteadas en la visión Institucional. Nuestras autoridades, funcionarios, profesionales y técnicos han contribuido al cumplimiento de los planes, programas y proyectos del año 2023.

Es importante indicar que la gestión se ha orientado a realizar acciones concretas con el fin de lograr los Objetivos Estratégicos planteados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2030 y el Plan Estratégico Institucional 2021-2026 ampliado, donde se definen componentes de acuerdo a los lineamientos que establece el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

En este contexto, de manera sistematizada y sintetizada, la Gerencia General del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto, presenta este documento de carácter público donde se describe las ejecuciones de proyectos y actividades con sus respectivos resultados y logros durante el año fiscal 2023. Finalmente presentamos los estados financieros a la sociedad civil en cumplimiento a la práctica de nuestros principios y valores.



CAPITULO I

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en adelante el PEHCBM, es la unidad ejecutora del Gobierno Regional de San Martín, según el Artículo 4º del MOP el PEHCBM es un órgano desconcentrado de ejecución, adscrito al Pliego Gobierno Regional de San Martín, en adelante GRSM; con personería jurídica de derecho público interno y autonomía técnica, económica y administrativa, estando constituida como Unidad Ejecutora teniendo como objetivo el desarrollo integral de la población rural en el valle del Huallaga Central y Bajo Mayo. También el Artículo 5º del MOP del PEHCBM tiene como domicilio legal la ciudad de Tarapoto y desarrolla sus actividades en ocho (08) provincias de la región San Martín: Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, San Martín, El Dorado, Bellavista, Picota y Tocache

Dirección : Jr. Proyecto N° 347 –Tarapoto – San Martín
N° de RUC : 20148168955
Teléfonos : (042) 522508
Página Web : <http://www.pehcbm.gob.pe>


1.1.1. CREACIÓN

Mediante Decreto Ley N° 22517 del 01 de mayo del año 1979, se crea la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; con el encargo de ejecutar el Proyecto de Desarrollo de las Tierras de Ceja de Selva en el área de Huallaga Central y Bajo Mayo, en el departamento de San Martín.

Mediante Decreto Supremo N° 019-2007-EF del 1 de abril del 2007 y Decreto Supremo N° 044-2007-EF del 13 de abril del 2007, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en el marco del proceso de descentralización, es transferido al Gobierno Regional de San Martín y autorizado la transferencia de partidas presupuestales para el año 2007 a favor del Pliego 0459 Gobierno Regional de San Martín, Unidad Ejecutora 018 Huallaga Central y Bajo Mayo. Desde entonces venimos trabajando conforme a los lineamientos de desarrollo del Gobierno Regional en la búsqueda de la competitividad con inclusión social y sostenibilidad ambiental, manteniendo su autonomía técnica, económica y administrativa como unidad ejecutora; siendo su ámbito de aplicación las siguientes Provincias: Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, San Martín, El Dorado, Bellavista, Picota y Tocache, conforme a la demarcación política vigente.



1.2. MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2023

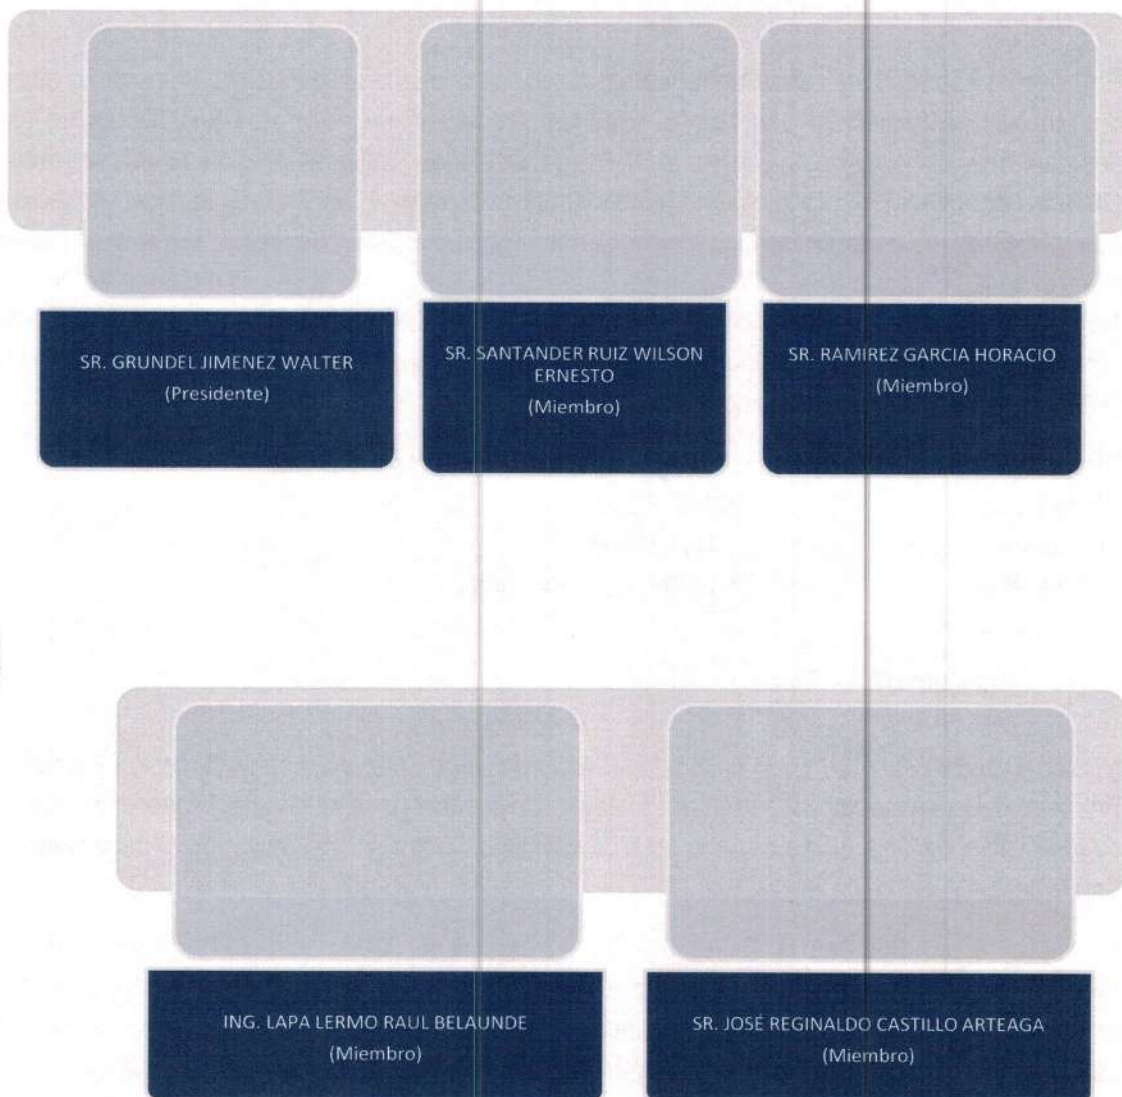

1.3. DIRECTORIO DEL PEHCBM 2023



Ing. JAVIER SINTI FLORES
Gerente General



Abog. LUIS ENRIQUE PASTOR CÁRDENAS
Órgano de Control Institucional



Ing. CESAR AUGUSTO CORAL RENGIFO
Oficina de Planificación y Presupuesto



Abog. JUAN CARLOS MAS GUIVIN
Oficina de Asesoría Legal



Lic. Adm. CRISTINA VILLOBO VALLES
Oficina de Administración



Ing. LEYDY TORRES MENDOZA
Dirección de Medio Ambiente



Ing. HOMERO MENDOZA PINCHI
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión Privada



Ing. EDWIN ERNESTO PÉREZ ZAVALETA
Dirección de Obras



Ing. OMAR JAVIER CAJO MARTÍNEZ
Dirección de Estudios y Proyectos



1.4. BASE LEGAL

- Decreto Ley N°22517 Creación del PEHCBM.
- Decreto Supremo N°044-2007-EF, que como Unidad Ejecutora del Pliego Gobierno Regional de San Martín al Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
- Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley N° 27867.
- La Constitución Política del Perú; Ley N°27680.
- Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902 y N° 28013, reconocen que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
- La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, establece que los Gobiernos Regionales tienen la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de sus competencias.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias
- Ley Marco del Presupuesto Participativo
- Ley N° 31638 de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023
- Ley N° 29785 Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política de Modernización.
- Directiva N° 002-2022-GRSM/GRPyP-SGDI, Normas y Procedimientos para la presentación de la Memoria Anual de Gestión Institucional del Gobierno Regional de San Martín.



1.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

01. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

- 01.1. Consejo Directivo
- 01.2. Gerencia General

02. ÓRGANOS DE CONTROL

- 02.1. Órgano de Control Institucional

03. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- 03.1. Oficina de Planificación y Presupuesto
- 03.2. Oficina de Asesoría Legal

04. ÓRGANO DE APOYO

- 04.1. Oficina de Administración

05. ÓRGANOS DE LINEA

- 05.1. Dirección de Estudios y Proyectos
- 05.2. Dirección de Obras
- 05.3. Dirección de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión Privada
- 05.4. Dirección de Medio Ambiente



Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo

Estructura Orgánica



CAPÍTULO II: FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua



Para la actualización de políticas y planes estratégicos, se aplica un ciclo compuesto por las cuatro fases siguientes:

Fase 1: El conocimiento integral de la realidad

Se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar, mediante la caracterización y el diagnóstico de variables que definen la situación actual. Se describe el territorio, los recursos disponibles (físicos, ambientales, económicos, sociales, culturales), sus interrelaciones y las condiciones de vida de su población. Mediante el diagnóstico, se relevan los problemas, las necesidades y prioridades de la población; las brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos de calidad que deben ser cerradas para mejorar su calidad de vida; y las intervenciones de actores que operan en el territorio (sector público, privado y sociedad civil). Mediante este análisis, se obtiene una imagen del territorio actual que reconoce y valora la diversidad de las realidades locales.

Fase 2: El futuro deseado

Se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se define la imagen del territorio deseado. El análisis de futuro identifica tendencias, oportunidades, riesgos, escenarios contextuales, escenarios disruptivos y alertas tempranas que podrían afectar, en forma positiva o

negativa, la provisión de servicios y el bienestar de las personas. La imagen del territorio deseado representa una situación más favorable que la actual, factible de ser alcanzada en un periodo dado mediante la acción coordinada del Estado. Se construye de forma concertada, a partir del conocimiento integral de la realidad y el análisis de futuro deseado.

Fase 3: Políticas y planes coordinados

Se definen las políticas públicas, de forma articulada entre sectores y niveles de gobierno, orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado, a través de objetivos prioritarios y lineamientos. Las políticas se reflejan en planes con objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y acordes con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) y en acciones de orden estratégico priorizadas. Al actualizar los planes, se incluyen acciones de prevención de riesgo de desastres y evaluaciones de simulacros de eventos que podrían causar pérdidas en el bienestar de las personas (contingencias) y afectar el logro del futuro deseado.

Fase 4: El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua

Se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, así como el uso de los recursos asignados con ese fin. Además, se analizan los cambios ocurridos en la vida de las personas (esperados o no esperados) y se generan informes periódicos que permiten identificar alternativas para mejorar políticas y planes, con respecto a su diseño o implementación, para el logro de los objetivos planteados. De esta manera, los informes de seguimiento y evaluación retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que está orientado a resultados favorables para el bienestar de las personas.



CAPITULO III: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN INSTITUCIONAL


VISIÓN INSTITUCIONAL

Al 2030, San Martín es modelo de región en bienestar social, competitividad y valoración de nuestros recursos naturales y diversidad. (PDRC SM AL 2030)

MISIÓN INSTITUCIONAL

Organizar y conducir la gestión pública regional promoviendo el desarrollo integral sostenible a través de la inversión pública y privada, el empleo, el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades en el departamento de San Martín, de manera íntegra, transparente, competitiva e inclusiva. (PEI 2024-2027)

MAPA DEL MODELO CONCEPTUAL SAN MARTÍN: COMPONENTES Y SUB COMPONENTES



CAPITULO IV: RESULTADOS DE GESTIÓN

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

RESULTADOS DE LA GESTIÓN PERIODO 2023

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 15 TRANSPORTE

2.280937 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN

Inicio de Obra (periodo 2020-2022)	: 24/01/2020
Inicio del Saldo de Obra	: 09/09/2024 (proyectado)
Fecha de Culminación Programada	: 30/04/2025 (proyectado)
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 09/06/2025 (proyectado)
Fecha de Transferencia Programada	: 18/06/2025 (proyectado)
Avance Físico Acumulado al 2023	: 78.22%
Avance Físico Solo 2023	: 0.00

Mejoramiento y Construcción de la Carretera Departamental SM-106; Tramo: Chazuta - Curiyacu, de 20+050 km. de longitud, con un ancho de superficie de rodadura 4.50 m. a nivel de afirmado granular mejorado con estabilizadores de suelos (PERMAZYNE 01 Lt por 20 M3 + 2% Silical), bermas de 0.5 m a cada lado. •Construcción de 12 Puentes Viga Losa de Longitud variable, construcción 129.26 ml de alcantarillas de concreto y 529.34 ml de alcantarillas TMC, 110.43 ml de muros de concreto y construcción de 5371.50 ml de cunetas de concreto simple. Capacitación al Comité pro mantenimiento, pobladores y a todos los que hacen uso de la vía, con la finalidad de crear conciencia, promover actitudes responsables para el mantenimiento de la vía, no dañando las señales de tránsito, para conservar la vía en óptimo estado de funcionalidad evitando también los accidentes de tránsito. La capacitación se realizará 02 veces durante la ejecución del proyecto a cargo de la Unidad Ejecutora.

Este Proyecto cuenta con **liquidación técnica financiera**, pendiente la ejecución del saldo de obra, presentando una ejecución de gastos de **S/. 351,963.18** que significa el **6.27 %** del PIM asignado en el 2023. Con un avance físico de **0%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
520,116.00	9,418,532.00	351,963.18	6.27	Kilometro	4.37	0.00

LOGROS

Transitabilidad de beneficiarios a los centros poblados Tununtununba, Shilcayo y Tupac Amaru, del tramo Chazuta a Curiyacu

LIMITACIONES

Abandono de obra por parte del contratista, déficit en contratación de personal para peritaje y elaboración de expediente de saldo de obra.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

- ✓ Cuenta con la probación la Liquidación Técnica Financiera por la Entidad PEHCBM, mediante RESOLUCION DIRECTORAL N°. 070-2023-GRSM-PEHCBM/DO (13-06-2023)
- ✓ Se viene elaborando TDR para peritaje técnico – financiero, elaboración de expediente de saldo de obra.

2.342702 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN

Inicio de Obra	: 10/05/2022
Fecha de Culminación Programada	: 14/02/2024
Fecha de Recepción de Obra Programada	: 20/03/2024
Fecha de Transferencia Programada	: 19/05/2024
Avance Físico Acumulado al 2023	: 80.26%
Avance Físico Solo 2023	: 100%

Mejoramiento de vía. - 61656; 18.392 km de afirmado, e=0.10. Tramos Santa Rosa - Santa Fe = 5.3 Km. Tramo Santa Fe - Limón= 1.2 Km. Tramo Limón - La Primavera= 4.5 km. Tramo La Primavera - Nuevo Chanchamayo= 2.5 Km. Tramo Nuevo Chanchamayo - La Divisoria= 2.8 Km. Tramo La Divisoria - El Ponal= 2.09 Km. Los siguientes trabajos. - Trazo y Replanteo. - 18.392 Km. Corte a nivel de Subrasante. - 261,216.18 Km. Conformación de terraplenes. - 32,717.61 m3. Refine y nivelación de subrasante. - 110,350.13 m2. Colocación de carpeta de afirmado e=0.10.- 88,250.11 m2. Conformación de plazoletas de cruce. - 36 unid. Construcción de Drenaje Pluvial.- 61656; Conformación de cunetas de tierra.- 18,392 ml. 61656; Construcción de badenes de mampostería de piedra.- 26 unid. 61656; Construcción de Alcantarillas TMC 61542;=48'. - 18 unid. Señalización Vial.- 61656; 19 Unid. Hitos Kilométricos. 61656; 07 Señales Informativas. Mitigación Ambiental 61656; Plan de Manejo Ambienta (01)

Este Proyecto se encuentra **en ejecución**, presentando una ejecución financiera del año 2023 de **S/. 9,514,890.00** que significa el **99.16%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	9,595,194.00	9,514,890.00	99.16	Kilometro	7.992	7.992



PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"



LOGROS

Transitabilidad de beneficiarios a los centros poblados Santa Rosa, Santa Fe, Limón, La Primavera, Nuevo Chanchamayo, La Divisoria, El Ponal del Valle del Bombonajillo, distrito de Bajo Biavo - Bellavista

LIMITACIONES

La contratista demostró incumplimiento de programación.

2.491462 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE -M-922, SM -923 Y SM-924, TRAMO: EMP.PE-5N (NUEVO HORIZONTE)-CAÑUTO, DEL DISTRITO DE POLVORA, PROVINCIA DE TOCACHE, DPTO. SAN MARTIN

Inicio De Obra	: 13/10/2022
Inicio del Saldo de Obra	: 24/06/2024 (proyectado)
Fecha De Culminación Programada	: 21/10/2024 (proyectado)
Fecha De Recepción De Obra Programada	: 26/12/2024 (proyectado)
Fecha De Transferencia Programada	: 17/02/2025 (proyectado)
Avance Físico Acumulado al 2023	: 56.35%
Avance Físico Solo 2023	: 23.05%



CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO. Acción 01: Se realizarán trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 4.137 km, en la partida movimiento de tierras se realizarán actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (4.14 ha), corte y desquinche en material suelto (396.97m³), conformación de terraplén (16728.98m³), en la partida de transporte se realizarán las actividades de : transporte de material propio seleccionado DP>=2.0 km (21747.67), transporte de material excedente para eliminación (516.06m³), transporte de material afirmado DP>=2.0 km (8251.07m³), transporte de material granular DP>=2.0 KM (9200.43m³), Transporte de mezcla asfáltica DP>=2.0 km (1914.42), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (29452.60m²), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (7077.25m³), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (6346.98m³), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (29452.60m²), carpeta asfáltica e=0.05m (29452.60m²), ensayos de deflectometría (4.14km). **B. COMPONENTE 2: ADECUACION Y DOTACION DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.** Acción 02: Construcción de alcantarillas rectangulares de concreto armado f'c= 210 kg/cm² MCA de 1.20x1.20m (7 und), construcción de badenes de dimensiones: 7.00 de ancho por 10.00m de largo (2 und), construcción de pontón de concreto armado f'c= 210 kg/cm² en estribos, f'c= 280 kg/cm² en loza y f'c=210 kg/cm² en aletas (01 und), construcción de cunetas revestidas de concreto f'c=175 kg/cm² (2488.80 m). **C. COMPONENTE 3: ADECUACION Y DOTACION DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.** Acción 03: Implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (12 und), señales reglamentarias (21 und), señales informativas (30 und), señales reguladoras (10 und), captafaros para pavimento (520 und), marcas en el pavimento con micro esferas (500 m²), guardianía (65 m) e hitos kilométricos (5 und) y un Plan de seguridad (6 estudios). Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental (04 estudios),



PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"



que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (4500 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (4 und). Así mismo se realizará el Control de calidad (5 estudios), Plan de monitoreo arqueológico (01 estudio), Plan de compensación por expropiación de terrenos (01 estudios), Capacitación en mantenimiento (capacitación técnica en mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y conservación vial de carreteras vecinales).

Este Proyecto cuenta con **resolución de contrato**, presentando una ejecución de gastos el 2023 de **S/. 1,786,063.81** que significa el **61.14 %** del PIM asignado. Con un avance físico de **23.05%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	2,921,347.00	1,786,063.81	61.14	Kilometro	3.050	0.703

LOGROS

Apertura de todo el tramo, así como el mejoramiento para la transitabilidad de los peatones.

LIMITACIONES

Resolución de contrato por tener una ejecución por debajo del 80%

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se viene elaborando TDR para peritaje técnico – financiero, elaboración de expediente de saldo de obra.

2.491482 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DDISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DPTO. SAN MARTIN

Inicio de Obra	: 07/12/2021
Fecha de Culminación	: 10/05/2022
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 02/07/2022
Fecha de Transferencia Programada	: 29/03/2023
Avance Físico Acumulado al 2023	: 100%
Avance Físico Solo 2023	: 100%

A. COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO Acción 01: Se realizaran trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 1.378 km, en la partida movimiento de tierras se realizaran actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (1.38 ha), corte y desquinche en material suelto (6104.44M3), en la partida de transporte se realizaran las actividades de : transporte de material excedente para eliminación (7935.77M3), transporte de material afirmado DP>=1.0 km (2759.12M3), transporte de material granular DP>=1.0 KM (3076.10M3), Transporte de mezcla asfáltica DP>=1.0 km (640.25M3), en la partida de pavimentos,

se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (9850M²), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (2366.23M³), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (2122.40M³), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (9850M²), carpeta asfáltica e=0.05m (9850M²), ensayos de deflectometría (1.38km). B. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 02: Construcción de alcantarilla rectangular de concreto armado MCA de 1.20x1.20m (01 und), muro de contención de concreto armado (40 ml), construcción de cunetas revestidas de concreto f'c=175 kg/cm² (950 m). C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Acción 03: Implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (4 und), señales reglamentarias (3 und), señales informativas (3 und), señales reguladoras (3 und), marcas en el pavimento con micro esferas (384.10 m²), hitos kilométricos (2 Und). Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental, que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (2000 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (2 und).

Este Proyecto se encuentra **culminado**, presentando una ejecución de gastos el 2023 de **S/. 23,321.11** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	23,322.00	23,321.11	100	Informe	1.00	1.00



LOGROS

Proyecto culminación al 100%.

LIMITACIONES

Observado por la Contraloría, habiendo solicitado información física original durante el proceso de liquidación.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se viene elaborando la liquidación financiera final de la inversión, encontrándose en proceso de conciliación.

2.491620 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra : 05/04/2022
Fecha de Culminación : 06/05/2023
Fecha de Recepción de Obra Programada : 15/12/2023
Fecha de Transferencia Programada : 07/06/2023
Avance Físico Acumulado al 2023 : 100%

Avance Físico Solo 2023

: 100%

A. COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO Acción 01: Se realizarán trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 3.40 km, en la partida movimiento de tierras se realizarán actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (3.40 has), corte y desquinche en material suelto (6847.89M3), conformación de terraplén (1477.27 m3), en la partida de transporte se realizarán las actividades de : transporte de material propio seleccionado $DP \geq 2.0$ km (1920.45m3), transporte de material excedente para eliminación $DP \geq 5.0$ KM (8902.26m3), transporte de material afirmado $DP \geq 2.0$ km (6982.65m3), transporte de material granular $DP \geq 2.0$ KM (7715.42m3), Transporte de mezcla asfáltica $DP \geq 2.0$ km (1631.16m3), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (25094.80m2), mejoramiento de subbase con material granular $e=0.20$ (5934.94m3), mejoramiento de base con material de afirmado $e=0.20$ (5371.27m3), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (25094.80m2), carpeta asfáltica $e=0.05$ m (25094.80m2), ensayos de deflectometría (3.40 km). B. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 02: Construcción de alcantarilla rectangular de concreto armado $f'c= 210$ kg/cm2 MCA de 1.20x1.20m (01 und), construcción de Baden de dimensiones: 7.00 de ancho por 30.00m de largo (01 und), construcción de pontón de concreto armado $f'c= 210$ kg/cm2 en estribos, $f'c= 280$

kg/cm2 en loza y $f'c=210$ kg/cm2 en aletas (01 und), construcción de cunetas revestidas de concreto $f'c=175$ kg/cm2 (2035.80 m). C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Acción 03: Implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (10 und), señales reglamentarias (20

und), señales informativas (30 und), señales reguladoras (10 und), captafaros para pavimento (520 und), marcas en el pavimento con micro esferas (500 m2), hitos kilométricos (5 Und) y guardianía (500 m) y un plan de seguridad (06 estudios). Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental (04 estudios), que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (4500 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (4 und). Así mismo se realizará el Control de calidad (5 estudios), Plan de monitoreo arqueológico (01 estudio), Plan de compensación por expropiación de terrenos (01 estudios), Capacitación en mantenimiento (capacitación técnica en mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y conservación vial de carreteras vecinales).

Este Proyecto se encuentra Culminado, presentando una ejecución de gastos el 2023 de **S/. 893,781.69** que significa el **99.83%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100.00%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	895,275.00	893,781.69	99.83	Kilometro	0.540	0.540

LOGROS

Transitabilidad peatonal, culminación de ejecución.

LIMITACIONES

Culminación de obra con penalidad.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se viene recopilando información para liquidación financiera final de inversión, estando pendiente la presentación de liquidación de contrato por el contratista ejecutor.

2.491678 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra	: 08/12/2021
Fecha de Culminación	: 06/06/2022
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 27/07/2022
Fecha de Transferencia Programada	: 29/03/2024
Avance Físico Acumulado al 2023	: 100%
Avance Físico Solo 2023	: 100%

A. COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO Acción 01: Se realizarán trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 2.706 km, en la partida movimiento de tierras se realizarán actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (2.71 ha), corte y desquinche en material suelto (8049.52 m³), conformación de terraplén (359.95 m³), en la partida de transporte se realizarán las actividades de : transporte de material propio seleccionado DP>=1.0 km (467.94 m³), transporte de material excedente para eliminación (10464.37m³), transporte de material afirmado DP>=2.0 km (5408.95m³), transporte de material granular DP>=2.0 KM (6024.79m³), Transporte de mezcla asfáltica DP>=2.0 km (1256.01m³), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (19323.20m²), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (4634.45m³), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (4160.73m³), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (19323.20m²), carpeta asfáltica e=0.05m (19323.20m²), ensayos de deflectometría (2.71km). B. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 02: construcción de alcantarilla rectangular de concreto armado MCA de 1.20x1.20m (05 und), construcción de alcantarilla rectangulares de concreto armado de dos ojos MCA de 1.50x1.50m (01 und), muro de contención de concreto armado (16 ml), construcción de cunetas revestidas de concreto f'c=175 kg/cm² (1625 m). C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Acción 03: implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (5 und), señales reglamentarias (3 und), señales informativas (4 und), señales reguladoras (3 und), marcas en el pavimento con micro esferas (734 m²), hitos kilométricos (3 Und) Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental, que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (2500 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de





PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"



máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (3 und). Capacitación técnica en mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y conservación vial de carreteras vecinales.

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos el 2023 de **S/. 48,324.68** que significa el **87.90%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	54,978.00	48,324.68	87.90	Informe	1.00	1.00

LOGROS

Culminación de obra al 100%

LIMITACIONES

Observado por la Contraloría, habiendo solicitado información física original durante el proceso de liquidación

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se viene elaborando la liquidación financiera final de la inversión, encontrándose en proceso de conciliación



2.491751 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra	: 05/04/2022
Fecha de Culminación Programada	: 06/05/2023
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 06/07/2023
Fecha de Transferencia Programada	: 29/03/2023
Avance Físico Acumulado al 2023	: 100%
Avance Físico Solo 2023	: 100%

COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO Acción 01: Se realizaran trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 4.744 km, en la partida movimiento de tierras se realizaran actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (4.74 ha), corte y desquinche en material suelto (19922.49 m3), en la partida de transporte se realizaran las actividades de ,transporte de material excedente para eliminación (25899.24m3), transporte de material afirmado DP>=2.0 km (9496.39m3), transporte de material granular DP>=2.0 KM (9928.04m3), Transporte de mezcla asfáltica DP>=2.0 km (2244.60m3), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (34532.32m2), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (7636.96m3), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (7304.91m3), imprimación de base

con asfalto diluido mc-30 (34532.32m²), carpeta asfáltica e=0.05m (34532.32m²), ensayos de deflectometría (4.74km). B. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 02: Construcción de alcantarillas rectangulares de concreto armado f'c= 210 kg/cm². tipo cajón MCA 1.20x1.20 (02 und), construcción de badenes de concreto f'c= 210 kg/cm² de dimensiones: 7.00 de ancho por 10.00m de largo (7 und), construcción de pontón de concreto armado concreto f'c= 210 kg/cm² en estribos, concreto f'c= 280 kg/cm² en loza y concreto f'c=210 kg/cm² en aletas (04 und), construcción de cunetas revestidas de concreto f'c= 175 kg/cm² (2134.55 ml). C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Acción 03: Implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (15 und), señales reglamentarias (25 und), señales informativas (30 und), señales reguladoras (10 und), captafaros para pavimento (550 und), marcas en el pavimento con micro esferas (600 m²), hitos kilométricos (5 Und) y guardianía (65 m) y un plan de seguridad (06 estudios). Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental (04 estudios), que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (4500 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (4 und). Así mismo se realizará el Control de calidad (5 estudios), Plan de monitoreo arqueológico (01 estudio), Plan de compensación por expropiación de terrenos (01 estudios), Capacitación en mantenimiento (capacitación técnica en mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y conservación vial de carreteras vecinales).

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos el 2023 de **S/. 2,949,652.07** que significa el **98.99%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	2,979,765.00	2,949,652.07	98.99	Kilometro	1.910	1.910

LOGROS

Culminado al 100%

LIMITACIONES

Déficit de personal para revisión de liquidación presentada por la contratista y supervisión.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

En revisión de liquidación de contrato de ejecución consentida 07.11.23.

2.492668 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE -DPTO SAN MARTIN

Inicio de Obra

: 04/02/2023

Inicio del Saldo de Obra

: 18/06/2024 (proyectado)

Fecha de Culminación Programada	: 15/12/2024
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 22/01/2025
Fecha de Transferencia Programada	: 27/03/2025
Avance Físico Acumulado al 2023	: 31.15%
Avance Físico Solo 2023	: 31.15%

CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO Acción 01: Se realizarán trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 4.166 km, en la partida movimiento de tierras se realizarán actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (4.17 ha), corte y desquinche en material suelto (15352.34m³), conformación de terraplén (384.88 m³), en la partida de transporte se realizarán las actividades de : transporte de material propio seleccionado DP>=2.0km (500.34m³), transporte de material excedente para eliminación DP>=5.0KM (19958.04m³), transporte de material afirmado DP>=2.0 km (6448.53m³), transporte de material granular DP>=2.0 KM (9396.17m³), Transporte de mezcla asfáltica DP>=2.0 km (2035.49m³), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (31315.20m²), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (7227.82m³), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (4960.41m³), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (31315.20m²), carpeta asfáltica e=0.05m (31315.20m²), ensayos de deflectometría (4.17km). B. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 02: Construcción de alcantarillas rectangulares de concreto armado f'c= 210 kg/cm². Tipo cajón MCA 1.20x1.20 (09 und), construcción de badenes de concreto f'c= 210 kg/cm² de dimensiones: 7.00 de ancho por 10.00m de largo (05 und), construcción de cunetas revestidas de concreto f'c= 175 kg/cm² (2499.34 ml). C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Acción 03: Implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (15 und), señales reglamentarias (25 und), señales informativas (30 und), señales reguladoras (10 und), captafaros para pavimento (550 und), marcas en el pavimento con micro esferas (600 m²), hitos kilométricos (5 Und) y guardianía (65 m) y un plan de seguridad (06 estudios). Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental (04 estudios), que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (4500 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (4 und). Así mismo se realizara el Control de calidad (5 estudios), Plan de monitoreo arqueológico (01 estudio), Plan de compensación por expropiación de terrenos (01 estudios), Capacitación en mantenimiento (capacitación técnica en mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y conservación vial de carreteras vecinales).

Este Proyecto cuenta con **resolución de contrato**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 4,170,906.41** que significa el **73.43%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **31.15%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
6,475,006.00	5,679,986.00	4,170,906.41	73.43	Kilometro	4.170	1.298

LOGROS

Apertura de todo el tramo, así como el mejoramiento para la transitabilidad de los peatones.

LIMITACIONES

Incongruencias del expediente técnico con el replanteo en campo, interferencias (postes y alcantarilla).

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se solicitó asignación de recurso para peritaje técnico – financiero y elaboración de expediente de saldo de obra.

2.493059 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra	: 01/04/2022
Inicio del Saldo de Obra	: 2024
Fecha de Culminación Programada	: 2025
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 2025
Fecha de Transferencia Programada	: 2025
Avance Físico Acumulado al 2023	: 4.97%
Avance Físico Solo 2023	: 4.97%

CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO Acción 01: Se realizarán trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 2.616 km, en la partida movimiento de tierras se realizarán actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (2.62 ha), corte y desquinche en material suelto (9595.21 m³), conformación de terraplén (240.55 m³), en la partida de transporte se realizarán las actividades de : transporte de material propio seleccionado DP>=1.0km (312.72m³), transporte de material excedente para eliminación DP>=5.0KM (12473.77m³), transporte de material afirmado DP>=1.0 km (5210.80m³), transporte de material granular DP>=1.0 KM (5810.65m³), Transporte de mezcla asfáltica DP>=1.0 km (1208.97m³), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (18599.60m²), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (4469.73m³), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (4008.31m³), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (18599.60m²), carpeta asfáltica e=0.05m (18599.60m²), ensayos de deflectometría (2.62km). B. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 02: construcción de alcantarillas rectangulares de concreto armado MCA 1.20x1.20 (03 und), construcción de cunetas revestidas de concreto f'c=175 kg/cm² (1569.60 ml). C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Acción 03: Implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (5 und), señales reglamentarias (3 und), señales informativas (3 und), señales reguladoras (3 und), marcas en el pavimento con micro esferas (734.85 m²), hitos kilométricos (3 Und). Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental, que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (2000 und), recuperación

ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (3 und).

Este Proyecto cuenta con **resolución de contrato**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 434,534.28** que significa el **75.01%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **4.97%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
4,058,081.00	579,267.00	434,534.28	75.01	Kilometro	2.620	0.130

LOGROS

Transitabilidad del tramo

LIMITACIONES

Insolvencia económica de la contratista. Falta la disponibilidad de terreno tramo km0+580 al 2+400, por interferencia con el proyecto de Saneamiento de Tocache, hecho que imposibilita la ejecución del saldo de obra.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se ha solicitado presupuesto para peritaje técnico – financiero y elaboración de expediente de saldo de obra.

2.530935 CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Fecha Inicio Elab Exp. Téc. : Noviembre del 2022

Fecha Culminación Exp. Téc. : En el mes de Julio-2024

Avance físico Acumulado Exp. Téc. : 70%

Avance físico Acumulado Exp. Téc. Solo 2023: 100%

Construcción de 01 Puente Vehicular sobre la Quebrada Santa Flor de 40.0 m. de luz, sub estructura tipo estribos en cantiléver y súper estructura tipo sección compuesta con vigas de acero estructural y losa de concreto armado, Capa de Rodadura de Pavimento Flexible-INTANGIBLES - OTROS: Intervención Social, Plan de Fortalecimiento Institucional y Gestión Operativa, Implementación de Plan Monitoreo Arqueológico.

Este Proyecto se encuentra en **elaboración del expediente técnico** presentando una ejecución de gastos de **S/. 128,700.00** que significa el **100%** del PIM asignado el 2023, con un avance físico del **100%** según lo programado al 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	128,700.00	128,700.00	100	Exp. Téc	0.350	0.350

LOGROS

Los logros que se ha obtenido en el año 2023 con respecto al presente proyecto, es el avance de la consultoría, es decir se ha presentado a la fecha 3 entregables.

LIMITACIONES

La principal limitante que tuvimos en el proyecto en mención fue la **SUSPENSIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL** en el tercer entregable (21 de marzo del 2023), debido a que no se cuenta con la certificación ambiental emitido por la SERNANP.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Las acciones implementadas en el presente proyecto son de contratar un Profesional especialista AMBIENTAL, para que realice todas las coordinaciones y trámites correspondientes a la suspensión de plazo contractual.



RESULTADOS DE LOS IOARRs y PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 20 SALUD

2.234509 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE,
PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN

Inicio de Obra	: 18/09/2015
Fecha de Culminación	: 08/08/2018
Fecha de Recepción	: 13/09/2019
Fecha de Transferencia Programada	: 27/03/2024
Avance Físico Acumulado al 2023	: 100%
Avance Físico Solo 2023	: 100%

Esta alternativa comprende: la construcción de la nueva infraestructura en un nuevo terreno, la adquisición de equipamiento biomédico, informático (software) y mobiliario, programa de capacitación en el mantenimiento periódico de los equipos e infraestructura, implementación de un sistema que optimice el uso de los servicios de salud, capacitación general del personal asistencial en nuevas metodologías en atención integral de salud, capacitación al personal administrativo en nuevas técnicas de gestión administración y logística de establecimientos de salud, plan integral de promoción y sensibilización a la población en los servicios de salud y un programa de difusión de la cartera de salud del establecimiento

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 257,406.52** que significa el **100%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
9,018,018	257,407.00	257,406.52	100.00	Informe	1.00	1.00

LOGROS

Culminación de la obra al 100%

LIMITACIONES

Contratista no quiere emitir factura por pago de saldo de obra. Proceso de arbitraje en curso iniciado por la contratista.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se ha solicitado presupuesto para pago, se cuenta con liquidación de contrato de ejecución, se ha recopilado información para liquidación financiera final de inversión.

2.234510 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.

Inicio de Obra : 12/08/2015
 Fecha de Culminación : 03/11/2016
 Fecha de Recepción : 05/08/2017
 Fecha de Transferencia Programada : 27/05/2024
 Avance Físico Acumulado al 2023 : 100%
 Avance Físico Solo 2023 : 83.33%

la alternativa contempla: la construcción de una nueva infraestructura sobre un terreno nuevo, la adquisición de equipamiento biomédico, informático (incluido software) y mobiliario, programa de capacitación en el mantenimiento periódico de los equipos e infraestructura, implementación de un sistema que optimice el uso de los servicios de salud, capacitación general del personal asistencial en nuevas metodologías en atención integral de salud, capacitación al personal administrativo en nuevas técnicas de gestión administración y logística de establecimientos de salud y un programa de difusión de la cartera de salud del establecimiento y un plan integral de promoción y sensibilización a la población en los servicios de salud.

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 412,530.27** que significa el **67.36%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **83.33%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
841,882	612,422.00	412,530.27	67.36	Informe	12.00	10.00

LOGROS

Culminación de la obra al 100%

LIMITACIONES

Proceso de arbitraje en curso iniciado por la contratista

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se viene ejecutando la conciliación y recopilando información para liquidación financiera final de inversión.

2.377760 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN

Inicio de Obra : 04/2024 (proyectado)
 Fecha de Culminación Programada : 09/2024 (proyectado)
 Fecha de Recepción De Obra Programada : 01/2025
 Fecha de Transferencia Programada : 03/2025



PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"



Avance Físico Acumulado al 2023 : 0%
Avance Físico Solo 2023 : 0%

Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno • Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios. • Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura. • Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los servicios de salud. • Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud. • Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. • Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios. • Adquisición de ambulancia terrestre debidamente equipada • Adquisición de movilidad de transporte terrestre tipo todo terreno.

Este Proyecto se encuentra en **Procedimiento de selección**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 72,206.59** que significa el **3.31%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **0.00%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	2,182,583.00	72,206.59	3.31	Obra	0.100	0.00

LOGROS

Actualización de expediente y lanzamiento de proceso de contratación de ejecución y supervisión

LIMITACIONES

Se actualizó el expediente técnico, fue el motivo de la demora que no se inició ejecución el 2023.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se encuentra en proceso de licitación, con fecha programada para contratación de la ejecución 05/02/2024 y contratación consultoría de supervisión 06/02/2024.

2.377762 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN

Inicio de Obra : 04/2024 (proyectado)
Fecha de Culminación Programada : 09/2024 (proyectado)
Fecha de Recepción De Obra Programada : 01/2025
Fecha de Transferencia Programada : 03/2025
Avance Físico Acumulado al 2023 : 0%
Avance Físico Solo 2023 : 0%

Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno. - Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios. - Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura. - Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los servicios de salud. - Capacitación al personal profesional y técnico asistencial

en técnicas y metodologías de atención integral de salud. - Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. - Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios. - Adquisición de ambulancia terrestre y fluvial debidamente equipada.

Este Proyecto se encuentra en **Procedimiento de selección**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 79,344.16** que significa el **3.41%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **0.00%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	2,308,744.00	79,344.16	3.41	Obra	0.100	0.00

LOGROS

Actualización de expediente y lanzamiento de proceso de contratación de ejecución y supervisión

LIMITACIONES

Se actualizó el expediente técnico, fue el motivo de la demora que no se inició en el 2023 su ejecución

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se encuentra en proceso de licitación, con fecha programada para contratación de la ejecución 05/02/2024 y contratación consultoría de supervisión 06/02/2024

2.377764 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS- DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio de Obra	: 04/2024 (proyectado)
Fecha de Culminación Programada	: 09/2024 (proyectado)
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 01/2025
Fecha de Transferencia Programada	: 03/2025
Avance Físico Acumulado al 2023	: 0%
Avance Físico Solo 2023	: 0%

Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno • Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios. • Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura. • Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los servicios de salud. • Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud. • Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. • Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios. • Adquisición de ambulancias terrestre debidamente equipada. • Adquisición de movilidad de transporte terrestre tipo todo terreno.

Este Proyecto se encuentra en **Procedimiento de selección**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 34,748.40** que significa el **1.51%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **0.00%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	2,308,744.00	34,748.40	1.51	Obra	0.100	0.00

LOGROS

Actualización de expediente y lanzamiento de proceso de contratación de ejecución y supervisión

LIMITACIONES

Se actualizó el expediente técnico, fue el motivo de la demora que no se inició en el 2023 su ejecución

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se encuentra en proceso de licitación, con fecha programada para contratación de la ejecución 05/02/2024 y contratación consultoría de supervisión 06/02/2024

2.486486 ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra	: 08/07/2020
Fecha de Culminación Programada	: 09/03/2024
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 16/04/2024
Fecha de Transferencia Programada	: 22/05/2024
Avance Físico Acumulado al 2023	: 100%
Avance Físico Solo 2023	: 0%

ante la emergencia sanitaria nacional por el COVID 19, se habilitó el área de expansión del establecimiento de salud a través de la unidad productora de salud hospital II-2 Tarapoto con código IPRESS N° 00006918, la cual cuenta con infraestructura potencial para brindar la primera atención a pacientes COVID 19, faltando el equipamiento necesario como es el coche de paro equipado más accesorios, para la atención a pacientes COVID 19 que presentaron un paro cardiorrespiratorio.

Este Proyecto se encuentra **Culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 0.00** que significa el **0.00%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **0.00%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	30,565.00	0.00	0.00	Informe	1.00	0.00



PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"



LOGROS

Culminación de servicios de aguas blandas, agua osmotizada, sistema eléctrico.

LIMITACIONES

Acondicionamiento para instalación de equipamiento trifásico.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se ha solicitado presupuesto para el servicio de instalación de 09 equipos trifásicos.

2.496582 CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra : 18/08/2021
Fecha de Culminación : 29/04/2022 (extra protocolar - NOTARIO)
Fecha de Recepción : 15/07/2022
Fecha de Transferencia Programada : 09/03/2024
Avance Físico Acumulado al 2023 : 100%
Avance Físico Solo 2023 : 100%

Construcción de infraestructura de sala de hospitalización en el marco de la emergencia COVID 19

Este Proyecto se encuentra **culminado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 2,500.00** que significa el **21.59%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	11,580.00	2,500.00	21.59	Informe	1.00	1.00

LOGROS

Culminación de obra al 100%

LIMITACIONES

Déficit de personal para liquidación financiera final de obra

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Recopilación de información para liquidación de ejecución de saldo de obra y liquidación financiera final de obra

RESULTADOS DE LOS IOARRs y PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 17 AMBIENTE

**2.475086 MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24
CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN**

Inicio de Obra	: 25/11/202
Fecha de Culminación Programada	: 31/12/2025
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 30/01/2026
Fecha de Transferencia Programada	: 30/03/2026
Avance Físico Acumulado al 2023	: 37.40%
Avance Físico Solo 2023	: 74.55%

Mejoramiento del manejo de las 24 concesiones para conservación, a través del conocimiento de las potencialidades en las concesiones para su aprovechamiento, Mayor Fortalecimiento de Capacidades a las Organizaciones y una Adecuada Articulación Comercial de los Productos Sostenibles de las Concesiones de Conservación

Este Proyecto se encuentra **en ejecución**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 1,481,103.69** que significa el **74.06%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **74.55%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
2,000,000	2,000,000	1,481,103.69	74.06	Porcentaje	11.13	8.31

LOGROS

- 1) Se han realizado 04 capacitaciones a 24 concesiones en los siguientes temas:
 - Apicultura, identificación de materiales apícolas.
 - Enfermedades y plagas en las abejas
 - Implementación y producción de sistemas agroforestales
 - Aplicación de abonos orgánicos.
- 2) Asistencia técnica en las 24 concesiones en los siguientes cultivos vainilla, cacao, café, abeja y cítricos.
- 3) 02 talleres de capacitación referidos a los temas de conservación de la biodiversidad, valor y servicios generados por las concesiones y temas legales en la Concesión Angaiza y Acobosay
- 4) Se realizó el diagnostico de las 24 concesiones para conservación, si cuentan o no con su instrumento de gestión (Declaración de Manejo – DEMA).

LIMITACIONES

De acuerdo con el PIM - 2023, al proyecto se le asignó un presupuesto de S/. 2,000,000.00 soles, sin embargo, no se ha logrado cumplir en un 100% las actividades programadas, esto debido a diversos factores como inestabilidad laboral del equipo técnico del proyecto, limitada experiencia del personal técnico, procesos administrativos tediosos, entre otros factores que hacen que la gestión del proyecto tenga dificultades en el cumplimiento de metas programadas

RESULTADOS DE LOS IOARRs y PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 22 EDUCACIÓN

2.464324 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Fecha Inicio Elab Exp. Téc. : 08/08/2023

Fecha Culminación Exp. Téc. : Junio-2024

Avance físico Acumulado Exp. Téc. : 20%

Avance físico Acumulado Exp. Téc. Solo 2023: 100%

El Mejoramiento y Ampliación de los servicios de los servicios de Educación Básica Regular I.E ALFONSO UGARTE, será una infraestructura de calidad, ya que es un factor importante para el rendimiento escolar porque cumple un rol motivacional y funcional; es decir, produce una mejor actitud en los estudiantes hacia el aprendizaje y facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje.

La programación multianual de esta inversión tiene como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población estudiantil de la Institución Educativa N°0106 Alfonso Ugarte.

Este Proyecto se encuentra en **Elaboración de Exp. Téc.**, presentando una ejecución de gastos de S/. **140,000.00** que significa el **66.15%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	211,631.00	140,000.00	66.15	Exp. Téc	0.20	0.20

LOGROS

Los logros que se ha obtenido en el año 2023 con respecto al presente proyecto, es el avance de la consultoría, es decir se ha presentado a la fecha el primer entregable.

LIMITACIONES

No existieron limitaciones

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Las acciones implementaciones en el presentado en el presente proyecto es las coordinaciones que estamos realizando con el contratista de manera continua para las siguientes presentaciones de los entregables.

2.599122 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0444 JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD COSTA RICA, DISTRITO DE PAJARILLO, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 22/01/2024
Fecha de Culminación Programada	: 21/03/2024
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 27/03/2024
Fecha de Transferencia Programada	: 14/05/2024
Avance Físico Acumulado al 2023	: 0.0%
Avance Físico Solo 2023	: 0.0%

El proyecto consta en la reparación de Losa Deportiva y Construcción de Cobertura de un área total de 1010.38 m²; está conformada por zapatas de 2.40x1.90 m, concreto de resistencia Fc' 210 y fierro de acero corrugado de 5/8", dados de concreto de 0.55 x 0.70 m, concreto de resistencia F'c 210, donde van soportadas las columnas metálicas de dimensiones 35X40 cm, armadas con tubos metálicos de 1"x1"x2mm y 3"x3"x4.0MM de espesor, y para arriostrar las columnas se utilizan vigas metálicas tipo cerche de dimensiones 50x45m, armadas con tubos metálicos de 2" x 2" x 2 MM.

Sobre las columnas nacen las vigas en arco tipo cercha de 35x60 cm, la cual está compuesta por 04 ángulos de 2.5"x2.5"x3/16" (brida superior e inferior), diagonales de fierro liso de 5/8", arriestre en diagonal en brida superior e inferior con fierro liso de 1/2". Sobre la estructura de los arcos metálicos se colocan las correas metálicas con tubos rectangulares de 2"x4"x3mm, así mismo estas correa se arriostran mediante fierros lisos de 3/8". Para la cobertura se empleará Aluzinc TR4 de 35 mm de espesor. Para disipar los movimientos horizontales entre los arcos metálicos se emplean templadores con fierro liso de 5/8" y tensores con fierro liso de 3/4" según detalle de los planos.

Así mismo el proyecto contempla la reparación de la losa deportiva en caso la requiera, y un sistema de drenaje pluvial por gravedad con canaletas de plancha de fierro galvanizado E=1/27" S/Detalle y 06 montantes para la descarga fluvial con tubos PVC-SAP de 4".

El sistema de iluminación consta de 6 reflectores led de 400w, suficientes para alumbrar todo el espacio deportivo.

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física.

Este Proyecto se encuentra **en Proceso de selección** presentando una ejecución de gastos de **S/. 0.00** que significa el **0.00%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **00%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:



PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"



EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	517,299.00	0.00	0.00	Porcentaje	100.00	0.00

LOGROS

En proceso de selección

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Buen equipo técnico del Comité de Selección, se viene realizando el proceso de selección para la posterior suscripción de contrato de ejecución y supervisión de obra.

2.599172 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0326 EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 22/01/2024
Fecha de Culminación Programada	: 21/03/2024
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 27/03/2024
Fecha de Transferencia Programada	: 14/05/2024
Avance Físico Acumulado al 2023	: 0.0%
Avance Físico Solo 2023	: 0.0%

El proyecto consta en la reparación de Losa Deportiva y Construcción de Cobertura de un área total de 1010.38 m²; está conformada por zapatas de 2.40x1.90 m, concreto de resistencia Fc' 210 y fierro de acero corrugado de 5/8", dados de concreto de 0.55 x 0.70 m, concreto de resistencia F'c 210, donde van soportadas las columnas metálicas de dimensiones 35X40 cm, armadas con tubos metálicos de 1"x1"x2mm y 3"x3"x4.0MM de espesor, y para arriostrar las columnas se utilizan vigas metálicas tipo cerche de dimensiones 50x45m, armadas con tubos metálicos de 2" x 2" x 2 MM.

Sobre las columnas nacen las vigas en arco tipo cercha de 35x60 cm, la cual está compuesta por 04 ángulos de 2.5"x2.5"x3/16" (brida superior e inferior), diagonales de fierro liso de 5/8", arriostre en diagonal en brida superior e inferior con fierro liso de 1/2". Sobre la estructura de los arcos metálicos se colocan las correas metálicas con tubos rectangulares de 2"x4"x3mm, así mismo estas correa se arriostran mediante fierros lisos de 3/8". Para la cobertura se empleará Aluzinc TR4 de 35 mm de espesor. Para disipar los movimientos horizontales entre los arcos metálicos se emplean templadores con fierro liso de 5/8" y tensores con fierro liso de 3/4" según detalle de los planos.

Así mismo el proyecto contempla la reparación de la losa deportiva en caso la requiera, y un sistema de drenaje pluvial por gravedad con canaletas de plancha de fierro galvanizado E=1/27" S/Detalle y 06 montantes para la descarga fluvial con tubos PVC-SAP de 4".

El sistema de iluminación consta de 6 reflectores led de 400w, suficientes para alumbrar todo el espacio deportivo.





PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"



El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física.

Este Proyecto se encuentra **en Proceso de selección** presentando una ejecución de gastos de **S/. 0.00** que significa el **0.00%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **00%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	606,164.00	0.00	0.00	Porcentaje	100.00	0.00

LOGROS

En proceso de selección

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Buen equipo técnico del Comité de Selección, se viene realizando el proceso de selección para la posterior suscripción de contrato de ejecución y supervisión de obra

2.599208 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0309 TUPAC AMARU II, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 22/01/2024
Fecha de Culminación Programada	: 21/03/2024
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 27/03/2024
Fecha de Transferencia Programada	: 14/05/2024
Avance Físico Acumulado al 2023	: 0.0%
Avance Físico Solo 2023	: 0.0%

El proyecto consta en la reparación de Losa Deportiva y Construcción de Cobertura de un área total de 842.17 m²; está conformada por zapatas de 2.00 x 1.60 m, concreto de resistencia Fc' 210 y fierro de acero corrugado de 5/8", dados de concreto de 0.50 x 0.60 m, concreto de resistencia F'c 210, donde van soportadas las columnas metálicas de dimensiones 30X40 cm, armadas con tubos metálicos de 1"x1"x2mm y 3"x3"x3MM de espesor, y para arriostrar las columnas se utilizan vigas metálicas tipo cerche de dimensiones 50x 40m, armadas con tubos metálicos de 2" x 2" x 2 MM. Sobre las columnas nacen las vigas en arco tipo cercha de 30x50 cm, la cual está compuesta por 04 ángulos de 2"x2"x3/16" (brida superior e inferior), diagonales de fierro liso de 5/8", arriostre en diagonal en brida superior e inferior con fierro liso de 1/2". Sobre la estructura de los arcos metálicos se colocan las correas metálicas con tubos rectangulares de 2"x4"x3mm, así mismo estas corres se arriostran mediante fierros lisos de 3/8". Para la cobertura se empleará Aluzinc TR4 de 35 mm de espesor. Para disipar los movimientos horizontales entre los arcos metálicos se emplean templadores con fierro liso de 5/8" y tensores con fierro liso de 3/4" según detalle de los planos.

Así mismo el proyecto contempla la reparación de la losa deportiva en caso la requiera, y un sistema de drenaje pluvial por gravedad con canaletas de plancha de fierro galvanizado E=1/27" S/Detalle y 06 montantes para la descarga fluvial con tubos PVC-SAP de 4".

El sistema de iluminación consta de 6 reflectores led de 400w, suficientes para alumbrar todo el espacio deportivo.

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física.

Este Proyecto se encuentra **en Proceso de selección** presentando una ejecución de gastos de **S/. 0.00** que significa el **0.00%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **00%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	532,224.00	0.00	0.00	Porcentaje	100.00	0.00

LOGROS

En proceso de selección

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Buen equipo técnico del Comité de Selección, se viene realizando el proceso de selección para la posterior suscripción de contrato de ejecución y supervisión de obra.

2.599215 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. ANGEL CUSTODIO GARCIA RAMIREZ EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 22/01/2024
Fecha de Culminación Programada	: 21/03/2024
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 27/03/2024
Fecha de Transferencia Programada	: 14/05/2024
Avance Físico Acumulado al 2023	: 0.0%
Avance Físico Solo 2023	: 0.0%

El proyecto consta en la reparación de losa deportiva y cobertura metálica a construir tiene las dimensiones de un área total de 762.85 m²; está conformada por zapatas de 2.0 x 1.6 m , concreto de resistencia Fc' 210 y fierro de acero corrugado de 5/8", dados de concreto de 0.50 x 0.60 m, concreto de resistencia F'c 210, donde van soportadas las columnas metálicas de dimensiones 30X40 cm, armadas con tubos metálicos de 1"x1"x2mm y 3"x3"x3.0MM de espesor, y para arriostrar las columnas se utilizan vigas metálicas tipo cerche de dimensiones 50x 40m, armadas con tubos metálicos de 2" x 2" x 2 MM.



PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"



Sobre las columnas nacen las vigas en arco tipo cercha de 30x50 cm, la cual está compuesta por 04 ángulos de 2"x2"x3/16" (brida superior e inferior), diagonales de fierro liso de 5/8", arriostre en diagonal en brida superior e inferior con fierro liso de 1/2". Sobre la estructura de los arcos metálicos se colocan las correas metálicas con tubos rectangulares de 2"x4"x3mm, así mismo estas corras se arriostran mediante fierros lisos de 3/8". Para la cobertura se empleará Aluzinc TR4 de 35 mm de espesor.

Para disipar los movimientos horizontales entre los arcos metálicos se emplean templadores con fierro liso de 5/8" y tensores con fierro liso de 3/4" según detalle de los planos.

Así mismo el proyecto contempla la reparación de la losa deportiva en caso la requiera, y un sistema de drenaje pluvial por gravedad con canaletas de plancha de fierro galvanizado E=1/27" S/Detalle y 06 montantes para la descarga fluvial con tubos PVC-SAP de 4".

El sistema de iluminación consta de 6 reflectores led de 400w, suficientes para alumbrar todo el espacio deportivo.

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física

Este Proyecto se encuentra **en Proceso de selección** presentando una ejecución de gastos de **S/. 0.00** que significa el **0.00%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **00%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	491,233.00	0.00	0.00	Porcentaje	100.00	0.00

LOGROS

En proceso de selección :

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Buen equipo técnico del Comité de Selección, se viene realizando el proceso de selección para la posterior suscripción de contrato de ejecución y supervisión de obra

2.599286 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN (LA) I.E. 0202 EN LA LOCALIDAD CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 27/12/2024
Fecha de Culminación Programada	: 24/02/2024
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 04/03/2024
Fecha de Transferencia Programada	: 15/05/2024
Avance Físico Acumulado al 2023	: 31.91%
Avance Físico Solo 2023	: 31.91%

El proyecto consta en la reparación de Losa Deportiva y Construcción de Cobertura de un área total de 857.96 m²; está conformada por zapatas de 2.40 x 1.90 m, concreto de resistencia Fc' 210 y fierro de acero corrugado de 5/8", dados de concreto de 0.50 x 0.60 m, concreto de resistencia F'c 210, donde van soportadas las columnas metálicas de dimensiones 30X40 cm, armadas con tubos metálicos de 1"x1"x2mm y 3"x3"x4.0MM de espesor, y para arriostrar las columnas se utilizan vigas metálicas tipo cerche de dimensiones 50x 40m, armadas con tubos metálicos de 2" x 2" x 2 MM.

Sobre las columnas nacen las vigas en arco tipo cercha de 30x50 cm, la cual está compuesta por 04 ángulos de 2"x2"x1/4" (brida superior e inferior), diagonales de fierro liso de 5/8", arriestre en diagonal en brida superior e inferior con fierro liso de 1/2". Sobre la estructura de los arcos metálicos se colocan las correas metálicas con tubos rectangulares de 2"x4"x3mm, así mismo estas correa se arriostran mediante fierros lisos de 3/8". Para la cobertura se empleará Aluzinc TR4 de 35 mm de espesor.

Para disipar los movimientos horizontales entre los arcos metálicos se emplean templadores con fierro liso de 5/8" y tensores con fierro liso de 3/4" según detalle de los planos.

Así mismo el proyecto contempla la reparación de la losa deportiva en caso la requiera, y un sistema de drenaje pluvial por gravedad con canaletas de plancha de fierro galvanizado E=1/27" S/Detalle y 06 montantes para la descarga fluvial con tubos PVC-SAP de 4".

El sistema de iluminación consta de 6 reflectores led de 400w, suficientes para alumbrar todo el espacio deportivo.

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física

Este Proyecto se encuentra **en Ejecución** presentando una ejecución de gastos de **S/. 00.00** que significa el **0.00%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **31.91%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	548,602.00	0.00	0.00	Porcentaje	100	31.91

LOGROS

Ejecución de actividades de movimiento de tierras, concreto simple y concreto armado e inicio de la habilitación de estructuras metálicas.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Buen equipo técnico del Comité de Selección, se viene realizando el proceso de selección para la posterior suscripción de contrato de ejecución y supervisión de obra.

2.599293 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0075 EKE PEDRO GIRANO PIRO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE SISA, DISTRITO DE SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 22/01/2024
Fecha de Culminación Programada	: 21/03/2024
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 27/03/2024
Fecha de Transferencia Programada	: 14/05/2024
Avance Físico Acumulado al 2023	: 0.0%
Avance Físico Solo 2023	: 0.0%

El proyecto consta en la reparación de losa deportiva y construcción de la cobertura metálica a construir tiene las dimensiones de un área total de 828.55 m²; está conformada por zapatas de 1.80 x 1.40 m, concreto de resistencia Fc' 210 y fierro de acero corrugado de 5/8", dados de concreto de 0.50 x 0.60 m, concreto de resistencia F'c 210, donde van soportadas las columnas metálicas de dimensiones 30x40 cm, armadas con tubos metálicos de 1"x1"x2mm y 3"x3"x2MM de espesor, y para arriostrar las columnas se utilizan vigas metálicas tipo cerche de dimensiones 50x 40m, armadas con tubos metálicos de 2" x 2" x 2 MM.

Sobre las columnas nacen las vigas en arco tipo cercha de 30x50 cm, la cual está compuesta por 04 ángulos de 2"x2"x3/16" (brida superior e inferior), diagonales de fierro liso de 5/8", arriostre en diagonal en brida superior e inferior con fierro liso de 1/2". Sobre la estructura de los arcos metálicos se colocan las correas metálicas con tubos cuadrado de 2"x4"x3mm, así mismo estas corras se arriostran mediante fierros lisos de 3/8". Para la cobertura se empleará Aluzinc TR4 de 35 mm de espesor.

Para disipar los movimientos horizontales entre los arcos metálicos se emplean templadores con fierro liso de 5/8" y tensores con fierro liso de 3/4" según detalle de los planos.

Así mismo el proyecto contempla la reparación de la losa deportiva en caso la requiera, y un sistema de drenaje pluvial por gravedad con canaletas de plancha de fierro galvanizado E=1/27" S/Detalle y 06 montantes para la descarga fluvial con tubos PVC-SAP de 4".

El sistema de iluminación consta de 6 reflectores led de 400w, suficientes para alumbrar todo el espacio deportivo.

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física

Este Proyecto se encuentra **en Proceso de selección** presentando una ejecución de gastos de **S/. 0.00** que significa el **0.00%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **0.00%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	519,485.00	0.00	0.00	Porcentaje	100.00	0.00

LOGROS

En proceso de selección

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Buen equipo técnico del Comité de Selección, se viene realizando el proceso de selección para la posterior suscripción de contrato de ejecución y supervisión de obra

2.607931 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0757 ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD SHATOJA, DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 22/01/2024
Fecha de Culminación Programada	: 21/03/2024
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 27/03/2024
Fecha de Transferencia Programada	: 14/05/2024
Avance Físico Acumulado al 2023	: 0.0%
Avance Físico Solo 2023	: 0.0%



El proyecto consta en la reparación de Losa Deportiva y Construcción de Cobertura de un área total de 970.50 m²; está conformada por zapatas de 2.40 x 1.90 m, concreto de resistencia Fc' 210 y fierro de acero corrugado de 5/8", dados de concreto de 0.55 x 0.70 m, concreto de resistencia F'c 210, donde van soportadas las columnas metálicas de dimensiones 35X40 cm, armadas con tubos metálicos de 1"x1"x2mm y 3"x3"x4MM de espesor, y para arriostrar las columnas se utilizan vigas metálicas tipo cerche de dimensiones 50x 40m, armadas con tubos metálicos de 2" x 2" x 2 MM.

Sobre las columnas nacen las vigas en arco tipo cercha de 35x60 cm, la cual está compuesta por 04 ángulos de 2.5"x2.5"x3/16" (brida superior e inferior), diagonales de fierro liso de 5/8", arriostre en diagonal en brida superior e inferior con fierro liso de 1/2". Sobre la estructura de los arcos metálicos se colocan las correas metálicas con tubos rectangulares de 2"x4"x3mm, así mismo estas correas se arriostran mediante fierros lisos de 3/8". Para la cobertura se empleará Aluzinc TR4 de 35 mm de espesor. Para disipar los movimientos horizontales entre los arcos metálicos se emplean templadores con fierro liso de 5/8" y tensores con fierro liso de 3/4" según detalle de los planos.

Así mismo el proyecto contempla la reparación de la losa deportiva en caso la requiera, y un sistema de drenaje pluvial por gravedad con canaletas de plancha de fierro galvanizado E=1/27" S/Detalle y 06 montantes para la descarga fluvial con tubos PVC-SAP de 4".

El sistema de iluminación consta de 6 reflectores led de 400w, 3600lm suficientes para alumbrar todo el espacio deportivo

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física

Este Proyecto se encuentra **en Proceso de selección** presentando una ejecución de gastos de **S/. 0.00** que significa el **0.00%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **00%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	538,341.00	0.00	0.00	Porcentaje	100.00	0.00

LOGROS

En proceso de selección

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Buen equipo técnico del Comité de Selección, se viene realizando el proceso de selección para la posterior suscripción de contrato de ejecución y supervisión de obra.

2.607953 RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 22/01/2024
Fecha de Culminación Programada	: 21/03/2024
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 27/03/2024
Fecha de Transferencia Programada	: 14/05/2024
Avance Físico Acumulado al 2023	: 0.0%
Avance Físico Solo 2023	: 0.0%

El proyecto consta en la reparación de Losa Deportiva y La cobertura metálica a construir tiene las dimensiones de un área total de 894.11m²; está conformada por zapatas de 2.4 x 1.9 m , concreto de resistencia Fc' 210 y fierro de acero corrugado de 5/8" @0.20, dados de concreto de 0.50 x 0.60 m, concreto de resistencia F'c 210, donde van soportadas las columnas metálicas de dimensiones 30X40 cm, armadas con tubos metálicos de 1"x1"x2mm y 3"x3"x4MM de espesor, y para arriostrar las columnas se utilizan vigas metálicas tipo cerche de dimensiones 50x 40m, armadas con tubos metálicos de 2" x 2" x 2 MM.

Sobre las columnas nacen las vigas en arco tipo cercha de 30x50 cm, la cual está compuesta por 04 ángulos de 2"x2"x1/4" (brida superior e inferior), diagonales de fierro liso de 5/8", arriestre en diagonal en brida superior e inferior con fierro liso de 1/2". Sobre la estructura de los arcos metálicos se colocan las correas metálicas con tubos rectangulares de 2"x4"x3mm, así mismo estas corras se arriostran mediante fierros lisos de 3/8". Para la cobertura se empleará Aluzinc TR4 de 35 mm de espesor.

Para disipar los movimientos horizontales entre los arcos metálicos se emplean templadores con fierro liso de 5/8" y tensores con fierro liso de 3/4" según detalle de los planos.

Así mismo el proyecto contempla la renovación de la losa deportiva en caso la requiera, y un sistema de drenaje pluvial por gravedad con canaletas de plancha de fierro galvanizado E=1/27" S/Detalle y 06 montantes para la descarga fluvial con tubos PVC-SAP de 4".

El sistema de iluminación consta de 6 reflectores led de 400w, suficientes para alumbrar todo el espacio deportivo.

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física

Este Proyecto se encuentra **en Proceso de selección** presentando una ejecución de gastos de **S/. 0.00** que significa el **0.00%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **00%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	711,009.00	0.00	0.00	Porcentaje	100.00	0.00

LOGROS

En proceso de selección

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Buen equipo técnico del Comité de Selección, se viene realizando el proceso de selección para la posterior suscripción de contrato de ejecución y supervisión de obra.

2.608214 CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. CARLOS WIESSE, DE LA LOCALIDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 03/01/2024
Fecha de Culminación Programada	: 02/03/2024
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 15/03/2024
Fecha de Transferencia Programada	: 14/05/2024
Avance Físico Acumulado al 2023	: 0.0%
Avance Físico Solo 2023	: 0.0%

El proyecto consta en la reparación de Losa Deportiva y Construcción de Cobertura de un área total de 857.96 m²; está conformada por zapatas de 2.40 x 1.90 m, concreto de resistencia Fc' 210 y fierro de acero corrugado de 5/8", dados de concreto de 0.50 x 0.60 m, concreto de resistencia F'c 210, donde van soportadas las columnas metálicas de dimensiones 30X40 cm, armadas con tubos metálicos de 1"x1"x2mm y 3"x3"x4.0MM de espesor, y para arriostrar las columnas se utilizan vigas metálicas tipo cerche de dimensiones 50x 40m, armadas con tubos metálicos de 2" x 2" x 2 MM.

Sobre las columnas nacen las vigas en arco tipo cercha de 30x50 cm, la cual está compuesta por 04 ángulos de 2"x2"x1/4" (brida superior e inferior), diagonales de fierro liso de 5/8", arriestre en diagonal en brida superior e inferior con fierro liso de 1/2". Sobre la estructura de los arcos metálicos se colocan las correas metálicas con tubos rectangulares de 2"x4"x3mm, así mismo estas correa se arriostran mediante fierros lisos de 3/8". Para la cobertura se empleará Aluzinc TR4 de 35 mm de espesor.

Para disipar los movimientos horizontales entre los arcos metálicos se emplean templadores con fierro liso de 5/8" y tensores con fierro liso de 3/4" según detalle de los planos.

Así mismo el proyecto contempla la reparación de la losa deportiva en caso la requiera, y un sistema de drenaje pluvial por gravedad con canaletas de plancha de fierro galvanizado E=1/27" S/Detalle y 06 montantes para la descarga fluvial con tubos PVC-SAP de 4".

El sistema de iluminación consta de 6 reflectores led de 400w, suficientes para alumbrar todo el espacio deportivo.

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física

Este Proyecto se encuentra **en Proceso de selección** presentando una ejecución de gastos de **S/. 42,683.52** que significa el **8.04%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **00%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	531,041.00	42,683.52	8.04	Porcentaje	100.00	0.00

LOGROS

En proceso de selección

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Buen equipo técnico del Comité de Selección, se viene realizando el proceso de selección para la posterior suscripción de contrato de ejecución y supervisión de obra

2.608239 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0010 JULIO PIZARRO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE TINGO DE SAPOSOA, DISTRITO DE TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 09/01/2024
Fecha de Culminación Programada	: 08/03/2024
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 15/03/2024
Fecha de Transferencia Programada	: 14/05/2024
Avance Físico Acumulado al 2023	: 0.0%
Avance Físico Solo 2023	: 0.0%

El proyecto consta en la reparación de Losa Deportiva y Construcción de Cobertura de un área total de 857.96 m²; está conformada por zapatas de 2.40 x 1.90 m , concreto de resistencia Fc' 210 y fierro de acero corrugado de 5/8", dados de concreto de 0.50 x 0.60 m, concreto de resistencia F'c 210, donde van soportadas las columnas metálicas de dimensiones 30X40 cm, armadas con tubos metálicos de

1"x1"x2mm y 3"x3"x4.0MM de espesor, y para arriostrar las columnas se utilizan vigas metálicas tipo cerche de dimensiones 50x 40m, armadas con tubos metálicos de 2" x 2" x 2 MM.

Sobre las columnas nacen las vigas en arco tipo cercha de 30x50 cm, la cual está compuesta por 04 ángulos de 2"x2"x1/4" (brida superior e inferior), diagonales de fierro liso de 5/8", arriestre en diagonal en brida superior e inferior con fierro liso de 1/2". Sobre la estructura de los arcos metálicos se colocan las correas metálicas con tubos rectangulares de 2"x4"x3mm, así mismo estas correas se arriostran mediante fierros lisos de 3/8". Para la cobertura se empleará Aluzinc TR4 de 35 mm de espesor.

Para disipar los movimientos horizontales entre los arcos metálicos se emplean templadores con fierro liso de 5/8" y tensores con fierro liso de 3/4" según detalle de los planos.

Así mismo el proyecto contempla la reparación de la losa deportiva en caso la requiera, y un sistema de drenaje pluvial por gravedad con canaletas de plancha de fierro galvanizado E=1/27" S/Detalle y 06 montantes para la descarga fluvial con tubos PVC-SAP de 4".

El sistema de iluminación consta de 6 reflectores led de 400w, suficientes para alumbrar todo el espacio deportivo.

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física

Este Proyecto se encuentra en **Proceso de selección** presentando una ejecución de gastos de **S/. 0.00** que significa el **0.00%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **00%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	645,600.00	0.00	0.00	Porcentaje	100.00	0.00

LOGROS

En proceso de selección

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Buen equipo técnico del Comité de Selección, se viene realizando el proceso de selección para la posterior suscripción de contrato de ejecución y supervisión de obra

2.608249 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0707 EMILIO SAN MARTIN, DE LA LOCALIDAD DE TABALOSOS, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra Programada	: 22/01/2024
Fecha de Culminación Programada	: 21/03/2024
Fecha de Recepción De Obra Programada	: 27/03/2024
Fecha de Transferencia Programada	: 14/05/2024
Avance Físico Acumulado al 2023	: 0.0%

Avance Físico Solo 2023

: 0.0%

El proyecto consta en la reparación de Losa Deportiva y Construcción de Cobertura de un área total de 857.96 m²; está conformada por zapatas de 2.40 x 1.90 m, concreto de resistencia Fc' 210 y fierro de acero corrugado de 5/8", dados de concreto de 0.50 x 0.60 m, concreto de resistencia Fc' 210, donde van soportadas las columnas metálicas de dimensiones 30X40 cm, armadas con tubos metálicos de 1"x1"x2mm y 3"x3"x4.0MM de espesor, y para arriostrar las columnas se utilizan vigas metálicas tipo cerche de dimensiones 50x 40m, armadas con tubos metálicos de 2" x 2" x 2 MM.

Sobre las columnas nacen las vigas en arco tipo cercha de 30x50 cm, la cual está compuesta por 04 ángulos de 2"x2"x1/4" (brida superior e inferior), diagonales de fierro liso de 5/8", arrioste en diagonal en brida superior e inferior con fierro liso de 1/2". Sobre la estructura de los arcos metálicos se colocan las correas metálicas con tubos rectangulares de 2"x4"x3mm, así mismo estas correas se arriostran mediante fierros lisos de 3/8". Para la cobertura se empleará Aluzinc TR4 de 35 mm de espesor.

Para disipar los movimientos horizontales entre los arcos metálicos se emplean templadores con fierro liso de 5/8" y tensores con fierro liso de 3/4" según detalle de los planos.

Así mismo el proyecto contempla la reparación de la losa deportiva en caso la requiera, y un sistema de drenaje pluvial por gravedad con canaletas de plancha de fierro galvanizado E=1/27" S/Detalle y 06 montantes para la descarga fluvial con tubos PVC-SAP de 4".

El sistema de iluminación consta de 6 reflectores led de 400w, suficientes para alumbrar todo el espacio deportivo.

El proyecto busca tener adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de los estudiantes, recreativas y de educación física.

Este Proyecto se encuentra **en Proceso de selección** presentando una ejecución de gastos de **S/. 0.00** que significa el **0.00%** del PIM asignado el 2023. Con un avance físico de **00%** de lo programado en el 2023. Habiéndose logrado lo siguiente:

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	589,354 00	0.00	0.00	Porcentaje	100.00	0.00

LOGROS

En proceso de selección

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Buen equipo técnico del Comité de Selección, se viene realizando el proceso de selección para la posterior suscripción de contrato de ejecución y supervisión de obra



PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"



RESULTADOS DE LA GESTIÓN

POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARRs

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

ANEXO N° 1 A: PROYECTOS DE INVERSIÓN

COMPONENTE 10: TRANSPORTE

Nombre del Proyecto	Meta del Proyecto	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Físico acumulado	Avance Financiero acumulado
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de Transitabilidad y accesibilidad para el traslado de carga y pasajeros	Distrito de Chazuta	6229	48,737,519.70	0	81.1
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	Adecuada accesibilidad y conectividad de tránsito peatonal y vehicular entre las localidades del valle del Bombonajillo, Distrito de Bajo Viabo, Provincia de Bellavista- San Martin	Distrito de Bajo Biavo	10299	32,185,890.58	87.94	96.6
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE -M-922, SM -923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N (NUEVO HORIZONTE)-CAÑUTO, DEL DISTRITO DE POLVORA, PROVINCIA DE TOCACHE, DPTO. SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal SMM-922, SM -923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N (NUEVO HORIZONTE)-CAÑUTO, DEL DISTRITO DE POLVORA, PROVINCIA DE TOCACHE, DPTO. SAN MARTIN	Distrito de Polvora	1450	4,847,577.66	55.02	69.9
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DPTO. SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DPTO. SAN MARTIN	Distrito de Tocache	1500	3,684,758.51	100	99.5



Nombre del Proyecto	Meta del Proyecto	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Físico acumulado	Avance Financiero acumulado
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Distrito de Pólvora	1334	5,375,921.04	87.4	87.4
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Distrito de Tocache	1500	5,254,503.98	100	96.8
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Distrito de Pólvora	2261	10,432,581.96	100	99.7
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE -DPTO SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE -DPTO SAN MARTIN	Distrito de Tocache	3479	8,366,612.22	31.15	50.8
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Distrito de Tocache	750	5,610,898.85	4.97	7.9
CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Distrito de Bajo Biavo	424	6,862,849.58	70% (Exp. Téc)	3.8

COMPONENTE 17: AMBIENTE

Nombre del Proyecto	Meta del Proyecto	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Físico acumulado	Avance Financiero acumulado
MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Los concesionarios tienen un adecuado acceso al servicio de apoyo al uso sostenible de los ecosistemas en 24 concesiones de conservación de la Región San Martín	8 provincias	2031	17,966,143.79	37.4	37.3

COMPONENTE 20: SALUD

Nombre del Proyecto	Meta del Proyecto	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Físico acumulado	Avance Financiero acumulado
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN	Poblacion accede a adecuados Servicios de Salud en el Hospital ToCACHE	Tocache	150,858	131,631,280.16	100	92.2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.	Poblacion accede a adecuados Servicios de Salud en el Centro de Salud San Jose de Sisa	San Jose de Sisa	38,354	57,137,589.39	100	95.9
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	Aumento de la cobertura de los servicios de salud del centro de salud Pongo de Caynarachi, ubicado en el Distrito de Caynarachi, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín.	Distrito de Caynarachi	8003	52,003,452.95	0	1.2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	Aumento de la cobertura de los servicios de salud del centro de salud, ubicado en el Distrito de Chazuta, Provincia de San Martín, Departamento de San Martín	Distrito de Chazuta	8218	54,888,189.07	0	1.2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Aumento de la cobertura de los servicios de salud del centro de salud Tabalosos, ubicado en el Distrito de Tabalosos, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín	Distrito de Tabalosos	20977	54,204,953.42	0	1.1
ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda y Aumentar en número de usuarios atendidos	Distrito de la Banda de Shilcayo	0	10,331,551.21	100	96.8

CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda y Aumentar en número de usuarios atendidos	Distrito de Lamas	0	6,880,642.06	100	98.1
---	--	-------------------	---	--------------	-----	------

COMPONENTE 22: EDUCACIÓN

Nombre del Proyecto	Meta del IOARR	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Fisico acumulado	Avance Financiero acumulado
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Población estudiantil accede a servicios que cumplen estándares sectoriales en la Institución Educativa N° 106 Alfonso Ugarte Vernal	Distrito de Tarapoto	1430	14,375,225.17	20% (Exp. Téc)	20
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0444 JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD COSTA RICA, DISTRITO DE PAJARILLO, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	Distrito de Pajarillo	208	517,299.89	0	0
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0326 EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	Distrito de Santa Rosa	184	606,164.32	0	0
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0309 TUPAC AMARU II, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	Distrito de San Martín	356	532,224.40	0	0
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. ANGEL CUSTODIO GARCIA RAMIREZ EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	Distrito de Tarapoto	522	491,233.74	0	0
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0202 EN LA LOCALIDAD CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	Distrito de San Pablo	389	548,602.01	31.910	0
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0075 EKE PEDRO GIRANO PIRO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE SISA, DISTRITO DE SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	Distrito de San Hilarion	396	519,485.71	0	0

REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0757 ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD SHATOJA, DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	Distrito de Shatoja	196	538,341.92	0	0
RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	Distrito de Shapaja	167	711,009.41	0	0
CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. CARLOS WIESSE, DE LA LOCALIDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	Distrito de Juanjui	1395	531,041.88	0	8.2
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0010 JULIO PIZARRO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE TINGO DE SAPOSOA, DISTRITO DE TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	Distrito de Tingo de Saposoa	84	645,600.65	0	0



ANEXO N° 1-B PROGRAMAS/ PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO	META			RESULTADOS/LOGROS
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA 2023	EJECUTADA 2023	
GESTION DE PROYECTOS	Informe	12.00	12.00	Pago de personal, adquisición de bienes y contratación de servicios
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Informe	1.00	0.00	Para los estudios de Agua sisa, hospital Banda Shilcayo se pagó el 2do entregable
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN	Informe	1.00	1.00	Culminado, se cuenta con liquidación de contrato de ejecución, se ha recopilado información para liquidación financiera final de inversión.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.	Informe	12.00	10.00	Culminado, Se viene ejecutando la conciliación y recopilando información para liquidación financiera final de inversión.
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	Kilómetros	4.37	0.00	Cuenta con la probación la Liquidación Técnica Financiera por la Entidad PEHCBM, pendiente ejecución saldo de obra
MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL	Informe	12.00	11.00	En ejecución, se realizó capacitaciones en temas de innovación
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	Kilómetros	7.99	7.99	En ejecución, se dio Transitabilidad de beneficiarios, la obra está al 80.26% de ejecución física
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	Obra	0.10	0.00	Se actualizó el Exp. Téc. Y se lanzó a procedimiento de selección
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	Obra	0.10	0.00	Se actualizó el Exp. Téc. Y se lanzó a procedimiento de selección
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS-DEPARATAMENTO DE SAN MARTIN	Obra	0.10	0.00	Se actualizó el Exp. Téc. Y se lanzó a procedimiento de selección
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRIT	Exp. Téc.	0.20	0.20	En Elaboración de Exp. Téc. se pagó el primer entregable

MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Porcentaje	11.13	8.31	En ejecución, se encuentra al 37.40% de ejecución física acumulada
ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA)	Informe	1.00	0.00	IOARR culminado
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE -	Kilómetros	3.05	0.70	Apertura de todo el tramo, así como el mejoramiento para la transitabilidad de los peatones, Contrato resuelto. Se viene elaborando TDR para peritaje técnico - financiero
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - D	Informe	1.00	1.00	Proyecto culminado
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Kilómetros	0.54	0.54	Proyecto culminado, hay Transitabilidad peatonal
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE	Informe	1.00	1.00	Proyecto culminado
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Kilómetros	1.91	1.91	Culminado, En revisión de liquidación de contrato de ejecución consentida 07.11.23
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE -	Kilómetros	4.17	1.30	En proceso de peritaje técnico - financiero y elaboración de expediente de saldo de obra. Contrato resuelto
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Kilómetros	2.62	0.13	En proceso de peritaje técnico - financiero y elaboración de expediente de saldo de obra. Contrato resuelto
CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS	Informe	1.00	1.00	Culminado
CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Exp. Téc.	0.350	0.350	En Elaboración de Exp. Téc, se encuentra presentado el 3er entregable
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0444 JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD COSTA RICA, DISTRITO DE PAJARILLO, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Porcentaje	100.00	0.00	Se logró lanzar a procedimiento de selección

REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0326 EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Porcentaje	100.00	0.00	Se logro lanzar a procedimiento de selección
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0309 TUPAC AMARU II , EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Porcentaje	100.00	0.00	Se logro lanzar a procedimiento de selección
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. ANGEL CUSTODIO GARCIA RAMIREZ EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Porcentaje	100.00	0.00	Se logro lanzar a procedimiento de selección
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0202 EN LA LOCALIDAD CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Porcentaje	100.00	31.91	Se encuentra en ejecución
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0075 EKE PEDRO GIRANO PIRO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE SISA, DISTRITO DE SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Porcentaje	100.00	0.00	Se logro lanzar a procedimiento de selección
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0757 ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD SHATOJA, DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Porcentaje	100.00	0.00	Se logro lanzar a procedimiento de selección
RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Porcentaje	100.00	0.00	Se logro lanzar a procedimiento de selección
CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. CARLOS WIESSE, DE LA LOCALIDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Porcentaje	100.00	0.00	Se logro lanzar a procedimiento de selección
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0010 JULIO PIZARRO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE TINGO DE SAPOSOA, DISTRITO DE TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Porcentaje	100.00	0.00	Se logro lanzar a procedimiento de selección
REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0707 EMILIO SAN MARTIN, DE LA LOCALIDAD DE TABALOSOS, DISTRITO DE	Porcentaje	100.00	0.00	Se logro lanzar a procedimiento de selección

TABALOSOS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN				
REUBICACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA) RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (POSTES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN) , EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, PUERTO LIMON, NUEVO CHANCHAMAYO Y LA DIVISORIA, DISTRITO DE BAJO BIAVO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Porcentaje	100.00	0.00	Se logró lanzar a procedimiento de selección



ANEXO N° 1 D: PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS

FUNCIÓN 03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

SECTOR	AVANCES
GESTIÓN	
GESTION DE PROYECTOS	Pagos de personal, adquisición de bienes y contratación de servicios para la operatividad de la Entidad
PRE INVERSIÓN	Agua sisa, hospital Banda Shilcayo, se logró pagar el 2° entregable
2301043: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL	En ejecución, se realizó capacitaciones en temas de innovación

FUNCIÓN 15: TRANSPORTE

SECTOR	AVANCES
TRANSPORTE	
2280937: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	* Cuenta con la probación la Liquidación Técnica Financiera por el PEHCBM, pendiente ejecución saldo de obra * Se ejecutó al 6.3% (S/ 351,963.00) del PIM
2342702: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	* En ejecución, hay Transitabilidad para los beneficiarios. * La obra está al 80.26% de ejecución física * Se ejecutó al 99.2% (S/ 9,514,890.00) del PIM
2491462: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	* Apertura de todo el tramo, así como el mejoramiento para la transitabilidad de los peatones * Contrato resuelto, Se viene elaborando TDR para peritaje técnico – financiero * Se ejecutó al 61.1% (S/ 1,786,064.00) del PIM
2491482: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	* Proyecto culminado * Se ejecutó al 100% (S/ 23,321.00) del PIM
2491620: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	* Proyecto culminado, hay Transitabilidad peatonal * Se ejecutó al 99.8% (S/ 893,782) del PIM




2491678: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	*Proyecto culminado * Se ejecutó al 87.9% (S/ 48,325.00) del PIM
2491751: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	*Culminado, *En revisión de liquidación de contrato de ejecución consentida 07.11.23 * Se ejecutó al 99.0% (S/ 2,949,652.00) del PIM
2492668: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	*En proceso de peritaje técnico – financiero y elaboración de expediente de saldo de obra. Contrato resuelto * Se ejecutó al 73.4% (S/ 4,170,906.00) del PIM
2493059: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	*Contrato resuelto *En proceso de peritaje técnico – financiero y elaboración de expediente de saldo de obra. * Se ejecutó al 75.0% (S/ 434,534.00) del PIM
2530935: CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	*En Elaboración de Exp. Téc, se presentó el 3er entregable * Se ejecutó al 100% (S/ 128,700.00) del PIM

FUNCION 17: AMBIENTE



SECTOR	AVANCES
AMBIENTE	
2475086: MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	* En ejecución, se encuentra al 37.40% de ejecución física acumulada * Se ejecutó al 74.1% (S/ 1,481,104.00) del PIM 2023




FUNCION 20: SALUD

SECTOR	AVANCES
SALUD	
2234509: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN	*Culminado, se cuenta con liquidación de contrato de ejecución. *Se ha recopilado información para liquidación financiera final de inversión. * Se ejecutó al 100% (S/ 257,407.00) del PIM 2023
2234510: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.	*Culminado *Se viene ejecutando la conciliación y recopilando información para liquidación financiera final de inversión. * Se ejecutó al 67.4% (S/ 412,530.00) del PIM 2023
2377760: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	* Se actualizó el Expediente Técnico * Se lanzó a procedimiento de selección
2377762: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	* Se actualizó el Expediente Técnico * Se lanzó a procedimiento de selección
2377764: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	* Se actualizó el Expediente Técnico * Se lanzó a procedimiento de selección
2486486: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR culminado
2496582: CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR culminado



FUNCION 22: EDUCACIÓN

SECTOR	AVANCES
EDUCACIÓN	
2464324: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	*En elaboración del Exp. Téc, se pagó el primer entregable * Se ejecutó al 66.2% (S/ 140,000.00) del PIM 2023
2599122: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0444 JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD COSTA RICA, DISTRITO DE PAJARILLO, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	*Se logró lanzar a procedimiento de selección
2599172: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0326 EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	*Se logró lanzar a procedimiento de selección
2599208: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0309 TUPAC AMARU II, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	*Se logró lanzar a procedimiento de selección
2599215: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. ANGEL CUSTODIO GARCIA RAMIREZ EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	*Se logró lanzar a procedimiento de selección
2599286: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0202 EN LA LOCALIDAD CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	*Se encuentra en ejecución
2599293: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0075 EKE PEDRO GIRANO PIRO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE SISA, DISTRITO DE SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	*Se logró lanzar a procedimiento de selección



2607931: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0757 ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD SHATOJA, DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	*Se logró lanzar a procedimiento de selección
2607953: RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	*Se logró lanzar a procedimiento de selección
2608214: CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. CARLOS WIESSE, DE LA LOCALIDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	*Se logró lanzar a procedimiento de selección * Se ejecutó al 8.0% (S/ 42,684.00) del PIM 2023
2608239: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0010 JULIO PIZARRO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE TINGO DE SAPOSOA, DISTRITO DE TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	*Se logró lanzar a procedimiento de selección
2608249: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0707 EMILIO SAN MARTIN, DE LA LOCALIDAD DE TABALOSOS, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	*Se logró lanzar a procedimiento de selección



ANEXO N° 1E: RETOS Y LIMITACIONES

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

LIMITACIONES (*)

Instrumentos de gestión desactualizados, no contemplan la realidad.

Retraso en el tiempo de Ejecucion de las Obras por factores climatologicos.

Retraso en el tiempo de Ejecucion de las Obras por materiales limitados dentro de la Region.

No se contaba con personal tecnico capacitado en topografia para realizar las evaluaciones y mediciones necesarias.

RETOS

Disminuir el periodo de Ejecución de Obras.

Minimizar el tiempo de elaboracion de las Liquidaciones de los Apoyos Sociales.

Minimizar el tiempo de entrega de materiales de construccion donados a las entidades.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

En coordinaci3n con los especialistas del Pliego se esta actualizando el MOP y directivas

Se tomaron las medidas necesarias para la prevencion de la zona de trabajo y este debidamente adecuada para evitar la dilatacion del tiempo de ejecucion.

Se contacto con proveedores externos a la Region para agilizar el abastecimiento de los materiales requeridos.

Se coordino con la Direccion de Obras para el apoyo oportuno con personal de otras Areas.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Utilizar metodos prefabricados que agilizen la construccion de las obras.

Incorporaci3n de Personal Profesional con experiencia calificada, para elaborar los informes finales oportunamente.

Se elabora una mejor planificaci3n para realizar las cotizaciones de los materiales una vez solicitado el apoyo para de ser aprobado proceder a su traslado de manera mas pronta.



ANEXO N° 4A: INFORMACIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

- POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	21,411,630	21,309,836.82	99.52
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	809,934	761,309.62	94.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,868,168		0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,116,919	1,018,056.23	91.15
5 RECURSOS DETERMINADOS	25,084,030	15,011,243.37	59.84
TOTAL	60,290,681	38,100,446.04	63.19

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2023

- POR GENERICA DE GASTO**

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,400	19,200.00	94.12
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	389,560	389,558.00	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,880,721	37,691,688.04	62.94
TOTAL	60,290,681	38,100,446.04	63.19

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2023



CAPITULO IV: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ESTADOS FINANCIEROS

5.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PEHCBM – 2023

ANEXO N° 6: PRESUPUESTO EJECUTADO EN INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

POR RECURSOS ORDINARIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS	
PROYECTOS	PRESUPESTO EJECUTADO INVERSIÓN
GESTION DE PROYECTOS	13,663,519.05
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN	257,406.52
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.	130,998.05
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	351,963.18
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	6,755,739.02
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE -	76,631.50
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	54,379.50
SIN PRODUCTO	19,200.00
TOTAL	21,309,836.82

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2023



POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO INVERSIÓN
GESTION DE PROYECTOS	575,010.47
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	72,206.59
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	79,344.16
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	34,748.40
TOTAL	761,309.62

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2023

POR RECURSOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO INVERSIÓN
MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL	1,018,056.23
TOTAL	1,018,056.23

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2023

POR RECURSOS DETERMINADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS	
PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO INVERSIÓN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.	281,532.22
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	2,759,150.89
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRIT	140,000.00
MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,481,103.69
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE -	1,786,063.81
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - D	23,321.11

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	893,781.69
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE	48,324.68
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	2,949,652.07
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE -	4,094,274.91
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	380,154.78
CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS	2,500.00
CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	128,700.00
CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. CARLOS WIESSE, DE LA LOCALIDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	42,683.52
TOTAL	15,011,243.37

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2023



5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL ANTERIOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO

ANEXO N° 7: INFORMACIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

AÑO: 2022

- POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	43,559,467	35,136,438.55	80.66
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,708,317	8,392,292.60	96.37
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	7,637,184	2,397,992.22	31.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	587,158	470,239.00	80.09
5 RECURSOS DETERMINADOS	34,756,689	26,632,699.98	76.63
TOTAL	95,248,815	73,029,662.35	76.67

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2022

- POR GENERICA DE GASTO**

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,550	20,350.00	90.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	95,226,265	73,009,312.35	76.67
TOTAL	95,248,815	73,029,662.35	76.67

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2022



5.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIÓN

ANEXO N° 8: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIÓN

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

AÑO: 2022

FUNCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	26,352,486	25,021,579.91	94.95
TRANSPORTE	65,140,127	44,706,475.64	68.63
AMBIENTE	2,400,000	2,383,717.44	99.32
SANEAMIENTO	185,938	1,328.00	0.71
SALUD	1,139,764	911,561.36	79.98
EDUCACION	30,500	5,000.00	16.39
TOTAL	95,248,815	73,029,662.35	76.67

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2022



ANEXO N° 10: PANEL FOTOGRÁFICO EN PROYECTOS 2023


Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.234509	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	150,858	
Horizonte del Proyecto:	Población accede a adecuados servicios de salud en el hospital Tocache	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	257,407.00	
Monto Ejecutado:	257,406.52	
Avance Financiero:	100.00%	
Avance Físico 2023:	100.00%	
Estado de la Obra:	Culminado, En arbitraje el contrato de ejecución	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.	
Código UNIFICADO:	2.234510	 
Unidad Ejecutora:	PEHCBM	
Población Beneficiada:	38,354	
Horizonte del Proyecto:	Población accede a adecuados servicios de salud en el centro de Salud San José de Sisa	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	612,422.00	
Monto Ejecutado:	412,530.27	
Avance Financiero:	67.36%	
Avance Físico 2023:	83.33%	
Estado de la Obra:	Culminado, En liquidación	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.280937	 16 nov 2023 11:00:12 a. m.
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	6,229	 5 jul 2023 14:15:16 D. 76 14:30 N Historias de las imágenes: 45
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de Transitabilidad y accesibilidad para el traslado de carga y pasajeros.	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	5,616,454.00	
Monto Ejecutado:	351,963.18	
Avance Financiero:	6.27%	
Avance Físico 2023:	0.00%	
Estado de la Obra:	Paralizada por Resolución de contrato, cuenta con liquidación técnica financiera	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL	
Código UNIFICADO:	2.301043	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	18,623	
Horizonte del Proyecto:	El Proyecto tiene como objetivo central contribuir al crecimiento de la productividad empresarial a través de un aumento de los niveles de innovación.	
Modalidad de ejecución:	Administración directa	
PIM:	1,116,919.00	
Monto Ejecutado:	1,018,056.23	
Avance Financiero:	91.15%	
Avance Físico 2023:	91.66%	
Estado de la Obra:	En ejecución	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN
Código UNIFICADO:	2.342702
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo
Población Beneficiada:	10,299
Horizonte del Proyecto:	Adecuada accesibilidad y conectividad de tránsito peatonal y vehicular
Modalidad de ejecución:	Por contrata
PIM:	9,595,194.00
Monto Ejecutado:	9,514,889.91
Avance Financiero:	99.16%
Avance Físico 2023:	100.00%
Estado de la Obra:	En ejecución

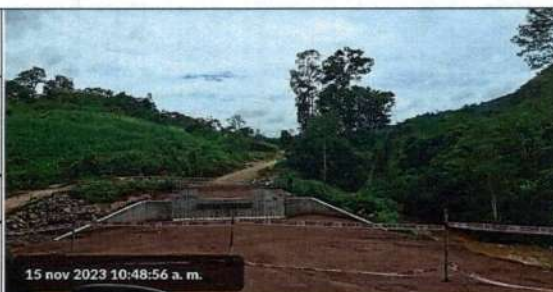

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN
Código UNIFICADO:	2.377760
Unidad Ejecutora:	PEHCBM
Población Beneficiada:	8,003
Horizonte del Proyecto:	Aumento de la cobertura de los servicios de salud
Modalidad de ejecución:	Por contrata
PIM:	2,182,583.00
Monto Ejecutado:	72,206.59
Avance Financiero:	3.31%
Avance Físico 2023:	0.00%
Estado de la Obra:	Se encuentra en procedimiento de selección para ejecución y supervisión

RESUMEN GENERAL	
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL
ESTRUCTURAS	5,604,009.18
ARQUITECTURA	3,169,853.39
INSTALACIONES SANITARIAS	870,321.87
INSTALACIONES ELECTRICAS	1,450,663.64
INSTALACIONES MECANICAS	1,643,287.98
COMUNICACIONES	4,617,986.01
EQUIPAMIENTO	13,852,135.34
COSTO DIRECTO	31,208,257.41
Gastos Generales 10.65%	3,324,886.65
Utilidad 8.00%	2,496,660.59
COSTO DE OBRA	37,029,804.65
IGV(18% CD)	6,665,364.84
Presupuesto Total Componentes I: Infraestructura Y equipamiento Biomedico	43,695,169.49
SUPERVISIÓN Inc. LIQUIDACION (4.77466196916221% PTC)	2,086,296.64
Presupuesto Total Componentes II: Capacitación	748,038.92
Presupuesto Total Componentes III: Sistema de utilización 22.9 KV	644,307.46
GESTIÓN DE PROYECTOS	3,035,494.00
EXPEDIENTE TÉCNICO	531,362.66
TOTAL	50,740,689.17
MEIDAS EXPANSIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE (2.00%PI)	1,014,813.78
JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS	247,930.00
TOTAL DE INVERSION	52,003,432.95



PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"




Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2.377762	RESUMEN GENERAL	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL
Población Beneficiada:	8,218	ESTRUCTURAS	7.599.589,04
Horizonte del Proyecto:	Aumento de la cobertura de los servicios de salud del centro de salud	ARQUITECTURA	3.167.450,57
Modalidad de ejecución:	Por contrata	INSTALACIONES SANITARIAS	869.811,77
PIM:	2,328,379.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.452.956,22
Monto Ejecutado:	79,344.16	INSTALACIONES MECANICAS	1.649.560,63
Avance Financiero:	3.41%	COMUNICACIONES	4.628.493,41
Avance Físico 2023:	0.00%	EQUIPAMIENTO	13.852.135,34
Estado de la Obra:	Se encuentra en procedimiento de selección para ejecución y supervisión	COSTO DIRECTO	33.219.996,98
		Gastos Generales	10,17%
		Utilidad	8,00%
		COSTO DE OBRA	39.256.577,33
		IGV (18% CD)	18,00%
		Presupuesto Total Componentes I: Infraestructura Y equipamiento Biomedico	46.322.761,25
		SUPERVISIÓN Inc. LIQUIDACION (4.50382616170145% PTC)	2.086.296,64
		Presupuesto Total Componentes II: Capacitación	748.058,92
		Presupuesto Total Componentes III: Sistema de utilización 22.9 K	626.789,35
		GESTIÓN DE PROYECTOS	3.242.593,00
		EXPEDIENTE TÉCNICO	542.362,67
		TOTAL	53.568.861,83
		MEDIDAS EXPANSIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE (2.00%PT)	1.071.377,24
		JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS	247.950,00
		TOTAL DE INVERSION	54.888.189,07

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2.377764	RESUMEN GENERAL	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL
Población Beneficiada:	20,977	ESTRUCTURAS	6.031.170,03
Horizonte del Proyecto:	Aumento de la cobertura de los servicios de salud del centro de salud	ARQUITECTURA	3.894.760,44
Modalidad de ejecución:	Por contrata	INSTALACIONES SANITARIAS	1.117.231,44
PIM:	2,308,744	INSTALACIONES ELECTRICAS	3.562.405,65
Monto Ejecutado:	34,748.40	COMUNICACIONES	4.629.458,20
Avance Financiero:	1.51%	EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	13.614.454,64
Avance Físico 2023:	0.00%	COSTO DIRECTO	32.849.480,40
Estado de la Obra:	Se encuentra en procedimiento de selección para ejecución y supervisión	Gastos Generales	10,26%
		Utilidad	8,00%
		COSTO DE OBRA	38.846.456,55
		IGV (18% CD)	18,00%
		Presupuesto Total Componentes I: Infraestructura y Equip. Biomedico	45.838.818,73
		SUPERVISIÓN Inc. LIQUIDACION	4,55%
		Presupuesto Total Componentes II: Capacitación	748.058,92
		Presupuesto Total Componentes III: Sistema de Utilización 22.9K	565.873,01
		GESTIÓN DE PROYECTOS	3.129.345,00
		EXPEDIENTE TÉCNICO	530.630,66
		TOTAL	52.899.022,96
		MEDIDAS EXPANSIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE (2.00%PT)	1.057.980,46
		JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS	247.950,00
		TOTAL DE INVERSION	54.204.953,42

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO
Código UNIFICADO:	2.464324
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo
Población Beneficiada:	1,430
Horizonte del Proyecto:	Población estudiantil accede a servicios que cumplen estándares sectoriales
Modalidad de ejecución:	Por contrato
PIM:	211,631.00
Monto Ejecutado:	140,000.00
Avance Financiero:	66.15%
Avance Físico 2023:	100%
Estado de la Obra:	En elaboración Exp. Téc.

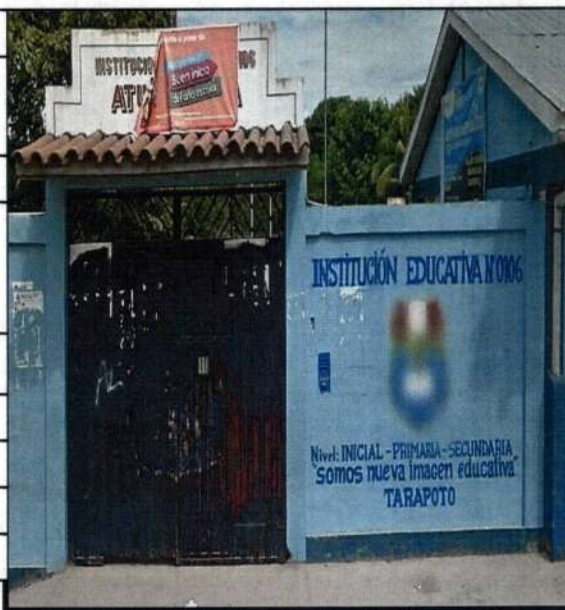


Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Código UNIFICADO:	2.475086
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo
Población Beneficiada:	2,031
Horizonte del Proyecto:	Los concesionarios tienen un adecuado acceso al servicio de apoyo al uso sostenible de los ecosistemas en 24 concesiones de conservación de la Region San Martin.
Modalidad de ejecución:	Administración Directa
PIM:	2,000,000
Monto Ejecutado:	1,481,103.69
Avance Financiero:	74.06%
Avance Físico 2023:	74.55%
Estado de la Obra:	Proyecto en ejecución

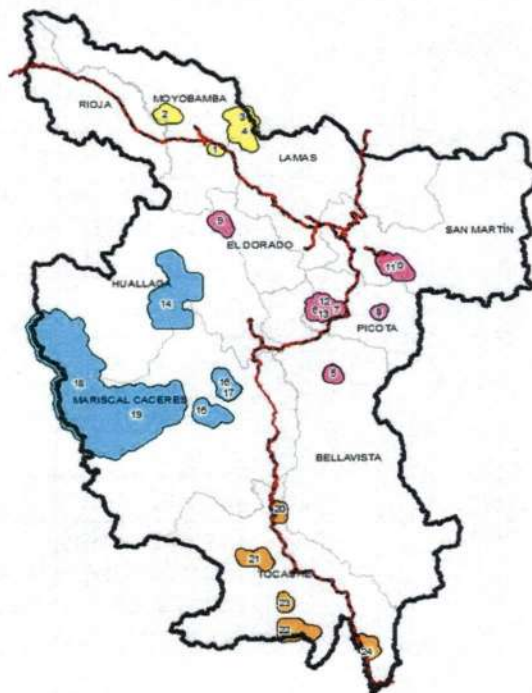

Nombre del Proyecto:	ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2.486486		
Unidad Ejecutora:	PEHCBM		
Población Beneficiada:			
Horizonte del Proyecto:	Aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda y aumentar en número de usuarios atendidos.		
Modalidad de ejecución:	Por contrata		
PIM:	30,565.00		
Monto Ejecutado:	0.00		
Avance Financiero:	0.00%		
Avance Físico 2023:	0.00%		
Estado de la Obra:	Culminado		


Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE -		
Código UNIFICADO:	2.491462		
Unidad Ejecutora:	PEHCBM		
Población Beneficiada:	1,450		
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal		
Modalidad de ejecución:	Por contrata		
PIM:	2,921,347.00		
Monto Ejecutado:	1,786,063.81		
Avance Financiero:	61.14%		
Avance Físico 2023:	23.05%		
Estado de la Obra:	Contrato resuelto, Elaboración de TRD para contratación de peritaje Técnico y Financiero		

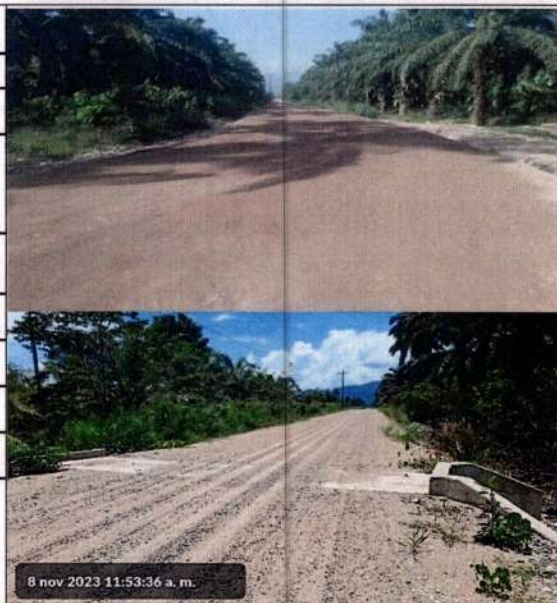

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DPTO. SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.491482	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	1,500	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	23,322.00	
Monto Ejecutado:	23,321.11	
Avance Financiero:	100.00%	
Avance Fisico 2023:	100.00%	
Estado de la Obra:	Culminado, Pendiente de recopilación de información para liquidación financiera	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.491620	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	1,334	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	895,275.00	
Monto Ejecutado:	893,781.69	
Avance Financiero:	99.83%	
Avance Físico 2023:	100.00%	
Estado de la Obra:	Culminado, en proceso de liquidación financiera final	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	
Código UNIFICADO:	2.491678	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	1,500	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	54,978.00	
Monto Ejecutado:	48,324.68	
Avance Financiero:	87.90%	
Avance Físico 2023:	100.00%	
Estado de la Obra:	Culminado, En proceso de liquidación financiera final de la inversión	

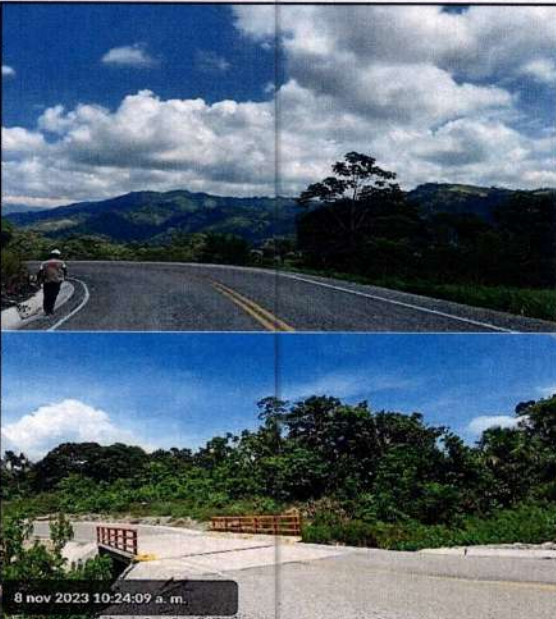Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.491751	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	2,261	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	2,979,765.00	
Monto Ejecutado:	2,949,652.07	
Avance Financiero:	98.99%	
Avance Físico 2023:	100.00%	
Estado de la Obra:	Culminado, En proceso de liquidación de obra	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N-SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE -	
Código UNIFICADO:	2.492668	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	3,479	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	5,679,986.00	
Monto Ejecutado:	4,170,906.41	
Avance Financiero:	73.43%	
Avance Físico 2023:	31.15%	
Estado de la Obra:	Obra paralizada por resolución de contrato	

Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS	
Código UNIFICADO:	2.496582	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:		
Horizonte del Proyecto:	Aumentar el nivel de calidad de servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda y aumentar en numero de usuarios atendidos.	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	11,580.00	
Monto Ejecutado:	2,500.00	
Avance Financiero:	21.59%	
Avance Físico 2023:	100.00%	
Estado de la Obra:	Culminado, En proceso de liquidación técnica	

Nombre del Proyecto:	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.530935	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	424	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial de la carretera departamental	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	128,700.00	
Monto Ejecutado:	128,700.00	
Avance Financiero:	100.00%	
Avance Físico 2023:	100.00%	
Estado de la Obra:	En elaboración de Exp. Téc.	



Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0444 JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD COSTA RICA, DISTRITO DE PAJARILLO, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.599122	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	208	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	517,299.00	
Monto Ejecutado:	0.00	
Avance Financiero:	0.00%	
Avance Físico 2023:	0.00%	
Estado de la Obra:	Con contrato de servicio de consultoría	

Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0326 EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.599172	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	184	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	606,164.00	
Monto Ejecutado:	0.00	
Avance Financiero:	0.00%	
Avance Físico 2023:	0.00%	
Estado de la Obra:	Con contrato de servicio de consultoría	

Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0309 TUPAC AMARU II , EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.599208	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	356	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	532,224.00	
Monto Ejecutado:	0.00	
Avance Financiero:	0.00%	
Avance Físico 2023:	0.00%	
Estado de la Obra:	Con contrato de servicio de consultoría	

Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. ANGEL CUSTODIO GARCIA RAMIREZ EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.599215	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	522	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	491,233.00	
Monto Ejecutado:	0.00	
Avance Financiero:	0.00%	
Avance Físico 2023:	0.00%	
Estado de la Obra:	Con contrato de servicio de consultoría	



Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0202 EN LA LOCALIDAD CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.599286	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	389	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	548,602.00	
Monto Ejecutado:	0.00	
Avance Financiero:	0.00%	
Avance Físico 2023:	31.91%	
Estado de la Obra:	En ejecución	

Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0075 EKE PEDRO GIRANO PIRO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE SISA, DISTRITO DE SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.599293	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	396	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	519,485.00	
Monto Ejecutado:	0.00	
Avance Financiero:	0.00%	
Avance Físico 2023:	0.00%	
Estado de la Obra:	Con contrato de servicio de consultoría	



Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0757 ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD SHATOJA, DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.607931	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	196	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	538,341.00	
Monto Ejecutado:	0.00	
Avance Financiero:	0.00%	
Avance Físico 2023:	0.00%	
Estado de la Obra:	Con contrato de servicio de consultoría	

Nombre del Proyecto:	RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA, PROVINCIA SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.607953	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	167	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	711,009.00	
Monto Ejecutado:	0.00	
Avance Financiero:	0.00%	
Avance Físico 2023:	0.00%	
Estado de la Obra:	Con contrato de servicio de consultoría	

Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. CARLOS WIESSE, DE LA LOCALIDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.608214	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	1,395	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	531,041.00	
Monto Ejecutado:	42,683.52	
Avance Financiero:	8.04%	
Avance Físico 2023:		
Estado de la Obra:	Con contrato de servicio de consultoría	



Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0010 JULIO PIZARRO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE TINGO DE SAPOSOA, DISTRITO DE TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.608239	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	84	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	645,600.00	
Monto Ejecutado:	0.00	
Avance Financiero:	0.00%	
Avance Físico 2023:	0.00%	
Estado de la Obra:	Con contrato de servicio de consultoría	



Nombre del Proyecto:	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 0707 EMILIO SAN MARTIN, DE LA LOCALIDAD DE TABALOSOS, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.608249	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	913	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades, recreativas y de educación física	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	589,354.00	
Monto Ejecutado:	0.00	
Avance Financiero:	0.00%	
Avance Físico 2023:	0.00%	
Estado de la Obra:	Con contrato de servicio de consultoría	

Nombre del Proyecto:	REUBICACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA) RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (POSTES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN) , EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, PUERTO LIMON, NUEVO CHANCHAMAYO Y LA DIVISORIA, DISTRITO DE BAJO BIAVO, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2.626982		
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo		
Población Beneficiada:			
Horizonte del Proyecto:	Reubicación de postes eléctricos de media y baja tensión		
Modalidad de ejecución:	Por contrata		
PIM:	130,004.00		
Monto Ejecutado:	0.00		
Avance Financiero:	0.00%		
Avance Físico 2023:	0.00%		
Estado de la Obra:	Se aprobó el Exp. Téc de la inversión IOARR y actualmente se encuentra en ejecución.		

