



GOBIERNO REGIONAL

AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AL AÑO 2018


Ing. Juan Manuel Alpiste Caro
Gerente Regional de Infraestructura

Gerencia Regional de Infraestructura



LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL 2015 AL 2018

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 2015 AL 2018						
ITEM N°	SECTOR	CULMINADOS	EN EJECUCIÓN	EN CONVOCATORIA	TOTAL PROYECTOS	IMPORTE
1	Agopecuaria	2	0	0	2	5,433,583.36
2	Turismo	1	0	0	1	1,040,831.17
3	Transporte	5	3	0	8	21,379,027.18
4	Educacion	24	10	1	35	156,223,584.11
5	Salud	5	1	0	6	144,531,096.83
6	Saneamiento	18	4	1	23	53,685,390.28
TOTAL		52	18	2	72	382,293,512.93

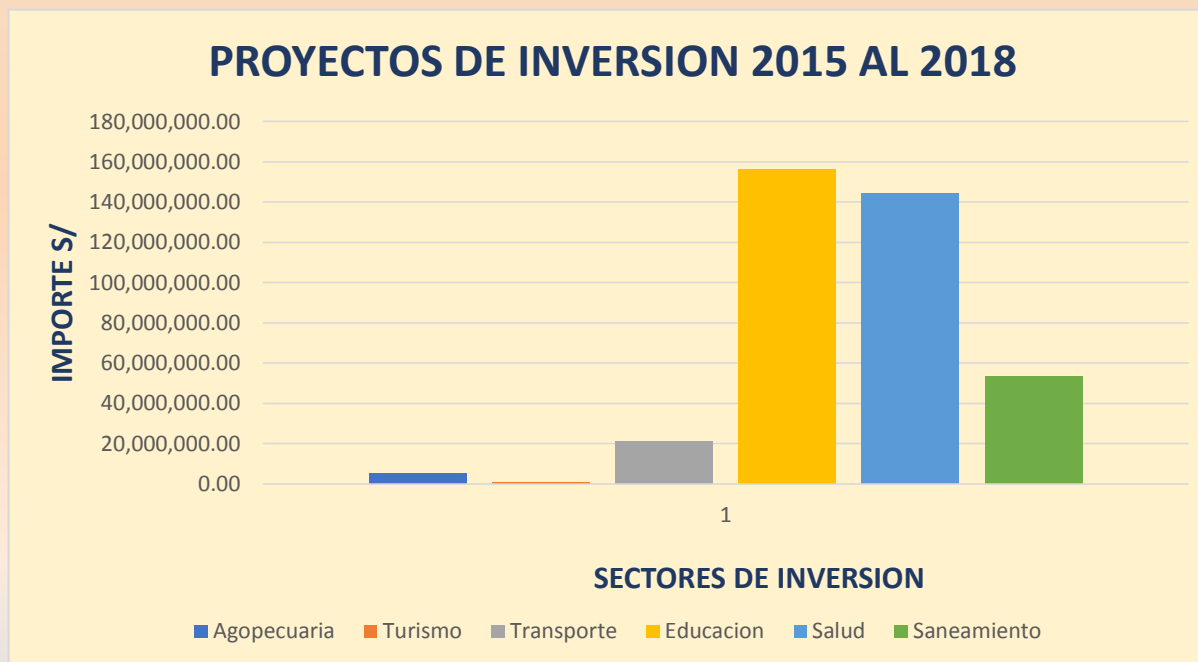

LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL 2015 AL 2018

RELACIÓN DE PROYECTOS EN PROCESO DE CONVOCATORIA

ITEM	DENOMINACION DEL PROYECTO	PROVINCIA	SECTOR	VALOR REFERENCIAL	MODALIDAD DE EJECUCION	POBLACION BENEFICIARIA	SITUACION
1*	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA - SALDO DE OBRA- ETAPA I	BARRANCA	SANEAMIENTO Y VIVIENDA	1,768,068.01	CONTRATA	2,928	CONVOCATORIA
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHU, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO - META II.	CAJATAMBO	EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,206,554.79	CONTRATA	2,236	CONVOCATORIA
TOTAL				3,974,622.80			

- **Nota:** Se precisa que la obra del primer ítem, se encuentra para firma de contrato.

LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL 2015 AL 2018

SECTOR TRANSPORTES:

Tres obras en ejecución, con un valor referencial de S/ 14,073,444.67

ITEM	DENOMINACION DEL PROYECTO	PROVINCIA	VALOR REFERENCIAL APROBADO	DEVENGADO A NOV.	ESTADO
1	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO - LAYA - LA PEDRERA, DISTRITO DE LAHUAYTAMBO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA, META I	HUAROCHIRI	2,892,481.61	324,030.00	EJECUCIÓN
2	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y VEREDAS DEL C.P. SAN BENITO, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA	OYON	1,704,324.15	924,675.00	EJECUCIÓN
3	MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES OYON, IQUITOS, VICTOR ANDRES BELAUNDE, MAZAMARI, ANDAHUAYLAS, FELIX RIVERA, MARAÑON, AMAZONAS, UCAYALI Y PASAJE NUEVO DEL BARRIO PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON, REGION LIMA	OYON	9,476,638.91	En trámite primera valorización	EJECUCIÓN
TOTAL			14,073,444.67	1,248,705.00	



EN EJECUCIÓN

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO - LAYA - LA PEDRERA, DISTRITO DE LAHUAYTAMBO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA, META I”

LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL 2015 AL 2018

SECTOR SALUD:

Actualmente se vienen ejecutando una obra y tres culminadas, con un costo de S/ 156,548,800.06

ITEM	DENOMINACION DEL PROYECTO	PROVINCIA	VALOR REFERENCIAL APROBADO	DEVENGADO A NOV.	ESTADO
1	"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE" META II.	CAÑETE	148,392,018.11	111,064,152.79	EJECUCIÓN
2	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL DE SUPE - META EQUIPAMIENTO.	BARRANCA	6,913,524.00	6,913,524.00	CULMINADA
3	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD MANZANARES NIVEL I-4, MICRORRED HUALMAY - RED DE SALUD HUAURA OYON - SALDO DE OBRA	HUAURA	889,913.32	889,913.32	CULMINADA
4	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COCHAMARCA- DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA.METAI	OYON	353,344.63	357,102.00	CULMINADA
TOTAL			156,548,800.06	119,224,692.11	



CULMINADA

"FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL DE SUPE" – EQUIPAMIENTO"



GOBIERNO REGIONAL

Gerencia Regional de Infraestructura

LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL 2015 AL 2018

SECTOR SALUD:

“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE: META I”

Mediante D.U. N° 016-2012, se financió este proyecto por S/ 33'900.000.00 y la Meta I conta de:

Construcción del casco estructural en bloques de 3 pisos, con 9 sectores denominados A, B, C, D, E, F, G, H, I, con sus respectivas tuberías empotradas en la pared de instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas y comunicaciones, con vigas, viguetas de acero ASTM A-36 y planchas tipo PRCOR TR-14 traslucidas y opacas.

Al asumir la gestión el 2015, esta meta ya estaba ejecutada y recepcionada. Asimismo, la Meta II ya se encontraba licitada.

Al ejecutar los trabajo en la Meta II, se evidencio la existencia de defectos y vicios ocultos en la Meta I, generando la aprobación de adicionales por deficiencias y omisiones en la ejecución de varias partidas.

LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL 2015 AL 2018

SECTOR SALUD:

“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE” META II”

Por deficiencias del Expediente Técnico modificado, en el que se omitió la norma técnica de salud N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos de Salud 2° nivel de atención” de 01.09.2014.

A la fecha se tiene doce adicionales de obra, de los cuales cuatro están en tramite en la Contraloría General de la República.


Porcentajes de avances:

- Equipamiento 85.72%
- Obra en general (a octubre) 68.97%

Meta III “Ejecución del pozo tubular”, cuenta con Expediente Técnico.

Meta IV “Ejecución de pistas y veredas”, también cuenta con Expediente Técnico a cargo de la DRTC.

Meta V “Sistema de Media Tensión”, para mayor potencia por cambio tecnológico de los equipos; Exp. Técnico aprobado por Luz del Sur.

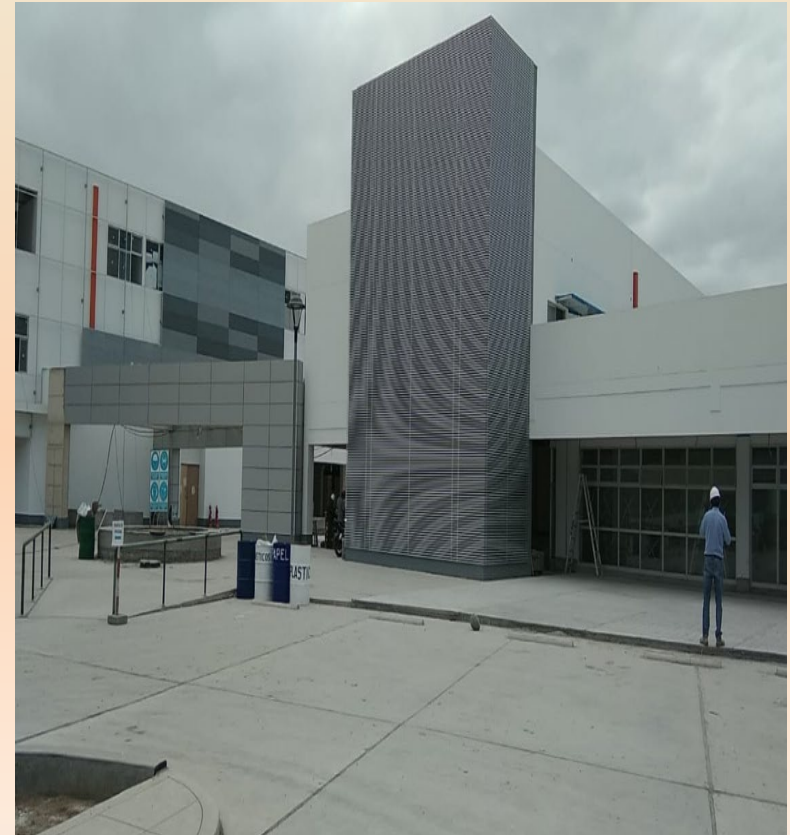

LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL 2015 AL 2018

SECTOR SANEAMIENTO:

Se tiene tres obras en ejecución, tres culminadas y una en convocatoria, con un costo de ejecución de S/ 21,349,324.99, tal como se aprecia a continuación:

ITEM	DENOMINACION DEL PROYECTO	PROVINCIA	VALOR REFERENCIAL APROBADO	DEVENGADO A NOV.	ESTADO
1	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA - SALDO DE OBRA- ETAPA I	BARRANCA	1,768,068.01	60,000.00	CONVOCATORIA
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CENTROS POBLADOS PAMPA SAN JOSE, CARAQUEÑO Y ONCE ESTRELLAS, DISTRITO DE PATIVILCA, BARRANCA, LIMA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	BARRANCA	1,944,753	72,660.00	EJECUCIÓN
3	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS DE LA AGUADA, DISTRITO DE MALA-CAÑETE-LIMA" META: SISTEMA DE AGUA POTABLE.	CAÑETE	4,376,312.61	51,775.00	EJECUCIÓN
	SUB TOTAL		8,089,133.42	184,435.00	



CULMINADA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POQUIAN DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO – LIMA"

LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL 2015 AL 2018

SECTOR SANEAMIENTO:

Se tiene tres obras en ejecución, tres culminadas y una en convocatoria, con un costo de ejecución de S/ 21,349,324.99, tal como se aprecia a continuación:

ITEM	DENOMINACION DEL PROYECTO	PROVINCIA	VALOR REFERENCIAL APROBADO	DEVENGADO A NOV.	ESTADO
	SUB TOTAL		8,089,133.42	184,435.00	
4	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA, META I.	HUAURA	7,160,914.95	789,018.00	EJECUCIÓN
5	“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAHUA Y CAHUA VIEJO, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGIÓN LIMA”.	CAJATAMBO	2,015,393.67	208,529.00	CULMINADA
6	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POQUIAN DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA	CAJATAMBO	1,693,646.25	1,285,414.00	CULMINADA
7	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE ÑAUPAY, DISTRITO DE IHUARI-HUARAL-LIMA	HUARAL	2,390,236.70	63,807.63	CULMINADA
	TOTAL		21,349,324.99	2,531,203.63	



CULMINADA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAHUA Y CAHUA VIEJO, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGIÓN LIMA”



GOBIERNO REGIONAL

Gerencia Regional de Infraestructura

LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL 2015 AL 2018

SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE:

Son 10 obras en ejecución, 7 culminadas y una en convocatoria, cuya inversión es de S/ 80,606,469.60

ITEM	DENOMINACION DEL PROYECTO	PROVINCIA	VALOR REFERENCIAL APROBADO	DEVENGADO A NOV.	ESTADO
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHU, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO - META II.	CAJATAMBO	2,206,554.79		CONVOCATORIA
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 20832 DEL CENTRO POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, META I	BARRANCA	1,158,130.79	300,070.00	EJECUCIÓN
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. Nro. 661 DEL C.P MANUEL SEOANE CORRALES, DISTRITO DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, META I.	BARRANCA	1,077,220.71	344,200.00	EJECUCIÓN
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. AUGUSTO B. LEGUÍA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL – CAÑETE - LIMA	CAÑETE	16,766,409.19	15,550,879.69	EJECUCIÓN
5	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. Nro 20390 HORTENCIA DULANTO DE LAS CASAS DEL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA	HUARAL	12,240,907.32	1,270,494.00	EJECUCIÓN
6	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE 20955-28 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES ANEXO 22 DEL CENTRO POBLADO VALLE HERMOSO, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI , LIMA META I-NIVEL INICIAL	HUAROCHIRI	2,857,640.92	902,715.00	EJECUCIÓN
SUB TOTAL			36,306,863.72	18,368,358.69	



EN EJECUCIÓN

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. AUGUSTO B. LEGUÍA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL – CAÑETE - LIMA”



LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL 2015 AL 2018

SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE:

Son 10 obras en ejecución, 7 culminadas y una en convocatoria, cuya inversión es de S/ 80,606,469.60

ITEM	DENOMINACION DEL PROYECTO	PROVINCIA	VALOR REFERENCIAL APROBADO	DEVENGADO A NOV.	ESTADO
	SUB TOTAL		36,306,863.72	18,368,358.69	
7	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 20840 SANTIAGO ERIK ANTUNEZ DE MOYOLO RYNNING EN PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS-HUARACHIRI-LIMA-META II-ETAPA 01	HUARACHIRI	1,618,659.74	277,420.00	EJECUCIÓN
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL EN LA IEI NRO 20366 TUPAC AMARU II DEL CENTRO POBLADO EL SOCORRO, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA.	HUAURA	15,943,017.32	8,514,614.00	EJECUCIÓN
9	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA E.I N° 20372 PICHUPAMPA, DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA	HUAURA	1,711,523.15	1,400,225.00	EJECUCIÓN
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 20047 SANTO TOMAS DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA-META I.	OYON	1,314,829.80	0.00	EJECUCIÓN
11	CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA - META: SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 20 KV CON OPERACIÓN INICIAL 10 KV	BARRANCA	463,458.45	0.00	EJECUCIÓN
12	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. N° 20871 DEL CENTRO POBLADO PARAISO, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA – LIMA – SALDO DE OBRA	HUAURA	322,433.42	322,433.4	CULMINADA
	SUB TOTAL		57,217,327.15	28,883,051.11	



EN EJECUCIÓN

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 20832 DEL CENTRO POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, META I”



LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2018

SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE:

Son 10 obras en ejecución, 7 culminadas y una en convocatoria, cuya inversión es de S/ 80,606,469.60

ITEM	DENOMINACION DEL PROYECTO	PROVINCIA	VALOR REFERENCIAL APROBADO	DEVENGADO A NOV.	ESTADO
	SUB TOTAL		57,217,327.15	28,883,051.11	
13	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CETPRO BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA - BARRANCA - LIMA	BARRANCA	749,436.37	6,000.00	CULMINADA
14	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IETI PEDRO E. PAULET MOSTAJO EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA" – II ETAPA – META II (TRES TALLERES Y UN LABORATORIO)"	HUAURA	820,000.00	820,000.0	CULMINADA
15	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N° 20331-656 PASITOS DE JESUS EN EL BARRIO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE HUALMAY- PROVINCIA DE HUAURA-REGION LIMA. META I : CONSTRUCCION DEL BLOQUE 01, BLOQUE 02 Y BLOQUE 05	HUAURA	3,655,106.61	1,702,738.00	CULMINADA
16	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 20331 - 656 PASITOS DE JESÚS DEL BARRIO LA ESPERANZA DISTRITO DE HUALMAY- PROVINCIA DE HUAURA - REGIÓN LIMA-META II	HUAURA	1,630,417.60	1,630,417.60	CULMINADA
17	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N° 20331-656 PASITOS DE JESUS EN EL BARRIO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE HUALMAY- PROVINCIA DE HUAURA-REGION LIMA. META III : CERCO PERIMETRICO	HUAURA	98,081.55	98,081.55	CULMINADA
18	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. NRO 21544-651 HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ DEL CENTRO POBLADO LA VILLA, DISTRITO DE SAYÁN - PROVINCIA DE HUAURA	HUAURA	16,436,100.32	8,514,614.00	CULMINADA
	TOTAL		80,606,469.60	41,654,902.26	



CULMINADA

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IETI PEDRO E. PAULET MOSTAJO EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA" – II ETAPA – META II (TRES TALLERES Y UN LABORATORIO)"



GOBIERNO REGIONAL

Gerencia Regional de Infraestructura

LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL 2015 AL 2018

OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS

ITEM N°	PROYECTO	PROVINCIA	IMPORTE S/	PMI 2019	ESTADO EXPEDIENTES TECNICOS
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS EN LA I.E.I. ESCOLARIZADA N 21571 SAN JUAN DE DIOS, DISTRITO DE AUCALLAMA PROVINCIA DE HUARAL REGION LIMA	HUARAL		1,245,434.00	CON CONFORMIDAD TÉCNICA
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LAS CAPACIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN LA CIUDAD DE OYÓN, DISTRITO DE OYÓN, PROVINCIA DE OYÓN - LIMA	OYON	9,992,039.00		EN ELABORACIÓN
3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CP MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUPE – BARRANCA – LIMA” SALDO DE OBRA ETAPA II	BARRANCA	4,430,000.00		EN ELABORACIÓN
4	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR OESTE, DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA, LIMA - META I	BARRANCA			EN ELABORACIÓN
5	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 20523 CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA	BARRANCA		8,294,319.00	EN ELABORACIÓN
6	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR VALLEJO, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA	HUARAL		8,979,796.00	EN ELABORACIÓN
7	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. BEATO SANTISIMO MARTIN DEL CENTRO POBLADO LA VILLA, DISTRITO VEGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGION LIMA	HUAURA		1,217,341.00	EN ELABORACIÓN
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETPRO LAS CARMELITAS DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	HUAURA		1,549,330.00	EN ELABORACIÓN
	SUB TOTAL		14,422,039.00	21,286,220.00	



LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL 2015 AL 2018

OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS

ITEM N°	PROYECTO	PROVINCIA	IMPORTE S/	PMI 2019	ESTADO EXPEDIENTES TECNICOS
	SUB TOTAL		14,422,039.00	21,286,220.00	
9	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 20840 SANTIAGO ERIK ANTÚNEZ DE MAYOLO RYNNING EN PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS – HUAROCHIRÍ – LIMA” META II	HUAROCHIRI	6,689,619.04		APROBADO EL GLOBAL - EN EJECUCIÓN LA META I
10	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL EN LA IEI N° 661 DEL CP MANUEL SEOANE CORRALES, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA	BARRANCA	3,361,816.58		APROBADO EL GLOBAL - EN EJECUCIÓN LA META I
11	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA DE HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA – HUAURA – LIMA”	HUAURA	12,332,056.44		APROBADO EL GLOBAL - EN EJECUCIÓN LA META I
12	AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PARAMONGA NUEVA DEL VALLE DE PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA, BARRANCA, LIMA	BARRANCA	265,478.50		APROBADO
13	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EL VALLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VALLE SAGRADO ANEXO 22, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ – LIMA	HUAROCHIRI	13,000,925.73		PROCESO DE APROBACIÓN CON RESOLUCIÓN
14	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CHANCAYLLO – CHANCAY – HUARAL – LIMA	HUARAL	1,929,100.91		PROCESO DE APROBACIÓN CON RESOLUCIÓN
15	REHABILITACION DE PUENTE Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL E INGRESO AL CENTRO POBLADO TRAPICHE, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES - CANTA – LIMA	CANTA	9,109,808.44		PROCESO DE APROBACIÓN CON RESOLUCIÓN
16	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ” META II	HUAROCHIRI	4,052,028.19		EXPEDIENTE CON CONFORMIDAD TÉCNICA, A AL ESPERA DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL PTAR
17	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAROCHIRI – LIMA “META: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	HUAROCHIRI	1,774,133.77		CON CONFORMIDAD TÉCNICA
	TOTAL		66,937,006.60	21,286,220.00	

DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL AÑO 2018

- ❖ El GORE Lima solicitó financiamiento para ejecutar proyectos con Expediente Técnico, sin embargo a través del D.U. N° 006-2018 asignaron recursos para proyectos que se encontraban a nivel de perfil.
- ❖ Demora en la transferencia de recursos por parte del MEF, que representa una limitante si se considera los plazos para convocar los procedimientos de selección.
- ❖ La entrada en vigencia del Nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE PE, ocasionado dificultades, puesto que el registrar cada incremento en el costo de ejecución de las obras en el aplicativo, demanda mucho tiempo ocasionado retraso en el pago de las obligaciones contraídas, llámese valorizaciones, servicio de Supervisión de obra. Asimismo, no hubo adecuada capacitación.
- ❖ Las autoridades provinciales y distritales presentan expedientes técnicos que no reúnen las características técnicas mínimas, conllevando a disponer de recursos adicionales para las revisiones y levantamiento de observaciones, para su aprobación y posterior ejecución.



DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL AÑO 2018

- ❖ La transferencia de la Unidad Ejecutora es un cuello de botella, puesto que los registros se encuentran a cargo del Gobierno local, además, se precisa que ya no se cuenta con el acompañamiento del CONECTA MEF.
- ❖ La obra “Construcción y Equipamiento del Hospital Regional en la Provincia de Cañete” Meta II”, a la fecha tiene un porcentaje de avance de 68.97%, del contrato inicial, además queda en trámite la aprobación por la Contraloría General de la Republica, cuatro (04) adicionales de obra por haber superado el 15% del monto contratado.



GOBIERNO REGIONAL



Gerencia Regional de Infraestructura

GRACIAS



GOBIERNO REGIONAL



Gerencia Regional de Infraestructura
