

## INFORME FINANCIERO

### COMPONENTE CAPACITACIÓN - AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU – LA UNIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA – PROVINCIA DE MOYOBAMBA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" CON CUI N° 2518482.**



**RESPONSABLE:**  
**CPC. Erika del Pilar Flores Tello**  
ADMINISTRADORA  
Componente Capacitación - Ambiental del PI  
CUI N° 2518482

**ABRIL 2025**



## I. DATOS GENERALES

### 1.1 Nombre del Componente Capacitación - Ambiental



De acuerdo al estudio definitivo viabilizado, se define como Componente Capacitación - Ambiental del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Tioyacu – La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del Distrito de Moyobamba – Provincia de Moyobamba – Departamento de San Martín" con CUI N° 2518482.

### 1.2 Descripción



El Componente Capacitación – Ambiental del PI con CUI N° 2518482 "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Tioyacu – La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del Distrito de Moyobamba – Provincia de Moyobamba – Departamento de San Martín". El enfoque de este componente debe ser eminentemente participativo y con enfoque social y ambiental, donde se busca el adecuado manejo de los residuos sólido, la arborización de la captación del canal de riego y la implementación para la descontaminación de uso de agua agrícola y residuales; con la finalidad de garantizar la optimización de la disponibilidad hídrica a los agricultores que se encuentra dentro del área de influencia directa del proyecto de inversión.



El objetivo principal del Componente Capacitación - Ambiental es alcanzar la sostenibilidad del proyecto propiamente dicha, con el fortalecimiento en el manejo de la gestión de residuos sólidos, la arborización en la captación del canal principal con productores e instituciones educativas del área de influencia del proyecto, implementación del proceso de descontaminación de las aguas de uso agrícola y residuales.

Así mismo, mejorar la situación socioeconómica de los beneficiarios directos e indirectos del sector de riego de las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto, teniendo como resultado el mejoramiento del rendimiento de los cultivos y la producción de los sectores mencionados.





**COMPONENTE CAPACITACIÓN - AMBIENTAL DEL PI CON CUI N° 2518482**

<b>APROBADO</b>	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 031-2025-GRSM-PEAM-GG, DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2025
<b>MODIFICADO</b>	RESOLUCION GERENCIAL N° 052-2025-PEAM-GG, DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2025
<b>INSPECTOR</b>	Ing. Lopez Gonzales Darlyng Luz
<b>COORDINADOR</b>	Ing. Mendoza Fababa Alexandra
<b>ADMINISTRADOR</b>	CPC. Flores Tello Erika del Pilar
<b>ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL</b>	Ing. Saldaña Castro Sandy
<b>ESPECIALISTA AGROFORESTAL</b>	Ing. Pérez Grández Fernando
<b>TÉCNICA AGROPECUARIO - TRAMO I</b>	Ing. León Suárez Wildor Daniel
<b>TÉCNICA AGROPECUARIO - TRAMO II Y IV</b>	Ing. Estrella Díaz Tomas
<b>TÉCNICA AGROPECUARIO - TRAMO III</b>	Téc. Cachique Gonzáles Alfonso

Fuente: Elaboración Propia.

## II. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados: Fondo de Compensación Regional (FONCOR)

## III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

### 3.1 Ejecución de gastos a nivel de certificación


Se viene certificando hasta la fecha el monto de S/ 286,502.00 (Doscientos ochenta y seis mil quinientos dos con 00/100 soles), correspondiente al 75.39% de avance.



**Cuadro Resumen:**

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEVENGADO ACUMULADO SEGÚN PIM 2025**

AÑO 2025 (Febrero – Abril)		
PIM	EJECUTADO (CERTIFICADO ACUMULADO)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
380,000.00	286,502.00	75.39%

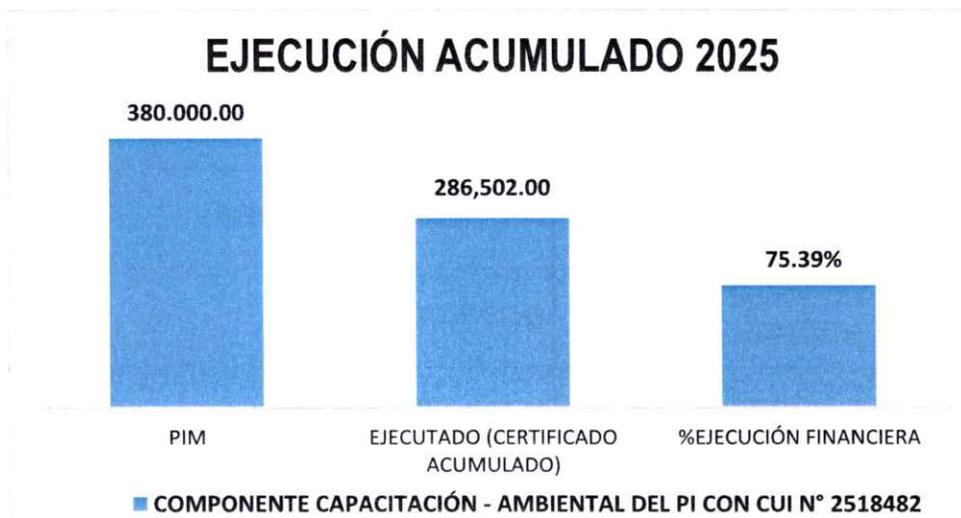

**3.2 Ejecución de gastos a nivel de devengado**

Se viene devengando hasta la fecha el monto de S/ 118,285.00 (Ciento dieciocho mil doscientos ochenta y cinco con 00/100 soles), correspondiente al 31.13% de avance.

**Cuadro Resumen:**

**EJECUCIÓN FINANCIERA CERTIFICADO ACUMULADO SEGÚN PIM 2025**

AÑO 2025 (Febrero – Abril)		
PIM	EJECUTADO (DEVENGADO ACUMULADO)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
380,000.00	118,285.00	31.13%





## EJECUCIÓN ACUMULADO 2025



■ COMPONENTE CAPACITACIÓN - AMBIENTAL DEL PI CON CUI N° 2518482

### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al mes de marzo se tiene una ejecución a nivel de devengado porcentual por el monto de S/ 118,285.00 y un porcentaje equivalente a 31.13%.
- Se recomienda acelerar los procesos de adquisición de materiales, e insumos para continuar con las actividades en cumplimiento de la ejecución del componente capacitación - ambiental del PI CUI N° 2518482.
- Se recomienda a la empresa responsable de la construcción de la carretera, tener cuidado con las plantaciones instaladas y de esta manera evitar el deterioro de las mismas.
- Se recomienda acelerar el trámite de la generación de las órdenes, tanto de bienes como de servicios, para elevar el porcentaje de la ejecución financiera, tanto comprometido como devengado.



Firmado digitalmente por:  
FLORES TELLO ERIKA DEL  
PILAR FIR 71689853 hard  
Motivo: SOY EL AUTOR DEL  
DOCUMENTO  
CARGO: ADMINISTRADOR DEL COMP.  
CAP. AMB. CUI N° 2518482  
Fecha: 29/04/2025 15:42:46-0500





## INFORME FINANCIERO

**COMPONENTE CAPACITACIÓN - AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA  
UNIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE  
MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" CON  
CUI N° 2518482.**



**RESPONSABLE:**

**CPC. Erika del Pilar Flores Tello**  
**ADMINISTRADORA**  
Componente Capacitación - Ambiental del PI  
CUI N° 2518482

**ABRIL 2025**



Documento Nro: 2938014004-2025690572. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=7b11c8e81cfcf428409b95Xd1591019e9b9&anex=2938014>

## I. DATOS GENERALES

### 1.1 Nombre del Componente Capacitación - Ambiental

De acuerdo al estudio definitivo viabilizado, se define como Componente Capacitación - Ambiental del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Tioyacu – La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del Distrito de Moyobamba – Provincia de Moyobamba – Departamento de San Martín" con CUI N° 2518482.




### 1.2 Descripción

El Componente Capacitación – Ambiental del PI con CUI N° 2518482 "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Tioyacu – La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del Distrito de Moyobamba – Provincia de Moyobamba – Departamento de San Martín". El enfoque de este componente debe ser eminentemente participativo y con enfoque social y ambiental, donde se busca el adecuado manejo de los residuos sólido, la arborización de la captación del canal de riego y la implementación para la descontaminación de uso de agua agrícola y residuales; con la finalidad de garantizar la optimización de la disponibilidad hídrica a los agricultores que se encuentra dentro del área de influencia directa del proyecto de inversión.



El objetivo principal del Componente Capacitación - Ambiental es alcanzar la sostenibilidad del proyecto propiamente dicha, con el fortalecimiento en el manejo de la gestión de residuos sólidos, la arborización en la captación del canal principal con productores e instituciones educativas del área de influencia del proyecto, implementación del proceso de descontaminación de las aguas de uso agrícola y residuales.



Así mismo, mejorar la situación socioeconómica de los beneficiarios directos e indirectos del sector de riego de las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto, teniendo como resultado el mejoramiento del rendimiento de los cultivos y la producción de los sectores mencionados.



COMPONENTE CAPACITACION AMBIENTAL DEL PIGON GUI N° 2513182	
<b>APROBADO</b>	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 031-2025-GRSM-PEAM-GG, DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2025
<b>MODIFICADO</b>	RESOLUCION GERENCIAL N° 052-2025-PEAM-GG, DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2025
<b>INSPECTOR</b>	Ing. Lopez Gonzales Darlyng Luz
<b>COORDINADOR</b>	Ing. Mendoza Fababa Alexandra
<b>ADMINISTRADOR</b>	CPC. Flores Tello Erika del Pilar
<b>ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL</b>	Ing. Saldaña Castro Sandy
<b>ESPECIALISTA AGROFORESTAL</b>	Ing. Pérez Grández Fernando
<b>TÉCNICA AGROPECUARIO - TRAMO I</b>	Ing. León Suárez Wildor Daniel
<b>TÉCNICA AGROPECUARIO - TRAMO II Y IV</b>	Ing. Estrella Díaz Tomas
<b>TÉCNICA AGROPECUARIO - TRAMO III</b>	Téc. Cachique Gonzáles Alfonso

Fuente: Elaboración Propia.

## II. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados: Fondo de Compensación Regional (FONCOR)

## III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

### 3.1 Ejecución de gastos a nivel de certificación


Se viene certificando hasta la fecha el monto de S/ 286,502.00 (Doscientos ochenta y seis mil quinientos dos con 00/100 soles), correspondiente al 75.39% de avance.




**Cuadro Resumen:**

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEVENGADO ACUMULADO SEGÚN PIM 2025**

AÑO 2025 (Febrero – Abril)		
PIM	EJECUTADO (CERTIFICADO ACUMULADO)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
380,000.00	286,502.00	75.39%



**EJECUCIÓN ACUMULADO 2025**

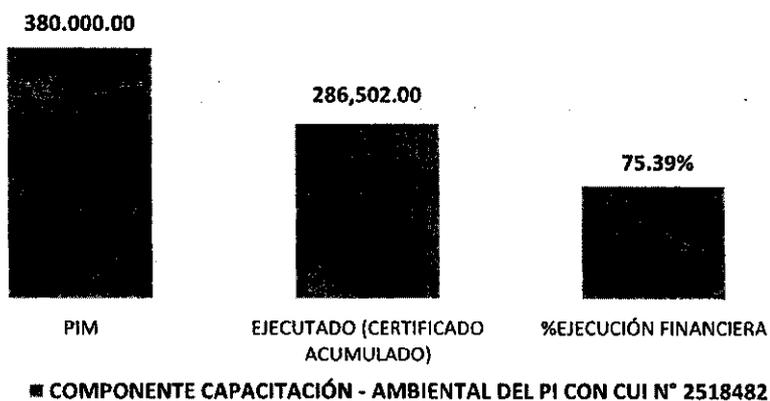

**3.2 Ejecución de gastos a nivel de devengado**

Se viene devengando hasta la fecha el monto de S/ 118,285.00 (Ciento dieciocho mil doscientos ochenta y cinco con 00/100 soles), correspondiente al 31.13% de avance.


**Cuadro Resumen:**

**EJECUCIÓN FINANCIERA CERTIFICADO ACUMULADO SEGÚN PIM 2025**

AÑO 2025 (Febrero – Abril)		
PIM	EJECUTADO (DEVENGADO ACUMULADO)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
380,000.00	118,285.00	31.13%



## EJECUCIÓN ACUMULADO 2025

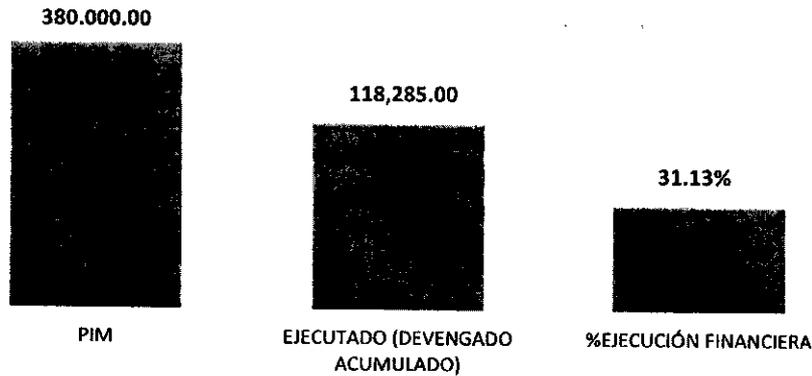

■ COMPONENTE CAPACITACIÓN - AMBIENTAL DEL PI CON CUI N° 2518482

### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Al mes de marzo se tiene una ejecución a nivel de devengado porcentual por el monto de S/ 118,285.00 y un porcentaje equivalente a 31.13%.

Se recomienda acelerar los procesos de adquisición de materiales, e insumos para continuar con las actividades en cumplimiento de la ejecución del componente capacitación - ambiental del PI CUI N° 2518482.

- Se recomienda a la empresa responsable de la construcción de la carretera, tener cuidado con las plantaciones instaladas y de esta manera evitar el deterioro de las mismas.
- Se recomienda acelerar el trámite de la generación de las órdenes, tanto de bienes como de servicios, para elevar el porcentaje de la ejecución financiera, tanto comprometido como devengado.



Firmado digitalmente por:  
FLORES TELLO ERIKA DEL  
PILAR FIR 71899853 hard  
Motivo: SOY EL AUTOR DEL  
DOCUMENTO  
CARGO: ADMINISTRADOR DEL COMP.  
CAP. AMB. CUI N° 2518482  
Fecha: 20/04/2025 15:42:48-0600



Documento No: 2938014004-2025690572. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=7b11c8e61cfcf4284e9b95Xd1591019e9b9&anex=2938014>
