

INFORME N°140-2025-AKVR

PARA : **Ing. Máximo David Ramos Chavarri**
Inspector del PI CUI N°2410964

DE : **Ing. Anyella Karina Vela Ramírez**
Coordinadora del Componente Socio Ambiental del PI CUI N°2410964

ASUNTO : Alcanzo Informe de Transparencia correspondiente al mes de mayo 2025

FECHA : Moyobamba, 29 de mayo del 2025

Por medio de la presente tengo el agrado de expresarle mi cordial saludo y a su vez hacerle llegar el informe de transparencia respecto a la ejecución física y financiera del mes de mayo correspondiente al **Componente Socio Ambiental** del Proyecto de Inversión “**Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba – provincia de Moyobamba – departamento de San Martín**” con **CUI N°2410964**.

Se adjunta:

- Informe de Transparencia – Ejecución física y financiera correspondiente al mes de mayo 2025 del CSA con CUI N°2410964.

Es todo cuanto informo a usted, para los trámites necesarios.

Atentamente;

ESTADO SITUACIONAL

COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
JUNINGUILLO DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA DEL DISTRITO DE
MOYOBAMBA – PROVINCIA DE MOYOBAMBA -DEPARTAMENTO DE SAN
MARTÍN” CON CUI N°2410964.



RESPONSABLE:

Ing. Anyella Karina Vela Ramírez
COORDINADORA
Componente Ambiental del PI CUI N°2410964

MAYO 2025

I. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Componente Socio Ambiental:

De acuerdo al estudio definitivo viabilizado, se define como **Componente Socio Ambiental del Proyecto de Inversión “Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba – provincia de Moyobamba -departamento de San Martín” con CUI N°2410964.**

1.2 Descripción:

El Componente de Intervención Ambiental es parte del Proyecto de Inversión Pública con CUI N° 2410964 **“Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba – provincia de Moyobamba -departamento de San Martín” con CUI n° 2410964**”, lo cual se desarrollará sobre la quebrada Juninguillo en el distrito de Moyobamba, en la provincia de Moyobamba, en la región de San Martín.

El objetivo principal del Componente Socio Ambiental es asegurar la sostenibilidad del proyecto propiamente dicha, con el desarrollo de capacidades en educación sanitaria y ambiental a través de capacitación y sensibilización a la población; a su vez con la implementación del plan de manejo del área de intervención, a través de reforestación específica del área de intervención por el proyecto y la implementación de asuntos sociales a través de la atención de la problemática o conflictos que se presentaran en el transcurso de la implementación del proyecto.

Así mismo, por tratarse de actividades ejecutadas relacionadas a mitigar los efectos negativos al medio ambiente, el enfoque del componente debe ser eminentemente participativo y con un enfoque social y ambiental, donde se utilice como metodología de enseñanza el “aprender haciendo”, asimismo se debe tener en cuenta la cultura y el perfil de los beneficiarios.

COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL DEL PI CON CUI N° 2410964	
APROBADO	Resolución Gerencial N°089-2024-GRSM-PEAM-GG, de fecha 13 de marzo del 2024.
INSPECTOR	Ing. Máximo David Ramos Chavarri
COORDINADOR	Ing. Anyella Karina Vela Ramírez
ADMINISTRADOR	Lic. Adm. Margoth Lopez Rojas
INGENIERÍA SANITARIA	Ing. Jessica Marleny Sandoval Espinoza
FACILITADOR EN LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL	Ing. Karen Paola Linares Flores
FACILITADOR DE LA ACTIVIDAD EN PLAN DE INTERVENCIÓN AGROFORESTAL	Ing. Carlos Darwin Vásquez Rodas

TÉCNICO DE CAMPO PARA LA REFORESTACIÓN PARTE ALTA	Bach. Emerson Chávez Noriega
TÉCNICO DE CAMPO PARA LA REFORESTACIÓN PARTE BAJA	Tec. Pablo Riva Lopez
TÉCNICO DE CAMPO PARA EL ÁREA DE REMEDIACIÓN DE DESBOSQUE	Tec. Héctor Francisco Barco Soriano
CONDUCTOR DE VEHÍCULO	Lenin Romario Vásquez Guerrero

Fuente: Elaboración Propia.

II. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados: Fondo de compensación Regional (FONCOR)

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


3.1 Ejecución de gastos a nivel de devengado

Se viene **devengado** hasta la fecha el monto de S/ 117, 600.50 (Ciento diecisiete mil seiscientos con 50/100 soles), correspondiente al 16.02% de avance.

Cuadro Resumen:

EJECUCIÓN FINANCIERA DEVENGADO ACUMULADO SEGÚN PIM 2025

AÑO 2025		
PIM	EJECUTADO (DEVENGADO ACUMULADO)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
734,194.00	117,600.50	16.02

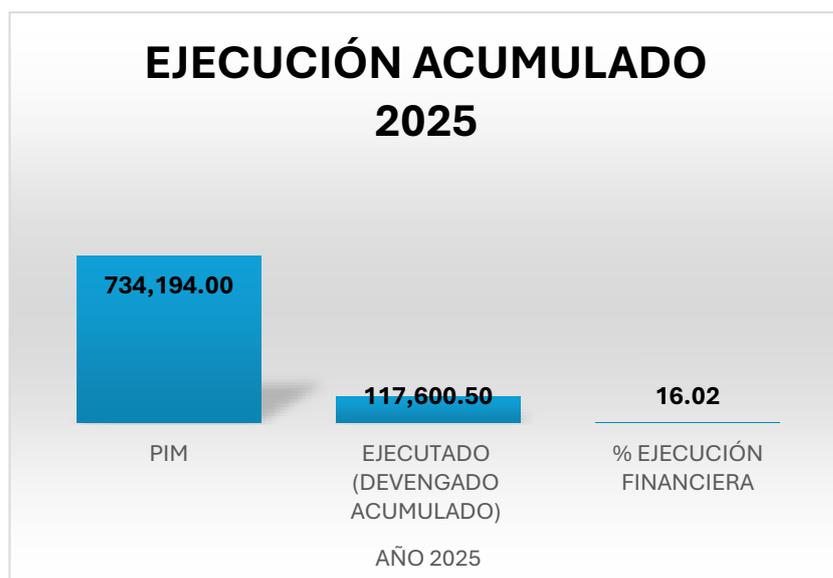

3.2 Ejecución Física

El Componente Socio Ambiental para este año 2025, considera el capacitar en educación ambiental y sanitaria, reforestación del área de intervención además del área de remediación de desbosque, instalación de pozos sépticos, módulos ambientales y la implementación de actividades ambientales, como acción de sensibilización se están desarrollando charlas con la finalidad de dar a conocer sobre las actividades que se implementarán con el componente. En este contexto las acciones desarrolladas en el mes de abril fueron las siguientes.

Actividades ejecutadas durante el mes de mayo del 2025:

- ❖ En el mes de mayo del presente año se tiene una ejecución porcentual acumulado a nivel de devengado por el monto de S/ 117, 600.50 y un porcentaje equivalente a 16.50 %.
- ❖ Se realizaron los requerimientos de módulos de cocinas mejoradas, animales menores, y módulos de biohuertos para la implementación del plan de intervención agroforestal.
- ❖ Se logró realizar el control y mantenimiento de 17 parcelas de un total de 32 parcelas existente en la parte baja y alta del área de influencia del componente, lo cual corresponde a un avance del 53.12% respecto a esta actividad.
- ❖ Se logró la siembra de 664 plantones forestales y 181 plantones frutales con los beneficiarios de los centros poblados, Creación 2000, Las Orquídeas, Nuevo Progreso, representando un total de 4.2316 hectáreas reforestadas.
- ❖ Se logró cumplir con 90% de las actividades programadas para el mes de mayo acorde al plan de intervención agroforestal y plan de capacitaciones del componente.
- ❖ Se realizaron los requerimientos de trípticos, polos publicitarios, refrigerios e insumos para recojo de residuos sólidos para la implementación del Programa de Capacitación en Educación Sanitaria y Ambiental.
- ❖ Se logró elaborar el expediente técnico de módulos de tratamiento de aguas mieles para beneficiarios al 100%, además se realizó el requerimiento del servicio para su ejecución.
- ❖ Se logro elaborar al 100% el requerimiento de contratación de servicio de “IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS para una correcta ejecución del procedimiento.
- ❖ Se logró realizar los talleres de educación sanitaria y ambiental a los estudiantes de nivel primaria y secundaria de las siguientes Instituciones educativas;
 - ❖ I.E. N°01067 Creación 2000
 - ❖ I.E. N°00910 Cordillera Andina
 - ❖ I.E. N°00984 Juningue

Panel fotográfico



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ❖ En el mes de mayo del presente año se tiene una ejecución porcentual acumulado a nivel de devengado por el monto de S/ 117, 600.50 y un porcentaje equivalente a 16.50 %.
- ❖ Se realizaron los requerimientos de módulos de cocinas mejoradas, animales menores, y módulos de biohuertos para la implementación del plan de intervención agroforestal.
- ❖ Se logró realizar el control y mantenimiento de 17 parcelas de un total de 32 parcelas existente en la parte baja y alta del área de influencia del componente, lo cual corresponde a un avance del 53.12% respecto a esta actividad.
- ❖ Se logró la siembra de 664 plantones forestales y 181 plantones frutales con los beneficiarios de los centros poblados, Creación 2000, Las Orquídeas, Nuevo Progreso, representando un total de 4.2316 hectáreas reforestadas.
- ❖ Se logró cumplir con 90% de las actividades programadas para el mes de mayo acorde al plan de intervención agroforestal y plan de capacitaciones del componente.
- ❖ Se realizaron los requerimientos de trípticos, polos publicitarios, refrigerios e insumos para recojo de residuos sólidos para la implementación del Programa de Capacitación en Educación Sanitaria y Ambiental.
- ❖ Se logró elaborar el expediente técnico de módulos de tratamiento de aguas mieles para beneficiarios al 100%, además se realizó el requerimiento del servicio para su ejecución.
- ❖ Se logro elaborar al 100% el requerimiento de contratación de servicio de "IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS para una correcta ejecución del procedimiento.
- ❖ Se logró realizar los talleres de educación sanitaria y ambiental a los estudiantes de nivel primaria y secundaria de las siguientes Instituciones educativas;
 - ❖ I.E. N°01067 Creación 2000
 - ❖ I.E. N°00910 Cordillera Andina
 - ❖ I.E. N°00984 Juningue

V. ANEXOS

Plano de Ubicación del Componente en ejecución

