

LOGROS AL 2017

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y EXPEDIENTES


SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN FORMULADOS

ESTADO	MONTO DE INVERSIÓN	CANTIDAD
DECLARADOS VIABLES	S/. 1,133,311,567.94	46
EN FORMULACIÓN	S/. 1,210,232,541.00	52
TOTAL	S/. 2,343,544,108.94	98


POR SECTOR

ESTADO	MONTO DE INVERSIÓN	CANTIDAD
DECLARADOS VIABLES	S/. 1,133,311,567.94	46.00
EN FORMULACIÓN	S/. 1,210,232,541.00	52.00
TOTAL	S/. 2,343,544,108.94	98.00

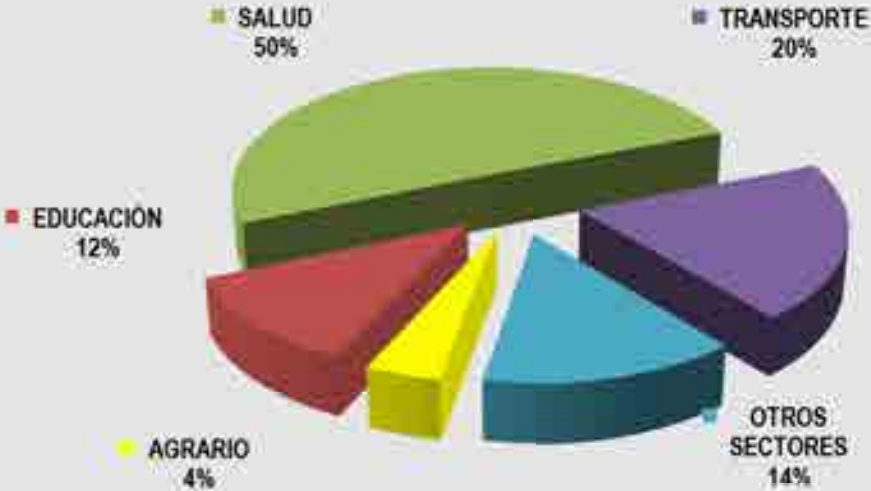

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN FORMULADOS Por Provincia

PROVINCIA	PRESUPUESTO	CANTIDAD
AREQUIPA	S/. 1,275,329,274.86	44.00
CAMANA	S/. 55,451,518.00	7.00
CARAVELI	S/. 16,562,290.08	5.00
CASTILLA	S/. 67,698,485.00	8.00
CAYLLOMA	S/. 146,513,872.00	16.00
CONDESUYOS	S/. 16,859,562.00	4.00
ISLAY	S/. 139,757,920.00	4.00
LA UNIÓN	S/. 14,865,955.00	6.00
MULTIPROVINCIALES	S/. 610,505,232.00	4.00
TOTAL	S/. 2,343,544,108.94	98.00

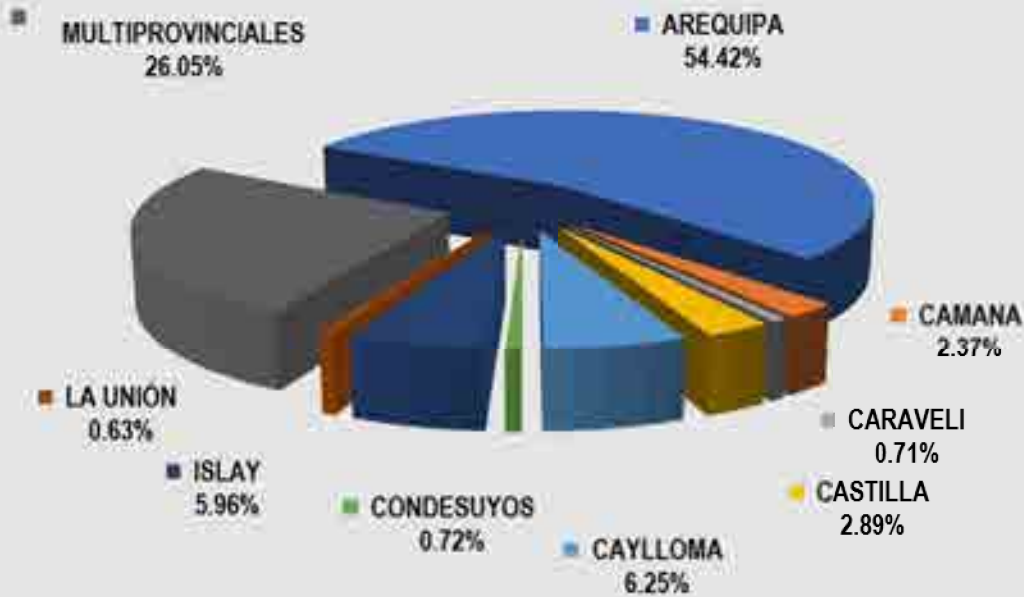




Expedientes Técnicos Elaborados

GOBIERNO REGIONAL

ESTADO	MONTO DE INVERSIÓN	CANTIDAD
APROBADOS	S/. 105,181,685.72	35.00
EN ELABORACIÓN	S/. 938,323,991.14	20.00
	S/. 1,043,505,676.86	55.00

POR SECTOR

SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	CANTIDAD
EDUCACIÓN	S/. 187,098,513.17	29.00
SALUD	S/. 527,213,313.90	7.00
SANEAMIENTO	S/. 4,891,787.21	1.00
TRANSPORTE	S/. 308,093,914.36	13.00
TURISMO	S/. 11,584,248.00	1.00
OTROS SECTORES	S/. 4,623,900.22	4.00
TOTAL	S/. 1,043,505,676.86	55.00

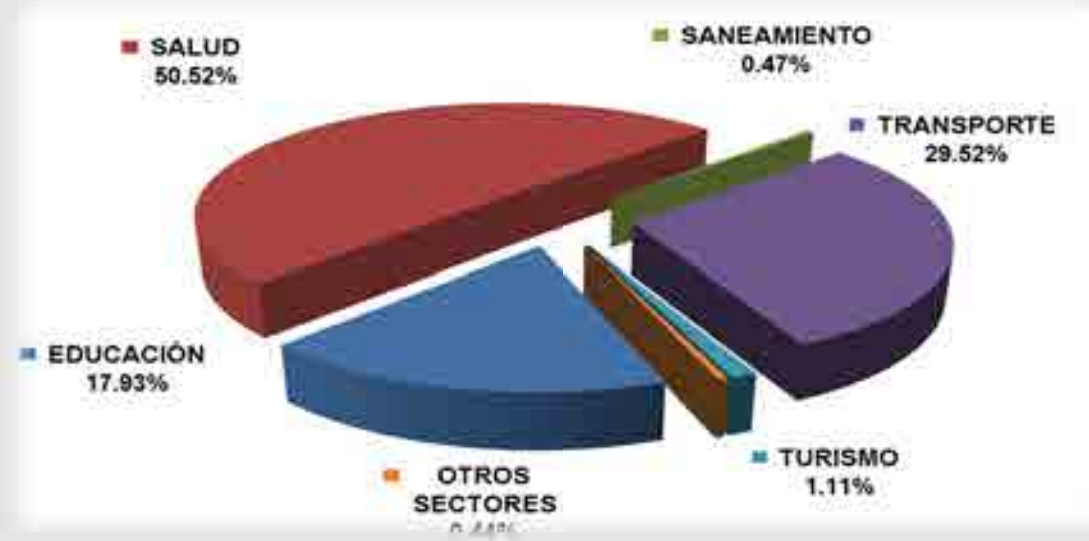

EJECUCIÓN DE PROYECTOS


Información General



GOBIERNO REGIONAL

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SEDE CENTRAL -2017

ITEM	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	CANTIDAD
1	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/. 184,541,185.00	49
2	CONTRATA	S/. 385,637,869.60	17
	TOTAL	S/. 570,179,054.60	66

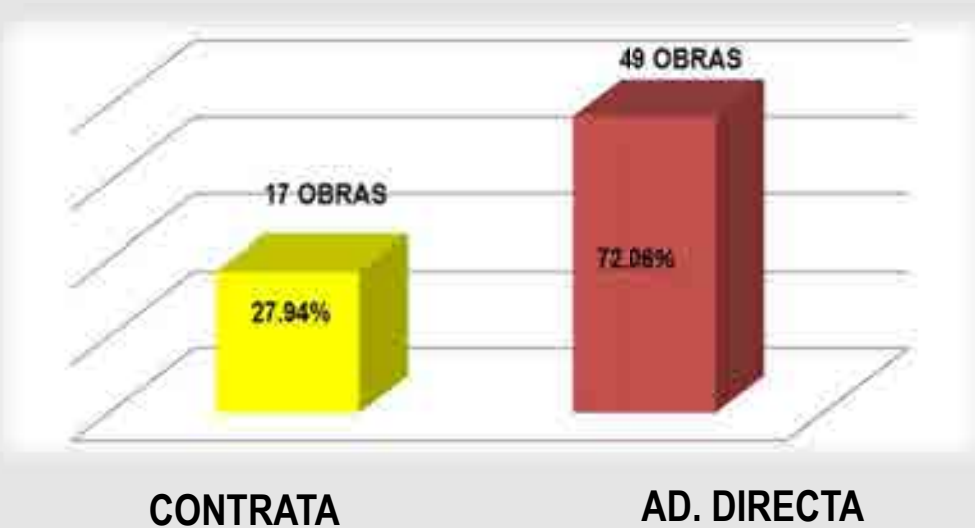



PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SEDE CENTRAL -2017


GOBIERNO REGIONAL

POR PROVINCIA:

ITEM	PROVINCIA	PRESUPUESTO	CANTIDAD
1	AREQUIPA	S/. 348,421,508.60	36
2	CAMANA	S/. 62,131,901.00	5
3	CARAVELI	S/. 29,835,143.00	2
4	CASTILLA	S/. 26,286,249.00	6
5	CAYLLOMA	S/. 73,871,757.00	8
6	CONDESUYOS	S/. 2,171,768.00	1
7	ISLAY	S/. 4,088,586.00	5
8	LA UNIÓN	S/. 23,372,142.00	3
TOTAL		S/. 570,179,054.60	66

POR SECTOR:

ITEM	SECTOR	PRESUPUESTO	CANTIDAD
1	AGRARIO	S/. 3,672,473.00	4
2	EDUCACIÓN	S/. 39,236,303.00	21
3	JUSTICIA	S/. 9,510,155.00	1
4	SALUD	S/. 127,668,063.00	12
5	TRANSPORTE	S/. 353,272,376.00	17
6	TURISMO	S/. 12,748,100.00	2
7	OTROS SECTORES	S/. 24,071,584.60	9
TOTAL		S/. 570,179,054.60	66

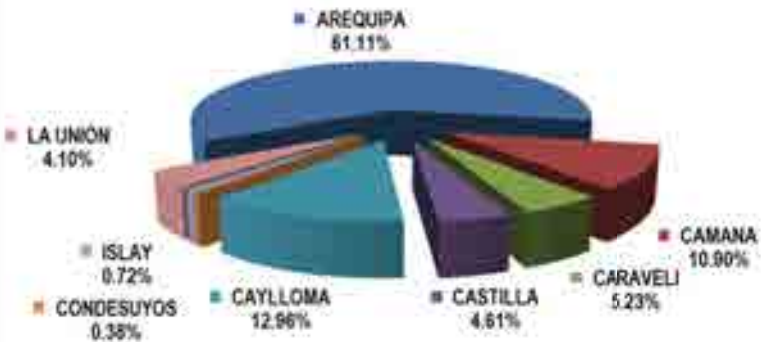

Administración Directa

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS POR AD. DIRECTA

ITEM	ESTADO	PRESUPUESTO	CANTIDAD
1	EN EJECUCIÓN	S/. 172,765,503.00	35
2	CULMINADAS	S/. 11,775,682.00	14
	TOTAL	S/. 184,541,185.00	49

OBRAS POR CADA SECTOR

ITEM	SECTOR	PRESUPUESTO	CANTIDAD
1	AGRARIO	S/. 3,672,473.00	4
2	EDUCACIÓN	S/. 25,015,546.00	14
3	JUSTICIA	S/. 9,510,155.00	1
4	SALUD	S/. 25,092,399.00	9
5	TRANSPORTE	S/. 99,389,552.00	13
6	TURISMO	S/. 12,748,100.00	2
7	OTROS SECTORES	S/. 9,112,960.00	6
	TOTAL	S/. 184,541,185.00	49





GOBIERNO REGIONAL

Obras por contrata




PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS POR CONTRATA

ITEM	ESTADO	PRESUPUESTO	CANTIDAD
1	EN EJECUCIÓN	S/. 377,020,576.60	12
2	CULMINADAS	S/. 8,617,293.00	5
TOTAL		S/. 385,637,869.60	17

OBRAS POR CADA SECTOR

ITEM	SECTOR	PRESUPUESTO	CANTIDAD
1	EDUCACIÓN	S/. 14,220,757.00	7
2	SALUD	S/. 102,575,664.00	3
3	TRANSPORTE	S/. 253,882,824.00	4
4	OTROS SECTORES	S/. 14,958,624.60	3
TOTAL		S/. 385,637,869.60	17

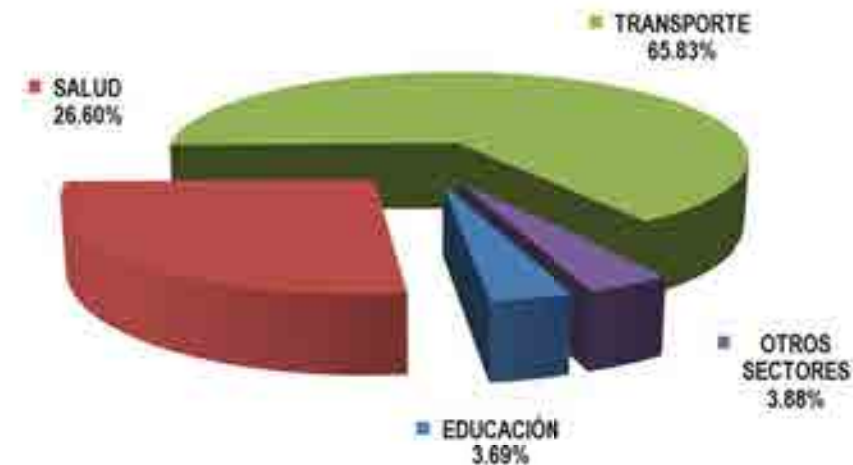



DETALLE DE LA OBRAS POR CONTRATA

N°	NOMBRE DE PIP	CODIGO SNIP	PIM 2017	MONTO SEGUN CONTRATO	PLAZO CONTRACTUAL (DC)	INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION	DEVENGADO AL 31.07.2017	AVANCE FINANCIERO AL 31.07.2017 (%)	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31.07.2017 (%)
GOBIERNO REGIONAL										
EDUCACION										
01	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL LOS TRES ERRANTES, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS, REGIÓN AREQUIPA	282196	S/. 2,171,768.00	S/. 2,094,378.48	175	24/01/2017	17/07/2017	100.00%	100.00%	100.00%
02	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. ESTRELLITA DE DAVID, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	264483	S/. 2,292,459.00	S/. 1,976,103.60	150	25/03/2017	21/08/2017	S/. 1,401,435.25	70.92%	78.87%
03	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. JOSE MARIA ARGUEDAS EN EL C.P. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	307939	S/. 2,143,556.00	S/. 2,181,688.22	148	28/12/2016	24/05/2017	S/. 1,801,541.27	82.58%	100.00%
04	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40606 SEUL DEL CENTRO POBLADO CASIMIRO CUADROS, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	149806	S/. 2,170,324.00	S/. 2,354,472.79	242	28/12/2016	26/08/2017	S/. 936,513.69	39.78%	66.85%
05	AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. SOR ANA B ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, SECTOR VII DISTRITO DE CERRO COLORADO - REGION AREQUIPA	265476	S/. 2,521,690.00	S/. 2,444,560.11	150	28/12/2016	26/05/2017	S/. 2,129,184.45	87.10%	95.00%
06	CREACIÓN DE LA I.E.I. NIÑOS TRIUNFADORES EN EL AA.HH. PEDRO VILCAPAZA, DISTRITO DE SACHACA, AREQUIPA, AREQUIPA	239654	S/. 2,165,711.00	S/. 2,045,064.07	188	26/01/2017	01/08/2017	S/. 672,061.58	32.86%	78.00%
07	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40302 EN EL ANEXO EL TAMBO, DISTRITO DE QUICACHA - PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA	265732	S/. 755,249.00	S/. 1,557,514.71	120	16/04/2016	03/07/2017	S/. 693,519.00	100%	100%



OBRAS POR CONTRATA

GOBIERNO REGIONAL

N°	NOMBRE DE PIP	CODIGO SNIP	PIM 2017	MONTO SEGUN CONTRATO	PLAZO CONTRATO (DC)	INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION	DEVENGADO AL 31.07.2017	AVANCE FINANCIERO AL 31.07.2017 (%)	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31.07.2017 (%)
SALUD										
08	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA	323144	S/. 21,958,456.00	S/. 42,736,811.46	600	28/12/2016	19/08/2018	S/. 9,138,382.04	21.38%	9.45%
09	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGIÓN AREQUIPA	322806	S/. 51,537,314.00	S/. 77,706,951.99	540	31/12/2016	23/06/2018	S/. 20,551,874.60	26.45%	10.20%
10	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGIÓN AREQUIPA	323143	S/. 29,079,894.00	S/. 43,255,030.13	390	28/12/2016	21/01/2018	S/. 4,053,808.61	9.37%	11.94%
TRANSPORTES										
11	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE UCHUMAYO. ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VÍA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA (TRAMO III)	249565	S/. 50,812,638.00	S/. 102,765,947.81 Expropiaciones S/.	495	10/09/2016	18/01/2018	S/. 42,692,336.47	135.34%	51.76%
12	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE UCHUMAYO. ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VÍA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA (TRAMO II)		S/. 150,013,186.00	S/. 126,762,447.44 Expropiaciones S/. 131,503,412.00	210	10/2017	05/2018	S/. 93,466.384.75	-----	-----
13	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPAOMATE	50669	S/. 8,025,000.00	S/. 56,983,828.28	210	10/2017	05/2017	-----	-----	-----
14	LACONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA JOYA JOYA	246218	S/. 45,032,000.00	S/. 107,549,938.00	510	10/2017	02/2018	-----	-----	-----



GOBIERNO REGIONAL

N°	NOMBRE DE PIP	CODIGO SNIP	PIM 2017	MONTO SEGUN CONTRATO	PLAZO CONTRATO (DC)	INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION	DEVENGADO AL 31.07.2017	AVANCE FINANCIERO AL 31.07.2017 (%)	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31.07.2017 (%)
SANEAMIENTO										
15	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA, III ETAPA REDES DE DESAGÜE Y BUZONES, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE.	31283	S/. 33,985.19	S/. 10,251,684.53	378	29/03/2016	10/04/2017	S/. 27,229,989.13	265.61%	100.00%
16	INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	78058	S/. 135,308,604.00	S/. 68,856,954.79	1191	22/04/2014	21/08/2017	S/. 72,238,309.62	104.91%	93.80%
17	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	74511	S/. 80,198,428.00	S/. 49,874,104.56	1179	15/09/2015	13/10/2017	S/. 54,826,346.51	109.93%	96.95%

Actividades de Mantenimiento

FICHAS DE MANTENIMIENTO

ESTADO	PRESUPUESTO	CANTIDAD
EN EJECUCIÓN	S/. 8,153,405.00	20
CULMINADAS	S/. 4,171,304.00	25
POR INICIAR	S/. 5,110,888.00	17
	S/. 17,435,597.00	62.00

SECTOR	PRESUPUESTO	CANTIDAD
AGRICULTURA	S/. 2,266,652.00	8
EDUCACIÓN	S/. 1,625,041.00	6
SALUD	S/. 2,671,296.00	8
TRANSPORTES	S/. 3,038,002.00	25
OTROS SECTORES	S/. 7,834,606.00	15
	S/. 17,435,597.00	62.00

