



PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
Agrario y Riego



# VI COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2021

RM N° 225-2019-MINAGRI

---

**OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES**  
**OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

Lima, 06 de julio de 2021

## RANKING DE EJECUCIÓN SECTORIAL – GN

Del total de recursos en Inversiones, el Sector Agrario y Riego a la fecha ha ejecutado el 23.6 % de su PIM, subiendo tres puestos respecto al cierre del mes de Mayo posicionándonos en el puesto N°14.



ITEM	SECTOR	PIM	DEV	%
1	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	3,517.0	1,220.2	34.7%
2	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10,337.6	3,551.9	34.4%
3	EDUCACION	2,479.1	706.4	28.5%
4	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	1,240.5	345.8	27.9%
<b>5</b>	<b>AGRARIO Y DE RIEGO</b>	<b>1,522.6</b>	<b>358.6</b>	<b>23.6%</b>
6	SALUD	1,026.1	235.2	22.9%
7	ECONOMIA Y FINANZAS	461.2	124.4	27.0%
8	DEFENSA	444.3	202.3	45.5%
9	INTERIOR	312.5	52.5	16.8%
10	ENERGIA Y MINAS	272.6	75.9	27.8%
11	AMBIENTAL	246.9	55.5	22.5%
12	PRODUCCION	236.2	118.4	50.2%
13	JUSTICIA	235.4	34.4	14.6%
14	PODER JUDICIAL	173.2	23.0	13.3%
15	CULTURA	156.5	41.8	26.7%
16	CONTRALORIA GENERAL	92.1	13.4	14.6%
17	COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	79.9	31.8	39.8%
18	MINISTERIO PUBLICO	68.8	4.4	6.4%
19	RENIEC	68.1	8.1	11.9%
20	TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	49.5	15.4	31.2%
21	JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	11.1	2.3	20.4%
22	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	7.6	3.3	42.9%
23	RELACIONES EXTERIORES	7.2	-	0.0%
24	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	3.1	-	0.0%
25	ONPE	1.2	-	0.0%
26	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.8	0.6	81.2%

\*Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF al 06 de julio de 2021

# RANKING DE EJECUCIÓN POR PLIEGOS Y UNIDADES EJECUTORAS - 2021



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

El Sector Agrario y Riego tiene un PIM de S/ 1,522.6 millones en Inversiones, habiendo ejecutado a la fecha S/ 358.6 millones, cifra que representa el 23.6% de avance.

PLIEGOS / UNIDADES EJECUTORAS	PIM	DEVENGADO	AVANCE
<b>MIDAGRI</b>	<b>1,200,368,176</b>	<b>236,770,521</b>	<b>19.7%</b>
PROVRAEM	14,492,742	8,609,576	59.4%
PE RIO PUTUMAYO	17,098,697	8,253,176	48.3%
UE FSA	38,978,576	16,565,491	42.5%
PE JAEN SAN IGNACIO BAGUA	82,879,322	31,478,714	38.0%
PE SIERRA CENTRO SUR	32,599,372	12,320,497	37.8%
PE PUYANGO TUMBES	41,142,539	14,632,724	35.6%
PE PICHIS PALCAZU	13,291,497	4,516,150	34.0%
PEDAMAALC	25,577,726	8,365,124	32.7%
PE LAGO TITICACA	33,432,313	9,389,843	28.1%
PE ALTO HUALLAGA	13,918,952	3,710,661	26.7%
PE JEQUETEPEQUE ZAÑA	65,339,871	15,919,059	24.4%
AGRORURAL	138,639,307	33,452,540	24.1%
UE GPS	41,904,256	7,678,568	18.3%
OGA MIDAGRI	184,928,982	21,660,134	11.7%
PSI	456,144,024	40,218,264	8.8%
<b>SENASA</b>	<b>169,403,941</b>	<b>59,198,025</b>	<b>34.9%</b>
<b>INIA</b>	<b>54,544,099</b>	<b>20,961,844</b>	<b>38.4%</b>
<b>ANA</b>	<b>80,911,157</b>	<b>32,056,297</b>	<b>39.6%</b>
<b>SERFOR</b>	<b>17,346,173</b>	<b>9,660,288</b>	<b>55.7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,522,573,546</b>	<b>358,646,975</b>	<b>23.6%</b>


\*Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF al 06 de julio de 2021

# EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN MENSUAL DE INVERSIONES A NIVEL SECTOR - 2021

**PROGRAMADO**  
ENERO – JUNIO: S/ 417.4 Mill

**EJECUTADO**  
ENERO – JUNIO: S/ 352.6 Mill

**SALDO NO EJECUTADO**  
: S/ 64.8 Mill

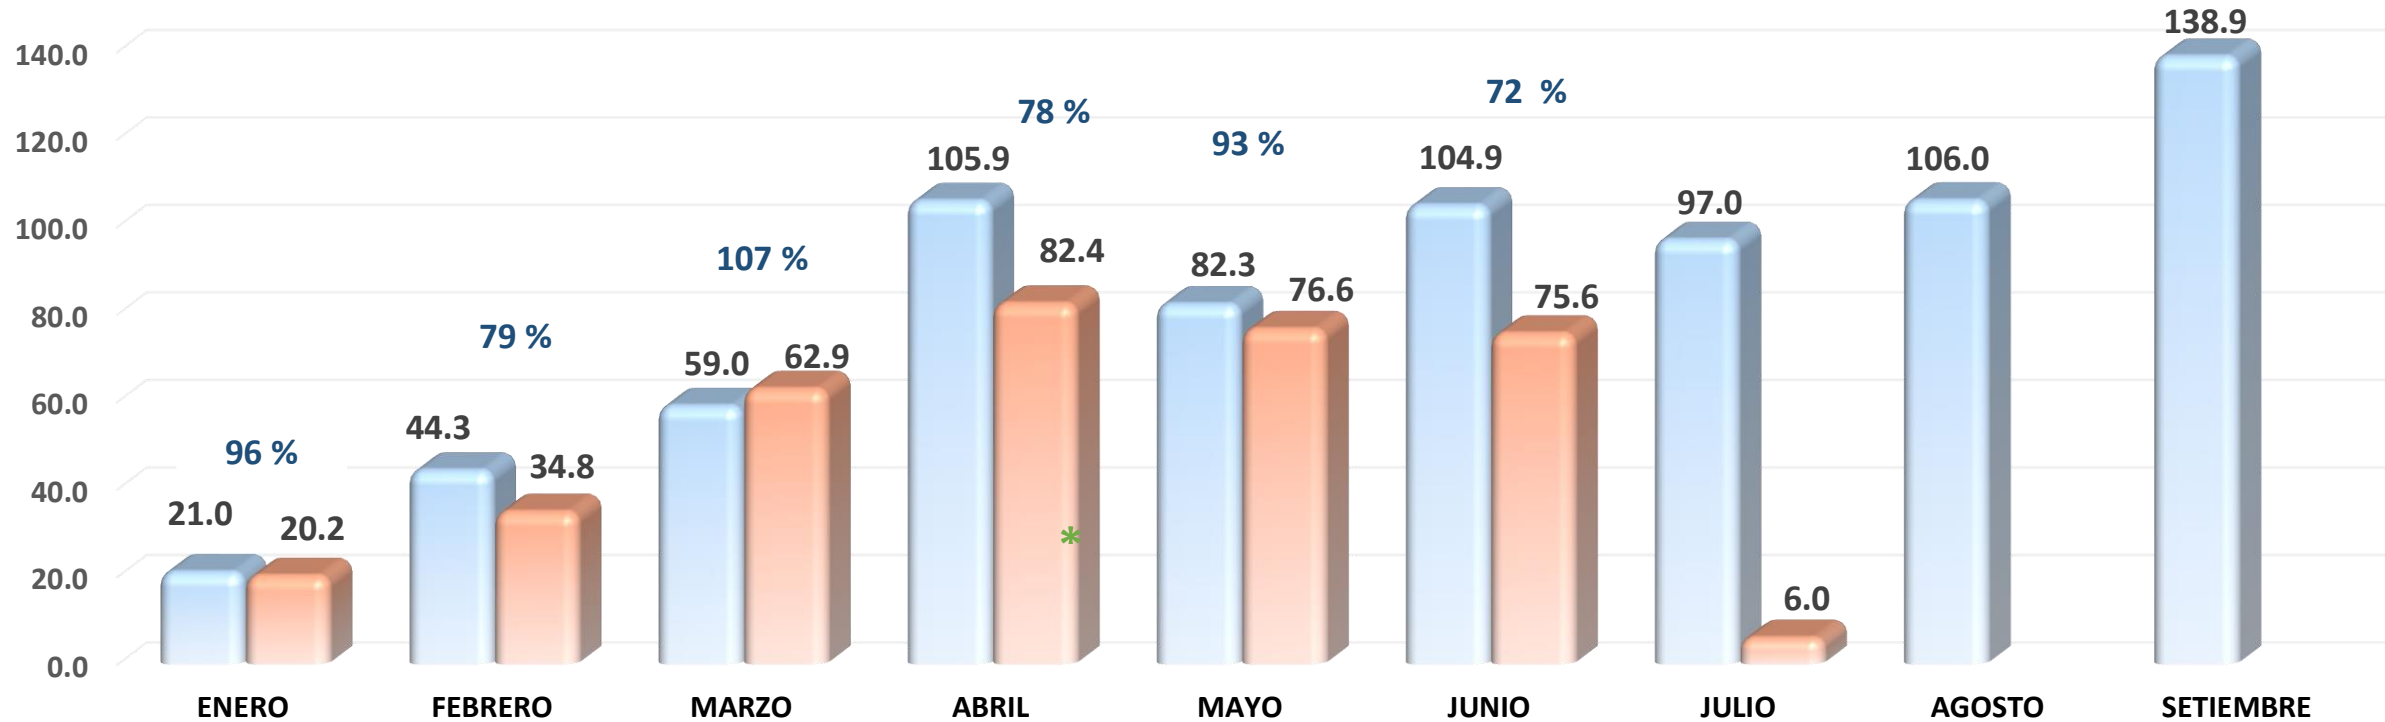

\*Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF al 01 de julio de 2021

■ PROGRAMADO

■ DEVENGADO

# META DE EJECUCIÓN SECTORIAL – JUNIO 2021



PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
Agrario y Riego

## RANKING DE EJECUCIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES

Según reporte del DGPP- MEF, de la meta de ejecución de inversiones del Sector en el mes de Junio de S/ 104.9 millones, se ha devengado S/ 75.6 millones, cifra que representa el 72 % de ejecución, posicionándonos en el puesto N° 11 del ranking Sectorial.

Sector	Meta Mensual	Devengado	Saldo	Ejecución (%)	🏆
Poblaciones Vulnerables	S/ 1.0M	S/ 1.4M	S/ 0.0M	139.4%	
Defensa	S/ 16.1M	S/ 20.4M	S/ 0.0M	126.6%	
Presidencia Consejo de Ministros	S/ 11.4M	S/ 13.1M	S/ 0.0M	114.4%	
Educación	S/ 112.3M	S/ 103.5M	S/ 8.8M	92.1%	
Trabajo	S/ 3.1M	S/ 2.9M	S/ 0.3M	91.1%	
Comercio Exterior y Turismo	S/ 5.8M	S/ 5.0M	S/ 0.8M	86.6%	
Ambiente	S/ 11.8M	S/ 9.9M	S/ 1.9M	84.1%	
Producción	S/ 24.1M	S/ 19.0M	S/ 5.1M	78.9%	
Vivienda	S/ 92.5M	S/ 72.5M	S/ 19.9M	78.4%	
Reconstrucción con Cambios	S/ 392.7M	S/ 284.5M	S/ 108.2M	72.4%	
<b>Agricultura</b>	<b>S/ 104.9M</b>	<b>S/ 75.6M</b>	<b>S/ 29.3M</b>	<b>72.0%</b>	
Transporte y Comunicaciones	S/ 943.3M	S/ 607.9M	S/ 335.4M	64.4%	
Interior	S/ 15.5M	S/ 9.4M	S/ 6.2M	60.3%	
Salud	S/ 77.6M	S/ 44.2M	S/ 33.4M	57.0%	
Cultura	S/ 15.1M	S/ 8.3M	S/ 6.8M	55.3%	
Justicia	S/ 15.9M	S/ 7.7M	S/ 8.2M	48.3%	
Economía	S/ 29.5M	S/ 7.5M	S/ 22.0M	25.3%	
Energía y Minas	S/ 72.7M	S/ 9.5M	S/ 63.3M	13.0%	
<b>Total</b>	<b>S/ 1,945.6M</b>	<b>S/ 1,302.3M</b>	<b>S/ 643.3M</b>	<b>66.9%</b>	

# EJECUCIÓN Y PROYECCION DE INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 2021

Según el registro de las Unidades Ejecutoras en el Modulo de Recolección de Datos la proyección de ejecución al mes de Julio es de S/ 449.9 Millones, ratio que representa (29.5%) de avance respecto al PIM del Sector Agrario y Riego.

PLIEGO / UE	PIM	EJECUTADO ENE - MAYO	EJECUTADO JUNIO	PROYECTADO						PROYECCIÓN DEVENGADO 2021	SALDO
				JULIO	PROYECCION ENE - JUL	PROYECCION ENE - JUL (%)	AGOSTO	SETIEMBRE	IV TRIMESTRE		
<b>013: MINAGRI</b>	<b>1,200,368,176</b>	<b>179,226,814</b>	<b>52,014,473</b>	<b>65,878,102</b>	<b>297,119,389</b>	<b>24.8%</b>	<b>72,166,073</b>	<b>98,540,447</b>	<b>548,620,102</b>	<b>1,016,446,011</b>	<b>183,922,165</b>
1296: AGRO RURAL	138,639,307	29,301,301	3,847,596	5,362,420	38,511,317	27.8%	8,946,701	21,392,830	56,159,284	125,010,132	13,629,175
1327: PE PUYANGO TUMBES	41,142,539	12,967,367	1,551,002	5,241,004	19,759,374	48.0%	7,213,029	2,851,417	11,318,719	41,142,539	
1328: PE JEQUETEPEQUE ZAÑA	65,339,871	12,383,786	1,151,388	3,815,954	17,351,128	26.6%	3,408,716	3,032,221	41,547,806	65,339,871	
1329: PE SIERRA CENTRO SUR	32,599,372	8,067,890	3,478,073	3,591,427	15,137,390	46.4%	3,771,371	3,721,649	9,968,962	32,599,372	
1330: PE LAGO TITICACA	33,432,313	7,769,937	1,615,447	1,859,281	11,244,665	33.6%	2,221,010	3,732,418	16,234,220	33,432,313	
1331: PE RIO PUTUMAYO	17,098,697	6,419,802	1,722,885	1,675,000	9,817,687	57.4%	1,521,645	1,519,050	4,240,315	17,098,697	
1332: PE JAEN SAN IGNACIO BAGUA	82,879,322	23,950,427	7,432,026	6,450,434	37,832,887	45.6%	6,211,001	7,180,231	31,655,203	82,879,322	
1333: PE ALTO HUALLAGA	13,918,952	2,800,794	887,305	1,095,676	4,783,775	34.4%	2,735,916	3,318,877	3,080,384	13,918,952	
1334: PE PICHIS PALCAZU	13,291,497	3,119,791	1,386,719	1,650,927	6,157,437	46.3%	2,152,537	1,511,272	3,470,251	13,291,497	
155: OGA	184,928,982	16,057,302	5,489,050	5,017,698	26,564,051	14.4%	6,310,140	7,280,181	144,774,611	184,928,982	
1593: PROVRAEM	14,492,742	6,570,258	1,969,387	1,757,915	10,297,560	71.1%	1,154,116	918,131	2,122,936	14,492,742	
1594: PEDAMAALC	25,577,726	7,355,234	912,208	1,238,556	9,505,998	37.2%	1,221,594	11,384,289	3,465,845	25,577,726	
1631: UE GPS	41,904,256	6,806,887	1,040,134	4,315,156	12,162,177	29.0%	8,501,155	4,469,765	9,844,511	34,977,608	6,926,648
1634: UE FSA	38,978,576	6,418,304	8,726,444	7,082,700	22,227,448	57.0%	6,956,637	4,303,251	5,491,239	38,978,576	
956: PSI	456,144,024	29,237,733	10,804,809	15,723,953	55,766,495	12.2%	9,840,506	21,924,865	205,245,817	292,777,682	163,366,342
<b>160. SENASA</b>	<b>169,403,941</b>	<b>46,500,758</b>	<b>12,551,836</b>	<b>16,579,366</b>	<b>75,631,960</b>	<b>44.6%</b>	<b>20,414,371</b>	<b>27,309,699</b>	<b>46,047,911</b>	<b>169,403,941</b>	
<b>163. INIA</b>	<b>54,544,099</b>	<b>16,107,633</b>	<b>4,845,208</b>	<b>5,259,054</b>	<b>26,211,895</b>	<b>48.1%</b>	<b>5,447,791</b>	<b>5,494,457</b>	<b>14,860,702</b>	<b>52,014,845</b>	<b>2,529,254</b>
<b>164. ANA</b>	<b>80,911,157</b>	<b>27,153,051</b>	<b>4,672,295</b>	<b>5,286,500</b>	<b>37,111,846</b>	<b>45.9%</b>	<b>6,623,674</b>	<b>6,890,829</b>	<b>28,716,036</b>	<b>79,342,385</b>	<b>1,568,772</b>
<b>165. SERFOR</b>	<b>17,346,173</b>	<b>8,037,055</b>	<b>1,478,166</b>	<b>4,365,193</b>	<b>13,880,414</b>	<b>80.0%</b>	<b>1,344,182</b>	<b>664,029</b>	<b>1,457,548</b>	<b>17,346,173</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1,522,573,546</b>	<b>277,025,311</b>	<b>75,561,978</b>	<b>97,368,215</b>	<b>449,955,504</b>	<b>29.5%</b>	<b>105,996,091</b>	<b>138,899,460</b>	<b>639,702,300</b>	<b>1,334,553,355</b>	<b>188,020,191</b>

# Cartera Priorizada del Sector Agrario y Riego



PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
Agrario y Riego

La Cartera Priorizada corresponde a 14 inversiones a cargo de 10 Unidades Ejecutoras. Estas inversiones tienen un monto de S/ 255.7 millones, cifra que representa el 43.1% del PIM total del Sector. Asimismo, estas inversiones concentran S/ 43.6 millones de la meta del mes de junio, de la cual se ha ejecutado S/ 37.7 millones, cifra que representa el 86.5% de la meta de la Cartera Priorizada del Sector.

N°	Nombre de la Inversión	PIM	Devengado	Avance	Meta Junio	Ejecutado Junio	Logro Junio	Meta Julio
1	AGRO RURAL PDTS-VRAEM	29,905,172	15,610,730	52.20%	1,418,264	1,050,000	74.03%	1,088,962
2	PEJSIB - AMOJAO	46,869,631	22,298,086	47.57%	3,525,000	5,012,806	142.21%	3,870,448
3	PEJSIB - HUARANGO	10,545,956	4,881,148	46.28%	2,140,248	1,745,758	81.57%	1,207,277
4	AGRO RURAL AVANZAR RURAL	23,490,001	10,213,057	43.48%	1,500,000	1,290,000	86.00%	1,590,000
5	UE FSA - IOARR SIEMBRA Y COSECHA	38,978,576	16,565,491	42.50%	8,075,159	8,726,444	108.07%	7,082,700
6	OGA MINAGRI - SEDE INSTITUCIONAL	42,851,264	16,628,669	38.81%	4,192,435	4,262,530	101.67%	4,067,495
7	ANA PMGRH - 10 CUENCAS	63,078,256	24,089,075	38.19%	3,821,684	3,056,764	79.98%	3,183,396
8	SENASA - PRODESA	167,573,088	57,889,524	34.55%	18,882,180	12,516,371	66.29%	16,574,222
9	PEJEZA - IGLESIA VIEJA	12,045,665	3,486,300	28.94%	1,913,284	27,800	1.45%	1,595,112
10	INIA - SEMILLAS	11,411,993	2,774,387	24.31%	673,173	938,149	139.36%	834,025
11	UEGPS - PIADER	13,426,648	2,750,945	20.49%	2,730,848	181,811	6.66%	964,596
12	UEGPS - PTRT3	28,477,608	4,927,623	17.30%	3,002,026	858,323	28.59%	3,350,560
13	PEBPT - RIO ZARUMILLA	19,510,081	2,993,372	15.34%	6,026,776	8,908,021	147.81%	4,026,776
14	PEJEZA - DEF. JEQUETEQUEPE	27,245,909	2,528,631	9.28%	93,155	137,167	147.25%	27,000
		<b>255,718,856</b>	<b>110,286,256</b>	<b>43.1%</b>	<b>43,554,970</b>	<b>37,660,673</b>	<b>86.5%</b>	<b>22,090,279</b>

\*Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF al 02 de Julio del 2021

# Exposición de la Cartera Priorizada



PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
Agrario y Riego

HORA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	Responsable
9:00: 9:15	Presentación del estado de ejecución de inversiones del Sector y de la Cartera Priorizada Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	OGPP MIDAGRI
9:15 - 9:30	Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria y la Inocuidad Agroalimentaria Fase II	PRODESA
9:30 - 9:45	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas	PMGRH - ANA
10:00 - 10:20	1. Proyecto De Desarrollo Territorial Sostenible - VRAEM 2. Avanzar Rural - 5 Departamentos	AGRO RURAL
10:20 - 10:40	1. Catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú, tercera etapa - PTRT3 2. Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y del Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural del Perú	UE GPS
10:40 - 11:00	Mejoramiento de la Disponibilidad, Acceso y Uso de Semillas de Calidad de Papa, Maíz Amiláceo, Leguminosas de Grano y Cereales, en las Regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno 4 Departamentos	INIA
11:00 – 11:15	37 inversiones de optimización de Siembra y cosecha de agua (Qochas)	UE FSA
11:15 – 11:35	1. Sistema de Drenaje Agrícola Iglesia Vieja - San Isidro, Sub-Sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque 2. Defensa Ribereña del Rio Jequetepeque.	PEJEZA
11:35 – 11:50	Mejoramiento e Implementación de la Nueva Sede del Ministerio de Agricultura y Riego en la Ciudad de Lima	OGA MIDAGRI
11:50 – 12:10	1. Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao 2. Irrigación San Antonio de Huarango	PEJSIB
12:10 – 12:25	Proyecto Protección contra Inundaciones Tramo I – Tumbes (Inversión de la Reconstrucción).	PEBPT
