



GOBIERNO REGIONAL PIURA




PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Chulucanas, 20 FEB 2019

MEMORÁNDUM N° 051 -2019/GRP-407000-407200

- A : ECON. ARNALDO MARIO OTINIANO ROMERO
Gerente de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- DE : ING. GILMAR AUGUSTO LIZANA PUELLES
Gerente General del PEIHAP
- ASUNTO : Alcanza Informe de Evaluación de Implementación del POI Año 2018
- REFERENCIA : MEMORÁNDUM MPULTIPLE N° 026-2019/GRP-410000

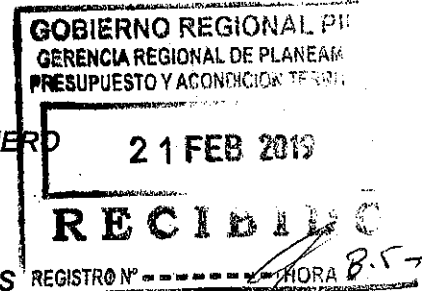

Me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y la vez alcanzar el Informe de Evaluación de Implementación del POI Año 2018 del IV Trimestre, de acuerdo al formato establecido.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura

[Signature]
Gilmar Augusto Lizana Puelles
GERENTE GENERAL

16 folios

c.c
407400
ECCC/rcv



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2018 DEL TRIMESTRE IV

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO PIURA
 UNIDAD EJECUTORA : PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E
 HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA
 FECHA : 20 DE FEBRERO DE 2019

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe plasma la evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 005 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura del Año Fiscal 2018, donde el objetivo principal es la ejecución del Proyecto "Mejoramiento y Generación Hidroenergético del Alto Piura", el cual es uno de los megaproyectos más importantes del país y de la región Piura que considera la ejecución de las obras de ingeniería de la infraestructura agrícola hidráulica principal, aprovechando los recursos hídricos existentes para la generación de energía eléctrica y la ampliación de la frontera agrícola que permita la explotación racional de los recursos hídricos e incrementando la oferta de energía eléctrica, mejoramiento de la infraestructura hidráulica en el valle tradicional y la producción y productividad agrícola sirviendo además como mecanismo regulador de grandes avenidas de agua en épocas excepcionales, regulando los flujos en la cuenca del Río Piura hacia los valles del Medio y bajo Piura. Asimismo, de la ejecución de obras complementarias menores de carácter multisectorial para la sostenibilidad social y ambiental del proyecto.¹

Los proyectos de inversión a cargo de nuestra unidad ejecutora responden a la Acción Estratégica AET.09.02: Infraestructura Económica Productiva de Servicios Adecuada para los Agentes Económicos, contribuyendo al Objetivo Estratégico OEI.09: Mejorar la Competitividad de los Agentes Económicos a través de la ejecución principalmente del el Proyecto.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

• Modificación:

- ✓ En el mes de enero el Pliego mediante RER N° 062-2018-GR aprueba el Saldo de Balance 2017 por el importe de S/ 66 776 287 por toda fuente de financiamiento.
- ✓ Mediante RER N° 073-2018-GR el Pliego aprueba la modificación Presupuestaria Tipo 004 de la Unidad Ejecutora Sede Central a favor del PEIHAP, por el importe de S/ 39

¹ Informe de gestión Año 2017



368 647 que corresponde al Saldo de Balance 2017 incorporado en la Sede, los indicados recursos corresponden al presupuesto del PEIHAP a amparo de la Ley 30458.

Al respecto, se procedió a registrar las siguientes actividades:

1. 18AO1111200090 Construcción de Presa
Unidad de medida : Obra
Meta Física : 01
2. 18AO111118940 : Supervisión y Control
Unidad de medida : Supervisión
Meta Física : 12

➤ **Objetivo del proyecto**

"AUMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA", en el valle del Alto Piura, para lo cual hay que realizar un conjunto de actividades cuyo fin es incrementar el abastecimiento del recurso hídrico.

➤ **Costo de Inversión**

El presupuesto total de la inversión asciende a 2 227 746 000 según perfil aprobado.

➤ **Beneficiarios**

334,642 (N° de personas)

➤ **Área de influencia**

Canchaque, Chulucanas, Buenos Aires, La Matanza, Salitral, San Juan de Bigote.

El componente I está conformado por los siguientes subcomponentes:

- Obras Preliminares y/o Provisionales
- Saldo de Obra Caminos de Acceso
- Presa Tronera Sur
- Túnel de trasvase y Portales de entrada y salida
- Plan de Gestión Ambiental
- Plan y Manual de Gestión de Calidad
- Programa de mantenimiento línea de Subtransmisión 22,9 Kv y subestaciones de transformación

- ✓ Mediante Decreto Supremo N° 142-2018-EF del 27 de junio de 2018 el Gobierno Central autoriza la transferencia de S/ 12 644 168,00 por la fuente de financiamiento de Recursos Determinados, para financiar el proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa – Cashapite".

Se procedió a registrar las siguientes actividades:

1. 18AO111158171 Mejoramiento de Línea de Conducción de Sistemas de Riego
Unidad de medida : Metro
Meta Física : 60,130
2. 18AO111158173 : Supervisión y Liquidación de Obras
Unidad de medida : Supervisión
Meta Física : 10



➤ **Objetivo del proyecto**

Incrementar la productividad de 1,305 hectáreas de cultivos permanentes como: café, caña de azúcar, frutales, pastos y estacionales como maíz y frejol, que permitirá mejorar el nivel de vida de los agricultores de los caseríos de Tunas, Tolingas, Trigopampa, Ramón Castilla, Zururan, Tablurán, Camarurán, Chalpa, San José de Tuna, La Piedra y La Playa.

➤ **Costo de Inversión**

El presupuesto total de la inversión asciende a S/ 12 644 168, según contrato suscrito.

➤ **Beneficiarios**

1,003 (N° de personas)

➤ **Área de Influencia**

Provincia Huarmaca, Distrito Huarmaca- Localidades (Tunas, Tolingas, Trigopampa, Ramon Castilla, Zururan, Tabluran, Camaruran, Chalpa, San José de Tunas. La Playa, La Piedra).

- ✓ Mediante RER N° 276-2018-GR el Pliego la modificación Presupuestaria Tipo 003 para financiar la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: Creación de represa Cascapampa para servicio de agua para riego en el Distrito de Sondorillo-Huancabamba-Piura.

Se registró la siguiente actividad:

1. 18AO11119305 : Elaboración de Expediente Técnico
Unidad de medida : Expediente
Meta Física : 01

- ✓ Mediante DS N° 238-2018-EF la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios Presidencia del Consejo de Ministros transfirió a esta Unidad Ejecutora la suma de S/ 4 330 258 por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios para financiar la Elaboración y Supervisión del Plan Integral para el Control de inundaciones y movimientos de masas y Plan Maestro de Drenaje Pluvial en los distritos Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. Asimismo, para el Monitoreo, Estudios y Evaluación de los Proyectos.

Se procedió a registrar tres actividades al POI 2018, tales como:

1. 18AO111157250 : Elaboración de Planes
Unidad de medida : Plan
Meta Física : 02
2. 18AO111158126 : Supervisión y Liquidación de Obras
Unidad de medida : Supervisión
Meta Física : 17
3. 18AO111158157 : Monitoreo, Estudios y Evaluación de Proyectos de Inversión.
Unidad de medida : Informe
Meta Física : 02



• **Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas:**

Proyecto: Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura

1. 18AO1111200090 Construcción de Presa

Al 2018 se ha logrado perforar 2 152.43 metros de túnel de los cuales 1 324.30 metros corresponden al frente de oriente (Portal de entrada) y 828.13 metros al frente occidente (Portal de salida).

De acuerdo a la geología actual en el túnel se encontró una roca muy variable, del tipo 5a y 5b, que impidió avanzar rápido; en noviembre del año 2016 se paralizaron los trabajos a causa de la falta de energía, la línea de transmisión del PEIHAP es antigua y era necesario adaptarse a las normas de seguridad modernas para estar habilitada, por tanto, se requería de un mayor metrado que permitirá contar con un buen sistema de transmisión.

Para lo cual se aprobó el adicional de obra por la suma de S/ 1 390 217 con lo cual se garantizó que la línea de transmisión quede operativa y pueda proveer de energía a la maquinaria que se usará en los trabajos del primer componente.

La ejecución física acumulada al mes de agosto de 2018 es del 19.35%, la obra se encuentra paralizada, dado que mediante RGG N° 63-2018/GRP-PEIHAP de fecha 23.10.18 se resolvió de pleno derecho el contrato con el Consorcio Obrainsa - Astaldi (COA) para la ejecución del componente I del PEIHAP, por la causal de paralización de trabajos por parte del contratista sin justificación alguna.

Se concluyó con la Ingeniería para la construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino.

2. 18AO111118940 : Supervisión y Control

El Consorcio Supervisión Alto Piura efectuó la supervisión de la obra en el marco del contrato suscrito, se ha efectuado el pago de valorizaciones al mes de agosto 2018, la valorización del mes de setiembre está en estado aprobada.

Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa – Cashapite".

1. 18AO111158171 Mejoramiento de Línea de Conducción de Sistemas de Riego

El 05.12.18 se adjudicó la ejecución de la obra al Consorcio Huarmaca.

2. 18AO111158173 : Supervisión y Liquidación de Obras

Se adjudicó la supervisión de la obra al Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol.



Proyecto: Creación de represa Cascapampa para servicio de agua para riego en el Distrito de Sondorillo-Huancabamba-Piura.

1. 18AO111119305 : Elaboración de Expediente Técnico

Proceso de adjudicación de Consultoría de Obra para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Creación de represa Cascapampa para servicio de agua para riego en el Distrito de Sondorillo-Huancabamba-Piura". En el año 2018 se convocó el procedimiento de selección para la elaboración del expediente técnico, sin embargo, quedó desierto en segunda convocatoria por incumplimiento de los requisitos de calificación, los postores que presentaron su oferta no cumplieron con acreditar lo establecido en bases integradas. El Gobierno Regional Piura solicitó la transferencia del presupuesto a la Sede Central.

Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masas y Plan Maestro de Drenaje Pluvial del área de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre

1. 18AO111157250 : Elaboración de Planes

En lo referente al Plan Maestro del Drenaje Pluvial de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, la finalidad es desarrollar estudios de pre inversión para proyectos de inversión que reduzcan o mitiguen el riesgo.

Mediante DS N° 238-2018-EF la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios Presidencia del Consejo de Ministros transfirió a esta Unidad Ejecutora la suma de S/ 4 330 258 por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios para financiar la Elaboración y Supervisión del Plan Integral para el Control de inundaciones y movimientos de masas y Plan Maestro de Drenaje Pluvial en los distritos Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. Asimismo, para el Monitoreo, Estudios y Evaluación de los Proyectos.

En la fecha 13 de diciembre 2018 se firma el CONTRATO N° 001-2018-GR-PEIHAP entre el PEIHAP y el CONSORCIO INUNDACIONES PIURA para servicio de consultoría en general para la Elaboración del Plan Integral para el control de Inundaciones y movimiento de masas y Plan Maestro de drenaje pluvial del área de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre por el monto de S/ 17 551,898.83.

2. 18AO111158126 : Supervisión y Liquidación de Obras

Al cierre del año no se convocó el procedimiento de selección de la supervisión del Plan Integral.

3. 18AO111158157 : Monitoreo, Estudios y Evaluación de Proyectos de Inversión.

Gastos de monitoreo del Plan, en diciembre de 2018 solo se efectuaron gastos de adquisición de útiles de oficina, servicios para apoyar en el procedimiento de selección para la Elaboración del Plan.



Gestión de Proyectos

➤ Saneamiento Físico Legal de Terrenos adquiridos para las Obras del Componente I del PEIHAP

- ✓ Independización e inscripción en Registros Públicos Piura a favor del PEIHAP de 51 lotes de terrenos adquiridos para las obras del Componente I.
- ✓ Se ingresó en Registros Públicos de Piura 17 expedientes para la respectiva independización, los cuales se encuentran en evaluación por parte de la registradora.
- ✓ Se encuentra en Proceso de subsanación (Escrituras Públicas, minutas, fallecidos) de 11 expedientes a fin de lograr la titularidad de los terrenos adquiridos por el PEIHAP para las obras del Componente I.

➤ Promoción del Desarrollo Agropecuario y Forestal

- ✓ Formación de promotores pecuarios en el distrito de Sondorillo
 - Se ha capacitado en sanidad pecuaria a 37 productores líderes del Distrito de Sondorillo, mediante la metodología Escuela de Campo, los temas impartidos son: "Enfermedades parasitarias internas y externas que afectan al ganado lechero", "Enfermedades infecciosas - Papilomitososis en vacunos o verruga bovina y recordatorio de nutrición en vacas lecheras" y "Condición corporal en la vaca lechera", "Mastitis en vacas lecheras", "Uso controlado de productos veterinarios en el control y tratamiento de enfermedades en ganado de uso doméstico"; estas actividades se realizaron en coordinación con la Municipalidad de Sondorillo.
- ✓ Promoción de la Asociatividad
 - Se ha promovido la Asociación de Promotores Agropecuarios del distrito de Sondorillo, con quienes se ha puesto en marcha el "Botiquín Veterinario" que viene siendo administrado por un promotor pecuario formado en los talleres de capacitación, implica atender y expedir la medicina veterinaria a los campesinos que requieran el servicio veterinario para su ganado. Son 37 promotores los que integran esta Asociación.
 - Con la Asociación de Promotores Agropecuarios del Distrito de Sondorillo, también se viene impulsando la participación de los productores de este distrito, en la comercialización de papa, arveja verde, carne de cerdo, quesos, entre otros productos.
 - La comercialización la realizan dos promotores pecuarios, dos días a la semana en el "Mercado Campesino" de Piura en donde se ha logrado obtener dos puestos para la venta de los productos antes señalados.

- ✓ Producción de semilla de arveja en el Distrito de Sondorillo

En el Caserío de Lanche distrito de Sondorillo, se ha instalado con tres productores, $\frac{3}{4}$ de ha de arveja para semilla, a quienes se viene capacitando en la producción de semillas de arveja.



- ✓ Realización de Talleres de Capacitación en "Banano Orgánico y Control de la Mancha Roja", "Problema de Cadmino en la producción y exportación del cacao", "Vulnerabilidad Agrícola de la provincia de Morropón y sus Distritos".
- ✓ Reforestación en cabecera de cuenca de la provincia de Huancabamba

En el Caserío Cascapampa, distrito de Sondorillo se reforestó tres hectáreas de especies nativas (aliso) y dos hectáreas con pino pátula. Este trabajo se ha ejecutado en coordinación con los campesinos de este distrito, con Agrorural – Huancabamba y Municipalidad Distrital de Sondorillo, y la ONG Progreso".

➤ RELACIONES COMUNITARIAS


- ✓ Diálogo permanente con la población del ámbito del PEIHAP, para conocer sus necesidades, las mismas que han sido canalizadas a través del Gobierno Regional Piura, Subregión Morropón Huancabamba, Agrorural y la Gerencia de Estudios y Proyectos del PEIHAP.
- ✓ Difusión de avances y beneficios del PEIHAP, a través de charlas ejecutadas por el PEIHAP en diferentes lugares del ámbito del PEIHAP.

➤ ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Gastos destinados a la gestión operativa del PEIHAP, orientados al cumplimiento de las diversas actividades desarrolladas por las Gerencias que conforma la entidad. Se consignan las remuneraciones, dietas, mobiliario, equipos informáticos, seguros, entre otros bienes y servicios.

• Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

Problemas presentados (Señalar los problemas encontrados o situaciones imprevistas)	Causas que lo originan (Señalar las causas que lo originan)	Medidas Correctivas (Indicar las medidas correctivas sugeridas y las implementadas para superar el problema presentado)
Incumplimiento del Contratista en presentar calendario acelerado	Interposición (solicitudes) arbitrarias del contratista por denegación de ampliaciones de plazo	Se implementó el uso de la Programación Detallada Anual (PDA)
Paralización de los trabajos en obra por parte del Contratista	Problemas económica del Contratista para afrontar pago a proveedores y trabajadores	Resolución de contrato, luego de intentar una intervención económica
Medida cautelar emitida por Juzgado para ejecutar las cartas fianzas	Apercibimiento de la entidad al Contratista para intervenir la Obra	Control de vencimiento de Fianzas/Evaluación Legal para interponer acciones que correspondan
Retraso en el proceso de constatación física e inventario de obra	Negativa del Contratista para presentarse en obra y retirar malla soldada en los portales	Interponer acciones legales para ingresar al túnel con fiscal y notario
Ausencia de personal de la Supervisión en Obra	Decisión de la empresa supervisora de no enviar el personal según la propuesta	Aplicación de varias penalidades
Reclamos de la población por expectativas de trabajo	Discrepancia con el contratista, por la forma de contratar la mano de obra local	Realizar proyectos y construir infraestructura para disminuir presión social.



Problemas presentados (Señalar los problemas encontrados o situaciones imprevistas)	Causas que lo originan (Señalar las causas que la originan)	Medidas Correctivas (Indicar las medidas correctivas sugeridas y las implementadas para solucionar el problema presentado)
Observación de ENOSA a la Línea de Trasmisión 22.9 kv	La línea fue construida tipo Rural y ahora se requiera tipo industrial, cumpliendo las normas actuales	Mantenimiento definitivo de la Línea (Contratar una empresa con experiencia en la materia)
Reclamos de la población por los trabajos en el área de influencia de la línea de transmisión 22.9 kv	No se cuenta con el saneamiento de la faja de servidumbre de la línea de transmisión 22.9 kv	Elaborar un expediente de saneamiento de terrenos antes de iniciar nuevamente la obra
La Gerencia de Estudios y Proyectos carece de personal para elaborar estudios de pre-inversión	La Gerencia de Estudios y Proyectos no cuenta con especialistas para elaborar estudios de pre inversión a nivel de Perfil	La Gerencia de Estudios y Proyectos solicitó la Contratación de especialistas, habiendo superado el problema
La restricción presupuestaria ha sido un problema que no ha permitido avanzar en la elaboración de los estudios de pre inversión.	Escasa transferencia de recursos financieros por parte del MEF debido a disposiciones gubernamentales.	Se ha contratado a personal mínimo para continuar con el avance de los estudios de pre inversión.
Tacha de 25 expedientes de independización e inscripción presentados a Registros Públicos Piura.	Aplicación e interpretación de la normativa vigente de manera errada por registradora.	Reingreso de 09 expedientes de independización e inscripción a Registros Públicos Piura. Previamente se coordinó con el Jefe Zonal de la Oficina Registral Piura, quien al tomar conocimiento de lo sucedido sugirió el reingreso de los expedientes. A la fecha se ha logrado la inscripción definitiva de independización de los 9 predios.
Se desconoce condición jurídica actual, de algunos terrenos (matrices) de los cuales el PEIHAP ha adquirido secciones para los fines de construcción de obras del Componente I.	Las búsquedas catastrales realizadas al momento de la compra (2009 – 2012), arrojaron resultados que en dichas áreas no había propiedades inscritas, sin embargo, los RRPP actualizan constantemente su base catastral, por lo cual esos resultados pueden variar en el tiempo. De otro lado, dichos terrenos se encuentran ubicados en "Zonas No Catastradas", lo cual implica que no han sido inventariados por la entidad generadora de catastro.	Se solicitará a los Registros Públicos una nueva Búsqueda Catastral para determinar el antecedente registral, y descartar superposiciones graficas con terceros.
Malestar de pobladores del caserío Tunas, socios del canal Cashapite	Retraso de la Contratista en la presentación del adicional correspondiente para la tubería del canal Cashapite	Reiterar la solicitud de ejecución de los trabajos del canal Cashapite a la Supervisión para que instruya al contratista en la pronta entrega.
Bloqueo de carretera Pampas – Portal de Entrada al tunel y detención de trabajadores del PEIHAP en el Portal de Entradade ex trabajadores de la Contratista Obrainsa Astaldi	Protesta de ex trabajadores y de proveedores de la Contratista Obrainsa Astaldi por falta de pago.	Reunión con ex trabajadores y proveedores de la contratista para conocer sus reclamos y coordinar reunión entre reclamantes y Contratista para solucionar problema. Compromiso de pago de la contratista.
Malestar de los propietarios/poseionarios de terrenos afectados por las obras del I Componente ante el atraso del Contratista en el pago de compensación de daños y compra de terrenos.	La Contratista no activa la partida PACRI (Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario)	Se coordinó con la Supervisión para que instruya a la Contratista y agilice los trámites correspondientes y se realice el pago en el menor tiempo posible



• **Medidas para la mejora continua:**

1. *Identificar lecciones aprendidas de la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 y compartir el conocimiento explícito con todos los trabajadores de la gerencia respectiva.*
2. *Mejorar la elaboración del POI 2019 identificando actividades e indicadores relevantes de la gerencia a su cargo.*
3. *Establecer hitos importantes para cada actividad consignada en el POI y efectuar monitoreo para su cumplimiento.*

3. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:

4. *La ejecución del Plan Operativo 2018 se ha cumplido en promedio el 50% de sus actividades programadas.*
5. *La paralización por parte del Contratista de la obra del Proyecto Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura y la resolución del contrato, afectó directamente al cumplimiento del POI.*
6. *Procedimientos de selección para ejecución de obra del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa – Cashapite" y para la elaboración del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masas y Plan Maestro de Drenaje Pluvial del área de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre se culminaron en el mes de diciembre, por lo tanto, no se dio inicio a su ejecución en la fecha prevista.*

Recomendaciones:

1. *Implementar medidas correctivas y de mejora continua plasmadas en el presente Informe.*
2. *Programar actividades y metas realistas posibles de alcanzar con los recursos disponibles en cada gerencia.*
3. *Las actividades que se deben consignar en el POI deben responder a los objetivos y prioridades de la Entidad.*
4. *Asegurar que las actividades que se consignan en el POI estén alineadas a los objetivos del Plan estratégico Institucional (PEI).*
5. *Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades programadas en el POI 2019.*
6. *Mantener informada a la Alta Gerencia de los problemas suscitados que limiten la ejecución de las actividades programadas.*



4. Anexo



0 6,106,828 3,191,595 7,973,656 2,391,124 4,882,456 1,173,601,233 0 0 0 0 29,461,298

CONSTRUCCION DE PRESA
 Pp: 0042, Prod/Prov: 2040186, Fun: 10, Div/Fun: 025, Grp/Fun: 0050
 Act/Obr: 4000097 - CONSTRUCCION DE PRESA

FFS/./: [3 : 0]

102,031,461
 29,461,298
 FFS/./: [3 : 102,031,461]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 2026880926

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF. %	EJEC. AVANCE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC. AVANCE							
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																						
1	18A011120163 - GESTION Y ADMINISTRACION	INFORME	23	1	3	3	3	3	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	0	23	95.65	0	257,313	351,279	471,660	358,080	606,327	387,464	595,370	588,269	355,166	476,054	582,265	1,177,348	6,117,041	100.12

Pp: 9602, Prod/Prov: 2000270, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008
 Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION

FFS/./: [1 : 0]

6,109,800
 6,117,041
 FFS/./: [1 : 6,000,000] [2 : 109,800]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 2026898134

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF. %	EJEC. AVANCE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC. AVANCE								
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																							
1	18A011192730 - ELABORACION DE PLANES	PLAN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,510,380	3,510,380	66.00

Pp: 0066, Prod/Prov: 2089754, Fun: 10, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035
 Act/Obr: 6000033 - ELABORACION DE PLANES

FFS/./: [1 : 0]

3,510,380
 2,316,850
 FFS/./: [1 : 3,510,380]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 2026898487

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF. %	EJEC. AVANCE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC. AVANCE								
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																							
1	18A011158126 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUPERVISION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,126	372,126	0.00

Pp: 0066, Prod/Prov: 2089754, Fun: 10, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035
 Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 2026898500

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO	ESTRATEGICA	ACCION	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. %
ESTRATEGICO	OPERATIVA	OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC. AVANCE

OEL.07 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO DE LA POBLACION Y TERRITORIO.

AEI.07.03 PLANES PARA LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE PURA

18A0711158173 - MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 10, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035																	
Act/Obr: 5000980 - MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION																	
FFS(/): [1 : 0]																	
447,752																	
0																	
FFS(/): [1 : 447,752]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 2026898504

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO	ESTRATEGICA	ACCION	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. %
ESTRATEGICO	OPERATIVA	OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC. AVANCE

OEL.02 PROMOVER EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PURA.

AEI.02.02 SERVICIO DE COBERTURA DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA HOGARES EN EL AMBITO RURAL.

18A0211158171 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	METRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2195104, Fun: 10, Div/Fun: 025, Grp/Fun: 0050																	
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO																	
FFS(/): [1 : 5 : 0]																	
2,447,535																	
0																	
FFS(/): [5 : 2,447,535]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 2026898505

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO	ESTRATEGICA	ACCION	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. %
ESTRATEGICO	OPERATIVA	OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC. AVANCE



OEL.05 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS.

AEI.05.01 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS ADECUADA PARA LOS AGENTES ECONOMICOS.

18A0511158173 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2195104, Fun: 10, Div/Fun: 025, Grp/Fun: 0050																	
Act/Obr: 6000302 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																	
FFS(/): [5 : 0]																	
311,709																	
0																	
FFS(/): [5 : 311,709]																	



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO METAS PRESUPUESTALES - DICIEMBRE 2018

META PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIV /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			COMENTARIOS/OBSERVACIONES
				CANT. PROG.	CANT. ELEC.	%	
0007 Construcción de Sistema de Riego	2040186	4000097	Obra	14.9	6.3	42.3	Se paralizó la obra en el día 09.08.18, inmerso en proceso de intervención económica. Avance acumulado al mes de enero al mes de diciembre 6,28% (Acumulado 2016 al mes de diciembre 2018 es de 19,35%)
0008 Supervisión y Control		6000002	Supervisión	12.0	9.0	75.0	
00009 Expedientes Técnicos	2343941	6000001	Expediente	1.0	0.0	0.0	Proceso de adjudicación de Consultoría de Obra para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Creación de represa Cascapampa para servicio de agua para riego en el Distrito de Sondorillo-Huancabamba-Piura". En el año 2018 se convocó el procedimiento de selección para la elaboración del expediente técnico, sin embargo, quedó desierto en segunda convocatoria por incumplimiento de los requisitos de calificación, los postores que presentaron su oferta no cumplen con acreditar los establecido en bases integradas. El Gobierno Regional Piura solicitó la transferencia del presupuesto a la Seda Central.
0011 Mejoramiento de Canales de Riego	2195104	4000120	Obra	1.0	0.0	0.0	El 05.12.18 se adjudicó la ejecución de la obra al Consorcio Huarmaca.
0012 Supervisión y Control			Supervisión	10.0	0.0	0.0	
0001 Acciones Administrativas			Informe	12.0	12.0	100.0	Meta presupuestal que consigan los gastos destinados a la gestión operativa del PEIHAP, orientados al cumplimiento de las diversas actividades desarrolladas por las Gerencias que conforma la entidad. Se consignan las remuneraciones, dietas, mobiliario, equipos informáticos, seguros, entre otros bienes y servicios.
0002 Elaboración de Estudios			Estudio	3.0	1.0	33.3	*"Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. 14534 "José Antonio Encinas" - Las Pampas, en el Distrito de Sondorillo". Avance: 100 %. *"Creación del camino vecinal Cashapite Taburan, en el Distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba - Piura". Avance: 40 %. *"Mejoramiento del Sistema de Riego de los Sub Sectores Santa Ana y San Antonio, Distrito de San Miguel del Faique". Avance: 40 %.
0003 Inspección y Supervisión		2000270	Inspección	12.0	12.0	100.0	Acciones referidas a Inspección de obras y administración de contratos. * Independización e inscripción en Registros Públicos Piura a favor del PEIHAP de 51 lotes de terrenos adquiridos para las obras del Componente I. * Se ingresó en Registros Públicos de Piura 17 expedientes para la respectiva independización, los cuales se encuentran en evaluación por parte de la registradora. * Se encuentra en Proceso de subsanación (Escrituras Publicas, minutas, fallcidos) de 11 expedientes a fin de lograr la titularidad de los terrenos adquiridos por el PEIHAP para las obras del Componente I.
0004 Sanamiento Físico Legal		6000016	Ha	14.9	6.8	45.6	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO METAS PRESUPUESTALES - DICIEMBRE 2018

META PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIV /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			COMENTARIOS/OBSERVACIONES
				CANT. PROG.	CANT. EJE.	%	
0005 Promoción del Desarrollo Agrícola			Acción	23.0	20.0	87.0	* Formación de promotores pecuarios en el distrito de Sondorillo. (Se ha capacitado en sanidad pecuaria a 37 productores líderes del Distrito de Sondorillo.) * Promoción de la Asociatividad (37 promotores integran Asociación de Promotores Agropecuarios del Distrito de Sondorillo) * Producción de semilla de arveja en el Distrito de Sondorillo. * Realización de Talleres de Capacitación en "Barano Orgánico y Control de la Mancha Roja", "Problema de Cadrino en la producción y exportación del cacao", "Vulnerabilidad Agrícola de la provincia de Moropon y sus Distritos" * Reforestación en cabecera de cuenca de la provincia de Huancabamba
0006 Elaboración de Estudios de Preinversión	2001621	6000032	Estudio	1.0	0.0	0.0	Presupuesto se transfirió a la meta 00009 Expedientes Técnicos, para el Expediente Técnico del Proyecto: Creación de represa Cascapampa para servicio de agua para riego en el Distrito de Sondorillo-Huancabamba-Piura.
0010 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales	39999999	5002174	Acción	1.0	1.0	100.0	Pago de sentencia judicial según Expediente N° 00002-2012-02-0010-JP-CI-01, Juez de Paz Letrado-Huamaca en la transferencia presupuestal por D.S N° 126-2018-EF por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada a favor del demandante RODOLFO CHINCHAY HUANCAS.
0014 Supervisión y Control (Plan Integral)		6000002	Supervisión	0.0	0.0		Al cierre del año no se convocó el procedimiento de selección de la supervisión del Plan Integral.
0013 Elaboración de Estudios (Plan Integral)	2089754	6000033	Plan	0.0	0.0		El 13 de diciembre 2018 se firma el CONTRATO N° 001-2018-GR-PE/HAP entre el PE/HAP y el CONSORCIO INUNDACIONES PIURA para servicio de consultoría en general para la Elaboración del Plan Integral para el control de inundaciones y movimiento de masas y Plan Maestro de drenaje pluvial del área de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre por el monto de S/ 17' 551,898.83.
0015 Inspección y Supervisión	39999999	5002174	Informe	2.0	0.0	0.0	Gastos de monitoreo del Plan, en diciembre de 2018 solo se efectuaron gastos de adquisición de útiles de oficina, servicios para apoyar en el procedimiento de selección para la Elaboración del Plan.

