



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

AUDIENCIA REGIONAL 2018:

**LOGROS, DIFICULTADES Y PERSPECTIVAS
DE LA GESTIÓN DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES**



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

**DIRECCION
REGIONAL DE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES**

OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

EQUIPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

UNIDAD FORMULADORA
- FICHAS
- ESTUDIOS DE PRE INVERSION

AREA DE CAMINOS
- PROYECTOS
- EXPEDIENTES TECNICOS
- MANTENIMIENTOS

AREA DE COMUNICACIONES
- MANTENIMIENTO DE ANTENAS

AREA DE TRANSPORTE
- PERMISO
- BREVETES

AREA DE FISCALIZACION
- INSPECCIONES

AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2018:

- I. Logros y avances**
- II. Dificultades y limitaciones**
- III. Perspectivas**


I. LOGROS Y AVANCES

PROYECTOS 2015 - 2018				
RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSION				
AÑO	N° OBRAS	MONTO ASIGNADO	EJECUTADO	SITUACION ACTUAL
2015 -2016	0			LA GRI SE ENCARGABA DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
2017	4	S/ 10'473,029.64	S/ 10'693,265.78	SE EJECUTO EL 100% DEL MONTO ASIGNADO
2018	11	S/34,741,257.93	S/11,693,930.38	SE VIENE EJECUTANDO UN 35.40% DEL MONTO ASIGNADO
MONTO TOTAL		S/45'214,287.57	S/25'428,547.59	

* El 2017 se crea la Unidad ejecutora de inversiones a la DRTC

LOGROS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROVINCIA	CULMINADOS	EN EJECUCION
BARRANCA	3'012,242.37	
CAJATAMBO	5'385,398.42	1'483,633.02
CAÑETE	2'525,919.95	
CANTA	7'921,101.97	10'152,743.78
HUARAL	1'286,7294	1'500,000.00
HUAROCHIRI	5'860,645.79	
HUAURA	8'136,071.13	
OYON	1'341,578.82	
YAUYOS	7'382,299.73	
TOTAL	54'432,552.18	13'136,376.80

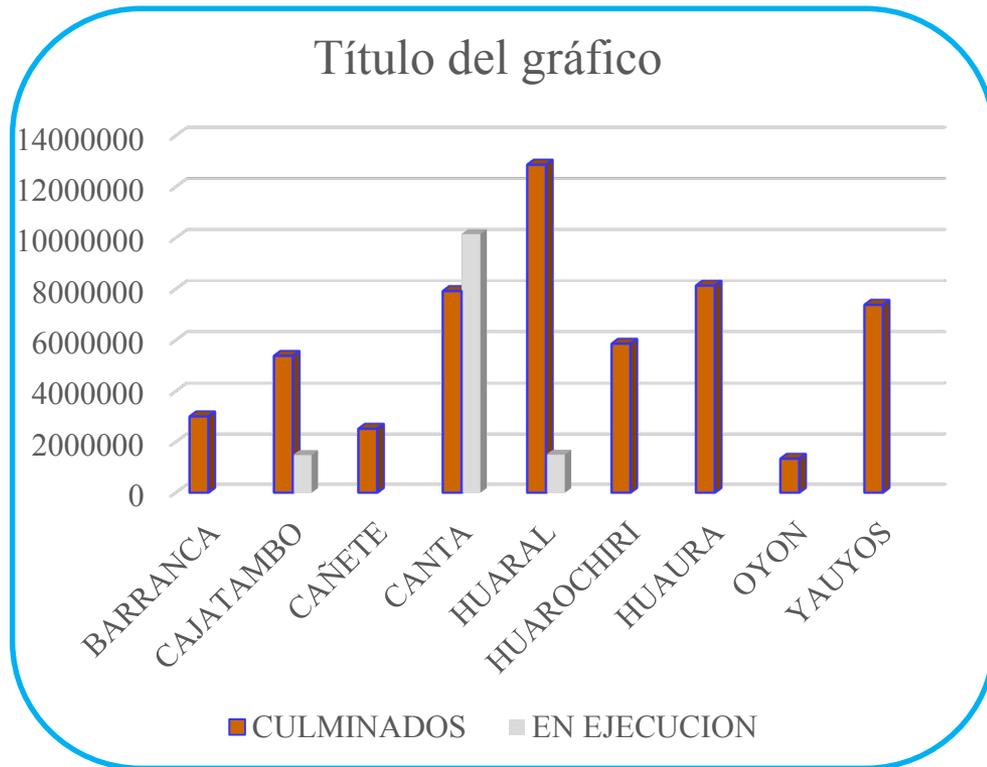

LOGROS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, cuenta con 23 proyectos, cuya distribución se aprecia a continuación:

- CULMINADAS: 05 Mantenimientos, costo de ejecución S/ 1'478,000.00 soles
06 Obras, costo de ejecución S/ 12'292,170.79 soles
- EJECUCION : 08 Obras, costo S/ 11'636,378.80 soles
- EN CONVOCATORIA : 01 Obra por iniciar, costo S/ 3'810,262.00 soles
- EXPEDIENTES TECNICOS : 03 Expedientes culminados



LISTADO DE PROYECTOS 2017

PROVINCIA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SITUACION ACTUAL
CANTA	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PARAISO EN LA LOCALIDAD DE HUARABI, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES - CANTA - LIMA	1'269,993.33	1'269,993.33	SE ENCUENTRA CULMINADO EN ETAPA DE LIQUIDACION
	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE QUIPAN - PURUCHUCO - APAN DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA - LIMA - ETAPA I - META 01	5,685,006.21	5,685,006.21	CULMINADO, EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA
CAJATAMBO	MEJORAMIENTO DEL PUENTE LAYACUTA EN LA COMUNIDAD DE COCHAS Y NAMIAHUAIN, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA	825,742.93	825,742.93	SE ENCUENTRA CULMINADO, CON APROBACION DE LIQUIDACION
BARRANCA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. SANTA ROSA Y CALLE PUNO DE LA URBANIZACION SANTA CATALINA- BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA	325,215.00	325,215.00	SE ENCUENTRA CULMINADO, CON APROBACION DE LIQUIDACION
HUARAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A TRAVES DE LA CARRETERA VECINAL 519, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	3'857,301.64	3'857,301.64	CULMINADO
MONTO TOTAL		S/ 10'473,029.64	S/ 10'693,265.78	

LISTADO DE PROYECTOS 2018

PROVINCIA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUP. ASIGNADO	PRESUP. EJECUTADO	SITUACION ACTUAL
CANTA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA LOCAL CANTA – OBRAJILLO, PROVINCIA DE CANTA - LIMA	5,057,876.54	3,485,241.00	EN EJECUCION, AL 31.12.18 SE TENDRA UN AVANCE FISICO DE 75.5%
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROS - EMPALME CON CARRETERA CANTA LA VIUDA, DISTRITO DE HUAROS - CANTA - LIMA	1,958,329.69	165,559.27	EN EJECUCION, AL 31.12.18 SE TENDRA UN AVANCE FISICO DE 100 %
	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA 26 DE JUNIO EN EL DISTRITO DE CANTA, PROVINCIA DE CANTA-LIMA	2,313,452.91	1,110,920.08	EN EJECUCION, AL 31.12.18 SE TENDRA UN AVANCE FISICO DE 100%
	CONSTRUCCION CARRETERA HUAROS - HUACOS, KM 0+000 AL KM 3+765.23 DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA	3,259,513.00	0.00	EN EJECUCION, AL 31.12.18 SE TENDRA UN AVANCE FISICO DE 20%
	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE QUIPAN - PURUCHUCO - APAN DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA – LIMA ETAPA I – META 2	8,239,369.70	2,325,567.00	EN EJECUCION, AL 31.12.18 SE TENDRA UN AVANCE FISICO DE 80 % DE LA META.
	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE QUIPAN - PURUCHUCO - APAN DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA – LIMA ETAPA II – META 3	4,280,107.08	0.00	SE ESTA EN INICIO DE OBRA (EN DIC SE EJECUTARA POR 30%)
	CREACION DEL PUENTE POSANCA EN LA CARRETERA SANTA ROSA DE QUIVES - ARAHUAY KM. 4+00 QUEBRADA POSANCA, DISTRITO DE ARAHUAY - CANTA - LIMA	3,810,262.00	1,524,105.00	EN INICIO DE EJEUCION PARA EL 15.12.18, POR CONTRATA, SE PAGARA ADELANTOS

LISTADO DE PROYECTOS 2018

PROVINCIA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUP. ASIGNADO	PRESUP. EJECUTADO	SITUACION ACTUAL
HUARAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL AUCALLAMA-PALPA, DISTRITO DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA	2,191,068.00	0.00	INICIO DE EJECUCION, AL 31.12.18 SE TENDRA UNA AVANCE DE 25%
CAJATAMBO	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUA LAS LOMAS	2,032,374.00	1,483,633.02	EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DE 73%, SE CULMINA EL 14.12.18
	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ABONADOS EN LAS LOCALIDADES DE COCHA, NUNUMIA, NAMIAHUAIN, PACA, PUCARUMI, NAMIAHUAIN CHICO, PUENTE RAZACANCHA, YANAOCO, KISHUAR DEL DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO-REGION LIMA: META INFRAESTRUCTURA – MITIGACION AMBIENTAL	1,598,905.01	1,598,905.01	CULMINADO
	MONTO TOTAL	34,741,257.93	11,693,930.38	

● PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION

“MEJORAMIENTO DEL PUENTE LAYACUTA EN LA COMUNIDAD DE COCHAS Y NAMIAHUAIN, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA”



MONTO ASIGNADO DE S/ 894,307.00 Soles

MONTO EJECUTADO DE S/825,742.93 Soles



● PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION

**“CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE QUIPAN - PURUCHUCO - APAN
DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA – LIMA ETAPA I – META 2”**



MONTO ASIGNADO DE S/ 8'239,369.7 Soles

MONTO EJECUTADO A LA FECHA
DE S/2'325,567 Soles



● PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A TRAVES DE LA CARRETERA VECINAL 519, PROVINCIA DE HUARAL – LIMA”

MONTO ASIGNADO DE S/ 3'857,301.64 Soles

MONTO EJECUTADO DE S/3'857,301.64Soles



● PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA LOCAL CANTA – OBRAJILLO, PROVINCIA DE CANTA – LIMA”



MONTO ASIGNADO DE S/ 5'057,876.54 Soles

MONTO EJECUTADO A LA FECHA
S/3'485,241.00 Soles



● PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION

“MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA 26 DE JUNIO EN EL DISTRITO DE CANTA, PROVINCIA DE CANTA-LIMA”



MONTO ASIGNADO DE S/ 2'313,452.91 Soles

**MONTO EJECUTADO A LA FECHA
S/1'110,920.08 Soles**



● PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION

“CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PARAISO EN LA LOCALIDAD DE HUARABI, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES - CANTA – LIMA”



MONTO ASIGNADO DE S/ 1'321,810.00 Soles

MONTO EJECUTADO S/1'269,993.33 Soles




MANTENIMIENTOS 2015 - 2018

MONTO EJECUTADO POR AÑO 2015 - 2018

AÑO	Nº MANTENIMIENTOS	MANTEN. RUTINARIO	MANTEN. PERIODICO	ACTIV. DE EMERGENCIA	MONTO EJECUTADO
2015	31	31	0	0	S/4,931,495.00
2016	18	11	7	0	S/14,133,401.26
2017	41	9	7	25	S/20,388,484.02
2018	5	3	2	0	S/1,478,000.00
TOTAL					S/40'931,380.28

RESUMEN DE MANTENIMIENTOS POR AÑO Y CANTIDAD

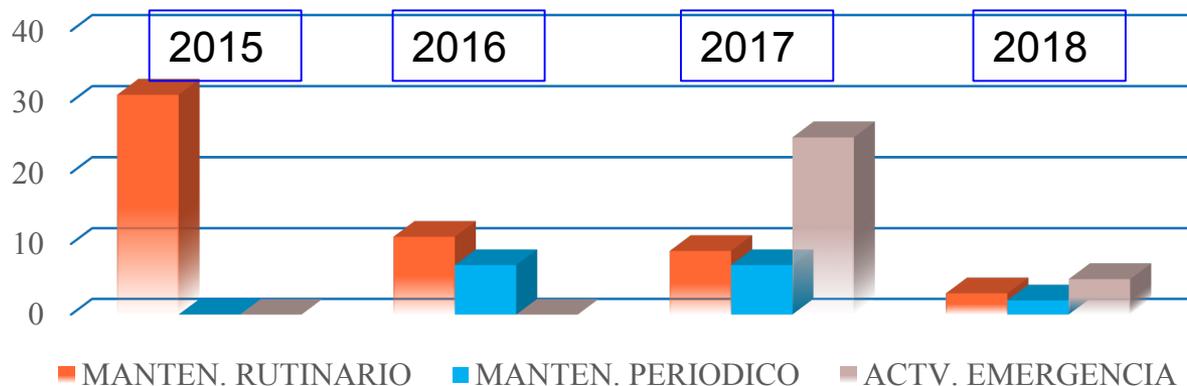

* DURANTE EL PERIODO 2015 - 2018 SE LLEGO A EJECUTAR UN MONTO DE S/ 40'931,380.00 SOLES EN OBRAS POR MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES


RESUMEN DE MANTENIMIENTOS POR PROVINCIA

2015 - 2018

PROVINCIA	MANT. RUTINARIO	MANT. PERIODICO	ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	TOTAL
YAUYOS	19	1	3	23
HUARAL	10	2	4	16
BARRANCA	1	1	2	4
HUAURA	7	5	4	16
CAJATAMBO	4	2	2	8
CANTA	2	2	2	6
HUAROCHIRI	8	2	3	13
OYON	0	0	4	4
CAÑETE	3	1	1	5
TOTAL	54	16	25	95

MANTENIMIENTO POR PROVINCIA 2015 - 2018

* SE EJECUTARON UN TOTAL DE 95 OBRAS POR MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES, DURANTE EL PERIODO 2015 - 2018 EN LAS 9 PROVINCIA DE LA REGION.

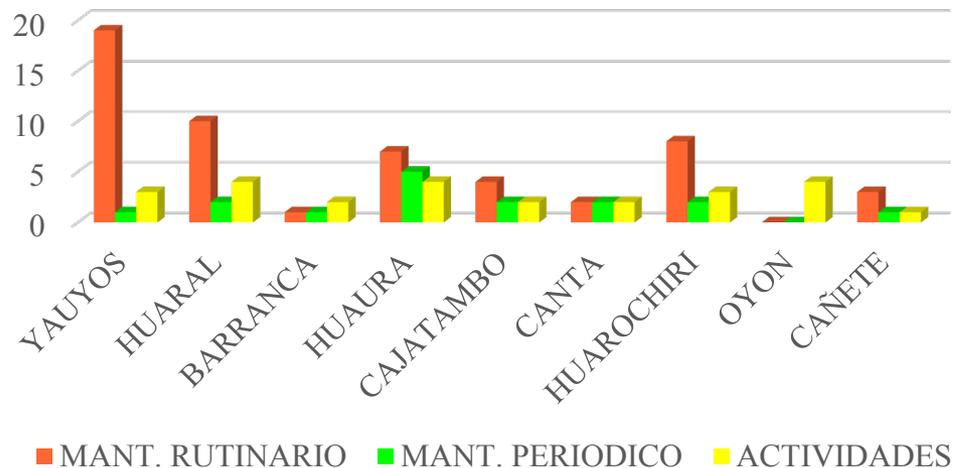

● PRINCIPALES MANTENIMIENTOS

” MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LM-116, TRAMO: KM: 0+000 (EMP. PE-22 DV. STA EULALIA) - KM 28+970 (EMP. LM 116-ATISCHA) DISTRITOS SANTA EULALIA HUACHUPAMPA, SAN PEDRO DE CASTA, CALLAHUANCA, SAN JUAN DE IRIS, LAROS, HUANZA, CARAMPOMA, CHICLA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - REGION LIMA”



META ALCANZADA DE 28.97 KM

MONTO EJECUTADO DE S/1'060,308.61 Soles



● PRINCIPALES MANTENIMIENTOS

**“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LM-124, KM 7+300
(DISTRITO DE COAYLLO) AL KM 55+300, REGION LIMA”**



META ALCANZADA DE 29.65 KM

MONTO EJECUTADO S/ 1'661,798.37 Soles



- **PRINCIPALES MANTENIMIENTOS**

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LM-110 TRAMO KM 0+000 (EMP. PE-20 A – DIV. HUAMANTANGA – CP NUEVO SAN JOSE”



META ALCANZADA DE 26.77 KM

MONTO EJECUTADO S/ 985,805.74 Soles



- **PRINCIPALES MANTENIMIENTOS**

“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LM -117, TRAMO: KM. 65+000 (DISTRITO DE ANTIOQUIA) – KM. 111+000 (DISTRITO DE ESCOMARCA)”



META ALCANZADA DE 46.00 KM

MONTO EJECUTADO S/ 1'684,382.74 Soles



● PRINCIPALES MANTENIMIENTOS

"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LM-108, TRAMO KM 0+000 (EMP. PE-20 C - PUEBLO LIBRE) - KM 57+930 (EMP. PE-20 A - TRAPICHE) - CANTA- HUARAL – LIMA"



META ALCANZADA DE 57.93 KM

MONTO EJECUTADO S/ 880,277.49 Soles



PROYECTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO	COSTO EJECUCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN	MODALIDAD EJECUCIÓN	COSTO EXPEDIENTE	ESTADO ACTUAL
“CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE QUIPAN – PURUCHUCO – APAN DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA – LIMA”, ETAPA II: CREACION DEL PUENTE MODULAR EN EL SECTOR DE APAN, META 4.	1,799,206.54	60 Días	Contrata	76,500.00	CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON INFORME N° 146--2018- GRL/GRPPAT/OPRE/FSBLR EXP. N° 763910 Para elaboración de Expediente Técnico
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LM-103, TRAMO KM 0+000 (EMP. PE-1N E - DV. VILCAHUAURA) – KM 19+929 – (EMP. LM-102 - PEÑICO)	350,000.00	30 Días	Administración Directa	15,000.00	CON RESOLUCIÓN N°248-2018 DOC:1172812 EXP: 771821 Fecha 09.10.18 Aprobación de Expediente Técnico
MEJORAMIENTO DE LA AV. EMILIO VALDIZAN, CALLE 1, CALLE 2, CALLE 3 DEL DISTRITO DE SAN LUIS-PROVINCIA DE CAÑETE-REGIÓN LIMA" con Código Unificado 2401086.	1,789,020.93	60 días	Contrata	73,000.00	CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

ESTUDIOS DE PRE INVERSION

N	Proyecto / Inversión	Código	Estado	Monto – S/.	Fase	UF
1	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL RUTA N LM-107 PUENTE TINGO, CHIUCHIN, PICOY, PARQUIN HASTA LA INTERSECCION VICHAYCOCHA, DISTRITOS; PACHANGARA, CHECRAS, SANTA LEONOR Y PACARAOS, DE LAS PROVINCIAS; OYON, HUAURA Y HUARAL, REGION LIMA	2333993	Viable	18,503,445.00	Formulación	GRL - DRTC
2	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA CAMPIÑA DE SUPE DEL DISTRITO DE SUPE, AL CENTRO POBLADO LAS VÍRGENES, LIMITE DISTRITAL DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA – LIMA.	2083414	Viable	11,826,577.00	Formulación	MP Barranca
3	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL EN LAS LOCALIDADES RURALES DE SAN PEDRO DE LANCHA, CHINCHINA, LA MERCED DE CHAUTE, SANTIAGO DE TUNA Y LUCUMANI DE LOS DISTRITOS DE SAN BARTOLOME, SANTIAGO DE TUNA, SAN ANDRES DE TUPICOCHA, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ – REGIÓN LIMA	2108922	Viable	2,515,333.14	Formulación	GRL- DRTC
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CANTA - PARIAMARCA - CARHUA - LACHAQUI, DISTRITO DE LACHAQUI - PROVINCIA DE CANTA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2408619	Viable	13,336,071.73	Formulación	MP Canta
5	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL DESDE LA LOCALIDAD DE COAYLLO - CATA - OMAS - SAN PEDRO DE PILAS - HUAMPARA - QUINCHES - HUAÑEC, DE LOS DISTRITOS DE COAYLLO, OMAS, SAN PEDRO DE PILAS, HUAMPARA, QUINCHES Y HUAÑEC, DE LA PROVINCIA DE CAÑETE Y YAUYOS, REGIÓN LIMA	2339846	Formulación - Evaluación	43,441,424.00	Formulación	GRL- DRTC
	TOTAL			89,622,850.87		

LOGROS EN EL SERVICIO DE EMISION DE BREVETES

TRAMITE DE LICENCIAS



ENTREGA DE LICENCIAS



TOTAL DE LICENCIAS EMITIDAS DESDE LA INAUGURACION DE LA OFICINA DE LICENCIAS

MARZO	3
ABRIL	64
MAYO	336
JUNIO	576
JULIO	827
AGOSTO	827
SETIEMBRE	611
OCTUBRE	1127
NOVIEMBRE	1080
TOTAL	5451

II. LIMITACIONES Y DIFICULTADES

- La demora en las transferencias de recursos para obras en el año 2018, esta limitando que varias obras no se culminen en el presente ejercicio fiscal por lo cual se debe coordinar y garantizar que las obras y actividades se considere en continuidad para el 2019.
- Los procedimientos realizados con Provias presentan limitaciones para su ejecución inmediata debido a que se transfieren a nivel de perfil.
- Los continuos cambios Ministeriales y de funcionarios a perjudicado las gestiones y coordinaciones para establecer los convenios para el 2019 para el caso de mantenimientos viales, por lo cual recién en el tercer trimestre se esta definiendo el monto a transferir en el 2019.

LIMITACIONES Y DIFICULTADES

- La Gestión ante la Autoridad de Reconstrucción con Cambios para la aprobación y transferencia de recursos para las obras de su plan nacional de reconstrucción ha demandado demasiado tiempo mas de 8 meses en promedio debido a que dicha instancia no contaba con procedimientos establecidos de manera clara y precisa.
- Asimismo, dicho procedimientos se ha visto limitado debido a que el propio gobierno regional a tenido que formular los estudios con limitados recursos, a pesar que las intervenciones son parte del Plan Nacional de Reconstrucción con Cambio del Gobierno Central.
- Con respecto al estudio de Perfil Reforzado de la nueva carretera Central se presento limitaciones iniciales a fin de que se defina el trazo idóneo para su intervención y en el proceso logístico para la contratación de los consultorias.

LIMITACIONES Y DIFICULTADES

- Se ve limitada la operatividad de la DRTC debido a que tiene un ROF aprobado, pero no está presupuestado, se deberá gestionar ante el MEF dichos recursos.
- Establecer instrumentos, procedimientos y procesos al interior de la DRTC a fin de que las obras y actividades se desarrollen de manera ordenada.
- Gestionar ante el MEF que los ingresos generados por la emisión de patentes se puedan utilizar directamente como saldo de balance, lo cual no sucede en la actualidad porque se demoran en la evaluación de transferencia por dicha entidad, causando inconvenientes en la operatividad del servicio.
- El área de fiscalización tiene limitaciones debido que actualmente solo tiene 4 fiscalizadores para toda la región Lima, se estima que deben ser como mínimo 20 fiscalizadores con su respectiva logística, ello se debe gestionar a fin de que se contemple un presupuesto base para cumplir con dicha función.

PERSPECTIVAS

PROYECTOS EN EJECUCION QUE CULMINAN EN EL 2019

Proyecto	DICIEMBRE DEL 2018			SALDO	
	PIM	Ejecución	Avance %	Ejecución	Avance %
2087525: CONSTRUCCION CARRETERA HUAROS - HUACOS, KM 0+000 AL KM 3+765.23 DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA	3,259,513	700,000	22%	2,559,513	78%
2212502: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL AUCALLAMA-PALPA, DISTRITO DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA	2,191,068	1,500,000	70%	691,068	30%
2251163: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE QUIPAN - PURUCHUCO - APAN DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA - LIMA ETAPA I - META 2	8,239,370	2,325,567	28.23%	5,913,803	71.77%
2251163: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE QUIPAN - PURUCHUCO - APAN DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA - LIMA ETAPA II - META 3	4,280,107	841,351.43	19.66%	3,438,756	80.34%
2307247: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA LOCAL CANTA - OBRAJILLO, PROVINCIA DE CANTA - LIMA	5,057,877	3,485,241	68.90%	1,572,636	30.10%
2323498: CREACION DEL PUENTE POSANCA EN LA CARRETERA SANTA ROSA DE QUIVES - ARAHUAY KM. 4+00 QUEBRADA POSANCA, DISTRITO DE ARAHUAY - CANTA - LIMA	3,810,262	1,524,105	40%	2,286,157	60%
2401086: MEJORAMIENTO DE LA AV. HERMILIO VALDIZAN, CALLE 1, CALLE 2, CALLE 3 DEL DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CAÑETE - REGION LIMA	1,799,695	406,960.93	22.61%	1,392,734	77.39%
00024-1027: ESTUDIO: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAYCAN-CIENEGUILLA-ANTIOQUIA-HUAROCHIRI-TANTARANCHE-CARHUAPAMPA-TANTA-PACHACAYO-JAUJA CON RAMAL LIMACTAMBO-YURACMAYO-POMACOCCHA-YAULI-LA OROYA, MULTIDISTRITAL-MULTIPROVINCIAL-LIMA-JUNIN	9,507,557	4,000,000	58%	5,507,557	42%
FUNCION TRANSPORTE	38,145,449	14,783,225	38.75%	23,362,223	61.25%

CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI 2019

CÓDIGO ÚNICO	INVERSIÓN	COSTO INVERSIÓN (S/)	PROGRAMACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN (S/)
			2019
2408619	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CANTA - PARIAMARCA - CARHUA - LACHAQUI, DISTRITO DE LACHAQUI - PROVINCIA DE CANTA - DEPARTAMENTO DE LIMA	13,336,072	s/. 1,333,607
2237286	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO - LAYA- LA PEDRERA, DISTRITO DE LAHUAYTAMBO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA	9,140,903	s/. 3,800,000
2333993	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL RUTA N LM-107 PUENTE TINGO, CHIUCHIN, PICOY, PARQUIN HASTA LA INTERSECCION VICHAYCOCHA, DISTRITOS; PACHANGARA, CHECRAS, SANTA LEONOR Y PACARAOS, DE LAS PROVINCIAS; OYON, HUAURA Y HUARAL, REGION LIMA	18,503,445	s/. 5,381,148
2118675	CONSTRUCCION CARRETERA CARHUAPAMPA - MARGEN DEL RIO MALA, DISTRITO DE SAN JUAN DE TANTARANCHE - HUAROCHIRI - LIMA	1,795,963	s/. 1,292,432
TOTAL TRANSPORTE		42,776,383.00	11,807,187.00

INTERVENCIONES EJECUTOR GORE LIMA

RESUMEN DE INTERVENCIONES

PROVINCIA	INTERVENCIONES APROBADAS	PUENTES	VIAS URBANAS	MONTO A FINANCIAR
YAUYOS	03			S/. 11,477,863.30
CAÑETE	01			S/. 999,309.12
BARRANCA		01		S/. 2,865,828.25
CAJATAMBO		01		S/. 3,236,963.65
CANTA		02		S/. 12,920,070.04
HUAURA		02		S/. 3,753,573.06
HUAROCHIRI			01	S/. 1,178,051.69
TOTAL MONTO INTERVENCIONES				S/ 36,431,659.21

INTERVENCIONES EJECUTOR GORE LIMA

INTERVENCIONES APROBADAS

CODIGO ARCC	NOMBRE DE INTERVENCION EN EL PLAN DE RECONSTRUCCION	NOMBRE DE LA INTERVENCION (SNIP - INVIERTE.PE)	CODIGO	MONTO A FINANCIAR - S/	ESTADO
1247714 2,42	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - KM EN EMP. PE-22 A (VISCAS) - QUINOCAY - EMP. LM-124 (MITO HUERTA).	RENOVACIÓN DE VIA VECINAL EN LM-866, DISTRITO DE OMAS Y DISTRITO DE QUINOCAY, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA.	2408708	4,845,000.04	POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SU EJECUCION.
6697	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - KM EN EMP. LM-936 (TANA) - HONGOS	RECONSTRUCCIÓN DE VIA VECINAL LM-938, EN EMP. LM-936 (TANA) - HONGOS, DISTRITO DE HONGOS - PROVINCIA DE YAUYOS - DEPARTAMENTO DE LIMA	2426286	4,536,996.69	CON RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL MONTO DE S/ 1'361,100.00 CON DECRETO SUPREMO N° 263-2018-EF
6655	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - KM EN EMP. PE-24 - COLONIA	RECONSTRUCCIÓN DE VIA VECINAL LM-933, EN EMP. PE-24 - COLONIA, DISTRITO DE COLONIA - PROVINCIA DE YAUYOS - DEPARTAMENTO DE LIMA	2426282	2,095,866.57	POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SU EJECUCION.
P6	RECUPERACIÓN DE PUENTE COLGANTE CATAPALLA EN EL CENTRO POBLADO CATAPALLA - DISTRITO LUNAHUANA-PROVINCIA CAÑETE	RENOVACION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL CATAPALLA, EN LA LOCALIDAD DE CATAPALLA, DISTRITO DE LUNAHUANA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA	2407330	999,309.12	POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SU EJECUCION.

TOTAL INVERSION: S/ 12'477,142.42 soles

INTERVENCIONES EJECUTOR GORE LIMA

PUENTES – 06 INTERVENCIONES

CODIGO ARCC	NOMBRE DE INTERVENCION EN EL PLAN DE RECONSTRUCCION	NOMBRE DE LA INTERVENCION (SNIP - INVIERTE.PE)	CODIGO	MONTO A FINANCIAR – S/	ESTADO
7498	REINSTALACIÓN DEL PUENTE BAILEY QUE CONECTA EL C.P. TUTUMO Y EL C.P. EL MOLINO	RENOVACION DEL PUENTE MODULAR EL MOLINO, EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	2407426	2,865,828.25	REMITIDO A RECONSTRUCCION PARA SU APROBACION Y FINANCIAMIENTO EN 2019.
7339	INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR EN EMP. PE-16 A-PUQUIAN -MANGAS-EMP. L.D ANCASH (MANGAS)	RENOVACION DEL PUENTE DE CARRETERA, EN LA LOCALIDAD DE TUMAC, DISTRITO DE COPA, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA	2407425	3,236,963.65	REMITIDO A RECONSTRUCCION PARA SU APROBACION Y FINANCIAMIENTO EN 2019.
7435	INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR EN CARRETERA VECINAL ALTURA KM. 21+00 EP.1NE HUMAYA	RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA HUACAN, EN LA LOCALIDAD DE HUACAN, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	2407423	2,131,707.14	REMITIDO A RECONSTRUCCION PARA SU APROBACION Y FINANCIAMIENTO EN 2019.
7507	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MINA	RENOVACION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL LA MINA, EN LA LOCALIDAD LA MINA, DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	2407349	1,621,865.92	REMITIDO A RECONSTRUCCION PARA SU APROBACION Y FINANCIAMIENTO EN 2019.
...	RECONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL TRAPICHE	REHABILITACION DE PUENTE Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL E INGRESO AL CENTRO POBLADO TRAPICHE, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES - CANTA - LIMA	2216566	9,109,808.44	REMITIDO A RECONSTRUCCION PARA SU APROBACION Y FINANCIAMIENTO EN 2019.
7300	PUENTE POSANCA EN PE-20 (SANTA ROSA DE QUIVES) – LICAHUASI – ARAHUAY – LACHAQUI – EMP-20 (SIRHUAYO)	CREACIÓN DEL PUENTE POSANCA EN LA CARRETERA SANTA ROSA DE QUIVES – ARAHUAY KM 4+000 QUEBRADA POSANCA, DISTRITO DE ARAHUAY – CANTA – LIMA	2323498	3,810,261.70	RECURSOS TRANSFERIDOS, POR INICIAR EJECUCION FISICA.

TOTAL INVERSION: S/ 22'776,435.10 soles

INTERVENCIONES EJECUTOR GORE LIMA

VIAS URBANAS – 01 INTERVENCION

CODIGO O ARCC	NOMBRE DE INTERVENCION EN EL PLAN DE RECONSTRUCCION	NOMBRE DE LA INTERVENCION (SNIP - INVIERTE.PE)	CODIGO	MONTO A FINANCIAR – S/	ESTADO
3583	RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-722 - CALLE SAN MARTIN DESDE AV. J. GALVEZ HASTA SALIDA DEL PUEBLO	MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS PEATONALES DEL CENTRO POBLADO URBANO DE SANTIAGO DE TUNA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA – HUAROCHIRI – LIMA, META CALLE GALVEZ Y SAN MARTIN.	2330441	1,178,051.69	POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SU EJECUCION.
3581	RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-720 - CALLE JOSE GALVEZ DESDE 1 CDRA HASTA 6TA CDRA.				


TOTAL INVERSION: S/ 1,178,051.69 soles

***TOTAL 12 INTERVENCIONES* INVERSION: S/ 36,431,659.21 soles**

Proyecto: Nueva Carretera Central

La Carretera Central, no estaba preparada para los más de 7,000 vehículos diarios que hoy recibe, de los cuales el 41 % corresponde al transporte de carga, lo que genera alta congestión vehicular.

Del total de tráfico que viene a Lima, del centro del país (Pasco, Huánuco, Junín, Ucayali, e inclusive San Martín y Huancavelica), esta carretera recibe el 88%, y sólo el 12% lo hace por vías alternas.

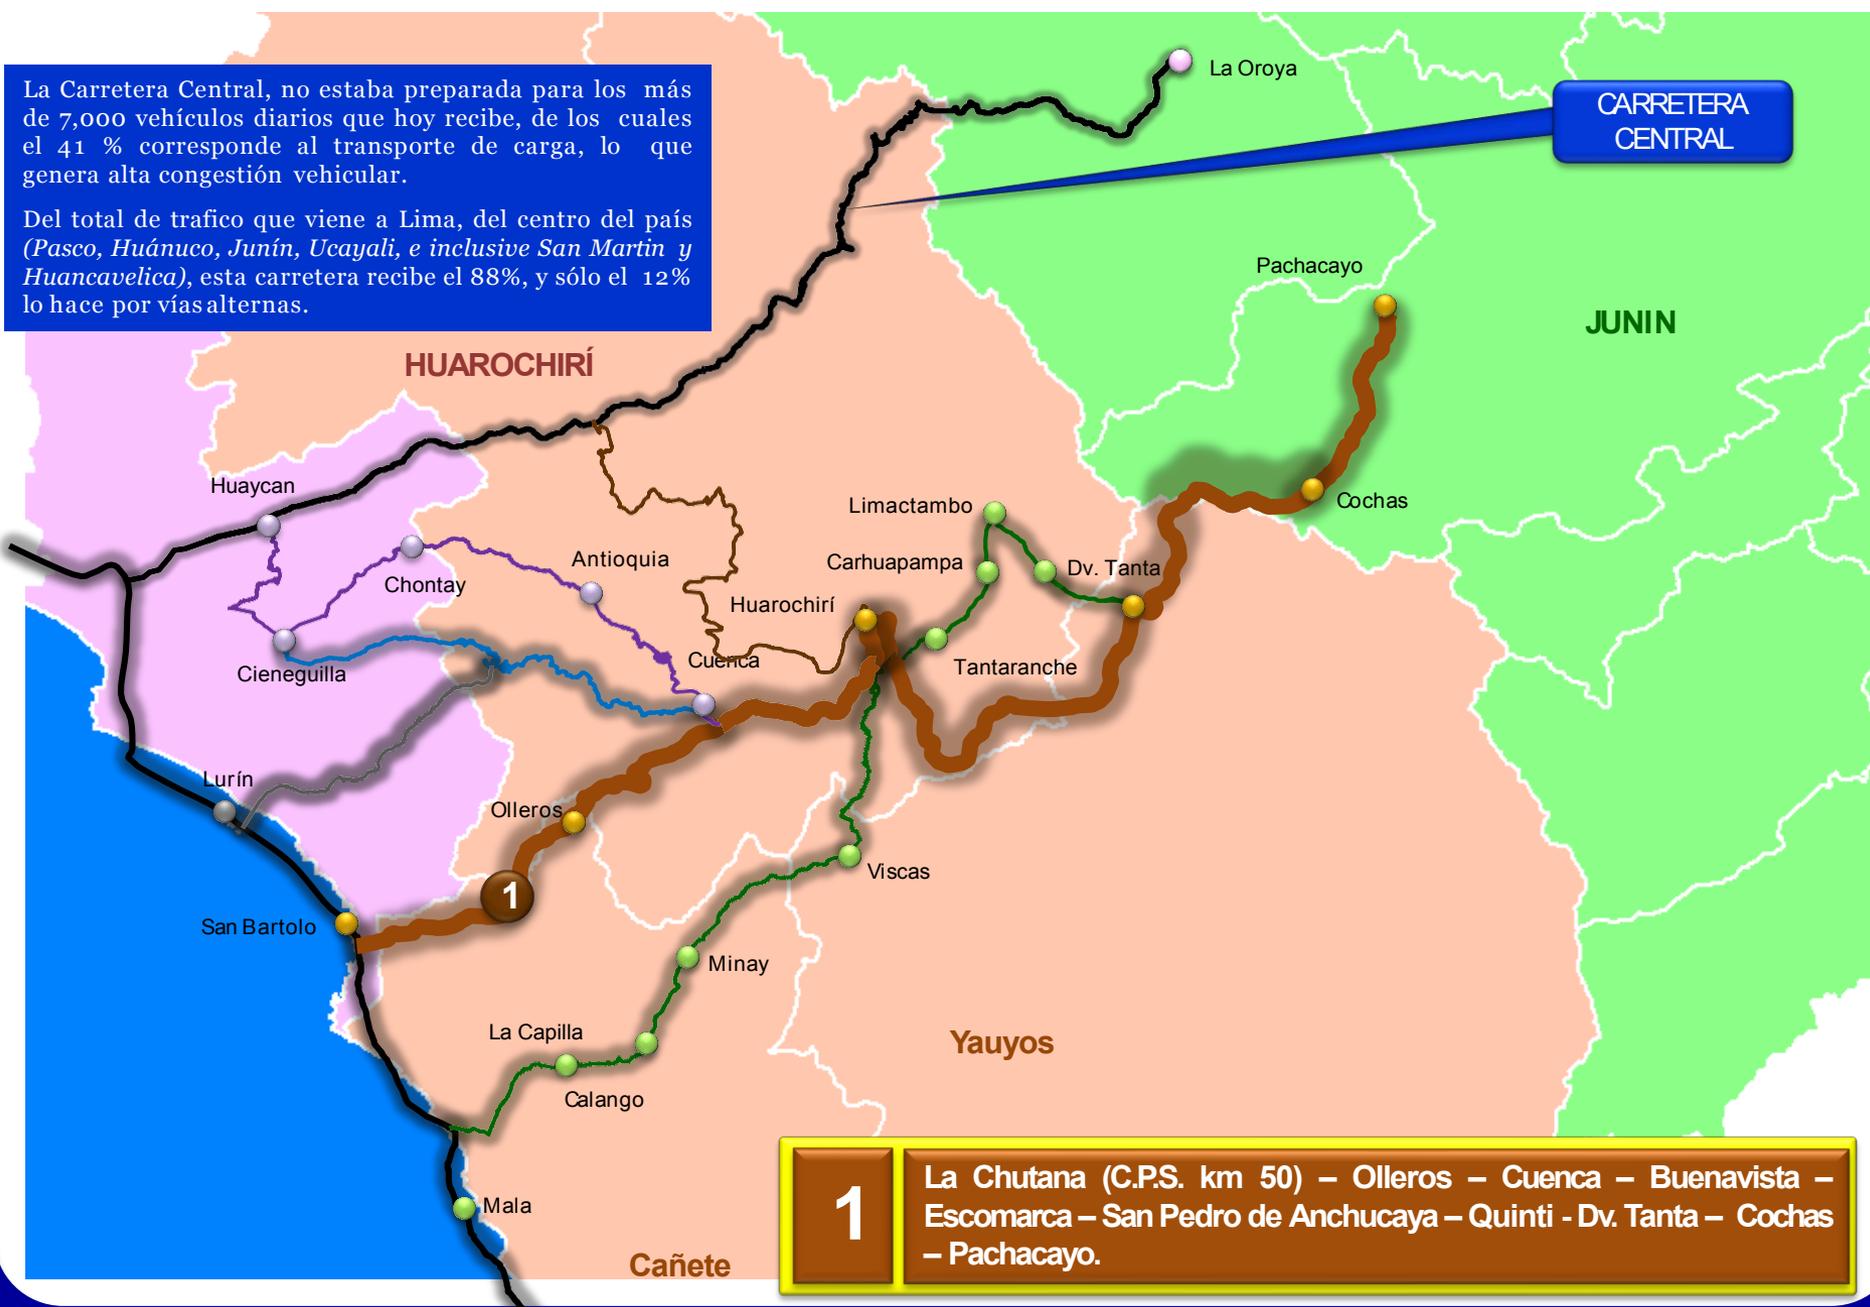

1

La Chutana (C.P.S. km 50) – Olleros – Cuenca – Buenavista – Escamarca – San Pedro de Anchucaya – Quinti - Dv. Tanta – Cochas – Pachacayo.

- Costo de elaboración del estudio de Pre – Inversión:

PRESUPUESTO DEL CONVENIO - S/	12.200.000,00
--------------------------------------	----------------------

OBJETIVO DEL PROYECTO

Lograr el descongestionamiento de la actual carretera central mediante la construcción de una Autopista, uniendo el Departamento de Lima con la Selva Central para promover el desarrollo socioeconómico y de competencias en la zona centro del Perú.

CONSIDERACIONES:

Se tiene programado que la culminación del estudio sea en el mes de junio 2019, procesándose una Adenda al convenio para ampliar el plazo de elaboración del estudio que vence el 31/12/2018.


El plazo se amplía debido a las complejidades de contratación de las especialidades involucradas, y su alta especialización de los consultores involucrados en la elaboración del estudio de Pre – inversión.

Estamos trabajando la Carretera Longitudinal de la Sierra de Lima a nivel de estudios, esperamos que la próxima gestión de Gobierno Regional, lo concluya.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA DE LIMA

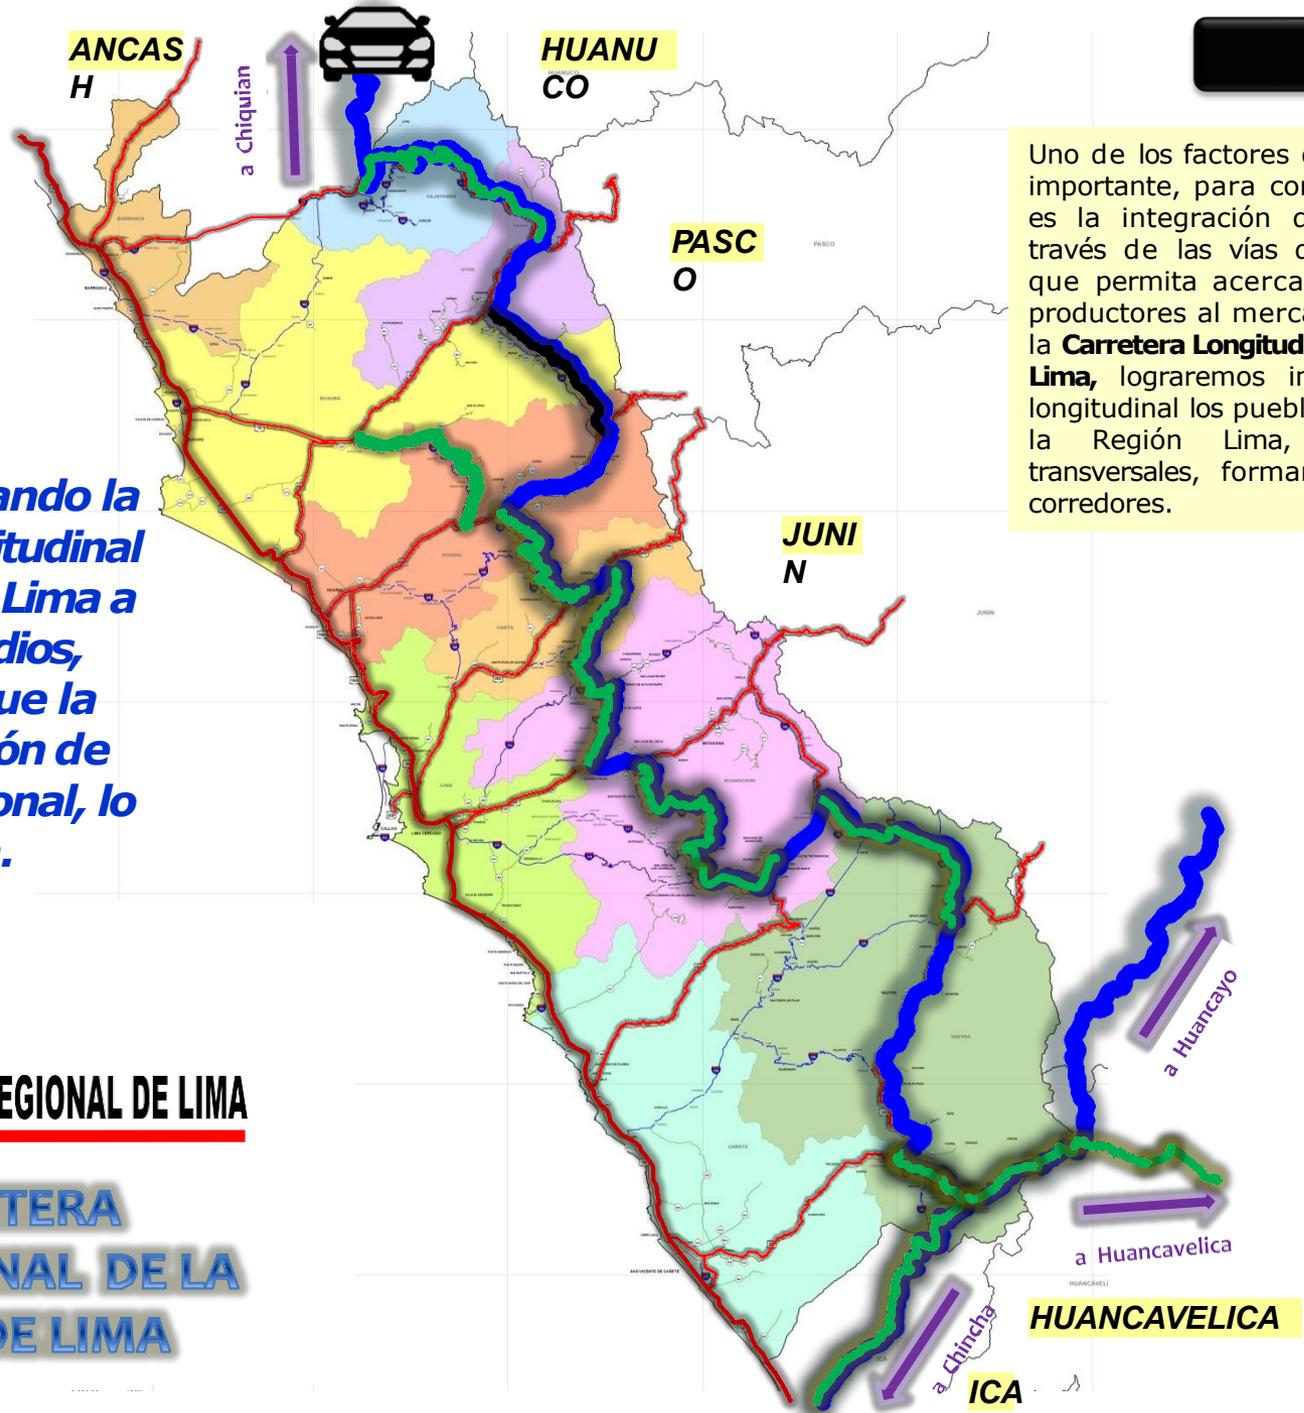

Uno de los factores que consideramos importante, para combatir la pobreza es la integración de los pueblos a través de las vías de comunicación, que permita acercar a los pequeños productores al mercado, por ello, Con la **Carretera Longitudinal de la Sierra de Lima**, lograremos integrar en forma longitudinal los pueblos mas pobres de la Región Lima, con los ejes transversales, formando una red de corredores.

LONGITUDINAL DE LA SIERRA – Proyectos Involucrados

N°	CODIGO UNICO	NOMBRE	INVERSION	KM	VIA INVOLUCRADA / ESTADO
1	2333993	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL RUTA N LM-107 PUENTE TINGO, CHIUCHIN, PICOY, PARQUIN HASTA LA INTERSECCION VICHAYCOCHA, DISTRITOS; PACHANGARA, CHECRAS, SANTA LEONOR Y PACARAOS, DE LAS PROVINCIAS; OYON, HUAURA Y HUARAL, REGION LIMA	S/. 18,503,445.00	65.17	LM - 107
2	2131310	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRÍ - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA	S/. 3,296,899.43	42.00	LM-117
3	2408619	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CANTA - PARIAMARCA - CARHUA - LACHAQUI, DISTRITO DE LACHAQUI - PROVINCIA DE CANTA - DEPARTAMENTO DE LIMA.	S/. 10,403,652.42	20.60	LM-111
4	2078611	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE-EMPALME CARRETERA PENETRACION-22 COCACHACRA-SANTIAGO DE TUNA-TUPICOCHA-SAN DAMIAN-SINACANCHA-LAHUAYTAMBO-EMPALME CARRETERA-115	S/. 4,545,844.38	96.00	LM-118
5	Por Formular	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LM-102 DISTRITO DE SUPE - HUAURA - MANAS, PROVINCIA DE BARRANCA - HUAURA - CAJATAMBO, REGION DE LIMA	S/. 25,779,802.75	-----	IDEA DE PROYECTO POR FORMULAR, PARA SU POSTERIOR INVERSION Y CIERRE DE BRECHA
6	Por Formular	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LM-109 DISTRITO DE AUCALLAMA - SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL, REGION DE LIMA	S/. 25,621,090.72	-----	IDEA DE PROYECTO POR FORMULAR, PARA SU POSTERIOR INVERSION Y CIERRE DE BRECHA
7	Por Formular	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LM-110 DISTRITO DE HUAMANTANGA - SUMBILCA, PROVINCIA DE CANTA, REGION DE LIMA	S/. 14,050,875.89	-----	IDEA DE PROYECTO POR FORMULAR, PARA SU POSTERIOR INVERSION Y CIERRE DE BRECHA
8	Por Formular	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LM-111 DISTRITO DE CANTA - LACHAQUI - ARAHUAY - SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA - LACHAQUI - ARAHUAY, REGION DE LIMA	S/. 18,679,676.21	-----	IDEA DE PROYECTO POR FORMULAR, PARA SU POSTERIOR INVERSION Y CIERRE DE BRECHA

LONGITUDINAL DE LA SIERRA – Proyectos Involucrados

N°	CODIGO UNICO	NOMBRE	INVERSION	KM	VIA INVOLUCRADA / ESTADO
9	Por Formular	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LM-114 DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHACLLA - ARAHUAY - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - CANTA, REGION DE LIMA	S/. 20,748,432.21	-----	IDEA DE PROYECTO POR FORMULAR, PARA SU POSTERIOR INVERSION Y CIERRE DE BRECHA
10	Por Formular	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LM-115 DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHACLLA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION DE LIMA	S/. 7,782,618.13	-----	IDEA DE PROYECTO POR FORMULAR, PARA SU POSTERIOR INVERSION Y CIERRE DE BRECHA
11	Por Formular	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LM-116 DISTRITO DE CARAPOMA - SAN JUAN DE IRIS - SAN PEDRO DE CASTA - HUACHUPAMA - SANTA EULALIA , PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION DE LIMA	S/. 21,704,299.33	-----	IDEA DE PROYECTO POR FORMULAR, PARA SU POSTERIOR INVERSION Y CIERRE DE BRECHA
12	Por Formular	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LM-118 DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA - SANTIAGO DE TUNA - SAN ANDRES DE TUPICOCHA- SAN DAMIAN - LAHUAYTAMBO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION DE LIMA	S/. 26,379,583.77	-----	IDEA DE PROYECTO POR FORMULAR, PARA SU POSTERIOR INVERSION Y CIERRE DE BRECHA
13	Por Formular	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LM-120 DISTRITO DE VITIS - HUANCAYA - TANTA - SAN LORENZO DE QUINTIN, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION DE LIMA	S/. 22,793,822.19	-----	IDEA DE PROYECTO POR FORMULAR, PARA SU POSTERIOR INVERSION Y CIERRE DE BRECHA
14	Por Formular	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LM-125 DISTRITO DE AYAVIRIS - MIRAFLORES, PROVINCIA DE YAUYOS, REGION DE LIMA	S/. 14,653,303.42	-----	IDEA DE PROYECTO POR FORMULAR, PARA SU POSTERIOR INVERSION Y CIERRE DE BRECHA
15	Por Formular	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LM-126 DISTRITO DE ALLAUCA - TAURIPAMPA - OMAS, PROVINCIA DE YAUYOS, REGION DE LIMA	S/. 25,912,719.49	-----	IDEA DE PROYECTO POR FORMULAR, PARA SU POSTERIOR INVERSION Y CIERRE DE BRECHA
16	Por Formular	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LM-129 DISTRITO DE CHOCOS - VIÑAC - MADEAN, PROVINCIA DE YAUYOS, REGION DE LIMA	S/. 18,621,420.06	-----	IDEA DE PROYECTO POR FORMULAR, PARA SU POSTERIOR INVERSION Y CIERRE DE BRECHA



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Muchas Gracias
