



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA PROYECTOS 2010 - 2011

Trujillo, 14 de Junio del 2,011

Expositor: Ing. Álvaro Bazán Cabellos
Gerente Regional de Infraestructura



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA – PROYECTOS (2010)

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA – PROYECTOS (2011)

CUADRO RESUMEN

OBRAS


PIA 2,011

OBRAS 2,010
INCORPORADAS AL
PRESUPUESTO 2,011
(EN EJECUCION)

OBRAS 2,010
INCORPORADAS AL
PRESUPUESTO 2,011
(LICITADAS IV
TRIMESTRE 2,010)

AVANCE
DE OBRAS

OBRAS 2,010
INCORPORADAS AL
PRESUPUESTO 2,011
(POR LICITAR)





ESTUDIOS



PIA 2,011



EXPEDIENTE TECNICOS
PROGRAMADOS
2,011

MANTENIMIENTOS




PIA 2,011

LIQUIDACIONES



PIA 2,011



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2010

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/12/2010		AVANCE FISICO A LA FECHA (MAYO 2011)
					FINANCIERO	FISICO	
TRUJILLO							
01 MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO, MOCHE PUEBLO - COMPUERTA DE SUN, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD.	MOCHE	1,973,920	800	CONTRATA	878,197	31.00%	100.00%
02 SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 81025 JOSE ANTONIO ENCINAS - VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	TRUJILLO	30,567	1,019	CONVENIO UNOPS	30,567	73.00%	100.00%
03 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CRUCE CARRETERA INDUSTRIAL-CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO-LAREDO-TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD.	EL PORVENIR	2,688,017	4,500	CONVENIO UNOPS	72,576	40.00%	100.00%
04 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	TRUJILLO	4,780,044	28,295	CONTRATA	2,266,219	77.00%	95.00%
05 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN NIVEL II-1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.	LA ESPERANZA	6,845,155	56,511	CONTRATA	1,777,002	40.00%	73.00%
06 MEJORAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CUENCA TRUJILLO ESTE, CENTRO Y OESTE.	TRUJILLO	6,482,320	219,504	CONTRATA	2,883,336	50.00%	70.00%
07 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL LAREDO-MICRORED LAREDO - RED TRUJILLO- LA LIBERTAD	LAREDO	4,730,221	33,000	CONTRATA	1,365,142	15.00%	56.00%
08 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO SANTA ROSA-CENTRO ARQUEOLOGICO LA HUACA DEL SOL Y LA LUNA-DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD	MOCHE	190,047	400	CONVENIO UNOPS INICIO DE OBRA	190,047	0.00%	13.00%



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2010

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/12/2010		AVANCE FISICO A LA FECHA (MAYO 2011)
						FINANCIERO	FISICO	
09	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE LIBERACION SOCIAL, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD.	TRUJILLO	2,349	3,330	CONVENIO UNOPS	2,348	100.00%	-
10	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE SALUD VICTOR LARCO DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	TRUJILLO	1,988,371	19,804	CONTRATA	1,688,127	100.00%	-
11	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 210-NIVEL INICIAL-DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	TRUJILLO	981,057	278	CONTRATA	652,992	100.00%	-
12	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 253 - LA NORIA - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO	TRUJILLO	1,000,704	468	CONTRATA	972,784	100.00%	-
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81653-NUUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT-TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	TRUJILLO	887,070	282	CONTRATA	507,759	100.00%	-
14	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81024-MIGUEL GRAU SEMINARIO-DISTRITO DE SALAVERRY-PROVINCIA DE TRUJILLO	SALAVERRY	2,455,390	884	CONTRATA	2,175,967	100.00%	-
15	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN - ALTO TRUJILLO - EL PORVENIR - TRUJILLO	TRUJILLO	2,344,873	2,166	POR LICITAR	0	0.00%	0.00%
16	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO (EQUIPAMIENTO)	TRUJILLO	1,937,677	62,185	EN ELABORACION EXP. TECNICO	0	0.00%	0.00%
16	TRANSF. FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL (EL PORVENIR), PARA LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº80029 MARIANO MELGAR DEL SECTOR EL PRESIDIO, DISTRITO DE EL PORVENIR-TRUJILLO-LA LIBERTAD	EL PORVENIR	683,742	140,507	TRANSF. FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL - EL PORVENIR	683,742	0.00%	0.00%



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2010

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/12/2010		AVANCE FISICO A LA FECHA (MAYO 2011)
					FINANCIERO	FISICO	
SANTIAGO DE CHUCO							
01 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ DE CHUCA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD (EQUIPAMIENTO)	SANTA CRUZ DE CHUCA	192,911	961	CONVENIO UNOPS	0	40.00%	100%
02 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA MICRORED DE SALUD MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	MOLLEBAMBA	1,703,617	10,608	CONTRATA	872,933	65.00%	100%
03 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO I.S.T.P. HECTOR VASQUEZ JIMENEZ -DISTRITO DE CACHICADAN- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD	CACHICADAN	2,354,218	363	FIRMA DE CONTRATO	0	0.00%	2.00%
04 IRRIGACION MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO	MOLLEBAMBA	42,900	2,101	CONTRATA	42,849	100.00%	-
05 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD MOLLEPATA, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	MOLLEPATA	11,956	2,597	CONVENIO UNOPS	11,956	100.00%	-
06 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 1695 - NIVEL INICIAL - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE STGO. DE CHUCO - DPTO. LA LIBERTAD	SITABAMBA	595,988	35	CONTRATA	515,232	100.00%	-
07 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO Nº 80797 DEL CASERIO DE PISCOCHACA	SANTIAGO DE CHUCO	32,500	44	CONTRATA	32,403	100.00%	-



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2010							
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA							
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/12/2010		AVANCE FISICO A LA FECHA (MAYO 2011)
					FINANCIERO	FISICO	
08 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL C.E. Nº 80591 NIVEL PRIMARIA-PIJOBAMBA - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	SITABAMBA	483,359	135	PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA M.D. SITABAMBA	0	0.00%	0%
JULCAN							
01 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD JULCAN- RED JULCAN DIRECCION DE SALUD LA LIBERTAD.	JULCAN	2,194,749	10,115	CONTRATA	1,235,205	85.00%	100%
02 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL PUESTO DE SALUD CARABAMBA-RED OTUZCO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	1,485,827	6,932	CONTRATA	492,552	50.00%	100%
03 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 80534-CIRO ALEGRIA BAZAN-INTILLACTA-HUASO-JULCAN-REGION LA LIBERTAD	HUASO	21,992,426	182	CONTRATA	14,277,483	72.00%	100%
04 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION I.E. SAN PEDRO DE SICCHAL, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	CALAMARCA	21,992,426	275	CONTRATA	15,896,126	77.00%	100%
05 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL CASERIO MEJICO- DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN-LA LIBERTAD.	CALAMARCA	2,627,491	320	CONTRATA	15,502	30.00%	30.00%
06 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DE LA MICRORED JULCAN CENTRO DE SALUD JULCAN, RED OTUZCO, DIRES LA LIBERTAD	JULCAN	3,188	10,115	CONTRATA	0	100.00%	-
07 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD UNINGAMBAL, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD.	HUASO	788,335	480	EN TRAMITE APROBACION DE VIABILIDAD, M.D. HUASO.	0	0.00%	0%
08 CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION HUACATINA CALAMARCA, HUASO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD.	HUASO	10,769,982	650	CONTRATA	0	0.00%	0%



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2010

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/12/2010		AVANCE FISICO A LA FECHA (MAYO 2011)
					FINANCIERO	FISICO	
CHEPEN							
01 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PACANGA - EMPALME CARRETERA GUADALUPE - PUEBLO NUEVO (SECTOR TOCORORO), PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD.	PACANGA	385,617	27,726	CONVENIO UNOPS	385,617	0.00%	37.00%
02 AMPLIACION EVACUACION DE LAS AGUAS DE FILTRACION DEL A.H. CERRO COLORADO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	PACANGA	296,822	550	CONTRATA	293,794	100.00%	-
03 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD SANTA ROSA - RED CHEPEN - DPTO. LA LIBERTAD (EQUIPAMIENTO).	PUEBLO NUEVO	106,533	2,741	CONTRATA	0	100.00%	-
04 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD SAN IDELFONSO-RED CHEPEN-REGION LA LIBERTAD	CHEPEN	476,344	3,551	CONTRATA	367,738	100.00%	-
05 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN ILDEFONSO-DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-PROVINCIA DE CHEPEN-REGION LA LIBERTAD	PUEBLO NUEVO	16,443,049	695	CONTRATA	15,255,861	100.00%	-
06 AMPLIACION ELECTRIF. RURAL EL POLVORIN, ZAPOTAL, HUABAL, VICHAYAL, SANTA ANITA, SAN SIMON, LA ARENITA, SAN MATEO, PUENTE CHEPEN, PUENTE GUADALUPE, PUENTE MAYTA, CALERA ALTA Y BAJA, MORANA ALTA Y BAJA Y NUEVO PARAISO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD.	MULTIDISTRITAL	351,240	430	EN TRAMITE SU TRANSFERENCIA A HIDRANDINA	0	0.00%	0%
07 TRANSF. FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL (PACANGA) PARA LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH SAN JOSE DE MORO LOCALIDAD, PROVINCIA DE CHEPEN-LA LIBERTAD.	PACANGA	7,260,022	19,783	TRANSF. FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL PACANGA	7,260,022	0.00%	0%



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2010

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/12/2010		AVANCE FISICO A LA FECHA (MAYO 2011)
					FINANCIERO	FISICO	
GRAN CHIMU							
01 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA EMPALME RO1N CHICAMA - SAUSAL - BAÑOS CHIMU, TRAMO SAUSAL - DV CASCAS - BAÑOS CHIMU, SUB TRAMO: SAUSAL-DV. CASCAS.	GRAN CHIMU	7,396,771	10,595	CONTRATA	7,396,771	95.00%	100%
02 CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL COMPIN - SUCCHABAMBA - MUCHAMACA VI.	MARMOT	194,038	2,392	CONV. GRLL - M.P.G.CH, AVANCE DE OBRA EN UN 30 %	0	30.00%	40%
03 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO CHILETE - CONTUMAZA - EMP. R103 (PUENTE OCHAPE).	GRAN CHIMU	35,401	31,673	CONTRATA	29,365	100.00%	-
04 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 82333 DE LA LOCALIDAD DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	SAYAPULLO	18,704	219	CONTRATA	18,704	100.00%	-
05 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CARRETERA VECINAL BAÑOS CHIMU - SAYAPULLO (RUTA VECINAL 568).	SAYAPULLO	95,454	8,436	CONVENIO UNOPS	0	0.00%	0%
06 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUARANCHAL - LUCMA - 09 DE OCTUBRE (ESTUDIO DEFINITIVO)	LUCMA	856,761	3,730	POR INICIAR PROCESO DE CONVOCATORIA.	302,694	0.00%	0%
07 TRANSF. FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL (CASCAS), PARA LA EJECUCION DE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS.	CASCAS	8,535,422	14,702	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL CASCAS.	8,535,422	0.00%	0%



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2010

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/12/2010		AVANCE FISICO A LA FECHA (MAYO 2011)
						FINANCIERO	FISICO	
PATAZ								
01	CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL LA ALBORADA - MULATAMBO - MARCOS.	ONGON	2,003,500	1,117	CONVENIO M.P. TAYABAMBA	1,950,007	70.00%	100%
02	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 80460 PRIMARIA GRAN PAJATEN, DISTRITO DE PIAS - PATAZ - LA LIBERTAD	PATAZ	1,153,352	140	CONTRATA	889,234	86.00%	96%
03	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO HUANCASPATA, DISTRITO DE HUANCASPATA - PATAZ - LA LIBERTAD	HUANCASPATA	2,109,114	7,985	CONTRATA	1,120,994	61.00%	70%
04	CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL PUERTA DEL MONTE - CUMPAN	ONGON	2,070,066	1,012	CONVENIO M.D. ONGON, AVANCE 40%	1,992,853	40.00%	61.00%
05	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 80518 OLGUYACO, NIVEL PRIMARIA DISTRITO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	PATAZ	1,080,960	41	CONTRATO RESUELTO	40,428	0.00%	4.00%
06	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD PATAZ, DISTRITO DE PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ. LA LIBERTAD.	PATAZ	154,146	7,984	CONVENIO UNOPS	154,146	0.00%	2.00%
07	CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL TOMAC - PUERTA DEL MONTE	ONGON	21,500	1,143	-	0	100.00%	-
08	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PARIAMARCA-RED PATAZ-REGION LA LIBERTAD	PATAZ	1,067,884	2,192	CONTRATA	802,728	100.00%	-
09	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS GOICOCHEA ARELLANO-HUAYLILLAS-PATAZ-REGION LA LIBERTAD	PATAZ	1,189,803	129	CONTRATA	1,184,330	100.00%	-



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2010

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/12/2010		AVANCE FISICO A LA FECHA (MAYO 2011)
						FINANCIERO	FISICO	
10	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA EN OCHO CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE PATAZ	PATAZ	4,431,926	1,577	CONTRATA	0	0.00%	0%
	BOLIVAR							
01	* CONSTRUCC. CARRET. CALEMAR-ABRA EL NARANJILLO (INCLUYE EL PTE.) * REHAB. Y MEJORAM. CARRET. CHAGUAL-TAYABAMBA-PTE. HUACRACHUCO	BOLIVAR / PATAZ	9,955,766	4,940 (Bolivar)	EN EJECUCION	1,536,175	70 % 0 %	70 % 0 %
02	CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL LAPLAP - UCUNCHA	UCUNCHA	18,552	1,511	CONVENIO M.D.U. - GRLL	0	100.00%	-
03	CONSTRUCCION CARRETERA BOLIVAR - BAMBAMARCA TRAMO: CHELLEN - EL NARANJILLO.	BOLIVAR	3,100	4,554	CONTRATA	2,290	100.00%	-
04	CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL UCHUMARCA - PUSAC - REGION LA LIBERTAD.	UCHUMARCA	12,843	3,546	CONTRATA	12,843	100.00%	-
	SANCHEZ CARRION							
01	REHABILITACION DE LA CARRETERA EL MOLINO - CHAGUAL.	SANCHEZ CARRION	17,846,578	41,336	CONTRATA	8,066,653	45.00%	47.00%
02	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - EL MOLINO.	SANCHEZ CARRION	9,170,242	41,336	CONTRATA	3,276,527	43.00%	43.00%
03	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARKAHUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD.	HUAMACHUCO	3,110,697	57,487	CONTRATA	2,663,068	100.00%	-
04	TRANSF. FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL(HUAMACHUCO), PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: * AGUA POTABLE YANAZARA. * AGUA POTABLE EL PALLAR.	HUAMACHUCO	2,382,548	1,367	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL DE HUAMACHUCO	2,382,548	100.00%	-



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2010

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/12/2010		AVANCE FISICO A LA FECHA (MAYO 2011)
					FINANCIERO	FISICO	
05 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LLUCHUBAMBA, PERTENECIENTE A LA MICRORRED MARCABALITO DE LA RED SANCHEZ CARRION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD	HUAMACHUCO	616,368	1,822	EXP .TECNICO PARA R.E.R	0	0.00%	0%
06 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE SUCCHA CENTRO, PERTENECIENTE A LA MICRORRED CHUGAY DE LA RED SANCHEZ CARRION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD	HUAMACHUCO	1,195,746	1,768	EXP .TECNICO PARA R.E.R	0	0.00%	0%
07 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD SAN FELIPE I, PERTENECIENTE A LA MICRORRED MARCABAL GRANDE DE LA RED SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD	HUAMACHUCO	1,175,793	308	SEGUNDA CONVOCATORIA: EXP .TECNICO	0	0.00%	0%
OTUZCO							
01 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 80658 CRUZ DE MAYO- MACHE-OTUZCO - LA LIBERTAD, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD	OTUZCO	749,494	52	CONTRATA	596,297	87.00%	100%
02 REHABILITACION DE LA CARRETERA OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL.	OTUZCO	32,055,349	56,405	CONTRATA	7,340,675	30.00%	35%
03 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 80763 QUIÑIGON-MACHE-DISTRITO MACHE-PROVINCIA OTUZCO, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD	OTUZCO	9,056	48	CONTRATA	9,055	100.00%	-
04 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AGALLPAMPA - SALPO, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD.	OTUZCO	2,347,179	17,960	CONTRATA	2,107,063	100.00%	-



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2010

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/12/2010		AVANCE FISICO A LA FECHA (MAYO 2011)
					FINANCIERO	FISICO	
PACASMAYO							
01 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD.	GUADALUPE	629,700	27,311	CONVENIO: M.D. GUADALUPE Y M. VIVIENDA	0	80.00%	100%
02 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSE ANDRES RAZURI-SECUNDARIA SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	SAN PEDRO DE LLOC	1,286,444	1,153	CONTRATA	430,830	41.00%	100%
03 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PORTADA DE LA SIERRA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD.	SAN JOSE	2,366,951	1,200	CONTRATA	1,530,707	81.00%	82%
04 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TECAPA-SANTA MARIA-PORTADA DE LA SIERRA-NUEVA ESPERANZA-CULTAMBO-VERDUN, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD.	SAN JOSE	2,287,544	5,875	CONTRATA	1,862,290	100.00%	-
05 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME MAZANCA-SAN JOSE Y PANAMERICANA-SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD.	SAN JOSE	4,571	12,005	CONTRATA	4,571	100.00%	-
ASCOPE							
01 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE GUZMAN EN CHICAMA - LA LIBERTAD	CHICAMA	1,140,655	1,151	CONTRATA	1,005,716	100.00%	-
02 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD PAIJAN -RED ASCOPE PAIJAN, DISTRITO DE PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD	ASCOPE	6,272	11,279	CONTRATA	6,271	100.00%	-



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2010							
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA							
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/12/2010		AVANCE FISICO A LA FECHA (MAYO 2011)
					FINANCIERO	FISICO	
03 REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME R 01 N - CARTAVIO - SANTIAGO DE CAO, TRAMO CARTAVIO - SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD.	SANTIAGO DE CAO	324,375	18,594	CONVENIO UNOPS	324,375	0.00%	0%
VIRU							
01 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CARMELO – VIRU.	VIRU	724,816	1,700	CONTRATA	0	96.00%	100%
02 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 80074 MARIA CARIDAD AGUERO DE ARRESE - PTE. VIRU - LA LIBERTAD	VIRU	4,928,320	2,485	CONTRATA	2,543,506	68.00%	98%
03 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BUENA VISTA.	VIRU	651,031	26,815	SALDOS DE OBRA POR EJECUTAR	0	0.00%	54%
04 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80704-ANDRES AVELINO CACERES-EL NIÑO-DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU-REGION LA LIBERTAD.	VIRU	2,471,596	53,285	FIRMA DE CONTRATO	0	0.00%	32%
05 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. CAMPO NUEVO - DISTRITO DE GUADALUPITO.	GUADALUPITO	123,839	1,950	CONTRATA	87,418	100.00%	-
06 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80637 SAN IGNACIO EN GUADALUPITO VIRU	GUADALUPITO	904,921	195	CONTRATA	738,506	100.00%	-



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2011 (AL MES DE MAYO)

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/05/2011	
						FINANCIERO	FISICA
TRUJILLO							
01	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO, MOCHE PUEBLO - COMPUERTA DE SUN, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD.	MOCHE	1,288,000	800	CONTRATA	1,072,518	100.00%
02	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 210-NIVEL INICIAL- DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	TRUJILLO	327,888	278	CONTRATA	139,320	100.00%
03	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81024-MIGUEL GRAU SEMINARIO-DISTRITO DE SALAVERRY-PROVINCIA DE TRUJILLO	SALAVERRY	279,508	884	CONTRATA	2,124	100.00%
04	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE SALUD VICTOR LARCO DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	TRUJILLO	10,955	59,551	-	0	100.00%
05	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	TRUJILLO	928,972	28,295	CONTRATA	526,356	95.00%
06	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN NIVEL II-1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.	LA ESPERANZA	5,059,651	56,511	CONTRATA	1,805,283	73.00%
07	MEJORAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CUENCA TRUJILLO ESTE, CENTRO Y OESTE.	TRUJILLO	3,599,234	219,504	CONTRATA	1,151,755	70.00%
08	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL LAREDO-MICRORED LAREDO - RED TRUJILLO- LA LIBERTAD	LAREDO	3,361,678	34,555	CONTRATA	1,896,659	56.00%
09	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN - ALTO TRUJILLO - EL PORVENIR - TRUJILLO	TRUJILLO	2,107,333	2,166	-	0	0.00%
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE MOTORIZADO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	TRUJILLO	815,887	322,234	-	0	0.00%



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2011 (AL MES DE MAYO)

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/05/2011	
						FINANCIERO	FISICA
11	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION: BUENOS AIRES Y LAS DELICIAS	TRUJILLO	2,299,141	91,371	CONTRATA	656,405	-
12	CONSTRUCCION DEL PUENTE QUIRIHUAC-LAREDO-TRUJILLO-LA LIBERTAD	LAREDO	1,624,353	34,555	-	0	0.00%
13	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA PARA LAS INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LA LIBERTAD	TRUJILLO	27,409,509	1,725,075	GRLL	0	0.00%
14	MEJORAM.DE LOS SERV.DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	SALAVERRY	2,074,031	15,259	-	45,214	0.00%
15	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE PORRES-MICRORED TRUJILLO-RED TRUJILLO-LA LIBERTAD	EL PORVENIR	3,436,729	871,388	-	61,174	0.00%
SANTIAGO DE CHUCO							
01	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 1695 - NIVEL INICIAL - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE STGO. DE CHUCO - DPTO. LA LIBERTAD	SITABAMBA	51,000	35	CONTRATA	44,090	100.00%
02	PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SITABAMBA- SANTIAGO DE CHUCO	SITABAMBA	104,777	3,808	-	0	100.00%
03	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA MICRORED DE SALUD MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	MOLLEBAMBA	830,614	10,608	CONTRATA	621,964	100.00%
04	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO I.S.T.P. HECTOR VASQUEZ JIMENEZ -DISTRITO DE CACHICADAN-PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD	CACHICADAN	2,165,603	363	FIRMA DE CONTRATO	267,885	2.00%
05	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY	SANTIAGO DE CHUCO	1,878,157	61,083	-	0	0.00%
JULCAN							
01	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD JULCAN- RED JULCAN DIRECCION DE SALUD LA LIBERTAD.	JULCAN	959,583	10,115	CONTRATA	0	100.00%



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2011 (AL MES DE MAYO)

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/05/2011	
						FINANCIERO	FISICA
02	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL PUESTO DE SALUD CARABAMBA-RED OTUZCO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	993,296	6,932	CONTRATA	513,037	100.00%
03	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 80534-CIRO ALEGRIA BAZAN-INTILLACTA-HUASO-JULCAN-REGION LA LIBERTAD	HUASO	760,000	182	CONTRATA	505,096	100.00%
04	INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA -JULCAN	JULCAN	205,358	13,159	-	0	100.00%
05	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION I.E. SAN PEDRO DE SICCHAL, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	CALAMARCA	303,269	275	CONTRATA	265,724	100.00%
06	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL CASERIO MEJICO-DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN-LA LIBERTAD.	CALAMARCA	2,897,336	320	CONTRATA	0	30.00%
07	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE APRENDIZAJE EN COMUNICACIÓN, MATEMATICA Y PERSONAL SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL II Y III CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL DISTRITO Y PROV.DE JULCAN-REGION LA LIBERTAD	JULCAN	3,248,263	33,706	-	0	0.00%
08	CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION HUACATINA CALAMARCA, HUASO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD.	HUASO	10,540,005	650	-	0	0.00%
CHEPEN							
01	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD SAN IDELFONSO-RED CHEPEN-REGION LA LIBERTAD	CHEPEN	38,251	3,551	CONTRATA	10,186	100.00%
02	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN ILDEFONSO-DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-PROVINCIA DE CHEPEN-REGION LA LIBERTAD	PUEBLO NUEVO	57,140	695	CONTRATA	53,014	100.00%
03	AMPLIACION ELECTRIF. RURAL EL POLVORIN, ZAPOTAL, HUABAL, VICHAYAL, SANTA ANITA, SAN SIMON, LA ARENITA, SAN MATEO, PUENTE CHEPEN, PUENTE GUADALUPE, PUENTE MAYTA, CALERA ALTA Y BAJA, MORANA ALTA Y BAJA Y NUEVO PARAISO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD.	MULTIDISTRITAL	351,231	430	-	0	0.00%
04	MEJORAM. DE TRAMOS CRITICOS DE LOS CANALES DE RIEGO MORALES, HUABO, CAÑA PERDIDA, COTON, MATRIZ I Y MONTEVIDEO DEL VALLE JEQUETEPEQUE-PROV.DE PACASMAYO Y CHEPEN - LA LIBERTAD	MUTIPROVINCIAL	5,656,545	180,827	-	0	0.00%



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2011 (AL MES DE MAYO)

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/05/2011	
						FINANCIERO	FISICA
02	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL PUESTO DE SALUD CARABAMBA-RED OTUZCO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	993,296	6,932	CONTRATA	513,037	100.00%
03	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 80534-CIRO ALEGRIA BAZAN-INTILLACTA-HUASO-JULCAN-REGION LA LIBERTAD	HUASO	760,000	182	CONTRATA	505,096	100.00%
04	INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA -JULCAN	JULCAN	205,358	13,159	-	0	100.00%
05	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION I.E. SAN PEDRO DE SICCHAL, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	CALAMARCA	303,269	275	CONTRATA	265,724	100.00%
06	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL CASERIO MEJICO-DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN-LA LIBERTAD.	CALAMARCA	2,897,336	320	CONTRATA	0	30.00%
07	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE APRENDIZAJE EN COMUNICACIÓN, MATEMATICA Y PERSONAL SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL II Y III CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL DISTRITO Y PROV.DE JULCAN-REGION LA LIBERTAD	JULCAN	3,248,263	33,706	-	0	0.00%
08	CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION HUACATINA CALAMARCA, HUASO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD.	HUASO	10,540,005	650	-	0	0.00%
CHEPEN							
01	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD SAN IDELFONSO-RED CHEPEN-REGION LA LIBERTAD	CHEPEN	38,251	3,551	CONTRATA	10,186	100.00%
02	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN IDELFONSO-DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-PROVINCIA DE CHEPEN-REGION LA LIBERTAD	PUEBLO NUEVO	57,140	695	CONTRATA	53,014	100.00%
03	AMPLIACION ELECTRIF. RURAL EL POLVORIN, ZAPOTAL, HUABAL, VICHAYAL, SANTA ANITA, SAN SIMON, LA ARENITA, SAN MATEO, PUENTE CHEPEN, PUENTE GUADALUPE, PUENTE MAYTA, CALERA ALTA Y BAJA, MORANA ALTA Y BAJA Y NUEVO PARAISO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD.	MULTIDISTRITAL	351,231	430	-	0	0.00%
04	MEJORAM. DE TRAMOS CRITICOS DE LOS CANALES DE RIEGO MORALES, HUABO, CAÑA PERDIDA, COTON, MATRIZ I Y MONTEVIDEO DEL VALLE JEQUETEPEQUE-PROV.DE PACASMAYO Y CHEPEN - LA LIBERTAD	MUTIPROVINCIAL	5,656,545	180,827	-	0	0.00%



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2011 (AL MES DE MAYO)

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/05/2011	
						FINANCIERO	FISICA
GRAN CHIMU							
01	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA EMPALME R01N CHICAMA - SAUSAL - BAÑOS CHIMU, TRAMO SAUSAL - DV CASCAS - BAÑOS CHIMU, SUB TRAMO: SAUSAL-DV. CASCAS.	GRAN CHIMU	585,898	10,595	CONTRATA	77,631	100.00%
02	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS.	CASCAS	2,000,000	14,702	-	0	100.00%
03	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUARANCHAL - LUCMA - 09 DE OCTUBRE (ESTUDIO DEFINITIVO)	LUCMA	14,925,645	3,730	-	276,124	0.00%
04	MEJORAM.DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD CASCAS-RED GRAN CHIMU DPTO LA LIBERTAD.	CASCAS	804,000	14,702	-	0	0.00%
PATAZ							
01	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PARIAMARCA-RED PATAZ-REGION LA LIBERTAD	PATAZ	265,110	2,192	CONTRATA	0	100.00%
02	RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONAES DE CALIDAD Y SERVICIO: MANT. PERIODICO CARRET. DV. CHILLIA-EL HUAYO-CHILLIA.	MULTIPROVINCIAL	116,576	17,125	ADMINISTRACION DIRECTA	114,489	95.00%
03	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 80460 PRIMARIA GRAN PAJATEN, DISTRITO DE PIAS - PATAZ - LA LIBERTAD	PATAZ	215,984	140	CONTRATA	89,158	96.00%
04	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO HUANCASPATA, DISTRITO DE HUANCASPATA - PATAZ - LA LIBERTAD	HUANCASPATA	957,634	7,985	CONTRATA	157,531	70.00%
05	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 80518 OLGYOYACO, NIVEL PRIMARIA DISTRITO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	PATAZ	1,049,397	41	CONTRATA	0	4.00%
06	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA EN OCHO CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE PATAZ	PATAZ	4,459,456	1,577	-	0	0.00%



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2011 (AL MES DE MAYO)

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/05/2011	
						FINANCIERO	FISICA
07	CONSTRUCCION DE PRESA Y CANAL DE REGADIO YANAPACCHA GRANDE LOCALIDAD DE NUNAMARCA, DISTRITO DE CHILLIA-PATAZ-LA LIBERTAD	CHILLIA	4,317,883	12,778	-	0	0.00%
08	CONSTRUCC.DE CANAL IRRIGAC. HUARCAYOC CHALLAS LA VICTORIA DIST.STGO DE CHALLAS PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	4,114,688	2,837	-	0	0.00%
09	PERFILADO RED REHABILITACION TRAMO EL MOLINO - CHAGUAL	PATAZ	47,841	41,336	-	0	0.00%
BOLIVAR							
01	* CONSTRUCC. CARRET. CALEMAR-ABRA EL NARANJILLO (INCLUYE EL PTE.) * REHAB. Y MEJORAM. CARRET. CHAGUAL-TAYABAMBA-PTE. HUACRACHUCO	BOLIVAR / PATAZ	4,748,500	4,940 (Bolivar) 7,984 (Pataz)	CONTRATA	0	70.00%
SANCHEZ CARRION							
01	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARKAHUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD.	HUAMACHUCO	2,983,000	57,487	CONTRATA	0	100.00%
02	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - EL MOLINO.	SANCHEZ CARRION	19,052,472	41,336	CONTRATA	2,497,779	43.00%
03	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LLUCHUBAMBA, PERTENECIENTE A LA MICRORRED MARCABALITO DE LA RED SANCHEZ CARRION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD	HUAMACHUCO	616,368	1,822	EXP .TECNICO PARA R.E.R	0	0.00%
04	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE SUCCHA CENTRO, PERTENECIENTE A LA MICRORRED CHUGAY DE LA RED SANCHEZ CARRION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD	HUAMACHUCO	1,195,746	1,768	EXP .TECNICO PARA R.E.R	0	0.00%
05	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD SAN FELIPE I, PERTENECIENTE A LA MICRORRED MARCABAL GRANDE DE LA RED SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD	HUAMACHUCO	1,175,793	308	-	0	0.00%



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2011 (AL MES DE MAYO)

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/05/2011	
						FINANCIERO	FISICA
OTUZCO							
01	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUACTIVA N° 80658 CRUZ DE MAYO- MACHE-OTUZCO - LA LIBERTAD, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD	OTUZCO	112,168	52	CONTRATA	69,746	100.00%
02	RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONAES DE CALIDAD Y SERVICIO: MANT. CARRET. SIMBAL-LA CUESTA-PARANDAY-SAN IGNACIO-SINSICAP-COLLAMBAY-SIMBAL.	MULTIPROVINCIAL	762,871	14,382	CONTRATA	0	100.00%
03	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AGALLPAMPA - SALPO, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD.	OTUZCO	20,355	17,960	CONTRATA	0	100.00%
04	REHABILITACION DE LA CARRETERA OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL.	OTUZCO	59,430	56,405	CONTRATA	0	35.00%
05	REHABILITACION DE LA CARRETERA OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL.	OTUZCO	20,173,867	56,405	CONTRATA	597,146	35.00%
06	INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA -OTUZCO	OTUZCO	49,837	26,595	-	0	0.00%
PACASMAYO							
01	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TECAPA-SANTA MARIA-PORTADA DE LA SIERRA-NUEVA ESPERANZA-CULTAMBO-VERDUN, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD.	SAN JOSE	15,811	5,875	CONTRATA	12,872	100.00%
02	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD.	GUADALUPE	629,700	27,311	CONVENIO: M.D. GUADALUPE Y M. VIVIENDA, AVANCE 80%	0	100.00%
03	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSE ANDRES RAZURI-SECUNDARIA SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	SAN PEDRO DE LLOC	1,211,298	1,153	CONTRATA	900,116	100.00%
04	ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO TOMA DE LOS LEONES Y OTRO	PAIJAN	13,790	24,541	-	0	100.00%
05	ELECTRIFICACION RURAL LOS CASERIOS LOS GRADOS Y OTROS	PAIJAN	38,017	24,541	-	0	100.00%



EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2011 (AL MES DE MAYO)

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO	POBLACION	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCES AL 31/05/2011	
						FINANCIERO	FISICA
06	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PORTADA DE LA SIERRA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD.	SAN JOSE	682,000	1,200	CONTRATA	134,218	82.00%
	ASCOPE						
01	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE GUZMAN EN CHICAMA - LA LIBERTAD	CHICAMA	134,946	1,151	CONTRATA	0	100.00%
02	RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO: MANT, PUENTE CHUQUILLANQUI	MULTIPROVINCIAL	190,972	20,927	ADMINISTRACION DIRECTA	73,562	30.00%
03	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRORRED ASCOPE-PROV.DE ASCOPE-LA LIBERTAD	ASCOPE	2,933,223	7,183	-	56,611	0.00%
	VIRU						
01	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CARMELO – VIRU.	VIRU	86,323	1,700	CONTRATA	86,228	100.00%
02	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 80074 MARIA CARIDAD AGUERO DE ARRESE - PTE. VIRU - LA LIBERTAD	VIRU	2,244,641	2,485	CONTRATA	1,450,263	98.00%
03	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BUENA VISTA.	VIRU	636,100	26,815	CONTRATA	338,596	54.00%
04	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80704-ANDRES AVELINO CACERES-EL NIÑO-DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU-REGION LA LIBERTAD.	VIRU	3,283,194	53,285	-	675,025	32.00%
05	ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD CARLOS PIMENTEL-VIRU	VIRU	133,637	53,285	-	0	0.00%



CUADRO RESUMEN - EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

**PIA + PIM
2010:**

365,561,825

**PIM
2011:**

186,002,447

**EJECUCION
FINANCIERA A
DICIEMBRE 2010:**

147,914,625

**EJECUCION
FINANCIERA A
(MAYO 2011):**

18,478,150



PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011

- OBRAS -

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO S/.	MESES												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
01	I.E. LUIS FELIPE DE LA PUENTE UCEDA	CALAMARCA - JULCAN	248,260.00													
02	ELECTRIFICACION CARLOS PIMENTEL	PIMENTEL - VIRU	133,637.00													
03	CENTRO DE SALUD DE CASCAS - LABORATORIO	CASCAS - GRAN CHIMU	804,000.00													
04	ESCUELAS SUB OFICIALES PNP	TRUJILLO - TRUJILLO	500,000.00													
05	PRESA YANAPACCHA	CHILLIA - PATAZ	4,317,883.00													
06	IRRIGACION HUARCAYOC - CHALLAS	STGO CHALLAS - PATAZ	4,114,688.00													
07	CANALES: MORALES Y MONTEVIDEO	MULTIPROVINCIAL	5,656,545.00													
08	CARRETERA HUARANCHAL - LUCMA - 9 DE OCT	MULTIPROVINCIAL	14,649,332.43													
09	PUENTE QUIRIHUAC	LAREDO - TRUJILLO	1,624,353.00													
10	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA PESADA	MULTIPROVINCIAL	27,409,509.00													
11	CENTRO DE SALUD SALAVERRY	SALAVERRY - TRUJILLO	2,028,727.70													
12	CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ	ASCOPE - ASCOPE	2,933,223.00													
13	CENTRO DE SALUD SAN MARTIN	TRUJILLO - TRUJILLO	3,375,424.96													
14	CARRETERA SHOREY - SANTIAGO DE CHUCO	MULTIPROVINCIAL	1,878,157.00													
TOTAL			69,673,740.09													



OBRAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO 2011 EN EJECUCION

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

OBRAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO 2011 - EN EJECUCION

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO S/.	SALDO A EJECUTAR S/.	MESES											
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
01	CENTRO DE SALUD LAREDO	LAREDO - TRUJILLO	4,245,318.94	1,466,861.80	[Bar chart showing execution progress]											
02	I.E. SAN PEDRO DE SICCHAL	SICCHAL - STGO DE CHUCO	1,268,091.98	127,070.39	[Bar chart showing execution progress]											
03	VIA DE ACCESO MOCHE PUEBLO	MOCHE - TRUJILLO	1,951,746.47	279,841.31	[Bar chart showing execution progress]											
04	CUENCA TRUJILLO ESTE, CENTRO Y OESTE	TRUJILLO - TRUJILLO	5,720,517.38	2,877,195.23	[Bar chart showing execution progress]											
05	AGUA Y SANEAMIENTO HUANCASPATA	HUANCASPATA - PATAZ	1,866,186.24	830,257.19	[Bar chart showing execution progress]											
06	AGUA Y ALCANTARILLADO PORTADA DE SIERRA	SAN JOSE - PACASMAYO	2,151,417.61	547,808.70	[Bar chart showing execution progress]											
07	I.E. MIGUEL GRAU SEMINARIO	SALAVERRY - TRUJILLO	2,209,262.77	277,376.57	[Bar chart showing execution progress]											
08	I.E. N° 80658 CRUZ DE MAYO	MACHE - JULCAN	639,982.99	108,162.39	[Bar chart showing execution progress]											
09	CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE	V. LARCO - TRUJILLO	2,881,876.98	356,476.43	[Bar chart showing execution progress]											
10	I.E. N° 804060 GRAN PAJATEN	PIAS - PATAZ	1,003,987.71	126,829.14	[Bar chart showing execution progress]											
11	I.E. N° 80534 CIRO ALEGRIA	HUASO - JULCAN	2,379,215.76	254,916.24	[Bar chart showing execution progress]											
12	CARRETERA SIMBAL - LA CUESTA - PARANDAY	MULTIDIST. - TRUJILLO	1,351,557.80	762,871.00	[Bar chart showing execution progress]											
13	CARRETERA SAUSAL - DV CASCAS	MULTIPROVINCIAL	6,788,480.14	508,242.40	[Bar chart showing execution progress]											
14	MICRORED SALUD MOLLEBAMBA	MOLLEBAMBA - STGO CHUCO	1,535,558.47	20,666.01	[Bar chart showing execution progress]											
15	I.E. JOSÉ ANDRES RAZURI	SAN PEDRO - PACASMAYO	1,567,158.07	358,972.69	[Bar chart showing execution progress]											
16	CENTRO DE SALUD JULCAN	JULCAN - JULCAN	1,235,531.99	959,583.00	[Bar chart showing execution progress]											
17	CENTRO DE SALUD CARABAMBA	CARABAMBA - JULCAN	977,346.61	480,244.66	[Bar chart showing execution progress]											
18	CARRETERA EL MOLINO - CHAGUAL	MULTIDIST. - S. CARRION	16,277,957.98	47,841.00	[Bar chart showing execution progress]											
19	CARRETERA PUENTE PALLAR - EL MOLINO	MULTIDIST. - S. CARRION	19,052,472.00	16,684,473.09	[Bar chart showing execution progress]											
20	CANAL MEJICO	CALAMARCA - JULCAN	2,897,336.00	2,897,336.00	[Bar chart showing execution progress]											
21	CARRETERA OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL	MULTIDIST. - OTUZCO	20,173,867.00	19,576,471.94	[Bar chart showing execution progress]											
22	I.E. 210 - SANTA MARIA	TRUJILLO - TRUJILLO	327,888.00	322,593.91	[Bar chart showing execution progress]											
23	I.E. N° 80074 MARIA CARIDAD	VIRU - VIRU	2,244,641.00	852,692.74	[Bar chart showing execution progress]											
24	CENTRO DE SALUD JERUSALEM	LA ESPERANZA - TRUJILLO	5,059,651.00	3,681,571.59	[Bar chart showing execution progress]											
TOTAL			105,807,050.89	54,406,355.42												

EN EJECUCIÓN (2010 - 2011)



OBRAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO 2011 (LICITADAS IV TRIMESTRE 2010 y POR LICITAR EN EL 2011)

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

OBRAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO 2011 (LICITADAS IV TRIMESTRE 2010)

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO S/.	MESES												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
LICITADAS (IV TRIMESTRE 2010)	01 AGUA Y ALCANTARILLADO BUENA VISTA	VIRU - VIRU	636,100.00													
	02 AGUA Y ALCANTARILLADO EL CARMELO	CARMELO - VIRU	86,323.00													
	03 I.E. ANDRES AVELINO CACERES - EL NIÑO	VIRU - VIRU	3,283,194.00													
	04 REPRESA HUACATINA	CALAMARCA - JULCAN	10,540,005.00													
	05 ISTP HECTOR VASQUEZ JIMENEZ	CACHICADAN - STGO DE CHUCO	2,165,603.00													
	06 I.E. VIRGEN DEL CARMEN	A. TRUJILLO - TRUJILLO	2,107,333.00													
	07 PUESTO DE SALUD SUCCHA CENTRO	CHUGAY - S. CARRION	1,195,746.00													
TOTAL			20,014,304.00													

OBRAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO 2011 (POR LICITAR)

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO S/.	MESES												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
OBRAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO 2011	01 INSTITUCION EDUCATIVA OLGoyACO	URPAY - PATAZ	1,049,397.00													
	02 PUESTO DE SALUD SAN FELIPE	MARCABAL - S. CARRION	1,175,793.00													
	03 PUESTO DE SALUD LLUCHUBAMBA	MARCABALITO - S. CARRION	616,368.00													
	04 8 CENTROS EDUCATIVOS Y EQUIP.	MULTIDIST. - PATAZ	5,696,764.24													
	05 CARRETERA CUMPAN-UTCUBAMBA-ONGON	MULTIDIST. - PATAZ	4,323,011.00													
TOTAL			12,861,333.24													



CUADRO DE AVANCE DE OBRAS



PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA RELACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS EN ELABORACIÓN

ITEM	P.I.A. 2011 - ESTUDIOS Y PROYECTOS	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO S/.	MESES													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
01	CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION HUARCAYOC - CHALLAS - LA VICTORIA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PATAZ - LA LIBERTAD.	PATAZ - LA LIBERTAD	89,000.00	■	■												
02	ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD CARLOS PIMENTEL - VIRU	VIRU	3,500.00	■													
03	CONSTRUCCION DEL PUENTE QUIRIHUAC - LAREDO -TRUJILLO - LA LIBERTAD	LAREDO - TRUJILLO	88,464.60			■	■										
04	MEJORAM. DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD-DPTO LA LIBERTAD	SALAVERRY - TRUJILLO	45,303.30	■													
05	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE PORRES - MICRORED TRUJILLO-RED TRUJILLO- LA LIBERTAD	TRUJILLO	61,304.04	■													



PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA RELACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS EN ELABORACIÓN

ITEM	P.I.A. 2011 - ESTUDIOS Y PROYECTOS	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO S/.	MESES														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
06	MEJORAM. DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD CASCAS-RED GRAN CHIMU DPTO LA LIBERTAD	GRAN CHIMU - TRUJILLO	72,828.00															
07	REHABILITACION DE LA CARRETERA HUARANCHAL - LUCMA - 09 DE OCTUBRE	JARANCHAL - LUCMA	186,652.99															
08	CONSTRUCCION DE PRESA Y CANAL DE REGADIO YANAPACCHA GRANDE LOCALIDAD DE NUNAMARCA, DISTRITO DE CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD	CHILLIA - PATAZ	205,185.75															
09	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRORED ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD.	ASCOPE - LA LIBERTAD	56,697.54															
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80249 DEL DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN, LA LIBERTAD" - LUIS DE LA PUENTE UCEDA	JULCAN	59,682.19															
TOTAL:			868,618.41															



EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS A DICIEMBRE DEL 2011

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CRONOGRAMA MENSUAL DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS PROYECTADO A DICIEMBRE DEL 2011.

Nº	PROYECTO EXPEDIENTES TECNICOS	ESPECIFICA DEL GASTO	MONTO TOTAL S/.	AÑO 2,011 MESES											
				ABR.-'11	MAY.-'11	JUN.-'11	JUL.-'11	AGO.-'11	SEPT.-'11	OCT.-'11	NOV.-'11	DIC.-'11			
01	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL - LA LIBERTAD (EXP. TEC.)	2.6.8 1.3 1	S/. 87,039.80	■											
02	EXP. TEC. COMPLEMENTARIO DEL LABORATORIO REGIONAL	2.6.8 1.3 1	S/. 62,846.88		■										
03	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO CATEGORIA III - I, CON ENFASIS EN LA ATENCION DE EMERGENCIA - TRUJILLO - LA LIBERTAD (PREFC - FACTIBILIDAD)	2.6.8 1.2 1	S/. 931,502.70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
04	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL DE REGION LA LIBERTAD	2.6.8 1.3 1	S/. 200,000.00								■		■		
05	NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	2.6.8 1.3 1	S/. 497,709.10			■	■	■							
06	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80823 "EL INDOAMERICANO"	2.6.8 1.3 1	S/. 38,234.70		■										
07	CARRETERA BOLIVAR – UCHUMARCA – SAN VICENTE DE PAUL – HUANABAMBA – EMP. PE-8B”	2.6.8 1.3 1	S/. 144,799.20			■									
08	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION PARASIVE - HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD, MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DE LOS CANALES DE RIEGO	2.6.8 1.3 1	S/. 85,886.88					■							



EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS A DICIEMBRE DEL 2011

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CRONOGRAMA MENSUAL DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS PROYECTADO A DICIEMBRE DEL 2011.

N°	PROYECTO EXPEDIENTES TECNICOS	ESPECIFICA DEL GASTO	MONTO TOTAL S/.	AÑO 2,011 MESES											
				ABR.-'11	MAY.-'11	JUN.-'11	JUL.-'11	AGO.-'11	SEPT.-'11	OCT.-'11	NOV.-'11	DIC.-'11			
09	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUAYO - DISTRITO DE HUAYO - PATAZ - LA LIBERTAD	2.6.8 1.3 1	S/. 48,382.43												
10	TRAMO: PUENTE MORENO - PAMPAS DE JAGUEY (MARGEN IZQUIERDA) - FACTIBILIDAD.	2.6.8 1.2 1	S/. 110,527.20												
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARRETERA OTUZCO-USQUIL-HUARANCHAL, TRAMO USQUIL-HUARANCHAL.	2.6.8 1.3 1	S/. 65,580.78												
12	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°80636 "LUIS VALLE GOICOCHEA" - GUADALUPITO - VIRU	2.6.8 1.3 1	S/. 47,231.10												
13	LA CARRETERA: CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO.	2.6.8 1.3 1	S/. 1,454,164.12												
14	Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PTE HUACRACHUCO.	2.6.8 1.3.1	S/. 1,495,948.12												
15	EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 80855 - CESAR ACUÑA PERALTA - LA DELICIANA, DISTRITO DE HUAYO - PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	2.6.8 1.3 1	S/. 37,174.41												
16	EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 80449 - NIVEL PRIMARIO- PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	2.6.8 1.3 1	S/. 43,439.76												
MONTO TOTAL			S/. 5,350,467.18												



PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

CRONOGRAMA DE CARRETERAS PARA MANTENIMIENTO VIAL

REGION LA LIBERTAD - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE CAMINOS

PERIODO: MAYO - DICIEMBRE

AÑO: 2011

Nº	META		OBSERVACIONES	COSTO		U.M.		MESES										
	DESCRIPCION	META		ESTIMADO	Km.	Global	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		00001		2,276,541.89														
1	Mant. Preventivo Santa Elena - María Laura - El Carmelo		Proceso Aprobación	2,276,541.89	10.97						40%	30%	30%					
	Gastos por contratación de servicios (supervisión).																	
		00003		7,703,751.12														
1	Mant. Carretera Mazanca - San José		Proceso Aprobación	1,516,889.82	2.62						100%							
2	Mant. Preventivo Carretera Jequetepeque - Huascar		Proceso Aprobación	1,543,915.87	5.67						40%	30%	30%					
3	Mant. Preventivo Huanchaco - Santiago de Cao		Proceso Aprobación	4,642,945.43	14.00						20%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%
		00004		9,128,587.15														
1	Emp. PE-1N (Chicama) - Desv. Cascas - Contumazá - Chilete.		Expediente de Contratación	6,789,754.29	33.82													
	Tramo: Sausal - Desv. Cascas.													40%	30%	30%		
2	Mant. Preventivo de la Carretera Virú - Huacapongo		Proceso Aprobación	2,313,832.86	15.00						25%	25%	25%	25%				
	Gastos por contratación de servicios (supervisión).			25,000.00														
	SELLADO DE CARRETERAS			709,984.32														
1	Chocope - casa Grande - Ascope			700,000.00	19.00						100%							
2	Chocope - Farias			49,000.00	1.50						100%							
4	Guadalupe - Pueblo Nuevo		Exped. Técnico	0.00														
5	Pueblo Nuevo - Santa rosa			120,000.00	3.86						100%							
6	La Calera - Guadalupe			130,000.00							100%							
7	Guadalupe - Seman			96,000.00	2.50						100%							
8	"Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta Chancadora, Planta de Asfalto y Tren de Asfalto"		Exp. Técnico Aprobado	314,984.32							20%	20%	35%	5.5%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%
9	Mant. Periódico Carret. Desv. Charat - Callancas - Desv. Huaranchal		En Ejecución	2,597,490.11	41.83						9.99%	9.99%	9.99%	9.99%	9.99%	9.99%	9.99%	9.99%
10	Mantenimiento Rutinario Carretera Desv Chilia - Chilia		En Ejecución	957,684.64	51.00						10.233%	10.024%	10.024%	10.024%	10.024%	10.024%	10.024%	10.024%
11	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA PARA LAS INTERVENCIONES VIALES EN LA REGIÓN LA LIBERTAD (EQUIPAMIENTO)		Proceso Elaboración de Exp. Técnico	30,150,459.45		63.00												
											20%	40%	40%					
	TOTAL			53,909,514.36														

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

REGIÓN LA LIBERTAD



PERIODO	CANTIDAD		
	LIQUIDACIONES	TRANSFERENCIAS	REBAJAS CONTABLES
2011	89	71	53

LIQUIDACIONES DE OBRAS




LIQUIDACIONES DE OBRAS

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA



CUADRO DE ACCIONES DE GESTION REGIONAL (ENERO - MAYO 2011)			
- LIQUIDACIONES DE OBRAS -			
MES:	Mayo 2011	Oficina / Area / Dependencia:	S.G.S.L.O.
Nº	ACTIVIDAD	IMPACTO	INDICADORES
1	ELABORACION DE LIQUIDACIONES TECNICAS - FINANCIERAS.	LIQUIDACIONES TECNICAS - FINANCIERAS, POR ADMINISTRACION DIRECTA, CONTRATA Y CONVENIO DEL GOBIERNO REGIONAL.	26
2	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRAS.	-	8
3	ELABORACION DE EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA.	QUE SE REALICE LA TRANSFERENCIA DE OBRA PARA SU MANTENIMIENTO Y USO DE LAS DIFERENTES ENTIDADES.	19
4	REBAJA CONTABLE DE OBRA.	DISMINUIR LOS ACTIVOS POR GASTOS OCASIONADOS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL.	10
5	INSPECCION DE OBRA Y ELABORACION DE INFORME.	DETERMINACION DEL TANTO POR CIENTO DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA.	5

GRAFICA DE ACCIONES DE GESTION REGIONAL (ENERO - MAYO 2011)

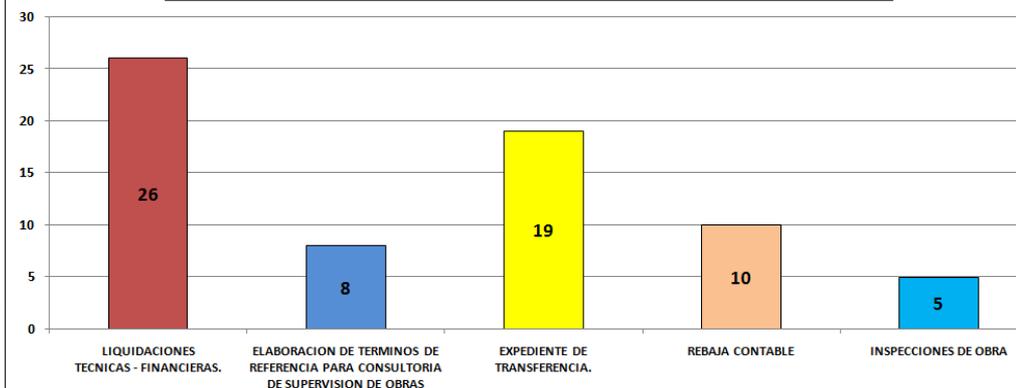

LIQUIDACIONES DE OBRAS

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA




PROGRAMACION DE ACCIONES DE GESTION REGIONAL 2do, 3er y 4to TRIMESTRE 2011 - LIQUIDACIONES DE OBRAS -

MES: **Mayo 2011** Oficina / Area / Dependencia: **S.G.S.L.O.**

Nº	ACTIVIDAD	TRIMESTRES 2do al 4to
1	ELABORACION DE LIQUIDACIONES TECNICAS - FINANCIERAS.	68
2	ELABORACION DE EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA.	52
3	REBAJA CONTABLE DE OBRA.	61
4	INSPECCION DE OBRA Y ELABORACION DE INFORME.	66

PROGRAMACION DE ACCIONES DE GESTION REGIONAL 2do, 3er y 4to TRIMESTRE 2011

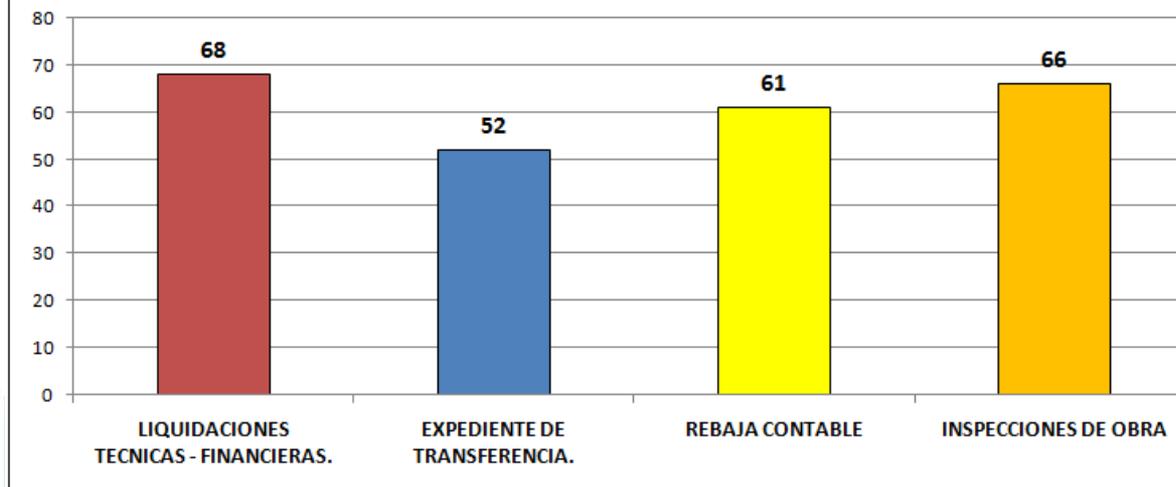



Gracias...

