

Ayacucho, 31 de enero del 2025

**CARTA N°001 -2025/ ICLL- SP**

Señor:


**Ing. LUIS ENRIQUE ANAYA ABREGU**

Director de Desarrollo Agroeconómico del PESCS

Ciudad:

**ASUNTO : REMITO ACTIVIDADES FISICO -FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO**

**Referencia : CARTA N°020-2025/LHM-RP  
CARTA N°01-2025AÑM-AA**



De mi mayor consideración;

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de saludarlo y a la vez remitir las actividades realizadas del Físico - Financiero correspondiente al Primer entregable en cumplimiento al contrato de locación de servicio N°004-2025-MIDAGRI-PESCS como SUPERVISOR de Meta del proyecto "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON C.U.I. N°2599658.

Adjunto al presente:

- 1) Ficha Técnica del Proyecto
- 2) Reporte mensual del proyecto
- 3) Reporte Financiero del proyecto
- 4) Panel fotográfico
- 5) Copia del cuaderno de obra.

Sin otro en particular quedo de Usted.

Atentamente

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

# MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

## PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

### PROYECTO PRODUCTIVO

**"RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN  
EN EL DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE  
AYACUCHO"**

## ACTIVIDADES PRIMER ENTREGABLE



**MES DE ENERO – 2025**

**ING. INDALICIO CABRERA LLANTOY**

**SUPERVISOR DE PROYECTO**

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
PROYECTO RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  
EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA  
DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Indalicio Cabrera Llantoy  
CIP. 153115  
SUPERVISOR

# **01. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

**PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**

**DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

**2.1. PLIEGO**

013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

**2.2. UNIDAD EJECUTORA**

016 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

**2.3. FUNCION**

10 AGROPECUARIA

**2.4. PROGRAMA PRESUPUESTAL**

0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE.

**2.5. NOMBRE DEL PROYECTO**

"RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

**2.6. CUI N°:**

N° 2599658

**2.7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA**

- LOCALIDAD : QUINUA
- DISTRITO : QUINUA
- PROVINCIA : HUAMANGA
- DEPARTAMENTO : AYACUCHO

**2.8. AMBITO DE INTERVENCION**

El distrito de Quinua, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho. Se construirán 5 viveros volantes los cuales están ubicadas en las siguientes comunidades:

**COMUNIDADES:**

- Moya
- Quilquitupo
- Quinua
- Pampachacra
- Parccay

**2.9. OBJETIVOS DEL PROYECTO:**

- **OBJETIVO GENERAL:**  
Recuperación del Ecosistema del Distrito de Quinua.
- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**
  - ✓ Establecer plantaciones forestales en los suelos con aptitud forestal, siendo principalmente plantaciones de Pino y Plantas Nativas (Cceñua y Ccolle); para mejorar los niveles de rendimiento por árbol.
  - ✓ Promover técnicas forestales para el cuidado y mantenimiento, logrando así su sostenibilidad en el tiempo.
  - ✓ Fomentar hábitos de manejo y conservación de los recursos naturales, para evitar mayores desastres por la alteración de los ecosistemas.
  - ✓ Realizar actividades concernientes a la revalorización ambiental.

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
 PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS  
 EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA  
 DE LA PROVINCIA HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

*[Firma]*

**Ing. Indalecio Cabrera Liantoy**  
 CIP. 153115  
 SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## 2.10. META FISICA TOTAL DEL PROYECTO PRODUCTIVO

- ✓ Producción de 454,950 plántones de Pinos en vivero, 500,000 pinos en tubetes y de 203,940 de plantas nativas, para su instalación en 810 Has en total.
- ✓ 576 productores capacitados y organizados en el año 02.
- ✓ Instalación de 05 viveros volantes, los cuales estarán ubicados en el Distrito de Quinua - Huamanga - Ayacucho en las siguientes comunidades campesinas:
  - ✓ COMUNIDAD DE MOYA
  - ✓ COMUNIDAD DE QULLQUITUPO
  - ✓ COMUNIDAD DE QUINUA
  - ✓ COMUNIDAD DE PAMPACHACRA
  - ✓ COMUNIDAD DE PARACCAY
- ✓ Transferencias tecnológicas - 30 Eventos - 01 Pasantías - 05 Asociaciones constituidas.

## 2.11. PLAZO DE EJECUCIÓN

24 meses

## 2.12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Ejecución Presupuestaria Directa (EPD).

## 2.13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.00 Recursos Ordinarios

## 2.14. FECHA DE INICIO Y REINICIO.

1er año : 10 de noviembre del 2023 (Inicio)  
 2do año : 21 de marzo del 2024 (Reinicio)  
 3er año : 24 de enero del 2025 (Reinicio)

## 2.15. FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO

10 de noviembre del 2025

## 2.16. PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO.

CUADRO N° 01. Equipo Técnico Del Proyecto - Enero 2025

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	PROFESION	N° de Colegiatura
1	INDALICIO CABRERA LLANTOY	SUPERVISOR	Ing. Agrónomo	153115
2	LUIS HUANCA MALDONADO	RESIDENTE	Ing. Agrónomo	109066
3	YANET LOPEZ QUISPE	MONITOR FISICO	Ing. Agrónoma	301812
4	MARILU QUINTANILLA FERNANDEZ	MONITOR FINANCIERO	Contadora	
5	AHYOSMERY ÑUFLO MORALES	ADMINISTRATIVO	Contadora	2291

## 2.17. ANTECEDENTES

### APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

Durante el inicio de la ejecución, del Expediente Técnico Matriz del Proyecto: "Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en Apoyo a la Forestación en el Distrito de Quinua - Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho", se aprobaron varias resoluciones, los cuales fueron justificados y aprobados respectivamente.

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRAL  
 PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  
 EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA  
 DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA  
 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD"

Ing. Indalicio Cabrera Llanto  
 C.R. 153115  
 SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"  
**CUADRO 02. Resoluciones de aprobación de presupuesto del proyecto**

ÍTEM	FECHA	DOCUMENTOS	PRESUPUESTO	DETALLE
01	05/09/2024	R.D. N° 368 - 2024-MIDAGRI-PESCS-1601	S/ 4'033,217.63	Exp. Técnico Modificado 01
02	30/07/2024	CARTA MULT. N° 170 - 2024-MIDAGRI-PESCS-1607.	S/ 4'033,217.63	Aprobación del Expediente Técnico Modificado N° 01. (No Significativa)
03	21/09/2023	Resolución Directoral N° 0496-2023-MINAGRI-PESCS-1601	S/ 4'033,217.63	Aprobación del Expediente Técnico Matriz.

1. Se realizó la aprobación de la modificación del "Expediente Técnico Modificado N° 01", por un costo total VR2=S/. 4,033,217.63 soles, manteniendo el mismo techo presupuestal por ser no significativo, el cual fue evaluado por el supervisor del proyecto determinando su aprobación con asiento en cuaderno de obra, el mismo que fue presentado a la DDA adjuntando el Anexo N° 10 de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, para su formalización de la aprobación pertinente del expediente técnico modificado, el mismo que fue aprobado mediante CARTA MULT. N° 170 - 2024-MIDAGRI-PESCS-1607, del 30/07/2024, en el marco de la referida Directiva de la Contraloría General de "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa". Así mismo se ratificó la aprobación con la R.D. N° 368 - 2024-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 05/09/2024.

**CUADRO 03. Resumen presupuesto analítico por específica de gasto de Expediente Técnico modificado**

"RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN APOYO A LA FORESTACION EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"					
PARTIDA	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	COSTO TOTAL
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1,237,664.60	0.00	0.00	1,237,664.60
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,064,036.81	30,506.00	23,640.00	1,118,182.81
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	972,765.54	530,504.69	174,100.00	1,677,370.23
<b>TOTAL</b>		<b>3,274,466.94</b>	<b>561,010.69</b>	<b>197,740.00</b>	<b>4,033,217.63</b>

2. Con Resolución Directoral N° 496-2023-MINAGRI-PESCS-1601, de fecha 21 de setiembre del 2023, se resolvió aprobar el Expediente Técnico de proyecto productivo: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN APOYO A LA FORESTACION EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"- CUI N°2599658; con un presupuesto VR2 de S/ 4,033,217.63.

**CUADRO 04. Resumen presupuesto analítico por específica de gasto**

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO					
PARTIDA	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	TOTAL (S/.)
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1,423,649.37	0.00	0.00	1,423,649.37
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	1,024,776.63	18,768.00	22,700.00	1,066,244.63
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	848,123.63	499,200.00	176,000.00	1,543,323.63
<b>TOTAL</b>		<b>3,296,549.63</b>	<b>517,968.00</b>	<b>198,700.00</b>	<b>4,033,217.63</b>

*[Handwritten signature and official stamp]*  
 PROYECTO TÉCNICO SIEMPRE CON FUERZA  
 MINAGRI - DISTRITO DE QUINUA  
 SUPERVISOR

2.18. PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

EJERCICIO 2025

- 1. Mediante Resolución Directoral N°0016-2025-MIDAGRI-PESCS-1601, con fecha 10 de enero de 2024, fue aprobado el Presupuesto Analítico de gastos 2025 del Proyecto "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON C.U.I. N°2599658, por un monto de **S/. 1,649,433.00** soles de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO 01. Resumen presupuesto analítico por específica de gasto

ECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO					
PARTIDA	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	TOTAL (S/.)
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	636,249.00	-	-	636,249.00
2.6.8.1.4.2	GASTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	393,253.00	4,280.00	-	397,533.00
2.6.3.2.12	MOBILIARIO	579.00			579.00
2.6.3.2.5.2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	402.00			402.00
2.6.8.1.4.3	GASTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -SERVICIOS	379,470.00	193,200.00	42,000.00	614,670.00
	<b>TOTAL S/</b>	<b>1,409,953.00</b>	<b>197,480.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>1,649,433.00</b>

EJERCICIO 2024.

- 1. Mediante Resolución Directoral N° 0548-2024- MINAGRI-PESCS-1601 de fecha 05 de diciembre de 2024, se aprueba la modificación del presupuesto Analítico por específica de gasto Nro. 07, del PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON C.U.I. N° 2599658 Por un monto de **S/. 1,683,387.00**, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO 01. Resumen presupuesto analítico por específica de gasto

ECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO					
PARTIDA	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	TOTAL (S/.)
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	512,727.00	0.00	0.00	512,727.00
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	590,970.01	9,196.00	0.00	600,166.00
2.6.33.2.12	MOLBILIARIO	14,764.00	0.00	0.00	14,764.00
2.6.3.2.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
2.6.33.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS	10,170.00	5,869.00	0.00	16,039.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	243,620.00	191,037.50	101,973.50	536,631.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,375,311.00</b>	<b>206,102.50</b>	<b>101,973.50</b>	<b>1,683,387.00</b>

- 2. Mediante Resolución Directoral N° 0532-2024- MINAGRI-PESCS-1601 de fecha 29 de noviembre de 2024, se aprueba la modificación del presupuesto Analítico por específica de gasto Nro. 06, del PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON C.U.I. N° 2599658 Por un monto de **S/. 1,693,387.00**, de acuerdo al siguiente detalle:

Ing. Indolicio Calvete Llanto
   
 C.I.P. 253215
   
 SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**CUADRO 02. Resumen presupuesto analítico por específica de gasto**

ECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO					
PARTIDA	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	TOTAL (S/.)
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	512,727.00	0.00	0.00	512,727.00
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	590,970.00	9,196.00	0.00	600,166.00
2.6.33.2.12	MOLBILIARIO	14,764.00	0.00	0.00	14,764.00
2.6.3.2.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
2.6.33.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS	10,170.00	5,869.00	0.00	16,039.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	243,620.00	191,037.50	101,973.50	536,631.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,375,311.00</b>	<b>206,102.50</b>	<b>101,973.50</b>	<b>1,683,387.00</b>

3. Mediante Resolución Directoral N° 0428-2024- MINAGRI-PESCS-1601 de fecha 06 de octubre de 2024, se aprueba la modificación del presupuesto Analítico por específica de gasto Nro. 05, del PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON C.U.I. N° 2599658 Por un monto de S/. 1,693,387.00, de acuerdo al siguiente detalle:

**CUADRO 03. Resumen presupuesto analítico por específica de gasto**

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO					VR2
META:	"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	09 MESES	DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONÓMICO		
ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL S/.
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	652,269.00	-	-	652,269.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	464,287.00	10,360.00	-	474,647.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,170.00	6,100.00	-	16,270.00
2.6.3.2.999	MAQUINARIA Y EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OTROS INSTALACIONES	3,060.00	-	-	3,060.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	244,120.00	191,047.50	101,973.50	537,141.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>		<b>1,373,906.00</b>	<b>207,507.50</b>	<b>101,973.50</b>	<b>1,693,387.00</b>

4. Mediante Resolución Directoral N° 0347-2024- MINAGRI-PESCS-1601 de fecha 21 de agosto de 2024, se aprueba la modificación del presupuesto Analítico por específica de gasto Nro. 04, del PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON C.U.I. N° 2599658 Por un monto de S/. 1,213,087.00, de acuerdo al siguiente detalle:

**CUADRO 04. Presupuesto modificado por específica de gasto**

CLASIFIC.	DESCRIPCION	COSTOS DIRECTO	COSTOS INDIRECTOS		TOTAL, COSTO (S/)
			GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISI.	
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,502.00			10,502.00
2.6.3.2.999	MAQUINARIA Y EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OTROS INSTALACIONES	3,150.00			3,150.00
2.6.8.1.4.1	GASTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL	500,012.00	-	-	500,012.00
2.6.8.1.4.2	GASTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-BIENES	248,307.00	7,547.00	-	255,854.00
2.6.8.1.4.3	GASTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-SERVICIOS	13,270.00	271,813.33	158,485.66	443,569.00
<b>TOTAL S/</b>		<b>775,241.00</b>	<b>279,360.34</b>	<b>158,485.66</b>	<b>1,213,087.00</b>

*[Handwritten signature]*  
 Ing. Inadriano Cabrera Llanos  
 C.I.R. 153125  
 SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- 5. Mediante Resolución Directoral N° 0315-2024- MINAGRI-PESCS-1601 de fecha 31 de julio de 2024, se aprueba la modificación del presupuesto Analítico por específica de gasto Nro. 03, del PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON C.U.I. N° 2599658 Por un monto de S/680,000.00
- 6. Mediante Resolución Directoral N° 0204-2024- MINAGRI-PESCS-1601 de fecha 15 de mayo de 2024, se aprobó la segunda Modificación del Presupuesto Analítico por específicas de Gasto N° 02, ejercicio - 2024, del proyecto de Inversión Pública "Recuperación de los servicios ecosistémicos en apoyo a la forestación en el distrito de Quinua de la provincia de Huamanga – departamento de Ayacucho" con C.U.I. N° 2599658, un monto de 680,000.00 soles

CUADRO N° 05. Presupuesto modificado por específicas de gasto n° 2

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO					
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA 05 MESES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONÓMICO					
ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL S/.
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	164,413.00	-	-	164,413.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	237,397.00	5,438.00	-	242,835.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,502.00			10,502.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	15,270.00	160,613.31	86,366.69	262,250.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>		<b>427,582.00</b>	<b>166,051.31</b>	<b>86,366.69</b>	<b>680,000.00</b>

- 7. Mediante RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL N°046-2024-MIDAGRI-SG de fecha 10 de mayo de 2024, se aprueba la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en el presupuesto institucional del pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en el cual se asigna S/. 180,000.00 para el proyecto: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2599658.
- 8. Mediante Resolución Directoral N°159-2024-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 16 de abril de 2024, se aprueba la rectificación del Presupuesto Analítico por específica de gasto N°01 del Proyecto de Inversión: "PROYECTO RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N°2442929
- 9. Con fecha de 11 de abril del 2024, mediante Resolución Directoral N° 0159-2024-MIDAGRI-PESCS-1601, se aprueba la primera modificación del presupuesto analítico por específica de gastos N° 01, ejercicio - 2024 del Proyecto Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en Apoyo a la Forestación en el Distrito de Quinua - Provincia De Huamanga Departamento de Ayacucho" CUI N° 2599658, bajo la administración directa. Para el presente año fiscal 2024, se tiene un presupuesto asignado en el PIM S/ 500,00.00, para la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las metas programadas para su ejecución. De acuerdo al siguiente detalle:

Ing. Inés Linares
   
 CIP. 35315
   
 SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"  
**CUADRO N° 06. Presupuesto modificado por específicas de gasto N° 01**

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO					
<b>META:</b> "Recuperación de los servicios Ecosistémicos en apoyo a la Forestación en el distrito de Quinua de la Provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho"		03 MESES	DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO		
ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL S/.
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	129,236.00			129,236.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	192,912.00	1,374.00		194,286.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,502.00			10,502.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,350.00	99,900.00	56,100.00	167,350.00
<b>TOTAL REQUERIMIENTO S/.</b>		<b>344,000.00</b>	<b>101,274.00</b>	<b>56,100.00</b>	<b>500,000.00</b>

10. Con fecha de 13 de marzo del 2024, mediante Resolución Directoral N° 0113-2024-MIDAGRI-PESCS-1601, se aprueba el presupuesto analítico por específica de gastos del Proyecto: "Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en Apoyo a la Forestación en el Distrito de Quinua - Provincia De Huamanga Departamento de Ayacucho" CUI N° 2599658, bajo la administración directa. Para el presente año fiscal 2024, se tiene un presupuesto asignado en el PIM S/ 500,00.00, para la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las metas programadas para su ejecución. De acuerdo al siguiente detalle:

**CUADRO N°07. Presupuesto por específicas de gasto - PIM 2024**

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO					
<b>META:</b> "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN APOYO A LA FORESTACION EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"		03 MESES	DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO		
ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL S/.
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	129,236.00	-	-	129,236.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	191,538.00	1,374.00	-	192,912.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,502.00			10,502.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	11,350.00	99,900.00	56,100.00	167,350.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>		<b>342,626.00</b>	<b>101,274.00</b>	<b>56,100.00</b>	<b>500,000.00</b>

11. Mediante Resolución Directoral N°106-2024-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 12 de marzo de 2024, se autoriza a la dirección de desarrollo Agroeconómico el reinicio de la ejecución física del proyecto de inversión pública "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON C.U.I. N°2599658.


**EJERCICIO 2023.**

- Mediante Resolución Directoral N° 496-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 21 de setiembre del 2023, se aprueba el expediente técnico del proyecto "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" por un monto de S/. 4,033,217.63, para su ejecución por modalidad de EPD, con plazo de ejecución de 24 meses.
- Para el ejercicio 2023 se aprobó la incorporación de recursos en el PIM una asignación presupuestal de S/. 90,000.00 en la fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios, para su ejecución por EPD.

PROYECTO FONDS AL CUESTA CENTRO SUR  
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"  
 Ing. Indalecio G. García Llanos  
 CUI. 15313  
 SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"  
**CUADRO N°08.** Resumen de presupuesto analítico por específica de gasto 2023

CLASIFIC.	DESCRIPCION	COSTOS DIRECTO	COSTOS INDIRECTOS		TOTAL, COSTO (S/)
			GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- <b>PERSONAL</b>	41,177.00			41,177.00
2.6.8.1.4.2	GASTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- <b>BIENES</b>	14,023.00			14,023.00
2.6.8.1.4.3	GASTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- <b>SERVICIOS</b>	34,800.00			34,800.00
	<b>TOTAL S/</b>	<b>90,000.00</b>	<b>166,051.31</b>	<b>86,366.69</b>	<b>90,000.00</b>

  
.....  
Ing. Indulcio Cabrera Zúñiga  
CIP. 183115  
SUPERVISOR

**2.0 METRADO FISICO SEGÚN  
EXPEDIENTE TÉCNICO**

**PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA  
FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA  
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

2.1. El Metrado físico total del Expediente técnico modificado aprobado con RD N° 368 -2024 MIDAGRI-PESCS-1601, del 05/09/2024, es según detalle siguiente:

**CUADRO 01. Metrado Físico Total Programado**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO
<b>01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.01	CARTEL DE OBRA	und	5.00
<b>02</b>	<b>INSTALACION FORESTAL</b>		
<b>02.01</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIVEROS VOLANTES</b>		
<b>02.01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	9,774.51
02.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DEL TERRENO	m2	9,774.51
02.01.01.03	CORTE Y EXCAVACION DE TERRENO CON MAQUINARIA	m3	1,629.09
02.01.01.04	NIVELACION Y APISONADO	m2	7,639.83
02.01.01.05	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO	m	1,016.70
02.01.01.06	PORTON DE INGRESO AL VIVERO FORESTAL	und	5.00
02.01.01.07	EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO	m3	12.10
02.01.01.08	CONFORMACION DE CAPA GRANULAR E=0.1	m2	460.00
02.01.01.09	CONSTRUCCION DE RESERVORIO RUSTICO PARA AGUA	und	5.00
<b>02.01.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
02.01.02.01	DADOS DE CONCRETO SIMPLE Fc=140 kg/cm2+25%PM	m3	13.43
<b>02.02</b>	<b>CONSTRUCCION DE ALMACEN Y SERVICIOS BASICOS</b>		
<b>02.02.01</b>	<b>CONSTRUCCION DE ALMACEN</b>		
<b>02.02.01.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
02.02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	77.70
<b>02.02.01.02</b>	<b>CIMIENTOS</b>		
02.02.01.02.01	CIMENTACION	m3	49.95
<b>02.02.01.03</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>		
02.02.01.03.01	MUROS DE ADOBE	m2	454.26
<b>02.02.01.04</b>	<b>ESTRUCTURA Y COBERTURA PARA TECHO</b>		
02.02.01.04.01	TECHO DE MADERA CON CALAMINA	und	5.00
<b>02.02.01.05</b>	<b>CARPINTERIA</b>		
02.02.01.05.01	PUERTA	und	5.00
02.02.01.05.02	VENTANA	und	5.00
<b>02.02.01.06</b>	<b>ACABADOS</b>		
02.02.01.06.01	FALSO PISO E=0.15 M.	m2	83.67
02.02.01.06.02	TARRAJEO ZOCALO	m2	51.30
02.02.01.06.03	TARRAJEO PARED	m2	221.50
<b>02.02.01.07</b>	<b>IMPLEMENTACION DE ALMACEN</b>		
02.02.01.07.01	IMPLEMENTACION DE ALMACEN	Modulo	5.00
<b>02.02.02</b>	<b>CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS</b>		
<b>02.02.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
02.02.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	20.80
02.02.02.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	11.20
02.02.02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M (AMANO C/CARRETILLA)	m3	11.20
02.02.02.01.04	REFINE Y NIVELACION DE HOYO	m2	40.00
<b>02.02.02.02</b>	<b>PREPARACION DE LA BASE DE APOYO</b>		
02.02.02.02.01	TRONCO MADERA EUCALIPTO D=6" (INCLUIDO EMPALME CON CASETA)	m	5.00
<b>02.02.02.03</b>	<b>CONSTRUCCION DE LA CASETA PARA LETRINA</b>		
02.02.02.03.01	CASETA DE MADERA Y CALAMINA GALV. PARA LETRINAS	und	5.00
02.02.02.03.02	PUERTA DE MADERA CON CALAMINA GALV. 1.8MX.80M	und	5.00
02.02.02.03.03	COBERTURA CON PLANCHA DE CALAMINA DE 1.8MX0.80 M	und	5.00
<b>02.02.02.04</b>	<b>INSTALACION DE TUBERIAS DE VENTILACION</b>		
02.02.02.04.01	SALIDA DE VENTILACION PARA LETRINA Ø 4"	und	5.00
<b>02.03</b>	<b>CONSTRUCCION DE CAMAS DE ALMACIGO Y REPIQUE</b>		
02.03.01	CONSTRUCCION DE CAMAS DE ALMACIGO EN PLATABANDAS	m2	250.00
02.03.02	CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE A NIVEL DEL SUELO	m2	1,676.00
<b>02.04</b>	<b>CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE REPIQUE</b>		
02.04.01	DOBLADO DE TUBO F°G° D=3/4"	und	336.00
02.04.02	ANCLAJE DE COBERTURA	und	746.00
02.04.03	MONTAJE DE ARCOS DE TUBO F°G° D=3/4"	und	373.00
02.04.04	TENDIDO DE MALLA RASCHELL	m2	8,145.43
<b>02.05</b>	<b>MANTENIMIENTO DE VIVEROS VOLANTES</b>		
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VIVEROS VOLANTES	mes	18.00
<b>02.06</b>	<b>PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO</b>		
<b>02.06.01</b>	<b>PRODUCCION DE PLANTONES</b>		
02.06.01.01	ALMACIGO DE SEMILLAS DE PINO	m2	182.00

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
 EN EL CANTON DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
 DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABALLERÍA  
 INGENIERO SUPERVISOR  
**Ing. Indalicio Cobrea Llantoy**  
 CIP. 153115  
 SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO
02.06.01.02	PREPARACION DE SUSTRATO PARA ALMACIGO	m3	54.60
02.06.01.03	PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE DE PINO	m3	306.00
02.06.01.04	EMBOLSADO DE SUSTRATO PARA PINO	mll	454.95
02.06.01.05	ENFILADO DE BOLSAS	mll	454.95
02.06.01.06	REPIQUE DE PLANTULAS DE PINO	mll	454.95
02.06.01.07	MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS	mll	454.95
02.06.01.08	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS	mll	454.95
02.06.01.09	MANEJO FISIONUTRICIONAL	mll	454.95
02.06.01.10	REMOCION Y SELECCION DE PLANTONES	mll	454.95
02.06.01.11	DESHIERBO EN CAMAS DE REPIQUE	m2	2,297.73
02.06.01.12	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO VIVERO	glb	5.00
02.06.01.13	PRODUCCION DE PLANTONES EN TUBETES	glb	1.00
<b>02.06.02</b>	<b>ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES</b>		
02.06.02.01	TRAZO Y MARCACION PARA EXCAVACION DE HOYOS	ha	290.00
02.06.02.02	APERTURA DE HOYOS	mll	372.07
02.06.02.03	TRASLADO DE PLANTONES	mes	4.00
02.06.02.04	ESTABLECIMIENTO EN CURVAS A NIVEL	ha	290.00
02.06.02.05	TRASLADO, ESTABLECIMIENTO Y RIEGO VOLANTE DE PLANTONES	mll	500.00
02.06.02.06	CARGUIO Y DESCARGUE DE PLANTONES DE PINO	mll	872.44
02.06.02.07	CERCO DE PROTECCION DE PLANTACIONES DE PINOS	m	10,500.00
<b>02.07</b>	<b>PRODUCCION DE PLANTONES DE QUEÑUA Y COLLE</b>		
<b>02.07.01</b>	<b>PRODUCCION DE PLANTONES</b>		
02.07.01.01	RECOLECCION DE ESQUEJES DE QUEÑUA Y COLLE	mll	203.94
02.07.01.02	PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE DE QUEÑUA Y COLLE	m3	168.00
02.07.01.03	EMBOLSADO DE SUSTRATO PARA QUEÑUA Y COLLE	mll	203.94
02.07.01.04	ENFILADO DE BOLSAS	mll	203.94
02.07.01.05	MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS	mll	203.94
02.07.01.06	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS	mll	203.94
02.07.01.07	MANEJO FISIONUTRICIONAL	mll	203.94
02.07.01.08	REMOCION Y SELECCION DE PLANTONES	mll	203.94
02.07.01.09	DESHIERBO EN CAMAS DE REPIQUE	m2	1,031.00
<b>02.07.02</b>	<b>ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES</b>		
02.07.02.01	TRAZO Y MARCACION PARA EXCAVACION DE HOYOS	ha	130.00
02.07.02.02	APERTURA DE HOYOS	mll	166.79
02.07.02.03	TRASLADO DE PLANTONES	mes	4.00
02.07.02.04	ESTABLECIMIENTO EN CURVAS A NIVEL	ha	130.00
<b>02.08</b>	<b>MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES</b>		
02.08.01	MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES	mes	12.00
02.08.02	CERCO DE PROTECCION DE PLANTACIONES DE QUEÑUA Y COLLE	m	5,000.00
<b>03</b>	<b>TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA</b>		
<b>03.01</b>	<b>ASISTENCIA TÉCNICA</b>		
03.01.01	PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA	mes	22.00
03.01.02	CURSO TALLER EN MANEJO FORESTAL	Evento	30.00
03.01.03	PASANTIA A LUGARES EXITOSOS	vje	1.00
03.01.04	DIFUSION	glb	1.00
<b>03.02</b>	<b>ORGANIZACION</b>		
03.02.01	CONSTITUCION DE ASOCIACIONES	asoc.	5.00
<b>03.03</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>		
03.03.01	EQUIPAMIENTO	Modulo	1.00
<b>03.04</b>	<b>ANALISIS DE SUELO</b>		
03.04.01	ANALISIS DE SUELO	und	20.00

  
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
 PROYECTO ESPECIAL PARA LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS  
 EN EL DISTRITO DE QUINUA  
 Ing. **Mauro Lantoy**  
 CIP. 153115  
 SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

2.2. Metrados Programados para la ejecución del presente año, según el presupuesto asignado en el PIM 2025, se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO 02: METRADO PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2025

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO
01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.01	CARTEL DE OBRA		
02	<b>INSTALACION FORESTAL</b>	und	-
02.01	<b>CONSTRUCCION DE VIVEROS VOLANTES</b>		
02.01.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	-
02.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DEL TERRENO	m2	-
02.01.01.03	CORTE Y EXCAVACION DE TERRENO CON MAQUINARIA	m3	-
02.01.01.04	NIVELACION Y APISONADO	m2	0.00
02.01.01.05	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO	m	-
02.01.01.06	PORTON DE INGRESO AL VIVERO FORESTAL	und	-
02.01.01.07	EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO	m3	1.60
02.01.01.08	CONFORMACION DE CAPA GRANULAR E=0.1	m2	30.00
02.01.01.09	CONSTRUCCION DE RESERVORIO RUSTICO PARA AGUA	und	-
02.01.02	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
02.01.02.01	DADOS DE CONCRETO SIMPLE Fc=140 kg/cm2+25%PM	m3	1.83
02.02	<b>CONSTRUCCION DE ALMACEN Y SERVICIOS BASICOS</b>		
02.02.01	<b>CONSTRUCCION DE ALMACEN</b>		
02.02.01.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
02.02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	-
02.02.01.02	<b>CIMENTOS</b>		
02.02.01.02.01	CIMENTACIÓN	m3	-
02.02.01.03	<b>MAMPOSTERIA</b>		
02.02.01.03.01	MUROS DE ADOBE	m2	-
02.02.01.04	<b>ESTRUCTURA Y COBERTURA PARA TECHO</b>		
02.02.01.04.01	TECHO DE MADERA CON CALAMINA	und	-
02.02.01.05	<b>CARPINTERIA</b>		
02.02.01.05.01	PUERTA	und	-
02.02.01.05.02	VENTANA	und	-
02.02.01.06	<b>ACABADOS</b>		
02.02.01.06.01	FALSO PISO E=0.15 M.	m2	-
02.02.01.06.02	TARRAJEO ZOCALO	m2	-
02.02.01.06.03	TARRAJEO PARED	m2	-
02.02.01.07	<b>IMPLEMENTACION DE ALMACÉN</b>		
02.02.01.07.01	IMPLEMENTACIÓN DE ALMACÉN	Modulo	2.13
02.02.02	<b>CONSTRUCCION DE SERVICIOS BÁSICOS</b>		
02.02.02.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
02.02.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	-
02.02.02.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	-
02.02.02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M (AMANO C/CARRETILLA)	m3	-
02.02.02.01.04	REFINE Y NIVELACION DE HOYO	m2	-
02.02.02.02	<b>PREPARACION DE LA BASE DE APOYO</b>		
02.02.02.02.01	TRONCO MADERA EUCALIPTO D=6" (INCLUIDO EMPALME CON CASETA)	m	-
02.02.02.03	<b>CONSTRUCCION DE LA CASETA PARA LETRINA</b>		
02.02.02.03.01	CASETA DE MADERA Y CALAMINA GALV. PARA LETRINAS	und	-
02.02.02.03.02	PUERTA DE MADERA CON CALAMINA GALV. 1.8MX.80M	und	-
02.02.02.03.03	COBERTURA CON PLANCHA DE CALAMINA DE 1.8MX0.80 M	und	-
02.02.02.04	<b>INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE VENTILACIÓN</b>		
02.02.02.04.01	SALIDA DE VENTILACIÓN PARA LETRINA Ø 4"	und	-
02.03	<b>CONSTRUCCION DE CAMAS DE ALMÁCIGO Y REPIQUE</b>		
02.03.01	CONSTRUCCIÓN DE CAMAS DE ALMÁCIGO EN PLATABANDAS	m2	-
02.03.02	CONSTRUCCIÓN DE CAMAS DE REPIQUE A NIVEL DEL SUELO	m2	276.00
02.04	<b>CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE REPIQUE</b>		
02.04.01	DOBLADO DE TUBO F°G° D=3/4"	und	36.00
02.04.02	ANCLAJE DE COBERTURA	und	406.00
02.04.03	MONTAJE DE ARCOS DE TUBO F°G° D=3/4"	und	203.00
02.04.04	TENDIDO DE MALLA RASHELL	m2	4,433.04
02.05	<b>MANTENIMIENTO DE VIVEROS VOLANTES</b>		
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VIVEROS VOLANTES	mes	11.00
02.06	<b>PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO</b>		


  
 Ing. Indalecio Cabrera Llantoy
   
 CIP. 153115
   
 SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO
02.06.01	<b>PRODUCCION DE PLANTONES</b>		
02.06.01.01	ALMACIGO DE SEMILLAS DE PINO		
02.06.01.02	PREPARACION DE SUSTRATO PARA ALMACIGO	m2	103.00
02.06.01.03	PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE DE PINO	m3	13.10
02.06.01.04	EMBOLSADO DE SUSTRATO PARA PINO	m3	26.00
02.06.01.05	ENFILADO DE BOLSAS	mll	306.55
02.06.01.06	REPIQUE DE PLANTULAS DE PINO	mll	306.55
02.06.01.07	MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS	mll	306.55
02.06.01.08	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS	mll	314.95
02.06.01.09	MANEJO FISIONUTRICIONAL	mll	314.95
02.06.01.10	REMOCION Y SELECCION DE PLANTONES	mll	314.95
02.06.01.11	DESHIERBO EN CAMAS DE REPIQUE	mll	384.95
02.06.01.12	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO VIVERO	m2	2,027.73
02.06.01.13	PRODUCCION DE PLANTONES EN TUBETES	glb	5.00
02.06.02	<b>ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES</b>	glb	0.46
02.06.02.01	TRAZO Y MARCACION PARA EXCAVACION DE HOYOS		-
02.06.02.02	APERTURA DE HOYOS	ha	230.00
02.06.02.03	TRASLADO DE PLANTONES	mll	340.07
02.06.02.04	ESTABLECIMIENTO EN CURVAS A NIVEL	mes	4.00
02.06.02.05	TRASLADO, ESTABLECIMIENTO Y RIEGO VOLANTE DE PLANTONES	ha	266.62
02.06.02.06	CARGUIO Y DESCARGUE DE PLANTONES DE PINO	mll	500.00
02.06.02.07	CERCO DE PROTECCION DE PLANTACIONES DE PINOS	mll	842.44
02.07	<b>PRODUCCION DE PLANTONES DE QUEÑUA Y COLLE</b>	m	10,500.00
02.07.01	<b>PRODUCCION DE PLANTONES</b>		
02.07.01.01	RECOLECCION DE ESQUEJES DE QUEÑUA Y COLLE		
02.07.01.02	PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE DE QUEÑUA Y COLLE	mll	148.94
02.07.01.03	EMBOLSADO DE SUSTRATO PARA QUEÑUA Y COLLE	m3	122.00
02.07.01.04	ENFILADO DE BOLSAS	mll	148.94
02.07.01.05	MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS	mll	148.94
02.07.01.06	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS	mll	148.94
02.07.01.07	MANEJO FISIONUTRICIONAL	mll	148.94
02.07.01.08	REMOCION Y SELECCION DE PLANTONES	mll	148.94
02.07.01.09	DESHIERBO EN CAMAS DE REPIQUE	mll	123.94
02.07.02	<b>ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES</b>	m2	911.00
02.07.02.01	TRAZO Y MARCACION PARA EXCAVACION DE HOYOS		148.94
02.07.02.02	APERTURA DE HOYOS	ha	120.00
02.07.02.03	TRASLADO DE PLANTONES	mll	166.79
02.07.02.04	ESTABLECIMIENTO EN CURVAS A NIVEL	mes	4.00
02.08	<b>MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES</b>	ha	130.00
02.08.01	MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES		
02.08.02	CERCO DE PROTECCION DE PLANTACIONES DE QUEÑUA Y COLLE	mes	12.00
03	<b>TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA</b>	m	5,000.00
03.01	<b>ASISTENCIA TÉCNICA</b>		
03.01.01	PRESTACION DE ASISTENCIA TÉCNICA		
03.01.02	CURSO TALLER EN MANEJO FORESTAL	mes	14.00
03.01.03	PASANTIA A LUGARES EXITOSOS	Evento	10.00
03.01.04	DIFUSION	vje	1.00
03.02	<b>ORGANIZACION</b>	GBL	1.00
03.02.01	CONSTITUCION DE ASOCIACIONES		
03.03	<b>EQUIPAMIENTO</b>	asoc.	-
03.03.01	EQUIPAMIENTO		
03.04	<b>ANALISIS DE SUELO</b>	Modulo	0.05
03.04.01	ANALISIS DE SUELO	und	10.00


  
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRAL SUR
   
 PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMATICOS
   
 EN APOYO A LA TRANSACCION EN EL DISTRITO DE QUINUA
   
 PESCA DE LA PROVINCIA DE TACNA
   
 Ing. Indalicio Cabrera Llanto
   
 CIP. 353115
   
 SUPERVISOR

## **3.0 ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO**

**PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA  
FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA  
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

### 3.1 DESCRIPCION DE PARTIDAS EJECUTADAS Y ENCONTRADAS DURANTE EL DIAGNOSTICO.

Durante el diagnostico situacional se encontró los siguientes:

#### 01.01 CARTEL DE OBRA

Se constató 5 careles de obra instalados en las entradas de los viveros en las comunidades de Moya, Quinoa, Ccollquitupo, Pampachacra y Paraccay, los cuales se encuentran fijados en postes de madera reforzados con cintas de eucalipto.



#### 02. INSTALACION FORESTAL

##### 02.01.01.06. PORTON DE INGRESO AL VIVERO FORESTAL

Se encontró 5 portones de dos hojas, para el ingreso y seguridad en los viveros forestales ubicados en las comunidades de Moya, Quinoa, Ccollquitupo, Pampachacra y Paraccay; el cual está soportado y articulado con bisagra en rollizo de eucalipto de D=6" y longitud 4.0 m; cada puerta de dos hojas de 2.5 m de ancho x 3 m de altura, elaborado con marcos de madera y con planchas de calamina




PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERIA  
DIRECCION REGIONAL DE FORESTALIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE QUINUA  
*[Signature]*  
Ing. Inalicio Cabrera Llantoy  
C.P. 153115  
SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**02.01.01.08 CONFORMACION DE CAPA GRANULAR E=0.1**

Se evidenció una capa de material granular, de espesor 10 cm, compuesta de grava y/o piedra fracturada en forma natural o artificial; construida sobre una superficie debidamente preparada. Específicamente esta partida se constató ya ejecutadas en los 5 viveros básicamente esparcidos en las calles de las camas de repique en las comunidades de Moya, Quinua, Ccollquitupo, Pampachacra y Paraccay, en un área de 430 m<sup>2</sup>

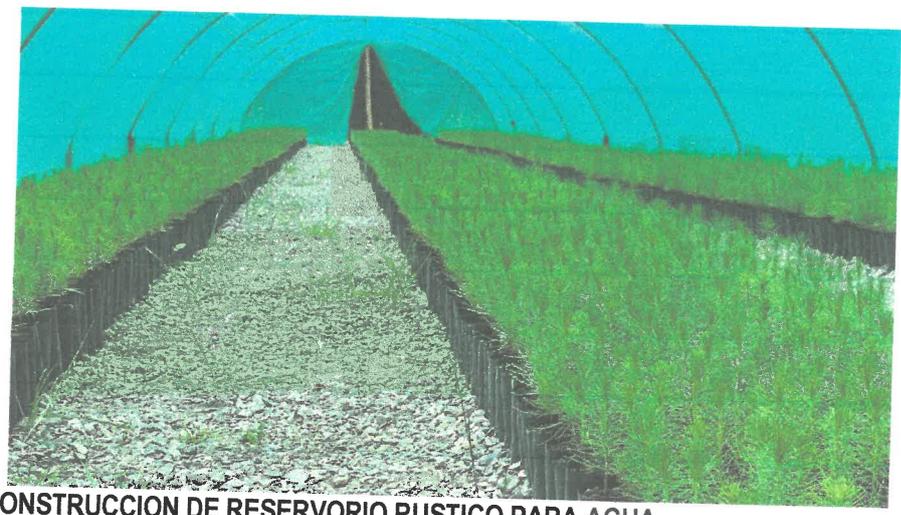

**02.01.01.09 CONSTRUCCION DE RESERVORIO RUSTICO PARA AGUA**

Se logró evidenciar reservorio rústico construido en los 5 viveros de Moya, Quinua, Ccollquitupo, Pampachacra y Paraccay , para el agua de riego de los plantones pino y nativas,



**02.02.01.04.01 TECHO DE MADERA CON CALAMINA**

Se evidenció 5 sub almacenes techados con calamina en los 5 viveros de las comunidades de Moya, y Paraccay, pertenecientes al distrito de Quinua. Cuya infraestructura está a base de adobe y con largueros de madera.

  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
INSTITUTO REGIONAL DE OBREROS Y EMPLEADOS ECONÓMICOS  
DEL SUR DE LA TUMACAJI  
PERÚ - BELLA VISTA DE HUAYAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
**Ing. Indalicio Cabrera Lisatoy**  
CIP. 153115  
SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**02.02.01.05.01 PUERTA DE SUB ALMACENES**

Se encontró la existencia de 5 puertas de calamina de dimensión: 1.9mx0.8m. los cuales se encuentran instalados en en las comunidades de Moya, Quinua, Ccollquitupo, Pampachacra y Paraccay, pertenecientes al distrito de Quinua.

**02.02.01.05.02 VENTANAS DE LOS SUB ALMACENES**

Se evidenció 5 ventanas instalados de dimensión: 1.5m x 0.8m que en el plano aparece indicada. en las comunidades de Moya, Quinua, Ccollquitupo, Pampachacra y Paraccay, pertenecientes al distrito de Quinua.



**02.02.01.06.01 FALSO PISO E=0.15 M.**

Se constató 83.67 m2 en total en los 5 viveros de Moya, Quinua, Ccollquitupo, Pampachacra y Paraccay



**02.02.01.06.02 TARRAJEO ZOCALO DE LOS SUB ALMACENES.**

Esta partida se constató que se encuentra ejecutada en los 5 viveros de Moya, Quinua, Ccollquitupo, Pampachacra y Paraccay

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMATICOS  
EN APOYO A LA FOP ESTACIONES EN EL DISTRITO DE QUINUA  
DADA LA ORDENANZA DE HUASICHACA DEL GOBIERNO DE AYACUCHO  
*[Signature]*  
**Ing. Edualicio Cabrera Llantoy**  
CIP. 153115  
SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


**02.02.01.06.03 TARRAJEO PARED DE LOS SUB ALMACENES**

Al momento del diagnóstico se encontró a los 5 sub almacenes tarrajeados con yeso en los viveros y comunidades de Moya, Quinua, Ccollquitupo, Pampachacra y Paraccay



**02.02.01.07.01. IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACEN**

Se encontró implementado en los sub almacenes de los 05 viveros (Moya, Quinua, Ccollquitupo, Pampachacra y Paraccay), con materiales: plumón grueso acrílico, papel bond A-4, papelógrafo, mesa de madera tornillo 2.0 x 1.0 m., pizarra acrílica 1.2 m. x 2.4 m., silla de madera, estante de madera tornillo de a= 1.0 m. x h=1.8 m., timbo de 60 gl;

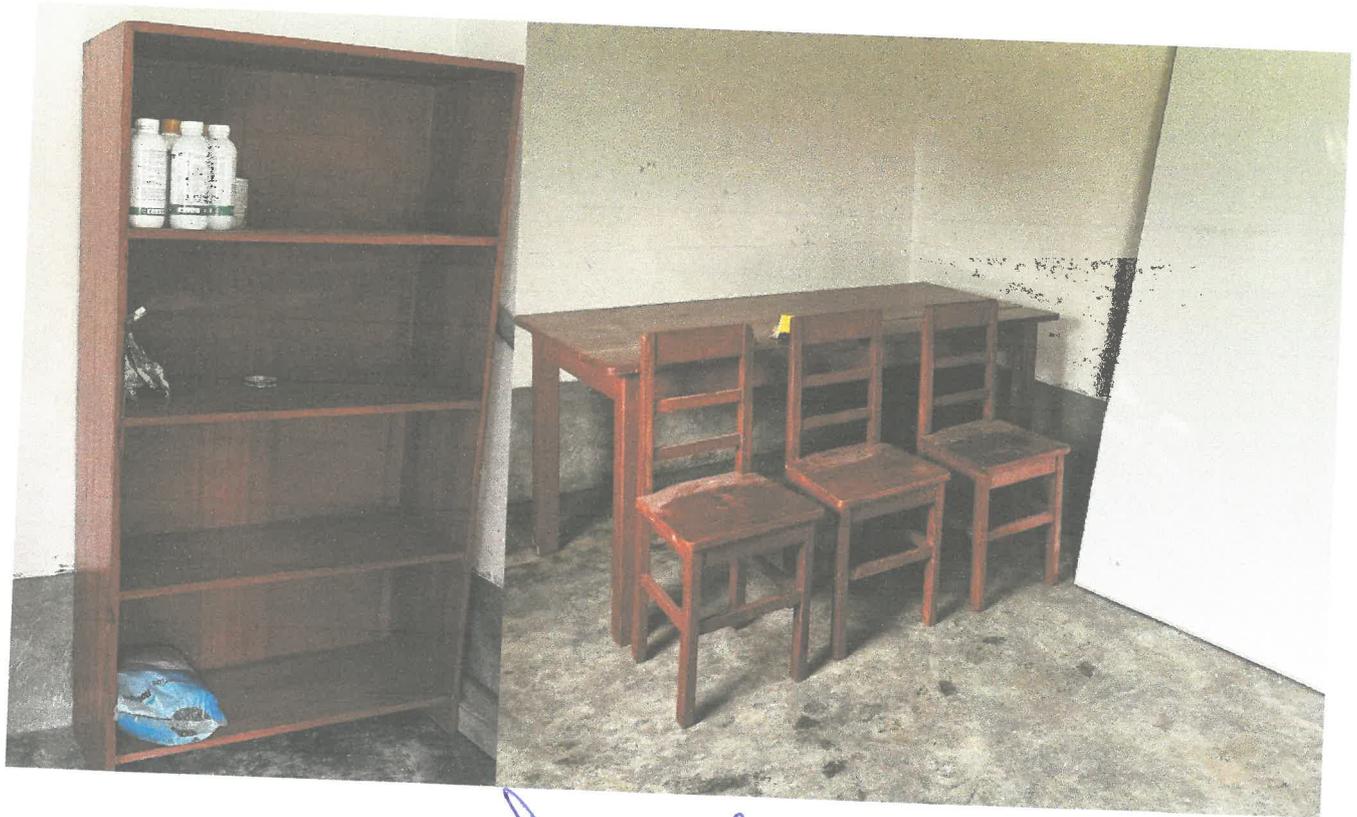

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
PREVENCIÓN Y CUIDADO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS  
EN EL AREA DE SERVICIOS DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS  
DE LA SIERRA CENTRO SUR  
DE LA INSTITUCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE LA SIERRA  
DE LA INSTITUCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE LA SIERRA  
DE LA INSTITUCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE LA SIERRA  
Ing. Indalecio Cabrera Liantoy  
CIP. 193115  
SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**02.02.02.03.01 CASETA DE MADERA Y CALAMINA GALV. PARA LETRINAS**

Se pudo constatar las 05 casetas -letrinas con sus respectivos puertas de madera y calamina,techado con plancha de calamina, con sus respectivos salidas cpara ventilación contubos de pvc de 4 pulgadas de diametro en los viveros de las comunidades de Moya, Quinua, Ccollquitupo, Pampachacra y Paraccay.



**VIVEROS VOLANTES**

Se pudo evidenciar 05 viveros volantes en las comunidades de Moya, Quinua, Ccollquitupo, Pampachacra y Paraccay., cuya infraestructura está a base de tubos galvanizados en forma de arcos, se confirma que son viveros volantes en forma de túneles, recubiertos con malla raschel y agrofilm. En cuyo interior se constató existencia de plantones de pino y quenhua en pleno crecimiento con una altura de 30 a 40 cm en promedio, ya listos y aptos para la instalación en el campo definitivo



*[Handwritten signature]*  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PERÚ  
PESCS  
CENTRO SUR  
Ing. Indalecio Cabrera Llantoy  
DIP. 153115  
SUPERVISOR

### PRODUCCIÓN DE PLANTONES EN TUBETES

Se visitó a las instalaciones de Vivero forestal de AGRORURAL, donde se constató la existencia de plantones de pino en tubetes en pleno crecimiento con una altura de 45 cm en promedio, ya listos y aptos para la instalación en el campo definitivo, se pudo recavar la información de que esta producción es en cumplimiento del convenio celebrado con el Proyecto Especial Sierra Centro Sur organismo ejecutor del proyecto.



### APERTURA DE HOYOS Y ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES DE PINO

Se constató hoyos aperturados y plantados con plantones de pino en las alturas del distrito de Quinua y en la comunidad de Ccolqitupo, se recorrió los sectores de Pallca, yanacocha grande, sector de Ccolqitupo, constatándose que los plantones de pino ya está en pleno prendimiento y crecimiento ya en el campo definitivo en promedio se pudo calcular que hay 30 millares de pino en 23.38 has



### EQUIPAMIENTO

En los 5 viveros se pudo evidenciar mochilas fumigadoras herramientas manuales, los cules están en los sub almacenes correspondientes a cada vivero de las comunidades de Moya, Quinua, Ccolqitupo, Pampachacra y Paraccay.

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS  
EN EL DISTRITO DE QUINUA  
DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE QUINUA  
SECRETARÍA DE AYACUCHO

*[Handwritten Signature]*

Ing. Indalicio Cabrera Llantoy  
C.P. 153115  
SUPERVISOR

## **4.0 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y OTROS**

**PROYECTO:** "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

**4.1 DETALLES DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS EN EL ALMACÉN CENTRAL:**

Se pudo constatar en el almacén central de Quinua los siguientes según el detalle:

ITEM	DETALLES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
<b>MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COBERTURA Y FERRETERIA</b>				
1	CLAVO DE FIERRO DE 2"	5	KILOS	NUEVO
2	GRAPA DE ACERO GALVANIZADO 1"	39	KILOS	NUEVO
3	TUBO DE PVC 1/2" X 5 MT-PACVO	3	UNIDAD	NUEVO
4	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 1" X 6 MTS - NACIONAL	6	UNIDAD	NUEVO
5	ZARANDA DE METAL 3/8 X 1.0 MT 1.50 MTS	3	UNIDAD	NUEVO
6	WINCHA DE 60 METROS STANLEY	1	UNIDAD	NUEVO
7	ALAMBRES DE ACERO CON PUAS - ANDINO	50	UNIDAD	NUEVO
8	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N°14 - NACIONAL	100	KILOS	NUEVO
9	HILO DE NAYLON N°30X100 MT IMPORTADO	4	UNIDAD	NUEVO
10	PEGAMENTO PARA PVC 1/32 GL- OATEY	3	UNIDAD	NUEVO
11	REGADERA GALVANIZADA DE 5 LITROS - IMPORTADO	12	UNIDAD	NUEVO
12	SOGA DE NAILON PABLO N°18	2600	METROS	NUEVO
13	TANQUE DE PVC ROTOPLAST DE 1500 LITROS	2	UNIDAD	NUEVO
14	CEMENTO PORTLAND TIPO I - ANDINO	2125	KILOS	NUEVO
15	YESO POR 25 KILOS	30	UNIDAD	NUEVO
16	TIJERA PARA PODAR GRANDE	12	UNIDAD	NUEVO
17	TIJERA PARA PODAR GRANDE	12	UNIDAD	NUEVO
18	PERFIL SUJETADOR DE ALUMINIO PARA MALLA RASCHELL-NACIONAL	500	UNIDAD	NUEVO
19	GRAPA DE ACERO GALVANIZADO 1" - NACIONAL	90	KILOS	NUEVO
20	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 "X 100 MTS - NACIONAL	9	UNIDAD	NUEVO
21	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2" - NICOLL	125	UNIDAD	NUEVO
<b>MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COBERTURA</b>				
22	BOLSA DE POLIETILENO 3UM X 5" X 6MM COLOR NEGRO	45000	MILLAR	NUEVO
23	BOLSA DE POLIETILENO 3UM X 5" X 8" CON FUELLE DE 6MM	103	MILLAR	NUEVO
24	BOLSA DE POLIETILENO 2UM X 4" X 7" - NACIONAL	268	MILLAR	NUEVO
25	PLASTICO DOBLE ANCHO 2 X 3 X 100 MTS	3	UNIDAD	NUEVO
26	PLASTICO POLIETILENO 10UM X 6 MT X 50 MTS - ELITEC	5	UNIDAD	NUEVO
27	MALLA RASCHELL 65% 4.2 N X 100 MTS - POLIBAG	3	UNIDAD	NUEVO
28	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 "X 100 MTS - QUIVER	17	UNIDAD	NUEVO
29	MANGUERA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 1" X 100 MT	10	UNIDAD	NUEVO
30	CODO PARA SOLDAR O PEGAR SAP 1/2" X 90 ° PACVO	250	UNIDAD	NUEVO
31	TUBO DE PVC 1/2" X 5 MT-NICOLL	100	UNIDAD	NUEVO
32	MALLA GANADERA DE ACERO GALVANIZADO 1.20 X 100 MTS - PRODAC	72	UNIDAD	NUEVO
33	MANGUERA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 1" X 100 MT	10	UNIDAD	NUEVO
34	PLASTICO POLIETILENO 10UM X 6 MT X 50 MTS - NACIONAL	2	UNIDAD	NUEVO
35	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 1" X 6 MTS - NACIONAL	8	UNIDAD	NUEVO
36	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 3/4" X 6 MTS - NACIONAL	33	UNIDAD	NUEVO
<b>HERRAMIENTAS MANUALES</b>				
37	PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA TRAMONTINA	10	UNIDAD	NUEVO
38	ALICATE UNIVERSAL DE 8" TRUPER	7	UNIDAD	NUEVO
39	ARCO DE SIERRA DE 12"- IMPORTADO	1	UNIDAD	NUEVO
40	CINTA METRICA DE 10 MTS - TRUPER	3	UNIDAD	NUEVO
41	COMBA DE 3.30693 IB (1Y1/2"KG)- TRUPER	1	UNIDAD	NUEVO
42	ESCUADRA DE ACERO 40.50 MM X 61 CM- IMPORTADO	2	UNIDAD	NUEVO
43	MARTILLO CABEZA OCTOGONALCON MANGO DE MADERA 16 OZ	6	UNIDAD	NUEVO
44	BARRETA DE ACERO 1" X 1.50 MTS - MEGACON	12	UNIDAD	NUEVO
45	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) - MEGACON	10	UNIDAD	NUEVO
46	PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA - MEGACON	25	UNIDAD	NUEVO
47	PICO DE ACERO CARBONOCON MANGO DE MADERA 90 CM - ZAPAPICO	40	UNIDAD	NUEVO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

48	PICO DE ACERO MANGO DE MADERA 90 CM - MEGACON	15	UNIDAD	NUEVO
49	MACHETE HOJA DE ACERO INOXIDABLE DE 22 " JEKMACAN	40	UNIDAD	NUEVO
50	MACHETE TIPO CALABOZO - JEKMACAN	10	UNIDAD	NUEVO
51	RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 145 CM - JEKMACAN	15	UNIDAD	NUEVO
52	SERRUCHO 12" AYLLU	10	UNIDAD	NUEVO
53	SERRUCHO 24" JEKMACAN	10	UNIDAD	NUEVO
54	SERRUCHO DE PODAR CURVO DE MANGO 6 DIENTES HOJA - JEKMACAN	25	UNIDAD	NUEVO
55	TIJERA DE PODAR 17 CM- JEKMACAN	24	UNIDAD	NUEVO
56	TIJERA DE PODAR 70 CM CON MANGO TELESCOPICO	35	UNIDAD	NUEVO
<b>COMBUSTIBLE</b>				
57	GASOLINA PRIMUM PRIMAX	14.5	GALON	NUEVO
58	ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOCICLETA	9	UNIDAD	NUEVO
59	PETROLEO B5 DIESEL - PRIMAX	250	GALON	NUEVO
<b>MATERIALES DE ESCRITORIO</b>				
60	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 100 HOJAS	3	UNIDAD	NUEVO
61	BOLIGRAFO LAPICERO DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	150	UNIDAD	NUEVO
62	CD REGRABABLE DE 700 MB - HP	3	UNIDAD	NUEVO
63	CLIP MARIPOSA DE METAL DE 40 MM X 50 - ARTESCO	4	UNIDAD	NUEVO
64	CUADERNO TAMAÑO A4 100 HOJAS - ANDES	8	UNIDAD	NUEVO
65	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	5	UNIDAD	NUEVO
66	SUGETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100 - ARTESCO	1	UNIDAD	NUEVO
67	TONNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. 418477 NEGRO	2	UNIDAD	NUEVO
<b>REPUESTOS PARA MOTOCICLETA</b>				
68	CAMARA 90/90-19 - KISTONY	3	UNIDAD	NUEVO
69	CAMARA 110/90-17 - AMERICAN	6	UNIDAD	NUEVO
70	LLANTA 110/90-17 POSTERIOR AMERICAN TECNOLOGIA JAPAN	2	UNIDAD	NUEVO
71	LLANTA 90/90-19 DELANTERA SAFEWAY TECNOLOGIA JAPAN	2	UNIDAD	NUEVO
<b>INSUMOS AGRICOLAS</b>				
72	SEMILLA DE PINO RADIATA	15.25	KILOS	NUEVO
73	HIDROGEL POLIMERO MODIFICADO DE CARBOXIMETIL CELULOSA 25 KG	525	UNIDAD	NUEVO
74	ABONO FOLIAR NPK	12	LITRO	NUEVO
75	FOSFATO MONOAMONICO X 25 KG	10	KILOS	NUEVO
76	NITRATO DE CALCIO X 25 KG	10	UNIDAD	NUEVO
77	CLORURO DE POTASIO GRANULADO X 50 KG	27	UNIDAD	NUEVO
78	FERTILIZANTE MULTIMICRONUTRIENTE	4.5	KILOS	NUEVO
79	FERTILIZANTE SULFATO DE AMONIO 21%N 24%S X 50 KG	1	UNIDAD	NUEVO
80	FERTILIZANTE UREA 46%N X 50 KG	12	UNIDAD	NUEVO
81	SULFATO DE MAGNESIO SOLUBLE CRISTALIZADO X 25 KG	24	UNIDAD	NUEVO
82	ACIDO HUMICO AL 25 %	4	UNIDAD	NUEVO
83	BENOMYL 50% POLVO MOJABLE	1.2	UNIDAD	NUEVO
84	BENOMYL X 1 KG - BENLATE	6	UNIDAD	NUEVO
85	CARBONXIN 20%	2.6	UNIDAD	NUEVO
86	FOSTATO TRIPLE X 50 KG	3	UNIDAD	NUEVO
87	DESINFECTANTE ORGANICO FORMOL X 1 LT	1	UNIDAD	NUEVO
88	BIOESTIMULANTE AMINOACIDO X 1 LT - AMINOGRAN	7	LITRO	NUEVO
89	CARBONXIN CAPTAN CARBONIL X 1 KG CARBONIL	5	UNIDAD	NUEVO
90	COAYUVANTE SILICONADO DE POLIESTER X1 LT BREAK TRHU	6	UNIDAD	NUEVO
91	DIMETOATO 50 % EMULSION CONCENTRADA 1 LT CICLON	5	UNIDAD	NUEVO
92	FOSITIL ALUMINIO 80 % POLVO MOJABLE (WP) ALIETE	11	KILOS	NUEVO
93	MICROELEMENTOS CALCIO + BORO 1 LT - FERTALLC	5	UNIDAD	NUEVO
94	REGULADOR DE PH - NEW WORLD	6	LITRO	NUEVO
95	TIABENDAZOL SUSPENSION CONCENTRADA PARA CHUPADERA	10	UNIDAD	NUEVO
96	CIPERMETRINA + CLORPIRIFOS 1 L SOL TAMARON	1	UNIDAD	NUEVO
97	ENRAIZADOR ACIDO ALFA ANFTALENACETICO Roothor	2	LITRO	NUEVO
98	INOCULANTE BIOLÓGICO X LT EM-1	5	UNIDAD	NUEVO
99	NTP 311539.2014 FERTILIZANTE EM - CERAMICA	5	UNIDAD	NUEVO
100	BIOESTIMULANTE CA+ AMINOACIDO + ACIDO FULVICO - AMINOGRAN X 1 LT	6	UNIDAD	NUEVO
101	BIOESTIMULANTE N+P+CA+MG+AMINOACIDOS X1 LT BIOZIME	6	UNIDAD	NUEVO

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
 ERONDO ESTUPEÑAN DE LOS SERRES  
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE GANAJA  
 DE LA OFICINA GENERAL DE REGISTRO DE GANAJA  
 DE LA OFICINA GENERAL DE REGISTRO DE GANAJA

*[Firma]*

Ing. Indalecio Cabrera Zúñiga  
 C.R. 153115  
 SUPERVISOR

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

102	CARBONXIN 20% CAPTAN POLVO MOJABLE (WP) X1 KG VITAVAX	6	UNIDAD	NUEVO
103	CIPERMETRINA + CLORPIRIFOS 1 L TIFON			
104	DESINFECTANTE ORGANICO X 1 LT FORMOL	9	UNIDAD	NUEVO
105	DIMETOATO 50 % EMULSION CONCENTRADA 1 LT CICLON	5	UNIDAD	NUEVO
106	ENRAIZADOR ACIDO ALFA ANFTALENACETICO Roothor	6	UNIDAD	NUEVO
107	ENRAIZADOR ORGANICO K4% MATERIA ORGANICA 22 % ASCOPHILLUM 45.35%	7	UNIDAD	NUEVO
108	INOCULANTE BIOLOGICO X LT EM-1	6	UNIDAD	NUEVO
109	NTP 311539.2014 FERTILIZANTE EM - CERAMICA	6	UNIDAD	NUEVO
110	SEMILLA DE PINO PINUS RADIATA (AL PESO) RADIATA	6	UNIDAD	NUEVO
<b>VESTUARIO</b>		20	KILOS	NUEVO
111	GUANTES DE POLIESTER Y CAUCHO ESTERINO Y BUTADIENO			
112	BOTA DE JEBE - SEGUSA	8	UNIDAD	NUEVO
113	GUANTE DE PVC TALLA XL LARGO - DKPRO	4	PAR	NUEVO
114	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 ML- AVAL	5	UNIDAD	NUEVO
115	LENTES PROTECTOR DE POLICARBONATO 3M	20	UNIDAD	NUEVO
116	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA - ASA	19	UNIDAD	NUEVO
117	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA - SEGUSA	150	UNIDAD	NUEVO
118	TRAJE CON CAPUCHA DESCARTABLE PARA PROTECCION DE POLIETILENO	4	UNIDAD	NUEVO
119	BOTA DE JEBE NACIONAL	5	UNIDAD	NUEVO
120	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 ML- AVAL	23	PAR	NUEVO
<b>OTROS BIENES</b>		50	UNIDAD	NUEVO
121	MOCHILA FUMIGADORA			
122	SILLA DE PLASTICO	4	UNIDAD	NUEVO
123	MESA DE MADERA	6	UNIDAD	BUEN ESTADO
124	SILLA DE MADERA	1	UNIDAD	BUEN ESTADO
125	ESTANTE DE MADERA	10	UNIDAD	BUEN ESTADO
126	TIMBOS PARA COMBUSTIBLE	5	UNIDAD	BUEN ESTADO
		7	UNIDAD	BUEN ESTADO

**4.2 DETALLES DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS EN EL SUBALMACÉN VIVERO MOYA:**

Se pudo constatar según el siguiente detalle:

ITEM	DETALLES	CANT.	UNID. MEDIDA	OBSERVACIONES
01	MOCHILA FUMIGADORA SOLO			
02	ESCUADRA METALICA	01	UNIDAD	Regular
03	SERRUCHO DE 24"	01	UNIDAD	Regular
04	SERRUCHO METALICA	01	UNIDAD	Regular
05	ALICATE UNIVERSAL	01	UNIDAD	Regular
06	WINCHA DE 60 METROS	01	UNIDAD	Regular
07	MARTILLO STANLEY	01	UNIDAD	Regular
08	COMBA	01	UNIDAD	Regular
09	REGADERA DE METAL	01	UNIDAD	Regular
10	CARRETILLA	01	UNIDAD	Regular
11	ZAPAPICO	02	UNIDAD	Regular
12	PALA TIPO CUCHARA	02	UNIDAD	Regular
13	RASTRILLO	04	UNIDAD	Regular
14	ZARANDA METALICA	02	UNIDAD	Regular
15	TUBOS GALVANIZADO CURVOS	01	UNIDAD	Regular
16	ROTOPLAST PVC 1500L	25	UNIDAD	Regular
17	PIZARRA ACRILICA	01	UNIDAD	Regular
18	ESTANTE DE MADERA	01	UNIDAD	Regular
19	MESA DE MADERA	01	UNIDAD	Regular
20	SILLA DE MADERA	01	UNIDAD	Regular
		03	UNIDAD	Regular

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
   
 EN APOYO A LA SUPERESTACION DEL DISTRITO DE GUANUMA
   
 PESCS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGOS
   
 Ing. Indagatio Gabriela Llanos
   
 T.P. 155815
   
 SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**4.3 DETALLES DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS EN EL SUBALMACÉN VIVERO QUINUA:**

Se pudo constatar según el siguiente detalle:

ITEM	DETALLES	CANT.	UNID. MEDIDA	OBSERVACIONES
01	ROTOPLAST PVC DE 1500L	03	UNIDAD	Regular
02	CARRETILLA BUGUI	02	UNIDAD	Regular
03	ZAPAPICO	04	UNIDAD	Regular
04	PALA TIPO CUCHARA	03	UNIDAD	Regular
05	BARRETA	01	UNIDAD	Regular
06	RASTRILLO	01	UNIDAD	Regular
07	REGADERA DE PLASTICO COLOR VERDE	01	UNIDAD	Regular
08	REGADERA DE METAL	02	UNIDAD	Regular
09	MARTILLO STANLEY	01	UNIDAD	Regular
10	ESCUADRA METALICA	01	UNIDAD	Regular
11	COMBA	01	UNIDAD	Regular
12	ARCO DE SIERRA 21"	01	UNIDAD	Regular
13	WINCHA DE 60 METROS	01	UNIDAD	Regular
14	ALICATE UNIVERSAL	01	UNIDAD	Regular
15	SIERRA METALICA	01	UNIDAD	Regular
16	ESTANTE DE MADERA	01	UNIDAD	Regular
17	MESA DE MADERA	01	UNIDAD	Regular
18	SILLA DE MADERA	03	UNIDAD	Regular
19	PIZARRA ACRILICA	01	UNIDAD	Regular
20	MOCHILA FUMIGADORA SOLO	01	UNIDAD	Regular
21	MOCHILA FUMIGADORA JACTO	02	UNIDAD	Regular
22	TUBO REDONDO GALVANIZADO CURVO	29	UNIDAD	Regular
23	PALA TIPO RECTA	01	UNIDAD	Regular

**4.4 DETALLES DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS EN EL SUBALMACÉN VIVERO QULLQUITUPO:**

Se pudo constatar según el siguiente detalle:

ITEM	DETALLES	CANT.	UNID. MEDIDA	OBSERVACIONES
01	ROTOPLAST DE PVC 1500 LITROS	01	UNIDAD	Regular
02	REGADERA DE PLASTICO COLOR VERDE	01	UNIDAD	Regular
03	MOCHILA FUMIGADORA SOLO	01	UNIDAD	Regular
04	WINCHA DE 60 METROS	01	UNIDAD	Regular
05	PALA TIPO CUCHARA	01	UNIDAD	Regular
06	ESCUADRA METALICA	01	UNIDAD	Regular
07	PICO PUNTA	01	UNIDAD	Regular
08	MARTILLO STANLEY	01	UNIDAD	Regular
09	SERRUCHO DE 24" COLOR ANARANJADO	01	UNIDAD	Regular
10	CARRETILLA	01	UNIDAD	Regular
11	ZARANDA METALICA DE 1X1.5 METROS	01	UNIDAD	Regular
12	ZAPAPICO	01	UNIDAD	Regular
13	BARRETA	01	UNIDAD	Regular
14	ALICATE UNIVERSAL	01	UNIDAD	Regular
15	ESTANTE DE MADERA	01	UNIDAD	Regular
16	MESA DE MADERA	01	UNIDAD	Regular
17	SILLA DE MADERA	03	UNIDAD	Regular

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS  
 PESCS  
 Ing. *[Firma]*  
 CIP. 153115  
 SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**4.5 DETALLES DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS EN EL SUBALMACÉN VIVERO PAMPACHACRA:**

Se pudo constatar según el siguiente detalle:

ITEM	DETALLES	CANT.	UNID. MEDIDA	OBSERVACIONES
01	TUBO REDONDO GALVANIZADO	35	UNIDAD	Regular
02	ROTOPLAST PVC DE 1500 L	02	UNIDAD	Regular
03	MOCHILA FUMIGADORA SOLO	01	UNIDAD	Regular
04	MARTILLO STANLEY	01	UNIDAD	Regular
05	WINCHA DE 60 METROS	01	UNIDAD	Regular
06	PICO PUNTA	01	UNIDAD	Regular
07	PALA TIPO CUCHARA	04	UNIDAD	Regular
08	RASTRILLO	02	UNIDAD	Regular
09	CARRETILLA	02	UNIDAD	Regular
10	PALA RECTA	03	UNIDAD	Regular
11	ESTANTE DE MADERA	01	UNIDAD	Regular
12	SILLA DE MADERA	03	UNIDAD	Regular
13	ARCO DE SIERRA	01	UNIDAD	Regular

**4.6 DETALLES DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS EN EL SUBALMACÉN VIVERO PARCCAY:**

Se pudo constatar según el siguiente detalle:

ITEM	DETALLES	CANT.	UNID. MEDIDA	OBSERVACIONES
01	PALA TIPO CUCHARA	01	UNIDAD	Regular
02	PALA RECTA	01	UNIDAD	Regular
03	ZAPAPICO	02	UNIDAD	Regular
04	RASTRILLO	02	UNIDAD	Regular
05	BARRETA	01	UNIDAD	Regular
06	ARCO DE SIERRA 21" TRUPER	01	UNIDAD	Regular
07	REGADERA DE PLASTICO COLOR VERDE	01	UNIDAD	Regular
08	CARRETILLA BUGUI	01	UNIDAD	Regular
09	ROTOPLAST DE PVC DE 1500 LITROS	01	UNIDAD	Regular
10	ESTANTE DE MADERA	01	UNIDAD	Regular
11	MESA DE MADERA	01	UNIDAD	Regular
12	SILLA DE MADERA	03	UNIDAD	Regular
13	PIZARRA ACRILICA	01	UNIDAD	Regular
14	BALDE PLASTICO 18 LITROS	01	UNIDAD	Regular

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
 PROYECTO PARA EL COMERCIO DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS  
 PESQUEROS EN LA ZONA DE SIERRA CENTRO SUR  
 PESQUERÍA DEL NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

*Ing. Inocencio Cabrera Llanto*  
 CIP. 153115  
 SUPERVISOR

## **5.0 DIFICULTADES Y ACCIONES ADOPTADAS**

**PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**

## 5.1. DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL MES

Se presentaron las siguientes dificultades:

- ✓ Retraso en la instalación de los plántones de pino y Qenhua en el campo definitivo, a falta de contrato oportuno del personal técnico y de la mano de obra no calificada, afectando de manera negativa el avance físico del proyecto.
- ✓ Falta de movilidad ( motos lineales) para el desplazamiento de los ejecutores a los viveros , para realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del crecimiento de las plántulas de pino y qenhua en los 5 viveros de las comunidades de Moya, Quinoa, Qollqitupo , Paraccay y Pampachacra.

## 5.2.- ACCIONES ADOPTADAS

Se adoptaron las siguientes acciones:

- ✓ Se agilizó con los requerimientos del personal técnico, ni bien que salió la contrata de los ejecutores
- ✓ Se logró desplazar con movilidades particulares con el fin de atender las exigencias de las plantas de pino y qenhua a nivel de los viveros.
- ✓ Se realizó coordinaciones con el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quinoa y los funcionarios, sobre la situación actual del proyecto y su continuidad y la posible ampliación de plazos para cumplir con las metas del Proyecto.

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTO SUR  
PESCS  
ING. INDOLEO CABRERA LLANTOY  
NIP. 155415  
SUPERVISOR

## **6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

**PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN  
EN EL DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**6.1 CONCLUSIONES:**

- Se realizó el diagnóstico del estado situacional de los 5 viveros en la comunidades de, Moya, Quinua, Qollqitupo , Paraccay y Pampachacra del mismo modo se levantó la información actual del vivero de Alta Tecnología . AGRORURAL
- No se logró utilizar la mano de obra no calificada (peón).
- No se utilizó combustible para el presente mes.
- Durante el mes se empleó 05 puestos de trabajo, con el fin de cumplir las metas programadas para el presente mes.

**6.2 RECOMENDACIONES**

- Se recomienda atención oportuna la contratación del equipo técnico , para poder cumplir de manera satisfactoria los objetivos programados para el presente año 2025.
- reinicio con la instalación de plántones de pino y quenual en campo definitivo.
- Presentación inmediata de todos los requerimientos en el marco de la ejecución del proyecto.

  
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRAL SUR  
 EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS  
 EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL DISTRITO DE QUINUA  
 DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
 Ing. Andriana Esperanza Huanay  
 SUPERVISOR

## **07. ANEXOS**

**PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN  
EN EL DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**

## **7.1 PANEL FOTOGRÁFICO**

**PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN  
EN EL DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"  
**PANEL FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2025**



**FOTO N° 01:** Verificación de los plantones de quenual en el vivero de Moya



**FOTO N° 02:** Verificación de los plantones instalados en campo definitivo lugar Pallcca - Quinua

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS  
EN ANDOYA LA FUERTE JACRES EN EL DISTRITO DE QUINUA  
DE LA REGION DE HUANCAYO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PESCS

*[Signature]*  
**Ing. Indaño Cabrera Llantoy**  
C.P. 153115  
SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



FOTO N° 03: Verificación de los plantones nativos en el vivero de Parraccay



FOTO N° 04: Verificación de los plantones rustificados en el vivero de alta tecnología AGRORURAL

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
PROYECTO REAFIRMACIÓN DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS RUSTIFICADOS  
EN PROYECTO A LA FASE DE REAFIRMACIÓN DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS RUSTIFICADOS  
DE LA REGION DE INDIANOS DEL TROPICANDO DE QUINUA  
ING. Indalecio Cabrera Llantoy  
CIP. 153115  
SUPERVISOR

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



FOTO N° 05 : Estado de cobertura actual de vivero de Quinua



FOTO N° 06: Estado de cobertura actual de vivero de Moya


 PROYECTO ESPECIAL TIERRA CENTRO SUR  
 PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS  
 EN RELACIÓN A LAS FUENTES AGUÍFERAS DEL DISTRITO DE QUINUA  
 DE LA PALLANQUA DE MUYO, GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 PESCS  
  
 Ing. Indalecio Cabrera Llantoy  
 CIP. 153115  
 SUPERVISOR

## **7.2. COPIA DE CUADERNO DE OBRA**

**PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN  
EN EL DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**



FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

## ASIENTO N° 01 DEL RESIDENTE FECHA: 24/01/2025

\*REINICIO DE OBRA, DE CONTINUIDAD DE EJECUCIÓN PROYECTO -AÑO 2025. En el Distrito de Quivuna, Provincia Huancanga región Ayacucho, siendo las 10 am del día viernes 24 de enero del 2025, nos constituimos a la obra en mérito de cumplimiento al CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 005-2025-HIDAGRI-PESCS como RESIDENTE EN PROYECTOS PRODUCTIVOS (RESPONSABLE DE PROYECTO) Ing. Luis Huamca Maldonado y con CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 004-2025-HIDAGRI-PESCS al Ing. Indalicio Cabrera Montoy como supervisor del proyecto: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN AROTO A LA FORTALECIMIENTO EN EL DISTRITO DE QUIVUNA DE LA PROVINCIA DE HUANCANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con Cui: 2599658, con la finalidad de dar inicio a la continuidad de ejecución de actividades del proyecto en el presente año.

El presente proyecto, cuenta con un presupuesto global aprobado de S/. 4,033,217.63 sols, siendo programado en el PIM del presente año un presupuesto de S/. 1,649,433.00 sols, el mismo que fue aprobado con la resolución Directoral N° 0016-2025-HIDAGRI-PESCS-1601 del 10 de enero 2025 con plazo de ejecución de 07 meses, hasta 31 de julio de 2025.

DIAGNOSTICO SITUACION DE LOS 5 VIVEROS INSTALADOS EN QUIVUNA. En este día se procedió a realizar el diagnóstico situacional primeramente del vivero Moya. Donde se evidenció el cartel de obra. Instalado en la entrada al vivero ubicada en un lugar visible estratégicamente, a la vez se visualizó un porton de 2 hojas que sirve como ingreso al vivero, cuya dimensión 2.5mt de ancho y 3mt de altura elaborada con marco de madera y con planchas de calamina. Se evidenció una capa granulada en los calles de curvas de periferia de las plantulas de pino y quivuna.

INSPECTOR

PROYECTO ESPECIAL TERRA CENTRO SUR  
EN COOPERACION CON EL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
PESCS DE LA PROVINCIA DE HUANCANGA  
Ing. Luis Huamca Maldonado  
RESIDENTE

PROYECTO ESPECIAL TERRA CENTRO SUR  
EN COOPERACION CON EL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
PESCS DE LA PROVINCIA DE HUANCANGA  
Ing. Indalicio Cabrera Montoy  
SUPERVISOR  
Grafifesa

# CUADERNO DE OBRA



FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

También durante la visita se pudo constatar la existencia de los siguientes:  
- Un reservorio rustico para agua, un subalmacen debidamente techado con calamina con cinta de madera, con una puerta y ventana, forrado con yeso y el piso está a base de arena gruesa y cemento, el subalmacen en mericú se encuentra implementado con formario, sellos, muros, pizarra y entre otros. Se evidenció la existencia de 01 letina techada con calamina con marco de madera. Asimismo el vivero de mayá cuenta con 7 túneles (5 túneles con plantales de pino y 2 túneles con plantales de guayaba), entre los 2 tipos suman 56 mill en pleno crecimiento, entre 30 a 35 cm de altura. Del mismo modo se visitó al vivero de alta tecnología - Agroveraf, donde se evidenció plantales de pino en tubos en pleno crecimiento 30 a 45 cm de altura en un número de 190 mill.

OBSERVACIONES Y/O OCURRENCIAS: se tuvo dificultades en el desplazamiento al vivero mayá a falta de movilidad.  
\* También recurridos para Asist. Adm. a Lic. AYO SMERY NARCIS MORALES, con contrato No 006 2025 - Micheneri - pesos, con fecha 24 de Enero 2025.

ASIENTO N° 02 DEL SUPERVISOR Fecha 24/01/2025  
- Hoy nos constituíamos a la ejecución del proyecto, según el contrato mencionado por el Residente en el Asiento N°  
- Donde a la primera nos reunimos con el Director de Desarrollo Agroeconómico, Ing. Luis Araya Abrego y los ejecutores del proyecto Ing. Luis Ivánca Maldonado, Ing. Indalecio Cabrera Urdaneta e AYO SMERY NARCIS MORALES, Residente, Supervisor y Asistente Administrativo respectivamente con la finalidad de dar inicio a la continuidad de ejecución de actividades del proyecto en el presente año.  
Hoy día 24 de Enero se da inicio de las actividades del proyecto.  
- Durante el día se realizó el recorrido anual del vivero de MAYA, donde se encontró producción de plantales de pino y guayaba y se pudo verificar el estado de las infraestructuras del vivero y los materiales y bloques que se encuentran en ella.

INSPECTOR

PROYECTO EL SIERRA CUERO SUR  
ING. LUIS IVÁNCA MALDONADO  
RESIDENTE  
CIP. 109068

PROYECTO EL SIERRA CUERO SUR  
ING. INDALICIO CABRERA URDANETA  
SUPERVISOR  
CIP. 133115  
Grafiresa

# CUADERNO DE OBRA



FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

ASIENTO NO 03 DEL RESIDENTE FECHA: 25/01/2025  
DIAGNOSTICO SITUACIONAL AL VIVERO QUINUA: no evidencio lo sgte.  
\* 01 cartel de obra \* 01 partes de calamina de 2 hojas con marcos de madera  
\* capa gruesa de cemento en las calles de los canales de riego de pino y con una  
\* 1 reservorio rustico para agua \* 1 sub almorz. techado con calamina  
con cinta de madera con ventana y con una puerta de calamina a el  
piso se evidencio que es de cemento y arena, el pareda esta terrajada  
con teja, implementado con silla, planta de madera, mesa y pizarra  
\* 03 letrina sanitarias con techo de calamina con cinta de madera  
con una loza turca.  
\* la infraestructura del vivero esta se constato que esta a base de  
arcos de fierro galvanizada - vivero tipo tunel, hay 6 tunels (3 de pino,  
3 de puerua) entre los 2 pozos llegan a medir 46.6 mil. 30.54 mil

OBSERVACIONES Y/O OCURRENCIAS: no dificultad en desplazarse  
a falta de visibilidad, al vivero quinua

ASIENTO NO 04 DEL SUPERVISOR Fecha 25/01/2025  
ACTIVIDADES REALIZADAS  
- Durante el día se realizó la visita y diagnostico del  
vivero de QUINUA, donde se verifico la infraestructura del  
vivero donde se encuentra con 6 tunels y faltando construir  
01 tunel donde ya se encuentra ya como ya acondicionada para  
dicha construcción de un tunel  
- Se encontro y se verifico todas las bienes y enseres infraestructu-  
ros del como menciona el Ing. Residente en el cuaderno  
de obra asiento N° 3  
- Asimismo se encontraron plantas de pino y general, ya lista  
para el traslado a campo de puerua.  
- Asimismo se pudo evidenciar los 30 fotos pose de la  
siguiente producción y/o campo de producción.  
- Al Residente, verificar las plantas por cada tunel y  
realizar la rusticación, editando la malla Russell.

INSPECTOR \_\_\_\_\_  
RESIDENTE  
Ing. Luis Fernando Maldonado  
CIP. 109066  
RESIDENTE  
SUPERVISOR  
Ing. Ingrid C. Brera Wang  
CIP. 153115  
SUPERVISOR  
Grafiresa

# CUADERNO DE OBRA



4

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

ASIENTO N° 05 DEL RESIDENTE FECHA: 27/01/2025

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL VIVERO QOLGOTUPO.

- Se evidenció los siguientes:
- \* 1 portón de ingreso del vivero forjado, a base de calamina y madera 2.5m x 3m
  - \* conservación de capa granallon con piedra chucala en los cables de cemento repique
  - \* 01 reservorio rustico para agua, a base de ladrillo y cemento
  - \* 01 subalmacen, con techo de calamina y madera, con una ventana de metal y vidrio, más una puerta de calamina, poridas y arrojada con yeso y con falso piso implementada con solera, sillones y mesas
  - \* 01 letrina (consta de maderas y calamina galv.), con losa turca.
  - \* Se pudo constatar 3 túneles más en (01) Tinglado (malla basket y poste) en cuyo interior se encontró 32 mil entre pira y genitura en pleno crecimiento con una altura de 30 a 45 cm. en total

Personal: 1 supervisor, 1 residente, 1 asistente, 1 mon. física, 1 financiero

OBSERVACIONES Y/O OCURENCIAS: Crecimiento de hierbas no deseadas en los campos de repique a faltado mantenimiento en el pto más

ASIENTO N° 06 DEL SUPERVISOR fecha 28/01/2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el día se realiza la visita y diagnostico actual en el vivero de Qolgotupo, donde se pudo evidenciar la existencia de todas las infraestructuras construidas hasta el momento como: subalmacen, con techo, puertas forradas, con piso de cemento, portón existente del vivero y existencia de 03 túneles y 01 tinglado

- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Realizar el mantenimiento de todas las infraestructuras del vivero porque está afectado por las lluvias en la zona, lo cual es muy importante dicha actividad
- Realizar el mantenimiento y/o solicitud de 02 motos lineales para el proyecto, dichas motos se encuentran en el almacén central de PESCS.

INSPECTOR

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
PROYECTO RECUPERACION DE LA FAUNA Y FLORA EN LA ZONA DE LOS SERVICIOS PESQUEROS EN EL DISTRITO DE CAJALMA DE LA PROVINCIA DE GUAYAS

RESIDENTE  
CIP. YUSTINIANO  
RESIDENTE

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
PROYECTO RECUPERACION DE LA FAUNA Y FLORA EN LA ZONA DE LOS SERVICIOS PESQUEROS EN EL DISTRITO DE CAJALMA DE LA PROVINCIA DE GUAYAS

SUPERVISOR  
ING. H. G. GONZALEZ  
CIP. 153115  
SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA



5

12

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

ASIENTO N° 07 DEL RESIDENTE 28/01/2024

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL VIUERO PAMPACHICRA

Se evidenció la existencia de los siguientes:

- \* 01 cortel de obra, en la entrada del viadero y en lugar muy visible
- \* 01 porton de ingreso al viadero forjado, con 2 hojas, marco de madera y con planchas de calaminas, 2.5m ancho, 3 mt de altura
- \* los cals de los camos de repique se encuentran con una capa granular a base de piedra choncada.
- \* 01 reservorio rústico, a base de ladrillo y cemento.
- \* 01 sub almacén techado con calaminas y centro de madera, con respectivo puerta y ventana, falso piso a base de cemento y arena también el pared interior se encuentra forrada con yeso, devidamente implementado con Hsa, sillas, pilzorra acilica y estante de melaminas
- \* 01 bodega, a base de calaminas y marcos con lora turca.
- \* se evidenció 2 túneles a base de arcos galvanizados con techos de Malla meshell y agrofilm, en cuyo interior se metameta producción de pino 21200 plantulas.

PERSONAL: 1 supervisor, 1 residente, 1 Asist. Adm., 1 m. físico, 1 mon. financiero

ASIENTO N° 08 DEL SUPERVISOR Fecha 28/01/2024

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Durante el día se realizó la visita y diagnóstico del viadero Pampachicra, donde se evidenció la existencia de toda infraestructura a nivel del viadero y la implementación con de sub almacén, etc. tal como menciona el Ing. Residente en el cuaderno de obra Asiento N°
- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Se puede evidenciar el deterioro de las maderas a nivel de los bords de pino y queved, realizar en respectivo del hurbo y aplicación de productos para de protección de la planta.

INSPECTOR

RESIDENTE  
CIP. 109055  
RESIDENTE

Ing. SUPERVISOR  
CIP. 159115  
SUPERVISOR Grafiferesa

# CUADERNO DE OBRA



6

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

ASIENTO N° 09 DEL RESIDENTE FECHA: 29/01/2025  
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL VIVERO PARACEY

- Se pudo encontrar y/o evidenciar los siguientes:
- \* El cartel de obra, que pose toda la información básica del proyecto
- \* El portan de ingreso al vivero forjado a base de calamina y madera de 2 hojas 2.5mt de ancho y 3mt de altura.
- \* no evidencio que las calles de las camas de repique se encuentran ripiadas con con una capa granulada de piedra chacada
- \* El Reservoir rustico para agua, construido con la bida, cemento y arena
- \* El Sub almacén, debidamente techado con calamina y madera, forjado, con falso piso, con ventana de vidrio y metal y una puerta de calamina forjada con una y debidamente implementado con, mesa, silla, estante y pizarra blanca
- \* El latrín, a base de calamina con loza fuerte.
- \* El vivero está tipo túnel con tubos galvanizados en forma de arco se constató que hay 6 Túneles en cuyo interior hay producción de pino y guineo 46.95 mill entre los 2 espacios.
- Personal: el supervisor, el asistente, 1 asst. Adm, 1 mon. físico, 01 mon. financiero.

ASIENTO N° 10 DEL SUPERVISOR Fecha 29/01/2025  
ACTIVIDADES REALIZADA

- Durante el día se realizó la visita al vivero de Paracey, toda la actividad se realizó con el Ing Residente del proyecto, el detalle mencionado se encuentra en el Asiento N° de Ingeniero Residente del proyecto
- se pudo evidenciar el crecimiento de maderas a nivel de las camas de repique, lo cual es muy necesario
- Realizar la Rep-riecación de los plantones ya que se encuentran en condiciones óptimas para la instalación en campo definitivo.

INSPECTOR

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
ENFOQUE A LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS  
PESCS DEL PERU  
Ing. RESIDENTE  
RESIDENTE

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
ENFOQUE A LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS  
PESCS DEL PERU  
Ing. SUPERVISOR  
SUPERVISOR  
Grafiresa

# CUADERNO DE OBRA



7

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

ASIENTO N° 11 DEL RESIDENTE FECHA: 30/01/2025  
DIAGNOSTICA SITUACIONAL DE LOS PECTORES INSTALADOS  
CON PLANTONES DE PINO - SECTOR PALCCA Y YANACOCCHA

\* Se evidencio las plantaciones hechas en el mes de Diciembre del 2024, los plantulos de pino se pudo ver que estan prendiendo de manera satisfactoria en el campo definitivo probablemente este resultado positivo a por la presencia de los lluvias, en un area de 11.69 Has con una cantidad de plantulos 15560, se recorrió de manera minuciosa los sectores instalados que queda en la zona alta del Distrito de Quimac.

Personal: 1 Supervisor, 1 Asistente, 1 Asst. Adm. 1 mon. física, 1 mon. financiera.

Observaciones: al momento de realizar el diagnostico situacional no noto la presencia de la lluvia intensa, dificultando el labor que se vino realizando. Apto no se tuvo movilidad para el desplazamiento.

ASIENTO N° 12 DEL SUPERVISOR Fecha 30/01/2025  
ACTIVIDADES REALIZADAS

- Durante el día se realizó la verificación y estado actual de los plantones de pino instalados en campo definitivo del sector Palcca y Yanacoccha que son terrenos comunales de la comunidad de Quimac, en lo cual se encuentra instalada aproximadamente 12 hectáreas de la especie de pino radiata.
- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Las zonas instaladas no cuenta con cerco de protección, lo cual es muy necesario ya al momento se encuentra ganado vaquero cercano a las zonas instaladas y por instalar.

INSPECTOR

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
PROYECTO DE INICIATIVA PRIVADA  
ENAFORCE  
PERSCS DELIA

RESIDENTE  
CIP. JUAN JOSÉ MALLADO  
RESIDENTE

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
PROYECTO DE INICIATIVA PRIVADA  
ENAFORCE  
PERSCS DELIA

SUPERVISOR  
Ing. JUAN JOSÉ MALLADO

Grafiresa

# CUADERNO DE OBRA



FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

ASIENTO No 13 DEL RESIDENTE FECHA: 31/01/2025  
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS SECCIONES INSTALADAS  
- SECTOR- COOLCITUPA - con pino.

\* el momento de realizar la visita a los sectores de Coolcitupe no evidenció áreas instaladas con pino, una extensión de 11.69 Ha, con 15566 plantones de pino, los cuales están todos vivos en pleno crecimiento favorecidos por las precipitaciones continuas, se mota que la plantación están bien hechos.

PERSONAL: 1 supervisor, 1 residente, 1 Asist. Adm, 1 mor. financiera y 1 mor. física

OBSERVACIONES y/o DARNERMENTS:


se mota la caída de lluvias torrenciales, perjudicando el normal recorrido por los áreas instaladas con plantones de pino.

ASIENTO No 14 DEL SUPERVISOR fecha 31/01/2025  
ACTIVIDADES REALIZADAS

- Durante el día se visitó al lugar de Coolcitupe donde se encontró pino instalado en el campo, dejenito, lo cual es el terreno de una asociación
- El lugar es una zona segura para las plantaciones donde no hay mucho avance de algunas plantas.
- OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES
- Realizar el recate respectivo ya que hay una mínima morbilidad en el campo dejenito de Coolcitupe

INSPECTOR

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
ING. INGENIERO EN AGRICULTURA Y GANADERIA  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

Ing.  RESIDENTE

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
ING. INGENIERO EN AGRICULTURA Y GANADERIA  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

Ing.  SUPERVISOR

Grafiresa

## **7.4. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN  
EN EL DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**

FRT-01

# VALORIZACION DESAGREGADA N° 11 - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

PROYECTO :

CUI N° : 2599658

META/SEC. FUN. 0025 FORESTACION Y REFORESTACION

VALOR REF. 2 S/ 4,033,217.83

ASIG. P.PTAL : S/ 1,665,046.00

MODALIDAD: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA - EPD

FUENTE FTO: 1.00 RECURSOS ORDINARIOS

AÑO FISCAL: 2024

MESES: DICIEMBRE

PLAZO EJEC: 24 MESES

PARTIDA	DESCRIPCION	UNID	CANT.	P.U.	MONTO TOTAL S/	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		%	SALDO POR EJECUTAR	
						METRADO	MONTO S/	METRADO	MONTO S/	METRADO	MONTO S/		METRADO	MONTO S/
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				3,864.40									
02	CARTEL DE OBRA	und	5.00	792.88	3,864.40	5.00	3,864.40	-	-	5.000	3,864.40	100.00%	-	-
02.01	INSTALACION FORESTAL				2,442,899.40									
02.01.01	CONSTRUCCION DE VIVEROS VOLANTES				80,017.56									
02.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				77,188.74									
02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	9,774.51	1.05	10,263.24	9,774.51	10,263.24	-	-	9,774.510	10,263.24	100.00%	-	-
02.01.01.02	TRAZO Y EXCAVACION DE TERRENO	m2	9,774.51	0.32	3,127.84	9,774.51	3,127.84	-	-	9,774.510	3,127.84	100.00%	-	-
02.01.01.03	CORTE Y EXCAVACION DE TERRENO CON MAQUINARIA	m3	1,629.09	6.99	11,387.34	1,629.09	11,387.34	-	-	1,629.090	11,387.34	100.00%	-	-
02.01.01.04	NIVELACION Y APISONADO	m2	7,639.83	1.76	13,446.10	7,639.83	13,446.10	-	-	7,639.828	13,446.10	100.00%	-	-
02.01.01.05	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO	m	1,016.70	14.89	15,135.66	1,016.70	15,135.66	-	-	1,016.700	15,135.66	100.00%	-	-
02.01.01.06	PORTON DE INGRESO AL VIVERO FORESTAL	und	5.00	983.02	4,915.10	-	-	5.00	4,915.10	5.000	4,915.10	100.00%	-	-
02.01.01.07	EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO	m3	12.10	51.79	625.66	10.50	543.80	1.60	10.500	10.500	543.80	86.78%	1.60	82.86
02.01.01.08	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO RUSTICO PARA AGUA	m2	460.00	11.83	5,441.80	230.00	2,720.90	230.00	2,380.90	430.000	5,086.90	93.46%	30.00	354.90
02.01.01.09	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	und	5.00	2,568.60	12,843.00	3.00	7,705.80	2.00	5,137.20	5.000	12,843.00	100.00%	-	-
02.01.02.01	DADOS DE CONCRETO SIMPLE Fc=140 kg/cm2+25% PM	m3	13.43	210.56	2,827.82	-	-	13.43	2,827.82	-	-	-	-	-
02.02	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y SERVICIOS BASICOS				65,769.45									
02.02.01	CONSTRUCCION DE ALMACEN				63,428.85									
02.02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,413.36									
02.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	77.70	43.93	3,413.36	77.70	3,413.36	-	-	77.700	3,413.36	100.00%	-	-
02.02.01.02	CIMENTOS				5,605.39									
02.02.01.02	CIMENTACION	m3	49.95	112.22	5,605.39	49.95	5,605.39	-	-	49.950	5,605.39	100.00%	-	-
02.02.01.03	MAPOSTERIA				15,458.47									
02.02.01.03	MUROS DE ADOBE	m2	454.26	34.03	15,458.47	454.26	15,458.47	-	-	454.260	15,458.47	100.00%	-	-
02.02.01.04	TECHO DE MADERA PARA TECHO	und	5.00	926.04	4,630.20	2.00	1,852.08	3.00	2,778.12	5.000	4,630.20	100.00%	-	-
02.02.01.05	CARPINTERIA				3,874.80									
02.02.01.05	PUERTA	und	5.00	583.12	2,815.60	-	-	5.00	2,815.60	5.000	2,815.60	100.00%	-	-
02.02.01.05	VENTANA	und	5.00	211.86	1,059.30	-	-	5.00	1,059.30	5.000	1,059.30	100.00%	-	-
02.02.01.06	ACABADOS				15,003.83									
02.02.01.06	FALSO RISO E=0.15 M.	m2	83.67	72.85	6,095.36	75.00	5,463.75	8.67	631.61	83.670	6,095.36	100.00%	-	-
02.02.01.06	TARRAJEO ZOCALO	m2	51.30	65.97	3,384.26	46.00	3,034.62	5.30	349.64	51.300	3,384.26	100.00%	-	-
02.02.01.06	TARRAJEO PARED	m2	221.50	24.94	5,524.21	195.00	4,863.30	26.50	660.91	221.500	5,524.21	100.00%	-	-
02.02.01.07	IMPLEMENTACION DE ALMACEN				15,442.40									
02.02.01.07	IMPLEMENTACION DE ALMACEN	Modulo	5.00	3,088.48	15,442.40	-	-	5.00	15,442.40	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS				5,340.90									
02.02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,404.85									
02.02.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	20.80	1.05	21.84	20.80	21.84	-	-	20.800	21.84	100.00%	-	-
02.02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	11.20	49.93	492.02	11.20	492.02	-	-	11.200	492.02	100.00%	-	-
02.02.02.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M (AMANO CICARRETELLA)	m3	11.20	17.91	200.59	11.20	200.59	-	-	11.200	200.59	100.00%	-	-
02.02.02.01	REFINE Y NIVELACION DE HOYO	m2	40.00	17.26	690.40	40.00	690.40	-	-	40.000	690.40	100.00%	-	-

PROYECTO FORESTAL SUPLENENTE N° 001  
 PARA EL VIVERO FORESTAL  
 DE HUAMANGA DE HUAMANGA

*[Firma]*

Ing. Adolfo Castro de la Cruz

FRT-01

**VALORIZACION DESAGREGADA N° 11 - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024**

PROYECTO :

CUI N° : 2599658

META/SEC. FUN. 0025 FORESTACION Y REFORESTACION

VALOR REF. 2 SI. 4,033,217.83

ASIG. PPTAL : SI. 1,665,046.00

MODALIDAD: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA - EPD  
FUENTE FTO: 1.00 RECURSOS ORDINARIOS  
AÑO FISCAL: 2024 MES: DICIEMBRE  
PLAZO EJEC: 24 MESES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	P.U.	MONTO TOTAL SI.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		%	SALDO POR EJECUTAR	
						METRADO	MONTO SI.	METRADO	MONTO SI.	METRADO	MONTO SI.		METRADO	MONTO SI.
02.02.02.02	PREPARACION DE LA BASE DE APOYO				811.90									
02.02.02.02.01	TRONCO MADERA EUCALIPTO D=6" (INCLUIDO EMPALME CON CASETA)	m	5.00	162.38	811.90		811.90				811.90	100.00%		0.00%
02.02.02.03	CONSTRUCCION DE LA CASETA PARA LETRINA				2,829.75									
02.02.02.03.01	CASETA DE MADERA Y CALAMINA GALV. PARA LETRINAS	und	5.00	316.89	1,584.45		316.89	4.80	1,267.58	5.00	1,584.45	100.00%		0.00%
02.02.02.03.02	PUERTA DE MADERA CON CALAMINA GALV. 1.8MX.82M	und	5.00	135.68	678.40			5.00	678.40	5.00	678.40	100.00%		0.00%
02.02.02.03.03	COBERTURA CON PLANCHAS DE CALAMINA DE 1.8MX0.82 M	und	5.00	113.38	566.60		113.38	4.80	453.52	5.00	566.60	100.00%		0.00%
02.02.02.04	INSTALACION DE TUBERIAS DE VENTILACION				284.40									
02.02.02.05.01	SALIDA DE VENTILACION PARA LETRINA Ø 4"	und	5.00	58.88	294.40			5.00	294.40	5.00	294.40	100.00%		0.00%
02.03.01	CONSTRUCCION DE CAMAS DE ALMACIGO Y REPIQUE				41,418.98									
02.03.02	CONSTRUCCION DE CAMAS DE ALMACIGO EN PLATABANDAS	m2	250.00	50.17	12,542.50		12,542.50			250.00	12,542.50	100.00%		0.00%
02.04	CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE A NIVEL DEL SUELO	m2	1,676.00	17.23	28,877.48		24,122.00			1,400.00	24,122.00	83.53%	276.00	16.47%
02.04.01	DOBLADO DE TUBO F°C° D=3/4"	und	336.00	14.06	4,724.16		4,218.00			300.00	4,218.00	89.29%	36.00	10.71%
02.04.02	ANCLAJE DE COBERTURA	und	746.00	4.97	3,707.62		1,669.80			340.00	1,669.80	45.58%	406.00	54.42%
02.04.03	MONTAJE DE ARCOS DE TUBO F°C° D=3/4"	und	373.00	61.21	22,831.33		10,405.70			170.00	10,405.70	45.58%	203.00	54.42%
02.04.04	TENDIDO DE MALLA RASCHELL	m2	8,145.43	6.27	51,071.85		23,276.71			3,712.39	23,276.71	45.58%	4,433.04	54.42%
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VIVEROS VOLANTES				203,931.54									
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VIVEROS VOLANTES	mes	18.00	11,329.53	203,931.54		67,977.18	1.30	11,232.52	6.00	79,306.71	38.89%	11.00	61.11%
02.06.01	PRODUCCION DE PLANTONES				508,790.60									
02.06.01.01	ALMACIGO DE SEMILLAS DE PINO	m2	182.00	163.80	29,811.60		12,940.20			79.00	12,940.20	43.41%		56.59%
02.06.01.02	PREPARACION DE SUSTRATO PARA ALMACIGO	m3	54.60	141.04	7,700.78		5,853.16			41.50	5,853.16	76.01%		23.99%
02.06.01.03	PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE DE PINO	m3	306.00	142.77	43,687.62		39,875.60			280.00	39,875.60	91.50%		8.50%
02.06.01.04	EMBOLSADO DE SUSTRATO PARA PINO	mil	454.95	190.45	86,645.23		28,262.78			148.40	28,262.78	32.62%		67.38%
02.06.01.05	ENFLADO DE BOLSAS	mil	454.95	51.95	23,634.65		7,709.38			148.40	7,709.38	32.62%		67.38%
02.06.01.06	REPIQUE DE PLANTULAS DE PINO	mil	454.95	66.03	30,040.35		148.40			148.40	148.40	32.62%		67.38%
02.06.01.07	MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS	mil	454.95	20.58	9,362.87		9,798.85			148.40	9,798.85	32.62%		67.38%
02.06.01.08	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS	mil	454.95	15.68	7,133.62		2,881.20			148.40	2,881.20	30.77%		69.23%
02.06.01.09	MANEJO FISIONUTRICIONAL	mil	454.95	30.39	13,825.93		2,952.20			148.40	2,952.20	30.77%		69.23%
02.06.01.10	REMOCCION Y SELECCION DE PLANTONES	mil	454.95	39.60	18,016.02		4,254.60			148.40	4,254.60	30.77%		69.23%
02.06.01.11	DESHERBO EN CAMAS DE REPIQUE	mil	454.95	2.38	1,062.78		2,772.00			70.00	2,772.00	15.39%		84.61%
02.06.01.12	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO VIVERO	m2	2,297.73		5,468.00		642.60			270.00	642.60	11.75%		88.25%
02.06.01.13	PRODUCCION DE PLANTONES EN TUBETES	gob	5.00	31,867.15	162,436.39									
02.06.02	ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES				104,803.46									
02.06.02.01	TRAZO Y MARCACION PARA EXCAVACION DE HOYOS	ha	1.00	201,556.18	201,556.18		104,803.46	8.02	4,894.85	0.52	109,470.11	54.31%	5.00	100.00%
02.06.02.02	APERTURA DE HOYOS	ha	290.00	45.07	13,070.30		2,704.20			60.00	2,704.20	20.69%	0.46	45.69%
02.06.02.03	TRASLADO DE PLANTONES	mil	372.07	234.40	87,259.00		1.26			32.00	1.26	86.0%	340.07	91.40%
02.06.02.04	ESTABLECIMIENTO EN CURVAS A NIVEL	mes	4.00	19,564.75	78,259.00								4.00	100.00%
02.06.02.05	TRASLADO, ESTABLECIMIENTO Y RIEGO VOLANTE DE PLANTONES	ha	290.00	271,811.10	78,259.00								266.62	100.00%
02.06.02.06	CARGUIO Y DESCARGUE DE PLANTONES DE PINO	mil	500.00	415.14	207,570.00								500.00	100.00%
02.06.02.07	CERCO DE PROTECCION DE PLANTACIONES DE PINOS	mil	872.44	88.71	77,394.15								842.44	96.56%
2.07	PRODUCCION DE PLANTONES DE QUENUA Y COLLE	m	10,500.00	11.42	119,910.00								10,500.00	100.00%
					517,762.87									


  
 DIRECTOR GENERAL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

FRT-01

**VALORIZACION DESAGREGADA N° 11 - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024**

PROYECTO : "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN APOYO A LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"  
 CUI N° : 2599658  
 MODALIDAD: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA - EPD  
 META/SEC. FUN. : 0025 FORESTACION Y REFORESTACION  
 FUENTE FTO: 1. 00 RECURSOS ORDINARIOS  
 VALOR REF. 2 : S/ 4,033,217.63  
 AÑO FISCAL: 2024  
 MES: DICIEMBRE  
 ASIG. PPTAL : S/ 1,665,046.00  
 PLAZO EJEC: 24 MESES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	P.U.	MONTO TOTAL S/.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		%	SALDO POR EJECUTAR	
						METRADO	MONTO S/.	METRADO	MONTO S/.	METRADO	MONTO S/.		METRADO	MONTO S/.
02.07.01	PRODUCCION DE PLANTONES				107,764.09									
02.07.01.01	RECOLECCION DE ESQUEJES DE QUENUA Y COLLE	ml	203.94	125.11	25,514.93	55.00	6,881.05	-	-	55.000	6,881.05	26.97%	148.94	18,633.88
02.07.01.02	PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE DE QUENUA Y COLLE	m3	168.00	141.10	23,704.80	46.00	6,490.60	-	-	46.000	6,490.60	27.38%	122.00	17,214.20
02.07.01.03	EMBOLSADO DESUSTRATO PARA REPIQUE DE QUENUA Y COLLE	ml	203.94	107.71	21,966.38	55.00	5,924.05	-	-	55.000	5,924.05	26.97%	148.94	16,042.33
02.07.01.04	ENFLADO DE BOLSAS	ml	203.94	10.98	2,239.26	55.00	2,842.95	-	-	55.000	2,842.95	26.97%	148.94	7,688.71
02.07.01.05	MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS	ml	203.94	10.98	2,239.26	55.00	603.90	-	-	55.000	603.90	26.97%	148.94	1,635.36
02.07.01.06	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS	ml	203.94	10.98	2,239.26	55.00	600.60	-	-	55.000	600.60	26.97%	148.94	1,638.66
02.07.01.07	MANEJO FISIONUTRICIONAL	ml	203.94	10.98	2,239.26	55.00	1,427.80	-	-	55.000	1,427.80	26.97%	148.94	3,866.48
02.07.01.08	REMOCCION Y SELECCION DE PLANTONES	ml	203.94	25.96	5,284.28	80.00	5,891.20	-	-	80.000	5,891.20	39.23%	123.94	9,188.91
02.07.01.09	DESHIERBO EN CANAS DE REPIQUE	m2	1,031.00	74.14	15,120.11	120.00	138.00	-	-	120.000	138.00	11.64%	911.00	1,047.65
02.07.02	ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES			1.15	1,185.65									
02.07.02.01	TRAZO Y MARCACION PARA EXCAVACION DE HOYOS				409,968.87									
02.07.02.02	APERTURA DE HOYOS	ha	130.00	114.79	14,922.70	10.00	1,147.90	-	-	10.000	1,147.90	7.69%	120.00	13,774.80
02.07.02.03	TRASLADO DE PLANTONES	ml	166.79	1,033.84	172,434.17	-	-	-	-	-	-	0.00%	166.79	172,434.17
02.07.02.04	ESTABLECIMIENTO EN CURVAS A NIVEL	mes	4.00	29,090.75	116,363.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	4.00	116,363.00
02.08.01	MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES	ha	130.00	817.30	106,249.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	130.00	106,249.00
02.08.02	CERCO DE PROTECCION DE PLANTACIONES DE QUENUA Y COLLE	mes	12.00	7,131.95	85,583.40	-	-	-	-	-	-	0.00%	12.00	85,583.40
03.01	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	m	5,000.00	11.21	56,050.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	5,000.00	56,050.00
03.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA				678,714.48									
03.01.01	PRESTACION DE ASISTENCIA TÉCNICA	mes	22.00	24,472.08	538,385.76	-	-	-	-	-	-	0.00%	22.00	538,385.76
03.01.02	CURSO TALLER EN MANEJO FORESTAL	Evento	30.00	1,500.00	45,000.00	7.00	171,304.56	1.00	24,412.03	8.000	195,776.64	36.36%	14.00	342,899.12
03.01.03	PASANTIA A LUGARES EXITOSOS	vje	1.00	48,710.15	48,710.15	20.00	30,000.00	-	-	20.000	30,000.00	66.87%	10.00	15,000.00
03.01.04	DIFUSION	GBL	1.00	17,203.42	17,203.42	-	-	-	-	-	-	0.00%	1.00	48,710.15
03.02.01	ORGANIZACION				17,203.42									
03.02.01	CONSTITUCION DE ASOCIACIONES	assoc.	5.00	1,493.22	7,466.10	-	-	-	-	-	-	0.00%	5.00	7,466.10
03.03.01	EQUIPAMIENTO				19,915.25									
03.03.01	EQUIPAMIENTO	Modulo	1.00	19,915.25	19,915.25	0.13	2,669.64	6.82	16,553.13	0.954	18,999.15	95.40%	0.05	916.10
03.04.01	ANALISIS DE SUELO				2,033.80									
03.04.01	ANALISIS DE SUELO	und	20.00	101.69	2,033.80	-	-	-	-	-	-	0.00%	20.00	2,033.80
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>3,095,348.28</b>									
<b>GASTOS GENERALES</b>					<b>582,138.55</b>									
<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>					<b>192,324.75</b>									
<b>SUB TOTAL</b>					<b>3,869,811.58</b>									
<b>IGV (18% Materiales y Equipos - Obtenidos del PAC)</b>					<b>193,406.05</b>									
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>					<b>4,033,217.63</b>									
<b>AVANCE %</b>					<b>100%</b>									
<b>ANTERIOR</b>					<b>725,532.29</b>									
<b>ACTUAL</b>					<b>114,687.16</b>									
<b>ACUMULADO</b>					<b>840,189.45</b>									
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>					<b>2,295,148.33</b>									
<b>ANTERIOR</b>					<b>402,268.40</b>									
<b>ACTUAL</b>					<b>140,120.24</b>									
<b>ACUMULADO</b>					<b>2,935,148.33</b>									
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>					<b>2,795,000.00</b>									

PROYECTO ESPECIAL SIEMPRE EN CENTRO SUR  
 PARA EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES EMATICOS  
 PESIS DEL DISTRITO DE QUINUA EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
 Ing. *Andrés Cabrera Llantoy*  
 CIP. 153115  
 SUPERVISOR

102
