

INFORME N° 097-2025-AKVR

PARA : **Ing. Máximo David Ramos Chavarri**
Inspector del PI CUI N°2410964

DE : **Ing. Anyella Karina Vela Ramírez**
Coordinadora del Componente Socio Ambiental del PI CUI N°2410964

ASUNTO : Alcanzo Informe de Transparencia correspondiente al mes de abril 2025

FECHA : Moyobamba, 28 de abril del 2025

Por medio de la presente tengo el agrado de expresarle mi cordial saludo y a su vez hacerle llegar el informe de transparencia respecto a la ejecución física y financiera del mes de abril correspondiente al **Componente Socio Ambiental** del Proyecto de Inversión **“Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba – provincia de Moyobamba – departamento de San Martín”** con **CUI N°2410964**.

Se adjunta:

- Informe de Transparencia – Ejecución física y financiera correspondiente al mes de abril 2025 del CSA con CUI N°2410964.

Es todo cuanto informo a usted, para los trámites necesarios.

Atentamente;



Firmado digitalmente por:
VELA RAMIREZ ANYELLA
KARINA FIR 46113015 hard
Motivo: SOY EL AUTOR DEL
DOCUMENTO
CARGO: COORDINADORA DEL COMP.
SOCIO AMB. CUI N° 2410964
Fecha: 28/04/2025 15:03:00-0500



ESTADO SITUACIONAL

COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
JUNINGUILLO DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA DEL DISTRITO DE
MOYOBAMBA – PROVINCIA DE MOYOBAMBA -DEPARTAMENTO DE SAN
MARTÍN” CON CUI N°2410964.



RESPONSABLE:

Ing. Anyella Karina Vela Ramírez
COORDINADORA
Componente Ambiental del PI CUI N°2410964

ABRIL 2025



I. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Componente Socio Ambiental:

De acuerdo al estudio definitivo viabilizado, se define como **Componente Socio Ambiental del Proyecto de Inversión “Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba – provincia de Moyobamba -departamento de San Martín” con CUI N°2410964.**

1.2 Descripción:

El Componente de Intervención Ambiental es parte del Proyecto de Inversión Pública con CUI N° 2410964 **“Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba – provincia de Moyobamba -departamento de San Martín” con CUI n° 2410964”**, lo cual se desarrollará sobre la quebrada Juninguillo en el distrito de Moyobamba, en la provincia de Moyobamba, en la región de San Martín.

El objetivo principal del Componente Socio Ambiental es asegurar la sostenibilidad del proyecto propiamente dicha, con el desarrollo de capacidades en educación sanitaria y ambiental a través de capacitación y sensibilización a la población; a su vez con la implementación del plan de manejo del área de intervención, a través de reforestación específica del área de intervención por el proyecto y la implementación de asuntos sociales a través de la atención de la problemática o conflictos que se presentaran en el transcurso de la implementación del proyecto.

Así mismo, por tratarse de actividades ejecutadas relacionadas a mitigar los efectos negativos al medio ambiente, el enfoque del componente debe ser eminentemente participativo y con un enfoque social y ambiental, donde se utilice como metodología de enseñanza el “aprender haciendo”, asimismo se debe tener en cuenta la cultura y el perfil de los beneficiarios.

COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL DEL PI CON CUI N° 2410964	
APROBADO	Resolución Gerencial N°089-2024-GRSM-PEAM-GG, de fecha 13 de marzo del 2024.
INSPECTOR	Ing. Máximo David Ramos Chavarri
COORDINADOR	Ing. Anyella Karina Vela Ramírez
ADMINISTRADOR	Lic. Adm. Margoth Lopez Rojas
INGENIERÍA SANITARIA	Ing. Jessica Marleny Sandoval Espinoza
FACILITADOR EN LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL	Ing. Karen Paola Linares Flores
FACILITADOR DE LA ACTIVIDAD EN PLAN DE INTERVENCIÓN AGROFORESTAL	Ing. Carlos Darwin Vásquez Rodas



TÉCNICO DE CAMPO PARA LA REFORESTACIÓN PARTE ALTA	Bach. Emerson Chávez Noriega
TÉCNICO DE CAMPO PARA LA REFORESTACIÓN PARTE BAJA	Tec. Pablo Riva Lopez
TÉCNICO DE CAMPO PARA EL ÁREA DE REMEDIACIÓN DE DESBOSQUE	Tec. Héctor Francisco Barco Soriano

Fuente: Elaboración Propia.

II. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados: Fondo de compensación Regional (FONCOR)

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


3.1 Ejecución de gastos a nivel de devengado

Se viene **devengado** hasta la fecha el monto de S/ 87, 339.90 (Ochenta y siete mil trescientos treinta y nueve con 90/100 soles), correspondiente al 11.90% de avance.

Cuadro Resumen:

EJECUCIÓN FINANCIERA DEVENGADO ACUMULADO SEGÚN PIM 2025

AÑO 2025		
PIM	EJECUTADO (DEVENGADO ACUMULADO)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
734,194.00	87, 339.90	11.90%

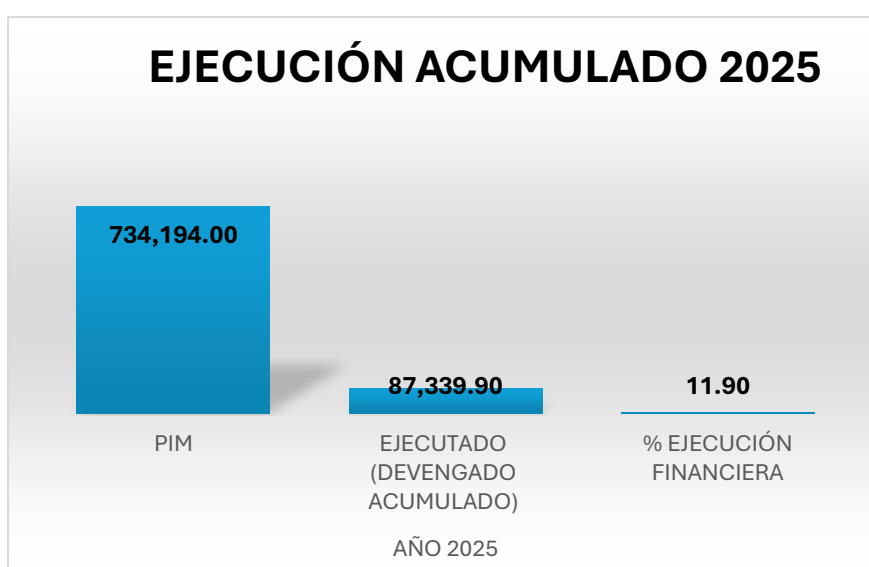

3.2 Ejecución Física

El Componente Socio Ambiental para este año 2025, considera el capacitar en educación ambiental y sanitaria, reforestación del área de intervención además del área de remediación de desbosque, instalación de pozos sépticos, módulos ambientales y la implementación de actividades ambientales, como acción de sensibilización se están desarrollando charlas con la finalidad de dar a conocer sobre las actividades que se implementarán con el componente. En este contexto las acciones desarrolladas en el mes de abril fueron las siguientes.

Actividades ejecutadas durante el mes de abril del 2025:

- ❖ En el mes de abril del presente año se tiene una ejecución porcentual acumulado a nivel de devengado por el monto de S/ 87, 339.90 y un porcentaje equivalente a 11.90 %.
- ❖ Se realizaron los requerimientos de los insumos (abono orgánico, cocinas mejoradas y otros) para la implementación del Plan de Intervención Agroforestal.
- ❖ Se georreferenciaron y evaluaron hasta la fecha 12 parcelas de un total de 14 existentes en la parte baja de la quebrada Juningullo, lo cual corresponde a un avance de 85.71% respecto a esta actividad.
- ❖ Se logró la siembra de 1684 plantones forestales y 638 plantones frutales con los beneficiarios de los centros poblados, Creación 2000, las Orquídeas, Nuevo Progreso, representando un total de 6.496 hectáreas reforestadas.
- ❖ Se logró elaborar 12 mapas de dispersión de un total de 14 parcelas georreferenciadas en la parte baja, lo cual corresponde a un avance de 85,71 % respecto a esta actividad.
- ❖ Se logró evaluar hasta la fecha 10 parcelas de un total de 14 existentes en la parte alta de la quebrada Cocabamba, lo cual corresponde a un avance de 71.4 % respecto a esta actividad.
- ❖ Se logró realizar la evaluación al 100% del monitoreo ambiental ejecutado por la empresa contratista CONSORCIO SELVA PERÚ.
- ❖ Se logró elaborar el expediente técnico de módulos de tratamiento de aguas mieles para beneficiarios al 100%, además se realizó el requerimiento del servicio para su ejecución.
- ❖ Se logro elaborar al 100% el requerimiento de contratación de servicio de "IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS para una correcta ejecución del procedimiento.
- ❖ Se logró realizar los talleres de educación sanitaria y ambiental a los estudiantes de nivel primaria y secundaria de las siguientes Instituciones educativas;
 - ❖ I.E. N°01067 Creación 2000
 - ❖ I.E. N°00910 Cordillera Andina
 - ❖ I.E. N°00944 Nuevo Progreso
 - ❖ I.E. N°00984 Juningue



Panel fotográfico




IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ❖ En el mes de abril del presente año se tiene una ejecución porcentual acumulado a nivel de devengado por el monto de S/ 87, 339.90 y un porcentaje equivalente a 11.90 %.
- ❖ Se realizaron los requerimientos de los insumos (abono orgánico, cocinas mejoradas y otros) para la implementación del Plan de Intervención Agroforestal.
- ❖ Se georreferenciaron y evaluaron hasta la fecha 12 parcelas de un total de 14 existentes en la parte baja de la quebrada Juningullo, lo cual corresponde a un avance de 85.71% respecto a esta actividad.
- ❖ Se logró la siembra de 1684 plantones forestales y 638 plantones frutales con los beneficiarios de los centros poblados, Creación 2000, las Orquídeas, Nuevo Progreso, representando un total de 6.496 hectáreas reforestadas.
- ❖ Se logró elaborar 12 mapas de dispersión de un total de 14 parcelas georreferenciadas en la parte baja, lo cual corresponde a un avance de 85,71 % respecto a esta actividad.
- ❖ Se logró evaluar hasta la fecha 10 parcelas de un total de 14 existentes en la parte alta de la quebrada Cocabamba, lo cual corresponde a un avance de 71.4 % respecto a esta actividad.
- ❖ Se logró realizar la evaluación al 100% del monitoreo ambiental ejecutado por la empresa contratista CONSORCIO SELVA PERÚ.
- ❖ Se logró elaborar el expediente técnico de módulos de tratamiento de aguas mieles para beneficiarios al 100%, además se realizó el requerimiento del servicio para su ejecución.
- ❖ Se logro elaborar al 100% el requerimiento de contratación de servicio de “IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS para una correcta ejecución del procedimiento.
- ❖ Se logró realizar los talleres de educación sanitaria y ambiental a los estudiantes de nivel primaria y secundaria de las siguientes Instituciones educativas;
 - I.E. N°01067 Creación 2000
 - I.E. N°00910 Cordillera Andina
 - I.E. N°00944 Nuevo Progreso
 - I.E. N°00984 Juningue



V. ANEXOS

Plano de Ubicación del Componente en ejecución

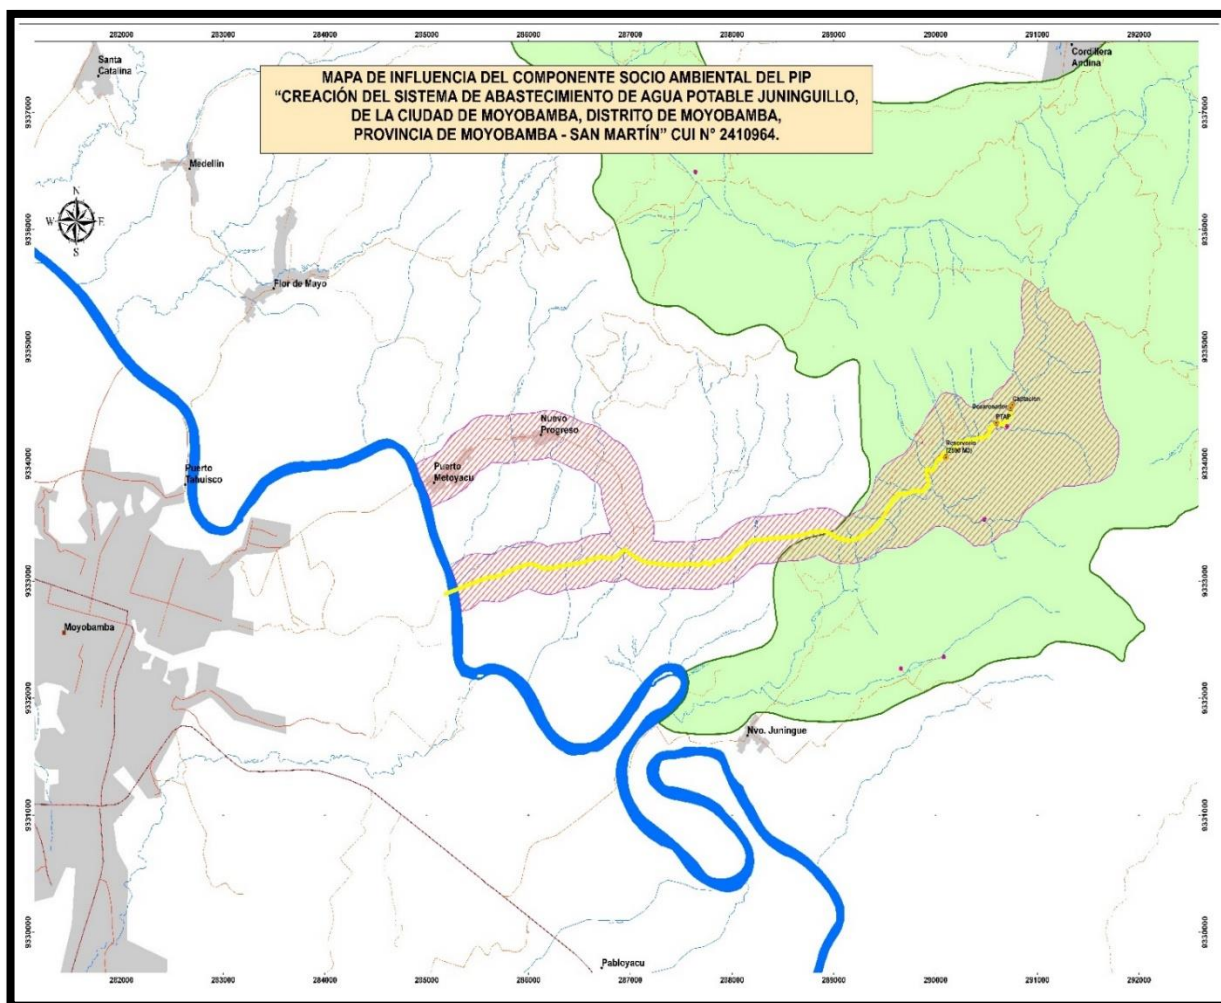

Documento Nro: 004-2025079728. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=81e89be8z0077L4cab69a17D1a2943794ded>
