



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL



**Informe para transparencia (avance físico- financiero) del PI
“Recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica
en la microcuenca Juningullo, distrito de Moyobamba-
provincia de Moyobamba - región San Martín”, CUI N° 2398144**



SEMBRANDO ÁRBOLES COSECHAMOS AGUA



PROYECTO JUNINGULLO

GORESAM-PEAM

RESPONSABLE:

✓ **EDGAR LÓPEZ CÓRDOVA**

COORDINADOR

PI Juningullo

ABRIL 2025

I. DATOS GENERALES

Recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica en la microcuenca Juninguillo, distrito de Moyobamba- provincia de Moyobamba – región San Martín, CUI N° 2398144.

1.1. Descripción

El proyecto propone en su objetivo general la “Recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica en la microcuenca Juninguillo, distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - región San Martín”, Código Único de Inversiones N° 2398144, para esto se ha planteado la implementación de 04 componentes. Para la recuperación de áreas degradadas se realizará la instalación y manejo de viveros permanentes para la producción de especies forestales nativas de la zona, reforestación de 1,056.94 ha a través de sistemas de siembra lineal, fortalecimiento y sensibilización tanto a pobladores asentados en la microcuenca y pobladores beneficiarios del barrio Zaragoza de la ciudad de Moyobamba.


Con la ejecución del proyecto de inversión, se espera recuperar la capacidad de regulación hídrica de las microcuencas Chuyayacu, El Milagro, Vilchez y Balta, abastecedoras del sistema de agua potable de la población del barrio Zaragoza, Moyobamba, con la implementación de sistemas agroforestales en las áreas afectadas de la microcuenca Juninguillo.

1.2. Localización

Región: San Martín
Distrito: Moyobamba
Provincia: Moyobamba
Sectores: El Atajo, Juninguillo (EPS) y Cordillera Andina

1.3. Ubicación Geográfica

Las coordenadas perimétricas según Datum WGS 84, proyección UTM Zona 18s; corresponden a los siguientes sectores que son las áreas a intervenir por el proyecto.

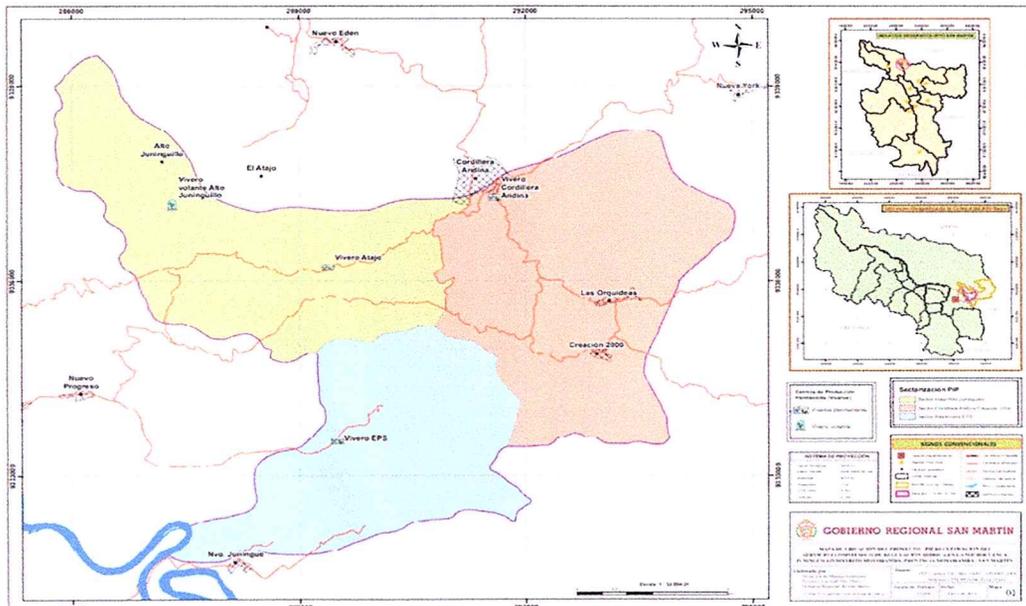

1.4. Modalidad de Ejecución: Administración Directa

1.5. Unidad Ejecutora de Inversiones: Proyecto Especial Alto Mayo

II. MARCO PRESUPUESTAL

2.1. Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Para el Ejercicio Fiscal 2025 el proyecto con CUI N° 2398144, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de **S/ 1,022,640.00**.

EJECUCIÓN DE DEVENGADOS: A la fecha, el PI con CUI N° 2398144, se obtuvo un devengado acumulado de **S/ 216,433.16**, teniendo avance financiero de 21.16% del presupuesto asignado en el presente año por la fuente de financiamiento **FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL - FONCOR**.

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.1. Ejecución de gastos

El PIM aprobado para el año 2025 es de **S/ 1,022,640** y la ejecución presupuestal al cierre de abril 2025, es la siguiente:

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)			
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO (a)	11,344,837.22	PIM 2025 (c)	1,022,640.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2025 (b)	8,159,246.62	DEVENGADO 2025 (d)	216,433.16
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	71.9 %	AVANCE FINANCIERO 2025 (d/c)	21.2 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	3,185,590.6	SALDO POR DEVENGAR 2025 (c-d)	806,206.84
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	AGO-2019	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	ABR-2025

PIM	DEVENGADO	PORCENTAJE
S/1,022,640.00	S/ 216,433.16	21.16%



4.1.2. Actividades de identificación de parcelas.

- Identificación de 5.8416 has. correspondiente a 05 beneficiarios del sector El Atajo/Alto Juningullo.
- Identificación de 6.7822 has. correspondiente a 03 beneficiarios del sector reservorio EPS/Juningue.
- Identificación de 12.0760 has. correspondiente a 05 beneficiarios del sector Cordillera Andina/Creación 2000.

Imagen 04: Identificación de nuevas parcelas



Imagen 05: Identificación de nuevas parcelas



4.1.3. Actividades de reforestación y recalce.

- Reforestación de 2.5803 has. correspondiente a 02 beneficiarios del sector El Atajo/Alto Juningullo.
- Reforestación de 6.0958 has. correspondiente a 05 beneficiarios del sector Cordillera Andina/Creación 2000.
- Recalce de 1.21 has correspondiente a 01 beneficiario en el sector Cordillera Andina/Creación 2000.
- Recalce de 1.254 has. correspondiente a 02 beneficiarios del sector reservorio EPS/Juningue.
- Recalce de 2.1326 has. correspondiente a 01 beneficiario del sector El Atajo/Alto Juningullo.



Imagen 06: Beneficiario reforestando su parcela



Imagen 07: Beneficiario reforestando su parcela



4.1.4. Actividades de CUSAF

- Se logró identificar a 13 beneficiarios que acceden a la evaluación para ser beneficiados con derecho a CUSAF, haciendo un total de **70.0805 has**, debidamente georreferenciadas y están ubicados en los sectores de Cordillera Andina – Creación 2000, Atajo – Alto Juningullo y Reservorio EPS – Juningue.

Foto 08: Firma de formatos CUSAF – Sector Atajo

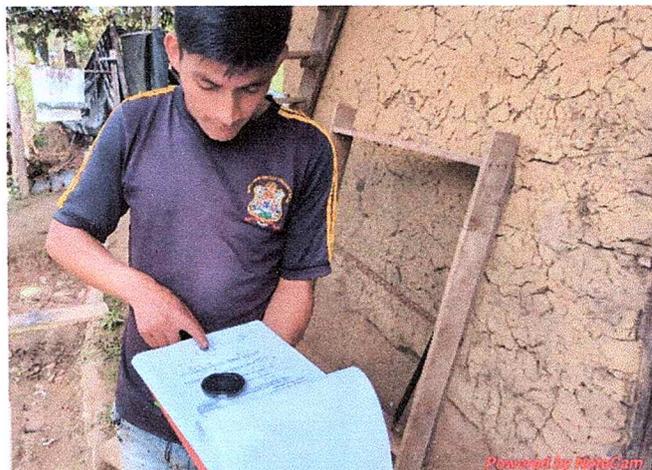


Foto 09: Firma de formatos CUSAF – Cordillera Andina



Foto 10: Firma de formatos CUSAF – Sector Reservorio EPS



4.2. COMPONENTE 02: Adecuadas prácticas para la recuperación de ecosistemas de interés hídrico.

En este componente en el mes de abril se realizó las siguientes actividades:

- Se realizó tres (03) talleres de capacitación de apicultura Sostenible- Nutrición de las abejas a los beneficiarios apícolas de los sectores de Cordillera Andina, Juníngue y Atajo.

Imagen 11: Cosecha de propóleo y derivados de las colmenas y sus usos



- 15 acompañamientos y asistencia técnica a los beneficiarios para el desarrollo de sus colmenas.

Imagen N° 12: Acompañamiento a beneficiarios del sector Cordillera Andina



Imagen N° 13: Acompañamiento a los beneficiarios del sector EPS-Juningue.



Imagen N° 14: Acompañamiento a los beneficiarios del sector Atajo-Alto Juninguillo



- Se realizó un (1) evento de degustación venta de miel con los beneficiarios del PI-Juninguillo, durante este evento, se implementó una estrategia de promoción de la miel y otros productos apícolas a través de degustación y venta directa a los trabajadores de la ARA, lo que permitió los consumidores puedan adquirir la miel cosechada por los beneficiarios.

Imagen N° 15: Degustación venta de miel en las instalaciones de la ARA



4.3. COMPONENTE 03: Suficientes conocimientos de involucrados en los MERESE.

En este componente en el mes de abril se realizó las siguientes actividades:

- 01 taller de capacitación “Perfil inicial del promotor ambiental”, en el sector Cordillera Andina, a cargo de la Ing. Anselma Zumaeta Soplín, Esp. en Fortalecimiento Organizacional del proyecto Juninguillo.

Imagen N° 16: Capacitación a beneficiarios



- 01 taller de capacitación “**Delitos ambientales**” con la Asociación Valientes Apicultoras y los beneficiarios del proyecto en el sector de Juningue, con la participación del fiscal del medio ambiente- FEMA, Autoridad Regional Ambiental- ARA, Municipalidad Provincial de Moyobamba-MPM y proyecto Juninguillo-PEAM.

Imagen N° 17: Capacitación en delitos ambientales



- 01 taller de capacitación “**Manejo integrado de plagas y enfermedades**” con los beneficiarios del sector Atajo, con el objetivo de promover el desarrollo rural sostenible mediante sistemas agroforestales, dicho taller estuvo a cargo del Ing. César Montalván y Ing. Andy Pinedo, especialistas agroforestales del proyecto Juninguillo.

Imagen 18: Exposición de los especialistas agroforestales



- 01 Taller de sensibilización con los estudiantes del nivel inicial de la IE Annie Soper, por conmemorarse el día internacional de la tierra. La actividad tuvo como finalidad sensibilizar a los niños y niñas sobre los impactos ambientales positivos que se generan al sembrar árboles y preservar la diversidad de flora existente, actividad que estuvo a cargo de la Especialista en Fortalecimiento Organizacional del proyecto Juninguillo.

Imagen 19: Sensibilización a los estudiantes de nivel inicial



- 01 Taller de capacitación a los estudiantes del segundo grado de educación secundaria del colegio Serafín Filomeno, en conmemoración del Día Internacional de la Tierra se sensibilizó a los estudiantes del segundo grado "D" de educación secundaria, sobre la importancia del agua en diversos sectores, los principales desafíos que enfrenta, y la necesidad de adoptar prácticas de conservación y uso eficiente del recurso en su vida diaria y en la comunidad, actividad que estuvo a cargo de la Especialista en Fortalecimiento Organizacional del proyecto Juninguillo.

Imagen 20: Sensibilización de los estudiantes nivel secundaria




4.4. COMPONENTE 04: Suficiente generación de información para la toma de decisiones en recuperación hídrica

Para el cumplimiento de este componente se realizó las siguientes actividades:

- Los resultados de caudales para la quebrada Alto Juninguillo (Atajo) son los siguientes: caudal promedio de 0.159m³/s, el caudal mínimo es de 0.105m³/s y el caudal máximo registrado es de 0.255m³/s.
- Los resultados de caudales para la quebrada Cocabamba (Sector Creación 2000) son los siguientes: caudal promedio de 0.184m³/s, el caudal mínimo es de 0.118m³/s y el caudal máximo registrado es de 0.316m³/s.
- Los resultados de caudales para la quebrada Juninguillo (Sector Reservorio EPS) son los siguientes: caudal promedio de 0.391 m³/s, el caudal mínimo es de 0.273 m³/s y el caudal máximo registrado es de 0.660m³/s.

Imagen 21: Localización de los puntos de aforo

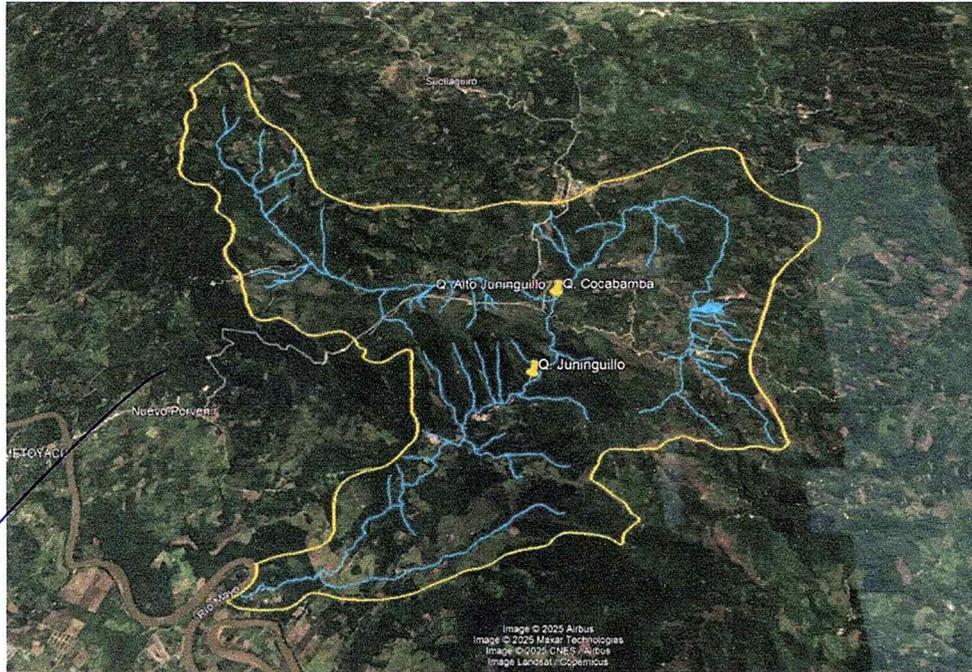

V. CONCLUSIONES

- Para el año 2025 se cuenta con un PIM aprobado de **S/ 1,022,640.00**, y a la fecha se tiene un devengado de **S/ 216,433.16**, avance financiero de 21.2%.
- Se logró producir un total de **2,572** plántones en los tres viveros: Cordillera Andina/Creación 2000, Atajo/Alto Juninguillo y Reservorio EPS/ Juningue.
- Se realizó la identificación de **24.6998** hectáreas para la reforestación en los sectores Cordillera Andina/Creación 2000, Atajo/Alto Juninguillo y Reservorio EPS/ Juningue.
- Se logró reforestar **8.6761 has**, entre los sectores Cordillera Andina/Creación 2000 y Atajo/Alto Juninguillo.
- Se logró identificar **70.0805 has**, que corresponden a 13 nuevos beneficiarios que acceden a evaluación para el derecho a CUSAF.
- Se logró 03 talleres de capacitación de apicultura Sostenible - Nutrición de las abejas.
- Se logró 15 acompañamiento técnico en temas de apicultura a los beneficiarios de los tres sectores de intervención del proyecto.
- Se realizó con los beneficiarios del PI Juninguillo, una degustación y venta de miel en las Instalaciones de la Autoridad Regional Ambiental-ARA.
- Se logró llevar a cabo 03 talleres de fortalecimiento y sensibilización con la colaboración de la MPM, FEMA y ARA a la población beneficiaria del proyecto y 02 capacitaciones a estudiantes de los centros educativos del barrio de Zaragoza.
- Se logró realizar la medición diaria de los caudales de las quebradas de Cocabamba (Sector Creación 2000), quebrada Alto Juninguillo (Atajo) y quebrada Juninguillo (EPS).

VI. RECOMENDACIONES

- Continuar trabajando articuladamente con las instituciones públicas y privadas que están involucradas en temas del medio ambiente para tomar acciones destinadas a proteger, conservar y restaurar los ecosistemas proveedoras de agua para uso poblacional.
- Fortalecer y formar organizaciones en control y vigilancia para el cuidado y protección de los bosques y de las actividades que realiza el proyecto.
