

INFORME N°129-2025-GEEM

PARA : Ing. Darlyng Luz López Gonzáles
Inspector (e) Componente Ambiental CUI N° 2223939

ASUNTO : Remito Informe Físico-Financiero correspondiente al mes de mayo del año 2025.

FECHA : Moyobamba, 30 de Mayo de 2025

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente, y al mismo tiempo presentar el informe físico – financiero correspondiente al mes de Mayo del año 2025 de las actividades contempladas en el Expediente Técnico Adicional N° 01 del Componente Ambiental del PI **“Mejoramiento del Camino Vecinal: Buenos Aires – Santa Catalina (Acceso Puente Motilones) – Flor del Mayo, Margen izquierda del río Mayo, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba – San Martín”** con CUI N° **2223939**; por lo tanto adjunto documento mencionado líneas arriba.

Sin otro particular, es cuanto tengo por informar, para los fines pertinentes, me suscribo de usted.

Atentamente,



EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO

**COMPONENTE AMBIENTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL N° 01 DEL PI
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES – SANTA CATALINA – FLOR
DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA
DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN” CON CUI N° 2223939**



RESPONSABLE:
Ing. GINIE ESTEFANI ENRIQUEZ MENDOZA
COORDINADORA
Componente Ambiental del PI CUI N° 2223939

MAYO 2025



I. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Componente Ambiental:

Componente Ambiental del Expediente Técnico Adicional N° 01 del Proyecto de Inversión ***“Mejoramiento del Camino Vecinal Buenos Aires – Santa Catalina (Acceso Puente Motilones) - Flor del Mayo, Margen Izquierda del Río Mayo, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - Región San Martín”*** con CUI N° 2223939.

1.2 Descripción:

El Componente Ambiental del Expediente Técnico Adicional N° 01 es parte del Proyecto de Inversión *"Mejoramiento del Camino Vecinal: Buenos Aires - Santa Catalina (Acceso Puente Motilones) - Flor del Mayo, margen izquierda del río Mayo, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martín"* con CUI N° 2223939, que ubica sus actividades al norte del departamento de San Martín, en la provincia de Moyobamba, entre las localidades de Buenos Aires - Santa Catalina – Flor del Mayo.

El objetivo principal del componente ambiental es Fortalecer las condiciones de transitabilidad de la carretera Buenos Aires – Santa Catalina – Flor del Mayo.

Así mismo, el desarrollo e implementación de las actividades programadas en el expediente técnico adicional N° 01 del Componente Ambiental está siendo ejecutado por la Gerencia de Gestión Ambiental, por administración directa, por un lapso de 18 meses. Considerando la participación activa de la población beneficiaria a través de los programas de asuntos sociales.

EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL N° 01 DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PI CON CUI 2223939	
DOCUMENTO DE APROBACIÓN	Resolución Gerencial N° 020-2025-GRSM-PEAM-G.G., de fecha 16 de enero del 2025.
INSPECTOR	Ing. Denis Hernán Vela Tang
COORDINADORA	Ing. Ginie Estefani Enriquez Mendoza
FACILITADOR EN GESTIÓN AMBIENTAL	Bach. Yoana Priscilla Vásquez Rodríguez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Gely Vanessa Nuñez Navarro
TÉCNICO AGROFORESTAL DE CAMPO	Herbeth Pilco Valles
	María Rosita Delgado Guevara
	Alex Idael Padilla Quispe
	Deivis Jack Díaz Lule
	Gian Carlos Vázquez Pezo

Fuente: *Elaboración propia*



II. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fondo de Compensación Regional - FONCOR

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


3.1 Ejecución de gastos

Hasta el mes de Mayo se tiene una ejecución porcentual a nivel de devengado por el monto de S/. 241,386.01 soles y un porcentaje equivalente a 54.80%

AÑO 2025		
PIM ¹	EJECUTADO (DEVENGADO ACUMULADO)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
440,499.00	241,386.01	54.80

Cuadro Resumen:

EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE DEVENGADO SEGÚN PIM¹ 2025.

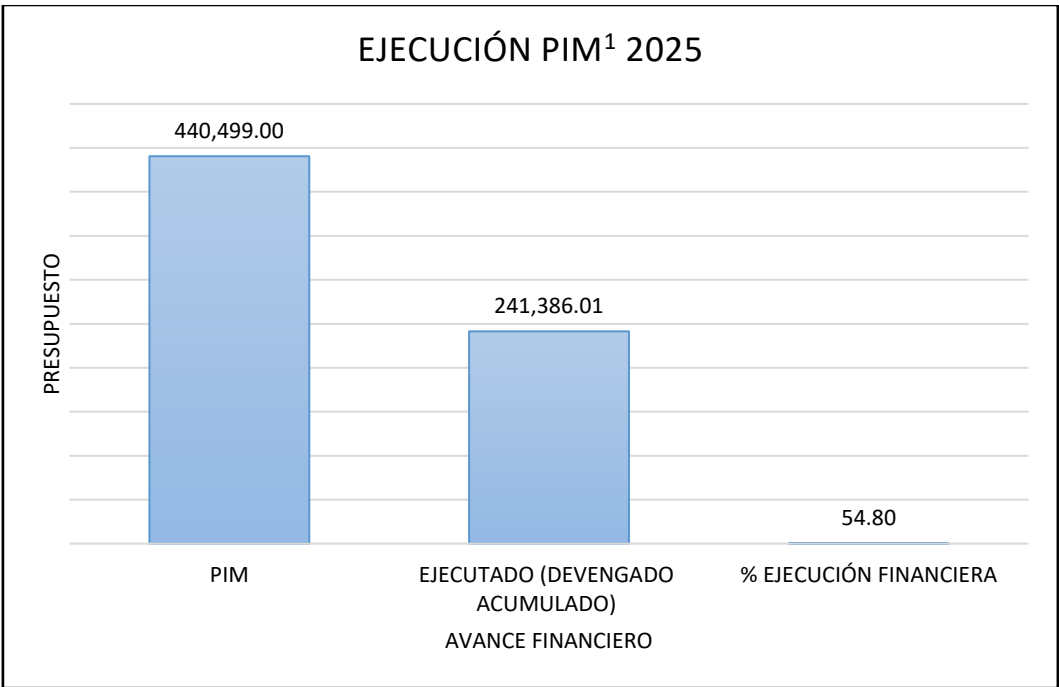

3.2 Ejecución Física

El Componente Ambiental del Expediente Técnico Adicional N° 01 para este año 2025, considera las siguientes actividades: monitoreo, evaluación continua para las actividades de reforestación.



Actividades ejecutadas durante el mes de Mayo del 2025:

- Se realizó una reunión de coordinación con el director de la I.E. N° la I.E. N° 00531 César Vallejo Mendoza, profesor Roberto Garro Villanueva del centro poblado de Buenos Aires, para concretar fecha para la ejecución de taller de capacitación sobre control de plagas y enfermedades en plantaciones forestales, el cual forma parte del programa de asuntos sociales del Componente Ambiental.



- Se llevó a cabo el Taller de control de plagas y enfermedades en plantaciones forestales, con la participación activa de los alumnos de 1^{ro}, 2^{do} y 6^{to} grado de primaria y profesores de la I.E. N° la I.E. N° 00531 César Vallejo Mendoza, ubicado en el centro poblado de Buenos Aires.



- Se desarrolló el taller de Socialización de las actividades del componente ambiental del proyecto de inversión como parte del programa de asuntos sociales con la participación de la población del centro poblado de Zapote, margen izquierda del río mayo, previa coordinación con el Agente Municipal Sr. Yeser Leodán Guevara Fernández.





- Se realizaron trabajo de campo para las labores culturales de las plantaciones tales como limpieza, hoyado, señalización, recalce, control de plagas (hormigas), en los cinco (05) tramos de intervención del área de influencia del componente ambiental (22 km desde Buenos Aires hasta Flor del Mayo), esto con el objetivo de promover el crecimiento y desarrollo saludable de las plantas sembradas en ambos márgenes del derecho de vía, mejorando su productividad y calidad y reducir la incidencia de plagas y enfermedades.

✓ TRAMO 01: km 0.0 – km 4.5 (Sector Buenos Aires – Paraje)



✓ TRAMO 02: km 4.5 – km 9.3 (Sector Gobernador – Zapote)



- ✓ TRAMO 03: km 9.3 – km 14.0 (Sector Puerto Guillermo)



- ✓ TRAMO 04: km 14.0 – km 17.8 (Sector Nuevo Piura)



- ✓ TRAMO 05: km 17.8 – km 22 (Sector Santa Catalina – Flor del Mayo)



AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA 2025 COMPONENTE AMBIENTAL PI CUI 2223939

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PROGRAMADO	EJECUTADO	% PORCENTAJE
1. MONITOREO, EVALUACIÓN CONTINUA PARA LAS ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN			
Recalce de plantones	8800	2250	26%
Sistema de riego	18	0	0%
Aplicación de abono orgánico	4	0	0%
Aplicación de fertilizantes	4	0	0%
Control de malezas	11000	3994	36%
Control de plagas, enfermedades e insectos	11000	594	5%
Monitoreo Fenologica de los Plantones (tabla)	11000	11000	100%
Implementación de vivero temporal	1	1	100%
Implementación de caseta para almacén	1	1	100%
2. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL COMPONENTE			
Elaboración de spot radial	1	0	0%
Elaboración de spot televisivo	1	0	0%
Difusión de spots radial y televisivo	4	0	0%
3. IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS			
Instalación de puntos ecológicos	4	0	0%
4. PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES			
4.1. Sub programa de comunicaciones con los actores involucrados			
Socialización de las actividades del componente ambiental del proyecto de inversión	4	2	50%
Socialización del avance de ejecución del componente ambiental del proyecto de inversión	4	1	25%
Campaña de recojo de residuos sólidos	3	0	0%
Talleres de manejo y uso adecuado de compostaje	3	1	33%
Taller de control de plagas y enfermedades en plantaciones forestales	5	0	0%
Talleres de sensibilización para el mantenimiento de las plantaciones	3	2	67%
Talleres de sensibilización en educación ambiental y educación vial	2	1	50%
Talleres de sensibilización para prácticas sostenibles sobre reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos	3	2	67%
4.2. Sub programa de mitigación de conflictos sociales		0	
Atención de quejas y absolución de consultas	5	2	40%



Documento Nro: 004-2025935717. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=45626de6Yb52644627da82dB8a89ceff32b4>

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al mes de Mayo se tiene una ejecución porcentual a nivel de devengado por el monto de S/ 241,386.01 y un porcentaje equivalente a 54.80 %.
- Para el mes de Mayo se ejecutaron actividades en gabinete, para la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y servicios, así como su seguimiento respectivo.
- Hasta el mes de mayo se logró realizar el recalce de 2250 plantones forestales entre paliperro y Yacushimbillo en ambos márgenes del derecho de vía del área de influencia, esto equivale al 26% de avance físico.
- Hasta el mes de mayo se logró realizar las labores de control de malezas de 3994 plantones, equivalente al 36% de ejecución física.
- Se logró ejecutar los talleres, capacitaciones, reuniones contempladas en el programa de asuntos sociales (tales como sensibilización para prácticas sostenibles sobre reciclaje, manejo y uso adecuado de compostaje, así como campaña de reforestación), esto equivale al 36% de ejecución física.
- Se recomienda acelerar con los trámites de requerimiento de bienes y servicios para continuar con la ejecución de las actividades contempladas en el Expediente técnico adicional N° 01 del Componente Ambiental con CUI N° 2223939.

V. ANEXOS

Plano de Ubicación del Proyecto en ejecución

