EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2013

Fuente: MEF – SIAF al 16 de junio del 2013

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 16/06/2013

Ranking de Ejecución de los Gobiernos Regionales

Gobierno Regional	Devengado S/. Millones	Avance %
446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	**302**	44.0
443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	**166**	41.0
457: GOBIERNO REGIONAL PIURA	**153**	38.3
464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO	141	**51.0**
459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	131	45.7
448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	103	36.9
453: GOBIERNO REGIONAL LORETO	100	30.2
441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH	97	34.1
442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	97	30.3
456: GOBIERNO REGIONAL PASCO	96	**55.3**
463: GOBIERNO REGIONAL LIMA	94	50.3
444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	89	24.5
462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	86	37.2
445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	82	33.2
461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES	71	**53.9**
447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA	67	31.3
440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	67	28.3
458: GOBIERNO REGIONAL PUNO	64	26.4
449: GOBIERNO REGIONAL ICA	60	22.6
460: GOBIERNO REGIONAL TACNA	51	21.0
454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	50	42.2
450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN	48	27.3
455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	42	27.3
452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	37	12.9
451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	37	20.4
465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	12	22.7

Fuente: SIAF al 16 de junio de 2013

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 16/06/2013

(Millones de Nuevos Soles)

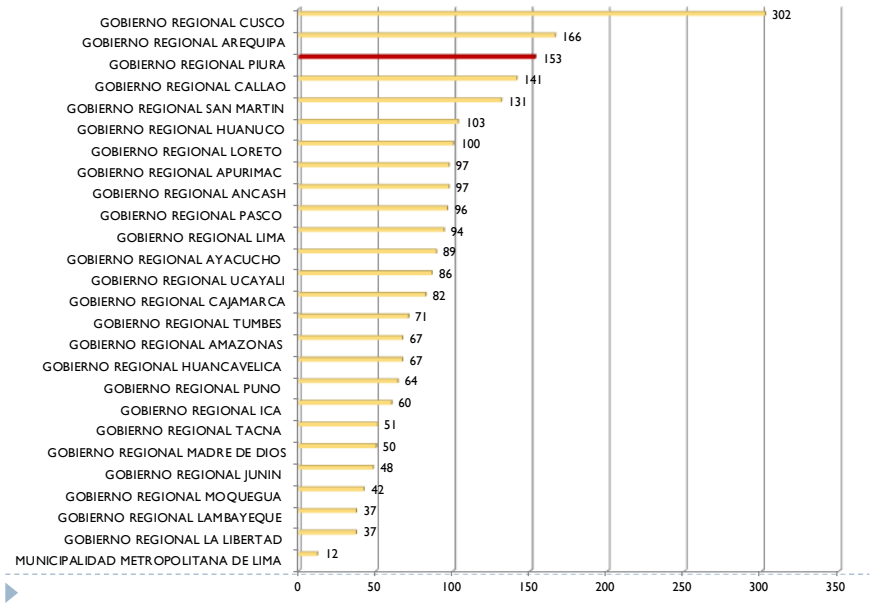

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 16/06/2013

(Porcentaje)

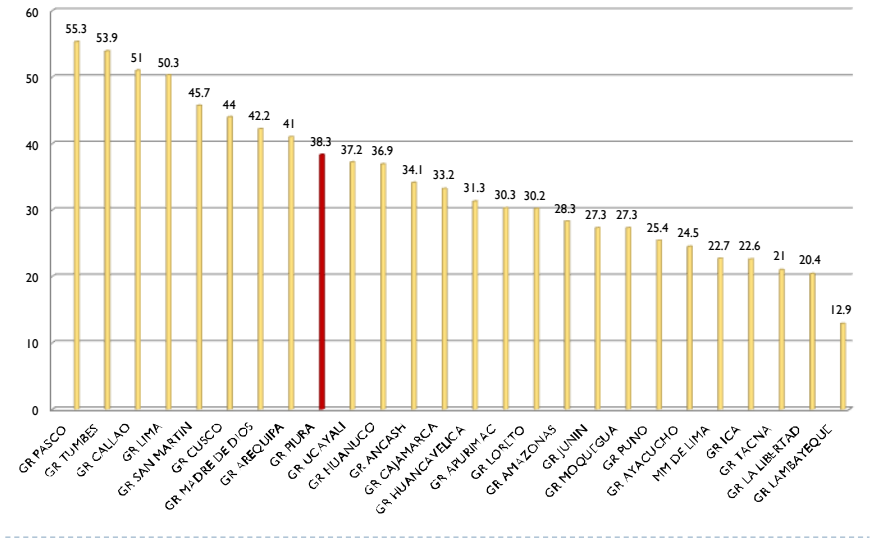

PRESUPUESTO DE INVERSIONES AL 17.06.2013

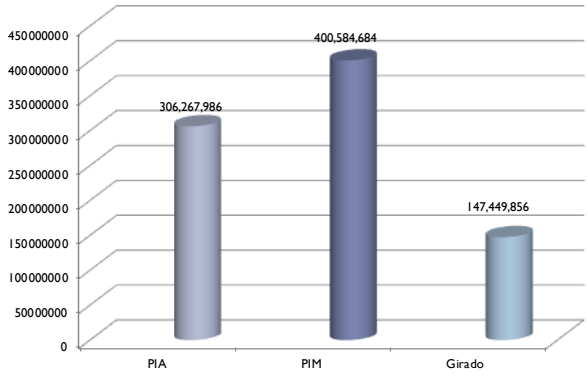

DISTRIBUCION DE INVERSIONES 2013

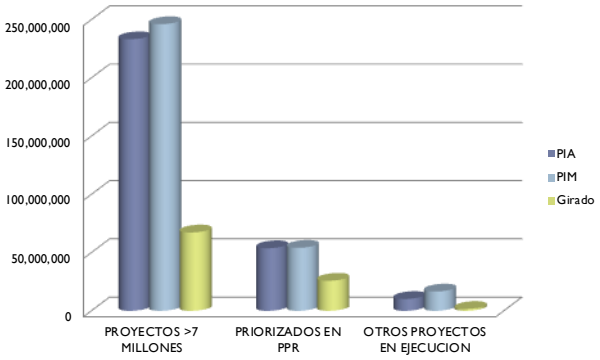

	PIA	PIM	Girado
PROYECTOS >7 MILLONES	233,186,502	246,115,880	67,262,826
PRIORIZADOS EN PPR	53,750,307	54,093,253	25,833,453
OTROS PROYECTOS EN EJECUCION	19,331,177	100,375,551	54,353,577

PIA 2013 - INVERSIONES

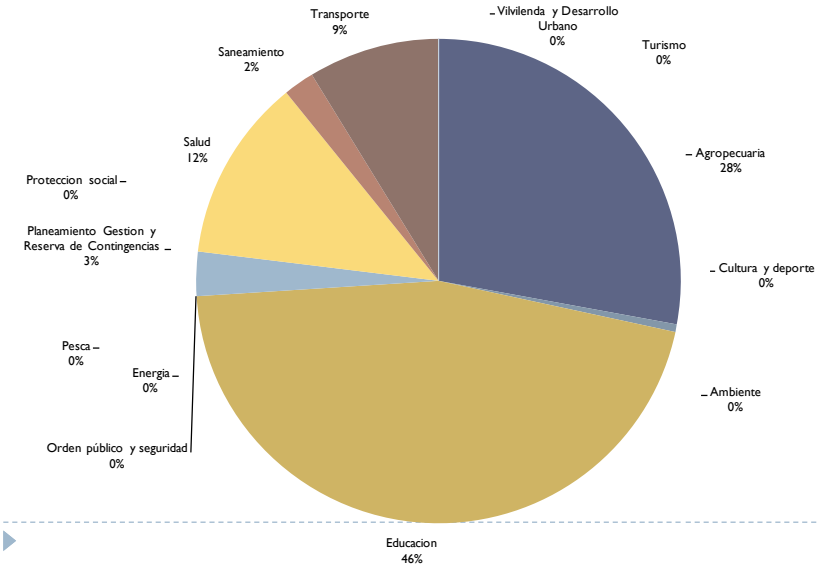

PIM 2013 - INVERSIONES

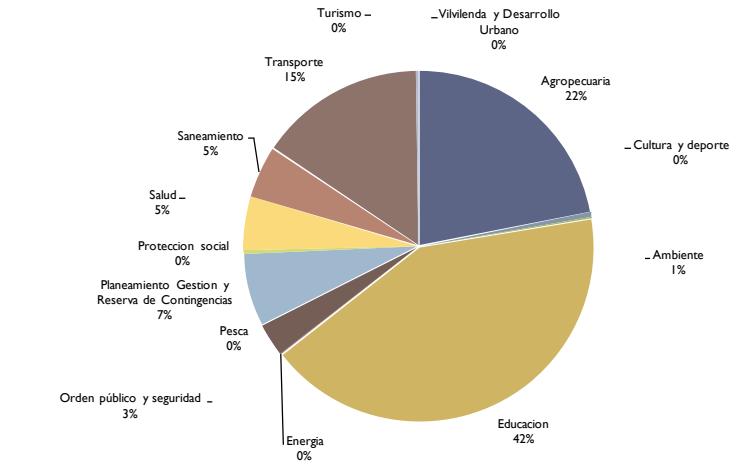

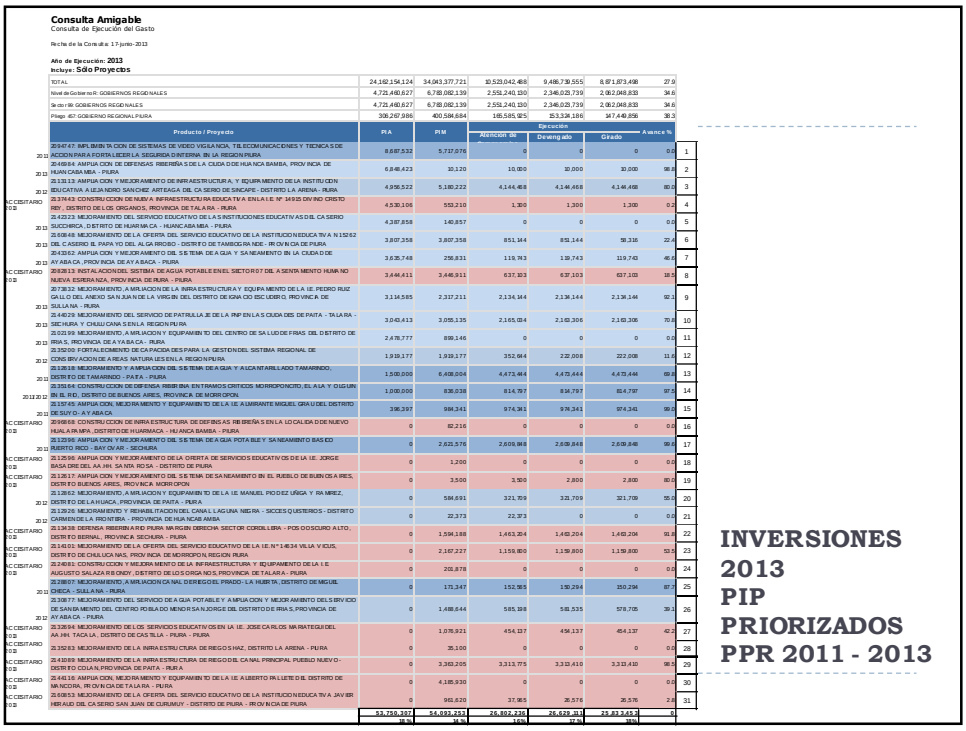

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 17-junio-2013

Año de Ejecución: 2013
Incluye: Sólo Proyectos

TOTAL	24,162,154,124	34,043,377,721	10,523,042,488	9,486,739,555	8,871,873,498	27.9	
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	4,721,460,627	6,783,082,139	2,551,240,130	2,346,023,739	2,062,048,833	34.6	
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	4,721,460,627	6,783,082,139	2,551,240,130	2,346,023,739	2,062,048,833	34.6	
Pliego 457: GOBIERNO REGIONAL PIURA	306,267,986	400,584,684	165,585,925	153,324,186	147,449,856	38.3	
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Ejecución			Avance %	
			Atención de	Devengado	Girado		
2049747: IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA, TELECOMUNICACIONES Y TECNICAS DE ACCION PARA FORTALECER LA SEGURIDA CIUDADANA EN LA REGION PIURA	8,687,532	5,737,076	0	0	0	0.0	1
2049894: AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	6,848,423	10,120	10,000	10,000	10,000	98.8	2
2133113: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA DEL CASERIO DE SINCAPE - DISTRITO LA ARENA - PIURA	4,956,522	5,180,222	4,144,468	4,144,468	4,144,468	80.0	3
2137443: CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 14930 DIVINO CRISTO REY, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	4,530,106	553,210	1,300	1,300	1,300	0.2	4
2142223: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA S INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO SUCCHIRCA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	4,387,858	140,857	0	0	0	0.0	5
2160848: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15262 DEL CASERIO EL PAPAYO DEL ALGARROBO - DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA	3,807,358	3,807,358	851,144	851,144	59,316	22.4	6
2043262: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA , PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	3,635,748	256,831	119,743	119,743	119,743	46.6	7
2069813: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ESPERANZA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	3,446,411	3,446,911	637,103	637,103	637,103	18.5	8
2073832: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. PEDRO RUIZ GALLO DEL ANEXO SAN JUAN DE LA VIRGEN DEL DISTRITO DE GONGORA DEL DEPARTAMENTO DE SULLANA - PIURA	3,134,585	2,317,211	2,134,144	2,134,144	2,134,144	92.1	9
2144029: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE LA PNP EN LA S CIUDADES DE PAITA - TALARA - SECHURA Y CHULUCANAS EN LA REGION PIURA	3,043,413	3,055,135	2,165,034	2,165,306	2,165,306	70.9	10
2102199: MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FRIAS DEL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	2,478,777	899,146	0	0	0	0.0	11
2130209: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES EN LA REGION PIURA	1,919,177	1,919,177	352,664	222,008	222,008	11.6	12
2128318: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO TAMARINDO, DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA	1,500,000	6,408,064	4,473,444	4,473,444	4,473,444	69.8	13
2131164: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA ENTRAMOS CRITICOS MORROPONCITO, EL ALA Y OJUGUN EN EL RIO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON	1,000,000	836,038	814,757	814,757	814,737	97.5	14
2157475: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ILUMINANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE SUYO - AYABACA	196,397	984,341	974,341	974,341	974,341	99.0	15
2099818: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAMPA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	0	82,216	0	0	0	0.0	16
2123196: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PUERTO RICO - BAYOVAR - SECHURA	0	2,621,576	2,609,848	2,609,848	2,609,848	99.6	17
2125196: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. JORGE BASADRE DEL AA.HH. SANTA ROSA - DISTRITO DE PIURA	0	1,200	0	0	0	0.0	18
2126217: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL PUEBLO DE BUENOS AIRES, DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA MORROPON	0	3,500	3,500	2,800	2,800	80.0	19
2128162: MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL PIO DIEZ UÑIGA Y RAMIREZ, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	0	584,691	321,709	321,709	321,709	55.0	20
2129126: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL LAGUNA NEGRA - SICCES QUISTEROS - DISTRITO CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA	0	22,373	22,373	0	0	0.0	21
2134138: DEFENSA RIBEREÑA RIO PIURA MARGEN DERECHA SECTOR COROLLERA - POS OSCURO ALTO, DISTRITO BERNAL, PROVINCIA SECHURA - PIURA	0	1,594,188	1,463,204	1,463,204	1,463,204	91.8	22
2141631: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 14834 VILLA VICUS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA	0	2,167,227	1,159,800	1,159,800	1,159,800	53.5	23
2124631: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	0	200,878	0	0	0	0.0	24
2128107: MEJORAMIENTO, AMPLIACION CANAL DERIEGO EL PRADO - LA HUERTA, DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA	0	171,347	152,565	150,294	150,294	87.7	25
2130877: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO MENOR SAN JORGE DEL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	0	1,488,644	585,198	581,535	578,705	39.1	26
2132694: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL AA.HH. TACALA , DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA	0	1,076,921	454,137	454,137	454,137	42.2	27
2132163: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE SAIHZ, DISTRITO LA ARENA - PIURA	0	35,100	0	0	0	0.0	28
2140869: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL PUEBLO NUEVO - DISTRITO COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	0	3,363,205	3,313,775	3,313,410	3,313,410	98.5	29
2146116: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALBERTO PALLETE DEL DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	0	4,185,930	0	0	0	0.0	30
2160853: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JAVIER HERAUD DEL CASERIO SAN JUAN DE CURUMUY - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA	0	961,820	37,965	26,576	26,576	2.8	31
	53,750,307	54,093,253	25,833,453	25,833,453	25,833,453	0	
	16 %	16 %	16%	17 %	18%		

INVERSIONES 2013 PIP PRIORIZADOS PPR 2011 - 2013

Presupuesto Proyectos de Impacto + PPR

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 17-junio-2013

Año de Ejecución: 2013
Incluye: Sólo Proyectos

TOTAL	24,162,154,124	34,043,377,721	10,523,042,488	9,486,739,555	8,871,873,498	27.9	
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	4,721,460,627	6,783,082,139	2,551,240,130	2,346,023,739	2,062,048,833	34.6	
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	4,721,460,627	6,783,082,139	2,551,240,130	2,346,023,739	2,062,048,833	34.6	
Pliego 457: GOBIERNO REGIONAL PIURA	306,267,986	400,584,684	165,585,925	153,324,186	147,449,856	38.3	
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Ejecución			Avance %	
			Atención de	Devengado	Girado		
2000270: GESTION DE PROYECTOS	21,847,920	23,490,004	9,082,544	9,050,247	9,002,899	38.5	
1 2040186: MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA	89,280,666	79,597,903	21,192,199	21,192,199	21,192,199	26.6	
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	50,436,534	66,871,334	19,222,133	17,440,865	15,732,797	26.1	
2018641: REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2 DEL HOSPITAL DE APOYO II SULLANA	25,842,752	3,101,292	2,756,102	551,221	551,221	17.8	
2045631: CONSTRUCCION NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA 3	17,925,997	14,754,612	6,253,529	6,247,856	6,143,347	42.3	
2043041: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAJINOS - AYABACA - SOCCHABAMBA 4	10,180,686	16,584,686	1,642,011	1,642,011	1,502,119	9.9	
2022037: CONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE - KM. 21 DE LA VIA PIURA-CHULUCANAS 5	9,000,000	26,443,136	17,604,319	10,538,875	10,337,184	39.9	
2113414: CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MIGUEL (EX-PUENTE VIEJO), PROVINCIA DE PIURA - PIURA 6	8,671,947	15,272,913	2,801,060	2,801,060	2,801,060	18.3	
	233,186,502	246,115,880	80,553,897	69,464,334	67,262,826		
	76%	61%	49%	45%	46%		
PRIORIZADOS EN PPR	53,750,307	54,093,253	25,833,453	25,833,453	25,833,453		
SUB TOTAL	286,936,809	300,209,133	106,387,350	95,297,787	93,096,279		
	94%	75%	64%	62%	63%		

EJECUCION PPR 2011 - 2013

SITUACION A JUNIO 2013

PPR 2011

No.	PPR	DNPP	Nombre del Proyecto	COD SNIP	Costo Fase Inversión	Total PPR	Ejec Acum Total	Observaciones I T 2013	
DE PIURA									
1	2011	2.114410	Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado en los ASENTAMIENTOS Túpac Amaru II Etapa y Jesús de Nazaret de Piura	105434	4,979,830	1,000,000	4,443,668	Transferido a al Municipalidad Provincial de Piura - SOSEM Avance Físico Acumulado 92.63%	
2	2011	2.077937	Ampliación de infraestructura y equipamiento para mejorar acciones de promoción, prevención y recuperación con énfasis a la Madre y el Niño - la Unión - Piura	8566	4,348,393	1,000,000	30,000	En Ejecución EXPEDIENTE TÉCNICO - Presentación de consultas desde 24/04/2013 hasta 30/04/2013. - ojo NO ESTA INCLUIDO EN PROGRAMA DE INVERSIONES GORE 2013	
3	2011	2.112396	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico Puerto Rico - Bayovar	72659	2,299,773	2,000,000	2,621,576	Obra desarrollandose con normalidad.	
CASTILLO COLONNA									
1	2011	2.112618	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y alcantarillado Tamarindo - Paita	113676	5,826,066	2,000,000	4,473,444	Se ejecuta por concurso oferta Habilitacion de camino de acceso.	
2	2011	2.115745	Ampliación, mejoramiento y equipamiento de la IE Almirante Miguel Grau - Suyo - Ayabaca	97043	3,772,756	2,000,000	5,142,348	Finalizando ejecución	
3	2011		Sistema de tratamiento y reuso de aguas residuales del Sector Talara Alta	37726	5,664,206	2,000,000		UE original EPS GRAU - Proyecto Transferidoa la Municipalidad Provincial de Talara - No registra ejecución	
4	2011	2.113145	Instalación del servicio eléctrico de los caseríos Chilaco Pelados, Chalacala Alta, Centro de Servicio y José Olaya - Sullana	131729	2,198,881	1,500,000		Sin Ejecución NO ESTA VIGENTE (2009)	
5	2011	2.128807	Mejoramiento, ampliación canal de riego el Prado - la Huerta - Miguel Checa - Sullana	137679	1,193,756	1,000,000	1,512,859	Ejecutado	
GSR MORROPON - HUANCABAMBA									
1	2011		Mejoramiento de los logros de aprendizaje en los niños y niñas de las zonas rurales de mayor pobreza ubicadas en el Distrito de Lagunas y Pacaipampa de la Provincia de Ayabaca y Distrito de Sondorillo de la Provincia de Huancabamba	69549	6,815,223	3,500,000		Observado - NO VIABLE Desde el 2007	
					37,098,884	16,000,000	18,223,895		
REPRIORIZADOS EN PPR 2012									
1	2011 2012	2.118406	Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado y agua potable en la Caleta el Ñuro-los Organos-Talara	137033	3,914,338	1,500,000	2,735,140	Recursos transferidos a municpalidad respectiva para su ejecución.	
2	2011 2012	2.135164	Construcción de defensa ribereña en tramos críticos Morroponcito, al Ala y Olguin en el rio - Buenos Aires	150160	3,771,633	2,500,000	3,482,849	Obra culminada.	
	Sub Total de Proyectos Priorizados en el Año Fiscal:			45%	44,784,855	20,000,000	24,441,884		
Total Presupuesto Institucional de Apertura Inversiones						183,017,514	122%	100%	
						11%	55%		

11 PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL 2010 - NINGUNO CONTÓ CON EL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. EN TOTAL SE ASIGNÓ EL 45% DEL MONTO DECLARADO VIABLE 3 obras culminadas , 3 proyectos transferidos, 3 en ejecución, 1 sin viabilidad 1 desactualizado

PPR 2012

No.	PPR	DNPP	Nombre del Proyecto	COD SNIP	Costo Fase Inversión	AÑO 2012 Total PPR	Ejec Acum Total	Observaciones I T 2013	
REPRIORIZADOS EN PPR 2012									
1	2011 2012	2.118406	Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado y agua potable en la Caleta el Ñuro-los Organos-Talara	137033	3,914,338	3,914,338	3,914,338	Recursos transferidos a municipalidad respectiva para su ejecución.	
2	2011 2012	2.135164	Construcción de defensa ribereña en tramos críticos Moropopncito, al Ala y Olguin en el río - Buenos Aires	150160	3,771,633	3,771,633	3,482,849	Obra culminada.	
SEDE PIURA									
1	2012	2.1352	Fortalecimiento de capacidades para la gestión del sistema regional de conservación de áreas naturales en la región	133370	3,376,748	3,484,103	465,160	En ejecución	
2	2012	2.113113	Ampliación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la institución educativa Alejandro Sanchez Arteaga-Sincape-la Arena	114491	5,337,139	5,337,139	4,226,596	En ejecución	
GSR LUCIANO CASTILLO COLONNA									
1	2012	2.062462	Reconstrucción, ampliación de infraestructura y equipamiento de la Institucion Educativa Florentino Galvez Saavedra del Sector Chinchin - Ayabaca	80272	1,007,129	871,552	818,007	En ejecución. Obra paralizada. Se rescindió contrato.	
2	2012	2.112823	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la IE Nuestra Señora de las Mercedes - Charan - Ayabaca	107943	2,039,045	2,039,045	2,435,971	Culminada, recepcionada y liquidada.	
3	2012	2.112862	Mejoramiento, ampliación y equipamiento de la IE Manuel Pio de Zuñiga y Ramirez-la Huaca-Paita	96071	3,279,256	3,279,256	2,720,473	En ejecución	
GSR MORROPON - HUANCABAMBA									
1	2012	2.130877	Mejoramiento del servicio de agua potable y ampliación y mejoramiento del servicio de saneamiento del centro poblado menor San Jorge-Frias-Ayabaca	162539	2,669,583	3,210,331	1,592,398	En ejecución	
2	2012	2.112926	Mejoramiento y rehabilitación del canal Laguna Negra Sicces Quisterios-Carmen de la Frontera-Huancabamba	132052	1,195,176	1,194,994	8,760	En ejecución - Expediente técnico	
3	2012	2.019192	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y construccion del sistema de desague en la localidad de Tunal-Lalaquiz-Huancabamba	2528	1,204,743	3,169,459	1,116,897	Obra cerrada en fase de inversión. Fue ejecutada en el 2007 en su primera etapa. Con respecto a la segunda fase se encontraron deficiencias en el diseño del proyecto (preinversión). Expediente Técnico deficiente, Deficiencias en el área administrativa, Desinterés de los beneficiarios, entre otros - Devengado acumulado.1,116,897.44	
	Sub Total de Proyectos Priorizados en el Año Fiscal:			109%	27,794,790	30,271,850	20,781,450		
Total Presupuesto Institucional de Apertura Inversiones						207,286,475	69%	100%	
						15%			

10 PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL 2011 - financiemiento al 100% de los proyectos. EN TOTAL SE ASIGNÓ EL 109% DEL MONTO DECLARADO VIABLE 2 obras culminadas, 1 proyecto transferido, 1 prpyecto paralizado, 5 obras en ejecución, 1 deshabilitado.

PPR 2013

No.	PPR	DNPP	Nombre del Proyecto	COD SNIP	Costo Fase Inversión	Año 2013 TOTAL PPR	Ejec Acum Total	Observaciones I T 2013	
SEDE PIURA									
1	2013	2.094747	Implementación de sistemas de video vigilancia, telecomunicaciones y técnicas de acción para fortalecer la seguridad interna en la región Piura	80824	23,687,535	8,687,535	18,000	Se elabora adenda para ver si hay cambio de Unidad Ejecutora ya que pertenece al Ministerio del Interior.	
2	2013	2.144029	Mejoramiento del servicio de patrullaje PNP en las ciudades de Paita, Talara, Sechura y Chulucanas	161311	3,061,913	3,061,913	2,195,104	En ejecución	
3	2013	2.160848	Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institucion educativa N° 15262 del caserío el Papayo del Algarrobo, Tambogrande, Piura	170604	3,807,358	3,807,358	851,144	En ejecución	
GSR LUCIANO CASTILLO COLONNA									
1	2013	2.043362	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua y saneamiento en la ciudad de Ayabaca II Etapa.	49538	6,876,193	4,200,000	3,360,189	En ejecución	
2	2013	2.073832	Mejoramiento, ampliacion de la infraestructura y equipamiento de la I.E. Pedro Ruiz Gallo del anexo San Juan de la Virgen, Ignacio Escudero, Sullana	83820	3,114,585	3,114,585	2,134,144	En ejecución	
3	2013	2.046984	Ampliación de defensas ribereñas de la ciudad de Huancabamba	48721	11,414,038	6,848,423	453,367	En ejecución	
4	2013		Creación de vía canal entre puente Santa Cruz y Carretera Tambogrande del distrito de Sullana	206950	4,534,439			No se pudo incluir en el PIA 2013 por demora en la solicitud de la Municipalidad Provincial de Sullana para el cambio de unidad ejecutora a favor del Gobierno Regional Piura	
GSR MORROPON - HUANCABAMBA									
1	2013	2.142323	Mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas del caserío Succhirca, Huarmaca, Huancabamba	149457	4,445,957	4,387,858		En trámite para la reformulación de expediente técnico	
2	2013	2.102199	Mejoramiento, ampliación y equipamiento del centro de salud de Frias del distrito de Frias, provincia de Ayabaca	112946	2,521,523	2,521,523	52,746	En revisión de expediente tecnico.	
3	2013		Mejoramiento de trocha carrozable Pallashaco-Huachari (progresivas 0+000 20+620) distito de Santa Catalina de Mossa y Chalaco (coejecucion GORE PIURA-MPM)	126927	3,009,784			No se pudo incluir en el PIA 2013 por demora en la solicitud de la Municipalidad Provincial de Chulucanas para el cambio de uridad ejecutora a favor del Gobierno Regional Piura	
	Sub Total de Proyectos Priorizados en el Año Fiscal:			89%	43,163,634	36,629,195	9,064,693		
Total Presupuesto Institucional de Apertura Inversiones						306,267,986	25%	100%	
						12%			

10 PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL 2011 - financiemiento al 100% de los proyectos. EN TOTAL SE ASIGNÓ EL 85% DEL MONTO DECLARADO VIABLE. 3 proyectos en cambio de UE, 5 obras en ejecución, 2 en revisión de expediente técnico.

MUCHAS GRACIAS

www.regionpiura.gob.pe
