MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones

Firmado Digitalmente por:
HELFGOTT
CASTELLANOS Ernesto
FAU 20414868216 hard
Razón: Doy VB
Cargo: JEFE - SUGOR
Fecha: 12/06/2024 18:22:02

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

Lima, 12 de junio de 2024

VISTOS:

El Informe N° 0216-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT-SUGOR y el Informe Técnico N° 090-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGERT-SUGOR-ACV de la Subunidad Gerencial de Obras de Riego Tecnificado; y, el Informe Legal N° 00159-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el 23 de diciembre de 2022, como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 021-2022-MIDAGRI-PSI, el PSI y la empresa Monte Alto Consultoría y Edificaciones S.R.L. (en adelante el Supervisor), suscribieron el Contrato N° 046-2022-MIDAGRI-PSI, contratación del servicio de Consultoría de Obra – Supervisión de la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el Grupo de Gestión Empresarial Los Genios del Agro Moderno 02-Margen Izquierda, distrito de Carabamba, provincia de Julcán, departamento de La Libertad", por el monto de S/ 152,995.25 (Ciento cincuenta y dos mil novecientos veinticinco con 25/100 Soles), que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario;

Que, el 21 de febrero de 2023, como resultado de la Licitación Pública N° 01-2022-MIDAGRI-PSI-1, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (en adelante PSI) y la empresa Ingeniería Campo Riego S.A.C., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 003-2023-MIDAGRI-PSI, contratación para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el Grupo de Gestión Empresarial Los Genios del Agro Moderno 02-Margen Izquierda, distrito de Carabamba, provincia de Julcán, departamento de La Libertad", por el monto de S/ 4'326,874.80 (Cuatro millones trescientos veintiséis mil ochocientos setenta y cuatro con 80/100 Soles), que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario;

Que, mediante Carta N° 029-2024-ICR/LOSGENIOS/MARGENIZQUIERDO/ PSI, recibida por el Supervisor el 21 de mayo de 2024, el Contratista presenta su solicitud de ampliación de plazo Nº 10 por el plazo de noventa y tres (93) días calendario, por la causal "*Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista*", debido a la presencia de lluvias, los efectos perjudiciales y consecuencias negativos al desarrollo de la obra debido a las precipitaciones pluviales desde el 17 de noviembre de 2023 al 10 de mayo de 2024, señalando lo siguiente:

"(…)

6. ANALISIS DEL HECHO Y CAUSAL GENERADORA DE LA AMPLIACION DE PLAZO:

6.1 SUSTENTACION TECNICA – ANÁLISIS DE LA CAUSAL:

JUSTIFICACION TECNICA

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

Durante los primeros meses, el desarrollo del proceso constructivo de la obra ha sido normal; sin embargo, a partir del mes de noviembre de 2023, hasta el día 10 de mayo del 2024, se produjeron constantemente fuertes lluvias de gran intensidad en la zona de obra y demás parajes del distrito de Carabamba de la provincia de Julcán, tal como se evidencia en los documentos adjuntos.

Estas ocurrencias de las lluvias con mayor intensidad y frecuencia han perjudicado el normal desarrollo de las actividades programadas del día; asimismo, consecuentemente después del cese de las lluvias no se pudieron continuar con la ejecución de las partidas por la presencia de la humedad, esta situación ha afectado la ruta crítica.

Los efectos negativos que se generaron por las precipitaciones pluviales son los que mencionamos a continuación:

1) Saturación de Plataforma del camino, tornándola resbaladiza e intransitable, impidiendo realizar los trabajos programados.
2) Saturación de los materiales de cantera, imposibilitando el transporte, el manejo adecuado y la colocación del material en las áreas correspondientes.
3) Crecida de quebradas y riachuelos, impidiendo la ejecución de las estructuras proyectadas.
4) Derrumbes y deslizamientos de taludes de corte.
5) Paralización de personal, equipos y maquinaria.
6) Atrasos y desfases en la ejecución de las partidas contractuales de obra, afectando seriamente el Calendario de Avance de Obra

6.3 CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO

(…)

e) El inicio de las circunstancias se da con fecha 17.11.2023, mediante asiento N° 587 del cuaderno de obra digital, donde el Residente de Obra redacta sobre la precipitación pluvial que afecta el normal desarrollo de la ejecución de la obra. El cierre parcial de la causal se realiza en el asiento N° 1314 de fecha 10 de mayo de 2024
f) De acuerdo a lo registrado en el cuaderno de obra por parte del residente de obra y refrendado por el supervisor de obra, se tiene 93 días con la presencia de las precipitaciones pluviales a partir del 17 de noviembre de 2023 hasta 10 de mayo de 2024. Asimismo, se debe comprender que la presencia de la lluvia no sólo afecta las actividades del momento, si no también afecta las actividades de los siguientes días, tal como se ha explicado líneas arriba
g) Por lo tanto, para la presente solicitud de ampliación de plazo se considera los días efectivos de las ocurrencias de las precipitaciones pluviales, ya que si se considera los días en que han sido afectados las actividades por las consecuencias de las lluvias, saldría un número mayor. Es así que se tiene cuantificado 93 días calendario, el cual debe computarse a partir del 28 de marzo de 2024 y siendo nueva fecha de conclusión de obra el 28 de junio de 2024.

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

CUANTIFICACION DE DIAS CALENDARIO PARA LA AMPLIACION

En base a los días de ocurrencia de las precipitaciones pluviales

N° DIAS	ASIENTO N°	FECHA	N° DIAS	ASIENTO N°	FECHA	N° DIAS	ASIENTO N°	FECHA
1	**587**	17/11/2023	32	**933**	08/02/2024	63	**1095**	19/03/2024
2	**588**	18/11/2023	33	**936**	09/02/2024	64	**1109**	21/03/2024
3	**651**	05/12/2023	34	**938**	10/02/2024	65	**1115**	22/03/2024
4	**653**	06/12/2023	35	**940**	12/02/2024	66	**1125**	25/03/2024
5	**658**	07/12/2023	36	**958**	13/02/2024	67	**1126**	26/03/2024
6	**717**	27/12/2023	37	**966**	14/02/2024	68	**1132**	27/03/2024
7	**718**	28/12/2023	38	**974**	15/02/2024	69	**1156**	02/04/2024
8	**729**	29/12/2023	39	**978**	16/02/2024	70	**1162**	03/04/2024
9	**734**	30/12/2023	40	**988**	19/02/2024	71	**1168**	04/04/2024
10	**746**	03/01/2024	41	**990**	20/02/2024	72	**1173**	05/04/2024
11	**767**	10/01/2024	42	**995**	21/02/2024	73	**1178**	06/04/2024
12	**772**	11/01/2024	43	**1007**	24/02/2024	74	**1180**	08/04/2024
13	**778**	12/01/2024	44	**1011**	26/02/2024	75	**1185**	09/04/2024
14	**783**	13/01/2024	45	**1015**	27/02/2024	76	**1187**	10/04/2024
15	**787**	15/01/2024	46	**1020**	28/02/2024	77	**1189**	11/04/2024
16	**791**	16/01/2024	47	**1025**	29/02/2024	78	**1191**	12/04/2024
17	**795**	17/01/2024	48	**1033**	01/03/2024	79	**1193**	13/04/2024
18	**799**	18/01/2024	49	**1038**	02/03/2024	80	**1195**	15/04/2024
19	**804**	19/01/2024	50	**1042**	04/03/2024	81	**1211**	16/04/2024
20	**808**	20/01/2024	51	**1046**	05/03/2024	82	**1224**	20/04/2024
21	**812**	22/01/2024	52	**1051**	06/03/2024	83	**1229**	22/04/2024
22	**816**	23/01/2024	53	**1057**	07/03/2024	84	**1235**	23/04/2024
23	**820**	24/01/2024	54	**1062**	08/03/2024	85	**1249**	25/04/2024
24	**829**	25/01/2024	55	**1067**	09/03/2024	86	**1252**	26/04/2024
25	**840**	26/04/2024	56	**1073**	11/03/2024	87	**1258**	27/04/2024
26	**854**	27/01/2024	57	**1079**	12/03/2024	88	**1268**	01/05/2024
27	**866**	29/01/2024	58	**1085**	13/03/2024	89	**1279**	02/05/2024
28	**909**	02/02/2024	59	**1089**	14/03/2024	90	**1298**	07/05/2024
29	**911**	03/02/2024	60	**1090**	15/03/2024	91	**1302**	07/05/2024
30	**913**	05/02/2024	61	**1091**	16/03/2024	92	**1309**	09/05/2024
31	**928**	07/02/2024	62	**1093**	18/03/2024	93	**1313**	10/05/2024

TOTAL DÍAS PARA AMPLIACION DE PLAZO: 93 días calendario

Del: 28 de marzo de 2024

Al: 28 de junio de 2024

Que, mediante la Carta N° 028-2024-MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES SRL/PSI/RL, recibida por la Entidad con fecha 23 de mayo de 2024, el Supervisor en virtud del Informe N° 28-2024-MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES SRL/PSI/CACN/J.S., se pronuncia sobre la solicitud de ampliación de plazo Nº 10, presentada por el Contratista, por la causal "*Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista*";

Que, por Informe Nº 0216-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT-SUGOR de la Subunidad Gerencial de Obras de Riego Tecnificado, que se sustenta en el Informe Técnico N° 090-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGERT-SUGOR-ACV del Administrador del Contrato, opina declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo Nº 10 por noventa y tres (93) días calendario; precisándose en el Informe Técnico N° 090-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGERTSUGOR-ACV los siguientes fundamentos:

"(…)

IV. ANALISIS

(…)

<u>Inicio de las circunstancias que determinan ampliación de plazo</u>

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

4.7 Al respecto, el contratista refiere que el inicio de las circunstancias que a su criterio determinan la ampliación de plazo parcial solicitada, se origina en el Asiento N° 587 en el Cuaderno de Obra Digital, de fecha 17 de noviembre de 2023, donde se reporta la presencia de fuertes precipitaciones que perjudican el avance de obra.

A. ANOTACIONES DE INICIO DE LA CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO:

- ✓ Con fecha 17 de noviembre de 2023, el Ing° Orlando Zelada Comeca, Residente de Obra de la empresa Ingeniería Campo Riego SAC, contratista a cargo de la ejecución de la obra, en el Asiento N° 587 del Cuaderno de Obra Digital, registra sobre la ocurrencia de la precipitación pluvial, por lo cual esta anotación se considera como el inicio de la causal de la ampliación de plazo. Como se comprenderá, las lluvias copiosas y frecuentes propias de la temporada de la zona, han afectado el normal desarrollo del proceso constructivo de la Obra; puesto, que el exceso de aguas pluviales satura la plataforma del camino, tornándola resbaladiza y por tanto peligrosa. Satura los materiales de cantera imposibilitando un manejo adecuado para las actividades programadas. Por otro lado, la crecida de quebradas y riachuelos impide los trabajos programados.

(…)

<u>Final de las circunstancias que determinan ampliación de plazo</u>

4.8 A criterio del contratista, se indica el cierre de causal abierta a través del Asiento N° 1314 del Residente en el Cuaderno de Obra Digital, de fecha 10 de mayo de 2024.
(…)
Siendo esto así, se tiene que el contratista solicita una ampliación de plazo parcial mediante Carta N° 028-2024-MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES SRL/PSI/RL y el Informe N° 028-2024-MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES SRL/PSI/CACN/JS, por un periodo comprendido del 17/11/2023 al 10/05/2024; sin embargo, del asiento 1314 del COD se aprecia que el Residente de Obra, ***"asienta el cierre de causal abierta por presencia de lluvias",*** *lo cual difiere de lo solicitado, puesto que si la causal finalizó, según lo asentado en el cuaderno de obra el día 10 de mayo de 2024, no estamos frente a una circunstancia sin fecha prevista de conclusión, en consecuencia dado que se solicita una ampliación de plazo por causal abierta, es el caso que el Contratista no ha cumplido con acreditar de forma indubitable, que la circunstancia alegada no tiene fecha prevista de conclusión, incumpliéndose lo dispuesto en el numeral 198.6 del Reglamento.*
(…)

El numeral 198.5 del artículo 1984 del RLCE establece que, "Cuando las ampliaciones se sustentan en causales que no correspondan a un mismo período de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve independientemente".

Asimismo, el cuarto párrafo del acápite del sub numeral 2.1.5 del numeral 2 de la Opinión N° 170-2016/DTN, señala que, "(…) cuando las solicitudes de ampliación de plazo se hubiesen sustentado en causales producidas en fechas distintas, debían ser cuantificadas, tramitadas y resueltas de manera independiente".

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

En ese sentido, las ocurrencias de lluvias señaladas por el contratista se han producido en fechas distintas, por lo que debieron ser cuantificadas y tramitadas de manera independiente, por lo que al hacer lo contrario, no se estaría cumpliendo con el procedimiento de anotar el inicio y respectivo final de causal en cada caso, como se aprecia de las anotaciones del cuaderno de obra a las que se refiere el Contratista en su solicitud, siendo estas las siguientes:

CUANTIFICACION DE DIAS CALENDARIO PARA LA AMPLIACION
En base a los días de ocurrencia de las precipitaciones pluviales

N° DIAS	ASIENTO N°	FECHA	N° DIAS	ASIENTO N°	FECHA	N° DIAS	ASIENTO N°	FECHA
1	**587**	17/11/2023	32	**933**	08/02/2024	63	**1095**	19/03/2024
2	**588**	18/11/2023	33	**936**	09/02/2024	64	**1109**	21/03/2024
3	**651**	05/12/2023	34	**938**	10/02/2024	65	**1115**	22/03/2024
4	**653**	06/12/2023	35	**940**	12/02/2024	66	**1125**	25/03/2024
5	**658**	07/12/2023	36	**958**	13/02/2024	67	**1126**	26/03/2024
6	**717**	27/12/2023	37	**966**	14/02/2024	68	**1132**	27/03/2024
7	**718**	28/12/2023	38	**974**	15/02/2024	69	**1156**	02/04/2024
8	**729**	29/12/2023	39	**978**	16/02/2024	70	**1162**	03/04/2024
9	**734**	30/12/2023	40	**988**	19/02/2024	71	**1168**	04/04/2024
10	**746**	03/01/2024	41	**990**	20/02/2024	72	**1173**	05/04/2024
11	**767**	10/01/2024	42	**995**	21/02/2024	73	**1178**	06/04/2024
12	**772**	11/01/2024	43	**1007**	24/02/2024	74	**1180**	08/04/2024
13	**778**	12/01/2024	44	**1011**	26/02/2024	75	**1185**	09/04/2024
14	**783**	13/01/2024	45	**1015**	27/02/2024	76	**1187**	10/04/2024
15	**787**	15/01/2024	46	**1020**	28/02/2024	77	**1189**	11/04/2024
16	**791**	16/01/2024	47	**1025**	29/02/2024	78	**1191**	12/04/2024
17	**795**	17/01/2024	48	**1033**	01/03/2024	79	**1193**	13/04/2024
18	**799**	18/01/2024	49	**1038**	02/03/2024	80	**1195**	15/04/2024
19	**804**	19/01/2024	50	**1042**	04/03/2024	81	**1211**	16/04/2024
20	**808**	20/01/2024	51	**1046**	05/03/2024	82	**1224**	20/04/2024
21	**812**	22/01/2024	52	**1051**	06/03/2024	83	**1229**	22/04/2024
22	**816**	23/01/2024	53	**1057**	07/03/2024	84	**1235**	23/04/2024
23	**820**	24/01/2024	54	**1062**	08/03/2024	85	**1249**	25/04/2024
24	**829**	25/01/2024	55	**1067**	09/03/2024	86	**1252**	26/04/2024
25	**840**	26/04/2024	56	**1073**	11/03/2024	87	**1258**	27/04/2024
26	**854**	27/01/2024	57	**1079**	12/03/2024	88	**1268**	01/05/2024
27	**866**	29/01/2024	58	**1085**	13/03/2024	89	**1279**	02/05/2024
28	**909**	02/02/2024	59	**1089**	14/03/2024	90	**1298**	07/05/2024
29	**911**	03/02/2024	60	**1090**	15/03/2024	91	**1302**	07/05/2024
30	**913**	05/02/2024	61	**1091**	16/03/2024	92	**1309**	09/05/2024
31	**928**	07/02/2024	62	**1093**	18/03/2024	93	**1313**	10/05/2024

*4.9 El numeral 198.1 del Artículo 198 del RLCE5, se señala que,.. "**Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor**, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente". Mediante la Carta N° 029-2024-ICR/LOSGENIOS/MARGENIZQUIERDO/PSI, de fecha 21 de mayo de 2024, la contratista Ingeniería Campo Riego SAC presenta a la supervisión su solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 10 es formulada por la empresa ejecutora Ingeniería Campo Riego SAC, a través de la Carta N° 029-2024-ICR/LOSGENIOS/MARGENIZQUIERDO/PSI, de fecha 21 de mayo de 2024 y presentada a la supervisión el mismo día, solicitando noventa y tres (93) días calendario de ampliación de plazo, desde el 28/03/2024 al 28/06/2024.*

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

La ampliación de plazo presentada se fundamenta en la presencia de fuertes precipitaciones que han perjudicado el avance de obra, retrasando la ejecución de diversas partidas y alterando la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra vigente.

Considerando que, a criterio del contratista ha establecido el 10 de mayo de 2024, el final de la causal y la presentación del pedido de ampliación de plazo al supervisor fue efectuada el 21 de mayo de 2024, dentro del plazo de los quince (15) días establecidos, con lo que se estaría cumpliendo con lo establecido en el RLCE.
(…)

<u>Del sustento y cuantificación del contratista para la ampliación de plazo.</u>
(…)

4.14 En cuanto al sustento técnico, la contratista indica que a partir del mes de noviembre de 2023 hasta mayo de 2024, se han producido constantemente fuertes lluvias en el distrito de Carabamba, zona de ubicación de la obra, según la evidencia presentada.

Según lo indicado, la ocurrencia de las lluvias con mayor intensidad y frecuencia han perjudicado el normal desarrollo de las actividades programadas del día; así mismo, después del cese de las lluvias no se pudieron continuar con la ejecución de las partidas por la presencia de humedad y saturación de los suelos, afectando la ruta crítica de las partidas.

Como parte del sustento, la contratista indica que por la presencia de las precipitaciones pluviales, se generaron los siguientes efectos negativos:

- ✓ *Saturación de la plataforma del camino, tornándola resbaladiza e intransitable, impidiendo realizar los trabajos programados.*
- ✓ *Saturación de los materiales de cantera, imposibilitando el transporte, manejo adecuado y colocación del material en las áreas correspondientes.*
- ✓ *Crecida de quebradas y riachuelos, impidiendo la ejecución de las estructuras proyectadas.*
- ✓ *Derrumbes y deslizamientos de taludes de corte.*
- ✓ *Paralización de personal, equipos y maquinaria.*
- ✓ *Atrasos y desfases en la ejecución de las partidas contractuales de obra, afectando seriamente el calendario de Avance de Obra.*

4.15 Según el análisis del contratista, los efectos negativos mostrados, como consecuencia de las precipitaciones presentadas en la zona, han perjudicado el avance de la obra y el cumplimiento de las horas de trabajo establecidas, provocando la saturación de suelos dificultando la excavación manual, el relleno y la compactación manual de zanjas, así como el rendimiento del personal obrero y personal técnico. Igualmente, las vías de acceso en todo el ámbito de la obra quedaron intransitables por activación de quebradas, imposibilitando el traslado de materiales y personal.

(…)

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

4.17 Para la cuantificación de la ampliación de plazo solicitada, el contratista ha indicado que, de acuerdo a lo registrado en el Cuaderno de Obra Digital, se tienen 93 días con presencia de precipitaciones pluviales a partir del 17/11/2023 al 10/05/2024, según el siguiente detalle:

CUANTIFICACION DE DIAS CALENDARIO PARA LA AMPLIACION

En base a los días de ocurrencia de las precipitaciones pluviales

N° DIAS	ASIENTO N°	FECHA	N° DIAS	ASIENTO N°	FECHA	N° DIAS	ASIENTO N°	FECHA
1	**587**	17/11/2023	32	**933**	08/02/2024	63	**1095**	19/03/2024
2	**588**	18/11/2023	33	**936**	09/02/2024	64	**1109**	21/03/2024
3	**651**	05/12/2023	34	**938**	10/02/2024	65	**1115**	22/03/2024
4	**653**	06/12/2023	35	**940**	12/02/2024	66	**1125**	25/03/2024
5	**658**	07/12/2023	36	**958**	13/02/2024	67	**1126**	26/03/2024
6	**717**	27/12/2023	37	**966**	14/02/2024	68	**1132**	27/03/2024
7	**718**	28/12/2023	38	**974**	15/02/2024	69	**1156**	02/04/2024
8	**729**	29/12/2023	39	**978**	16/02/2024	70	**1162**	03/04/2024
9	**734**	30/12/2023	40	**988**	19/02/2024	71	**1168**	04/04/2024
10	**746**	03/01/2024	41	**990**	20/02/2024	72	**1173**	05/04/2024
11	**767**	10/01/2024	42	**995**	21/02/2024	73	**1178**	06/04/2024
12	**772**	11/01/2024	43	**1007**	24/02/2024	74	**1180**	08/04/2024
13	**778**	12/01/2024	44	**1011**	26/02/2024	75	**1185**	09/04/2024
14	**783**	13/01/2024	45	**1015**	27/02/2024	76	**1187**	10/04/2024
15	**787**	15/01/2024	46	**1020**	28/02/2024	77	**1189**	11/04/2024
16	**791**	16/01/2024	47	**1025**	29/02/2024	78	**1191**	12/04/2024
17	**795**	17/01/2024	48	**1033**	01/03/2024	79	**1193**	13/04/2024
18	**799**	18/01/2024	49	**1038**	02/03/2024	80	**1195**	15/04/2024
19	**804**	19/01/2024	50	**1042**	04/03/2024	81	**1211**	16/04/2024
20	**808**	20/01/2024	51	**1046**	05/03/2024	82	**1224**	20/04/2024
21	**812**	22/01/2024	52	**1051**	06/03/2024	83	**1229**	22/04/2024
22	**816**	23/01/2024	53	**1057**	07/03/2024	84	**1235**	23/04/2024
23	**820**	24/01/2024	54	**1062**	08/03/2024	85	**1249**	25/04/2024
24	**829**	25/01/2024	55	**1067**	09/03/2024	86	**1252**	26/04/2024
25	**840**	26/04/2024	56	**1073**	11/03/2024	87	**1258**	27/04/2024
26	**854**	27/01/2024	57	**1079**	12/03/2024	88	**1268**	01/05/2024
27	**866**	29/01/2024	58	**1085**	13/03/2024	89	**1279**	02/05/2024
28	**909**	02/02/2024	59	**1089**	14/03/2024	90	**1298**	07/05/2024
29	**911**	03/02/2024	60	**1090**	15/03/2024	91	**1302**	07/05/2024
30	**913**	05/02/2024	61	**1091**	16/03/2024	92	**1309**	09/05/2024
31	**928**	07/02/2024	62	**1093**	18/03/2024	93	**1313**	10/05/2024

TOTAL DÍAS PARA AMPLIACION DE PLAZO: 93 días calendario

Del: 28 de marzo de 2024

Al: 28 de junio de 2024

(…)

<u>Del análisis de la supervisión para la solicitud de Ampliación de Plazo</u>

4.19 En el análisis presentado por la supervisión, ha verificado que el contratista ha cumplido con los procedimientos y plazos para el trámite de ampliación de plazo, anotando los registros de afectación por lluvias por medio del Cuaderno de Obra Digital, a través de los siguientes registros:

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

ASIENTOS REGISTRADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA:

Nº	ASIENTO Nº	FECHA	Nº	ASIENTO Nº	FECHA	Nº	ASIENTO Nº	FECHA
1	**723**	28/12/2023	27	**919**	05/02/2024	53	**1083**	12/03/2024
2	**724**	28/12/2023	28	**923**	05/02/2024	54	**1097**	19/03/2024
3	**726**	28/12/2023	29	**942**	12/02/2024	55	**1101**	19/03/2024
4	**730**	29/12/2023	30	**945**	12/02/2024	56	**1102**	19/03/2024
5	**755**	05/01/2024	31	**948**	12/02/2024	57	**1103**	19/03/2024
6	**758**	06/01/2024	32	**952**	13/02/2024	58	**1105**	20/03/2024
7	**768**	10/01/2024	33	**955**	13/02/2024	59	**1107**	20/03/2024
8	**775**	12/01/2024	34	**961**	14/02/2024	60	**1117**	22/03/2024
9	**789**	15/01/2024	35	**970**	15/02/2024	61	**1123**	25/03/2024
10	**793**	16/01/2024	36	**976**	15/02/2024	62	**1130**	26/03/2024
11	**797**	17/01/2024	37	**980**	16/02/2024	63	**1159**	02/04/2024
12	**801**	18/01/2024	38	**997**	21/02/2024	64	**1165**	03/04/2024
13	**802**	18/01/2024	39	**1003**	23/02/2024	65	**1170**	04/04/2024
14	**806**	19/01/2024	40	**1013**	26/02/2024	66	**1175**	05/04/2024
15	**810**	20/01/2024	41	**1017**	27/02/2024	67	**1181**	08/04/2024
16	**814**	22/01/2024	42	**1022**	28/02/2024	68	**1183**	08/04/2024
17	**818**	23/01/2024	43	**1028**	01/03/2024	69	**1198**	15/04/2024
18	**823**	24/01/2024	44	**1035**	02/03/2024	70	**1200**	15/04/2024
19	**833**	25/01/2024	45	**1040**	02/03/2024	71	**1202**	15/04/2024
20	**846**	26/01/2024	46	**1044**	04/03/2024	72	**1204**	15/04/2024
21	**850**	26/01/2024	47	**1048**	05/03/2024	73	**1206**	15/04/2024
22	**858**	27/01/2024	48	**1054**	06/03/2024	74	**1208**	15/04/2024
23	**873**	29/01/2024	49	**1059**	07/03/2024	75	**1213**	16/04/2024
24	**879**	30/01/2024	50	**1065**	09/03/2024	76	**1270**	01/05/2024
25	**893**	31/01/2024	51	**1069**	09/03/2024	77	**1283**	02/05/2024
26	**916**	05/02/2024	52	**1075**	11/03/2024	78	**1316**	11/05/2024

4.20 En el análisis presentado por la supervisión, ha verificado que, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra vigente, la afectación en la ruta crítica de las partidas afectadas como consecuencia de las lluvias intensas, se ha producido en los siguientes períodos:

(…)

4.21 La supervisión indica en su análisis que de la revisión de la afectación en la ruta crítica, el retraso presentado por las lluvias es de solamente 25 días calendario, en lugar de los 93 días calendario solicitados.

De lo anterior y teniendo en consideración las fechas de precipitaciones; se desprende que:

- La contratista tuvo un retraso de **25 días calendario**, como consecuencia de las lluvias, respecto al Calendario de Avance de Obra vigente.
- Evaluación final en función a la **Ruta Critica;** la evaluación individual de cada causa de ampliación, ha sido evaluada dentro de la programación integral de la obra, la misma que se ha compatibilizado con el análisis de la Ruta Critica y que luego de contemplar las superposiciones de tareas, se estaria requiriendo la cantidad de **25 días calendarios**, tal como se sustenta en los cuadros que se adjunta. Todos los motivos expuestos obligan a la entidad al reconocimiento de la citada ampliación de plazo.

4.22 Complementando lo indicado, la supervisión manifiesta que dado que el período de afectación que ha indicado la contratista de 93 días calendario, se han aprobado ampliaciones de plazo por aprobación del adicional de obra con deductivo vinculante 02 y no acceso a parcelas, no se puede aprobar ampliaciones por eventos que afecten a un mismo período de tiempo, sino que deben considerarse la superposición de períodos de tiempo. Por tanto, el análisis de la supervisión indica una ampliación de 25 días calendario, según lo siguiente:

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

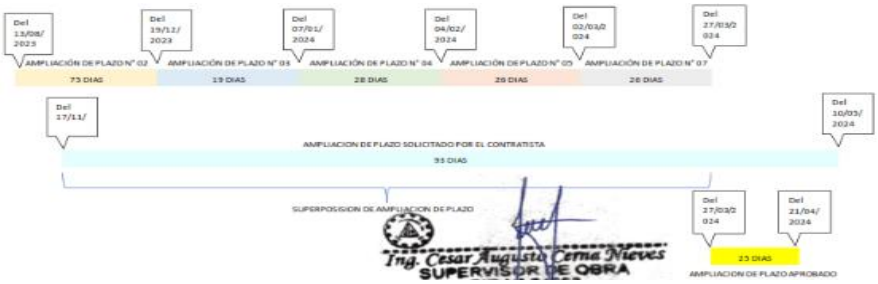

<u>Del análisis del suscrito para la solicitud de ampliación de plazo</u>

4.23 La causal que sustenta el pedido de Ampliación de Plazo Parcial N° 10 efectuado por el contratista y que cuenta con la conformidad parcial de la supervisión de obra, está sustentada de acuerdo a lo indicado en el ítem a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, del artículo 197. Causales de ampliación de Plazo, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS Nº 344-2018-EF, modificado por DS Nº 377-2019-EF, el DS Nº 168-2020-EF, el DS N° 250-2020-EF, el DS N° 162-2021-EF, el DS N° 234-2022-EF y el DS N° 308-2022-DS. Siendo dicho atraso la presencia de lluvias intensas que, a criterio del contratista, han afectado la normal ejecución de las partidas de la ruta crítica del calendario de ejecución de obra vigente.

4.24 Se presentan vistas fotográficas, con fecha y hora de los eventos climáticos, aunque no se han presentado fotografías de averías en las zanjas ni material de relleno de las mismas.

4.25 El contratista ha presentado en el anexo de su solicitud de ampliación de plazo, reportes meteorológicos de precipitaciones diarias provenientes de la Estación Meteorológica de Julcán, cercana al ámbito de influencia del proyecto, la cual es operada por el SENAMHI y cuenta con las siguientes características:

Estación: Julcán
Tipo: Meteorológica Convencional
Latitud: 8°2'32.23" S
Longitud: 78°29'9.85" O
Altitud: 3,397 m.s.n.m.
Código: 108043

En el período analizado desde el inicio de la causal hasta su término, los registros de precipitaciones diarias que sustentan los 93 días calendarios de ampliación de plazo solicitados y que figuran en el anexo de la solicitud, son los siguientes:

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

ESTACION METEOROLOGICA JULCAN - SENAMHI

Departamento: La Libertad — Provincia: Julcán — Distrito: Julcán
Latitud: 08°2'32.23" — Longitud: 78°29'9.85" — Altitud: 3,397 m.s.n.m.
Tipo: Convencional Meteorológica — Código: 108043

N°	Asiento N°	Fecha	Precip. (mm/día)	N°	Asiento N°	Fecha	Precip. (mm/día)	N°	Asiento N°	Fecha	Precip. (mm/día)	N°	Asiento N°	Fecha	Precip. (mm/día)
1	587	17/11/2023	25.50	31	928	07/02/2024	3.50	61	1091	16/03/2024	2.50	91	1302	07/05/2024	3.00
2	588	18/11/2023	10.00	32	933	08/02/2024	0.00	62	1093	18/03/2024	11.30	92	1309	09/05/2024	0.00
3	651	05/12/2023	6.50	33	936	09/02/2024	10.00	63	1095	19/03/2024	4.70	93	1313	10/05/2024	11.00
4	653	06/12/2023	7.00	34	938	10/02/2024	0.00	64	1109	21/03/2024	2.00				
5	658	07/12/2023	1.50	35	940	12/02/2024	3.50	65	1115	22/03/2024	0.00				
6	717	27/12/2023	7.50	36	958	13/02/2024	9.50	66	1125	25/03/2024	0.50				
7	718	28/12/2023	4.50	37	966	14/02/2024	23.00	67	1126	26/03/2024	0.00				
8	729	29/12/2023	9.50	38	974	15/02/2024	1.50	68	1132	27/03/2024	0.00				
9	734	30/12/2023	14.50	39	978	16/02/2024	15.00	69	1156	02/04/2024	2.00				
10	746	03/01/2024	1.00	40	988	19/02/2024	1.00	70	1162	03/04/2024	5.50				
11	767	10/01/2024	9.00	41	990	20/02/2024	0.50	71	1168	04/04/2024	21.80				
12	772	11/01/2024	2.00	42	995	21/02/2024	0.00	72	1173	05/04/2024	8.50				
13	778	12/01/2024	2.10	43	1007	24/02/2024	0.00	73	1178	06/04/2024	3.50				
14	783	13/01/2024	0.50	44	1011	26/02/2024	1.50	74	1180	08/04/2024	9.00				
15	787	15/01/2024	0.00	45	1015	27/02/2024	0.50	75	1185	09/04/2024	4.50				
16	791	16/01/2024	6.50	46	1020	28/02/2024	0.00	76	1187	10/04/2024	5.00				
17	795	17/01/2024	11.50	47	1025	29/02/2024	2.50	77	1189	11/04/2024	6.50				
18	799	18/01/2024	7.50	48	1033	01/03/2024	0.00	78	1191	12/04/2024	3.50				
19	804	19/01/2024	10.00	49	1038	02/03/2024	1.00	79	1193	13/04/2024	0.00				
20	808	20/01/2024	6.20	50	1042	04/03/2024	0.50	80	1195	15/04/2024	0.00				
21	812	22/01/2024	0.50	51	1046	05/03/2024	0.00	81	1211	16/04/2024	0.50				
22	816	23/01/2024	0.00	52	1051	06/03/2024	4.00	82	1224	20/04/2024	7.50				
23	820	24/01/2024	0.00	53	1057	07/03/2024	0.00	83	1229	22/04/2024	0.00				
24	829	25/01/2024	1.00	54	1062	08/03/2024	4.80	84	1235	23/04/2024	16.00				
25	840	26/04/2024	0.00	55	1067	09/03/2024	6.00	85	1249	25/04/2024	6.00				
26	854	27/01/2024	0.00	56	1073	11/03/2024	6.00	86	1252	26/04/2024	0.00				
27	866	29/01/2024	0.00	57	1079	12/03/2024	2.00	87	1258	27/04/2024	0.00				
28	909	02/02/2024	2.50	58	1085	13/03/2024	1.00	88	1268	01/05/2024	0.00				
29	911	03/02/2024	6.50	59	1089	14/03/2024	0.00	89	1279	02/05/2024	3.00				
30	913	05/02/2024	0.00	60	1090	15/03/2024	3.30	90	1298	07/05/2024	3.00				

4.26 Del análisis del registro de precipitaciones diarias presentadas para el período de 93 días calendario solicitados y en función de los asientos en el Cuaderno de Obra Digital, se puede determinar los días afectados según la intensidad de la precipitación producida:

Precipitaciones diarias de acuerdo a Asientos de Cuaderno de Obra			
N°	**Rango de precipitación (mm/día**	**Días afectados**	**Categoría**
1	0	26	Sin lluvia
2	1 – 5	37	Moderadamente lluvioso
3	5.1 – 10	21	Lluvioso
4	10.1– 20	5	Muy lluvioso
5	>20	4	Extremadamente lluvioso
Total		**93**	

El cuadro mostrado indica que, de acuerdo a los asientos del Residente de Obra en el Cuaderno de Obra Digital para el período reportado donde no se pudieron efectuar trabajos en la ejecución de la obra, se tiene que:

- ✓ *En 26 días donde se indicó afectación de los trabajos, el reporte de la estación muestra que no se produjeron precipitaciones.*
- ✓ *En 37 días se presentaron lluvias moderadas.*
- ✓ *En 21 días hubo días lluviosos.*
- ✓ *Solamente en 9 días se presentaron precipitaciones entre muy lluviosos y extremadamente lluviosos.*

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

4.27 En consecuencia, los días donde se indicaron afectaciones por lluvias, de acuerdo a los registros presentados, han sido menores a lo afirmado y las precipitaciones, de acuerdo a los umbrales de precipitación establecidos por el SENAMHI, indican períodos con lluvias de menor a regular intensidad en su gran mayoría. Por tanto, tal como se indica en la Opinión N° 170-2016/DTN, "es importante tener en consideración que no siempre la ocurrencia de un hecho o circunstancia por sí misma generaba la afectación de la ruta crítica, sino que dicha afectación se podría derivar de los efectos que dicho hecho o circunstancia producía en la obra". Estos efectos no han sido adecuadamente sustentados en la solicitud de ampliación de plazo.

4.28 Sin embargo, aunque se ha podido advertir hechos que podrían haber generado retrasos y ser atribuidos a los efectos climáticos, no se cumple con el procedimiento de cierre de la causal invocada, pues los eventos indicados por el contratista, se tiene debidamente acreditado en cada caso el inicio de causal, pues como se advirtió estamos frente a eventos generados en distintas fechas, por lo que, por cada uno se debió ser tramitada de manera independiente, conforme la Opinión N° 170-2016/DTN, por lo que se contraviene el numeral 198.5, al no presentarse solicitudes individuales por cada hecho.

Por tanto, en base a todo lo antes expuesto el suscrito considera que el pedido de ampliación de plazo resulta improcedente.

IV. CONCLUSIONES

5.1 De la evaluación realizada se concluye, que por la causal de Ampliación de Plazo Parcial Nº 10, presentada por la empresa Ingeniería Campo Riego SAC, en el marco del Contrato N° 003-2023-MIDAGRI-PSI, para la ejecución de la obra Los Genios del Agro Moderno 02-Margen Izquierda y bajo la causal de "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista", ES IMPROCEDENTE, por cuanto el Contratista no ha cumplido con acreditar de forma indubitable, que la circunstancia alegada no tiene fecha prevista de conclusión, incumpliéndose lo dispuesto en el numeral 198.6 del Reglamento y debido a que del sustento presentado se advierte que los hechos alegados ocurriendo en diferentes fechas incumpliéndose el numeral 198.5 del Reglamento.

(…)";

Que, el Contrato N° 003-2023-MIDAGRI-PSI se rige bajo los alcances del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y modificatorias, cuyo artículo 34 señala lo siguiente:

*"**Artículo 34. Modificaciones al contrato***

*34.1. **El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento**, por orden de la Entidad o **a solicitud del contratista**, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad (…).*

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

*34.2. **El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos**: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) **autorización de ampliaciones de plazo**, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento.*
(…)
*34.9. **El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados** y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.*
(…)" (resaltado es agregado);

Que, el artículo 197 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, aplicable al caso sub examine, establece lo siguiente:

"Artículo 197. Causales de ampliación de plazo
***El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad**, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:*

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios" (resaltado es agregado);

Que, el artículo 198 del citado Reglamento, en concordancia con lo señalado anteriormente, establece lo siguiente:

*"**Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo***
*198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, **el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra**, **el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo** y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, **el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo** ante el inspector o **supervisor**, según corresponda, con copia a la Entidad, **siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.***

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

198.2. El inspector o ***supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad*** *y al contratista* ***en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles****, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud.* ***La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles****, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.*
(…)

198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado. (…)" (resaltado es agregado).

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 00159-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ de fecha 11 de junio de 2024, opina lo siguiente:

"(…)

SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PRESENTADA

4.13 En atención a lo informado por la Unidad Gerencial de Riego Tecnificado esta Unidad efectuará el análisis legal, es decir verificar el cumplimiento de los presupuestos y el procedimiento previstos en el artículo 34 del TUO de la Ley N° 30225 y los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley N° 30225.
En ese sentido se tiene que, el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento de la Ley N° 30225, establece que, para que proceda una ampliación de plazo, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo; y que ***dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo el supervisor.***

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

ASIENTOS REGISTRADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA:

Nº	ASIENTO Nº	FECHA	Nº	ASIENTO Nº	FECHA	Nº	ASIENTO Nº	FECHA
1	**723**	28/12/2023	27	**919**	05/02/2024	53	**1083**	12/03/2024
2	**724**	28/12/2023	28	**923**	05/02/2024	54	**1097**	19/03/2024
3	**726**	28/12/2023	29	**942**	12/02/2024	55	**1101**	19/03/2024
4	**730**	29/12/2023	30	**945**	12/02/2024	56	**1102**	19/03/2024
5	**755**	05/01/2024	31	**948**	12/02/2024	57	**1103**	19/03/2024
6	**758**	06/01/2024	32	**952**	13/02/2024	58	**1105**	20/03/2024
7	**768**	10/01/2024	33	**955**	13/02/2024	59	**1107**	20/03/2024
8	**775**	12/01/2024	34	**961**	14/02/2024	60	**1117**	22/03/2024
9	**789**	15/01/2024	35	**970**	15/02/2024	61	**1123**	25/03/2024
10	**793**	16/01/2024	36	**976**	15/02/2024	62	**1130**	26/03/2024
11	**797**	17/01/2024	37	**980**	16/02/2024	63	**1159**	02/04/2024
12	**801**	18/01/2024	38	**997**	21/02/2024	64	**1165**	03/04/2024
13	**802**	18/01/2024	39	**1003**	23/02/2024	65	**1170**	04/04/2024
14	**806**	19/01/2024	40	**1013**	26/02/2024	66	**1175**	05/04/2024
15	**810**	20/01/2024	41	**1017**	27/02/2024	67	**1181**	08/04/2024
16	**814**	22/01/2024	42	**1022**	28/02/2024	68	**1183**	08/04/2024
17	**818**	23/01/2024	43	**1028**	01/03/2024	69	**1198**	15/04/2024
18	**823**	24/01/2024	44	**1035**	02/03/2024	70	**1200**	15/04/2024
19	**833**	25/01/2024	45	**1040**	02/03/2024	71	**1202**	15/04/2024
20	**846**	26/01/2024	46	**1044**	04/03/2024	72	**1204**	15/04/2024
21	**850**	26/01/2024	47	**1048**	05/03/2024	73	**1206**	15/04/2024
22	**858**	27/01/2024	48	**1054**	06/03/2024	74	**1208**	15/04/2024
23	**873**	29/01/2024	49	**1059**	07/03/2024	75	**1213**	16/04/2024
24	**879**	30/01/2024	50	**1065**	09/03/2024	76	**1270**	01/05/2024
25	**893**	31/01/2024	51	**1069**	09/03/2024	77	**1283**	02/05/2024
26	**916**	05/02/2024	52	**1075**	11/03/2024	78	**1316**	11/05/2024

Al respecto, con relación a la anotación en el cuaderno de obra del inicio y fin de las circunstancias que a su criterio determinan ampliación de plazo, de acuerdo a lo indicado por el contratista a través de los asientos siguientes anota las circunstancias para efectos de la presente solicitud de ampliación:
Ahora bien, la Unidad Gerencial de Riego Tecnificado ha manifestado que la ocurrencia de fuertes lluvias se ha producido en fechas distintas, por lo tanto, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 10 no cumple con lo dispuesto en el artículo 198.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el cuarto párrafo del acápite del sub numeral 2.1.5 del numeral 2. de la Opinión N° 170-2016/DTN, donde se indica que, cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve independientemente.

Asimismo, la UGERT señaló que los días que se indican que se vieron afectados por lluvias de acuerdo a los registros presentados han sido menores a lo afirmado; y, las precipitaciones de acuerdo a los umbrales de precipitación establecidos por el SENAMHI, indican períodos con lluvias de menor a regular intensidad en su gran mayoría. Por tanto, tal como se indica en la Opinión N° 170-2016/DTN, "es importante tener en consideración que no siempre la ocurrencia de un hecho o circunstancia por sí misma generaba la afectación de la ruta crítica, sino que dicha afectación se podría derivar de los efectos que dicho hecho o circunstancia producía en la obra". Estos efectos no han sido adecuadamente sustentados en la solicitud de ampliación de plazo.

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

4.14 En consecuencia, de conformidad con el análisis técnico expuesto por el área usuaria, corresponde declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo Nº 10 presentada por la empresa Ingeniería Campo Riego S.A.C., conforme a lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

(…)

V) CONCLUSIONES

*5.1 De acuerdo con el sustento técnico alcanzado por la Unidad Gerencial de Riego Tecnificado, corresponde **DECLARAR IMPROCEDENTE** la solicitud de ampliación de plazo Nº 10 por noventa y tres (93) días calendario, presentada en el marco del Contrato N° 003-2023-MIDAGRI-PSI, suscrito con la empresa Ingeniería Campo Riego S.A.C., para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el Grupo de Gestión Empresarial Los Genios del Agro Moderno 02-Margen Izquierda, distrito de Carabamba, provincia de Julcán, departamento de La Libertad", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.*

(…)"

Que, el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 003-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI delega en el/la jefe/a de la Unidad Gerencial de Riego Tecnificado (UGERT), en materia de contrataciones del Estado, la facultad de resolver las solicitudes de ampliación de plazo de contratos de consultoría y ejecución de obra;

Que, en ese sentido, considerando las conclusiones y recomendaciones vertidas en los informes técnicos y legal antes señalados corresponde declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 10 del Contrato N° 003-2023-MIDAGRI-PSI, suscrito con la empresa Ingeniería Campo Riego S.A.C., para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el Grupo de Gestión Empresarial Los Genios del Agro Moderno 02-Margen Izquierda, distrito de Carabamba, provincia de Julcán, departamento de La Libertad";

Con el visado de la Subunidad Gerencial de Obras de Riego Tecnificado en el marco de las funciones establecidas en los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 084-2020-MINAGRI, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 003-2024-MIDAGRI-PSI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar **IMPROCEDENTE** la solicitud de ampliación de plazo Nº 10, por noventa y tres (93) días calendario, presentada por la empresa Ingeniería Campo Riego S.A.C., en el marco del Contrato N° 003-2023-MIDAGRI-PSI, para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el Grupo de Gestión Empresarial Los Genios del Agro Moderno 02-Margen Izquierda, distrito de Carabamba, provincia de Julcán, departamento de La Libertad", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Resolución Jefatural Nº 00024-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la empresa Ingeniería Campo Riego S.A.C., y a la empresa Monte Alto Consultoría y Edificaciones S.R.L., anexando los informes técnicos y legal de sustento, que forman parte de la presente resolución.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web institucional de la Entidad (www.psi.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

Firmado Digitalmente por: HUAMAN HUAMANI Hugo Rodolfo FAU 20414868216 hard
Razón: Soy el Autor del documento
Cargo: JEFE ENCARGADO - UGERT
Fecha: 12/06/2024 18:29:58

HUGO HUAMAN HUAMANI
UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
