Resolución de Gerencia Municipal N° 082-2024- MDP/GM

Pucará, 02 de Septiembre 2024

VISTOS:

El **Contrato N° 013-2022-MDP/A**, de fecha 04 de Noviembre 2022, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Pucará y el Consorcio AQUA, cuyo objeto de contratación es la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín" (CUI N° 2333902) ; la **Carta N° 258-2024/CONSORCIO AQUA/RC**, de fecha 22 de Agosto 2024, emitido por el Consorcio AQUA; el **Informe N° 174-2024-EGJR/RO/CA**; de fecha 22 de Agosto 2024, emitido por el Residente de Obra; la **Carta N° 112-2024-CPyS/JLSB**, de fecha 22 de Agosto 2024, emitido por el Consorcio PYS (Supervisión de la Obra); el **Informe Nº 011-2024-CSPS/ING. DEPB J.S.**, de fecha 22 de Agosto 2024, emitido por el Jefe de Supervisión de la Obra; el **Informe N° 258-2024-ARQ.JMYE/GIDUR-MDP**, de fecha 28 de Agosto 2024, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural; la **Opinión Legal N° 0025-2024-JRPP-MDP/ALE**, de fecha 29 de Agosto 2024, emitido por la Asesoría Legal Externa; y, todos con los fundamentos y anexos que contienen, y;

CONSIDERANDOS:

Que, de acuerdo al **Artículo II** del **Título Preliminar** de la **Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972**, indica que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la **Constitución Política del Perú** establece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el **Articulo II** del **Título Preliminar** de la **Ley Nº 27972**, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. La autonomía que la **Constitución Política del Perú** establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Asimismo, en el **Artículo X** señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno

regional y nacional, con el objetivo de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, considerando el contenido del **Artículo 26°** de la **Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades**, se prescribe que la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la **Ley Nº 27444**. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente Ley;

Que, considerando el contenido del **Numeral 34.9** del **Artículo 34°** del **Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, que establece que: "*El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.*";

Que, considerando el **Artículo 197°** del **Reglamento** de la **Ley N° 30225**, aprobado por **Decreto Supremo N° 344-2018-EF**, y modificatorias; sobre las **Causales de Ampliación de Plazo**, se prescribe que: "*El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado; c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.*";

Que, según los **Numerales 198.1, 198.2, 198.3, 198.4, 198.5, 198.6, 198.7** y **198.8** del **Artículo 198°** del mismo cuerpo normativo, sobre **Procedimiento de Ampliación de Plazo**, se prescribe que: "*(...). Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. (...). El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de*

cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. (...). En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad. (...). Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. (...). Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve independientemente. (...). Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado. (...). La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. (...). Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada.";

Que, mediante **Contrato N° 013-2022-MDP/A**, de fecha 04 de Noviembre 2022, suscriben la **Municipalidad Distrital de Pucará** y el **Consorcio AQUA** para la **Ejecución de Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín" (CUI N° 2333902)**, siendo éste último ganador de la **Buena Pro** del

Procedimiento de Selección por **Licitación Pública N° 001-2022-CS/MDP** con fecha 18 de Octubre 2022;

Que, según **Carta N° 258-2024/CONSORCIO AQUA/RC**, de fecha 22 de Agosto 2024, emitido por el **Consorcio AQUA**, quien con asunto **SOLICITA** la **Ampliación de Plazo N° 14** del **Contrato N° 013-2022-MDP/A**, por causales de plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra, tal y como lo fundamenta el **Informe N° 174-2024-EGJR/RO/CA**, de fecha 22 de Agosto 2024 presentado por el **Residente de Obra**, quien sustenta entre otros que la **Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín" (CUI N° 2333902)**, tiene la **Causal de Ampliación de Plazo**, comprendido el 08 de Agosto 2024, fecha señalada como inicio y finalización de la causal, avalado en su **Numeral 4.3** de su **Sustento** mencionando la causal en el **Cuaderno de Obras** en el **Asiento N° 960 (08 de Agosto 2024)**; cabe resaltar que el plazo vigente contractual concluyó el 07 de Junio 2024, la aprobación del **Adicional de Obra N° 06 y Deductivo Vinculante de Obra N° 02** no se dio hasta el pasado 07 de Agosto 2024, y que ahora se requiere un plazo de mayor para ejecutar los cincuenta y cinco (55) días calendarios de plazo que tiene esta prestación adicional; en relación a la causal mencionada, es importante señalar que esta no es atribuible al contratista, ya que se origina por el plazo que ahora se requiere para la ejecución de los trabajos de la prestación adicional que van directamente vinculadas a la **Ruta Crítica** del proyecto, el 07 de Agosto 2024, momento en el cual la Entidad cumple con notificar la aprobación del **Adicional de Obra N° 06 y Deductivo Vinculante de Obra N° 02**, marca un hito donde se procede a dar inicio a los trabajos respectivos, y cuyo plazo de ejecución corresponden a cincuenta y cinco (55) días calendarios; cabe resaltar que las causales mencionadas se encuentran tipificadas en el **Artículo 197°** del **Literal b)**: "*Cuando es necesario un plazo adicional, para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiera otorgado.*"; del **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**; las buenas prácticas de la ingeniería civil, para el análisis de la afectación de una ampliación de plazo por el plazo requerido para la ejecución de adicionales de obra, se debe desplazar la partida afectada a la fecha de término de la causal, que en este caso fue el 07 de Agosto 2024 según la **Resolución de Gerencia Municipal N° 069-2024-MDP/GM**; esto produce un desplazamiento de la **RUTA CRÍTICA**, la cual tendrá un intervalo de inicio el 08 de Agosto 2024 y como fecha de término el 01 de Octubre 2024, con una duración efectiva de cincuenta y cinco (55) días calendarios (según cronograma aprobado); cabe mencionar que, luego de la culminación del plazo vigente el 07 de Junio 2024, se había computado: **(i) Ampliación de Plazo N° 12** por cuarenta y un (41) días calendarios, correspondiente del 08 de Junio 2024 al 18 de Julio 2024; **(ii) Ampliación de Plazo N° 13** por veinte (20) días calendarios, correspondiente del 19 de Julio 2024 al 07 de Agosto 2024; por lo tanto, restando la nueva fecha de fin del 01 de Octubre 2024, con la fecha de fin actualizada del 07 de Agosto 2024, se obtiene un **Plazo Adicional** de **CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS CALENDARIOS**;

Que, considerando el contenido de la **Carta N° 112-2024-CPyS/JLSB**, de fecha 22 de Agosto 2024, del **CONSORCIO PYS (Supervisión de Obra)**; con asunto **Informe sobre la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 14** de la **Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín" (CUI N° 2333902)**; remite adjunto a su Carta el **Informe N° 011-2024-CSPS/ING. DEPB J.S.**, de fecha 22 de Agosto 2024, emitido por el **Jefe de Supervisión de la Obra**, invocando que según el **Artículo 198°** y sus numerales respectivos del **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, la **Ampliación de Plazo N° 14** que será de **CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS CALENDARIOS**, solicitado por el **CONSORCIO AQUA** para el cumplimiento en lo previsto en el **Artículo 198°** del **Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, y sus modificatorias;

Que, considerando el contenido del **Informe N° 011-2024-CSPS/ING. DEPB J.S.**, de fecha 22 de Agosto 2024 del **Jefe de Supervisión de Obra**, sobre **Ampliación de Plazo N° 14**; por lo que, la supervisión se pronuncia señalando que: "*(...). El hito de inicio y fin de la causal se enmarca cunado en un solo evento extraordinario el cual corresponde a la fecha en que se realizó la aprobación mediante acto resolutivo del Adicional N° 006 y Deductivo N° 002, esta ejecución de la obra se inicia con la anotación del Asiento N° 960 del Residente de Obra (OSCE) del 08/08/2024. En dicho asiento, se deja constancia de la recepción de la resolución de aprobación de la prestación Adicional de Obra N° 06 y Deductivo de Obra N° 02 mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 069-2024-MDP/GM, de lo cual se dejó constancia en el Asiento N° 937. (...).*";

ANÁLISIS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 14 CON EL CRONOGRAMA ACTUALIZADO

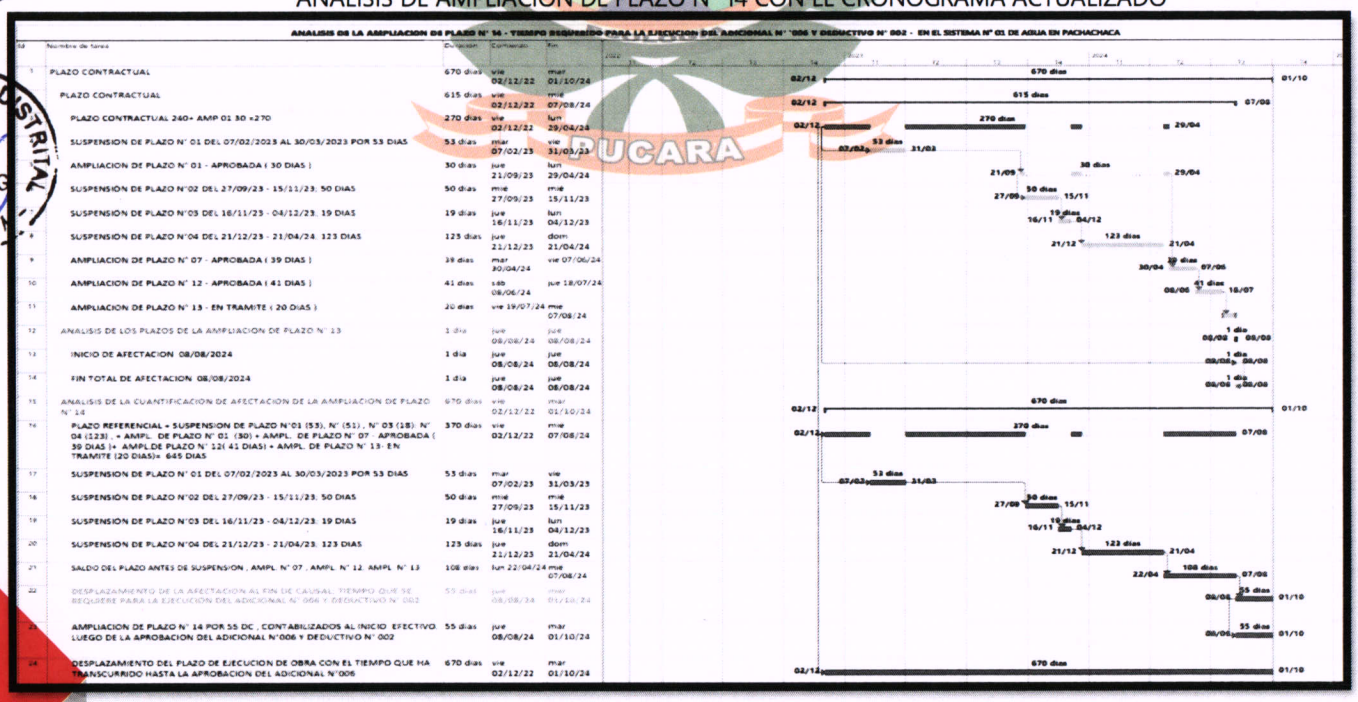

ANALISIS DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 14 - TIEMPO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL ADICIONAL N° 006 Y DEDUCTIVO N° 002 - EN EL SISTEMA N° 01 DE AGUA EN PACHACHACA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	PLAZO CONTRACTUAL	670 días	vie 02/12/22	mar 01/10/24
	PLAZO CONTRACTUAL	615 días	vie 02/12/22	mie 07/08/24
	PLAZO CONTRACTUAL 240+ AMP 01 30 +270	270 días	vie 02/12/22	lun 29/04/24
	SUSPENSION DE PLAZO N° 01 DEL 07/02/2023 AL 30/03/2023 POR 53 DIAS	53 días	mar 07/02/23	vie 31/03/23
	AMPLIACION DE PLAZO N° 01 - APROBADA (30 DIAS)	30 días	jue 21/09/23	lun 29/04/24
	SUSPENSION DE PLAZO N°02 DEL 27/09/23 - 15/11/23: 50 DIAS	50 días	mie 27/09/23	mie 15/11/23
	SUSPENSION DE PLAZO N°03 DEL 16/11/23 - 04/12/23: 19 DIAS	19 días	jue 16/11/23	lun 04/12/23
	SUSPENSION DE PLAZO N°04 DEL 21/12/23 - 21/04/24: 123 DIAS	123 días	jue 21/12/23	dom 21/04/24
	AMPLIACION DE PLAZO N° 07 - APROBADA (39 DIAS)	39 días	mar 30/04/24	vie 07/06/24
	AMPLIACION DE PLAZO N° 12 - APROBADA (41 DIAS)	41 días	sab 08/06/24	jue 18/07/24
	AMPLIACION DE PLAZO N° 13 - EN TRAMITE (20 DIAS)	20 días	vie 19/07/24	mie 07/08/24
	ANALISIS DE LOS PLAZOS DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 13	1 día	jue 08/08/24	jue 08/08/24
	INICIO DE AFECTACION 08/08/2024	1 día	jue 08/08/24	jue 08/08/24
	FIN TOTAL DE AFECTACION 08/08/2024	1 día	jue 08/08/24	jue 08/08/24
	ANALISIS DE LA CUANTIFICACION DE AFECTACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 14	670 días	vie 02/12/22	mar 01/10/24
	PLAZO REFERENCIAL + SUSPENSION DE PLAZO N°01 (53), N° (51) , N° 03 (18) N° 04 (123) , + AMPL. DE PLAZO N° 01 (30) + AMPL. DE PLAZO N° 07 - APROBADA (39 DIAS)+ AMPL.DE PLAZO N° 12(41 DIAS) + AMPL. DE PLAZO N° 13- EN TRAMITE (20 DIAS)= 645 DIAS	370 días	vie 02/12/22	mie 07/08/24
	SUSPENSION DE PLAZO N° 01 DEL 07/02/2023 AL 30/03/2023 POR 53 DIAS	53 días	mar 07/02/23	vie 31/03/23
	SUSPENSIÓN DE PLAZO N°02 DEL 27/09/23 - 15/11/23: 50 DIAS	50 días	mie 27/09/23	mie 15/11/23
	SUSPENSION DE PLAZO N°03 DEL 16/11/23 - 04/12/23: 19 DIAS	19 días	jue 16/11/23	lun 04/12/23
	SUSPENSION DE PLAZO N°04 DEL 21/12/23 - 21/04/23: 123 DIAS	123 días	jue 21/12/23	dom 21/04/24
	SALDO DEL PLAZO ANTES DE SUSPENSION , AMPL. N° 07 , AMPL. N° 12, AMPL. N° 13	108 días	lun 22/04/24	mie 07/08/24
	DESPLAZAMIENTO DE LA AFECTACION AL FIN DE CAUSAL, TIEMPO QUE SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DEL ADICIONAL N° 006 Y DEDUCTIVO N° 002	55 días	jue 08/08/24	mar 01/10/24
	AMPLIACION DE PLAZO N° 14 POR 55 DC , CONTABILIZADOS AL INICIO EFECTIVO LUEGO DE LA APROBACION DEL ADICIONAL N°006 Y DEDUCTIVO N° 002	55 días	jue 08/08/24	mar 01/10/24
	DESPLAZAMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA CON EL TIEMPO QUE HA TRANSCURRIDO HASTA LA APROBACION DEL ADICIONAL N°006	670 días	vie 02/12/22	mar 01/10/24

Que, el **Jefe de Supervisión de Obra** finaliza su informe y determina **CONCLUYENDO** que: "*(...) que la Ampliación de Plazo solicitado del ADICIONAL DE OBRA N° 006 y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 002 cuenta con toda la documentación necesaria para su aprobación. (...). Se deja constancia que desde el 07/06/2024 al 18/07/2024 se ha tramitado y aprobado la Ampliación de Plazo N° 12, y desde el 19/07/2024 al 07/08/2024 se ha tramitado la Ampliación de Plazo N° 13. Es importante destacar que el plazo vigente originalmente establecido hasta el 07/06/2024 debe ser ajustado para permitir la ejecución de los trabajos dentro del plazo. Por tanto, únicamente se solicitará el plazo necesario para completarlos trabajos considerados en la prestación Adicional de Obra N° 06 el cual ha sido aprobado y se encuentra en ejecución, siendo este plazo de 55 días calendarios. (...) que el plazo para esta solicitud es de 55 días calendarios según lo suscitado. (...). Finalmente, debe señalarse que es competencia de la Entidad definir si otorga la ampliación de plazo de obra solicitada por el contratista, debiendo, para ello, evaluar si se ha configurado y justificado alguna de las causales contempladas en el Artículo 169° del Reglamento.*"; y dando las siguientes **RECOMENDACIONES**, siendo: "*(...). La supervisión opina que se le debe otorgar los días solicitados para cumplir con las metas del proyecto. (...). Se debe presentar este expediente a la Entidad para su **APROBACIÓN** vía **ACTO RESOLUTIVO**.*";

Que, por otra parte, se tiene el contenido del **Informe N° 258-2024-ARQ.JMYE/GIDUR-MDP**, de fecha 28 de Agosto 2024 de la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural**, quien **RATIFICA** que es **PROCEDENTE** el **CONSENTIMIENTO** de la **Ampliación de Plazo N° 14** de la Obra en mención, al tiempo que se requiere para la ejecución de las partidas contempladas en el **Expediente Técnico** de la prestación **Adicional de Obra N° 06 y Deductivo Vinculante de Obra N° 02**, consentido por la **Supervisión de Obra** y aprobado por la Entidad con la **Resolución de Gerencia Municipal N° 069-2024-MDP/GM**, esta situación es consignada en el **Asiento N° 960** del **Cuaderno de Obra**. El 08 de Agosto 2024 el **Ejecutor de Obra** inicia los trabajos en el lugar mencionado y de acuerdo a las partidas y especificaciones del **Expediente Técnico** de la prestación **Adicional de Obra N° 06 y Deductivo Vinculante de Obra N° 02**; así mismo, se considera la fin de la causal el 01 de Octubre 2024, en atención a la resultante del análisis de **Cronograma de GANT**, de las partidas contenidas en el **Expediente Técnico** de la prestación **Adicional de Obra N° 06 y Deductivo Vinculante de Obra N° 02** y aprobada por la Entidad; este periodo consigna cincuenta y cinco (55) días calendarios requeridos para la ejecución y cumplimiento de las metas y garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de la Obra; trabajos contemplados en el **Sistema de Agua N° 01**, que modifica el sistema de bombeo, por uno, de funcionamiento de gravedad; siendo la **Ampliación de Plazo N° 14** por **CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS CALENDARIOS**, y siendo la nueva fecha de vencimiento de plazo de Obra el **01 de Octubre 2024**, solicitando su **APROBACIÓN** mediante **Acto Resolutivo**;

Que, en el presente caso la **Supervisión de Obra** y la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural** de la Entidad, así como el Contratista señalan que existe la situación

ajena a la voluntad de Contratista, que es la **Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (CUI N° -2333902), que a la fecha del aconteciendo materia en cuestión, es el tiempo que se requiere para la ejecución de las partidas contempladas en el **Expediente Técnico** de la prestación **Adicional de Obra N° 06 y Deductivo Vinculante de Obra N° 02**, consentido por la **Supervisión de Obra** y aprobado por la Entidad con la **Resolución de Gerencia Municipal N° 069-2024-MDP/GM**, esta situación es consignada en el **Asiento N° 960** del **Cuaderno de Obra**; razones por lo que cabría la justificación de la **Ampliación de Plazo Parcial N° 14**, cuyas causales mencionadas se encuentran tipificadas en el **Literal b)** del **Artículo 197°** del **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado** que prescribe taxativamente que: "*Cuando es necesario un plazo adicional, para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiera otorgado.*";

Por lo que, en este orden de ideas en base a la documentación antes descrita y en base al **Marco Legal** de los **Artículos 197°** y **198°** del **Reglamento**, es pertinente que la Entidad municipal, **DECLARE PROCEDENTE** la pretensión del **CONSORCIO AQUA**, en el extremo que solicita **Ampliación de Plazo N° 14** del **Contrato N° 013-2022-MDP/A**, por causales tipificadas en el **Literal b)** del **Artículo 197°** del **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, por **cincuenta y cinco (55) días calendarios**;

Así también, en base a los documentos antes descritos y al amparo del Marco Legal antes citados, la Entidad debe **ACOGER LA RECOMENDACIÓN** de la **Supervisión de Obra** y de la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural** de la Entidad, en el extremo de otorgar **cincuenta y cinco (55) días calendarios** de la **Ampliación de Plazo N° 14**; sustentados en los **Informe N° 011-2024-CSPS/ING. DEPB J.S.** del **Jefe de Supervisión de Obra**, y el **Informe N° 258-2024-ARQ.JMYE/GIDUR-MDP** de la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural**;

Que, se debe tener presente que, en la parte técnica de días propuestos es de entera responsabilidad de la **Supervisión de Obra** y de la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural** de la **Entidad**, cuya responsabilidad está regulada en el **Numeral 187.1** del **Artículo 187°** del **Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado** y sus respectivas modificatorias, donde la Entidad controla los trabajos efectuados por el **Contratista** a través del **Supervisor de Obra**, quien es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la **Obra** y del cumplimiento del **Contrato**, además de la debida y oportuna administración de riesgo durante todo el plazo de la **Obra**, debiendo absolver las consultas que formule el **Contratista**; así también, es responsable de éste **Análisis Técnico** por su propia función como área usuaria la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural** de la Entidad; siendo **PROCEDENTE** la **Ampliación de Plazo N° 14** de la **Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua**

Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín" (CUI N° 2333902);

Que, mediante **Opinión Legal N° 0025-2024-JRPP-MDP/ALE**, de fecha 29 de Agosto 2024, la **Asesoría Legal Externa** de la **Municipalidad Distrital de Pucará**, dentro de su **ANÁLISIS LEGAL** emite su **OPINIÓN LEGAL** prescribiendo que: "*(...). En consecuencia, estando a los informes antes citados, en donde de sus análisis coinciden por la **PROCEDENCIA**, procédase con el trámite correspondiente. (...).*", que pertenece a la **Ampliación de Plazo N° 14** de la **Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín" (CUI N° 2333902)**;

Que, estando a lo expuesto con el visto bueno de la **Asesoría Legal Externa**, de la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural**, de la **Gerencia de Administración y Finanzas**, de la **Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Generales**, y por las consideraciones expuestas y en mérito a la **Resolución de Alcaldía N° 001-2024-MDP/A**, de fecha **03 de Enero 2024** que delega las atribuciones administrativas, propias del **Despacho de Alcaldía** al **Gerente Municipal** emitida en virtud al **Numeral 20** del **Artículo 20°** de la **Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades**, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - **DECLARAR PROCEDENTE** la **Ampliación de Plazo de Obra N° 14** de la Ejecución de la Obra: **"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín" (CUI N° 2333902)** por **CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS CALENDARIOS** en mérito a los **Informes Técnicos** sustentados de la **Residencia de Obra** a través del **Informe N° 174-2024-EGJR/RO/CA**, y de la **Supervisión de Obra** a través del **Informe N° 011-2024-CSPS/ING. DEPB J.S.**, y ratificados por la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural**, a través del **Informe N° 258-2024-ARQ.JMYE/GIDUR-MDP**, y la **Opinión Legal N° 0025-2024-JRPP-MDP/ALE** de la **Asesoría Legal Externa**; como consecuencia de la **APROBACIÓN** del **Adicional de Obra N° 06 y Deductivo Vinculante de Obra N° 02**.

ARTÍCULO SEGUNDO. – **ENCARGAR** a la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural**, y demás unidades orgánicas, el estricto cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO. – **ENCARGAR** a la **Secretaría General** la comunicación del presente Acto Resolutivo al **CONSORCIO AQUA** quien es el Ejecutor de la Obra, al **CONSORCIO PYS** quien es la **Supervisión de Obra**, y demás áreas orgánicas de la Municipalidad que tengan injerencia en la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO. – REMITIR, a la **Secretaría Técnica** del **Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD)**, a través de la **Gerencia de Administración y Finanzas**, para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y/o servidores que presumiblemente hubiesen demorado en la elaboración, revisión y pronunciamiento por parte de la Entidad sobre la prestación **Adicional de Obra N° 06 y Deductivo Vinculante de Obra N° 02**, como parte de la recomendación de la **Opinión Legal N° 0025-2024-JRPP-MDP/ALE**, de fecha 02 de Septiembre 2024, emitida por la **Asesoría Legal Externa** de la **Municipalidad Distrital de Pucará**.

ARTÍCULO QUINTO. – ENCARGAR a la **Secretaría General** quien es la **ENCARGADA** del **Portal de Gobierno Digital** la publicación de la presente Resolución en el **Portal de Transparencia** de la **Municipalidad Distrital de Pucará**.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARÁ
Patricio M. Valle Condori
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ASESORÍA LEGAL EXTERNA V°B° PUCARÁ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL G.I.D.U.R. V°B° PUCARÁ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS V°B° PUCARÁ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SGA y SG V°B° PUCARÁ
