GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 BASADO EN RESULTADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Índice

1. Proyecto de Inversión e IOARR ejecutado o en proceso de ejecución durante el 2024, y los que están en proceso de ejecución o lo previsto ejecutar el año 2025:
    - CUI.
    - Tipo de inversión.
    - Función.
    - Ejecutor.
    - Estado Situacional del proyecto a la fecha.
    - Fuente de Financiamiento.
    - Costo de inversión actualizado.
    - Tiempo de financiamiento.
    - Financiamiento para el 2025.
    - Beneficiarios.
2. Logros (metas físicas y financieras) y avances (avance porcentual de lo programado) por proyecto.
3. Fotografías del proyecto.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1. RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5036 R. BELAUNDE DIEZ CANSECO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUI :	2500983	**TIPO DE INVERSIÓN :**	IOARR	**FUNCIÓN :**	EDUCACIÓN
EJECUTOR:		Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS DETERMINADOS			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:		120 días calendarios			
FECHA DE INICIO:	05/12/2023	**FECHA DE TERMINO :**		31/03/2024	
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A LA FECHA :		RECEPCIONADO – CON LIQUIDACION			
MONTO REFERENCIAL :		S/.610,234.65	**MONTO DE CONTRATO :**	S/.549,211.19	
CONTRADO DE OBRA :		09-2023/CAFED/GA			
BENEFICIARIOS :		665 Alumnos			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN DE EXP. TECNICO	RESOLUCION GERENCIAL N°001-2023-CAFED/GIE		
AVANCE FÍSICO	100% - CONCLUIDO		
METAS FISICAS		U. M.	CANTIDAD
- En Patio: Techo termoacústico multicapa de UPVC color gris		m2	522.10
- En Patio: Techo termoacústico multicapa de UPVC color translucido		m2	70.00
- En Patio: picado y resane de pisos		m2	606.10
- En Patio: luminaria exterior completa c/reflector del de 200ws		und	14.00
- En aulas: Contrapiso de concreto e=5 cm		m2	30.97
- En Aulas: Piso de porcelanato antideslizante 60 x 60		m2	1128.56
- En Escenario: cobertura liviana con estructura metálica		m2	19.90

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

2. REMODELACION DE COBERTURA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; REPARACION DE AULA GENERAL; EN EL(LA) I.E. MARIA MADRE EN LA LOCALIDAD CIUDAD SATELITE SANTA ROSA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUI :	2593274	**TIPO DE INVERSIÓN:**	IOARR	**FUNCIÓN :**	EDUCACIÓN
EJECUTOR :		Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS DETERMINADOS			
TIEMPO DE EJECUCION		60 días calendarios			
FECHA DE INICIO :	09/11/2023	**FECHA DE TERMINO:**		18/03/2024	
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A LA FECHA:		RECEPCIONADO – CON LIQUIDACION			
MONTO REFERENCIAL:		S/. 912,985.08	**MONTO DE CONTRATO:**	S/912,985.08	
CONTRATO DE OBRA:		07-2023/CAFED/GA			
BENEFICIARIOS:		352 Alumnos			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN DE EXP. TECNICO	RESOLUCION GERENCIAL N°003-2023-CAFED/GIE		
AVANCE FÍSICO	100% - CONCLUIDO		
METAS FISICAS		U. M.	CANTIDAD
- Reparación en temas de conectividad: Aulas		und	21.00
- Reparación en temas de conectividad: Sala de computo		und	02.00
- Reparación en temas de conectividad: Biblioteca		und	01.00
- Reparación en temas de conectividad: Oficinas Administrativas		und	11.00
- Reparación en temas de conectividad: Auditorio		und	01.00
- Remodelación de cobertura de anfiteatro		m2	415.80
- Equipamiento en conectividad y data: Computadora		und	10.00
- Equipamiento en conectividad y data: Impresora		und	01.00
- Equipamiento en conectividad y data: Aire acondicionado		und	05.00
- Equipamiento en conectividad y data: Proyector multiuso		und	04.00

SALIDA

3. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) I.E. 5146 EN EL AA. HH OASIS - 1ER SECTOR DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUI :	2586132	**TIPO DE INVERSIÓN :**	IOARR	**FUNCIÓN :**	EDUCACIÓN
EJECUTOR :		Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO :		RECURSOS DETERMINADOS			
TIEMPO DE EJECUCION		60 días calendarios			
FECHA DE INICIO	01/06/2024	**FECHA DE TERMINO :**	31/07/2024		
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A LA FECHA :		RECEPCIONADO – CON LIQUIDACION			
MONTO REFERENCIAL :		S/.475,732.35	**MONTO DE CONTRATO :**	S/.475,732.35	
CONTRATO DE OBRA :		03-2024/CAFED/GA			
BENEFICIARIOS :		702 Alumnos			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN DE EXP. TECNICO	RESOLUCION GERENCIAL N°007-2023-CAFED/GIE		
AVANCE FÍSICO	100% - CONCLUIDO		
METAS FISICAS		U. M.	CANTIDAD
- Muro de contención		m2	43.55
- Veredas		m2	39.20

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

4. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; ADQUISICION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) I.E. 5098 KUMAMOTO EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUI:	2608156	**TIPO DE INVERSIÓN:**	IOARR	**FUNCIÓN:**	EDUCACIÓN
EJECUTOR:		Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS DETERMINADOS			
TIEMPO DE EJECUCIÓN.		120 días calendarios			
FECHA DE INICIO:	10/06/2024	**FECHA DE TERMINO:**		18/10/2024	
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A LA FECHA:		RECEPCIONADO			
MONTO REFERENCIAL:		S/ 753,667.95	**MONTO DE CONTRATO:**	S/ 753,667.95	
CONTRATO DE OBRA:		05-2024/CAFED/GA			
BENEFICIARIOS:		1814 (Alumnos, personal docente y personal administrativo)			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN DE EXP. TECNICO	RESOLUCION GERENCIAL N°005-2023-CAFED/GIE		
AVANCE FÍSICO	100% - CONCLUIDO		
METAS FISICAS		U. M.	CANTIDAD
- Construcción de tanque elevado de 20m3		und	01.00
- Construcción de cisterna de 50m3		und	01.00
- Construcción de área de recreación pasiva: veredas y rampas		m2	120.33
- Construcción de área de recreación pasiva: piso adoquinado		m2	43.22
- Construcción de área de recreación pasiva: área verde		m2	54.82
- Construcción de área de recreación pasiva: banca de concreto		und	06.00
- Construcción de área de recreación pasiva: tacho de basura		und	02.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

5. REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; CONSTRUCCION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) I.E. 5095 JULIO RAMON RIBEYRO EN EL AA.HH. BOCANEGRA ZONA 1 DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUI:	2592492	**TIPO DE INVERSIÓN:**	IOARR	**FUNCIÓN:**	EDUCACIÓN
EJECUTOR:		Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS DETERMINADOS			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:		90 días calendarios			
FECHA DE INICIO:	03/11/2024	**FECHA DE TERMINO:**		31/01/2025	
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A LA FECHA:		RECEPCIONADO			
MONTO REFERENCIAL:		S/1,789,607.12	**MONTO DE CONTRATO:**	S/1,780,670.43	
CONTRATO DE OBRA:		07-2024/CAFED/GA			
BENEFICIARIOS:		1503 (Alumnos, personal docente y personal administrativo)			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN DE EXP. TECNICO	RESOLUCION GERENCIAL N°006-2024-CAFED/GIE		
AVANCE FÍSICO	100% - CONCLUIDO		
METAS FISICAS		U. M.	CANTIDAD
- En Patio principal: Techo termoacústico multicapa de UPVC		m2	810.00
- En Patio auxiliar: Techo termoacústico multicapa de UPVC		m2	240.00
- Construcción de área de circulación: veredas y rampas		m2	1487.69
- Construcción de área de recreación pasiva: piso adoquinado		m2	342.04
- Construcción de área de recreación pasiva: área verde		m2	240.00
- Construcción de área de recreación pasiva: banca de concreto		und	14.00
- Área de juegos: Piso de caucho anti impacto de colores		m2	98.20
- Área de juegos: Adquisición de juegos infantiles e inclusivos		Und	04.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

6. REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5096 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

CUI:	2501115	**TIPO DE INVERSIÓN:**	IOARR	**FUNCIÓN:**	EDUCACIÓN
EJECUTOR:		Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS DETERMINADOS			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:		90 días calendarios			
FECHA DE INICIO:	18/12/2024	**FECHA DE TERMINO:**		17/03/2025	
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A LA FECHA:		CONCLUIDO – POR RECEPCIONAR			
MONTO REFERENCIAL:		S/1,205,386.82	**MONTO DE CONTRATO:**	S/1,177,967.40	
CONTRATO DE OBRA:		011-2024/CAFED/GA			
BENEFICIARIOS:		694 (Alumnos, personal docente y personal administrativo)			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN DE EXP. TECNICO	RESOLUCION GERENCIAL N°008-2024-CAFED/GIE		
AVANCE FÍSICO	100% - CONCLUIDO		
METAS FISICAS		U. M.	CANTIDAD
- En Patio: Techo termoacústico multicapa de UPVC		m2	613.47
- En Patio: construcción de piso de concreto		m2	661.01
- En Patio: luminaria exterior completa c/reflector del de 200ws		und	12.00
- Cerco perimétrico: Muro de contención		m2	127.10
- Cerco perimétrico: Muro caravista		m2	81.33
- Gradería		m	72.39
- Piso adoquinado		m2	162.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

7. REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 5046 - JOSE GALVEZ EGUSQUIZA EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUI	2591593	**TIPO DE INVERSIÓN:**	IOARR	**FUNCIÓN:**	EDUCACIÓN
EJECUTOR:		Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS DETERMINADOS			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:		90 días calendarios			
FECHA DE INICIO:	08/11/2024	**FECHA DE TERMINO:**		28/02/2025	
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A LA FECHA:		CONCLUIDO – POR RECEPCIONAR			
MONTO REFERENCIAL:		S/1,810,701.73	**MONTO DE CONTRATO:**	S/1,718,367.66	
CONTRATO DE OBRA:		009-2024/CAFED/GA			
BENEFICIARIOS:		521 (Alumnos, personal docente y personal administrativo)			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN DE EXP. TECNICO	RESOLUCION GERENCIAL N°003-2024-CAFED/GIE		
AVANCE FÍSICO	100% - CONCLUIDO		
METAS FISICAS		U. M.	CANTIDAD
- En Patio principal: Techo termoacústico multicapa de UPVC		m2	470.20
- En Patio auxiliar: Techo termoacústico multicapa de UPVC		m2	272.81
- En estrado: Techo termoacústico multicapa de UPVC		m2	40.10
- En aulas: Termotecho poliestireno		m2	259.00
- En espacio deportivo: piso de concreto		m2	310.00
- En patios y circulación: piso de concreto		m2	979.68
- Cerco perimétrico: muro de contención y albañilería		m	21.60

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

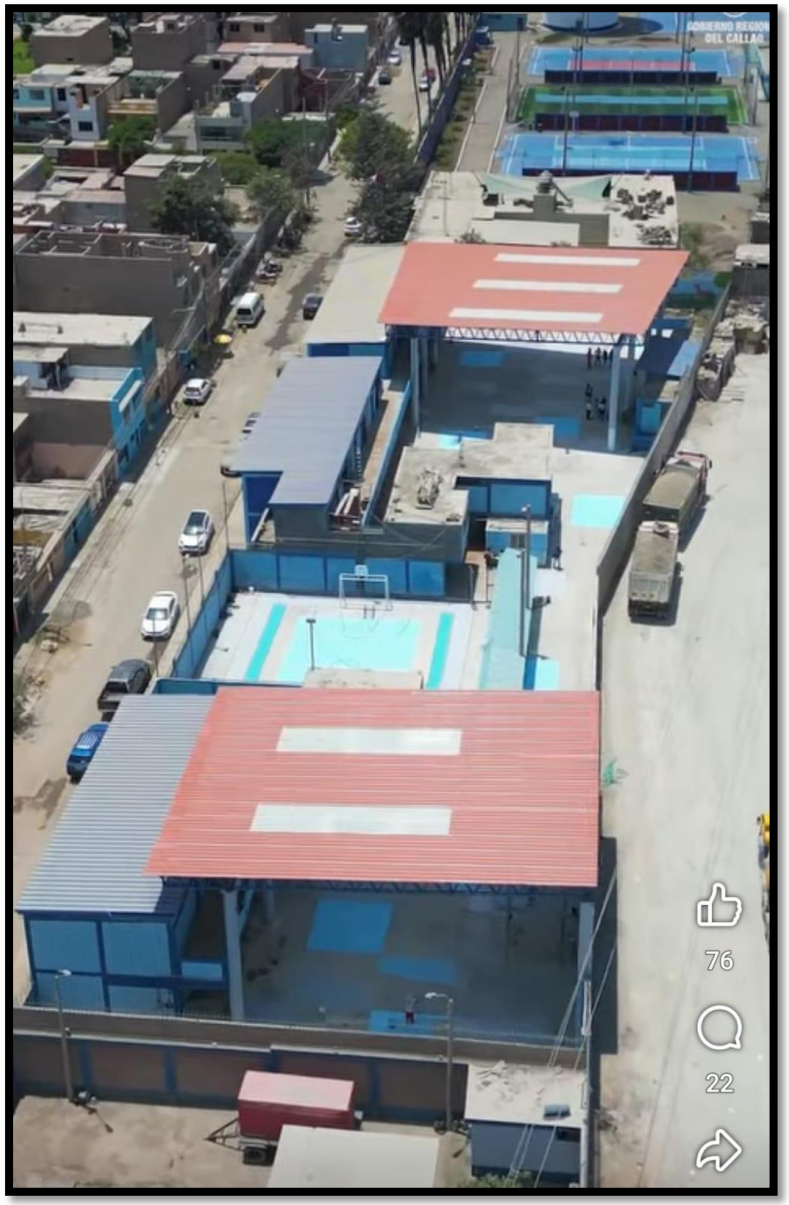

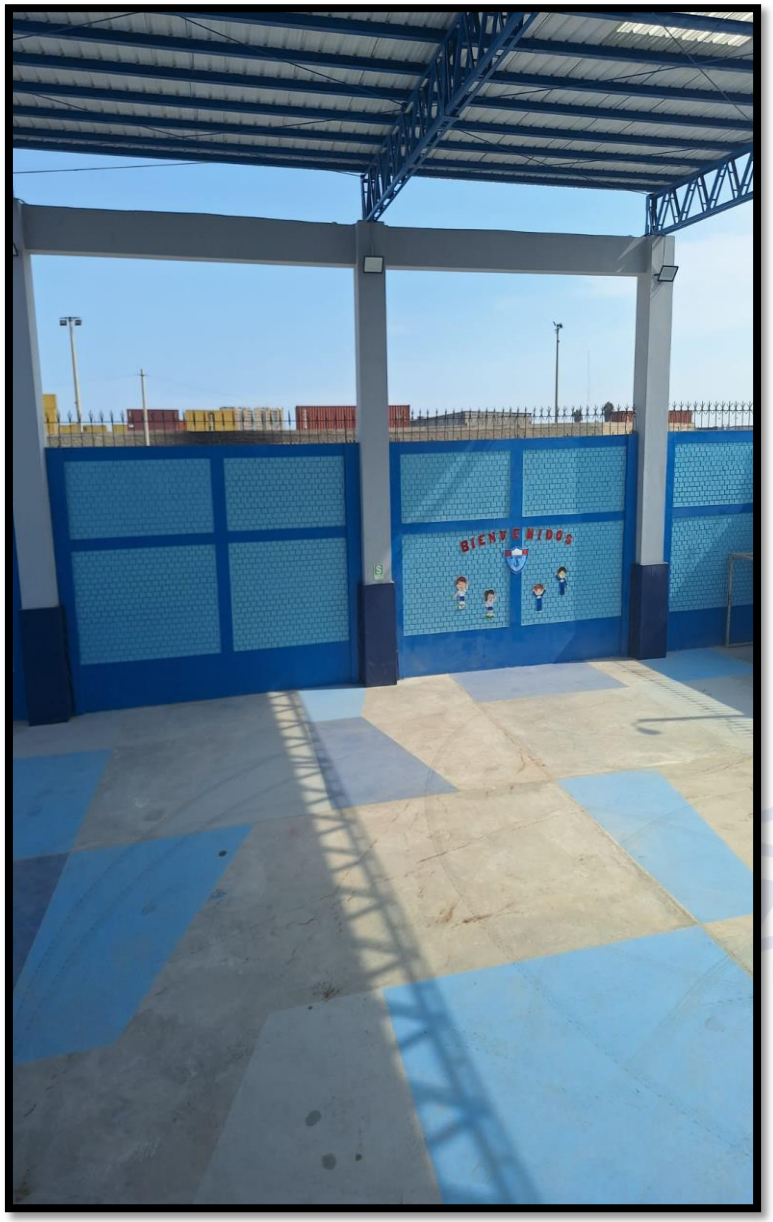

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

8. RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; REMODELACION DE COBERTURA Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 43 EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

CUI:	2626166	**TIPO DE INVERSIÓN:**	IOARR	**FUNCIÓN:**	EDUCACIÓN
EJECUTOR:		Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS DETERMINADOS			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:		90 días calendarios			
FECHA DE INICIO:	17/11/2024	**FECHA DE TERMINO:**		-----	
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A LA FECHA:		EN EJECUCION			
MONTO REFERENCIAL:		S/3,391,321.86	**MONTO DE CONTRATO:**	S/3,323,495.42	
CONTRATO DE OBRA:		008-2024/CAFED/GA			
BENEFICIARIOS:		1292 (Alumnos, personal docente y personal administrativo)			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN DE EXP. TECNICO	RESOLUCION GERENCIAL N°005-2024-CAFED/GIE		
AVANCE FÍSICO	57.80%		
METAS FISICAS		U. M.	CANTIDAD
- En Patio: Techo termoacústico multicapa de UPVC		m2	972.00
- En losa deportiva: piso de concreto		m2	741.30
- En área de circulación: piso de concreto veredas y rampas		m2	1444.11
- En área de circulación: piso de adoquín		m2	261.18
- En área verde: grass natural		m2	139.55
- En Cerco perimétrico: muro de contención y albañilería		m	465.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

9. RENOVACIÓN DE COBERTURA; EN EL (LA) IE 4010 HERMANOS RAFAEL SAMUEL Y EMILIO MOISES GOMEZ PAQUIYAURI EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

CUI:	2501023	**TIPO DE INVERSIÓN:**	IOARR	**FUNCIÓN:**	EDUCACIÓN
EJECUTOR:		Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS DETERMINADOS			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:		60 días calendarios			
FECHA DE INICIO:	----	FECHA DE TERMINO	-----		
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A LA FECHA:		FIRMA DE CONTRATO			
MONTO REFERENCIAL:		S/1,075,372.39	**MONTO DE CONTRATO:**	S/1,021,603.77	
CONTRATO DE OBRA:		001-2025/CAFED/GA			
BENEFICIARIOS:		500 (Alumnos, personal docente y personal administrativo)			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN DE EXP. TECNICO	RESOLUCION GERENCIAL N°010-2024-CAFED/GIE		
AVANCE FÍSICO	0.0%		
METAS FISICAS		U. M.	CANTIDAD
- En Patio: Techo termoacústico multicapa de UPVC		m2	585.00
- En losa deportiva: piso de concreto		m2	1075.00
- En área de circulación: piso de concreto veredas y rampas		m2	300.50
- En área de circulación: piso de adoquín		m2	261.18
- En Cerco perimétrico: pintado exterior e interior		m2	585.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

10.

RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 154 RAYITO DE LUZ, EN EL CENTRO POBLADO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

CUI:	2623197	**TIPO DE INVERSIÓN:**	IOARR	**FUNCIÓN:**	EDUCACIÓN
EJECUTOR		Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS DETERMINADOS			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:		60 días calendarios			
FECHA DE INICIO:	----	**FECHA DE TERMINO:**		----	
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A LA FECHA:		FIRMA DE CONTRATO			
MONTO REFERENCIAL:		S/1,577,521.36	**MONTO DE CONTRATO:**	S/1,577,521.36	
CONTRATO DE OBRA:		003-2025/CAFED/GA			
BENEFICIARIOS:		102 (Alumnos, personal docente y personal administrativo)			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN DE EXP. TECNICO	RESOLUCION GERENCIAL N°004-2024-CAFED/GIE		
AVANCE FÍSICO	0.0%		
METAS FISICAS		U. M.	CANTIDAD
- En Patio: Techo termoacústico multicapa de UPVC		m2	150.00
- En área de circulación: veredas y rampas de concreto		m2	86.00
- En zona de juegos: piso de caucho de colores		m2	67.00
- En zona de juegos: adquisición de juegos		und	4.00
- En cerco perimétrico: construcción de muro de contención		m	100.00
- En cerco perimétrico: construcción de cerco perimétrico		m	150.00
- Sembrado de áreas verdes			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11. REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) I.E. CALLAO EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

CUI:	2660336	**TIPO DE INVERSIÓN:**	IOARR	**FUNCIÓN:**	EDUCACIÓN
EJECUTOR		Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS DETERMINADOS			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:		90 días calendarios			
FECHA DE INICIO:	----	**FECHA DE TERMINO:**		----	
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A LA FECHA:		FIRMA DE CONTRATO			
MONTO REFERENCIAL:		S/2,465,928.12	**MONTO DE CONTRATO:**	S/2,342,631.70	
CONTRATO DE OBRA:		004-2025/CAFED/GA			
BENEFICIARIOS:		1015 (Alumnos, personal docente y personal administrativo)			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN DE EXP. TECNICO	RESOLUCION GERENCIAL N°016-2024-CAFED/GIE		
AVANCE FÍSICO	0.0%		
METAS FISICAS		U. M.	CANTIDAD
- En Patio principal: Techo termoacústico multicapa de UPVC		m2	1500.00
- En patios: piso de concreto		m2	2885.00
- En zona de circulación: piso de adoquín		m2	140.00
- En áreas verdes: sembrado de grass		m2	325.00
- Renovación y mantenimiento de batería de baños		und	3.00

12. RENOVACION DE MURO DE CONTENCION; CONTRUCCION DE COBERTURA; EN LA I.E. 5130-4 EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUI:	2614772	**TIPO DE INVERSIÓN:**	IOARR	**FUNCIÓN:**	EDUCACIÓN
EJECUTOR		Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS DETERMINADOS			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:		90 días calendarios			
FECHA DE INICIO:	----	FECHA DE TERMINO		----	
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A LA FECHA:		**FIRMA DE CONTRATO**			
MONTO REFERENCIAL:		S/1,439,229.41	**MONTO DE CONTRATO:**	S/1,410,444.87	
CONTRATO DE OBRA:		005-2025/CAFED/GA			
BENEFICIARIOS:		145 (Alumnos, personal docente y personal administrativo)			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN DE EXP. TECNICO	RESOLUCION GERENCIAL N°015-2024-CAFED/GIE		
AVANCE FÍSICO	0.0%		
METAS FISICAS		U. M.	CANTIDAD
- En Patio: Techo termoacústico multicapa de UPVC		m2	280.00
- En zona de recreación: Techo de policarbonato		m2	46.00
- En zona de recreación: piso de concreto		m2	400.00
- En zona de recreación: adquisición de juegos		und	7.00
- En Cerco perimétrico: construcción de muro de contención		m	15.00
- Construcción de Aula de Psicomotricidad incl. equipamiento			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

13. CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA REMODELACION DE LOSA ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS REFORESTACION DE AREA VERDE EN EL I.E. 5127 MARTIR JOSE OLAYA EN LA LOCALIDAD DE JOSE OLAYA BALANDRA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO

CUI:	2614287	**TIPO DE INVERSIÓN:**	IOARR	**FUNCIÓN:**	EDUCACIÓN
EJECUTOR:		Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS DETERMINADOS			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:		90 días calendarios			
FECHA DE INICIO:	----	**FECHA DE TERMINO:**		----	
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A LA FECHA:		EN PROCESO DE SELECCION			
MONTO REFERENCIAL:		S/2,002,099.40	**MONTO DE CONTRATO**		
CONTRATO DE OBRA:					
BENEFICIARIOS:		960 (Alumnos, personal docente y personal administrativo)			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN DE EXP. TECNICO	RESOLUCION GERENCIAL N°014-2024-CAFED/GIE		
AVANCE FÍSICO	0.0%		
METAS FISICAS		U. M.	CANTIDAD
- En Patio: Techo termoacústico multicapa de UPVC		m2	1420.00
- En zona de juegos: Techo de policarbonato		m2	125.00
- En patio: piso de concreto		m2	1190.00
- En área de circulación: veredas y rampas de concreto		m2	142.00
- En área de circulación: piso de adoquín		m2	345.00
- En zona de juegos: piso de caucho de colores		m2	145.00
- En zona de juegos: adquisición de juegos		und	5.00
- Sembrado de áreas verdes		m2	350.00

14.

CONSTRUCCION DE AULA DE INNOVACION TECNOLOGICA Y AULA; REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUI:	2626168	**TIPO DE INVERSIÓN:**	IOARR	**FUNCIÓN:**	EDUCACIÓN
EJECUTOR:		Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS DETERMINADOS			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:		90 días calendarios			
FECHA DE INICIO:	----	**FECHA DE TERMINO:**		----	
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A LA FECHA:		EN PROCESO DE SELECCION			
MONTO REFERENCIAL:		S/1,436,803.49	**MONTO DE CONTRATO:**	----	
CONTRATO DE OBRA:					
BENEFICIARIOS:		395 Alumnos			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN DE EXP. TECNICO	RESOLUCION GERENCIAL N°001-2025-CAFED/GIE		
AVANCE FÍSICO	0.0%		
METAS FISICAS		U. M.	CANTIDAD
- En Patio: Techo termoacústico multicapa de UPVC		m2	660.00
- En patio: piso de concreto		m2	770.00
- Construcción de un modulo de aulas – Incluye Aula de innovación tecnológica		modulo	1.00

15.

CONSTRUCCION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD, AMBIENTE DE USOS MULTIPLES Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. HELEN KELLER (CEBE) DEL A.H. PROYECTO ESPECIAL PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUI:	2591603	**TIPO DE INVERSIÓN:**	IOARR	**FUNCIÓN:**	EDUCACIÓN
EJECUTOR:		Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS DETERMINADOS			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:		90 días calendarios			
FECHA DE INICIO:	----	**FECHA DE TERMINO:**		----	
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A LA FECHA:		EN PROCESO DE SELECCION:			
MONTO REFERENCIAL:		S/965,620.08	**MONTO DE CONTRATO**		
CONTRATO DE OBRA:					
BENEFICIARIOS:		90 Alumnos			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN DE EXP. TECNICO	RESOLUCION GERENCIAL N°002-2025-CAFED/GIE		
AVANCE FÍSICO	0.0%		
METAS FISICAS		U. M.	CANTIDAD
- Construcción de Aula de psicomotricidad		modulo	1.00
- Construcción de Aula de usos múltiples		modulo	1.00
- Construcción de Aula de la vida diaria		modulo	1.00
