



RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 014-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J

Cayhuayna, 07 de marzo del 2024.

VISTO:

Los documentos que se acompañan en ciento treinta y ocho (138) folios, en físico;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, Ley N° 30220 – Ley Universitaria; el Estado Reconoce la autonomía normativa, de gobierno, académico, administrativo y económico en los asuntos de su competencia;

Que, el T.U.O. de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sobre la base de aplicación de leyes en el tiempo, prescriben una serie de disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contratación pública, en lo concerniente a Bienes, Servicios u Obras, y a su vez regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, mediante CONTRATO N°007-2023-UNHEVAL de fecha 31 de marzo de 2023, la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN y el CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN suscriben el Contrato de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO" con un plazo de ejecución de trescientos sesenta días y cuyo monto contractual asciende a la suma de S/. 13,206,369.77;

Que, con fecha 05 de julio del 2023 se suscribe la Adenda N° 01 al Contrato N° 007-2023-UNHEVAL, entre la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco y el CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO", cuyo monto contractual asciende a la suma de S/ 13,167,745.69;

Que, con fecha 27 de octubre del 2023 se suscribe el Contrato N° 045-2023-UNHEVAL, entre la UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZAN y el CONSORCIO SUPERVISOR ALMACEN Y ARCHIVO, para el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO", con un plazo de servicio de 390 días calendario (360 días para la supervisión de la obra y 30 días para la recepción y liquidación de obra) y cuyo monto contractual asciende a la suma de S/. 598,466.73

Que, el literal f) del segundo párrafo del artículo 2° del T.U.O. de la Ley de N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 082-2019 -EF, establece lo siguiente: "*f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos*".

Que, en ese orden de ideas, el artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, precisa que: "*202.1. Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un plazo máximo de siete (7) días hace una actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica. 202.2. El Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecución de Obra previo, así como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual. 202.3. El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) días manifiesta su aprobación u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo máximo de siete (7) días luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos señalados, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes. 202.4. Ante la falta de presentación del Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo señalado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos*".

Que, en mérito a la norma legal señalada en líneas anteriores, se advierte los siguientes actuados:

...///

TRANSCRIPCIÓN

En fecha 07/03/2024 expedido
Resolución siguiente





UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 014-2024-UNHEVAL-DIGA-UEIJ
Cayhuayna, 07 de marzo del 2024.



pág. 3

TRANSCRIPCIÓN

En la fecha se ha expedido
Resolución siguiente

4	Jul-22	S/	924,159.20	7.02%	S/	2,490,737.59	18.92%	S/739,327.36	5.61%	15.13%
5	Ago-22	S/	918,704.78	6.98%	S/	3,409,442.37	25.89%	S/734,963.82	5.58%	20.71%
6	Set-22	S/	701,229.72	5.33%	S/	4,110,672.09	31.22%	S/560,983.78	4.26%	24.97%
7	Oct-22	S/	494,414.00	3.75%	S/	4,605,086.09	34.97%	S/395,531.20	3.00%	27.98%
8	Nov-22	S/	948,156.79	7.20%	S/	5,553,242.88	42.17%	S/758,525.43	5.76%	33.74%
9	Dic-22	S/	755,784.14	5.74%	S/	6,309,027.02	47.91%	S/604,627.31	4.59%	38.33%
10	Ene-23	S/	1,917,652.19	14.56%	S/	8,226,679.21	62.48%	S/1,534,121.75	11.65%	49.98%
11	Feb-23	S/	1,950,742.75	14.81%	S/	10,177,421.96	77.29%	S/1,560,594.20	11.85%	61.83%
12	Mar-23	S/	1,012,541.21	7.69%	S/	11,189,963.17	84.98%	S/810,032.97	6.15%	67.98%
13	Abr-23	S/	1,977,782.52	15.02%	S/	13,167,745.69	100.00%	S/1,582,226.02	12.02%	80.00%
			S/ 13,167,745.69					S/ 10,534,196.55		

VII. ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA – ADICIONAL N°01

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13
Del 13/04/2023	Del 1/05/2023	Del 1/06/2023	Del 1/07/2023	Del 1/08/2023	Del 1/09/2023	Del 1/10/2023	Del 1/11/2023	Del 1/12/2023	Del 1/01/2024	Del 1/02/2024	Del 1/03/2024	Del 1/04/2024
A/ 30/04/2023	A/ 31/05/2023	A/ 30/06/2023	A/ 31/07/2023	A/ 31/08/2023	A/ 30/09/2023	A/ 31/10/2023	A/ 30/11/2023	A/ 31/12/2023	A/ 31/01/2024	A/ 29/02/2024	A/ 31/03/2024	A/ 13/04/2024
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 7,847.82	S/ 65,309.52	S/ 1,831.14	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 47,151.48	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,200.72	S/ 9,991.44	S/ 280.16	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 7,214.18	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,177.17	S/ 9,795.53	S/ 274.67	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 7,072.72	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 10,225.71	S/ 85,090.49	S/ 2,385.97	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 61,438.38	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 10,225.71	S/ 85,090.49	S/ 2,385.97	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 61,438.38	S/ 0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.43%	53.47%	1.50%	0.00%	0.00%	38.51%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.43%	59.89%	61.39%	61.39%	100.00%	100.00%	100.00%

N°	MES	PROGRAMADO			80% PROGRAMADO.		
		MENSUAL	%/MES	ACUMULADO	MENSUAL	%/MES	ACUMULADO
1	Abr-22		0.00%		S/0.00	0.00%	0.00%
2	May-22		0.00%		S/0.00	0.00%	0.00%
3	Jun-22		0.00%		S/0.00	0.00%	0.00%
4	Jul-22		0.00%		S/0.00	0.00%	0.00%
5	Ago-22		0.00%		S/0.00	0.00%	0.00%
6	Set-22		0.00%		S/0.00	0.00%	0.00%
7	Oct-22	S/ 10,225.71	6.43%	S/ 10,225.71	S/8,180.57	5.14%	5.14%
8	Nov-22	S/ 85,090.49	53.47%	S/ 95,316.20	S/68,072.39	42.78%	47.92%
9	Dic-22	S/ 2,385.97	1.50%	S/ 97,702.17	S/1,908.78	1.20%	49.11%
10	Ene-23		0.00%		S/0.00	0.00%	49.11%
11	Feb-23		0.00%		S/0.00	0.00%	49.11%
12	Mar-23	S/ 61,438.38	38.61%	S/ 159,140.55	S/49,150.70	30.89%	80.00%
13	Abr-23		0.00%		S/0.00	0.00%	80.00%
		S/ 159,140.55			S/ 127,312.44		

VIII. ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA – ADICIONAL N°02

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13
Del 13/04/2023	Del 1/05/2023	Del 1/06/2023	Del 1/07/2023	Del 1/08/2023	Del 1/09/2023	Del 1/10/2023	Del 1/11/2023	Del 1/12/2023	Del 1/01/2024	Del 1/02/2024	Del 1/03/2024	Del 1/04/2024
A/ 30/04/2023	A/ 31/05/2023	A/ 30/06/2023	A/ 31/07/2023	A/ 31/08/2023	A/ 30/09/2023	A/ 31/10/2023	A/ 30/11/2023	A/ 31/12/2023	A/ 31/01/2024	A/ 29/02/2024	A/ 31/03/2024	A/ 13/04/2024
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,354.56	S/ 677.27	S/ 677.27	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 207.25	S/ 103.62	S/ 103.62	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 203.19	S/ 101.59	S/ 101.59	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,765.00	S/ 882.48	S/ 882.48	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,765.00	S/ 882.48	S/ 882.48	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

N°	MES	PROGRAMADO			80% PROGRAMADO.		
		MENSUAL	%/MES	ACUMULADO	MENSUAL	%/MES	ACUMULADO
1	Abr-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
2	May-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
3	Jun-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
4	Jul-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
5	Ago-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
6	Set-22	S/ 1,765.00	50.00%	50.00%	S/1,412.00	40.00%	40.00%
7	Oct-22	S/ 882.48	25.00%	75.00%	S/705.98	20.00%	60.00%
8	Nov-22	S/ 882.48	25.00%	100.00%	S/705.98	20.00%	80.00%
9	Dic-22		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%
10	Ene-23		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%
11	Feb-23		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%
12	Mar-23		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%
13	Abr-23		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%
		S/ 3,529.96			S/ 2,823.97		

IX. ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA – ADICIONAL N°03

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13
Del 13/04/2023	Del 1/05/2023	Del 1/06/2023	Del 1/07/2023	Del 1/08/2023	Del 1/09/2023	Del 1/10/2023	Del 1/11/2023	Del 1/12/2023	Del 1/01/2024	Del 1/02/2024	Del 1/03/2024	Del 1/04/2024
A/ 30/04/2023	A/ 31/05/2023	A/ 30/06/2023	A/ 31/07/2023	A/ 31/08/2023	A/ 30/09/2023	A/ 31/10/2023	A/ 30/11/2023	A/ 31/12/2023	A/ 31/01/2024	A/ 29/02/2024	A/ 31/03/2024	A/ 13/04/2024
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 62,506.52	S/ 5,181.08	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 9,563.50	S/ 792.70	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 9,375.98	S/ 777.16	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 81,446.00	S/ 6,750.94	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 81,446.00	S/ 6,750.94	S/ 0.00	S/ 0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.35%	7.65%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.35%	100.00%	100.00%	100.00%

N°	MES	PROGRAMADO			80% PROGRAMADO.		
		MENSUAL	%/MES	ACUMULADO	MENSUAL	%/MES	ACUMULADO
1	Abr-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
2	May-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
3	Jun-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
4	Jul-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
5	Ago-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
6	Set-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
7	Oct-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
8	Nov-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
9	Dic-22		0.00%	0.00%	S/0.00	0.00%	0.00%
10	Ene-23	S/ 81,446.00	92.35%	92.35%	S/65,156.80	73.88%	73.88%
11	Feb-23	S/ 6,750.94	7.65%	100.00%	S/5,400.75	6.12%	80.00%
12	Mar-23		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%
13	Abr-23		0.00%	100.00%	S/0.00	0.00%	80.00%
		S/ 88,196.94			S/ 70,557.55		

X. ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA – ADICIONAL N°04



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 014-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J
Cayhuayna, 07 de marzo del 2024.



pág. 5

TRANSCRIPCIÓN

En la fecha se expidió
Resolución siguiente

3. Se indica el nuevo presupuesto de Obra, por el monto de S/13,334,384.28 (Trece Millones Trescientos Treinta y cuatro mil Trescientos Treinta y cuatro con 28/100 Soles), ya que se afectó por la reducción del monto, como también a causa de los Adicionales de Obra N°01, N°02, N°03, N°04 y N° 05 con sus respectivos Deductivos de Obra N°01, N°02, N°03 y N° 04

MONTO CONTRACTUAL	S/ 13,206,369.77
REDUCCIÓN DEL MONTO CONTRACTUAL	S/ 38,624.08
Resolución Jefatural N° 074 - 2023 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J	
ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01:	S/ 32,968.57
Adicional de Obra N° 01:	S/ 159,140.55
Deductivo de Obra N° 01:	S/ 126,171.98
Resolución Jefatural N° 082 - 2023 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J	
ADICIONAL DE OBRA N° 02:	S/ 3,529.96
Resolución Jefatural N° 092 - 2023 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J	
ADICIONAL DE OBRA N° 03 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02:	-S/ 145,745.75
Adicional de Obra N° 03:	S/ 88,196.94
Deductivo de Obra N° 02:	S/ 233,942.69
Resolución Jefatural N° 002 - 2024 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J	
ADICIONAL DE OBRA N° 04 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03:	S/ 215,113.98
Adicional de Obra N° 04:	S/ 317,865.22
Deductivo de Obra N° 03:	S/ 102,751.25
Resolución Jefatural N° 004 - 2024 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J	
ADICIONAL DE OBRA N° 05 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 04:	S/ 60,771.84
Adicional de Obra N° 05:	S/ 416,786.27
Deductivo de Obra N° 04:	S/ 356,014.43
Resolución Jefatural N° 012 - 2024 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J	
NUEVO MONTO CONTRACTUAL MODIFICADO	S/ 13,334,384.29

4. Se recomienda a la entidad aprobar vía acto resolutorio la presente actualización del cronograma, para llevar el control de ejecución de obra, de lo contrario se continuará el control de obra con el cronograma vigente emitido según Resolución Jefatural N° 008 - 2024 - UNHEVAL - DIGA - UEI - J, de fecha 25 de enero del 2023

3. Que, mediante Informe N°068-2024-UNHEVAL-UEI/SGAG con fecha de recepción por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones el día 07 de marzo de 2023, en el cual el Ingeniero Civil I de este despacho remite la conformidad del Cronograma Actualizado de Ejecución de Obra por Aprobación del Adicional de Obra N°05 correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO" y señala lo siguiente:

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


5.1. CONCLUSIONES

- ✓ Se concluye que el periodo de ejecución de la obra es desde el 13 de abril del 2023 hasta el 13 de abril del 2024, teniendo un plazo de 360 días calendarios y una suspensión de plazo desde el 21 al 27 de octubre del 2023.

- ✓ El calendario valorizado CONSOLIDADO de la obra se representa en el siguiente cuadro:

N°	MES	AVANCE PROGRAMADO				
		PARCIAL S/	ACUMULADO S/	PARCIAL %	ACUMULADO %	ACUMULADO 80%
1	abr-23	214,726.36	214,726.36	1.61%	1.61%	1.29%
2	may-23	786,300.03	1,001,026.39	5.90%	7.51%	6.01%
3	jun-23	565,552.00	1,566,578.39	4.24%	11.75%	9.40%
4	jul-23	924,159.20	2,490,737.59	6.93%	18.68%	14.94%
5	ago-23	918,704.78	3,409,442.37	6.89%	25.57%	20.46%
6	set-23	702,994.72	4,112,437.09	5.27%	30.84%	24.67%
7	oct-23	505,522.20	4,617,959.29	3.79%	34.63%	27.71%
8	nov-23	1,034,129.76	5,652,089.05	7.76%	42.39%	33.91%
9	dic-23	758,170.12	6,410,259.17	5.69%	48.07%	38.46%
10	ene-24	2,099,884.72	8,510,143.89	15.75%	63.82%	51.06%
11	feb-24	2,269,488.21	10,779,632.10	17.02%	80.84%	64.67%
12	mar-24	1,359,892.07	12,139,524.17	10.20%	91.04%	72.83%
13	abr-24	1,194,860.11	13,334,384.29	8.96%	100.00%	80.00%

*Los montos expuestos anteriormente son a nivel de costo total sin IGV

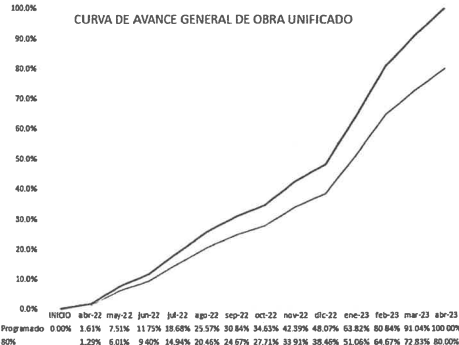

- ✓ La Curva S a utilizar para el control físico de la obra es la siguiente:
✓ Se da CONFORMIDAD a la actualización del cronograma de ejecución de obra, cronograma valorizado de ejecución de obra y Curva S presentados por la Supervisión de Obra.

5.2. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda a la Entidad Universidad Nacional Hermilio Valdizán aprobar el Calendario de Avance Programado Actualizado, el Cronograma Valorizado de Ejecución de obra y la Curva S mediante acto resolutorio.

(...)

...///



Que, estando a las facultades y atribuciones resolutivas conferidas al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, mediante la Resolución Rectoral N° 586-2020-UNHEVAL de fecha 16 de julio de 2020, en concordancia con la Resolución Rectoral N° 0145-2022-UNHEVAL, de fecha 17 de febrero del 2021 y en concordancia con la Ley N° 30220 - Ley Universitaria y su reglamento;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y ACTUALIZADO, concerniente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO", siendo la fecha de inicio de obra el 13 de abril de 2023 y su fecha de fin de plazo el 13 de abril de 2024, en virtud a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	MES	AVANCE PROGRAMADO				
		PARCIAL S/	ACUMULADO S/	PARCIAL %	ACUMULADO %	ACUMULADO 80%
1	abr-23	214,726.36	214,726.36	1.61%	1.61%	1.29%
2	may-23	786,300.03	1,001,026.39	5.90%	7.51%	6.01%
3	jun-23	565,552.00	1,566,578.39	4.24%	11.75%	9.40%
4	jul-23	924,159.20	2,490,737.59	6.93%	18.68%	14.94%
5	ago-23	918,704.78	3,409,442.37	6.89%	25.57%	20.46%
6	Set-23	702,994.72	4,112,437.09	5.27%	30.84%	24.67%
7	oct-23	505,522.20	4,617,959.29	3.79%	34.63%	27.71%
8	nov-23	1,034,129.76	5,652,089.05	7.76%	42.39%	33.91%
9	dic-23	758,170.12	6,410,259.17	5.69%	48.07%	38.46%
10	ene-24	2,099,884.72	8,510,143.89	15.75%	63.82%	51.06%
11	feb-24	2,269,488.21	10,779,632.10	17.02%	80.84%	64.67%
12	mar-24	1,359,892.07	12,139,524.17	10.20%	91.04%	72.83%
13	abr-24	1,194,860.11	13,334,384.29	8.96%	100.00%	80.00%
		13,334,384.29				

ARTÍCULO SEGUNDO. - PRECISAR, que de conformidad con los alcances de Contrato N° 045-2023-UNHEVAL, corresponde al CONSORCIO SUPERVISOR ALMACEN Y ARCHIVO el control y exigir el cumplimiento de la programación y calendarios de obra vigentes, por tanto, el inspector deberá cumplir sus obligaciones.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución al Contratista (CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN-UNHEVAL) y al Supervisor (CONSORCIO SUPERVISOR ALMACEN Y ARCHIVO), con las formalidades de Ley.

ARTÍCULO CUARTO. - DAR A CONOCER, la presente Resolución a los Órganos Competentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE



UNIVERSIDAD NACIONAL
"HERMILIO VALDIZAN"
ING. GUILLERMO J. ALBORNOZ RAMOS
JEFE UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

TRANSCRIPCIÓN
En la fecha se ha copiado
Resolución siguiente

Distribución:
RECTOR
TRANSPARENCIA
OAJ
OCI
DIGA
ARCHIVO
