

**EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO**

**COMPONENTE CAPACITACIÓN - AMBIENTAL DEL PROYECTO DE  
INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO  
DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHICA, EN LOS DISTRITOS DE  
SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA  
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" CON CUI N° 2508317**



**RESPONSABLE:**

**Ing. ERICK DEL CASTILLO VELA**  
COORDINADOR

Componente Capacitación - Ambiental del PI CUI N° 2508317

**ABRIL 2025**

## I. DATOS GENERALES

### 1.1 Nombre del Componente Capacitación - Ambiental:

Componente Capacitación - Ambiental del Proyecto de Inversión **"Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal principal Luchador - Shica, en los distritos de Soritor, Habana y Calzada de la provincia de Moyobamba departamento de San Martín"** con CUI N° 2508317.

### 1.2 Descripción:

Mediante Resolución Gerencial N° 063-2025-GRSM-PEAM de fecha 17 de febrero de 2025, se aprobó la modificación del Expediente Técnico del Componente Capacitación – Ambiental del proyecto de inversión denominado "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador – Shica, en los distritos de Soritor, Habana y Calzada de la Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín" con CUI N° 250831, con un monto de S/ 1,714,848.00 (Un Millón Setecientos Catorce Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con 00/100 Soles), en un plazo de ejecución de 24 meses y bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa.

La ejecución del componente Capacitación - Ambiental del proyecto de inversión denominado "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador – Shica, en los distritos de Soritor, Habana y Calzada de la Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín" con CUI N° 2508317; tiene como fin contribuir a la sostenibilidad ambiental del Proyecto de Inversión, para ello el componente basa su intervención en tres sub componentes:

- Fortalecimiento en el manejo de la gestión de residuos sólidos.
- Manejo y conservación del suelo en la arborización de la captación, bordes laterales y puntos críticos del canal principal con productores e instituciones educativas del área de influencia del proyecto.
- Gestión del recurso hídrico en la implementación del proceso de descontaminación de las aguas de uso agrícola y residuales.



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN – AMBIENTAL DEL PI CON CUI N° 250831	
<b>DOCUMENTO DE APROBACIÓN</b>	Resolución Gerencial N° 063-2025-GRSM-PEAM de fecha 17 de febrero de 2025.
<b>INSPECTOR</b>	Ing. Máximo David Ramos Chavarri
<b>COORDINADORA</b>	Ing. Erick del Castillo Vela
<b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b>	Ing. Diany Lisbeth López Navarro
<b>ESPECIALISTA AGROFORESTAL</b>	Ing. Benancio Córdova Yglesias
<b>ADMINISTRADORA</b>	CPC. Solmarina Reategui Reguera
<b>TÉCNICOS DE CAMPO</b>	Gisela Vásquez Mundaca
	Brayan Medina Herrera
	Danith Rojas Cahuaza
	Jhonny Coronado Curinambe

Fuente: Elaboración propia

## II. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El componente está asignado a la meta presupuestaria “091-0041505 Sensibilización y Capacitación Medioambiental”, y a cargo de dos (02) rubros de Recursos Determinados:

- ✓ 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones (FIDEICOMISO).
- ✓ 15. Fondo de Compensación Regional (FONCOR).


## III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

### 3.1 Ejecución de gastos a nivel de certificación

El componente, al 30 de abril del 2025, tiene **certificado** en el rubro de FONCOR el monto de S/ 152,718.00 en el (*Ciento cincuenta y dos mil setecientos dieciocho con 00/100 soles*), y en el rubro de FIDEICOMISO el monto de S/ 44,050.00 en el (*Cuarenta y cuatro mil cincuenta con 00/100 soles*), correspondiente al 30.80% y 100% de avance financiero respectivamente, y se detalla en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN FINANCIERA CERTIFICADO ACUMULADO			
RUBRO	PIM 2025	EJECUTADO CERTIFICADO	% EJECUCIÓN FINANCIERA
FONCOR	495,918.00	152,718.00	30.80%
FIDEICOMISO	44,050.00	44,050.00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>539,968.00</b>	<b>196,768.00</b>	-




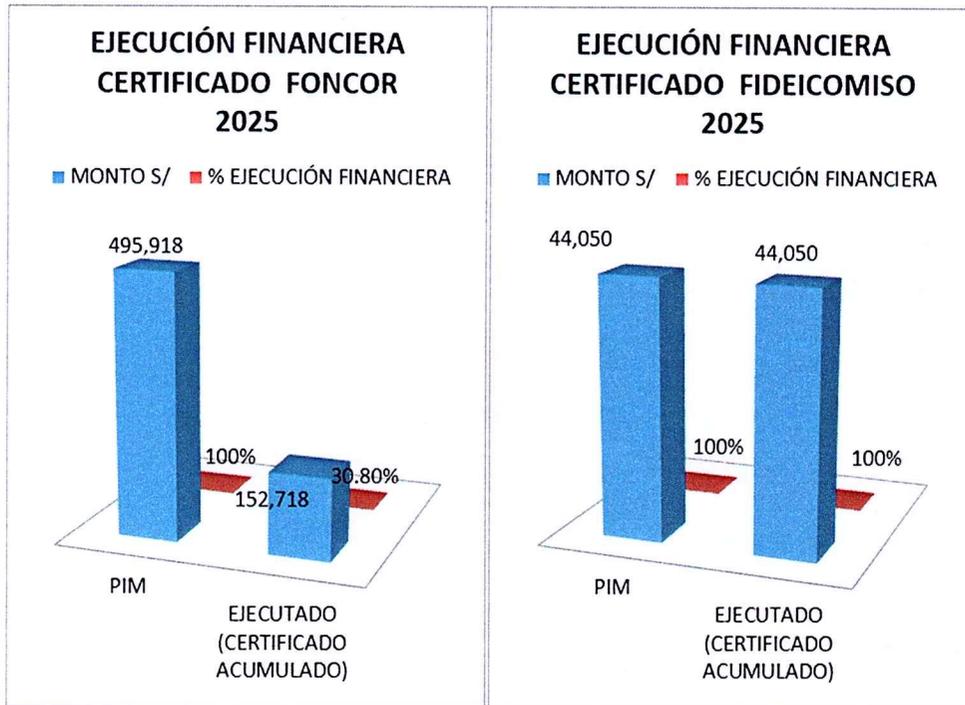

### 3.2 Ejecución de gastos a nivel de devengado

El componente, al 30 de abril del 2025, tiene **devengado** en el rubro de FONCOR el monto de S/ 29,692.00 en el (Veintinueve mil seiscientos noventa y dos con 00/100 soles) que representa 5.98% de ejecución financiera, y en el rubro de FIDEICOMISO aún no hay montos devengados, y se detalla en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN FINANCIERA DEVENGADO ACUMULADO			
RUBRO	PIM 2025	EJECUTADO DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FONCOR	495,918.00	29,692.00	5.98%
FIDEICOMISO	44,050.00	0.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>539,968.00</b>	<b>29,692.00</b>	<b>-</b>

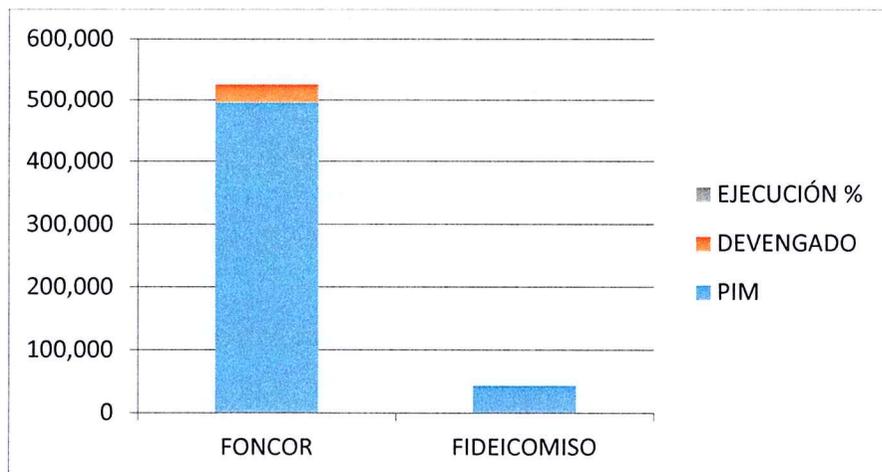

### 3.3 Ejecución Física

Componente Capacitación – Ambiental del proyecto de inversión denominado “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador – Shica, en los distritos de Soritor, Habana y Calzada de la Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín” con CUI N° 250831, considera las siguientes actividades:

Actividades ejecutadas durante el mes de abril del 2025:

#### 1. Sub Componente 01: Implementación de la Gestión de Residuos Sólidos, Manejo y Conservación de suelos para la adaptación al cambio climático con productores e instituciones educativas del área de influencia directa del proyecto.

- Meta: 200 usuarios de agua capacitados
- Indicador: N° de usuarios capacitados

#### 1.1. Actividad 1.1. Gestión de residuos sólidos

- Meta: 200 habitantes capacitados

#### 1.1.1. Subactividad 1.1.1: Fortalecimiento en el manejo de residuos sólidos con Agricultores y Instituciones Educativas.

- ✓ En coordinación con el coordinador del componente se elaboró el plan de capacitación en manejo de residuos sólidos. El plan contempla la ejecución de talleres de capacitación a los agricultores de las diferentes comisiones de regantes (Los independientes – Soritor y El Progreso – Rioja), Institución educativa de Faustino Maldonado, Centro Poblado de Faustino Maldonado y Santa Rosa de Bajo Tangumí.
- ✓ Se desarrolló dos (02) talleres de capacitación en manejo de residuos sólidos con agricultores y habitantes de las localidades de Faustino Maldonado y Santa Rosa de Bajo Tangumí. Se capacitaron un total de 110 habitantes.





Vista N° 01: Taller de capacitación en manejo de residuos sólidos con agricultores y habitantes de la localidad de Faustino Maldonado



Vista N° 01: Taller de capacitación en manejo de residuos sólidos con agricultores y habitantes de la localidad de Santa Rosa de Bajo Tangumí.

### 1.1.2. Subactividad 1.1.2: Implementación de la Gestión de Residuos Sólidos.

- ✓ Se identificó con el equipo técnico la ubicación del punto estratégico a construir las 02 casetas temporal de almacenamiento de residuos sólidos.
- ✓ Se desarrolló una campaña de recolección masiva de reciclaje de residuos sólidos en los Centros Poblados de Faustino Maldonado y Santa Rosa de Bajo Tangumí, para la ejecución de esta actividad se coordinó con la Municipalidad Distrital de Calzada y Moyobamba para entrega de reciclaje a recicladores formalizados.



Vista N° 03: Campaña de recolección masiva de reciclaje de residuos sólidos en el Centro Poblado de Faustino Maldonado



Vista N° 04: Campaña de recolección masiva de reciclaje de residuos sólidos en el Centro Poblado de Santa Rosa de Bajo Tangumí.

**1.1.3. Subactividad 1.1.3: Transformación y uso de los residuos sólidos para productores y instituciones educativas.**

- ✓ En coordinación con el coordinador del componente se elaboró el plan de capacitación en Transformación y uso de los residuos sólidos. El plan contempla la ejecución de talleres de capacitación a los productores e instituciones educativas del área de influencia del componente.
- ✓ Se desarrolló un taller en Transformación y uso de los residuos sólidos con los estudiantes de la I.E 00832 – Faustino Maldonado. Se capacitaron un total de 40 estudiantes.



Vista N° 05: Taller en Transformación y uso de los residuos sólidos con los estudiantes de la I.E 00832 – Faustino Maldonado.



Vista N° 06: Taller en Transformación y uso de los residuos sólidos con los estudiantes de la I.E 00832 – Faustino Maldonado.



**1.2. Actividad 1.2. Manejo y conservación del suelo en la arborización de la captación, bordes laterales y puntos críticos del canal principal con productores e instituciones educativas del área de influencia del proyecto.**

- Meta General para 02 años: Arborizar 13 hectáreas de plantación establecida.
- Meta 2025: 05 hectáreas de plantación establecida.
- ✓ En el presente mes se identificó y caracterizó puntos críticos y áreas a arborizar.



- ✓ En el presente mes se gestionó la adquisición de plantones forestales maderables y no maderables.
- ✓ En el presente mes se gestionó la adquisición de insumos orgánicos y herramientas para reforestar.

**1.3. Implementación de módulos demostrativo de viveros en las localidades de Faustino Maldonado y Santa Rosa del Bajo Tangumí. Metodología "Aprender haciendo".**

- Meta: 02 módulos demostrativos de viveros agroforestales.

**1.3.1. Adquisición de insumos para instalación de vivero temporal demostrativo.**

- ✓ En el presente mes se gestionó la adquisición de insumos para la instalación de los viveros temporales demostrativo.
- ✓ En el presente mes se desarrollo dos (02) jornadas de trabajo para preparación de las áreas donde se instalarán los 02 viveros temporales demostrativos.





Vista N° 09: Jornadas de trabajo para preparación de las áreas donde se instalarán los 02 viveros temporales demostrativos



Vista N° 10: Jornadas de trabajo para preparación de las áreas donde se instalarán los 02 viveros temporales demostrativos

### 1.3.2. Adquisición de semillas

- ✓ En el presente mes se gestionó la adquisición de semillas.

## 2. Sub Componente 03: Manejo de conflictos.

- Meta General: 01 Centro de Atención de Conflictos
- Indicador: N° de conflictos atendidos y resueltos.

### 2.1. Actividad 3.1. Plan de capacitación en manejo de conflictos para productores e Instituciones

- ✓ En el presente mes se elaboró el plan de capacitación en manejo de conflictos para comisión de usuarios, comités de regantes y laterales.

#### 2.1.1. Reuniones para atender quejas y consultas.

- ✓ En el presente mes se facilitó 01 reunión para atender quejas y conflictos.
- ✓ En el presente mes se instaló un (01) punto de quejas. Asimismo, se instaló el buzón de sugerencias en centro de atención de quejas y conflictos.



### 3. Sub Componente 04: Gestión de impactos por el cambio de los ecosistemas

- Meta General: 01 Folleto en "Gestión de impactos por la producción agrícola".
- Indicador: N° de folletos.

#### 3.1. Charla en restauración ecológica y prácticas sostenibles.

- ✓ En el presente mes se elaboró el plan de capacitación en gestión de impactos por el cambio de los ecosistemas.

### 4. Sub Componente 6.0: Implementación del Plan de Desbosque

- Meta General: Reforestación 7.4375 hectáreas
  - Meta Año 2025: Reforestación 4 hectáreas.
  - Indicador: N° de hectáreas reforestadas
- ✓ En el presente mes se realizó 01 visita para levantamiento de información al área donde se ejecutará el Plan de Compensación Ecosistémica de forma ex situ sobre una superficie de 7.4375 ha, ubicado en el sector Juninguillo Yanayacu (ZoCREA), perteneciente al Gobierno Regional San Martín mediante D.S N° 130 EF.



Vista N° 11: Visita de levantamiento de información del área donde se ejecutará el Plan de Compensación Ecosistémica de forma ex situ sobre una superficie de 7.4375 ha



Vista N° 12: Visita de levantamiento de información del área donde se ejecutará el Plan de Compensación Ecosistémica de forma ex situ sobre una superficie de 7.4375 ha

### 5. Sub Componente 7.0: Gestión de proyectos del Componente Capacitación – Ambiental

- ✓ En el presente mes se realizaron los requerimientos de bienes y servicios, así como su seguimiento respectivo.

Cuadro de requerimientos de bienes y servicios del mes de abril 2025

Item	N° de Expediente	Fecha	Documento N°	Asunto
01	004-2025271042	14/04/25	INFORME N° 039-2025-EDCV	Servicio de refrigerio mes abril
02	004-2025208057	15/04/25	INFORME N° 040-2025-EDCV	Adquisición de botiquín
03	004-2025551170	15/04/25	INFORME N° 041-2025-EDCV	Adquisición de indumentaria
04	004-2025823599	15/04/25	INFORME N° 043-2025-EDCV	Servicio de construcción de casetas temporales
05	004-2025040239	15/04/25	INFORME N° 044-2025-EDCV	Adquisición de semillas
06	004-2025408370	15/04/25	INFORME N° 045-2025-EDCV	Adquisición de plantones
07	004-2025643826	21/04/25	INFORME N° 046-2025-EDCV	Adquisición de insumos para el vivero
08	004-2025738108	21/04/25	INFORME N° 047-2025-EDCV	Servicio de fabricación arcos metálicos vivero
09	004-2025542898	21/04/25	INFORME N° 048-2025-EDCV	Adquisición de 06 contenedores residuos sólidos
10	004-2025154398	24/04/25	INFORME N° 054-2025-EDCV	Adquisición de útiles y materiales de escritorio
11	004-2025413787	25/04/25	INFORME N° 055-2025-EDCV	Adquisición de plantones II
12	004-2025071759	25/04/25	INFORME N° 056-2025-EDCV	Adquisición de 24 basureros para residuos sólidos
13	004-2025654127	25/04/25	INFORME N° 059-2025-EDCV	Servicio de refrigerio mes mayo



EJECUCIÓN FÍSICA ABRIL 2025 COMPONENTE DE  
CAPACITACIÓN – AMBIENTAL PI CUI N° 2508317

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PROGRAMADO	EJECUTADO	% PORCENTAJE
<b>Subactividad 1.1.1: Fortalecimiento en el manejo de residuos sólidos con Agricultores y Instituciones Educativas.</b>			
Plan de capacitación en manejo de residuos sólidos	01	01	100 %
Talleres de capacitación en manejo de residuos sólidos con agricultores	02	02	100 %
<b>Subactividad 1.1.2: Implementación de la Gestión de Residuos Sólidos.</b>			
Ubicación del punto estratégico a construir las 02 casetas temporal de almacenamiento de residuos sólidos.	02	02	100 %
campana de recolección masiva de reciclaje de residuos sólidos en los Centros Poblados de Faustino Maldonado y Santa Rosa de Bajo Tangumí, para la ejecución de esta actividad se coordinó con la Municipalidad Distrital de Calzada y Moyobamba para entrega de reciclaje a recicladores formalizados	01	01	100 %
<b>Subactividad 1.1.3: Transformación y uso de los residuos sólidos para productores y instituciones educativas.</b>			
Plan de capacitación en Transformación y uso de los residuos sólidos	01	01	100 %
Taller en Transformación y uso de los residuos sólidos con los estudiantes de la I.E 00832 – Faustino Maldonado.	01	01	100 %
<b>Actividad 1.2. Manejo y conservación del suelo en la arborización de la captación, bordes laterales y puntos críticos del canal principal con productores e instituciones educativas del área de influencia del proyecto.</b>			
identificación y caracterización puntos críticos y áreas a arborizar.	12	03	25 %
Gestión para la adquisición de plántones forestales maderables y no maderables	01	01	100 %
Adquisición de insumos orgánicos y herramientas para reforestar.	01	01	100 %
Adquisición de semillas.	01	01	100 %
<b>Sub Componente 03: Manejo de conflictos.</b>			
Plan de capacitación en manejo de conflictos para comisión de usuarios, comités de regantes y laterales.	1	1	100 %
Punto de quejas	1	1	100 %
<b>Sub Componente 04: Gestión de impactos por el cambio de los ecosistemas</b>			
Plan de capacitación en gestión de impactos por el cambio de los ecosistemas	1	1	100 %
<b>Sub Componente 6.0: Implementación del Plan de Desbosque</b>			
Visita al área donde se ejecutará el Plan de Compensación Ecosistémica de forma ex situ sobre una superficie de 7.4375 ha, ubicado en el sector Juninguillo Yanayacu (ZoCREA),	1	1	100 %



#### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al 30 de abril se tiene una ejecución porcentual acumulado a nivel de certificado en la meta presupuestaria “091-0041505 Sensibilización y Capacitación Medioambiental”, y fuente de financiamiento FONCOR por el monto de S/ 152,718.00 y un porcentaje equivalente al 30.80%.
- Al 30 de abril se tiene una ejecución porcentual acumulado a nivel de certificado en la fuente de financiamiento FIDEICOMISO por el monto de S/ 44,050.00 y un porcentaje equivalente al 100%.
- Al 30 de abril se tiene una ejecución porcentual acumulado a nivel de devengado en la meta presupuestaria “091-0041505 Sensibilización y Capacitación Medioambiental”, y fuente de financiamiento FONCOR por el monto de S/ 29,692.00 y un porcentaje equivalente al 5.98%.
- Se logró realizar la sistematización y digitalización de la información cartográfica generada por el equipo técnico de campo dentro del ámbito de influencia del componente.
- Se logró identificar y habilitar las áreas para implementar 02 viveros temporales que servirán para el acopio, climatización de los plántones, producción de plántones, asegurando condiciones óptimas para su desarrollo.
- Se logró ejecutar los talleres, capacitaciones, reuniones contempladas para el mes de abril 2025 logrando ejecutar el 100 % de los programado.
- Se recomienda acelerar con los trámites de requerimiento de bienes y servicios para continuar con la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo del Componente Capacitación – Ambiental con CUI N° 2508317.



Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Erick Del Castillo Vela**

Coordinador  
del CCA-S del PI con CUI 2508317
