

EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO

COMPONENTE CAPACITACIÓN - AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHICA, EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" CON CUI N° 2508317



RESPONSABLE:

Ing. ERICK DEL CASTILLO VELA
COORDINADOR

Componente Capacitación - Ambiental del PI CUI N° 2508317

MAYO 2025



I. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Componente Capacitación - Ambiental:

Componente Capacitación - Ambiental del Proyecto de Inversión **"Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal principal Luchador - Shica, en los distritos de Soritor, Habana y Calzada de la provincia de Moyobamba departamento de San Martín"** con CUI N° 2508317.

1.2 Descripción:

Mediante Resolución Gerencial N° 063-2025-GRSM-PEAM de fecha 17 de febrero de 2025, se aprobó la modificación del Expediente Técnico del Componente Capacitación – Ambiental del proyecto de inversión denominado "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador – Shica, en los distritos de Soritor, Habana y Calzada de la Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín" con CUI N° 250831, con un monto de S/ 1,714,848.00 (Un Millón Setecientos Catorce Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con 00/100 Soles), en un plazo de ejecución de 24 meses y bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa.

La ejecución del componente Capacitación - Ambiental del proyecto de inversión denominado "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador – Shica, en los distritos de Soritor, Habana y Calzada de la Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín" con CUI N° 2508317; tiene como fin contribuir a la sostenibilidad ambiental del Proyecto de Inversión, para ello el componente basa su intervención en tres sub componentes:

- Fortalecimiento en el manejo de la gestión de residuos sólidos.
- Manejo y conservación del suelo en la arborización de la captación, bordes laterales y puntos críticos del canal principal con productores e instituciones educativas del área de influencia del proyecto.
- Gestión del recurso hídrico en la implementación del proceso de descontaminación de las aguas de uso agrícola y residuales.



AMBIENTAL DEL PI CON CUI N° 250831	
DOCUMENTO DE APROBACIÓN	Resolución Gerencial N° 063-2025-GRSM-PEAM de fecha 17 de febrero de 2025.
INSPECTOR	Ing. Máximo David Ramos Chavarri
COORDINADORA	Ing. Erick del Castillo Vela
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Ing. Diany Lisbeth López Navarro
ESPECIALISTA AGROFORESTAL	Ing. Benancio Córdova Yglesias
ADMINISTRADORA	CPC. Solmarina Reategui Reguera
TÉCNICOS DE CAMPO	Gisela Vásquez Mundaca
	Brayan Medina Herrera
	Danith Rojas Cahuaza
	Jhonny Coronado Curinambe

Fuente: Elaboración propia

II. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El componente está asignado a la meta presupuestaria “091-0041505 Sensibilización y Capacitación Medioambiental”, y a cargo de dos (02) rubros de Recursos Determinados:

- ✓ 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones (FIDEICOMISO).
- ✓ 15. Fondo de Compensación Regional (FONCOR).

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.1 Ejecución de gastos a nivel de certificación

El componente, al 30 de mayo del 2025, tiene certificado en el rubro de FONCOR el monto de S/ 227,937.00 (Doscientos veintisiete mil novecientos treinta y siete con 00/100 soles), y en el rubro de FIDEICOMISO el monto de S/ 35,313.00 en el (Treinta y cinco mil trescientos trece con 00/100 soles), correspondiente al 45.96% y 80.17% de avance financiero respectivamente, y se detalla en el siguiente cuadro:


EJECUCIÓN FINANCIERA CERTIFICADO ACUMULADO			
RUBRO	PIM 2025	EJECUTADO CERTIFICADO	% EJECUCIÓN FINANCIERA
FONCOR	495,918.00	227,937.00	45.96%
FIDEICOMISO	44,050.00	35,313.00	80.17%
TOTAL	539,968.00	263,250.00	48.75%

Documento Nro: 3084726004-2025498198. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en

concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=9b60d0e4N2431c40d9vaeffr29572df39e67&anex=3084726>



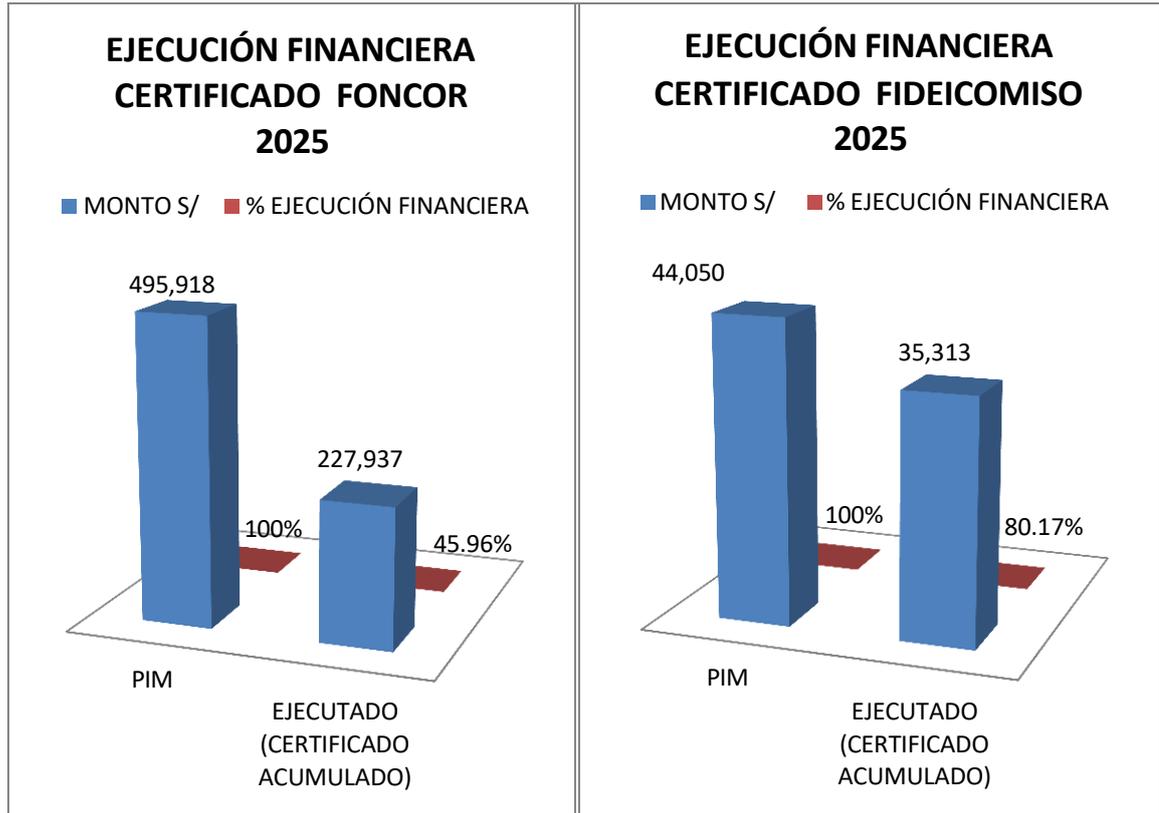


3.2 Ejecución de gastos a nivel de devengado

El componente, al 30 de mayo del 2025, tiene devengado en el rubro de FONCOR el monto de S/ 84,469.00 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve con 00/100 soles) y en el rubro de FIDEICOMISO el monto de S/ 350.00 en el (Trescientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente al 17.03% y 0.79% de avance financiero respectivamente, y se detalla en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN FINANCIERA CERTIFICADO ACUMULADO			
RUBRO	PIM 2025	EJECUTADO CERTIFICADO	% EJECUCIÓN FINANCIERA
FONCOR	495,918.00	84,469.00	17.03%
FIDEICOMISO	44,050.00	350.00	0.79%
TOTAL	539,968.00	84,819.00	17.82%



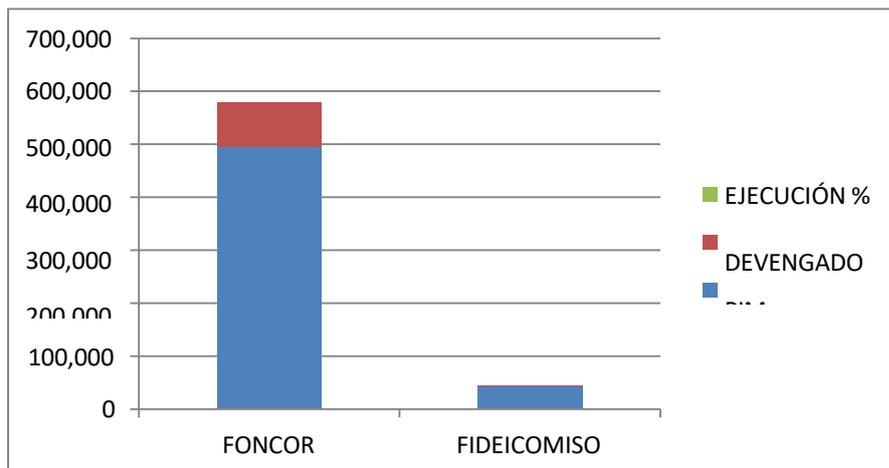

3.3 Ejecución Física

El Componente Capacitación – Ambiental del proyecto de inversión denominado “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador – Shica, en los distritos de Soritor, Habana y Calzada de la Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín” con CUI N° 250831, en el mes de mayo ejecuto las siguientes actividades:

Actividades ejecutadas durante el mes de mayo del 2025:

1. Sub Componente 01: Implementación de la Gestión de Residuos Sólidos, Manejo y Conservación de suelos para la adaptación al cambio climático con productores e instituciones educativas del área de influencia directa del proyecto.

- Meta: 200 usuarios de agua capacitados
- Indicador: N° de usuarios capacitados

1.1. Actividad 1.1. Gestión de residuos sólidos

- Meta: 200 habitantes capacitados

1.1.1.Subactividad 1.1.1: Fortalecimiento en el manejo de residuos sólidos con Agricultores y Instituciones Educativas.

- ✓ Se desarrolló dos (01) taller participativo en manejo de residuos sólidos con la I.E 00832 del CP. Faustino Maldonado. Se capacitaron un total de 40 personas (estudiantes y docentes).





Vista N° 01: Taller de capacitación en manejo de residuos sólidos con estudiante y docentes de la localidad de Faustino Maldonado



Vista N° 02: Taller de capacitación en manejo de residuos sólidos con estudiante y docentes localidad de Santa Rosa de Bajo Tangumí.

1.1.1. Subactividad 1.1.2: Implementación de la gestión de residuos sólidos.

- ✓ En el presente mes se implementó 02 casetas temporal para el almacenamiento de residuos sólidos, ubicados en los C.P. de Faustino Maldonado y Santa Rosa de Bajo Tangumí.



Vista N° 03: Caseta temporal para el almacenamiento de residuos sólidos C.P. Faustino Maldonado.



Vista N° 04: Caseta temporal para el almacenamiento de residuos sólidos C.P. de Santa Rosa de Bajo Tangumí.

1.1.2. Subactividad 1.1.3: Transformación y uso de los residuos sólidos para productores y instituciones educativas.

- ✓ Se desarrolló un taller de capacitación en el uso de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) con agricultores y habitantes del C.P. de Santa Rosa de Bajo Tangumí. Se capacitaron un total de 40 personas (estudiantes y docentes).





Vista N° 05: Taller de capacitación en el uso de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) con agricultores y habitantes del C.P. de Santa Rosa de Bajo Tangumí.



Vista N° 06: Taller de capacitación en el uso de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) con agricultores y habitantes del C.P. de Santa Rosa de Bajo Tangumí.

1.2. Actividad 1.2. Manejo y conservación del suelo en la arborización de la captación, bordes laterales y puntos críticos del canal principal con productores e instituciones educativas del área de influencia del proyecto.

- Meta General para 02 años: Arborizar 13 hectáreas de plantación establecida.
- Meta 2025: 05 hectáreas de plantación establecida.
- ✓ En el presente mes se identificó y caracterizó puntos críticos y áreas a arborizar.
- ✓ En el presente mes se gestionó la adquisición de plántones forestales maderables y no maderables.
- ✓ En el presente mes se gestionó la adquisición de insumos orgánicos y herramientas para reforestar.

1.3. Implementación de módulos demostrativo de viveros en las localidades de Faustino Maldonado y Santa Rosa del Bajo Tangumí. Metodología "Aprender haciendo".

- Meta: 02 módulos demostrativos de viveros agroforestales.

1.3.1. Adquisición de insumos para instalación de vivero temporal demostrativo.

- ✓ En el presente mes se gestionó la adquisición de insumos para la instalación de los viveros temporales demostrativo.
- ✓ En el presente mes se instaló dos (02) viveros temporales demostrativos en los C.P. Faustino Maldonado y Santa Rosa del Bajo Tangumí, con la participación activa de los beneficiarios.





Vista N° 07: Vivero temporal demostrativo C.P. Santa Rosa de Bajo Tangumí.



Vista N° 08: Vivero temporal demostrativo C.P. Faustino Maldonado.

1.3.2. Adquisición de semillas

- ✓ En el presente mes se gestionó la adquisición de semillas.

2. Sub Componente 04: Gestión de impactos por el cambio de los ecosistemas

- Meta General: 01 Folleto en “Gestión de impactos por la producción agrícola”.
- Indicador: N° de folletos.

2.1. Gestión de impactos por la producción agrícola.

- ✓ En el presente mes se desarrolló 01 charla en el tema de restauración ecológica y prácticas sostenibles, en la localidad de Faustino Maldonado con un total de 45 participantes.
- ✓ En el presente mes se desarrolló 01 charla en el tema de Conservación de cuenca y restauración de ríos, en la localidad de Faustino Maldonado con un total de 40 participantes.
- ✓ En el presente mes se desarrolló 01 charla en el tema de Impactos negativos de los agroquímicos en el agua, en la localidad de Faustino Maldonado con un total de 40 participantes.





Vista N° 09: charla en el tema de Conservación de cuenca y restauración de ríos



Vista N° 10: charla en el tema de restauración ecológica y prácticas sostenibles.

3. Sub Componente 05: Gestión del recurso hídrico en la descontaminación de agua de uso agrícola y residuales

- Meta General: 150 usuarios de agua capacitados.
- Indicador: N° de usuarios capacitados

✓ En el presente mes se desarrolló el Taller sobre tratamiento de aguas residuales con un total de 40 participantes.



Vista N° 11: Taller sobre tratamiento de aguas residuales



Vista N° 12: Taller sobre tratamiento de aguas residuales



4. Sub Componente 7.0: Gestión de proyectos del Componente Capacitación – Ambiental

- ✓ En el presente mes se realizaron los requerimientos de bienes y servicios, así como su seguimiento respectivo.

Cuadro de requerimientos de bienes y servicios del mes de mayo 2025

Item	N° de Expediente	Fecha	Documento N°	Asunto
01	004-2025211635	21/05/25	INFORME N° 091-2025-EDCV	Adquisición de herramientas
02	004-2025211836	21/05/25	INFORME N° 092-2025-EDCV	Adquisición de insumos orgánicos
03	004-2025142153	22/05/25	INFORME N° 097-2025-EDCV	Adquisición de plántones III
04	004-2025348560	23/05/25	INFORME N° 099-2025-EDCV	Servicio de seis (06) contenedores
05	004-2025718412	23/05/25	INFORME N° 100-2025-EDCV	Adquisición de veinticuatro (24) basureros
06	004-2025187566	28/05/25	INFORME N° 104-2025-EDCV	Adquisición de semillas Latapi
07	004-2025458039	28/05/25	INFORME N° 105-2025-EDCV	Adquisición de plántones plan desbosque
08	004-2025022918	30/05/25	INFORME N° 109-2025-EDCV	Servicio de refrigerio mes de junio

EJECUCIÓN FÍSICA ACULADA MAYO 2025 COMPONENTE DE CAPACITACIÓN – AMBIENTAL PI CUI N° 2508317

N°	SUB COMPONENTE	PRGRAMADO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	EJECUTADO	%
1	Implementación de la Gestión de Residuos Sólidos, Manejo y Conservación de suelos para la adaptación al cambio climático con productores e instituciones educativas del área de influencia directa del proyecto	75	0	0	4	40	5	5	4	4	6	3	6	12	16.00
2	Programa de difusión del componente	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
3	Manejo de conflictos.	7	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	14.286
4	Gestión de impactos por el cambio de los ecosistemas	7	0	0	0	3	0	1	0	3	0	0	0	3	42.857
5	Gestión del recurso hídrico en la descontaminación de agua de uso agrícola y residuales	24	0	0	0	1	0	1	2	3	8	6	3	1	4.1667
6	Implementación del Plan de Desbosque	23	0	0	0	3	2	3	3	3	3	3	3	0	0
7	Gestión de proyectos del Componente Capacitación - Ambiental	120	2	17	20	11	10	10	10	10	10	10	10	40	33.333

boración propia


15.81

Documento Nro: 3084726004-2025498198. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en


concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=9b60d0e4N2431c40d9vaeffr29572df39e67&anex=3084726>



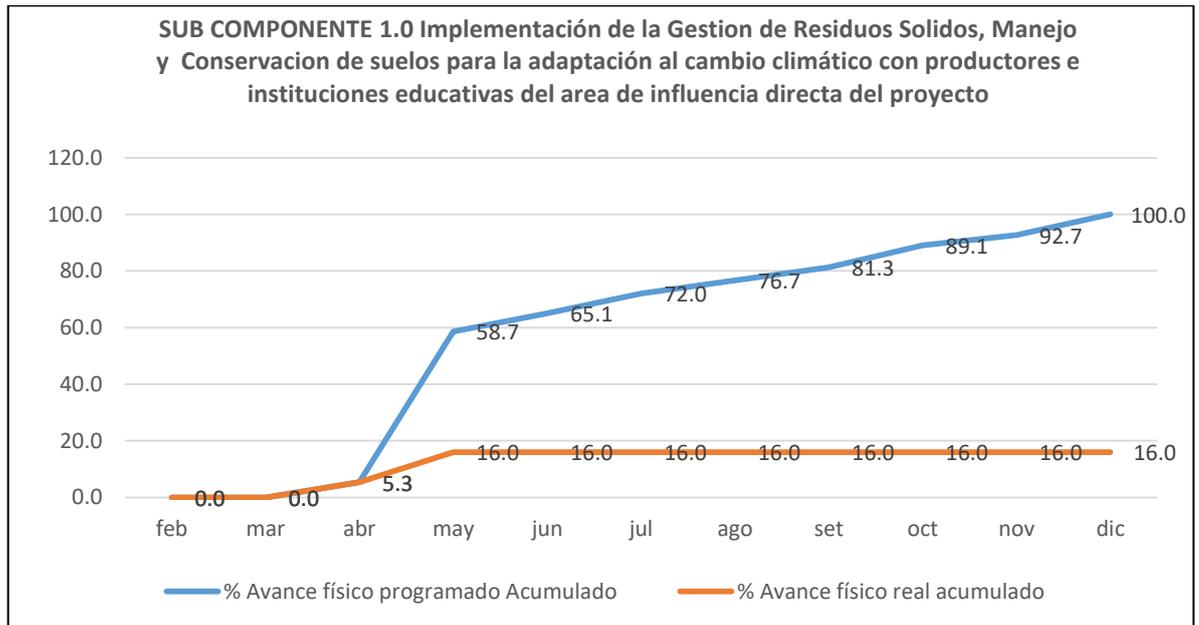


Fuente: Elaboración propia

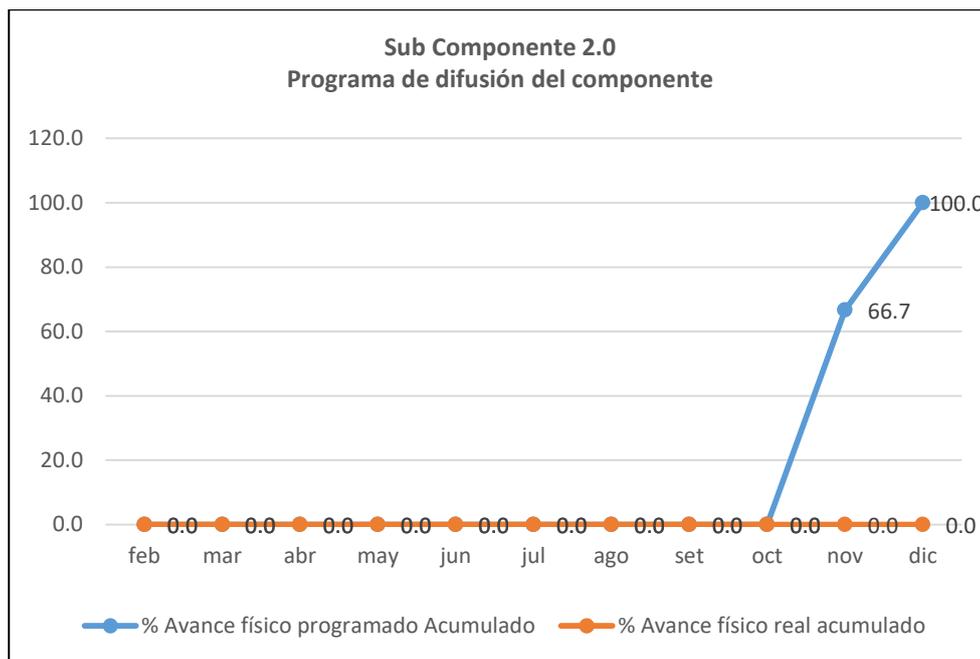


Fuente: Elaboración propia



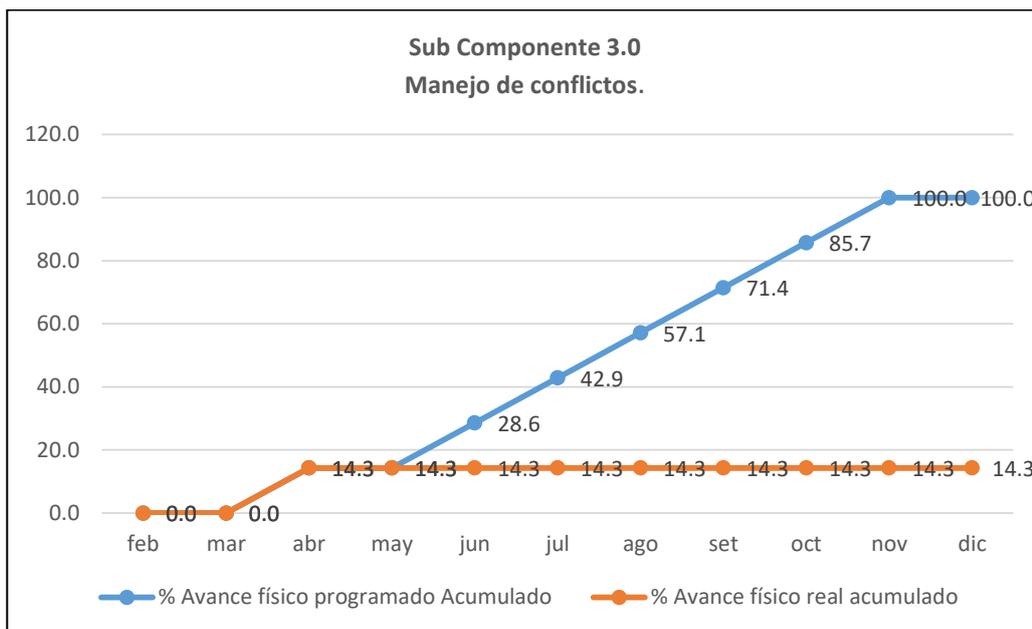


Fuente: Elaboración propia

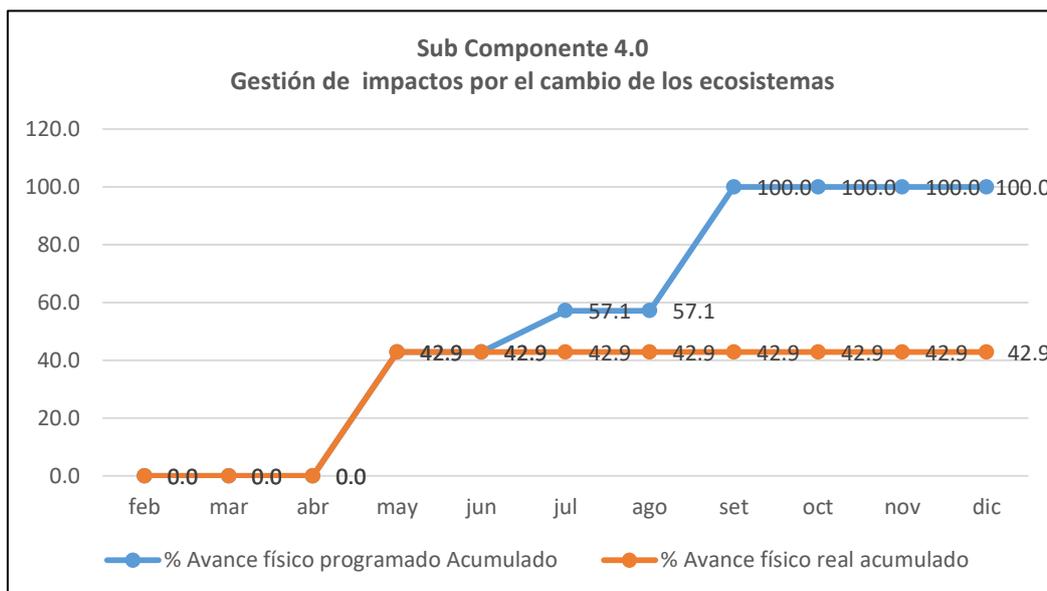


Fuente: Elaboración propia




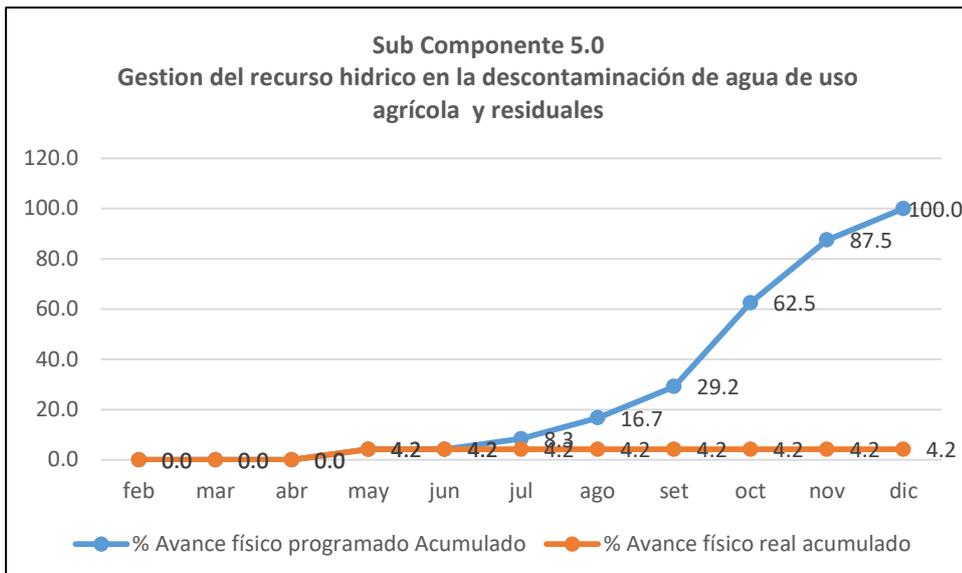

Fuente: Elaboración propia

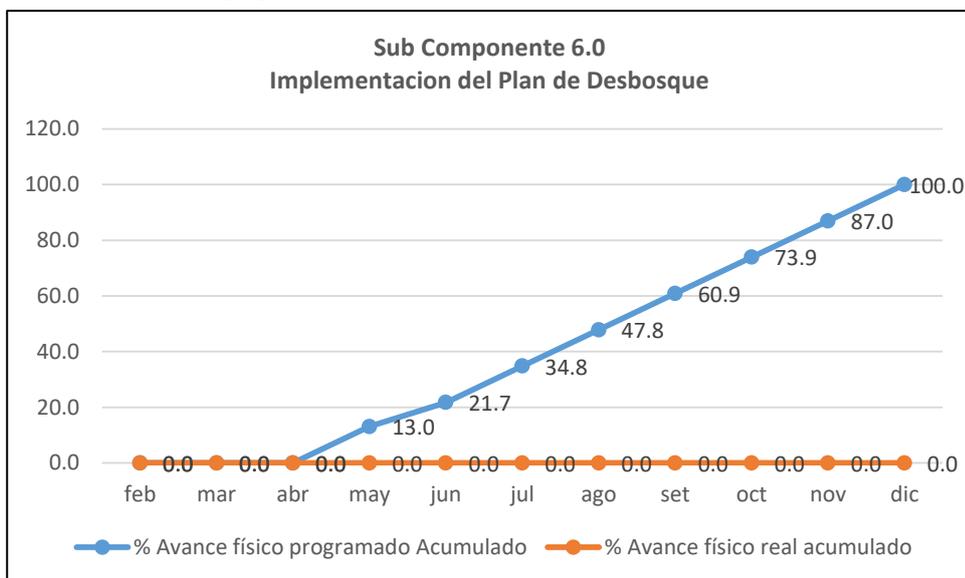

Fuente: Elaboración propia

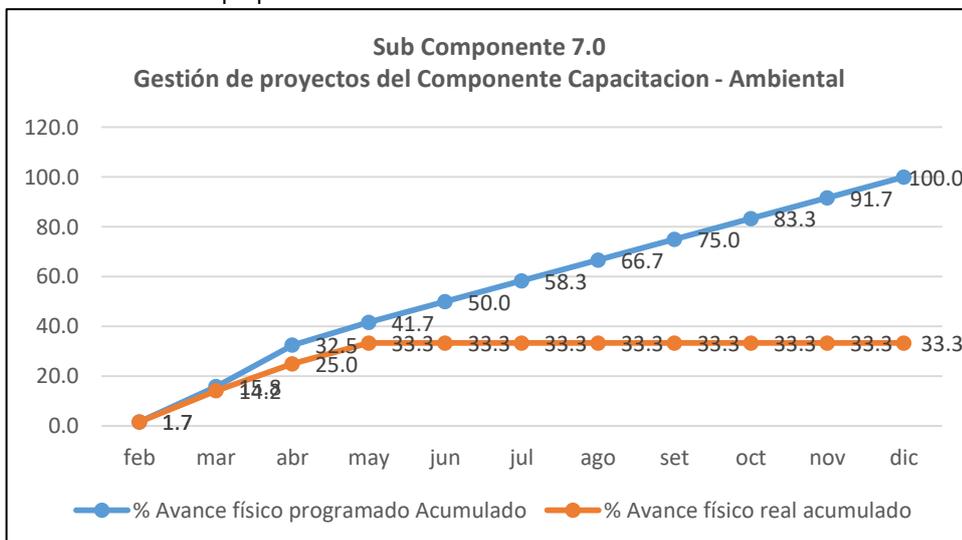

Fuente: Elaboración propia



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al 30 de mayo se tiene una ejecución porcentual acumulado a nivel de certificado en la fuente de financiamiento FIDEICOMISO por el monto de S/ 35,313.00 y un porcentaje equivalente al 80.17%.
- Al 30 de mayo se tiene una ejecución porcentual acumulado a nivel de devengado en la meta presupuestaria “091-0041505 Sensibilización y Capacitación Medioambiental”, y fuente de financiamiento FONCOR por el monto de S/ 84,469.00 y un porcentaje equivalente al 17.03%
- Al 30 de mayo se tiene una ejecución porcentual acumulado a nivel de devengado en la meta presupuestaria “091-0041505 Sensibilización y Capacitación Medioambiental”, y fuente de financiamiento FIDEICOMISO por el monto de S/ 350.00 y un porcentaje equivalente al 0.79%
- Al 30 de mayo el componente tiene una ejecución física acumulada del 15.81 %.

V. RECOMENDACIONES

- Continuar con las gestiones administrativas y de coordinación para la continuidad de la ejecución del Componente Capacitación – Ambiental del proyecto de inversión “*Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador-Shica en los distritos de Soritor, Habana y Calzada de la provincia de Moyobamba – departamento de San Martín*”, con CUI 2508317.

