



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



“Buscador Público del Cuaderno de Obra Digital”



BICENTENARIO
PERÚ 2021

INICIO

VALORIZACIÓN
01

VALORIZACIÓN
02

...

VALORIZACIÓN
N

RECEPCION

LIQUIDACIÓN





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas




¿Qué es el Cuaderno de Obra Digital?



BICENTENARIO
PERÚ 2021

¿QUE ES EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL – COD?

Es una **herramienta informática** desarrollada y administrada por el OSCE, que **sustituye al cuaderno de obra físico** con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento.



Se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas

NUEVO CUADERNO DE OBRA DIGITAL - COD

VIGENCIA

**Resolución N° 100-2020-OSCE/PRE
(01/08/2020)**

**Directiva N°009-2020-OSCE/CD
LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL
CUADERNO DE OBRA DIGITAL**

**Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 00023-2021-ARCC/DE
(28/03/2021)**

2020



2021



Aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, **convocados** a partir de la entrada en vigencia de la presente Directiva/Resolución.

Para procedimientos de selección convocados con anterioridad a la vigencia de la presente Directiva, **las partes pueden acordar el uso del cuaderno de obra digital, siempre que no se no se haya abierto un cuaderno de obra físico.**

Beneficios del COD

RIESGOS DEL CUADERNO DE OBRA EN FISICO

ANTES



SUSTRACCIÓN

PERDIDA

DETERIORO

NO SE VEN LAS COPIAS

LEGALIZACION DE LOS CUADERNOS

NO SE ENTIENDE LA LETRA

HAY QUE FEDATEAR LAS COPIAS

SOLO TIENEN ACCESO EL RESIDENTE O EL SUPERVISOR

SE DEBE TRANSCRIBIR LOS METRADOS

LIMITADO PARA PONER VISTAS FOTOGRAFICAS

BENEFICIOS DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

AHORA



DISPONIBLE DE MANERA PERMANENTE PARA EL RESIDENTE Y SUPERVISOR

PUEDE ACCEDER EL MONITOREO DE OBRA Y/O ADJUDICATARIO (JRD)

QUEDA REGISTRADO DE MANERA VIRTUAL

DE ACCESO PÚBLICO

NO SE LEGALIZA

PERMITE ADJUNTAR ARCHIVOS Y ENLAZAR ASIENTOS

SÓLO USUARIOS AUTORIZADOS PUEDEN REGISTRAR Y VISUALIZAR LOS ASIENTOS

SE IMPRIMEN LOS ASIENTOS O SE GUARDAN EN PDF



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Flujo del proceso del uso del COD



BICENTENARIO
PERÚ 2021


FLUJO DEL PROCESO DEL USO DEL COD



ADMINISTRADOR DE USUARIOS DEL COD



RESIDENTE,
SUPERVISOR O
INSPECTOR

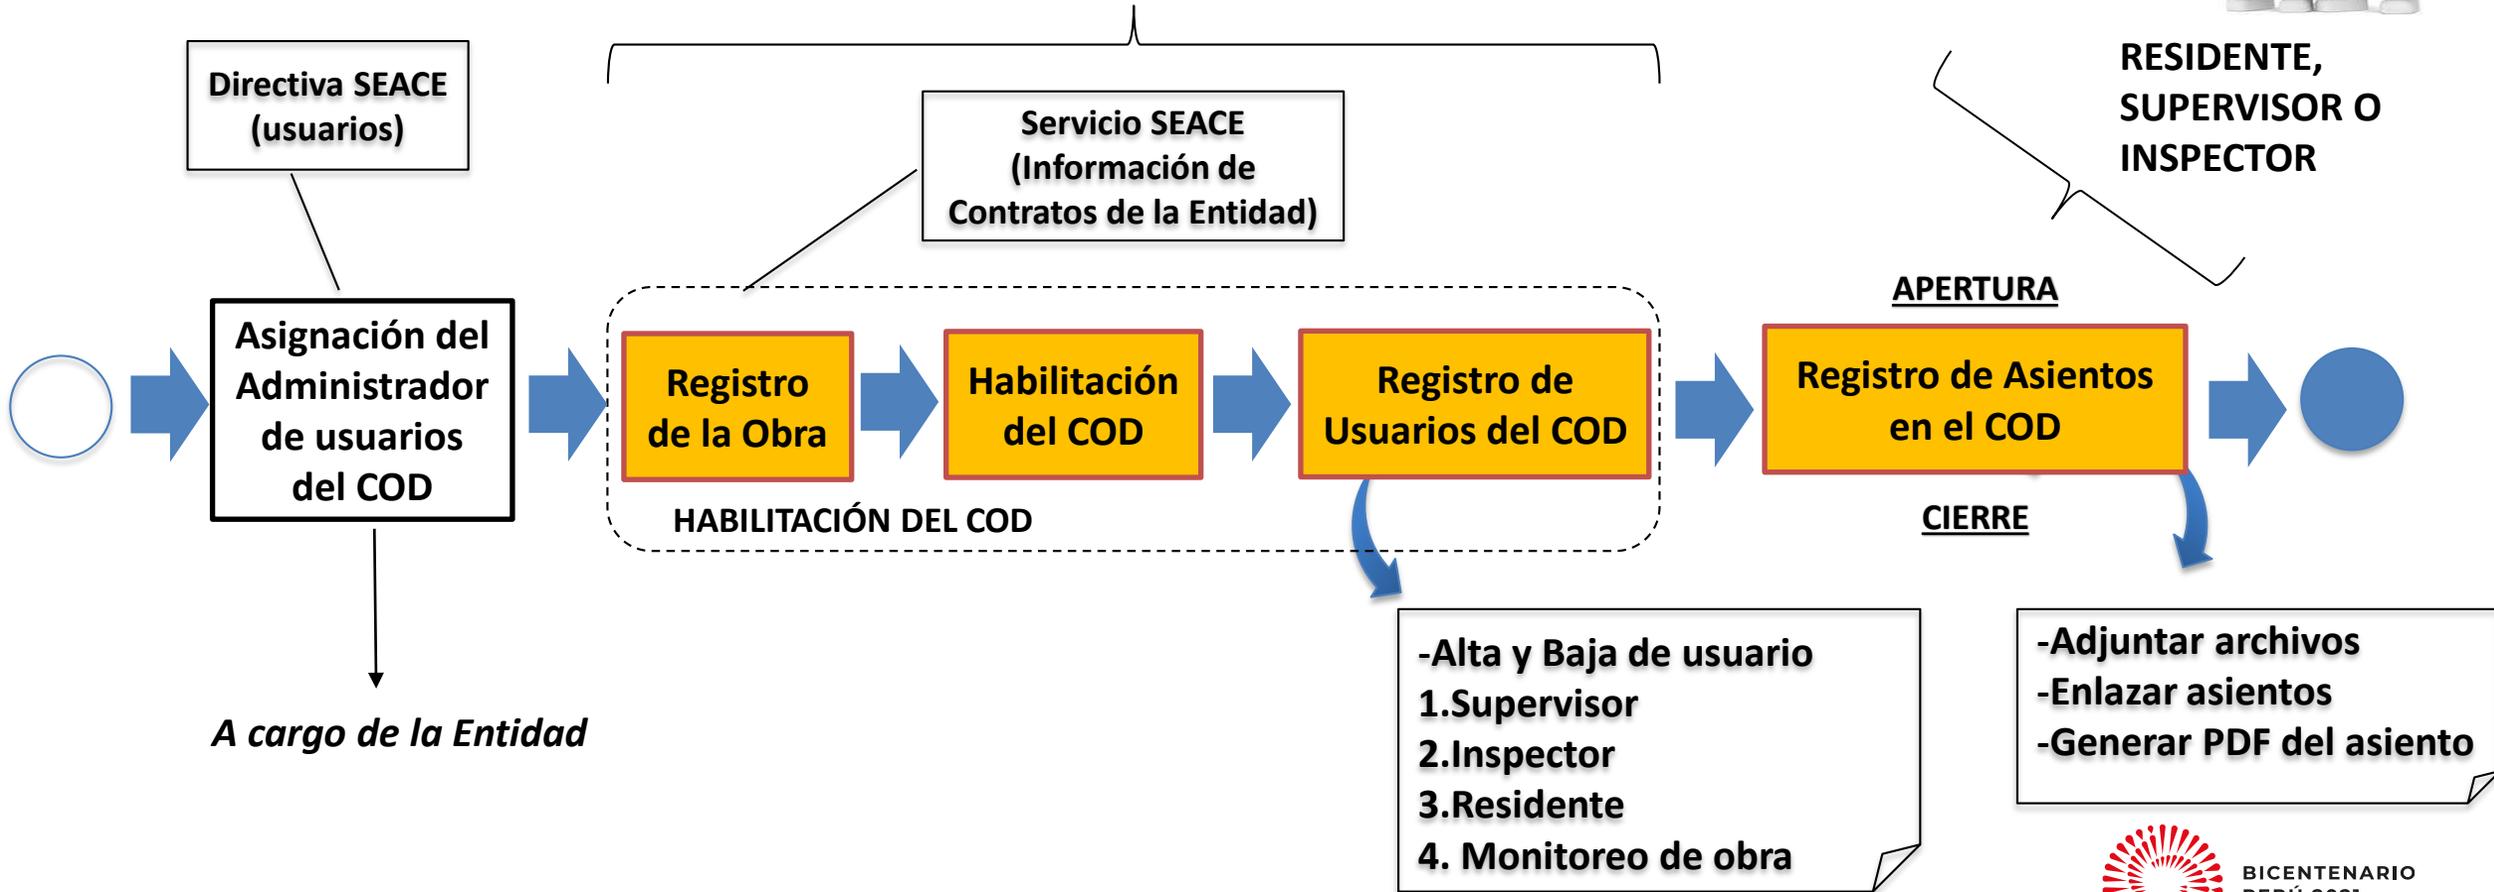



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

¿QUE HAGO SI EN MI LOCALIDAD NO HAY INTERNET?

De manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la contratación de una obra, **puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico**, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra **no haya acceso a internet**

La Dirección del SEACE se pronuncia sobre la solicitud en un plazo máximo de **cinco (5) días hábiles**.

La Entidad **debe registrar** las imágenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad implementada para dicho efecto, en el **plazo máximo de diez (10) días hábiles del mes siguiente**. El registro se efectúa desde el **asiento de apertura** hasta el **asiento de cierre**.

El registro de las imágenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra físico está a cargo del Inspector/Supervisor.



SOLICITUD PARA USO DEL CUADERNO DE OBRA FÍSICO

(Debe ser llenado todos los campos de manera obligatoria y en letra impresa)

1.- DATOS DE LA ENTIDAD	
RAZÓN SOCIAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINGCAP
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE	20058191
DOMICILIO LEGAL	
Av./Calle/Paseo: CALLE GRAU	
Distrito: SINGCAP	
Provincia: OTUZCO	
Departamento: LA LIBERTAD	
2.- DATOS DEL SOLICITANTE (JEFE DE ADMINISTRACIÓN O EL QUE HAGA SUS VECES)	
NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	
BOCANOGA MELLENDEZ ALEX MARIANA	
CARGO	
GERENTE MUNICIPAL	
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO
4188134	bocanoga@munisingscap.gob.pe
TELÉFONO	
995 854 965	
3.- DETALLE DE LA SOLICITUD	
3.1 Se solicita en el siguiente contrato de ejecución de obra autorización para el uso del cuaderno de obra físico:	
N° de Referencia del procedimiento de selección en el PAC (Ejemplo: LP-S-2020-MFC)	AS-SIA-3-2020-MOBICE-1
Descripción del objeto de contratación	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR PAQUETE: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANEJO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE REGADÍO CHINAPE DEL CASERIO MEMBRILLAR Y LA PORTADA DEL CASERIO DE CHILTE, DISTRITO DE SINGCAP - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Lugar exacto de ejecución de la obra (dirección, distrito, provincia y región)	CASERIO DE MEMBRILLAR Y CHILTE, DISTRITO DE SINGCAP - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Georreferencia del lugar de ejecución de la obra, de ser el caso	CHILTE: (814305.87 N - 8144573.35 E) ; (753021.46 E - 75218.17 E) MEMBRILLAR: (8143843.36 N - 8145384.98 E) ; (745795.82 E - 744757.42 E)
3.2 Detallar el sustento de su solicitud	
Describir de manera fundamentada las razones por las que solicita autorización del uso del cuaderno de obra físico, en el marco de lo señalado en el numeral 9.3 de la Directiva "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Física".	EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EXISTE ACCESO A INTERNET DADO QUE LA ZONA CARECE DE CONECTIVIDAD
Detallar los documentos y evidencias que se adjuntan a efectos de fundamentar su solicitud.	
Declaro bajo juramento que toda la información proporcionada es veraz; en caso contrario, me someto al procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria. En ese sentido, la presente solicitud se efectúa bajo mi responsabilidad.	
	
Firma y Sello del Jefe de Administración o del que haga sus veces	
En caso de no contar con la firma, sello o con el registro de los cambios obligatorios, la solicitud será rechazada	

Acceso al Buscador mediante el portal GOB.PE OSCE

<https://www.gob.pe/osce>

Trámites y servicios

Normas legales

Informes y publicaciones

Noticias

Campañas y eventos

Información institucional

Contacto y redes sociales 



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Supervisamos los procesos de contratación pública que realizan las entidades del Estado, a fin de que sean íntegros, eficientes y competitivos, en beneficio de los ciudadanos.

Conocer más

 Convocatorias del Estado >

 Libro de reclamaciones >

 Mesa de partes >

 Portal de transparencia

Orientación, trámites y servicios más visitados

Entérate los beneficios, requisitos y pasos para acceder a ellos, y otra información de tu interés.

Imprimir constancia de inscripción en el RNP para ser participante, postor y contratista

Acceder a trámites en línea del Registro Nacional de Proveedores (RNP)

Realiza el proceso de inscripción,

Acceder al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace)

El Seace permite el intercambio de

1. Digitar “buscador público del cuaderno de obra digital”

2. Seleccionar el ícono lupa

1

2



Resultados de búsqueda en

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Opciones de búsqueda

Tipo de contenido

- Todos 6
- Orientación de trámites y servicios 1
- Noticias 4
- Normas legales 0
- Informes y publicaciones 1
- Campañas 0
- Instituciones 0
- Directorio de funcionarios 0
- Contenido institucional 0

Mostrar más opciones

¿No encontraste lo que buscabas?

buscador público del cuaderno de obra digital

Filtros aplicados: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

BUSCADOR PÚBLICO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

6 resultados

Recibe las últimas actualizaciones de esta lista. [Canal RSS](#)

Guía de uso del Buscador Público del Cuaderno de Obra Digital

22 de enero de 2021

Guía de uso del **Buscador Público del Cuaderno de Obra Digital**

Esta publicación pertenece a la colección Documentos de orientación (Seace)

[Ver más](#)

OSCE fomenta la transparencia con el Buscador público del Cuaderno de Obra Digital

22 de enero de 2021 - 11:08 a. m.

En el marco de sus esfuerzos permanentes para fomentar la transparencia, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha implementado el **Buscador Público del Cuaderno de Obra Digital**. Con esta funcionalidad, los us...

[Ver más](#)

3. Seleccionar el segundo resultado en la lista.

Puede hacer clic en el título o en la etiqueta "Ver más"

3




Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Ministerio de Economía y Finanzas

OSCE fomenta la transparencia con el Buscador público del Cuaderno de Obra Digital

Nota de Prensa

• Aplicación permitirá a la ciudadanía acceder a la información relacionada a los cuadernos de obra digitales de las obras ejecutadas por las Entidades contratantes.

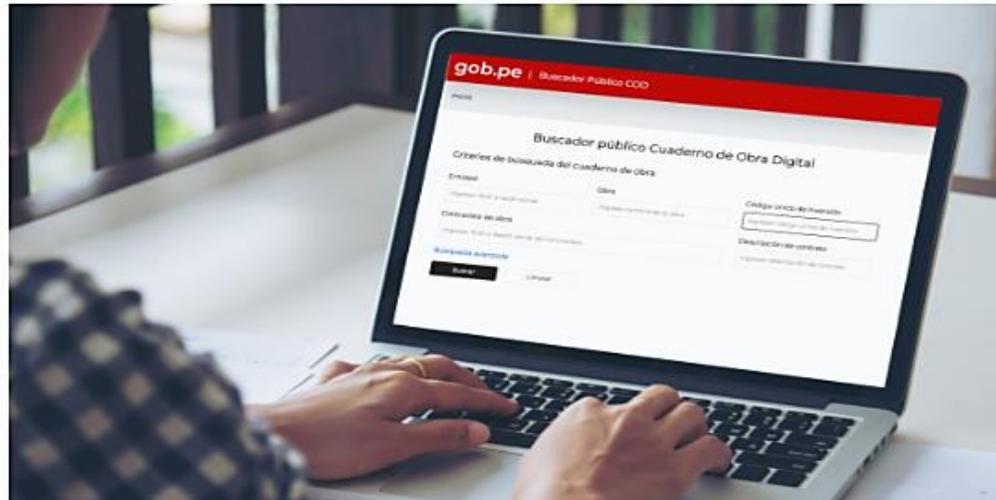

22 de enero de 2021 - 11:08 a. m.

En el marco de sus esfuerzos permanentes para fomentar la transparencia, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha implementado el Buscador Público del Cuaderno de Obra Digital.



4. Seleccionar la etiqueta Buscador Público del Cuaderno de Obra Digital la cual enlaza a la página del buscador.

<https://apps.osce.gob.pe/buscador-cuaderno-obra/search>

4

Buscador público Cuaderno de Obra Digital

Criterios de búsqueda del cuaderno de obra

Entidad

Obra

Código único de inversión

Contratista de obra

Descripción de contrato

[Búsqueda avanzada](#)

No se encontraron resultados.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Criterios de búsqueda y Reporte xls



BICENTENARIO
PERÚ 2021

CRITERIOS DE BÚSQUEDA (BÁSICA Y AVANZADA)

gob.pe | Buscador Público COD

Inicio

1. Ingresar criterio de búsqueda:

(mínimo uno obligatorio)

Básica

- Entidad
- Obra
- Código único de inversión
- Contratista de obra
- Descripción de contrato

Avanzada

- Departamento
- Provincia
- Distrito
- Año de suscripción de contrato

Buscador público Cuaderno de Obra Digital

Criterios de búsqueda del cuaderno de obra

Entidad

Obra

Código único de inversión

Contratista de obra

Descripción de contrato

Búsqueda avanzada

Departamento

Provincia

Distrito

Año de suscripción de contrato

Buscar

Limpiar

1

2

2. Seleccionar Buscar para obtener resultados



RESULTADO DE BÚSQUEDA

Buscador público Cuaderno de Obra Digital

Criterios de búsqueda del cuaderno de obra

Entidad

municipalidad distrital de moro

Obra

Ingrese nombre de la obra

Código único de inversión

Ingresar código único de inversión

Contratista de obra

Ingresar RUC o Razón social del contratista

Descripción de contrato

Ingresar descripción del contrato

[Búsqueda avanzada](#)

Buscar

Limpiar

Resultados de búsqueda: 06

N°	Entidad	Descripción de contrato	Contratista de obra	Ubigeo de Obra	Fecha de suscripción de contrato	
01	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO VILLA LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH	CONSORCIO MERCEDES	ANCASH / SANTA / MORO	17/05/2021	 Activar W

Registros por página: 5

1 - 1 de 1



2



Descargar excel



Criterio de búsqueda ingresado:
Código único de inversión

1. Acceso al detalle del COD

2. Descargar Reporte Excel con resultado de búsqueda

1

REPORTE RESULTADO DE BÚSQUEDA

Nº	Entidad	Descripción de contrato	Contratista de obra	Ubigeo de Obra	Fecha de suscripción de contrato
01	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO VILLA LAS MERCEDES DEL DISTRITO	CONSORCIO MERCEDES	ANCASH / SANTA / MORO	17/05/2021
02	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE VIRAHUANCA, DISTRITO DE MORO, PROVINCIA	CONSORCIO VIRAHUANCA	ANCASH / SANTA / MORO	24/03/2021
03	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO	RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 514 CODIGO LOCAL 665531 EN EL DISTRITO DE MORO, PROVINCIA DE SANTA	CONSORCIO SAN FRANCISCO	ANCASH / SANTA / MORO	18/01/2021
04	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA NUEVA	SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL	JUNIN / YAULI / MOROCOCHA	26/10/2020
05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA	CONSTRUCCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SAN AGUSTIN ANEXO DE PUCARA DEL DISTRITO DE MOROCOCHA	CONSORCIO PUCARA	JUNIN / YAULI / MOROCOCHA	26/10/2020
06	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TALLER Y TOPICO, REMODELACION DE LOZA DEPORTIVA Y AUDITORIO ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E. RICARDO PALMA -	CONSORCIO LEO	JUNIN / YAULI / MOROCOCHA	05/10/2020

Formato XLS

Datos

- Entidad
- Descripción de contrato
- Contratista de obra
- Ubigeo de Obra
- Fecha de suscripción de contrato



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Detalle del Cuaderno de Obra Digital



BICENTENARIO
PERÚ 2021

DATOS DEL COD

Datos del Cuaderno de Obra Digital

Entidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO

Obra

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CASERIO VILLA LAS MERCEDES DEL
DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

Descripción del contrato [👁](#)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO
VILLA LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DEL
SANTA - ANCASH

Código único de inversión

2457866

Fecha de suscripción del contrato

17/05/2021

Fecha de asiento de apertura

02/06/2021

Fecha de asiento de cierre

-

Contratista de Obra


CONSORCIO MERCEDES

Residente de Obra

LEON FLORES, JUAN RAUL

Supervisor de Obra

CHAUCA MEJIA, FREDY YSAAC

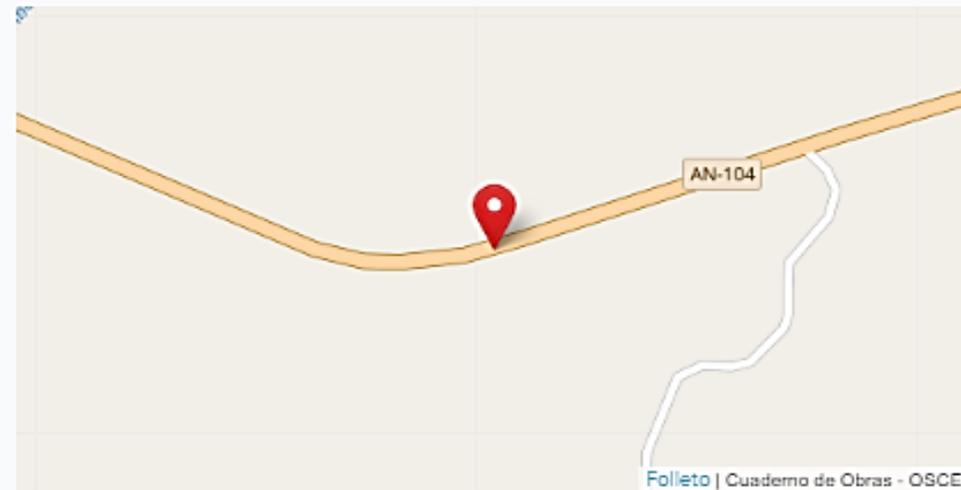

Ubicación referencial de la Obra

Latitud: -9.143113339365119

Longitud: -78.19497585296631

Ubigeo de obra

ANCASH / SANTA / MORO

LISTA DE ASIENTOS DEL COD

Asientos del Cuaderno de Obra Digital

N°	Titulo de Asiento	Tipo de Asiento	Fecha	Usuario	Rol
92	OCURRENCIAS EN OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	28/07/2021 12:01 a. M.	CHAUCA MEJIA, FREDY YSAAC	SUPERVISOR DE OBRA
91	SUSPENSION PLAZO EJECUCION	SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	27/07/2021 03:07 p. M.	LEON FLORES, JUAN RAUL	RESIDENTE DE OBRA
90	OCURRENCIAS EN OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	26/07/2021 11:41 p. M.	CHAUCA MEJIA, FREDY YSAAC	SUPERVISOR DE OBRA
89	OCURRENCIA EN OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	26/07/2021 10:43 p. M.	LEON FLORES, JUAN RAUL	RESIDENTE DE OBRA
88	OCURRENCIAS EN OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	24/07/2021 10:24 p. M.	CHAUCA MEJIA, FREDY YSAAC	SUPERVISOR DE OBRA

Regresar

Registros por página:

1-5 de 92



Descargar excel

Activar Wi
Ve a Contador

REPORTE DE LISTA DE ASIENTOS DEL COD

Nº	Titulo de Asiento	Tipo de Asiento	Fecha	Usuario	Rol
01	AVANCES DIARIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL	02/06/2021 18:27	LEON FLORES, JUAN RAUL	RESIDENTE DE OBRA
02	ASIENTO N°01 DE LA SUPERVISION : FECHA 03 DE JUNIO DEL 2021	INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	03/06/2021 15:13	CHAUCA MEJIA, FREDY YSAAC	SUPERVISOR DE OBRA
03	OCURRENCIA DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	03/06/2021 18:22	LEON FLORES, JUAN RAUL	RESIDENTE DE OBRA
04	OCURRENCIAS EN LA OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	03/06/2021 21:01	CHAUCA MEJIA, FREDY YSAAC	SUPERVISOR DE OBRA
05	AVANCE DIA 04 06 2021	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	04/06/2021 17:47	LEON FLORES, JUAN RAUL	RESIDENTE DE OBRA
06	EJECUCION DE ACTIVIDADES	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	05/06/2021 12:57	LEON FLORES, JUAN RAUL	RESIDENTE DE OBRA
07	ASIENTO NÚMERO 06 DEL 05 DE JUNIO DEL 2021 DEL SUPERVISOR	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	05/06/2021 16:03	CHAUCA MEJIA, FREDY YSAAC	SUPERVISOR DE OBRA
08	ASIENTO 08 DEL 06 DE JUNIO DEL 2021 SUPERVISOR DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	06/06/2021 11:08	CHAUCA MEJIA, FREDY YSAAC	SUPERVISOR DE OBRA
09	OCURRENCIAS EN OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	07/06/2021 17:37	LEON FLORES, JUAN RAUL	RESIDENTE DE OBRA
10	ASIENTO N° 10 DEL 07 DE JUNIO DE 2021 DEL SUPERVISOR	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	07/06/2021 20:01	CHAUCA MEJIA, FREDY YSAAC	SUPERVISOR DE OBRA
11	OCURRENCIAS EN OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	08/06/2021 17:42	LEON FLORES, JUAN RAUL	RESIDENTE DE OBRA
12	ASIENTO N° 12 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2021 DEL SUPERVISOR	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	08/06/2021 20:24	CHAUCA MEJIA, FREDY YSAAC	SUPERVISOR DE OBRA
13	OCURRENCIAS EN OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	09/06/2021 18:14	LEON FLORES, JUAN RAUL	RESIDENTE DE OBRA
14	ASIENTO N° 14 DE 09 DE JUNIO DE 2021 DEL SUPERVISOR	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	09/06/2021 23:15	CHAUCA MEJIA, FREDY YSAAC	SUPERVISOR DE OBRA
15	OCURRENCIAS DE OBRA	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	10/06/2021 17:41	LEON FLORES, JUAN RAUL	RESIDENTE DE OBRA
16	ASIENTO N° 16 DE 10 DE JUNIO DE 2021 DEL SUPERVISOR	PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	10/06/2021 21:58	CHAUCA MEJIA, FREDY YSAAC	SUPERVISOR DE OBRA



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Otras herramientas relacionadas a la ejecución de Obras públicas



BICENTENARIO
PERÚ 2021

BUSCADOR DE CONTRATOS

Opciones de búsqueda:

 Mapa interactivo

 Búsqueda avanzada

 **Central de Consultas del SEACE:**
(01) 614 3636 - Opción 2

 **Central Administrativa:**
(01) 613 5555

 **Correo de consultas:**
consultas@osce.gob.pe

 **Sede central:**
Av. Gregorio escobedo
cdra. 7 s/n Residencial
San Felipe - Jesús María.
Dirección del SEACE

Búsqueda

Seleccione una de las opciones para comenzar

Búsqueda por palabra clave:

 Por: Entidad, Proveedor, Descripción

Año de suscripción
del contrato:

2021

Búsqueda avanzada:

Entidad:

Ej: Nombre entidad, RUC entidad.

Descripción:

Ej: Descripción del proceso de selección, Descripción del ítem.

Proveedor:

Ej: Nombre del proveedor, RUC del proveedor.

Contrato:

Ej: N° contrato, Descripción contrato.

Proyecto de Inversión:

2461665

Nomenclatura:

Ej: Número de Nomenclatura, Descripción de Nomenclatura.

Fecha de suscripción

Desde:



Hasta:



del contrato:

Ampliar búsqueda

Limpiar

Buscar

 Excel

 CSV

Búsqueda por el Código Único de Inversión - CUI


FICHA DEL CONTRATO



Resultados de la búsqueda

Ítems por página 5

1 - 1 of 1



EJECUCION DE LA OBRA:" CONSTRUCCION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL (LA) PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2461665

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Contratista: [20601505828-CORPORACION LUMAYJE S.A.C.](#)

Nomenclatura del Proceso: AS-SM-46-2020-MML-GA-SLC-2

[Ver Procedimiento de selección](#)

Número del Contrato: Contrato N° 28-2021-MML-GA/SLC

[Ver detalle del Contrato](#)

Objeto: OBRA

Monto: S/ 60,664.03

[Descargar Contrato](#)

Fecha de suscripción del Contrato: 27/01/2021

Fecha de Inicio de Contrato: 28/01/2021

Estado: Publicado

Fecha Fin de Contrato: 28/03/2021

Se puede acceder a la Ficha del Contratista



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

[Acceso a Operadores](#)

Búsqueda por Código

Código SNIP
 Código Único de Inversiones

2461665



CÓDIGO ÚNICO	2461665	CÓDIGO SNIP	2461665	FECHA DE REGISTRO	16/09/2019
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	CONSTRUCCION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) PARQUE METROPOLITANO CORONEL MÍGUEL BAQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	IOARR	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI <input type="button" value=""/>

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA
UNIDAD FORMULADORA (UF)	SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA-SERPAR
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SITUACIÓN	APROBADO <input type="button" value=""/>	FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	16/09/2019
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)	61,429
CADENA FUNCIONAL	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO - DESARROLLO URBANO Y RURAL - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	0

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI <input type="button" value=""/>	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)	80,405
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI <input type="button" value=""/>	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b)	0
REGISTRO DE CIERRE	NO	MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (c)	0
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c)	80,405

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES - SSI

Búsqueda por el Código Único de Inversión - CUI

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS

Búsqueda por el Código Único de Inversión - CUI

RESULTADOS DE BÚSQUEDA

 Criterios usados: , SNIP: 2461665

 Búsqueda avanzada

 INFOMAPA

Se muestran registros

Buscar:

N°	Resumen	Código INFOBRAS	Indicadores			Entidad	Obra	Modalidad	Estado	Monto
			Estado de Registro	Avance físico de la obra	Plazo de ejecución					
1	 Ver	117680				MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	CONSTRUCCION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Por Contrata	Sin ejecución	S/. 67,404.47

Resultado: 1 a 1 de 1

<< Anterior **1** Siguiente >>

LEYENDA: SEMÁFORO DE INDICADORES

Ind1:Estado de registro de la información por parte de la entidad pública.			
Ind2:Desfase del avance físico real acumulado con lo programado.			
Ind3:Desfase del plazo de ejecución programado.			

 Exportar a Excel



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Avances a la fecha



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Número de usuarios que accedieron a la herramienta informática.

En el mes de julio 2021, se han registrado **181** registros de cuadernos de obra digital y **41** registros de cuadernos de obra físico (sin considerar aquellos en estado de borrador)

Puesta de Producción:

Año 2021: 1632 (1468 cuadernos de obra digital/164 cuadernos de obra físico)

Mes de enero 2021: 210 (204 cuadernos obra digital /6 cuadernos obra físico)

Mes de febrero 2021: 298 (261 cuadernos de obra digital /37 cuadernos de obra físico)

Mes de marzo 2021: 222 (200 cuadernos de obra digital /22 cuadernos de obra físico)

Mes de abril 2021: 174 (159 cuadernos de obra digital /15 cuadernos de obra físico)

Mes de mayo 2021: 175 (161 cuadernos de obra digital / 14 cuadernos de obra físico)

Mes de junio 2021: 331 (302 cuadernos de obra digital / 29 cuadernos de obra físico)

Mes de julio 2021: 222 (181 cuadernos de obra digital / 41 cuadernos de obra físico)





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual para
acceder como
**Administrador
de usuarios del
Cuaderno de
Obra Digital**



Manual para
acceder como
**Residente, Supervisor
o Inspector de obra
del Cuaderno de
Obra Digital**



**Material de
consulta**

Manual para
acceder como
**Supervisor o
Inspector de obra
del Cuaderno de
Obra Físico**



GUÍA DE USO

**Buscador Público
del Cuaderno
de Obra Digital**



Organismo
Supervisor de las
Contrataciones
del Estado



**El OSCE supervisa y promueve
contrataciones públicas
eficientes, transparentes e íntegras,
para el bienestar de todos los peruanos**
