


PLAN OPERATIVO

2015

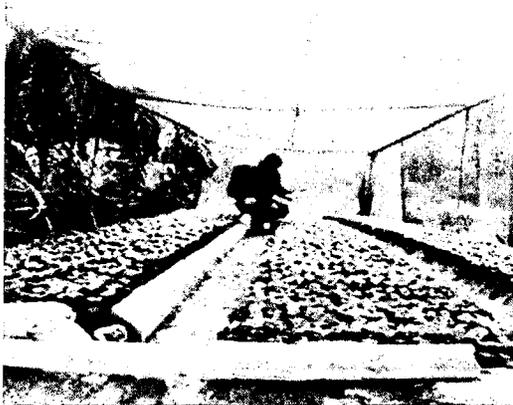

ACTIVIDAD:

“Capacitación y Asistencia Técnica en buenas prácticas de producción agraria” (a Productores de Café y Palma Aceitera en el Distrito de Padre Abad, Provincia Padre Abad, Región Ucayali)-
2015

EJECUTOR: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD



Aguaytia, Febrero del 2015

INDICE

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Nombre de la Actividad
- 1.2. Objetivo de la actividad
- 1.3. Monto Total de la inversión
- 1.4. Ámbito de intervención
- 1.5. N° Beneficiarios

II.- PLAZO DE EJECUCION:

III.- FINANCIAMIENTO:

IV.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1.- FASE DE SELECCIÓN DEL EQUIPO TECNICO

- 1.1 Selección, evaluación y contratación del Equipo Técnico

2. FASE DE FORMACIÓN DE FACILITADORES.

- 2.2 Reforzamiento a Facilitadores de Ecas

3.- FASE DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

- 3.1 Reuniones de Coordinación y Concertación comunal

4.- FASE DE EJECUCIÓN (IMPLEMENTACIÓN)

- 4.1 Sinceramiento de grupos.
- 4.2 Determinación del Contenido Técnico.
- 4.3 Instalación de 200 ha de café (variedades resistentes Roya Amarilla)
- 4.4. Mantenimiento de 260 ha de café
- 4.5 Establecimiento de parcelas de aprendizaje
- 4.6. Desarrollo de la Metodología de aprendizaje.
 - 4.6.1 Desarrollo de la Sesión.



4.6.2 Pasantías.

4.6.3 Asistencia Técnica

4.6.4 Fortalecimiento Organizacional.

4.7 Graduación.

4.7.1 Prueba de Caja.

4.7.2 Entrega de Certificados.

5.- FASE: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.

5.1 Difusión de Spot Radiales.

V.- PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS

5.1. Formato N° 1: Programación de metas Físicas de la Actividad

5.2. Formato N° 3: Programación de metas Financieras



I. DATOS GENERALES

1.1. Nombre de la Actividad:

"Capacitación y Asistencia Técnica en buenas prácticas de producción agraria (a Productores de Café y Palma Aceitera en el Distrito de Padre Abad, Provincia Padre Abad, Región Ucayali)".

1.2. Objetivo General:

Fortalecer el desarrollo de capacidades técnicas y de asociatividad de los productores de café y palma aceitera utilizando metodologías de aprendizaje participativas para que mejoren el nivel de sus ingresos con actividades lícitas.

Objetivos específicos:

- Mejorar los conocimientos teórico- prácticos de los agricultores para la correcta aplicación del paquete tecnológico de los cultivos de café (Instalación y mantenimiento) y palma aceitera (mantenimiento), que permitan mejorar los niveles de producción y productividad.
- Fortalecer la capacidad organizativa, productiva y comercial de la Cooperativa Agraria Cafetalera Cordillera Azul.

1.3. Monto de la Inversión:

El monto de la inversión es de S/. 800,000.00 nuevos soles.

1.4. Ámbito de intervención:

Región: Ucayali
Departamento: Ucayali
Provincia: Padre Abad
Distrito: Padre Abad

1.5. Número de Beneficiarios:

Directos: 500 (340 de Café, 160 de Palma Aceitera).



Café:

Provincia	Distrito	Comunidad	Nº Beneficiarios
Padre Abad	Padre Abad	DIVISORIA	45
		MIGUEL GRAU	15
		PREVISTO	15
		INCA GARCILAZO	16
		SANTA ANA	10
		JUAN VELAZCO	4
		HIDAYACU	7
		NUEVA PALESTINA	8
		CHANCADORA	11
		NUEVA UNION	10
		SANTA ROSA	36
		ALTO ORIENTAL	24
		NUEVO MUNDO	10
		TRES DE OCTUBRE	37
		NUEVA SINCHONA	21
		MINAS DE SAL	20
FLOR DE CAFÉ	24		
MARGARITA	27		
TOTAL			340



Palma Aceitera:

Provincia	Distrito	Comunidad	Nº Beneficiarios
Padre Abad	Padre Abad	Alto Shambillo	12
		Alto Miraflores	24
		Avelino Cáceres	14
		Boquerón	10
		Erika-Libertad	12
		Mediacion	10
		Micaela Bastidas	10
		Paujil	10
		Rio Blanco	10
		Rio Negro	10
		Selva Turística	5
		Shambillo A	5
		Shambillo B	12
		Shambo	16
Total			160

II. PLAZO DE EJECUCION.

Marzo a Diciembre de 2015 (10 meses)

III. FINANCIAMIENTO.

El 100% del financiamiento, corresponde a los fondos de DEVIDA.

IV. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La presente Actividad es para reforzar y garantizar la sostenibilidad del desarrollo de capacidades realizada durante los años 2013 y 2014; es decir, se reforzará los conocimientos tecnológicos y asociatividad de los productores de café y palma aceitera, en aquellos temas de importancia técnica como los planes de fertilización, manejo integrado de plagas y enfermedades, cosecha y post cosecha, entre otros. Se va a promover la capacitación en temas ambientales y manejo de suelos, así como en temas de motivación y liderazgo.

En el cultivo de café, se trabajara con los productores que vienen participando años anteriores y algunos nuevos, que demuestren su interés en mejorar su cultivo, con ellos se trabajara en sus plantaciones en producción, en etapa de crecimiento (instaladas el año 2013 y 2014) y en la etapa de instalación a desarrollarse este año 2015.

Para desarrollar esta actividad, se trabajara directamente con un equipo de 6 Extensionistas y 4 promotores de campo, quienes se encargaran de brindar asesoramiento técnico y capacitación a través de Escuelas de campo, pasantías interregionales a un total de 340 participantes. A cada Extensionista se le otorgara un sector con un promedio de 50 a 60 agricultores.

Cada extensionista tendrá como meta realizar 10 sesiones de Ecas. En caso de la Asistencia Técnica los Extensionistas tendrán como meta anual 3300 visitas (550 por Extensionista), tanto para las áreas de mantenimiento e instalación.

También se tiene como meta global, la instalación de 200 hectáreas de café de variedades resistentes a la enfermedad de la roya amarilla, donde cada Extensionista de café tendrá a su cargo la instalación de 40 hectáreas.



En Palma aceitera, se priorizara trabajar con productores nuevos, que no cuentan con Asistencia Técnica y que no pertenecen a ninguna organización. Para desarrollar esta actividad, se trabajara directamente con un equipo de 2 Extensionistas, quienes se encargaran de brindar asesoramiento técnico en mantenimiento del cultivo a un promedio de 160 agricultores. También se les capacitará a través de Escuelas de campo y pasantías interregionales. A cada Extensionista se le otorgara un sector con un promedio de 80 agricultores. Cada extensionista tendrá como meta realizar 10 sesiones de Ecas, así mismo, tendrán como meta anual 1400 visitas de asistencia técnica.

La actividad comprende 5 fases:

- ✓ Fase N° 01.- Selección del Equipo Técnico.
- ✓ Fase N° 02.- Formación de Facilitadores.
- ✓ Fase N° 03.- Planificación y Organización.
- ✓ Fase N° 04.- Ejecución.
- ✓ Fase N° 05.- Comunicación y Visibilidad.



1. FASE: SELECCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO:

En esta etapa se seleccionará al personal profesional de la Actividad y se contratará a 01 Coordinador general, 08 Extensionistas especialistas, 1 asistente administrativo. Adicionalmente se seleccionará y contratará a 4 promotores agrícolas para el cultivo de café.

1.1 Selección del Equipo Técnico de la Actividad.

Para la selección y evaluación de los facilitadores se considerará principalmente lo siguiente:

El Coordinador de la Actividad debe ser un Ing. Agrónomo, con colegiatura hábil, especialista y con amplia experiencia en el cultivo de palma aceitera y café; con experiencia en el manejo de proyectos similares y en Ecas; es el

encargado de diseñar, planificar y ejecutar las actividades del Plan Operativo. Responde ante la institución ejecutora y la institución financiera.

Los facilitadores o Extensionistas (6 en café y 2 en palma aceitera) deben ser Ingenieros agrónomos con amplio conocimiento en el cultivo y contar con dominio de metodologías participativas para los procesos de capacitación (Ecas). De manera permanente informaran a la coordinación, las actividades ejecutadas y los avances de acuerdo a los formatos y fechas establecidas.

El Asistente administrativo debe tener estudios superiores en Administración, Economía y/o contabilidad, con experiencia mínima de tres años en proyectos similares en instituciones públicas.

En todos los casos la experiencia profesional debe ser debidamente acreditada (evidencias). Adicionalmente el personal requerido debe tener el siguiente perfil: Debe ser comunicativo, tener conocimiento básico sobre extensión agropecuaria, tener conocimiento sobre el territorio de intervención de la actividad, tener conocimiento básico sobre metodología Ecas, aptitudes de liderazgo, conocimiento de desarrollo rural, entre otros.

Así mismo, se requerirá la contratación de 4 promotores agrícolas para el cultivo de café, para lo cual se requerirán a Agricultores líderes, con amplia experiencia en el cultivo de café y en la Metodología de Ecas. Son el apoyo de la Asistencia técnica y de la realización de las Escuelas de Campo



EQUIPO TECNICO DE LA ACTIVIDAD

CARGO	CANTIDAD
Coordinador de la Actividad	1
Facilitadores (Extensionistas)	8
Asistente Administrativo	1
Promotores Agrícolas	4

Total: 14

Unidad de medida: Informe

Meta: 01

2. FASE: FORMACIÓN DE FACILITADORES

2.1 Reforzamiento a facilitadores de Ecas:

En esta Etapa consiste en realizar un taller que servirán de reforzamiento a los facilitadores de Ecas, debido a las innovaciones en la Metodología que se da conforme transcurre el tiempo.

Dicha capacitación se realizara a través de una Consultoría por persona natural, con experiencia en la Metodología Ecas. Tendrá una duración de 3 días (24 horas académicas)

La Municipalidad de Padre Abad para evaluar y seleccionar al consultor que va a brindar este servicio, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Experiencia debidamente comprobada.
- Estar realizando trabajos de capacitación y extensión agrícola mediante la metodología Ecas.

Unidad de medida: Informe

Meta: 01

3. FASE: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN.

El equipo de profesionales realizarán acciones de acercamiento a las comunidades ya asistidas el año anterior, con el fin de comunicar e invitar a la población integrante de estas comunidades a participar en esta actividad, informando sobre los procesos de capacitación y la asistencia técnica, para definir conjuntamente, como se planificará y organizará las (Ecas), a quiénes se capacitará y además la identificación de un conjunto de tareas necesarias para asegurar el éxito de la actividad; teniendo en cuenta al ciclo vegetativo del cultivo de acuerdo al requerimiento de la comunidad.

El proceso de preparación de las Ecas, está formado por los siguientes pasos vinculados al establecimiento del grupo de productores a intervenir con la capacitación y la asistencia técnica:



- Identificación de la comunidad
- Reuniones de sensibilización e información
- Selección de participantes.
- Establecimientos de reglas de juego para el desarrollo adecuado de las Ecas.

3.1 Reuniones de Coordinación y Concertación Comunal.

Para iniciar la actividad se desarrollarán reuniones de coordinación y concertación con las autoridades, líderes y agricultores del ámbito de acción, donde se dará a conocer el detalle para la implementación de la actividad y generar un grado de confianza y responsabilidad para el cumplimiento de los fines y objetivos propuestos.

Unidad de medida: Actas de Reuniones.

Meta: 32

4. FASE: EJECUCIÓN (IMPLEMENTACIÓN).

En la presente fase el equipo técnico, iniciará las acciones en el campo en coordinación con las autoridades, agricultores líderes para dar inicio el trabajo de asistencia técnica y capacitación a través de las diferentes estrategias planteadas en el presente documento.

4.1 Sinceramiento de Grupos.

El equipo técnico, en coordinación con las autoridades comunales generará la relación de los agricultores quienes serán participantes en la implementación de la actividad.

- Participantes.

Los participantes serán productores nuevos del cultivo de Palma aceitera (160) que tienen sus parcelas en la fase de crecimiento y producción.



En el caso de Café (340) se trabajara con productores que tienen sus parcelas en la fase de crecimiento y producción; además, de la fase de instalación de 200 hectáreas a realizarse este año 2015.

Reajustes en las Reglas de Juego.

Lo definirán los beneficiarios conjuntamente con el extensionista en forma participativa.

Unidad de medida: Informe.

Meta: 01

4.2 Determinación del Contenido Técnico.

El contenido técnico estará determinado por los agricultores participantes de la actividad con el apoyo del extensionista, orientado a los vacíos técnicos de los agricultores.

4.2.1 Determinación del Currículo de las sesiones

Los temas que se desarrollaran en las ECA'S, saldrán en el proceso de las sesiones, sin embargo propondremos algunos temas que consideramos importantes para cada cultivo:



CAFE	PALMA ACEITERA
-Producción de café en armonía con el medio ambiente.	-Impacto ambiental en la producción de aceite de palma aceitera.(RSPO)
-Siembra en curvas de nivel	Prescripción de un Plan de Nutrición.
-Sistemas agroforestales	Manejo segura de

	Plaguicidas
-Manejo Integrado de Plagas	Manejo Integrado de Plagas
Manejo segura de Plaguicidas	Control de calidad de cosecha de RFF
Planes de abonamiento	Manejo de drenes
Cosecha y Post cosecha	Instalación de plantas nectaríferas
Costos de Producción	Costos de Producción

Unidad de medida: Informe.

Meta: 01

4.3 Instalación de 200 ha de café (variedades resistentes a la roya amarilla)

Debido al problema álgido de la enfermedad de la roya amarilla en el año 2013, en esta zona cafetalera de la Divisoria, muchas plantaciones de café se perdieron ocasionando pérdidas económicas y desanimo en los productores, por lo que se está planteando en este año 2015, continuar con el repoblamiento de las áreas de café, teniéndose como meta la instalación de 200 ha de café con la participación de 200 productores (1ha* productor), en la cual se utilizara semillas tolerantes a la enfermedad, Los beneficiarios serán escogidos de todas las comunidades participantes en esta actividad, con el objetivo de repoblar las plantaciones y de motivar a los agricultores a que continúen en esta actividad lícita y rentable si se le da un buen manejo agronómico.

En esta etapa de instalación se otorgará a los participantes un kit de herramientas conformado por: rastrillos, palas rectas y azadones.



Así mismo, se hará entrega de insumos como Semillas, bolsas, malla raschell, Fertilizantes y pesticidas como: Ulexita, roca fosfórica, Sulfato de potasio, Magnocal, sulfato de cobre, sulfato de Zinc, sulfato de Manganeso; insecticidas, fungicidas y abonos foliares

4.3.1 Instalación de germinadores

Es un medio sencillo, práctico y económico de producir un alto número de plantas para el establecimiento de las futuras plantaciones en un espacio relativamente pequeño. El tiempo aproximado que perduraran las plantitas en este lugar es aproximadamente 60 días.

Unidad de medida: Actas de instalación de germinadores

Meta: 200.

4.3.2 Instalación de viveros

Es el lugar adecuado donde permanecerán las plantas de café procedentes del germinador hasta alcanzar el desarrollo necesario para el trasplante al campo definitivo, que puede tardar entre 3 a 5 meses.

La preparación del sustrato en viveros requiere la adición de fuentes orgánicas y naturales para una buena producción de los plantones.

Unidad de medida: Actas de instalación de viveros

Meta: 200.

4.3.3 Instalación a campo definitivo

Una vez cumplido el tiempo en vivero, los plantones están aptos para el traslado a campo definitivo, para lo cual se tiene que tener en cuenta lo siguiente:

- Evitar la siembra de plantones cortando raíces, descartar estas plantas.



- La siembra de café debe hacerse en época inicial de lluvia hasta el finad de la época de lluvias.
- En la siembra de café incluir compost, roca fosfórica Ulexita y Magnocal en los suelos de altura.

Unidad de medida: Actas de instalación a campo definitivo

Meta: 200.

4.4 Mantenimiento de 260 ha de café (variedad catimor)

El periodo 2013, se inició un plan de contingencia, para contrarrestar los efectos de la enfermedad de la roya amarilla en los cafetales del valle de Divisoria y Previsto, en el cual se instaló 60 hectáreas de café de la variedad Catimor, continuándose el 2014, año en el que se instaló 200 ha adicionales, beneficiando un promedio de 340 productores .

Este año 2015, con la finalidad de darle sostenibilidad a este cultivo se plantea el abonamiento de estas 260 hectáreas en tres fracciones, a fin de garantizar una buena producción de estas plantaciones. Para el cual se estará haciendo la adquisición de fertilizantes como: urea, cloruro de potasio, sulfato de cobre, sulfato de Zinc y sulfato de Manganeso.



4.4.1 Primer Abonamiento:

Unidad de medida: Actas de conformidad

Meta: 340

4.4.2 Segundo Abonamiento:

Unidad de medida: Actas de conformidad

Meta: 340

4.4.3 Tercer Abonamiento:

Unidad de medida: Actas de conformidad

Meta: 340

4.5 Establecimiento de Parcelas de Aprendizaje:

Para las sesiones de las Escuelas de Campo se debe identificar y seleccionar parcelas de aprendizaje en las cuales se van a desarrollar las diferentes prácticas culturales que se realiza en el cultivo de Café y palma aceitera, parcelas en donde se realizarán todas las prácticas culturales necesarias para obtener productos de calidad.

Para la selección de estas parcelas de aprendizaje se debe considerar lo siguiente:

- La parcela debe pertenecer a un productor activo.
- Deben estar ubicadas cerca a la Escuela (Aula) de Campo.
- Deben tener fácil accesibilidad (cerca de carretera).
- El productor propietario debe tener una personalidad abierta para el dialogo.
- El propietario debe estar predispuesto de compartir sus experiencias.



Las “**parcelas de aprendizaje**”, servirán de base para transferir la tecnología aprendida en las Escuelas de Campo, en estas parcelas se efectuarán todas las actividades que comprende el manejo tecnificado del cultivo en forma adecuada y oportuna para que los productores observen y repliquen los resultados de estas parcelas, para ello todo el proceso de manejo cultural del cultivo se realizará en forma mancomunada y participativa.

Para el caso café se propone manejar 20 parcelas de aprendizaje de 0.5 ha cada una y para palma aceitera, se propone manejar 10 parcelas de aprendizaje de 1 ha cada una.

4.5.1 Parcelas de Aprendizaje café

Unidad de medida: Actas/parcela

Meta: 20

4.5.2 Parcelas de Aprendizaje palma aceitera

Unidad de medida: Actas/parcela

Meta: 10

4.6 Desarrollo de las Metodologías de Aprendizaje.

4.6.1 Desarrollo de la Sesión.

Se dará inicio la implementación de las Escuelas de Campo, en el cual se desarrollará la primera sesión, etapa donde se definirá, el nombre de la Eca, la Determinación de la Currícula, las Reglas de Juego. Como parte de la primera sesión se aplicará una prueba de entrada a los agricultores, con la finalidad de tener un diagnóstico del nivel de conocimiento técnico de cada una de los agricultores, con respecto al manejo de sus cultivos.

ECA 1
10 Sesiones
25 o 20 capacitados

* Carga por extensionista

Para el cumplimiento de las sesiones de las ECA's, cada extensionista conducirá 1 Escuela de Campo y con una sesión mensual. Las sesiones serán programadas en coordinación con los agricultores. En resumen cada Extensionista tanto de café y palma aceitera tendrá como meta 10 sesiones.

Como parte de la motivación a la asistencia a las Escuelas de campo se otorgara a todos los participantes un kit de herramientas (machete y lima), así como, a los participantes sobresalientes se les entregara algunos equipos y herramientas de más valor.

Unidad de Mediad: Actas Sesiones de Ecas.

Meta: 80.



4.6.2 Pasantías Interregionales:

Se llevarán a cabo 2 pasantías, hacia lugares exitosos donde los cultivos de café y palma aceitera están bien desarrollados; En esta oportunidad, se visitara las plantaciones de café de la zona de La Merced y Villa Rica y las plantaciones de Palmas de Shanusi en Yurimaguas para el caso de Palma Aceitera.

Unidad de medida: Informes

Meta: 2.

4.6.3 Asistencia Técnica (visitas de campo).

Para el caso de la asistencia técnica, se tendrá como meta anual 4700 visitas (3300 para el caso de café y 1400 para palma aceitera). Esta labor estará a cargo de 8 Extensionistas (6 café y 2 palma aceitera) y 4 promotores.

META POR EXTENSIONISTA:



Mes				Total/Mes	Total/año
Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4		
Asistencia Técnica Café				55	550
15 visitas	15 visitas	15 visitas	10 visitas	agricultores asistidos	agricultores asistidos

Mes				Total/Mes	Total/año
Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4		
Asistencia Técnica palma aceitera				70	700
20 visitas	20 visitas	20 visitas	10 visitas	agricultores asistidos	agricultores asistidos

Unidad de Mediad: Informes/Fichas de visitas técnicas.

Meta: 4700

4.6.4 Fortalecimiento Organizacional:

En esta etapa de la Actividad, se considera ejecutar un plan de fortalecimiento a la Organizaciones cafetaleras entre las que destaca la Cooperativa Agraria Cafetalera Cordillera Azul. El plan a ejecutar se basara en la capacitación y sensibilización a los productores cafetaleros a fin de que ellos opten por asociarse en una organización cooperativa.

El tiempo programado para la ejecución de esta labor es de 2 meses, mediante una consultoría por persona natural.

Unidad de Mediad: Informe

Meta: 1

4.7 Graduación.

Para la graduación de los participantes se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

- | | |
|---|-----|
| 1. Adopción de tecnología aplicadas en su parcela | 20% |
| 2. Prueba de caja | 30% |
| 3. Asistencia a las sesiones de Escuelas de Campo | 50% |



4.7.1 Prueba de Caja.

Se realizará las pruebas de cajas, a todos los Agricultores de las Ecas para determinar el nivel logrado del aprendizaje.

En estas pruebas de caja, se escogerán de 20 a 25 preguntas de los diversos temas tratados en las sesiones.

Unidad de Medida: Pruebas.

Meta: 200

4.7.2 Entrega de Certificados (participantes).

En la clausura, se les otorgará un certificado de reconocimiento a los Agricultores (personas capacitadas) participantes de la Ecas, que lograron graduarse, en mérito al desarrollo de su conocimiento participación y puesta en práctica en el manejo de sus parcelas productivas.

Unidad de medida: Certificados.

Meta: 120

4.8 Supervisión:

Se bien es cierto dentro del POA no se considera a un Supervisor, sin embargo esta labor lo realizara el Coordinador en conjunto con funcionarios de GEDES de la MPPA y DEVIDA, quienes evaluarán el grado de avance de los resultados esperados. Esta acción permitirá identificar oportunamente las debilidades y/o problemas para aplicar los correctivos oportunos y poder lograr el cumplimiento de las metas y el desarrollo de los procesos.

Unidad de medida: Informes

Meta: 10



5. FASE: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.

Esta actividad comprende los siguientes pasos:

5.1 Difusión de Spot Radiales

Se contratara a medios de comunicación radial más sintonizados por los agricultores, las mismas que nos servirán para difundir los spots de la actividad y dar a conocer con mayor impacto el desarrollo y avance de la actividad.

Igualmente, a través de espacios radiales se difundirán los avances de las Escuelas de Campo, pasantías, eventos de capacitación y convocatorias a las

mismas. El responsable de esta acción es el Coordinador de la Actividad con el apoyo del personal, para ello participará constantemente en las Ecas para obtener testimonio de los participantes y las experiencias y logros que se vienen obteniendo.

Previamente se contratara un medio de radiodifusión para que nos elabore los spots publicitarios .Se tendrá en cuenta la identidad cultural y social de los beneficiarios de las zonas de intervención.

Unidad de medida: informes

Meta: 03

V. Programación de metas físicas y Financieras.

5.1 Programación de Metas Físicas.

5.2 Programación de Metas Financieras.



FORMATO N° 1
METAS FISICAS - 2015

Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Padre Abad

Programa Presupuestal: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"

Resultado Específico: Lograr el cambio de actitud de personas

Producto: Familias incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible

Actividad : "Capacitación y Asistencia Técnica en buenas practicas de produccion agraria" (a Productores de Café y Palma Aceritera en el Distrito de Padre Abad-Provincia de Padre Abad-Región Ucayali.

Cod. (1)	Actividad/Tareas (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Mensualizada (4)												Meta Anual (5)	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	ECAS															
	FAMILIAS ASISTIDAS	Familias														500
1.	FASE DE SELECCIÓN DEL EQUIPO TECNICO															
	1.1 Selección del Equipo Tecnico de la Actividad	informes			1											1
2.	FASE DE FORMACION DE FACILITADORES															
	2.1 Reforzamiento de Facilitadores de Ecas	informes			1											1
3.	FASE DE PLANIFICACION Y DRGANIZACIÓN															
	3.1 Reuniones de coordinacion y concertacion comunal	Actas			32											32
	FASE DE EJECUCION (IMPLEMENTACION)															
	4.1 Sinceramiento de grupos	Informes			1											1
	4.2 Determinación del contenido tecnico (Determinación de la curricula)	informes			1											1
	4.3 Instalación de 200 ha de café (variedades resistentes)															
	4.3.1 Instalación de germinadores	Germinadores				100	100									200
	4.3.2 Instalación de viveros	Viveros							100	100						200
	4.3.3 Instalación a campo definitivo	Parcelas												50	150	200
	4.4 Mantenimiento de 260 ha de café															
	4.4.1 Primer abonamiento	Actas				340										340
	4.4.2 Segundo abonamiento	Actas							340							340
	4.4.3 Tercer abonamiento	Actas											340			340
	4.5 Establecimiento de Parcelas de Aprendizaje															
	4.5.1 Café	Actas/Parcelas				20										20
	4.5.2 Palma aceitera	Actas/Parcelas				10										10
	4.6 Desarrollo de la metodología de campo															
	4.6.1 Desarrollo de las Escuelas de Campo	Sesiones				8	8	10	10	10	10	9	9	6		80
	4.6.2 Pasantías	Pasantia					1			1						2
	4.6.3 Asistencia Técnica (visitas de campo)	Visitas tecnicas				470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	4700
	4.6.3.1 Café					330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3300
	4.6.3.2 palma					140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1400
	4.6.4 Fortalecimiento Organizacional (consultoria)	Informe									1					1
	4.7 Graduación															
	4.7.1 Prueba de caja	Pruebas													200	200
	4.7.2 Entrega de certificados	Certificados													120	120
	4.8 Supervisión															
	4.8.1 Informe de supervisión	Inbrme				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
5.	MEDIDS DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD															
	5.1 Difusión de Spots radiales	informes					1		1			1		1		4



"Capacitación y Asistencia Técnica en buenas prácticas de producción agraria (a Productores de Café y Palma Aceitera, en el Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Región Ucayali) - 2015

**FORMATO N° 3
METAS FINANCIERAS - 2015**

Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Padre Abad

Programa Presupuestal: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"

Resultado Específico: Lograr el cambio de actitud de personas

Producto: Familias incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible

Actividad : "Capacitación y Asistencia Técnica en buenas practicas de producción agraria" (a Productores de Café y Palma Acentera en el Distrito de Padre Abad-Provincia de Padre Abad-Región Ucayali)

Generica de Gasto (1)	META MENSUALIZADA (Nuevos Soles) (3)															Meta Anual (4) S/.
	Sub Generica de Gasto (2)		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Codigo	NOMBRE														
2.3.1	1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	-	-	-	1,400.00	1,400.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,575.00	1,575.00	1,050.00	14,000.00	
	3.1.1	Combustibles y carburantes	-	-	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	25,200.00	
	5.1.2	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	-	-	9,336.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,336.00	
	5.31	Aseo, Limpieza y Tocador	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	
	99.1.1	Herramientas	-	-	-	26,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26,260.00	
	99.1.99	Otros Bienes	-	-	3,650.00	33,600.00	-	-	-	-	-	-	-	10,810.00	48,060.00	
	10.1.4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y similares	-	-	-	119,695.00	24,600.00	-	-	-	-	-	-	-	144,295.00	
2.3.2	1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	-	-	-	-	1,750.00	100.00	-	750.00	100.00	100.00	-	-	2,800.00	
	1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	-	-	-	-	2,660.00	200.00	-	1,335.00	200.00	200.00	-	-	4,595.00	
	2.2.3	Servicio de internet	-	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,500.00	
	2.4.2	Otros servicios de publicidad	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00	
	5.1.1	De Edificios y Estructuras	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	7.3.2	Realizado por Persona Natural	-	-	5,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	11,000.00	
	7.11.99	Servicios diversos	-	-	800.00	8,650.00	20,660.00	800.00	1,500.00	13,470.00	1,550.00	800.00	800.00	8,360.00	57,390.00	
	8.1.1	Contratos Administrativos de Servicios	-	-	39,300.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	43,500.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	43,500.00	401,400.00	
	8.1.2	Contrataciones a ESSALUD DE C.A.S. (14)	-	-	1,436.40	1,436.40	1,436.40	1,436.40	1,436.40	1,436.40	1,436.40	1,436.40	1,436.40	1,436.40	14,364.00	
	2.6.6	1.1.7	Semillas y almacigos	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	
	TOTAL		-	-	88,092.40	234,111.40	96,576.40	47,356.40	55,956.40	64,811.40	49,106.40	47,181.40	58,691.40	58,116.40	800,000.00	



60000
