


PROYECTO RENIEC - BID



“Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”

***Seguimiento del Proyecto
al 05 de enero del 2024***

Programación y Ejecución de Inversiones 2023 (Millones S/)

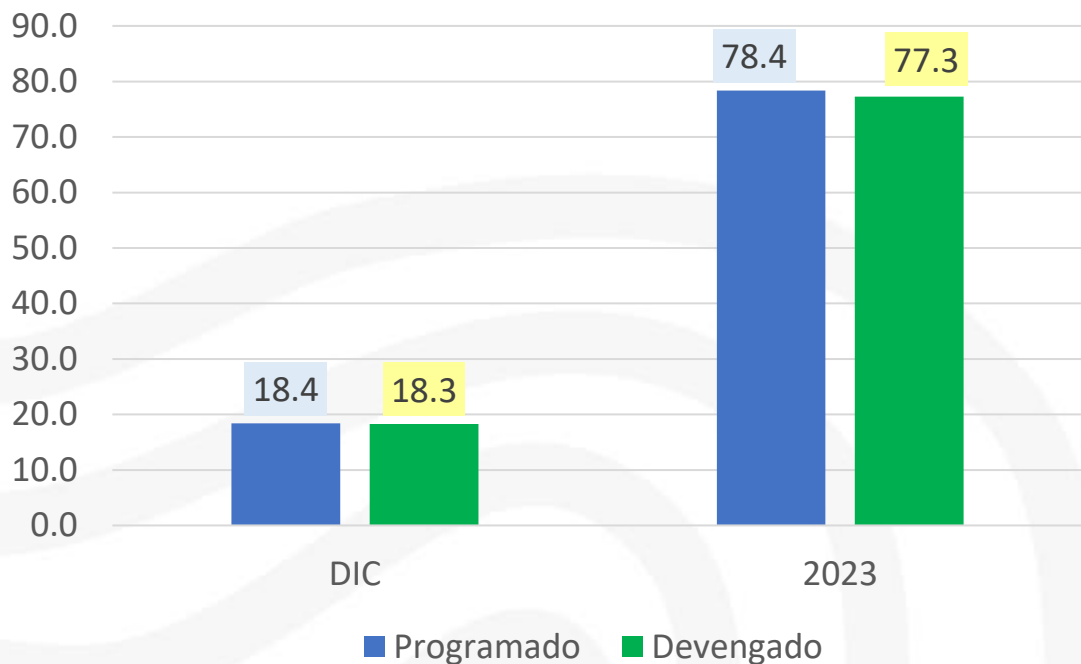


DICIEMBRE	
Programado	S/18.36
Ejecución	S/18.30
Avance	99.7%

PIM	S/78.4
Ejecutado	S/77.3
Avance	98.6%

PROD	UO	Detalle	Proy. Diciembre	Devengado Diciembre
P1	DRC	Consultores Asistencia Técnica OREC	0.02	0.02
P3	DRC	Digitalización de actas, consultores inspección del digitalización y depuración de actas registrales, pasajes	6.73	5.53
P4	DSR	Acondicionamiento oficinas, supervisor eléctrico	0.04	0.00
P5	DSR	Adecuaciones de oficinas y supervisión	1.06	1.07
P6	DSR	Adquisición de PVM, bienes para instalaciones PVM, elaboración EETT adecuaciones y consultores analistas sistemas	0.09	0.09
P9	DRI	Adecuación oficinas, anticipo y entrega de equipos de impresoras 200 DNle, supervisión	4.57	6.53
P11	OFCl	Consultoría enfoque intercultural, software y membresías	0.07	0.08
P13	DRC	Consultorías para delegación de funciones registrales, pasajes y viáticos	0.30	0.27
P14	DRIAS	Consultores ATI, viajes, adquisición de laptops y computadoras, conectividad.	0.67	0.60
P15	DRIAS	Consultores asistencia técnica registral	0.34	0.34
P16	DRC	Asistentes administrativo, de campo y de intervención remota, pasajes, software, impresión Compendio de Registro Civil Bilingüe.	0.31	0.11
P17	OTI	Gestor de impresoras, Plataforma gestión de contenidos, Consultores de Arquitectura y especialistas en gestión de proy. Tecnológicos	0.82	0.26
P18	OTI	Especialista en Estadística, sistema de información gerencial.	0.12	0.12
P20	OTI	Seguridad Networking	2.58	2.58
P21	OTI	Jefe de Proyectos, Sistema de citas, Chatbot	0.23	0.24
S/P		Gestión del proyecto	0.41	0.48
Total			18.36	18.30

EJECUCIÓN 2023 Vs POA 2023

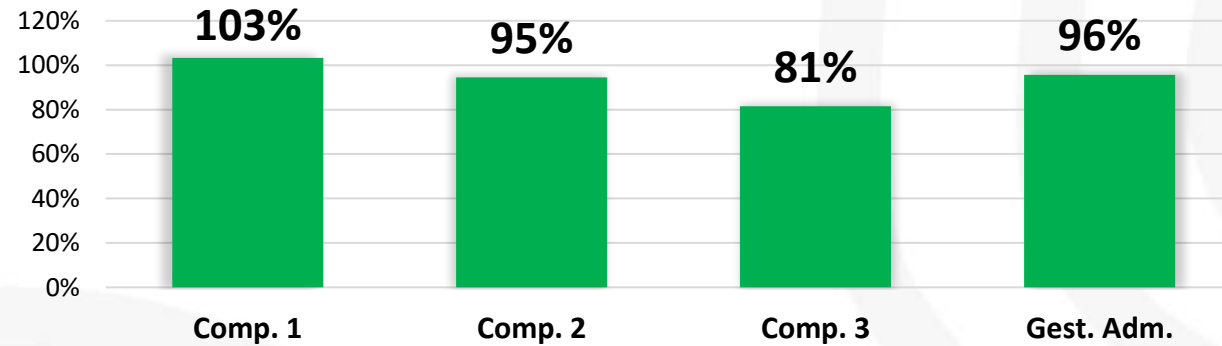

COMPONENTE 3: PAGOS QUE SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2024


CONCEPTO	PROD	MONTO
Implementación del Sistema de Citas	P21	198,885.66
Implementación del software de gestión de impresión del dne para el RENIEC	P17	1,103,685.41
Servicio de aprovisionamiento de plataforma de gestión de contenidos digitales con inteligencia artificial (asistente integral - chatbot) en la nube, modo paas	P17 P21	906,348.40
Implementación de RENIEC con redes internas seguras para el soporte informático	P20	1,288,891.34
TOTAL		3,497,810.81

COMPONENTE 3: PAGOS QUE SE INCREMENTARON EN EL AÑO 2023

CONCEPTO	PROD	MONTO
Adquisición de una arquitectura de firewalls de siguiente generación para segmentación y protección de la red interna del RENIEC	P20	1,287,959.00
TOTAL		1,287,959.00

EJECUCIÓN 2018 AL 2023


(MILLONES DE SOLES)

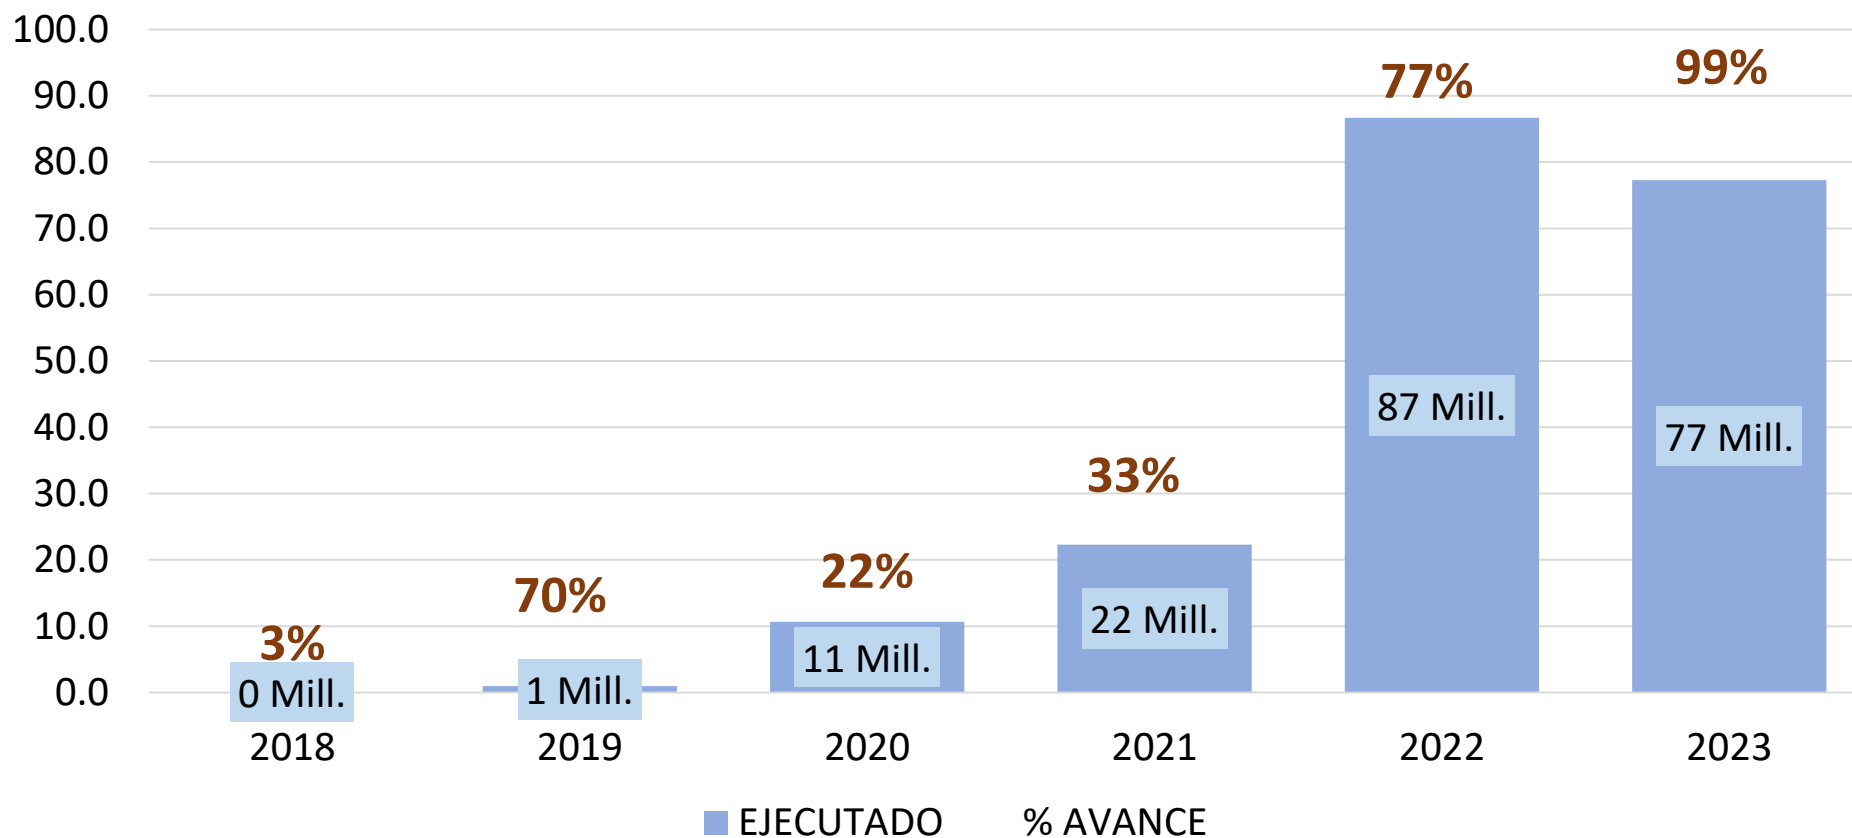

RENIEC
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

% Ejecución respecto al PIM

PROGRAMACION ANUAL 2024 (Millones de Soles)

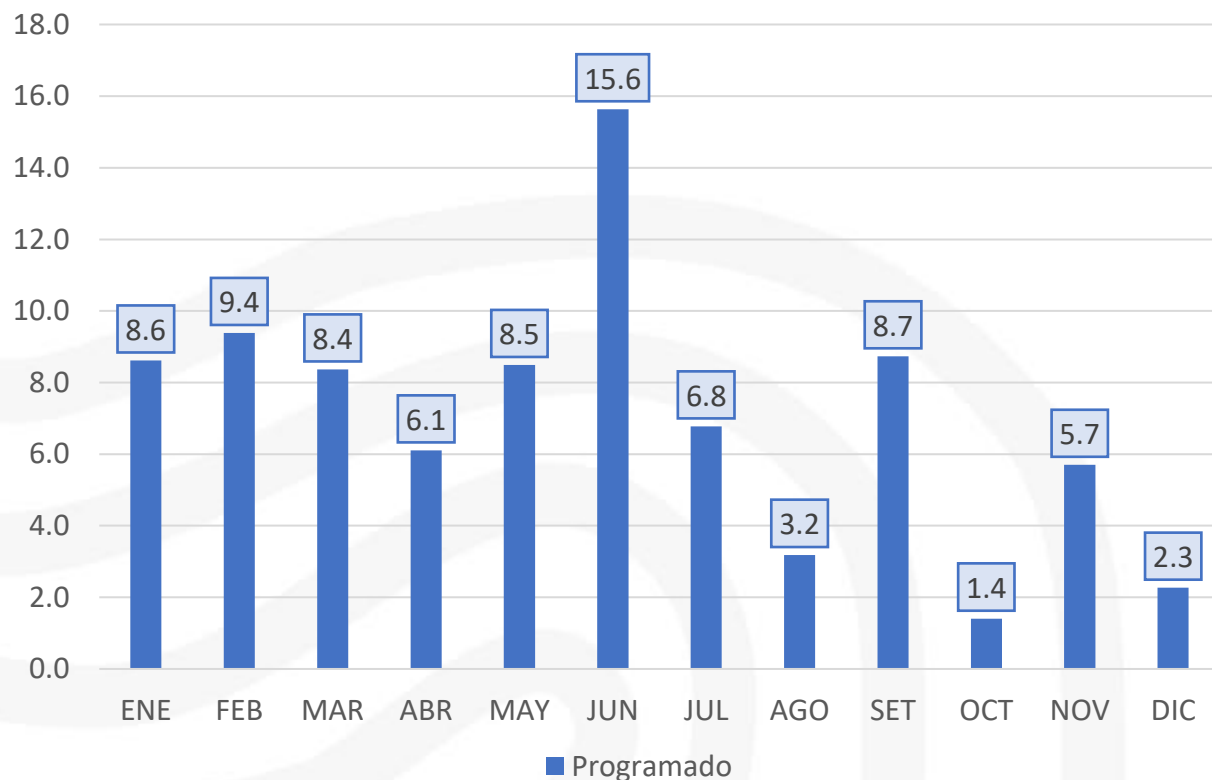

PIA (*)

S/84.5

(*) Excluye S/ 7.5 millones de ROOC cuya ejecución se adelantó al 2023.

PROD	UO	Detalle	Prog. Enero
P1	DRC	Consultores Asistencia Técnica OREC	0.02
P3	DRC	Digitalización de actas, consultores inspección del digitalización y depuración de actas registrales, pasajes	3.97
P5	DSR	Supervisión adecuación oficinas	0.01
P6	DSR	Elaboración EETT adecuaciones para PVM	0.01
P9	DRI	Adecuación oficinas, entrega de equipos de impresoras 200 DNle, supervisión	2.43
P11	OFCI	Consultoría diseño instruccional, consultoría diseño estructura pedagógica (MOOC)	0.02
P13	DRC	Consultorías para delegación de funciones registrales	0.13
P14	DRIAS	Consultores ATI, conectividad.	0.19
P15	DRIAS	Consultores asistencia técnica registral	0.22
P16	DRC	Asistentes administrativo, de campo y de intervención remota, pasajes, software, impresión Compendio de Registro Civil Bilingüe.	0.11
P17	OTI	Plataforma gestión de contenidos, Consultores de Arquitectura y especialistas en gestión de proy. Tecnológicos	0.52
P18	OTI	Especialista en Estadística, sistema de información gerencial.	0.12
P21	OTI	Jefe de Proyectos, Chatbot	0.46
S/P		Gestión del proyecto	0.40
Total			8.61

PRINCIPALES CONTRATOS VIGENTES 2024

N°	Prod	Actividad	Proveedor	Programación 2024
1	P3	Contrato N° 019-2022-GG/MCSR Procesamiento de actas registrales para la digitalización	INETUM	28,625,275
2	P9	Contrato N° 228-2023-GG/MCSR Adquisición de equipos de impresión para DNle para 04 centros de impresión	ZONDA	13,767,807
3	P17 P21	Contrato N° 220-2023-GG/MCSR Aprovechamiento de Plataforma de Plataforma de Gestión de Contenidos Digitales con Inteligencia Artificial (Asistente Integral – Chatbot) en la nube, en modo PaaS.	VASS	4,044,925
4	P9	Contratos varios Acondicionamiento para protección eléctrica de los Centros de Impresión en las Oficinas Registrales del RENIEC (13 OR)	VICLEVI & GESINCOP / GEEEC / INFALCO	2,391,187
5	P6	Contrato N° 026-2022-GG/MCSR Adquisición de equipos PVM	HIPER	2,079,720
6	P20	Contrato n° 273-2023-GG/MCSR Adquisición de arquitectura de firewalls de siguiente generación para segmentación y protección de la red interna de RENIEC	IMPERIA	1,719,454
TOTAL				52,628,370

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

N°	Prod	Actividad	Fecha estimada de firma de contrato	Programación 2024
7	P17	SBCC 001-2023-MCSR Implementación de un modelo de Gobierno de tecnología de la información en el marco del Framework COBIT 2019 para el RENIEC	19/03/2024	2,426,080
TOTAL				2,426,080

POR INICIAR

N°	Prod	Actividad	Programación 2024
8	P17	Implementación del SIIRC (Implementación y puesta en marcha)	11,102,499.25
9	P9	Adecuación para 03 Centros de Servicios para implementar Impresoras de 200 DNle/h (Lima (02) y Arequipa (01))	1,080,000.01
10	P10	Campañas de sensibilización a ciudadanos	700,000.00
TOTAL			12,882,499.26

COMPONENTE 1

ADECUADA COBERTURA DE LOS

SERVICIOS PRESENCIALES

Producto	Actividad	Proveedor	Estado situacional	Hitos
P01 OREC con Acta y Ficha implementada	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DRC)			
	Consultores para Acta y Ficha (06)		9no y último entregable deberá ser presentado el 04/01/24	Entregable 9: 04/01/24
P03 Actas registrales digitalizadas	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DRC)			
	Digitalización de Actas registrales	INETUM ESPAÑA	<p>Entregable 12 (Dic) Se realizó la entrega de 1,287,223.00 actas registrales microformadas, alcanzando un devengado por S/ 5,321,432.48.</p> <p>En el año 2023, se han digitalizado 6,591,098 actas registrales (incluyendo el piloto).</p> <p>Entregable 13 (Ene24) El 24/01/24 se espera recibir el informe con 910,000 actas registrales microformadas, con lo cual se estaría devengando un total de S/ 3.76 Mills.</p>	
	Depuración	Consultores varios (41)	<p>01 Coordinador Registral – 02 Asignadores - 02 Asistentes legales – 02 supervisores – 34 Calificadores de Títulos Consultores vienen realizando la presentación de su Entregable 11.</p>	

Producto	Actividad	Proveedor	Estado situacional	Hitos
P6. PVM instaladas y configuradas	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DSR)			
	Adquisición de 21 PVM duales	HIPER	<p>Equipos PVM (HIPER)</p> <p>Se cuentan con 03 PVM en los almacenes de HIPER (3 meses)</p> <p>Se viene gestionando la Adenda n° 09 al contrato, para incorporar el desarrollo de 04 funcionalidades adicionales que deben tener las PVM, cuya ejecución de debería realizar con la Fase 2 del software (2024)</p> <p><i>A la fecha, se cuenta con las 21 PVM transferidas al RENIEC</i></p>	
			<p>Software (HIPER). Entregable 5 (FASE 2)</p> <p>Con fecha 03/01/24 se realizó la revisión del Plan de Trabajo actualizado.</p> <p>HIPER ha solicitado ampliación de plazo para el desarrollo del software Fase 2 por 112 días adicionales porque ese es el plazo adicional que ha incurrido OTI para culminar el Back End (desde el 25/08); lo cual postergaría la culminación de la Fase 2 del 22/02/24 al 11/06/24. Esta información se remitió a OTI mediante Oficio N° 817-2023 del 01/12, para su pronunciamiento.</p>	Entregable 5 de Software (Fase 2): 11/06/24 (266 días calendarios posteriores más 112 días calendarios solicitadas por HIPER)
Expedientes técnicos para ubicaciones de PVM	KTL Project and Consulting Group	Se notificó a KTL para dar inicio a la ejecución de los últimos 09 expedientes, a partir del 04/01/24. E1: 09/01/24		

Producto	Actividad	Proveedor	Estado situacional
P4 Ventanilla del RENIEC implementada	Acondicionamiento de Oficinas y adquisición de mobiliario	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DSR)	
		VICLEVI	Item 2 (OR Trujillo I y II, Alto Trujillo y El Porvenir) E2 con conformidad del 27/12, culminado.
		VICLEVI	Item 7 (OR Tambopata); E2 con conformidad del 28/12, culminado. Item 8 (OR Cusco); E2 con conformidad del del 28/12, culminado.
		ACTIVIDADES EN ACTOS PREVIOS	
		Item 3 (Sullana): Se requiere conocer la nueva dirección del local para proceder con una nueva convocatoria.. Pendiente la respuesta al Oficio n° 615-2023 del 26/09, solicitando la ratificación o actualización de TDR	
P05 Oficinas acondicionadas térmicamente	Implementación de sistema de climatización en oficinas	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DSR)	
		VADIEL	CP 002 (S JL, Puente Piedra, Villa el Salvador, Belén y Tambopata) E2 culminado el 20/12, con conformidad del 22/12. adecuaciones culminadas. E3 deberá ser culminado el 21/03/24.
			CP 003 (Leonardo Ortiz, Lambayeque, Alto Trujillo, El Porvenir y Rioja) E2 culminado el 22/12, con conformidad del 26/12, adecuaciones culminadas. E3 deberá ser culminado el 25/03/24.
			CP 004 (Islay, Ilo y Tacna) E1 presentado y con conformidad del 18/12. E2 deberá ser culminado el 06/02/24

Productiva	Actividad	Proveedor	Estado situacional	HITOS
P09 Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
	Adquisición de impresoras 200DNIe/h	ZONDA - MÁXIMA	Diciembre: Se devengó S/ 4.03 por el pago del anticipo (20%) 1ra entrega; con fecha 28/12 se recibieron 02 impresoras, cuya conformidad se otorgó el 29/12, logrando el devengado por S/ 2.39. 2da entrega: con fecha 12/01/24 se recibirán las 02 impresoras restantes.	Entrega de impresoras (100 días): 12/01/24
	ACTIVIDADES EN ACTOS PREVIOS			
	Adecuación de ambientes para implementación de impresoras		Con fecha 20/12 se recibieron los TdR (solamente para la sala de personalización), en proceso de revisión para dar inicio a la indagación de mercado, a partir de 05/01/24.	
	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
	Acondicionamiento para protección eléctrica	VICLEVI - GESINCOP	OR Huánuco, OR Pucallpa, OR Cajamarca y OR Jaén E2 (Adecuaciones), se amplió el plazo por 20 días, siendo la nueva fecha el 12/01/24. OR Ica y OR Trujillo II E2 (Adecuaciones), el proveedor solicitó ampliación de plazo de 15 días útiles, en evaluación por el ETT. OR Santa y OR Chiclayo E2 (Santa) deberá ser presentado el 02/02/24 E2 (Chiclayo) deberá ser presentado el 15/02/24. OR San Román E1 con conformidad del 03/01/04. E2 deberá culminarse el 22/02/24	
			GEEEC	OR Iquitos : E2 (Adecuaciones), deberá ser presentado el 24/01/24
			INFALCO	OR Huamanga : E2 (Adecuaciones), deberá ser presentado el 23/01/24
	ACTIVIDADES EN PROCESO DE CONTRATACIÓN			
	Acondicionamiento para protección eléctrica		OR Trujillo I: Con fecha 21/12 se recibió la No Objeción del BID al TdR. En actos previos para la nueva convocatoria.	

Producto	Actividad	Proveedor	Estado situacional
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
P11. Funcionarios de Centros de Servicio RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	Servicio de diseño, diagramación e impresión de los cursos integrales	IAKOB	E1 (Diseño, diagramación de machotes), presentado el 14/11, con conformidad del 12/12. E2 (Impresiones) presentado el 22/12, con conformidad del 28/12, devengado y culminado.
	Servicio de diseño instruccional de los cursos en la línea de Registro Civil		E6 , deberá ser presentado el 05/01.
	Servicio de diseño instruccional y de contenidos para cursos MOOC		Contrato suscrito el 21/12 Entregable 1 , presentado el 27/12, con conformidad del 28/12. Entregable 2 , deberá ser presentado el 19/01/24
	Adquisición de Membresías		Zoom Business // Adobe Creative Cloud // Miro // Doodly : todos entregados y devengados.
ACTIVIDADES EN PROCESO DE CONTRATACIÓN			
Producción de Contenidos y Recursos Audiovisuales para Curso MOOC La elaboración del TdR tomará como insumo el diseño aprobado en el servicio de diseño instruccional para cursos MOOC. Servicio de instalación, configuración, alojamiento, mantenimiento y asistencia técnica para una plataforma e-learning El servicio se dividió en 2 partes; la 1ra, para contratación de un especialista que elabore el TdR y para soporte y apoyo en la revisión de los entregables y la 2da, para la actualización de la plataforma e-learning actual.			
P12. Gestión del Cambio Cultural	(01) Coordinador de proyectos; (01) Especialista en cultura organizacional; (01) Especialista en comunicación interna y (01) Especialista en diseño gráfico. El CEA recomendó la adjudicación al Especialista en cultura organizacional. Se viene evaluando las 3 posiciones restantes.		

COMPONENTE 2

MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A

POBLACIÓN VULNERABLE

Producto	Actividad	Proveedor	Estado situacional
P13 CCNN con servicios delegados	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DRC)		
	Consultores de campo (21) Consultores de gabinete (05)	Consultores varios	<p>227 CCNN intervenidas - (55% avance de 412). 194 CCNN con funciones delegadas (47.1%) y 33 con expediente técnico en proceso de resolución (8%)*.</p> <p>* Pendientes desde el 28/11/23 (37 días).</p> <p>09 equipos saliendo a campo el 04/01 // 01 equipo saldrá a campo el 10/01 // 01 equipo saldrá a campo el 12/01</p> <p>Con este viaje se prevé intervenir en 33 CCNN.</p>
P16 Registro civil bilingüe en comunidades nativas y centros poblados	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DRC)		
	Asistentes de campo (14), Intervención remota (01) y Asistentes administrativos (02) /Analistas informáticos (04)	Consultores varios	<p>Avance 108.2% de OREC implementadas 541 OREC implementadas: 384 OREC (presencial) y 157 (remota) – (de 500)</p> <p>Se han solicitado las actas de implementación, a fin de que la UE cuente con un archivo con evidencias del cumplimiento de metas.</p>
	Diseño, diagramación e impresión de libro RENIEC al rescate de las lenguas originarias		E3 (impresiones) plazo ampliado hasta el 08/01/24.
	Aplicativos informáticos		<p>Se vienen desarrollando los siguientes aplicativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema de Gestión de RRCC al 92% de desarrollo. Sutichay Wawa al 92% de desarrollo Registro Digital de Nacimiento al 66% de desarrollo Portal del Registrador Civil al 8% de desarrollo

Producto	Actividad	Proveedor	Estado situacional
P14 Unidades Itinerantes Equipadas	Conectividad	DOLPHIN MOBILE	2do entregable (2do pago de 100 simcard) y 3er pago (101 simcard), en conformidad de OTI.
	Habilitación del funcionamiento de las tablets		Se han detectado 03 situaciones adversas: Calentamiento de tablets, lápiz óptico se descarga rápidamente (se recibió nuevo brochure con nuevo modelo de lápiz) y las licencias deben ser renovadas manualmente (se realizará un webinar para capacitar a personal de OTI). Se viene coordinando con el proveedor.
	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
	Consultores para ATI (25)		Campañas realizadas: 106 // Trámites con tablets: 571 25 consultores para ATI, activos.
	Adquisición de laptops (30)	MUR TECNOLOGÍA	Equipos entregados en su totalidad (Dic23) y están en proceso de transferencia.
	Adquisición de All In One (51)	REDCOM S.A.C.	
	Adquisición de Sillas (110)	VICLEVI	
	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	Seguimiento – Base de datos automatizado		SCC 001-2023-MCSR En culminación de la evaluación con el área técnica (OTI).
	Expedientes Técnicos para acondicionamiento OR Cajamarca		CP 031-2023-MCSR Se cuenta con TdR actualizado para consensuar con USGCP.
P15 Asistencia Técnica Registral	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
Consultores para ATR (24)		1ra visita: avance 99.3% - (1530 de 1541 OREC) 2da visita (fortalecimiento): avance 93% - (1432 de 1541 OREC) 24 consultores para ATR en ejecución.	

COMPONENTE 3 INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Producto	Actividad	Proveedor	Estado situacional	Hitos
<p>P17 Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIIRC) Implementado</p>	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DRI)			
	Gestor de Impresoras	INETUM ESPAÑA	<p>Pendiente para conformidad al E3: La DRI solicitó la opinión técnica de OTI (desde el 11/12) respecto a la propuesta de formatos de reportes del proveedor.</p> <p>Pendiente para conformidad al E4, respecto a la obtención del logs: IXLA: se mantienen las coordinaciones para que remita las cotización para la obtención de los logs HDI: se mantienen las coordinaciones para que remita las cotización para la obtención de los logs</p> <p>Proveedor remitió carta de respuesta a las pruebas de SP 6 y 7, se envió los Oficios xxx y zzz a DRI y OTI para revisión y opinión.</p> <p>Se realizó reunión 04/01 participaron DRI,OTI y UE02 para coordinar la respuesta al documento de formatos de reportes, se acordó dar continuidad al servicio y OTI realizará el análisis a los formatos de los reportes con el log de la impresora MATICA (08/01) y con ello responder al proveedor.</p>	<p>Pago E3-E4 US\$ 0.14</p> <p>Pago E5-E6 US\$ 0.04</p>
	ACTIVIDADES EN PROCESO DE CONTRATACIÓN			
	Gobierno Corporativo de TI para la OTI	<p>SBCC 001-2023-MCSR Con fecha 18/12 se solicitó la No Objeción al Informe de evaluación de expresiones de interés y Lista Corta.</p>		
	ACTIVIDADES EN ACTOS PREVIOS			
Sistema Integrado de Identificación y Registros Civiles (SIIRC)	<p>Sistema Integrado de Identificación y Registros Civiles (SIIRC) TdR de 06 procesos misionales, en indagación de mercado. A la espera que INSPIRA IT, ORACLE, VASS, TTS-TATA y SOAINT, remitan sus propuestas.</p> <p>Consultores SIIRC, vienen trabajando en la nueva propuesta de TdR bajo la nueva estrategia de implementación por etapas: análisis de diseño, implementación y migración de datos. Primer TDR para la segunda semana de enero.</p>			


Producto	Actividad	Proveedor	Estado situacional	Hitos
P18 RENIEC con sistema de información gerencial	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – OPP)			
	Sistema de Información Gerencial	PRAYAGA	E3: el proveedor adelantó su entregable para el 19/12, con conformidad del ETT del 21/12. E4: deberá ser presentado el 10/01/24	E4 – Ad 03: 10/01/24 S/ 0.12 Mills
P19 PIDE en funcionamiento	ACTOS PREVIOS			
	Documento Equivalente		Con fecha 01/12 se remitió el Oficio n° 814-2023 a la OTI solicitando la propuesta de TdR y Documento Equivalente para la PIDE.	
P21 Servicios en línea ofrecidos	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DSR)			
	Gestor de Citas	SOAINT PERÚ	8vo entregable: presentado el 11/08, pendiente la aceptación del entregable y la revisión respectiva por el ETT. Proveedor presento respuesta el 26/12 a las observaciones funcionales y técnicas, se remitió el 27/12 a las áreas DSR y OTI con los Oficios 869 y 868. DSR respondió con fecha 03/01, indicando realizar una reunión con OTI para revisar la propuesta de plan de actividades y sincerar los tiempos para la puesta en producción. Pendiente de respuesta de OTI.	8vo Ent.: 11/08/23 Pago: S/ 0.19 Mills
P17 y P21 Plataforma de contenidos digitales y Chatbot	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – OCP)			
	Plataforma de contenidos digitales - Chatbot	VASS PERÚ	E2 presentado el 12/11, con conformidad del 19/12. E3 deberá ser presentado 18/01/24	3er Ent: 12/11/23 Pago: S/ 0.91 Mills
P20 Equipamiento de Hardware y Software de base para el SIIRC	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – OTI)			
	Seguridad de Networking	IMPERIA	Con fecha 18/11 se adelantó la entrega de los equipos, cuya conformidad se dio el 19/12, en proceso de pago. E1 (Plan de Trabajo) presentado el 14/12, con conformidad del 19/12. E2 (Plan de Pruebas) presentado el 29/12, con conformidad del 29/12. E3 (Ejecución de Plan de Trabajo) se deberá presentar el 12/04.	



PROD	Unidad Organica	Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
P01	DRC	Asistencia ORECs	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P03	DRC	Digitalización Actas, Racks, adq. equipos informáticos, consult. legales.	3.97	4.18	5.16	3.87	4.80	3.41	0.82	0.01	4.77	0.00	0.00	0.00
P04	DSR	Mobiliario OR Sullana	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P05	DSR	Equipos de climatización y servicio técnico	0.01	0.32	0.05	0.02	0.00	0.04	0.01	0.00	0.04	0.01	0.00	0.10
P06	DSR	EETT y adecuaciones PVM, desarrollo informático PVM	0.01	0.04	0.00	0.07	0.00	0.56	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P09	DRI	Adquisición impresoras, adecuaciones, supervisión	2.43	2.20	0.99	0.06	0.00	10.37	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P10	OFCI	Elaboración Doc Equiv., Campañas sensibilización al ciudadano	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00
P11	OFCI	Consultorías diseño cursos y elaboración contenidos	0.02	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
P12	OPP-OPH	Consultores gest. Cambio	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	DRC	Consultorías nuevas OREC,	0.13	0.21	0.30	0.13	0.16	0.24	0.22	0.21	0.12	0.00	0.00	0.00
P14	DRIAS	Consultores enfoque transversal, consultor .Net, bienes, Exp. Téc. Sedes, Conectividad	0.19	0.28	0.16	0.32	0.29	0.14	0.10	0.05	0.54	0.23	0.27	0.00
P15	DRIAS	Asistencia técnica a OREC, impresión de formatos, bienes	0.22	0.15	0.08	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P16	DRC	Lingüistas, programadores, impresión formatos, Equipos informáticos, bienes	0.11	0.18	0.11	0.23	0.22	0.09	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00
P17	OPP-OPH / OTI-DRI / OTI / OTI-OCP	Gestor de Impresoras, Portal Web, Gob. Corp OTI, Consultores y SIIRC	0.52	0.51	0.81	0.23	0.83	0.39	1.69	2.14	2.24	0.73	4.84	1.75
P18	OTI	Sist Inf Gerencial	0.12	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P19	OTI	Elaboración Doc Equiv., implementación	0.00	0.01	0.01	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P20	OTI	Equipamiento de hardware y software de base	0.00	0.10	0.00	0.43	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P21	OTI-DSR / OTI-OCP	Sist. Citas, Chatbot, Jefe proyectos	0.46	0.66	0.23	0.22	0.45	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
Subtotal			8.21	8.99	7.97	5.71	8.10	15.24	6.28	2.79	8.18	0.99	5.22	1.88

GASTO OPERATIVO			0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.50	0.39	0.55	0.41	0.48	0.39
Total			8.61	9.38	8.36	6.10	8.49	15.63	6.77	3.18	8.73	1.41	5.71	2.27

EJECUCIÓN 2018 AL 2023 (Millones de Soles)

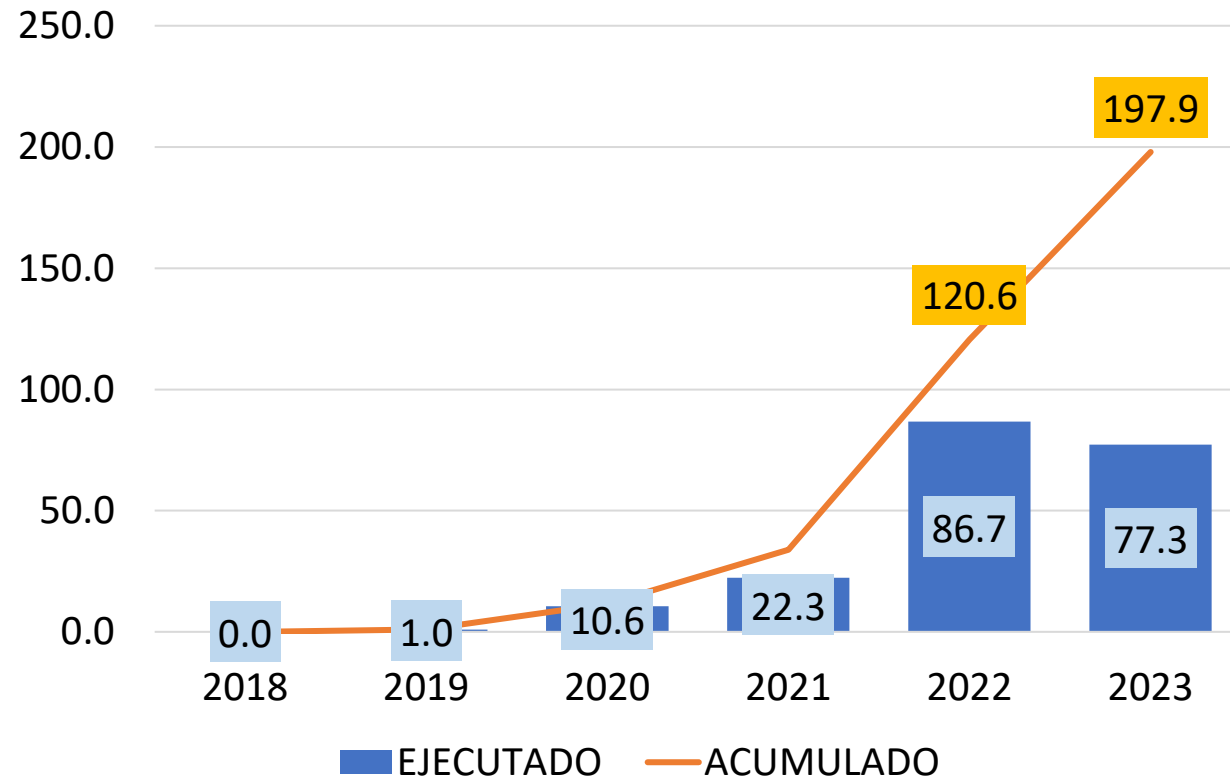

EJECUCION 2023 (Millones de Soles)

