


# PROYECTO RENIEC - BID



**“Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”**

***Seguimiento del Proyecto  
al 09 de mayo del 2024***

## PROGRAMACION VS EJECUCIÓN DE INVERSIONES – UE002-1718 (Millones de Soles)

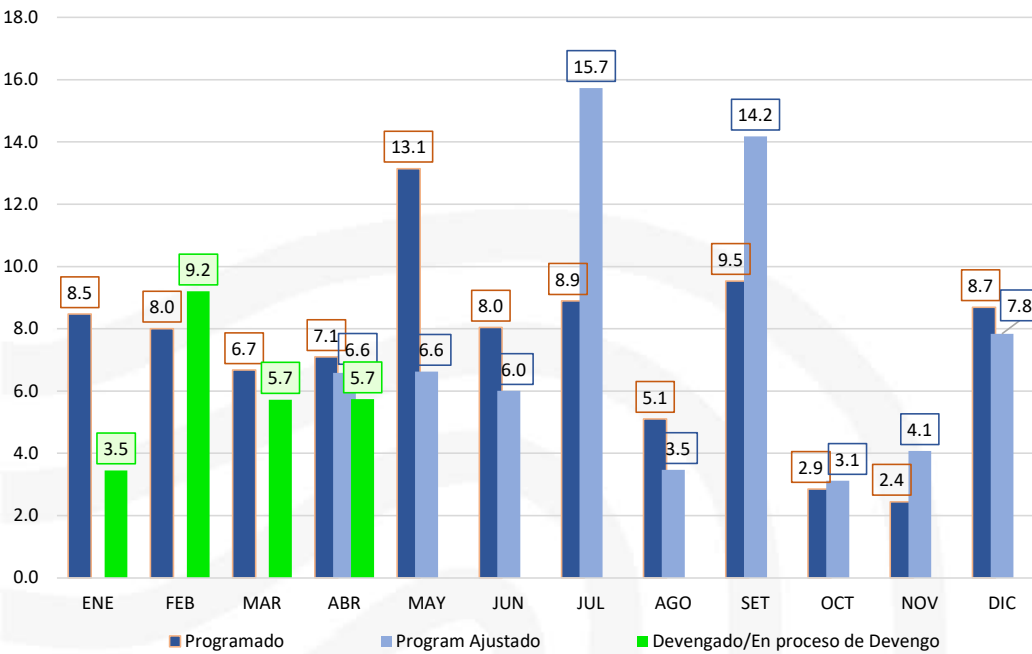

<b>PIM (*)</b>	S/85.1
<b>Ejecutado</b>	S/24.1
<b>Avance</b>	28%

<b>ABRIL</b>	
<b>Programado</b>	S/6.58
<b>Ejecución</b>	S/5.74
<b>Avance</b>	<b>87%</b>

(\*)- El PIM es de S/92.0 Millones de los cuales solo puede utilizar S/85.1.  
Se proyecta un saldo de presupuesto en ROOC de S/6.8 millones

Prod	UO	Detalle	Proy. Abril	Ejec. Abril	Proy. Mayo
<b>COMPONENTE 1</b>			<b>5.23</b>	<b>4.98</b>	<b>3.80</b>
P1	DRC	Consultores Asistencia Técnica OREC	0.00	0.00	0.00
P3	DRC	Digitalización de actas, consultores inspección del digitalización y depuración de actas registrales, pasajes	3.82	4.31	2.96
P4	DSR	Acondicionamiento oficinas, supervisor eléctrico	0.00	0.00	0.00
P5	DSR	Oficinas acondicionadas térmicamente	0.36	0.04	0.32
P6	DSR	Elaboración EETT adecuaciones para PVM	0.07	0.03	0.08
P9	DRI	Acondicionamiento para protección eléctrica, supervisión	0.97	0.57	0.41
P11	OFCI	Servicio de instalación, configuración, alojamiento y asistencia técnica para una plataforma e-learning bajo modelo SAAS	0.01	0.01	0.00
P12	OPH	Consultores especialista en diseño grafico y comunicación interna	0.01	0.01	0.02
<b>COMPONENTE 2</b>			<b>0.40</b>	<b>0.31</b>	<b>0.53</b>
P13	DRC	Consultorías para delegación de funciones registrales	0.11	0.09	0.21
P14	DRIAS	Consultores ATI, conectividad.	0.15	0.11	0.18
P15	DRIAS	Consultores asistencia técnica registral, pasajes	0.05	0.04	0.04
P16	DRC	Asistentes administrativo, de campo y de intervención remota, impresión Compendio de Registro Civil Bilingüe.	0.08	0.06	0.10
<b>COMPONENTE 3</b>			<b>0.51</b>	<b>0.03</b>	<b>1.85</b>
P17	OTI	Plataforma gestión de contenidos, Consultores de Arquitectura y especialistas en gestión de proy. Tecnológicos	0.27	0.02	0.27
P18	OTI	Especialista en Estadística, sistema de información gerencial.	0.01	0.00	0.00
P20	OTI	Estudio de sostenibilidad, Seguridad Networking	0.00	0.00	1.34
P21	OTI	Jefe de Proyectos, Chatbot	0.23	0.01	0.23
S/P		<b>Gestión del proyecto</b>	<b>0.45</b>	<b>0.43</b>	<b>0.45</b>
<b>Total</b>			<b>6.58</b>	<b>5.74</b>	<b>6.62</b>

# COMPONENTE 1

# ADECUADA COBERTURA DE LOS

# SERVICIOS PRESENCIALES

Producto	Actividad	Proveedor	Estado situacional
<b>ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DRC)</b>			
<b>P03 Actas registrales digitalizadas</b>	Digitalización de Actas registrales	<b>INETUM ESPAÑA</b>	<p><b>Meta acumulada: 9.96 Mills de actas ( 80.3% de 12.4 Mills)</b>  <b>Entregable 17 (May24)</b>  <b>1ra parte:</b>  Con fecha 26/04 se recibieron 54,683 actas microformadas  Con fecha 03/05 se recibieron 252,566 actas microformadas  Con fecha 10/05 se espera recibir 175,824 actas microformadas  <b>2da parte:</b>  Con fecha 17/05 se espera recibir 210,000 actas microformadas.  Para Mayo, se estima microformar 704,683 actas registrales y devengar S/ 2.91 Mills. <i>La disminución de meta del mes se debe a problemáticas en la transferencia de actas de la OREC Arequipa.</i></p>
<b>ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DSR)</b>			
<b>P4 Ventanilla del RENIEC implementada</b>	Acondicionamiento de Oficinas y mobiliario	<b>VICLEVI S.A,C.</b>	<p><b>Item 3 (Sullana).</b>  <b>E1 (Plan de trabajo)</b>, presentado el 26/04, con conformidad del 03/05  <b>E2 (Adecuaciones)</b>, programado para el 17/06.</p>
<b>ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DSR)</b>			
<b>P05 Oficinas acondicionadas térmicamente</b>	Implementación de sistema de climatización en oficinas	<b>VADIEL</b>	<p><b><u>SJL, Puente Piedra, Villa el Salvador, Belén y Tambopata</u></b>  E3 presentado el 21/03/24, con conformidad y devengado  E4 en ejecución hasta el 19/06/24</p> <p><b><u>Leonardo Ortiz, Lambayeque, Alto Trujillo, El Porvenir y Rioja</u></b>  E3 presentado el 25/03/24, con conformidad y devengado  E4 en ejecución hasta el 23/06/24</p> <p><b><u>Islay, Ilo y Tacna</u></b>  E2 (adecuaciones para Islay e Ilo), presentado el 20/04/24, en proceso de conformidad para Ilo y observaciones emitidas al entregable de Islay.  E2 (adecuaciones para Tacna), pendiente su presentación, se le aplicará penalidad.</p>

Producto	Actividad	Proveedor	Estado situacional
<b>ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DSR)</b>			
<b>P6. PVM instaladas y configuradas</b>	Adquisición de 21 PVM duales	<b>HIPER</b>	<b>Estabilizadores (16):</b> OC del 19/04/24 Entrega de bienes hasta el 09/05/24 (20 días calendario)
	Desarrollo de software Front End		<b>Software (HIPER) // Entregable 5 (FASE 2)</b> La culminación de la Fase 2 está programada para el <b>11/06/24</b> .  <i>Sin embargo, debido a problemas de recursos de OTI, se prevé que el proveedor solicite ampliación de plazo por 15 días adicionales.</i>
	Expedientes técnicos para ubicaciones de PVM	<b>KTL Project</b>	<b>Elaboración de 09 expedientes adicionales – Adenda 1 E2 (Levantamiento de información)</b> del 10/03/24, observado por el ETT, para subsanación del proveedor hasta el viernes 10/05
<b>ACTIVIDADES EN PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>			
<b>P09 Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonat o instalados</b>	Adecuaciones en oficinas	<b>CP 001 – 2024 Adecuación infraestructura y cableado en Sede Arequipa</b> En actos previos.	
		<b>CP 002 – 2024 Adecuación infraestructura y cableado en Sede Independencia</b> En actos previos.	
<b>ACTIVIDADES EN ACTOS PREVIOS</b>			
	Adquisición e instalación de sistema de climatización	Con fecha 26/04/24, se recibieron los TdR y anexos. Con fecha 02/05/24 se solicitó la No Objeción del BID a los TdR.	

Producto	Actividad	Proveedor	Estado situacional
P09 Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Acondicionamiento para protección eléctrica	<b>ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	
		VICLEVI - GESINCOP	<b>OR Huánuco, OR Cajamarca y OR Jaén</b> E3 (Aumento de potencia): culminado para Huánuco (11/04), Jaén (26/04) <u>pendiente de conformidad</u> y por culminar Cajamarca (11/05).
			<b>OR Ica y OR Trujillo II</b> E3 (Aumento de potencia): culminado para Trujillo II (30/04), <u>pendiente conformidad</u> , y por culminar Ica (19/05).
			<b>OR Santa y OR Chiclayo</b> E2 (Santa) adecuaciones culminadas, con conformidad. E3 ampliado hasta el 01/06. E2 (Chiclayo) adecuaciones culminadas, con conformidad. E3 ampliado hasta el 30/05.
		GEEEC	<b>OR San Román</b> E2 (Adecuaciones) culminado 23/03/24, con conformidad. E3 (Aumento de potencia) culminado el 22/04, <u>pendiente conformidad</u> .
		<b>ACTIVIDADES EN PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>	
		<b>CP 003 – Acondicionamiento para protección eléctrica - OR Trujillo I</b> Se recibió el TdR y Expedientes Técnicos actualizados, se dará inicio a la segunda convocatoria al proceso.	

Producto	Actividad	Estado situacional
P11. Funcionarios de Centros de Servicio RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	<b>ACTIVIDADES EN PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>	
	Producción de Contenidos y Recursos Audiovisuales para Curso MOOC	Con fecha 19/04 se recibieron 04 ofertas, resultado de la evaluación del CEA, las propuestas no cumplen con el perfil requerido (02) o sobrepasan el monto referencial. Por lo tanto, el proceso se estaría declarando desierto, encargando al área usuaria ajustar los TdR.
	Plataforma E- Learning (LMS) en cloud bajo modelo PAAS.	Con fecha 24/04 se solicitó la No Objeción del BID a los TdR.
	<b>ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	
	Consultoría especializada para el servicio de actualización de una plataforma de E Learning	E2 (Apoyar al comité de evaluación de postores) en ejecución.
P12. Gestión del Cambio Cultural	<b>ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	
	Especialista en comunicación interna	E2 presentado el 04/05, para conformidad. La consultora manifestó su decisión de renunciar a la consultoría.
	Servicio de apoyo en diseño grafico.	E2 deberá ser presentado el 14/05
	Especialista en cultura organizacional	Firma de contrato 02/05 E1 deberá ser presentado el 01/06
	Coordinador de proyectos	Firma de contrato será con fecha 09/05. E1 deberá ser presentado el 08/06

# COMPONENTE 2

## MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A POBLACIÓN VULNERABLE



Producto	Actividad	Estado situacional
P13 CCNN con servicios delegados	<b>ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DRC)</b>	
	Consultores de campo (21) Consultores de gabinete (02)	328 CCNN intervenidas - (79.6% avance de 412) → 01 CCNN presentó desistimiento. <u>294 CCNN con funciones delegadas (71.4%)</u> y 11 con expediente técnico en proceso de resolución (2.7%) y 23 nuevos expedientes en proceso de elaboración (5.6%)  10mo viaje programado para el mes de mayo (entre el 11 al 28 de mayo). Se proyecta intervenir en 34 CCNN.
P16 Registro civil bilingüe en comunidades nativas y centros poblados	<b>ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DRC)</b>	
	Analistas informáticos (04) Asistentes para monitoreo (08) Asistente de intervención remoto (01)	<b>Meta de implementación cumplida: 556 OREC implementadas (111%).</b> <b>Meta de monitoreo: 556 OREC, en proceso.</b>  <b>Fase de monitoreo de las OREC por 08 Asistentes de Campo para monitoreo</b>  Al 30/04 se han monitoreado 116 OREC: <b>102 de forma remota y 14 de forma presencial</b>  <u>Para el mes de mayo se estima monitorear 42 OREC de forma presencial</u>
	Aplicativos informáticos	Se vienen desarrollando los siguientes aplicativos (fecha de corte al 30/04): <b>Sutichay Wawa</b> - análisis 100%, desarrollo 100%, calidad 76%, prod 24% <b>Registro Digital de Nacimiento</b> - análisis 100%, desarrollo 100%, calidad 0%, prod 0% <b>Portal del Registrador Civil</b> - análisis 100%, desarrollo 68%, calidad 0%, prod 0% <b>Sistema de Gestión de RRCC</b> - análisis 100%, desarrollo 28%, calidad 0%, prod 0%
	<b>ACTIVIDADES EN ACTOS PREVIOS</b>	
	Traductores (11)	En proceso de actualización de TdR por el área usuaria.
Diseño, diagramación e impresión de libro Compendio de los Registros Civiles	En proceso de firma de TdR actualizado por el área usuaria. 08/05/2024	

Producto	Actividad	Estado situacional	
P14 Unidades Itinerantes Equipadas	Habilitación del funcionamiento de las tablets	<b>Condición de uso de tablets:</b> 123 operativas y 78 en validación.	<b>Incidentes:</b> 04 tablets con error de licencias (Solicitud a ZONDA de nuevas licencia, según compromiso (se envió Carta n° 186-2024 30/04) Continúa el calentamiento de las tablets <b>Mejora tecnológica:</b> En proceso de suscripción de las Actas de confidencialidad (ZONDA), desde el lunes 6/5. Compromiso de elaboración de un plan integral conjunto para solución definitiva de ZONDA – OTI- DRIAS (06/05)
	<b>ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>		
	Consultores para ATI (25) 24 activos, 1 por contratar reemplazo.	Campañas realizadas: 268 (avance del 42% de 638) 268 con aliados estratégicos ( avance del 53.4% de 502) 00 con PIAS (de 136) <b>Trámites ATI: 3351- Captura en vivo (Tablet) 1155; Trámite manual 1196.</b> En abril, 19 consultores salieron a campo, 04 consultores no salieron a campo (problema de tablets) y 01 en proceso de contratación de reemplazo y 01 en inducción.	
	Base de datos automatizado <b>Contrato N° 014-2024</b>	E2 (Módulo de autenticación), en ejecución hasta el 27/05. El 24/04 se aprobó la arquitectura del desarrollo (OTI y DRIAS)	
	<b>EN PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>		
	Expedientes Técnicos para acondicionamiento OR Cajamarca	<b>SCC 001-2024-MCSR</b> En proceso de adjudicación a la empresa ZB consultores SAC Fecha estimada para suscripción de contrato: 20/05/24.	
Analista programador y Analista para QA	Analista programador, en ejecución de actividades desde el 23/04/24. Analista de QA, en proceso de contratación, la fecha de inicio será el 13/05 (OTI)		
P15 Asistencia Técnica Registral	<b>ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>		
	Consultores para ATR (4)	<b>1ra visita: avance 100% - (1542 de 1541 OREC)</b> <b>2da visita (fortalecimiento): avance 98.6% - (1519 de 1541 OREC)</b> 4 consultores para ATR en ejecución.	

# COMPONENTE 3 INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Producto	Actividad	Proveedor	Estado situacional	Hitos
P17 Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIIRC) Implementado	<b>ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DRI)</b>			
	Gestor de Impresoras	<b>INETUM ESPAÑA</b>	<p>INETUM se encuentra en proceso de análisis y adecuaciones, producto de los requerimientos indicados por los usuarios para la modificación de los reportes de módulo de producción, la integración con las impresoras HID de las PVM y la automatización del proceso de carga del log de las impresoras IXLA.</p> <p>Se programó reunión técnica el 10/05 con INETUM, HIPER, DRI y la OTI, donde se definirá la integración de las impresoras HID, luego de ello, se estimaría los nuevos plazos de presentación de los entregables 3 al 8 a considerar en una siguiente adenda.</p>	<p>Pago E3-E4 US\$ 0.14</p> <p>Pago E5-E6 US\$ 0.04</p>
	<b>ACTIVIDADES EN PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>			
	Gobierno Corporativo de TI para la OTI		<b>SBCC 001-2023-MCSR</b>	Con fecha 26/04 se realizó la primera reunión de negociación por el proveedor seleccionado. Con fecha 09/05 se programó la reunión de negociación con el proveedor seleccionado, considerando como agenda los roles del personal clave y no clave.
	<b>ACTIVIDADES EN ACTOS PREVIOS</b>			
	Sistema Integrado de Identificación y Registros Civiles (SIIRC)			El CEA viene elaborando las bases del proceso para remitirlo al BID el 10/05.

Producto	Actividad	Proveedor	Estado situacional	Hitos
<b>ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – DSR)</b>				
P21 Servicios en línea ofrecidos	Gestor de Citas	SOAINT PERÚ	<p><b>8vo entregable:</b> presentado el 11/08/23</p> <p>Se retomaron las pruebas unitarias / integrales / regresión el lunes 06/05. En estas pruebas se incluyen las observaciones/oportunidades de mejora acordados en subsanar / implementar. En una primera instancia, se programaron 3 sesiones: lunes 06/05, miércoles 08/05 y viernes 09/05.</p>	<p>8vo Ent.: 11/08/23</p> <p>Pago: S/ 0.19 Mills</p>
<b>ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – OCP)</b>				
P17 y P21 Plataforma de contenidos digitales y Chatbot	Plataforma contenidos digitales – Chatbot	VASS PERÚ	<p><b>E5 (Validación de la implementación y migración de Plataforma)</b> Presentado el 30/03, con fecha 22/04 el ETT presentó observaciones y se notificó al proveedor para subsanación.</p> <p>Con fecha 27/04 el proveedor presentó la subsanación de las observaciones y el 30/04 el informe corregido de validaciones y mitigación de vulnerabilidades, de la revisión el ETT encontró observaciones y se notificó al proveedor en fecha de 08/05.</p> <p>Las capacitaciones al personal de OCP y OTI se realizaron del 15/04 al 29/04.</p>	<p>5to Ent: 30/03/23</p> <p>Pago: S/ 0.45 Mills</p>
<b>ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ÁREA USUARIA – OTI)</b>				
P20 Equipamiento de Hardware y Software de base para el SIIRC	Seguridad de Networking	IMPERIA	<p><b>E3 (Ejecución de Plan de Trabajo)</b> presentado el 12/04, con conformidad del 26/04.</p> <p><b>E4 (Ejecución del Plan de Pruebas)</b> presentado el 22/04, con conformidad del 26/04.</p> <p><b>E5 (Informe final)</b> presentado el 27/04, con fecha de 03/05 el ETT presentó observaciones y se notificó al proveedor para subsanación. Con fecha de 07/05 el proveedor presentó la subsanación de las observaciones y con fecha de 08/05 el ETT otorgó conformidad.</p>	

