

Contraloría General de la República	Vigente a partir del día siguiente de su publicación.	Código: INF-PGD-001
		Versión: 01



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025 – 2027

(Fecha de corte 31 de diciembre de 2025)

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobado por:	Guillermo Tomas Uribe Córdova	Gerente de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital	
Revisado por:	Luis Alberto Toledo Zatta	Subgerente de Operaciones y Plataforma Tecnológica	
	Marco Antonio Bermudez Torres	Subgerente de Sistemas de Información y Analítica de Datos	
Elaborado por:	César Eduardo Córdova Veliz	Supervisor general de la Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos	
	Leví Joel Aguirre Rojas	Especialista legal de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital	

Contenido

I.	INTRODUCCIÓN	4
II.	BASE NORMATIVA	4
III.	ACRONIMOS	5
IV.	OBJETIVO DEL INFORME	6
V.	ALCANCE	6
VI.	OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL (OGD)	6
VII.	PROYECTOS DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025 – 2027	6
VIII.	CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS	8
	8.1. Criterios para la Evaluación del Avance de Proyectos con financiamientos BID	8
	8.2. Criterios para la Evaluación del Avance de Proyectos con financiamiento interno o Recursos Ordinarios.	9
	8.3. Criterios para definir el estado de los Proyecto.	10
IX.	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS	11
	9.1. Alineamiento de los Proyectos del Plan de Gobierno Digital con Proyectos del BID3	11
	9.2. Estado y porcentaje de avance de los Proyectos del PGD	13
X.	ACCIONES ADICIONALES EN EL MARCO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	17
XI.	CONCLUSIONES	19
XII.	RECOMENDACIONES	20

Índice de Tablas:

<i>Tabla 1: Proyectos del Plan de Gobierno Digital 2025-2027.....</i>	<i>7</i>
<i>Tabla 2: Hitos, valores porcentuales y medios de verificación por cada etapa de los proyectos BID (Formulación e Implementación)</i>	<i>9</i>
<i>Tabla 3: Hitos, valores porcentuales y medios de verificación por cada etapa de los proyectos con recursos ordinarios (Formulación y Ejecución)</i>	<i>10</i>
<i>Tabla 4: Proyectos de Gobierno Digital, según tipo de financiamiento (BID o recursos ordinarios).....</i>	<i>11</i>
<i>Tabla 5: Estado y porcentaje de avance de los Proyectos del PGD 2025 - 2027</i>	<i>14</i>
<i>Tabla 6: Listado de compromisos en cumplimiento de Gobierno y Transformación digital de la CGR.....</i>	<i>17</i>

Índice de Gráfico:

<i>Gráfico 1: Total de proyectos de PGD 2025 - 2027, según financiamiento.....</i>	<i>13</i>
--	-----------

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025 – 2027 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

I. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gobierno Digital (PGD) 2025-2027 de la Contraloría General de la República fue aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 322-2025-CG, de fecha 13 de agosto del 2025.

El PGD es un documento de gestión institucional que permite plasmar los objetivos y proyectos de Gobierno y Transformación Digital, por un periodo de tres (3) años, y se constituye como el único instrumento para la gestión y planificación del gobierno y transformación digital de la entidad. El Comité de Gobierno y Transformación Digital de la Contraloría General de la República, a través del Plan de Gobierno Digital, orienta el proceso de transformación digital e innovación con miras a facilitar la prestación de servicios digitales que generan valor público y se encuentran alineados a los objetivos estratégicos institucionales.

Para la evaluación de los proyectos del PGD se realizaron actividades de seguimiento y se tomó en consideración la información brindada por los órganos y unidades orgánicas de la Contraloría General de la República (CGR), responsables de los proyectos.

II. BASE NORMATIVA

- 2.1. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- 2.2. Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.
- 2.3. Decreto Legislativo N° 1412, decreto legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- 2.4. Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital.
- 2.5. Decreto de Urgencia N° 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento.
- 2.6. Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el reglamento del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo.
- 2.7. Decreto Supremo N° 157-2021-PCM, que aprueba el reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital.
- 2.8. Decreto Supremo N° 085-2023-PCM de fecha 28 de Julio del 2023, que aprueba la Política de Transformación Digital al 2030.
- 2.9. Decreto Supremo N° 098-2025-PCM de fecha 30 de Julio del 2025, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el

procedimiento administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2021-PCM.

- 2.10. Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública.
- 2.11. Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, donde se aprueba las disposiciones sobre la conformación y funciones del comité de gobierno digital.
- 2.12. Resolución Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, mediante el cual se aprueban los lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital.
- 2.13. Resolución de Contraloría N° 179-2021-CG, que aprueba la Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General de la República, y modificatorias.
- 2.14. Resolución de Contraloría N° 292-2021-CG, de fecha 20 de diciembre del 2021, que aprueba el Plan de Gobierno Digital 2021-2024 de la Contraloría General de la República.
- 2.15. Resolución de Contraloría N° 274-2025-CG, que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General de la República, cuya vigencia inicia a partir del 08 de setiembre de 2025.
- 2.16. Resolución de Contraloría N° 320-2025-CG, que modifica el nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General de la República.
- 2.17. Resolución de Contraloría N° 322-2025-CG de fecha 13 de agosto del 2025, que aprueba el “El Plan de Gobierno Digital 2025 – 2027 de la Contraloría General de la República”.
- 2.18. Resolución de Contraloría N° 501-2025-CG, de fecha 14 de noviembre de 2025, mediante la cual se Reconforma el Comité de Gobierno y Transformación Digital de la Contraloría General de la Republica.

III. ACRONIMOS

- BID** : Banco Interamericano de Desarrollo
CGR : Contraloría General de la República
DE : Documento Equivalente
EETT : Especificaciones Técnicas
ENC : Escuela Nacional de Control
GTI : Gerencia de Tecnologías de la Información
H.I. : Hoja Informativa
PCM : Presidencia del Consejo de Ministros
PGD : Plan de Gobierno Digital
RO : Recursos Ordinarios
ROF : Reglamento de Organización y Funciones
SGTD : Secretaría de Gobierno y Transformación Digital
SGSI : Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
SNC : Sistema Nacional de Control
TDR : Términos de Referencia
TI : Tecnologías de la Información
TIC : Tecnologías de la Información y Comunicación
OUO : Órgano o Unidad Orgánica
UOR : Unidad Orgánica Responsable.

IV. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe, es elaborado conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM y modificatoria, y en las funciones del Comité de Gobierno y Transformación Digital de la Contraloría General de la República, donde señala que se debe realizar la elaboración de informes anuales que midan el progreso de la implementación del Plan de Gobierno Digital.

En ese sentido, el objetivo principal del presente informe es realizar el seguimiento a los proyectos del Plan de Gobierno Digital 2025 – 2027, para determinar el porcentaje de avance de ejecución.

V. ALCANCE

Se programaron doce (12) proyectos dentro del Plan de Gobierno Digital 2025 – 2027 que impulsan el gobierno y transformación digital en la entidad, y la evaluación se realiza con fecha de corte al 31 de diciembre del 2025.

Para su elaboración, se tomó en consideración la información brindada por las unidades orgánicas responsables (en adelante CGR) de los proyectos del PGD 2025 – 2027 de la Contraloría General de la República, así como los aportes realizados por los integrantes del Comité de Gobierno y Transformación Digital.

VI. OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL (OGD)

Según la Resolución de Contraloría N° 322-2025-CG que aprueba el Plan de Gobierno Digital 2025 – 2027, los objetivos de Gobierno Digital de la CGR son:

- OGD 01: Implementar servicios digitales orientados a mejorar la gestión de la CGR y el servicio al ciudadano.
- OGD 02: Implementar servicios digitales orientados a mejorar la gestión de la CGR y el servicio al ciudadano
- OGD 03: Incrementar el nivel de disponibilidad de la infraestructura tecnológica.
- OGD 04: Impulsar y fortalecer las competencias digitales de los trabajadores de la CGR, con enfoque en la transformación cultural que facilite y acelere la implementación de la transformación digital.
- OGD 05: Consolidar los niveles de seguridad de la información con la finalidad de proteger los activos de información de los procesos de la CGR.
- OGD 06: Implementar y actualizar las disposiciones normativas aplicables en materia de gobierno y transformación digital en la CGR.
- OGD 07: Optimizar los procesos estratégicos, misionales y de apoyo para impulsar la transformación y gobierno digital en la CGR.

VII. PROYECTOS DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025 – 2027

Los proyectos que se establecieron en el Plan de Gobierno Digital 2025-2027 son:

Tabla 1
Proyectos del Plan de Gobierno Digital 2025-2027

Nro	CÓDIGO DIG	PROYECTOS DE GOBIERNO Y DIGITAL	Objetivo de Gobierno o Digital	Unidad Orgánica responsable
1	PROY-CGR-01	Implementación de la Plataforma de Información de Inversiones en Infraestructura Pública.	OGD 01	Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC
2	PROY- CGR-02	Modernización del Sistema de Transferencia de Gestión con Interoperabilidad considerando la Rendición de Cuentas	OGD 01	Subgerencia de Prevención e Integridad
3	PROY- CGR-03	Laboratorio de Control para Innovar los Servicios de Control Gubernamental (Incluye la Contratación del servicio de no consultoría para capacitación en Machine Learning en el marco de la Implementación del Laboratorio de Control)	OGD 04	Subgerencia del Observatorio Anticorrupción ¹
4	PROY- CGR-04	Optimización del proceso administrativo sancionador con sistema de expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica	OGD 01	Oficina de Gestión de la Potestad Administrativa Sancionadora
5	PROY- CGR-05	Mejoramiento de las soluciones informáticas que brindan soporte al Sistema Integrado de Control Gubernamental	OGD 07	Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos
6	PROY- CGR-06	Fortalecimiento de la Gestión Documental Digital en la CGR.	OGD 06	Subgerencia de Gestión Documentaria
7	PROY-CGR-07	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de Información.	OGD 05	Subgerencia de Gobierno Digital ²
8	PROY-CGR-08	Implementar el Modelo de Gobierno y Gestión de TI en la CGR	OGD 06	Subgerencia de Gobierno Digital ³

¹ Desactivada a partir de la vigencia de la Estructura Orgánica de la Contraloría General de la República, aprobado con Resolución de Contraloría N° 274-2025-CG, y modificatoria, acaecida el 08 de setiembre de 2025, y reasignado el proyecto a la **Subgerencia de Modernización** según Memorando N° 000022-2026-CG/VCG de fecha 09 de enero de 2026. Actualmente el PGD en este aspecto se encuentra en proceso de actualización por parte del Comité de Gobierno y Transformación Digital (CGTD).

² Desactivada a partir de la vigencia de la Estructura Orgánica de la Contraloría General de la República, aprobado con Resolución de Contraloría N° 274-2025-CG, y modificatoria, acaecida el 08 de setiembre de 2025, y reasignado el proyecto a la **Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos**. Actualmente el PGD en este aspecto se encuentra en proceso de actualización por parte del Comité de Gobierno y Transformación Digital (CGTD).

³ Desactivada a partir de la vigencia de la Estructura Orgánica de la Contraloría General de la República, aprobado con Resolución de Contraloría N° 274-2025-CG, y modificatoria, acaecida el 08 de setiembre de 2025, y reasignado el proyecto a la **Gerencia de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital**. Actualmente el PGD en este aspecto se encuentra en proceso de actualización por parte del Comité de Gobierno y Transformación Digital (CGTD).

Nro	CÓDIGO DIG	PROYECTOS DE GOBIERNO Y DIGITAL	Objetivo de Gobierno o Digital	Unidad Orgánica responsable
9	PROY-CGR-09	Fortalecer infraestructura tecnológica de la CGR	OGD 03	Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica.
10	PROY-CGR-10	Implementación del Subsistema de Gestión de Rendimiento del Sistema Integrado de Recursos Humanos.	OGD 07	Subgerencia de Políticas y desarrollo humano.
11	PROY-CGR-11	Adecuación de los sistemas informáticos a la plataforma de autenticación de la Identidad Digital (ID Perú).	OGD 01	Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos
12	PROY-CGR-12	Programa de fortalecimiento de competencias digitales y transformación cultural	OGD 04	Subgerente de Políticas y Desarrollo Humano

Fuente: PGD 2025 - 2027.

Es importante señalar que los Objetivos de Gobierno Digital (OGD) de la CGR se encuentran intrínsecamente vinculados a los Objetivos Estratégicos de la Institución (OEI), y a su vez, están alineados con los proyectos del Plan de Gobierno Digital. Esta sinergia estratégica garantiza que los OGD contribuyan de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

VIII. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS

8.1 Criterios para la Evaluación del Avance de Proyectos con financiamientos BID.

Para la obtención del avance de los proyectos se determinaron hitos, valores porcentuales y medios de verificación por cada etapa (Formulación y Ejecución) conforme se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 2
Hitos, valores porcentuales y medios de verificación por cada etapa de los proyectos BID (Formulación e Implementación)

ETAPA	HITOS	VALOR PORCENTAJE	SUSTENTO O MEDIO DE VERIFICACION
Formulación	TDR, EETT O ET	20%	<p>Solicitud de las consistencias de los ET o DE. Para solicitar la consistencia, los ET o DE deben ser validados por las áreas técnicas correspondientes.</p> <p>Medio de verificación H.I./Memos de la UO responsable del proyecto solicitando la aprobación de consistencia adjuntando los ET o DE a la Gerencia de Recursos Estratégicos o la que haga sus veces.</p>
	Aprobación de consistencia	3%	<p>Medio de verificación (H.I./Memos que aprueba la consistencia del ET o DE con el estudio de Preinversión).</p>
	Proceso de selección	15%	<p>Contrato(s) Suscrito (s) Contrato suscrito de los ET o DE</p> <p>Cálculo (N° de Contratos Suscritos/Total de Contratos Programados a suscribir) * 100</p>
Implementación y Cierre	Ejecución Contractual	60%	<p>Avance de productos finales</p> <p>Medio de verificación H.I./Memorando de la UO responsable que aprueba la conformidad de los entregables.</p> <p>Cálculo (N° de productos / entregables con conformidad / total productos / entregables programados a entregar) * 100</p>
	Acta de entrega física del producto culminado	2%	<p>Acta de Entrega firmada</p> <p>Documento con el cual se realiza la entrega del producto culminado a la UO para su operación y mantenimiento</p>

Fuente: Elaboración Propia.

8.2. Criterios para la Evaluación del Avance de Proyectos con financiamiento interno o Recursos Ordinarios.

Para la obtención del avance de los proyectos con financiamiento interno o recursos ordinarios se determinaron hitos, valores porcentuales y medios de verificación por cada etapa (Formulación y Ejecución) conforme se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 3
Hitos, valores porcentuales y medios de verificación por cada etapa de los proyectos con recursos ordinarios (Formulación y Ejecución)

ETAPA	HITOS	VALOR PORCENTAJE	SUSTENTO O MEDIO DE VERIFICACION
Formulación	Formulación del Plan de Proyecto	20%	Medio de verificación H.I./Memos de la UO responsable del proyecto interno solicitando la aprobación del plan de proyecto formulado.
	Aprobación del Plan de Proyecto	8%	Medio de verificación (H.I./Memos/ documentación que aprueba el plan de proyecto).
Ejecución y Cierre	Ejecución Contractual	70%	Avance de productos finales. Medio de verificación H.I./Memorando de la UO responsable que aprueba la conformidad de los entregables. Cálculo (N° de productos / entregables con conformidad / total productos / entregables programados a entregar) * 100
	Acta de entrega física del producto culminado	2%	Acta de Entrega firmada Documento con el cual se realiza la entrega del producto culminado a la UO para su operación y mantenimiento

Fuente: Elaboración Propia.

8.3. Criterios para definir el estado de los Proyectos.

Se han definido estados en cada proyecto que refleja el progreso y la situación actual del proyecto durante su ciclo de vida:

- **Planificado:** Se están definiendo los objetivos, el alcance, los recursos, el cronograma y el presupuesto del proyecto.
- **En Ejecución:** El trabajo planificado está en marcha y se están llevando a cabo las actividades y tareas para alcanzar los objetivos del proyecto.
- **Cancelado:** El proyecto ha sido terminado antes de su finalización prevista, debido a razones como cambios en la estrategia de la organización, falta de recursos, o problemas irresolubles.
- **Completado:** Todas las actividades del proyecto se han finalizado y se han entregado los productos o resultados esperados.
- **Absorbido:** Con el fin de optimizar recursos y evitar duplicidades, se llevó a cabo una reestructuración que resultó en que un proyecto fuera absorbido por otro proyecto.

9. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS

9.1. Alineamiento de los Proyectos del Plan de Gobierno Digital con Proyectos del BID3

A través del Decreto Supremo N° 314-2018-EF, se aprueba la operación de endeudamiento externo con el BID, destinada a financiar parcialmente el Proyecto de “Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública”; el cual en el ámbito de la CGR se denomina “BID 3”, y comprende un conjunto de proyectos internos contemplados en el PGD 2025 - 2027 y se encuentran alineados según la siguiente tabla:

Tabla 4

Proyectos de Gobierno Digital, según tipo de financiamiento (BID o recursos ordinarios)

Nro	CÓDIGO PGD	PROYECTOS DE GOBIERNO Y DIGITAL	TIPO DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO BID	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
1	PROY-CGR-01	Implementación de la Plataforma de Información de Inversiones en Infraestructura Pública.	BID	1.1.2	Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC
2	PROY-CGR-02	Modernización del Sistema de Transferencia de Gestión con Interoperabilidad considerando la Rendición de Cuentas	BID	1.3	Subgerencia de Prevención
3	PROY-CGR-03	Laboratorio de Control para Innovar los Servicios de Control Gubernamental (Incluye la Contratación del servicio de no consultoría para capacitación en Machine Learning en el marco de la Implementación del Laboratorio de Control)	BID	1.5.1	Subgerencia del Observatorio Anticorrupción ⁴

⁴ Desactivado y reasignado el proyecto a la Subgerencia de Modernización.

Nro	CÓDIGO PGD	PROYECTOS DE GOBIERNO Y DIGITAL	TIPO DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO BID	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
4	PROY-CGR-04	Optimización del proceso administrativo sancionador con sistema de expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica	BID	1.7.1	Oficina de Gestión de la Potestad Administrativa Sancionadora
5	PROY-CGR-05	Mejoramiento de las soluciones informáticas que brindan soporte al Sistema Integrado de Control Gubernamental	BID	1.8.2	Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos
6	PROY-CGR-06	Fortalecimiento de la Gestión Documental Digital en la CGR.	BID	1.9.1	Subgerencia de Gestión Documentaria
7	PROY-CGR-07	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de Información.	RECURSOS ORDINARIOS	-----	Subgerencia de Gobierno Digital ⁵
8	PROY-CGR-08	Implementar el Modelo de Gobierno y Gestión de TI en la CGR	RECURSOS ORDINARIOS	-----	Subgerencia de Gobierno Digital ⁶
9	PROY-CGR-09	Fortalecer infraestructura tecnológica de la CGR	BID	3.5.2	Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica.
10	PROY-CGR-10	Implementación del Subsistema de Gestión de Rendimiento del Sistema Integrado de Recursos Humanos.	RECURSOS ORDINARIOS	-----	Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano.
11	PROY-CGR-11	Adecuación de los sistemas informáticos a la plataforma de autenticación de la Identidad Digital (ID Perú).	RECURSOS ORDINARIOS	-----	Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos
12	PROY-CGR-12	Programa de fortalecimiento de competencias digitales y transformación cultural	RECURSOS ORDINARIOS	-----	Subgerente de Políticas y Desarrollo Humano

Fuente: PGD 2025 – 2027 e información de las UOR.

De la información anterior, se puede indicar que de un total de 12 proyectos del PGD 2025 – 2027, siete están financiados por el BID y cinco con recursos ordinarios.

⁵ Desactivado y reasignado el proyecto a la Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos.

⁶ Desactivado y reasignado el proyecto a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital.

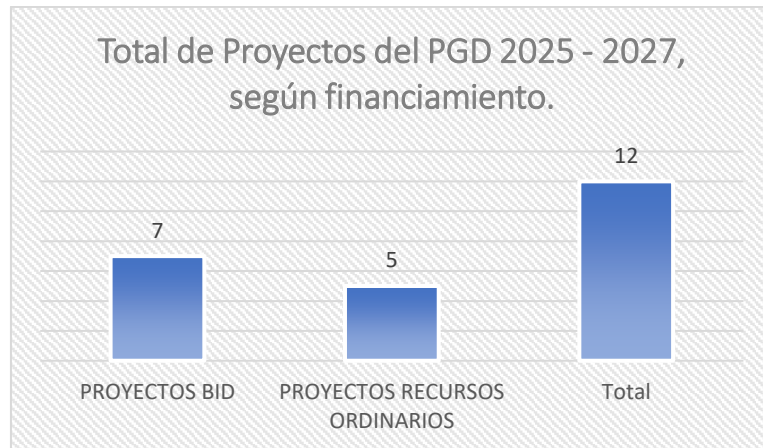


Gráfico 1: Total de proyectos de PGD 2025 - 2027, según financiamiento.

9.2. Estado y porcentaje de avance de los Proyectos del PGD

Para la evaluación del Plan de Gobierno Digital 2025-2027 se realizaron actividades de seguimiento y monitoreo como las reuniones de coordinación con las áreas especializadas, elaboración de instrumentos de seguimiento de proyectos, formación de equipos de trabajo, coordinaciones de apoyo y soporte a los líderes y personal involucrado en el seguimiento de proyectos del Plan de Gobierno Digital.

Se toma en consideración el Informe de Seguimiento del Plan de Gobierno Digital 2025-2027 con fecha de corte al 25 de agosto de 2025, aprobado por la Subgerencia de Gobierno Digital, unidad orgánica que al 08 de setiembre de 2025, fue desactivado por la vigencia de la Estructura Orgánica de la Contraloría General de la República.

En ese sentido, al 31 de diciembre de 2025 se muestra el estado y porcentaje de avance de los proyectos del PGD según el siguiente detalle:

Tabla 5
Estado y porcentaje de avance de los Proyectos del PGD 2025 - 2027

Nro	CÓDIGO DIG	PROYECTOS DE GOBIERNO Y DIGITAL Contrato Préstamo N° 4724/OC-PE (Proyecto BID)	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	Año de Cierre, según PGD	ETAPAS		% DE AVANCE POR PROYECTO / SUBPROYECTO	% DE AVANCE DEL PROYECTO PGD 2025 - 2027	Estado
					BID: 38%=100% R.O.: 28%=100%	BID: 62%=100 R.O.: 72%=100%			
1	PROY-CGR-01	Implementación de la Plataforma de Información de Inversiones en Infraestructura Pública.	Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC	2025	100 %	82.02 %	88.85%	88.85%	Ejecución
2	PROY- CGR-02	Modernización del Sistema de Transferencia de Gestión con Interoperabilidad considerando la Rendición de Cuentas	Subgerencia de Prevención	2025	100 %	96.61 %	97.90%	97.90%	Ejecución
3	PROY- CGR-03	Laboratorio de Control para Innovar los Servicios de Control Gubernamental (Incluye la Contratación del servicio de no consultoría para capacitación en Machine Learning en el marco de la Implementación del Laboratorio de Control)	Subgerencia del Observatorio Anticorrupción ⁷	2025	100 %	96.77 %	98.00%	98.00%	Ejecución
4	PROY- CGR-04	Optimización del proceso administrativo sancionador con sistema de expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica	Oficina de Gestión de la Potestad Administrativa Sancionadora	2025	100 %	95.16 %	97.00%	97.00%	Ejecución
5	PROY- CGR-05	Mejoramiento de las soluciones informáticas que brindan soporte al Sistema Integrado de Control Gubernamental	Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos	2026	65.79 %	43.55 %	52.00%	52.00%	Ejecución
6	PROY- CGR-06	Fortalecimiento de la Gestión Documental Digital en la CGR.	Subgerencia de Gestión Documentaria	2025	97.37 %	93.55 %	95.00%	95.00%	Ejecución

⁷ Desactivado y reasignado el proyecto a la Subgerencia de Modernización.

Nro	CÓDIGO DIG	PROYECTOS DE GOBIERNO Y DIGITAL Contrato Préstamo N° 4724/OC-PE (Proyecto BID)	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	Año de Cierre, según PGD	ETAPAS		% DE AVANCE POR PROYECTO / SUBPROYECTO	% DE AVANCE DEL PROYECTO PGD 2025 - 2027	Estado
					FORMULACIÓN BID: 38%=100% R.O.: 28%=100%	IMPLEMENTACIÓN BID: 62%=100 R.O.: 72%=100%			
7	PROY-CGR-07	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de Información.	Subgerencia de Gobierno Digital ⁸	2027	100 %	14.58 %	38.50%	38.50%	Ejecución
8	PROY-CGR-08	Implementar el Modelo de Gobierno y Gestión de TI en la CGR	Subgerencia de Gobierno Digital ⁹	2027	35.71 %	0.00%	10.00%	10.00%	Planificación
9	PROY-CGR-09 Fortalecer infraestructura tecnológica de la CGR	Equipamiento de TIC: Ampliación de las Capacidades de la Plataforma de Virtualización para la Atención de las demandas de los Sistemas de Información.	Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica.	2025	94.74 %	0.00%	36.00%	36.00%	Planificación
		Equipamiento de TIC: Adquisición de Equipamiento para Fortalecer la Solución de Respaldo de la Contraloría General de la República			94.74 %	0.00%	36.00%		Planificación
		Equipamiento de TIC: Adquisición de Servidores para el Fortalecimiento de la Plataforma de Base de Datos de Producción, Desarrollo y Contingencia de la CGR			94.74 %	0.00%	36.00%		Planificación
		Equipamiento de TIC: Adquisición de Licencias de Herramientas de Gestión y Base de Datos ORACLE para ampliar la Capacidad de las Bases de Datos			100 %	100 %	100.00%	100.00%	Ejecución

⁸ Reasignado a la Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos.

⁹ Reasignado a la Gerencia de Tecnologías de Información y Gobierno Digital.

Nro	CÓDIGO DIG	PROYECTOS DE GOBIERNO Y DIGITAL Contrato Préstamo N° 4724/OC-PE (Proyecto BID)	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	Año de Cierre, según PGD	ETAPAS		% DE AVANCE POR PROYECTO / SUBPROYECTO	% DE AVANCE DEL PROYECTO PGD 2025 - 2027	Estado
					FORMULACIÓN BID: 38%=100% R.O.: 28%=100%	IMPLEMENTACIÓN BID: 62%=100 R.O.: 72%=100%			
10	PROY-CGR-10	Implementación del Subsistema de Gestión de Rendimiento del Sistema Integrado de Recursos Humanos.	Subgerencia de Políticas y desarrollo humano.	2026	17.86 %	0.00%	5.00%	5.00%	Planificación
11	PROY-CGR-11	Adecuación de los sistemas informáticos a la plataforma de autenticación de la Identidad Digital (ID Perú).	Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos	2027	17.86 %	0.00%	5.00%	5.00%	Planificación
12	PROY-CGR-12	Programa de fortalecimiento de competencias digitales y transformación cultural	Subgerente de Políticas y Desarrollo Humano	2027	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Planificación

Fuente: PGD 2025 – 2027 e información de las UOR.

10. ACCIONES ADICIONALES EN EL MARCO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL

Se ha realizado el cumplimiento de compromisos priorizados por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD).


La SGTD es el órgano de línea de la Presidencia del Consejo de Ministros que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Transformación Digital que alcanza al sector público, privado, la sociedad civil organizada, la academia y los ciudadanos y a las materias de gobierno digital, confianza digital y transformación digital en el país. La SGTD realizó la priorización de compromisos en materia de Gobierno y Transformación Digital, el cual deben cumplir todas las entidades del estado. En ese sentido, el ámbito de la aplicación del cumplimiento de los compromisos priorizados por la SGTD, incluye a la Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República al mes de diciembre de 2025, continúa monitoreando y cumpliendo el 100% de los compromisos priorizados por la SGTD en materia de Gobierno y Transformación Digital y se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 6
Listado de compromisos en cumplimiento de Gobierno y Transformación digital de la CGR

Compromiso	Marco Normativo	Enlace de sustento	Estado
1. Incorporar la transformación digital en el Plan Estratégico Institucional	Resolución de Contraloría N° 258 – 2025 -CG	https://doc.contraloria.gob.pe/transparencia/documentos/pte/2025/RC-258-2025-CG.pdf	Completado
2. Designar al Líder de Gobierno y Transformación Digital	Resolución de Contraloría N° 693 – 2024 -CG	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7247994/6199710-resolucion-de-contraloria-n-693-2024-cg.pdf?v=1732058879	Completado
3. Constituir el Comité de Gobierno y Transformación Digital	Resolución de Contraloría N° 501-2025 -CG	https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/7407675-501-2025-cg	Completado
4. Elaborar y aprobar el Plan de Gobierno Digital	Resolución de Contraloría N° 322 – 2025 -CG	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8484705/7036844-resolucion-de-contraloria-n-322-2025-cg.pdf?v=1755104507	Completado
5. Incorporar su página web a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano GOB.PE	Cumplimiento Decreto Supremo N° 033-2018-PCM	https://www.gob.pe/contraloria	Completado
6. Desplegar el Modelo de Gestión Documental	Resolución de Contraloría N.° 169-2022-CG	https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/2913211-169-2022-cg	Completado
7. Implementar el Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital	Resolución de Contraloría N.° 170-2024-CG	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6123927/5412606-resolucion-de-contraloria-n-170-2024-cg.pdf?v=1711641140	Completado

8. Publicar Datos Abiertos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos	Resolución de Contraloría N° 036 – 2024 -CG	https://www.datosabiertos.gob.pe/group/contralor%C3%ADa-general-de-la-rep%C3%BAblica-del-per%C3%BA	Completado
9. Incorporar la información territorial a la Plataforma Digital Georreferenciada del Estado	Resolución de Contraloría N° 036 – 2024 -CG	https://visor.geoperu.gob.pe/	Completado
10. Lanzar la estrategia digital de la entidad con los servidores públicos internos y en los medios de difusión externos, a fin de fortalecer el despliegue y aprovechamiento de las tecnologías digitales en beneficio de los ciudadanos.	Plan de Difusión y sensibilización del Gobierno y Transformación Digital 2025.	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7682625/4903593-plan-de-difusion-y-sensibilizacion-del-gobierno-y-transformacion-digital-en-la-contraloria-general-de-la-republica-2025.pdf?v=1740493954	Completado
11. Designar al Oficial de Seguridad y Confianza Digital	Resolución de Contraloría N° 226 – 2022 -CG	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3168781/Resoluci%C3%B3n%20de%20Contralor%C3%ADa%20N%C2%B0%20226-2022-CG.pdf?v=1654043897	Completado
12. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	Resolución de Secretaria de Gobierno y Transformación Digital N° 003-2023-PCM/SGTD	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4949709/Resoluci%C3%B3n%20de%20Contralor%C3%ADa%20N%C2%B0%20293-2023-CG.pdf?v=1691444729 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7390668/6302573-resolucion-de-contraloria-n-726-2024-cg.pdf?v=1734531221	Completado
13. Designar funcionario Responsable del Software Público y Obligatoriedad de compartir el Software Público	Resolución de Contraloría N° 366 – 2018 -CG	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1691256/Resoluci%C3%B3n%20de%20Contralor%C3%ADa.pdf?v=1614207239	Completado
14. Formular el Plan de Transición al Protocolo IPV6	Decreto Supremo N° 081 – 2017 – PCM	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8525151/7063927-14_ipv6.pdf?v=1755785575	Completado
15. Disponer de una Mesa de Partes Digital	Resolución de Contraloría N.º R.S.G 090-2020-SGE	https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/	Completado
16. Publicar la información del Texto Único de Procedimientos Administrativos en la Plataforma Digital	Resolución de Contraloría N.º 237-2022-CG	https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/3130894-237-2022-cg	Completado


	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025 – 2027 (Fecha de corte 31 de diciembre de 2025)	Código: INF-PGD-001 Versión: 01 Página: 19 de 20
---	---	---

Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano GOB.PE			
17. Cumplir con la Encuesta Nacional de Activos Digitales del Estado	Resolución Ministerial N° 310-2013-PCM y Decreto Supremo N° 029-2021-PCM	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8525174/7063942-17_enad-2025.pdf?v=1755785706	Completado
18. Publicar y consumir los servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad	Decreto Supremo N° 083-2011-PCM y normativa complementaria	https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/408732-reporte-sobre-entidades-que-publicaron-servicios-en-la-plataforma-nacional-de-interoperabilidad	Completado
19. Implementar el Portal de Transparencia Estándar	Decreto Supremo N° 063-2010-PCM y normativa complementaria	https://portaltransparencia.contraloria.gob.pe/	Completado
20. Designar al Oficial de Gobierno de Datos	Resolución de Contraloría N.° 244-2022-CG	https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/3146458-244-2022-cg	Completado

Fuente: Elaboración propia, intranet y plataforma gob.pe de la CGR.

11. CONCLUSIONES

- El presente informe, es elaborado conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM y modificatoria, y el inciso f) del artículo 2 de la Resolución de Contraloría N° 501-2025-CG, donde señala que se debe realizar la elaboración de informes anuales que midan el progreso de la implementación del Plan de Gobierno Digital. Para su elaboración, se tomó en consideración la información brindada por los órganos y unidades orgánicas de la CGR responsables de los proyectos del PGD 2025 - 2027, así como los aportes de los integrantes del Comité de Gobierno y Transformación Digital.
- Se programaron 12 proyectos dentro del Plan de Gobierno Digital 2025 – 2027, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2025, de los cuales siete (7) proyectos se encuentran en el estado de ejecución, y cinco (5) proyectos se encuentran en el estado de planificación, donde un subproyecto asignado a la Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica se encuentra en ejecución, conforme se muestra en la Tabla 5.
- Asimismo, según el detalle en el numeral X del presente informe, se realizó el cumplimiento del 100% de los compromisos priorizados por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, en materia de Gobierno y Transformación Digital.

 <p>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025 – 2027 (Fecha de corte 31 de diciembre de 2025)</p>	<p>Código: INF-PGD-001 Versión: 01 Página: 20 de 20</p>
---	---	--

12. RECOMENDACIONES

- Realizar el seguimiento semestral con la finalidad de determinar el porcentaje de avance de ejecución de los proyectos que conforman el Plan de Gobierno Digital; y así lograr los objetivos de gobierno digital que están alineados y brindan soporte a los objetivos de estratégicos de la CGR.
- Continuar con el trámite de la actualización del Plan de Gobierno Digital 2025 – 2027 por parte del Comité de Gobierno y Transformación Digital de la CGR, debido a la actualización de la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la CGR, que entró en vigencia el 08 de setiembre del 2025.
