



Resolución Directoral Ejecutiva

N° 090 - 2017 - MINEDU / VMGI - PRONIED

Lima, 15 JUN. 2017

VISTO:

El Informe N° 080-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OTI e Informe N° 016-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OTI-RACB elaborados por la Oficina de Tecnologías de la Información; el Informe N° 164-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° 752-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ e Informe N° 615-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y;

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, del 30 de mayo de 2014, se creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa-PRONIED, con el objeto de ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública de Educación Básica y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la misma, cuando corresponda, de manera concertada y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en forma planificada, articulada y regulada; en el marco de las políticas sectoriales de educación en materia de infraestructura educativa; a fin de contribuir a la mejora en la calidad de la educación del país;

Que, por Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU de fecha 13 de enero de 2016 se aprobó el Manual de Operaciones del PRONIED y se establecieron, entre otras, las funciones del cargo de Director Ejecutivo;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, publicada el 14 de enero de 2016, se aprobó el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª. Edición, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática"; derogando la Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM;

Que, mediante Informe N° 080-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-OTI, de fecha 12 de mayo de 2016, la Oficina de Tecnologías de la Información presenta entre otros, el documento normativo denominado "Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información" a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001; solicitando la aprobación del mismo a través de Resolución Directoral Ejecutiva;



Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Informe N° 164-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, de fecha 06 de junio de 2017, opina favorablemente por la aprobación del documento normativo señalado en el párrafo precedente;

Que, mediante Informe N° 615-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, de fecha 07 de junio de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica después del análisis al documento normativo denominado "Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información" emite opinión legal favorable, señalando que éste cuenta con el sustento legal suficiente al amparo de lo establecido en la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM en el marco de los lineamientos señalados en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC-27001:2014, la cual exige a las Entidades Públicas cumplir con las políticas en materia de seguridad de la información. Asimismo, contribuye al adecuado desarrollo del aparato administrativo del PRONIED y por ende al cumplimiento de sus funciones y objetivos, correspondiendo su aprobación por la Dirección Ejecutiva;

Que, en ese sentido resulta pertinente aprobar el "Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED";

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª. Edición, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática", en el Manual de Operaciones del PRONIED, aprobado por Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU y con los visados de la Oficina de Tecnologías de la Información, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el "Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED" el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la difusión del presente Plan, a todas las unidades orgánicas del PRONIED a través del correo electrónico institucional.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional del PRONIED (www.pronied.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia
-Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**SGSI-001 – PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN.**

**Área de Seguridad de la Información
Oficina de Tecnologías de la Información**

**PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

Lima - Perú
2017



PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Comité de Gestión de Seguridad de la Información

Código de Documento:

SGSI-001

Fecha:

02/05/2017

HISTORIAL DE REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
02/05/2017	1.0	Elaboración del Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Oficina de Tecnologías de la Información



PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	Comité de Gestión de Seguridad de la Información		
	Código de Documento:	SGSI-001	Fecha: 02/05/2017

ÍNDICE

1.	FINALIDAD	4
2.	OBJETIVO	4
3.	ALCANCE	4
4.	BASE NORMATIVA	4
5.	DISPOSICIONES GENERALES	5
6.	RESPONSABILIDADES.....	7
7.	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	7
7.1	Cronograma de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Mayo 2017 – febrero 2018	8



 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	Comité de Gestión de Seguridad de la Información		
	Código de Documento:	SGSI-001	Fecha: 02/05/2017

1. FINALIDAD

El Plan de tiene por finalidad definir las fases para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, gestionar la protección de los activos de información de la institución asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del PRONIED.



2. OBJETIVO

Proteger los activos de información del PRONIED, fortaleciendo la seguridad de la información con la implementación de controles que sirvan de soporte al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM.



3. ALCANCE

El Plan de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es de cumplimiento obligatorio del personal del PRONIED y de terceros, independientemente de su régimen laboral o contractual.



4. BASE NORMATIVA

- Ley N° 28716, del 18 de abril del 2006, Ley de Control Interno de las entidades del estado.
- Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, Crean el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED
- Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, aprueban el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.
- Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, de fecha 08 de enero de 2016, Aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC-27001:2014. Tecnología de la Información, Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª. Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.
- Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG, del 20 de enero del 2017, que aprueba la “Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”.
- Resolución Directoral Ejecutiva N° 060-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, que aprueba la designación del Oficial de Seguridad de la Información del PRONIED.




PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	Comité de Gestión de Seguridad de la Información		
	Código de Documento:	SGSI-001	Fecha: 02/05/2017

- Resolución Directoral Ejecutiva N° 068-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, que aprueba la conformación del Comité de Gestión de Seguridad de la Información del PRONIED.

5. DISPOSICIONES GENERALES

- 5.1 Las fases generales para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información son cinco (05) de acuerdo al siguiente detalle:

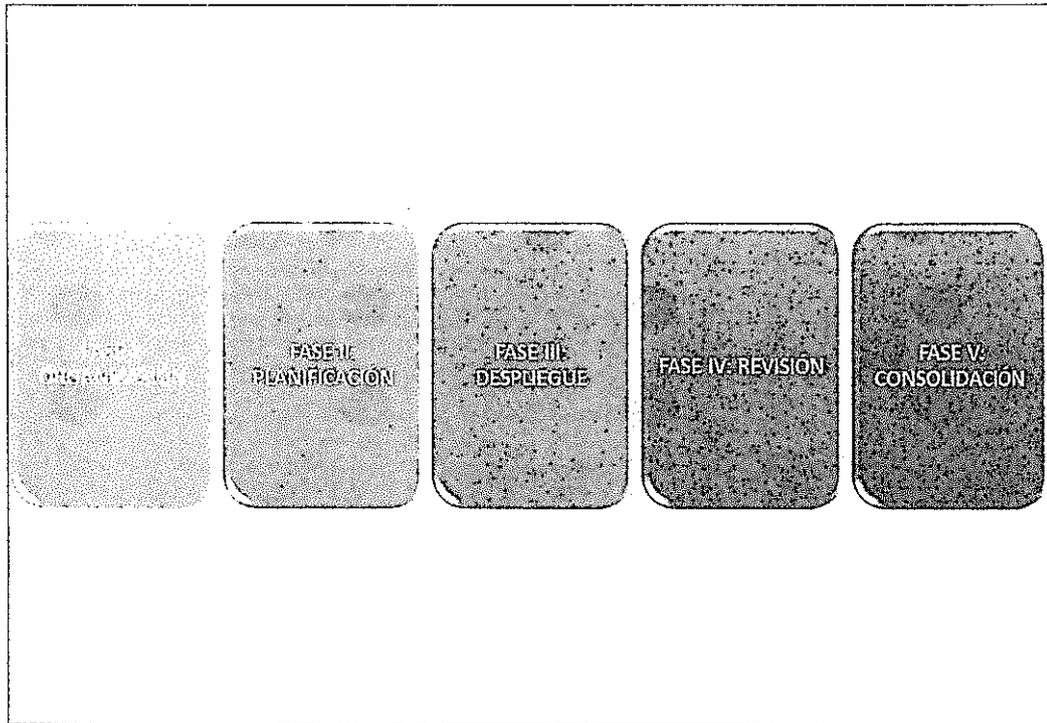

- Fase I: Organización, permite establecer las bases del SGSI, comprende la designación del Oficial de Seguridad de la información, conformación del Comité de Gestión de Seguridad de la Información, estableciendo la política, alcances, riesgos, entre otra documentación relacionada al SGSI.
- Fase II: Planificación, desarrolla las actividades de planificación como evaluación de riesgos, plan de tratamientos de riesgos, declaración de aplicabilidad, plan de sensibilización de seguridad de la información.
- Fase III: Despliegue, realiza las actividades de implementación al desarrollar documentos y registros necesarios, así como controles de seguridad de la información.
- Fase IV: Revisión, realizar actividades de recopilación de datos, elaborar formatos y realizar monitoreo del desempeño del SGSI.

PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	Comité de Gestión de Seguridad de la Información		
	Código de Documento:	SGSI-001	Fecha: 02/05/2017

- Fase V: Consolidación, son las acciones correctivas que se realizan al SGSI, se implementan controles de seguridad correctivos y documentan evaluaciones de desempeño.



5.2 El plan de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información debe ser aprobado y publicado para que todo el personal del PRONIED pueda conocerlo y cumplirlo


5.3 Glosario de Términos

- Plan de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Es el documento que especifica las fases y cronograma que se van a cumplir con la finalidad de iniciar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Política de Seguridad de la Información.
Documento de contenido genérico que establece el compromiso de la Dirección Ejecutiva y el enfoque de la institución en la Gestión de la Seguridad de la Información, dentro del marco normativo que se rige en las entidades del estado.
- Confidencialidad
Evitar que las personas no autorizadas puedan acceder a la información.
- Integridad
Guardar la totalidad de la información, cuyo contenido debe permanecer inalterado a menos que sea modificado por personal autorizado.
- Disponibilidad
La información y los recursos relacionados se encuentren disponibles para el personal autorizado.
- Control
Herramienta de gestión de riesgo, incluidas políticas, pautas, estructuras organizacionales, que pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, gerencial o legal.
- Comité de Seguridad de la Información
Directivos del PRONIED designados en base a los lineamientos mencionados en la Resolución 004-2016-PCM.
- Activo
Son los bienes que tienen valor para el PRONIED, siendo tangibles o intangibles.




PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	Comité de Gestión de Seguridad de la Información		
	Código de Documento:	SGSI-001	Fecha: 02/05/2017

- Registro
Documento que indique los resultados obtenidos o proporcione evidencia de las actividades desempeñadas.
- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Proporciona un modelo para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la protección de los activos de información para lograr los objetivos de negocio, ayuda a establecer políticas, procedimientos y controles de seguridad de la información.



6. RESPONSABILIDADES

- **Del Director Ejecutivo**
Es responsable de la aprobación del plan y de propiciar su ejecución.
- **Del Comité de Gestión de Seguridad de la Información**
Es responsable de la implementación del presente plan, para garantizar la seguridad de los activos de información de la institución.
- **Del Oficial de Seguridad de la Información:**
Es responsable de desarrollar las fases de acuerdo al cronograma establecido, en coordinación con el Comité de Gestión de Seguridad de la Información.



7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN





	Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	Comité de Gestión de Seguridad de la Información		
	Código de Documento:	SGSI-001	Fecha: 02/05/2017

7.1 Cronograma de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Mayo 2017 – febrero 2018




Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Aprueba	% completado
1	SGSI	214 días	mar 02/05/17	vie 23/02/18				0%
2	FASE I: ORGANIZACIÓN	54 días	mar 02/05/17	vie 14/07/17				0%
3	Conformar el Comité de Seguridad de la Información	10 días	mar 02/05/17	lun 15/05/17		Responsables de acuerdo a la resolución ministerial N° 004-2016-PCM	Directora ejecutiva mediante RDE	0%
4	Elaborar informe a la dirección ejecutiva para la conformación del comité del SGSI	1 día	mar 02/05/17	mar 02/05/17		Ronald Cornejo		0%
5	Remitir el informe a la Dirección Ejecutiva	1 día	mié 03/05/17	mié 03/05/17	4	Secretaria OTI		0%
6	Aprobación del comité de SGSI	3 días	jue 04/05/17	lun 08/05/17	5	Dirección ejecutiva	Directora ejecutiva mediante RDE	0%



 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	Comité de Gestión de Seguridad de la Información		
	Código de Documento:	SGSI-001	Fecha: 02/05/2017


Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Aprueba	% completado
7	Preparar Proyecto de informe para DE referente a notificar a la ONGEI	1 día	mar 09/05/17	mar 09/05/17	6	Ronald Cornejo		0%
8	Preparar proyecto de Oficio para ONGEI	1 día	mar 09/05/17	mar 09/05/17	6	Ronald Cornejo		0%
9	Llevar los borradores a OAJ para su verificación	1 día	mar 09/05/17	mar 09/05/17	6	Ronald Cornejo		0%
10	Envío de Informe y Proyecto de Oficio, RDE del Plan de implementación del SGSI a DE para envío a la ONGEI	1 día	mié 10/05/17	mié 10/05/17	9			0%
11	Envío de OFICIO a ONGEI con el Plan de implementación de Seguridad de la Información	3 días	jue 11/05/17	lun 15/05/17	10			0%
12	Aprobar el Plan y Política de Seguridad de la Información	8 días	lun 15/05/17	mié 24/05/17	3	OTI, Comité de Seguridad de la Información	Directora ejecutiva mediante RDE	0%
13	Coordinar con Asesoría Jurídica y OPP respecto a la aceptación del plan y política	1 día	lun 15/05/17	lun 15/05/17		Ronald Cornejo		0%



 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	Comité de Gestión de Seguridad de la Información		
	Código de Documento:	SGSI-001	Fecha: 02/05/2017


Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Aprueba	% completado
14	Elaborar Memorando múltiple dirigido a los miembros del comité acerca del Plan y Política	1 día	mar 16/05/17	mar 16/05/17	13	Ronald Cornejo		0%
15	Elaborar el Informe dirigido a la Dirección Ejecutiva	1 día	mié 17/05/17	mié 17/05/17	14	Ronald Cornejo		0%
16	Remitir el informe a la Dirección Ejecutiva para aprobar el plan	1 día	jue 18/05/17	jue 18/05/17	15	Secretaria OTI		0%
17	Coordinaciones con OAI - consultas del respecto a la Política y el Plan de implementación del SGSI	1 día	vie 19/05/17	vie 19/05/17	16	Ronald Cornejo, OAI		0%
18	Aprobar el plan y la Política de Seguridad de la Información	3 días	lun 22/05/17	mié 24/05/17	3	OTI, Comité de Seguridad de la Información	Directora ejecutiva mediante RDE	0%
19	Preparar memorando múltiple a todas las áreas indicando que se inicia la implementación del SGSI	2 días	lun 22/05/17	mar 23/05/17	17	Ronald Cornejo		0%





 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	Comité de Gestión de Seguridad de la Información		
	Código de Documento:	SGSI-001	Fecha: 02/05/2017

Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Aprueba	% completado
20	Enviar Plan de Seguridad de la Información a ONGEI	2 días	jue 25/05/17	vie 26/05/17	19			0%
21	Remitir Proyecto de Informe y Oficio a Dirección Ejecutiva para su envío a ONGEI	1 día	mié 24/05/17	mié 24/05/17		Secretaria OTI		0%
22	Envío a ONGEI el Plan de implementación del SGSI	1 día	jue 25/05/17	jue 25/05/17	21	Dirección Ejecutiva		0%
23	Remitir memorando múltiple a todas las áreas	1 día	mié 24/05/17	mié 24/05/17	19	Secretaria OTI		0%
24	Definir los alcances del SGSI (Procesos del negocio afectados)	13 días	lun 29/05/17	mié 14/06/17	23	Comité de Seguridad de la Información, OTI	Aprueba informe	0%
25	Elaborar Borrador de Alcance de los procesos de negocio afectos al SGSI	5 días	lun 29/05/17	vie 02/06/17		Ronald Cornejo		0%
26	Reunión con los responsables designados de las áreas afectas al SGSI	2 días	lun 05/06/17	mar 06/06/17	25	Recursos Humanos		0%
27	Corrección Observaciones al Alcance	2 días	mié 07/06/17	jue 08/06/17	26	Ronald Cornejo		0%



 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	Comité de Gestión de Seguridad de la Información		
	Código de Documento:	SGSI-001	Fecha: 02/05/2017

Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Aprueba	% completado
28	Elaborar Memorando al Comité SGSI con la propuesta de procesos de negocio	1 día	vie 09/06/17	vie 09/06/17	27	Ronald Cornejo		0%
29	Elaborar Informe para la Dirección Ejecutiva	1 día	lun 12/06/17	lun 12/06/17	28	Ronald Cornejo		0%
30	Remitir informe a la DE para su visado	1 día	mar 13/06/17	mar 13/06/17	29	Secretaria OTI		0%
31	Aprobación y visado en la Dirección ejecutiva	1 día	mié 14/06/17	mié 14/06/17	30	Dirección ejecutiva	Aprueba informe	0%
32	Aprobar el Plan de Riesgos de Seguridad de la Información	11 días	jue 15/06/17	jue 29/06/17	24	Comité de Seguridad de la Información, OTI	Aprueba informe	0%
33	Desarrollar el borrador del Plan de Riesgos	6 días	jue 15/06/17	jue 22/06/17		Ronald Cornejo		0%
34	Reunión con áreas involucradas de procesos de negocio	1 día	vie 23/06/17	vie 23/06/17	33	Ronald Cornejo		0%
35	Levantar Observaciones	1 día	lun 26/06/17	lun 26/06/17	34	Ronald Cornejo		0%
36	Elaborar informe a Dirección ejecutiva solicitando visado	2 días	mar 27/06/17	mié 28/06/17	35	Recursos Humanos		0%

 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	Comité de Gestión de Seguridad de la Información		
	Código de Documento:	SGSI-001	Fecha: 02/05/2017

Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Aprueba	% completado
37	Remitir informe a Dirección Ejecutiva	1 día	jue 29/06/17	jue 29/06/17	36	Ronald Cornejo		0%
38	Evaluación y tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información	11 días	vie 30/06/17	vie 14/07/17	32	Ronald Cornejo	Aprueba informe	0%
39	Elaborar el borrador del Plan de tratamiento de riesgos	6 días	vie 30/06/17	vie 07/07/17		Ronald Cornejo		0%
40	Reunión con los responsables de áreas para su tratamiento	1 día	lun 10/07/17	lun 10/07/17	39	Ronald Cornejo		0%
41	Levantar Observaciones	1 día	mar 11/07/17	mar 11/07/17	40	Ronald Cornejo		0%
42	Elaborar memorando para Comité de Seguridad	1 día	mié 12/07/17	mié 12/07/17	41			0%
43	Elaborar informe para la Dirección ejecutiva solicitando el visado de la evaluación y tratamiento de riesgos	1 día	jue 13/07/17	jue 13/07/17	42	Ronald Cornejo		0%
44	Remitir informe a la Dirección Ejecutiva para su aprobación	1 día	vie 14/07/17	vie 14/07/17	43	Secretaria OTI		0%





 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	Comité de Gestión de Seguridad de la Información		
	Código de Documento:	SGSI-001	Fecha: 02/05/2017

Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Aprueba	% completado
45	FASE II: PLANIFICACIÓN	60 días	lun 17/07/17	vie 06/10/17				0%
46	Elaborar el documento de valoración de activos	10 días	lun 17/07/17	vie 28/07/17		Ronald Cornejo	Aprueba informe	0%
47	Elaborar la Matriz de Evaluación de riesgos	13 días	lun 31/07/17	mié 16/08/17	46	Ronald Cornejo	Aprueba informe	0%
48	Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos	14 días	jue 17/08/17	mar 05/09/17	47	Ronald Cornejo	Aprueba informe	0%
49	Elaborar el Documento Declaración de Aplicabilidad	13 días	mié 06/09/17	vie 22/09/17	48	Ronald Cornejo	Aprueba informe	0%
50	Elaborar el Plan de Sensibilización de Seguridad de la Información	10 días	lun 25/09/17	vie 06/10/17	49	Ronald Cornejo	Aprueba informe	0%
51	FASE III DESPLIEGUE	55 días	lun 09/10/17	vie 22/12/17				0%
52	I Capacitación al personal del PRONIED en Seguridad de la Información	10 días	lun 09/10/17	vie 20/10/17		OTI, Recursos Humanos	Aprueba informe	0%
53	Gestión de Activos , "Elaborar directiva de Gestión de Activos"	7 días	lun 23/10/17	mar 31/10/17	52	Ronald Cornejo	Aprueba mediante RDE	0%
54	Control de Acceso , "Elaborar Directiva de Control de Acceso"	7 días	mié 01/11/17	jue 09/11/17	53	Ronald Cornejo	Aprueba mediante RDE	0%

 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	Comité de Gestión de Seguridad de la Información		
	Código de Documento:	SGSI-001	Fecha: 02/05/2017

Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Aprueba	% completado
55	Seguridad en las Operaciones, Elaborar formatos de control	7 días	vie 10/11/17	lun 20/11/17	54	Ronald Cornejo	Aprueba informe	0%
56	Seguridad en las Comunicaciones, elaborar Directiva	7 días	mar 21/11/17	mié 29/11/17	55	Ronald Cornejo	Aprueba mediante RDE	0%
57	Relaciones con los Proveedores, "Elaborar directiva de proveedores"	7 días	jue 30/11/17	vie 08/12/17	56	Ronald Cornejo	Aprueba mediante RDE	0%
58	Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información, "Elaborar propuesta de directiva"	7 días	lun 11/12/17	mar 19/12/17	57	Ronald Cornejo	Aprueba mediante RDE	0%
59	Elaborar Directiva para aspectos de Seguridad de la Información en la continuidad de negocio	3 días	mié 20/12/17	vie 22/12/17		Ronald Cornejo	Aprueba informe	0%
60	FASE IV: REVISIÓN	22 días	mar 26/12/17	mié 24/01/18				0%
61	Recopilación de datos para desempeño del SGSI	12 días	mar 26/12/17	mié 10/01/18		Ronald Cornejo	Aprueba informe	0%
62	Realizar formatos faltantes	10 días	jue 11/01/18	mié 24/01/18	61	Ronald Cornejo	Aprueba informe	0%
63	FASE V: CONSOLIDACIÓN	22 días	jue 25/01/18	vie 23/02/18		Ronald Cornejo		0%

 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	Comité de Gestión de Seguridad de la Información		
	Código de Documento:	SGSI-001	Fecha: 02/05/2017

Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Aprueba	% completado
64	Elaborar documento de acciones correctivas del SGSI	12 días	jue 25/01/18	vie 09/02/18		Ronald Cornejo	Aprueba informe	0%
65	Implementar controles correctivos	7 días	lun 12/02/18	mar 20/02/18	64	Ronald Cornejo	Aprueba informe	0%
66	Elaborar Informe de para Dirección Ejecutiva acerca de implementación del SGSI	1 día	mié 21/02/18	mié 21/02/18	65	Ronald Cornejo	Aprueba informe	0%
67	Remitir Oficio a ONGEI acerca de implementación del SGSI	2 días	jue 22/02/18	vie 23/02/18	66	Ronald Cornejo	Aprueba informe	0%

