

CONVENIO N° 577 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Públicos entre El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Parco

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Públicos que celebran:

- **El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento** a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatorias, con RUC N° 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la República N° 3361, Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director Ejecutivo, Señor Néstor Alfonso Supanta Velásquez, identificado con DNI N° 09285943, designado por Resolución Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y debidamente facultado por Resolución Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se denominará **VIVIENDA**.

La **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PARCO**, con RUC N° 20187024286 y domicilio legal en Jr. Amazonas N° 221, Distrito de El Parco, Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas, debidamente representada por su Alcalde Señor Marco Antonio Carhuatanta Julca, identificado con DNI N° 41621870, según Credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, en lo sucesivo **LA MUNICIPALIDAD**.

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

- 1.1. **VIVIENDA** es el órgano rector del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, que conforme a la Ley N° 30156 – Ley de Organización y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento.
- 1.2. **LA MUNICIPALIDAD** es un órgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y funciones que le asigna la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N° 27783 – Ley de Bases de Descentralización.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población.

En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función; por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben

hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el artículo V, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Así, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la función específica compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se creó el Programa “Agua para Todos”, bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, como responsable de coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y Programas del sector saneamiento, financiados con recursos públicos y otros en lo que corresponda, localizados en las áreas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento.

2.2 Mediante la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, se modifica la denominación del Programa “Agua para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y se delimitó su ámbito de intervención a las áreas urbanas a nivel nacional.

2.3 Mediante la Resolución Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los Criterios de Elegibilidad y Priorización para la asignación de recursos a Proyectos de Inversión Pública en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

2.4 Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa Nacional de Saneamiento Urbano, durante el año fiscal 2015, evaluar las solicitudes de financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de financiamiento de los proyectos de inversión pública de saneamiento del ámbito de los centros poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Asimismo, mediante la Resolución Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de diciembre de 2016, la autorización al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para intervenir en proyectos de inversión pública de saneamiento del ámbito de los centros poblados rurales, contenida en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificado por el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.

2.5 **LA MUNICIPALIDAD** mediante Oficio N° 143-2015-MDEP-A y Oficio N° 103-2016-MDEP/DA, solicitó financiamiento a **VIVIENDA** para la ejecución del Proyecto “**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERÍO SAN JOSE Y ANEXOS, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS**”, con código SNIP N° 324862, en adelante **PROYECTO**.

2.6 La Unidad de Coordinación Regional del PNSU mediante Informe N° 019-2016-VIVIENDA/VMCS/PNS/3.3, informa que el **PROYECTO** cumple con los criterios de admisibilidad y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA.

2.7 La Unidad de Estudios del PNSU mediante Informe Técnico N° 116-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° 190-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2, informa que el **PROYECTO** cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, precisando que el monto de inversión del **PROYECTO** registrado en el Banco de Proyectos del SNIP es:

Monto de Inversión con declaración de viabilidad: S/. 2,585,585.00
Monto de Inversión modificado en la fase de inversión: S/. 3,433,263.06
Costo de la Obra: S/. 3,285,185.00
Costo de Supervisión: S/. 120,051.00
Costo de Expediente Técnico: S/. 55,000.00

Asimismo, emite opinión técnica favorable para la transferencia de recursos públicos a favor de **LA MUNICIPALIDAD** para el financiamiento de la ejecución y supervisión de las Obras del **PROYECTO** hasta por la suma de S/. 3'378,238 .00, el mismo que se financiará con cargo a los recursos de **VIVIENDA**.


2.8 De acuerdo al numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realización de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecución de proyectos de inversión pública, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripción de convenio, las que se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes para el financiamiento por parte de **VIVIENDA** de la ejecución y supervisión de la Obra del **PROYECTO** denominado "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERÍO SAN JOSE Y ANEXOS, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS**", con código SNIP N° 324862, el que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Indirecta y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

VIVIENDA financiará el **PROYECTO** hasta la suma de S/. 3'378,238.00 (Tres Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Ocho con 00/100 Soles), de los cuales la suma de S/. 2'043,143.00 se financiará con cargo al presupuesto de año 2016 y la suma de S/. 1'335,095.00 se financiará con cargo al Presupuesto del año 2017 de **VIVIENDA**.



La Estructura de Financiamiento del **PROYECTO** se establece en el **ANEXO 1-A**, que forma parte integrante del presente Convenio.

LA MUNICIPALIDAD podrá aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos que se originen en la ejecución y/o supervisión de la Obra del **PROYECTO**, de ser el caso.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripción del mismo y culmina con la Liquidación Física y Financiera del **PROYECTO** que presentará **LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA**.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:

6.1 DE VIVIENDA:

6.1.1 Gestionar la emisión del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de **LA MUNICIPALIDAD** para el financiamiento del **PROYECTO** en el presente año fiscal, conforme a la Estructura de Financiamiento establecido en el **ANEXO 1-A**.

6.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecución del **PROYECTO**. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizarán sobre la base de la información del avance físico y financiero de la ejecución del **PROYECTO** que presente **LA MUNICIPALIDAD**, conforme al numeral 13.4 del artículo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza **VIVIENDA** en el marco del presente Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora, corresponden a la **MUNICIPALIDAD** en relación a la supervisión de la ejecución de la Obra, así como de las acciones de control que correspondan.

6.1.3 Comunicar al Órgano de Control Institucional de **LA MUNICIPALIDAD**, y a la Contraloría General de la República en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o cuando no cumpla con realizar la Liquidación Técnica y Financiera del **PROYECTO**; adicionalmente al Ministerio de Economía y Finanzas cuando se tome conocimiento de presuntos hechos irregulares en la ejecución del **PROYECTO**,

6.2 DE LA MUNICIPALIDAD

6.2.1 Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por **VIVIENDA**, de acuerdo a la normativa presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas que resulte aplicable, asegurando el correcto registro de los códigos presupuestales señalados en el dispositivo legal que autoriza la transferencia de los recursos.

6.2.2 Utilizar los recursos transferidos por **VIVIENDA**, única y exclusivamente para el financiamiento del **PROYECTO**, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos recursos, así como destinarlos en custodia bajo ningún otro concepto o depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro Público.

6.2.3 Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido el disposición legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los trámites para las convocatorias de los procedimientos de selección para la contratación de la ejecución y supervisión de la Obra del **PROYECTO**, para lo cual deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demás normas aplicables a la ejecución del Proyecto; No se aplica a la ejecución del **PROYECTO** los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado; la **MUNICIPALIDAD** se obliga a utilizar las bases estandarizadas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para los procesos de selección que correspondan al **PROYECTO**.




6.2.4 La **MUNICIPALIDAD** es responsable, previamente a la ejecución de la Obra, de obtener la Resolución que aprueba la Certificación Ambiental del **PROYECTO**.

6.2.5 Subsanan las observaciones e implementar las recomendaciones que efectúe el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, en los procedimientos de selección convocados.

6.2.6 Informar periódicamente a **VIVIENDA** sobre el avance físico y financiero de la ejecución de la Obra y presentar copia de los informes emitidos por la Supervisión del **PROYECTO**.

6.2.7 Facilitar a **VIVIENDA** las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecución del **PROYECTO**, garantizando el libre acceso a la información, así como cumplir con las recomendaciones y/o observaciones que realice **VIVIENDA** en relación a la ejecución del **PROYECTO**.



6.2.8 En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervisión y control de la ejecución de la Obra, así como de la administración de los contratos suscritos para la ejecución de la Obra.



6.2.9 Encargarse de la operación y la prestación de servicios de saneamiento en favor de la población del ámbito del Proyecto, así como del mantenimiento de la infraestructura del Proyecto y garantizar la sostenibilidad del mismo.



6.2.10 A la finalización del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolución del mismo, deberá efectuar la Liquidación Técnica y Financiera del **PROYECTO**, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles y comunicar a **VIVIENDA** de los saldos resultantes, debiendo abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias efectuadas. Dichos saldos deberán ser revertidos al Tesoro Público conforme a la normatividad de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF.



6.2.11 **LA MUNICIPALIDAD** autoriza a **VIVIENDA** para gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la aplicación de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementación del Convenio.

6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecución del **PROYECTO**, el cartel de obra, con el distintivo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, excepto en los casos de periodo electoral declarados conforme a la Ley Orgánica de Elecciones.

CLÁUSULA SÉTIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier modificación al contenido y alcances del presente Convenio será aprobado por acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribirá la Adenda correspondiente, la que formará parte integrante del presente Convenio.



CLÁUSULA OCTAVA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES

8.1 Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente Convenio, **LA MUNICIPALIDAD** designará a un Coordinador responsable de la información sobre la ejecución y supervisión del **PROYECTO**; dicha designación será comunicada a **VIVIENDA**, mediante carta indicándose los correos electrónicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones respectivas.

8.2 El Coordinador designado podrá ser sustituido mediante comunicación escrita de **LA MUNICIPALIDAD**, durante la vigencia del presente Convenio.

8.3 Por parte de **VIVIENDA**, la Coordinación se realizará a través de la Unidad de Monitoreo y Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad designará al Coordinador responsable.



CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

9.1 El presente Convenio podrá resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

9.1.1 Por acuerdo entre las partes.

9.1.2 En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, presupuestal, administrativo o de otra índole que imposibilite la implementación de este Convenio.

9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el presente Convenio y/ por la contravención de la normas legales aplicables a la ejecución del **PROYECTO**.

9.2 Para la Resolución del Convenio, una de las partes deberá comunicar a la otra, mediante comunicación escrita, la decisión de resolverlo, con expresión de causa.



- 9.3 Si la resolución del Convenio es realizada por **VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD** deberá abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la liquidación técnico y financiera del Proyecto (obra y supervisión) en el plazo máximo establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; además de proceder a la devolución de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Con la resolución del Convenio **LA MUNICIPALIDAD** es responsable de la ejecución del **PROYECTO**.

CLÁUSULA DECIMO DECIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

- 10.1 **LA MUNICIPALIDAD**, a través de su Alcalde, se obligan al estricto cumplimiento del presente Convenio.
- 10.2 **LA MUNICIPALIDAD**, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la responsabilidad de ejecutar el **PROYECTO** conforme a las normas técnicas y legales aplicables; así como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar por el mal uso de los recursos públicos, sin perjuicio de la devolución de los recursos de acuerdo a ley.



CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- 11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas y Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo a las normas de la buena fe y común intención, señalando que no media vicio o error que pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto

Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto

Anexo 1-C: Base Legal del Convenio

Anexo 1-D: Ficha de Información Actualizada de Proyecto de Inversión.


Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones

- 11.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente Convenio o Adendas, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que los anima en la celebración del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variación del domicilio legal, deberá ser oportunamente comunicado por escrito y de manera indubitable a la otra parte con una anticipación no menor de tres (03) días hábiles a la fecha




de efectiva modificación. Caso contrario, surtirán efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio anterior.


Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada, salvo su modificación conforme lo señalado en el párrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente convenio.

En señal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad de Lima a los **10** días del mes de **JUNIO** del año dos mil dieciséis.




VIVIENDA

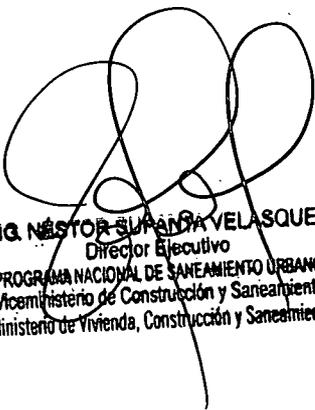
ING. NÉSTOR SULPÁN VELÁSQUEZ
Director Ejecutivo
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



LA MUNICIPALIDAD



ANEXO 1-A

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERÍO SAN JOSE Y ANEXOS, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS"



SNIP N° 3249862

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	VIVIENDA	LA MUNICIPALIDAD
Obra y Supervisión	S/. 3'378,238.00	S/. 0.00
TOTAL	S/. 3'378,238.00	S/. 0.00

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA


CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	TOTAL
Obra y Supervisión	S/. 2'043,143.00	S/. 1'335,095.00	S/. 3'378,238.00



ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente información corresponderá a la que se detalla a continuación:

- **Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP):**
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERÍO SAN JOSE Y ANEXOS, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS".
-  **Código SNIP (Código de identificación del Proyecto):**
"324862"
-  **Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:**
"Municipalidad Distrital de El Parco".
- **Ámbito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:**
"Distrito de El Parco"
-  **Número de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:**
"143 -2015- MDEP- A 1"
-  **Número de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:**
"Informe Técnico N° 116-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1"
- **Monto de Inversión a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, hasta por la suma:**
"S/. 3'378,238.00 (Tres Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Ocho con 00/100 Soles)"
-  **Modalidad de Ejecución del Proyecto:**
Administración Indirecta

ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO

El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.
- Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Texto único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
- Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
- Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusión Económica en zonas Rurales.
- Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA.
- Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.
- Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominación del Programa "Agua para Todos" a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ámbito a las áreas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para los Proyectos de áreas rurales a nivel nacional.
- Resolución Ministerial N° 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Capítulo de obras de saneamiento.
- Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N° 01-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.



ANEXO 1-D

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

Nombre del Proyecto: SNIP

I DATOS GENERALES DE LA OBRA:

FECHA:

1.- Contrato de Obra N°: Contratista:
 2.- Contrato Supervite N°: Supervisor:
 3.- Ubicación Proyecto: Localidad Distrito Provincia Departamento
 4.- Monto Contratado de Obra y Supervisión
 4.1.- Monto Contratado de Obra: SI
 4.2.- Monto Contratado Supervisión: SI
 4.3 Plazo de Contratación Supervisión:
 5.- Modalidad de Ejecución
 5.1.- Por Contrata: 5.2.- Ejecución Presupuestal Directa:
 6.- Modalidad de Contratación
 6.1.- A Precios Unitarios: 6.2.- A Suma Alzada:
 7. Financiamiento MVCS-I

Dispositivo de Transferencia	Fecha	Monto Transferencia
		SI

Telefono Correo Electrónico

8.- Residente de Obra:
 9.- Inspector de Obra:
 10.- Supervisor de Obra:
 11.- Coordinador de la UE:
 12.- Coordinador INFOBRAS:
 13.- Otros Documentos Técnicos
 13.1 Certificación Ambiental SI No
 13.2 Saneamiento Físico Leg /Libre Disponibilidad Terre SI No
 13.3 Autorización de Fuente de Agua SI No
 13.4 Autorización de vertimientos aguas residuales SI No


14.- Unidad Ejecutora:

Pag. 1

II VARIACIONES DEL CONTRATO DE OBRA:

1. Fechas de:
 1.1.- Inicio de obra: 1.2.- Entrega del terreno:
 2. Plazo de Ejecución (Días Calendarios)
 3. Fecha de Término del Plazo:
 3.1 Fecha de Término Contractual: 3.2 Fecha de Término Real
(Fecha Término Contractual= Aceptación de Plazo)

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION



FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

Pag. 2

4. Ampliaciones de Plazo :

4.1 Ampliación N° 01:	_____ días	R.D. N° _____
4.2 Ampliación N° 02:	_____ días	R.D. N° _____
4.3 Ampliación N° 03:	_____ días	R.D. N° _____
4.4 Ampliación N° 04:	_____ días	R.D. N° _____

4.5 Cronograma de Ejecución de obra vigente (d'Amp. de plazo): Si No

5.- Presupuestos Adicionales / Deductivos de Obra :

5.1 Adicional N° 01:	Si <input type="checkbox"/>	R.D. N° _____	% _____
5.2 Adicional N° 02:	Si <input type="checkbox"/>	R.D. N° _____	% _____
5.3 Adicional N° 03:	Si <input type="checkbox"/>	R.D. N° _____	% _____
Total	Si <input type="checkbox"/>	% _____	% _____

5.4 Deductivo N° 01:	Si <input type="checkbox"/>	R.D. N° _____	% _____
5.5 Deductivo N° 02:	Si <input type="checkbox"/>	R.D. N° _____	% _____
5.6 Deductivo N° 03:	Si <input type="checkbox"/>	R.D. N° _____	% _____
Total	Si <input type="checkbox"/>	% _____	% _____

5.7 Monto vigente del Contrato (Monto Contratado+Adicionales-Deductivos) Si %

5.8 Garantías

5.8.1 Carta Fianzas	Entidad Financiera	Tipo	Vigente	Vencida	Monto
					(\$)

6. Avance de Obra en Porcentaje :

6.1 Acumulado al mes anterior:	_____ %
6.2 Avance del Mes a fecha dd/mm/yyyy:	_____ %
6.3 Avance acumulado:	_____ %
6.4 Programado acumulado a la fecha:	_____ %
6.5 Avance financiero a la fecha	Si <input type="checkbox"/> _____ %

7. Estado de Avance de Obra :

7.1 Estado de la obra a la fecha: Atrasada Normal Adiantada

7.2 Causas del retraso: _____

7.3 Medidas correctivas /Penalizaciones: _____

III.- ACTIVIDADES VERIFICADAS


1. Cartel de Obra :

1.1 Ubicación adecuada:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
1.2 Dimensiones y Logos según formato del MVCS:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

2. Oficinas de Obra :

2.1 Del Contratista/Residente:	Dirección	_____
2.1.1 Ubicación adecuada:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2.1.2 Cuentan con la adecuada infraestructura de equipos y materiales	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2.2 Del Supervisor:	Dirección	_____
2.2.1 Ubicación adecuada:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2.1.2 Cuentan con la adecuada infraestructura de equipos y materiales	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION



FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

3. Personal en Obra

Pag. 3

3.1 Del Contratista :

3.1.1 Residente de Obra : Presente Ausente

3.1.2 Ingeniero Asistente : Presente Ausente

3.1.3 Personal de Obra :

3.1.4 Cantidad de Personal en campo

3.1.4.1 Cuentan con uniforme : Si No

3.1.4.2 Cuentan con implementos de seguridad : Si No

3.2 Personal de la Supervisión :

3.2.1 Jefe de Supervisión : Presente Ausente

3.2.2 Ingeniero Asistente : Presente Ausente

4. Maquinaria y Equipos :

Describir el tipo y cantidad de maquinaria presente en la obra

5. Almacén de Obra

5.1 Cuenta con los equipos y herramientas adecuados : Si No

5.2 Los materiales están debidamente almacenados : Si No


Materiales que faltan para la obra

6. Trabajos en Ejecución : Se llenara de acuerdo al tipo de proyecto y según el avance físico

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Según Exp Técnico	Avance %	Detalle/Deficiencias encontradas (*)
Componente Agua					
7.1.1	Captación o Fuente de Agua				
7.1.2	Línea de Conducción				
7.1.3	Línea de Impulsión				
7.1.4	Reservorio				
7.1.5	Línea de Aducción				
7.1.6	Redes de distribución				
7.1.7	Conexiones Domiciliarias				
Componente Alcantarillado					
7.2.1	Redes de Alcantarillado				
7.2.2	Coletores				
7.2.3	Emissores				
7.2.4	Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales				
7.2.4.1	PTAR				
7.2.4.2	Lagunas Primarias				
7.2.4.3	Lagunas Secundarias				
7.2.4.3	Tanque Séptico				
7.2.4.4	Tanque Imhoff				
7.2.5	Conexiones Domiciliarias				

(*) Se debe considerar las pruebas de estinidad diversas, análisis químicos, deficiencias constructivas, etc

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION




ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

1º. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuación se señala:

- a. Proyecto de Inversión Pública (Proyecto).- Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.
- b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingeniería de detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.
- c. Código SNIP.- El código SNIP es un número autogenerado que es asignado automáticamente por el Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversión Pública.
- d. Transferencia de recursos públicos.- Es la asignación de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales (GR), Locales (GL); y las entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecución y supervisión de proyectos de inversión pública. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificación presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.
- e. Ejecución directa e indirecta de proyectos de inversión.- Ejecución presupuestaria directa, se da cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar directamente los proyectos de inversión y cumple las disposiciones precisadas en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG". Ejecución presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante un contrato, cuyo marco regulatorio está prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus normas reglamentarias. Está sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas correspondientes.
- f. Financiamiento para ejecución y supervisión de obra pública.- Es la efectiva transferencia de recursos públicos para financiar la ejecución y supervisión de obras de proyectos de inversión una vez que estos cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el expediente técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.
- g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras del proyecto y de su supervisión.
- h. Monitoreo físico y financiero de obras.- Es la verificación de los avances en la ejecución de las obras del proyecto de inversión, en concordancia con el cronograma de ejecución de obras.
- i. Cronograma de ejecución de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de avance de obra, las actividades y la ruta crítica del proyecto.
- j. Liquidación física y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y acción final de ejecutar actos administrativos de verificación, conciliación y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobación, tanto técnica como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidación Final (obra concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidación Parcial (obra inconclusa) intervenida o paralizada por causales presupuestales u otras.
- k. Liquidación técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepción y liquidación de obra.
- l. Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecución de la obra.



- m. Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS).- Es el sistema informático que administra la Contraloría General de la República, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras públicas, ejecutadas por las modalidades de "administración directa" o "por contrata". La información a registrar incluye los avances físicos y presupuestales, así como información detallada sobre la obra (ubicación geográfica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, contratista, residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar información y realizar el seguimiento de un proyecto de inversión de obra pública, comprendiendo todas sus fases de desarrollo (pre inversión, inversión y post inversión).
- n. Finalización del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha recibido las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la Liquidación Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo señalado en el literal 6.2.11 del numeral 6.2 de la cláusula sexta. La resolución deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebración que impide que cumpla su finalidad u objeto.

2º. En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de interpretación sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

- a. La finalidad pública de la presente transferencia de recursos públicos es la ejecución y culminación de las obras del Proyecto de Inversión Pública indicado en el presente convenio, para la cual VIVIENDA realizará el monitoreo técnico y financiero correspondiente.
- b. El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los Anexos que son parte integrante del mismo según los principios de la buena fe y de su finalidad pública.
- c. El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las cláusulas se interpretarán las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado al objeto del Convenio y a su finalidad pública.
- d. Toda referencia efectuada en este documento a cláusula, numeral y anexo deberá entenderse efectuadas a las cláusulas, numerales y anexos contenidos en este convenio, salvo indicación expresa en sentido contrario.
- e. Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendrá el significado que le atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los referidos instrumentos, tendrá el significado que le asignen las normas legales aplicables.



ANEXO 01

INFORMACION DE PROYECTO									INFORMACION DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SNI	CODIGO ODFP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MUNDO GESTIONADO S/	NUMERO DE INFORME TECNICO	FECHA DE INFORME TECNICO
1	332960	2291509	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CASERIOS DE LA PAZA, LA LIBERTAD, ANEXO SAN JUAN MAYO, PALCOPAMPA, NUEVA ESPERANZA, HUANGAPAMPA - CHUCEN, ANEXO PUMALIC, DISTRITO DE CHOROPAMPA - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA	CAJAMARCA	CHOTA	CHOROPAMPA	RURAL	OBRA + SUPERV	2,381,492	INFORME TECNICO N° 105-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.1	31/05/2016
2	324917	2283146	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DEL CASERIO CHEPEN, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PARCO	AMAZONAS	BAGUA	EL PARCO	RURAL	OBRA + SUPERV	1,990,120	INFORME TECNICO N° 108-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.1	02/06/2016
3	332268	2290744	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS - CELENDIN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS	CAJAMARCA	CELENDIN	MIGUEL IGLESIAS	RURAL	OBRA + SUPERV	1,858,445	INFORME TECNICO N° 115-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.1	03/06/2016
4	324862	2281982	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DEL CASERIO SAN JOSE Y ANEKOS, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PARCO	AMAZONAS	BAGUA	EL PARCO	RURAL	OBRA + SUPERV	2,048,143	INFORME TECNICO N° 116-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.1	03/06/2016
5	321859	2278843	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	RURAL	OBRA + SUPERV	7,926,243	INFORME TECNICO N° 117-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.1	03/06/2016
6	319560	2274654	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO POBLADO CAPIRU'JIANI MAZAMARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	RURAL	OBRA + SUPERV	4,704,022	INFORME TECNICO N° 118-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.1	03/06/2016
7	267181	2238137	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE QUIRAHUARA, CCANCAIRO, CCARAIMARCA, SANTA TERESA DE CAPRACANCHA, SAN BARTOLOME Y VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCavelica	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA	HUANCavelica	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	RURAL	OBRA + SUPERV	2,438,575	INFORME TECNICO N° 119-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.1	03/06/2016
										23,282,140		



CARGO

INFORME N° 019 - 2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/UCR/3.3

A : **Ing. Nestor Supanta Velasquez**
Director del Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Asunto : Proyectos considerados admisibles y elegibles por lo establecido en la Resolución Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA y sus modificatorias.

Referencia : Resolución Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA
Resolución Ministerial N° 156-2015-VIVIENDA
Resolución Ministerial N° 042-2016-VIVIENDA
Resolución Directoral N° 014-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0

Fecha : San Isidro, **07 MAR. 2016**


Me dirijo a usted, en relación al financiamiento de proyectos de inversión en el sector saneamiento en el presente año fiscal, el cual se encuentra enmarcado de acuerdo a los criterios de admisibilidad, elegibilidad y priorización de la Resolución Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, modificada por la Resolución Ministerial N° 156-2015-VIVIENDA y por la Resolución Ministerial N° 042-2016-VIVIENDA.

En ese sentido, en cumplimiento de las normas antes referidas adjunto la relación de proyectos que cumplieron con los citados criterios (Anexo 01), así como las Fichas de Aplicación de Criterios de Admisibilidad, Elegibilidad y Priorización, visadas por los profesionales responsables de la verificación.

Cabe mencionar que los criterios de elegibilidad fueron evaluados según la información proporcionada por la Oficina General de Estadística e Informática – OGEI, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Memorandum N° 052-2016/VIVIENDA-OGEI, información basada en el Censo 2007 del INEI, registro de casos del Ministerio de Salud (2013), consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (06/2015). De la misma manera en el caso de proyectos multidistritales se tomó en cuenta la media obtenida de los puntajes por distrito beneficiado.

Atentamente,


DORA ARÉVALO QUEVEDO
Jefe (a) Unidad de Coordinación Regional
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento





Hoja de Trámite
00035717-2016
INTERNO

Remitente : PNSU - UNIDAD DE COORDINACIÓN REGIONAL
 Destinatario : PNSU - DIRECCION EJECUTIVA
 Documento : INFORME Nº 00000019-2016/VMCS/PNSU/UCR Folios : 43
 Asunto : PROYECTOS CONSIDERADOS ADMISIBLES Y ELEGIBLES POR LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº270-2014- VIVIENDA Y SUS MODIFICATORIAS.
 Fecha : 07/03/2016 05:06:27 p.m. Snip:
 Observaciones :

Destino	Acciones	Fecha	Responsable	Firma	Observaciones

- | | |
|------------------------|---|
| 1 Conocimiento y Fines | 9. Archivar |
| 2 Tramitar | 10. Evaluar |
| 3 Devolver | 11. Preparar Respuesta |
| 4 Revisar o VOB | 12. Opinión |
| 5 Coordinar | 13. Corregir |
| 6 Urgente | 14. Proceder de acuerdo a normas legales vigentes |
| 7 Pendiente | 15. Otros |
| 8 Respuesta | |

N°	SNIP	NOMBRE
1	291674	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE PINGO, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA - CAJAMARCA
2	324862	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERIO SAN JOSÉ Y ANEXOS, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS
3	324917	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERIO CHEPEN, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS
4	333698	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARIBAMBA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCÁVELICA
5	320949	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO CALLANCA, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA
6	307368	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COIPA CAPITAL Y ANEXOS DE SU PERIFERIA, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA
7	249137	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DESAGUE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PATACANCHA Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE PACCHA - JAUJA - JUNIN
8	322586	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD CAÑAS BRAVAS, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA
9	233135	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO
10	333380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI, DISTRITO DE MUÑANI - AZANGARO - PUNO
11	324802	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CP SALAZAR, DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS
12	330809	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE SAN MARTÍN DE HERCOMARCA, YURAYACU, ESTANCIA PATA, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO
13	331717	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DE LOS AA.HH. IRO. DE ENERO, CÉSAR L. SILVA, RONY VALERA Y JUAN ISERN CÓRDOVA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO
14	315404	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL JR. AREQUIPA (ENTRE LA AV. AUGUSTO FREYRE Y AV. NAVARRO CAUPER) DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO
15	323632	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AA.HH. MUNICH DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO
16	329441	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS SECTORES A, B Y C DEL AA.HH. JUAN CARLOS DEL ÁGUILACARDENAS, SECTOR NOR OESTE DEL DISTRITO DE IQUITOS,, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

17	331357	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL JR. AREQUIPA (ENTRE LA AV. AUGUSTO FREYRE Y AV. NAVARRO CAUPER) DISTRITO DE ÍQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO
18	333804	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AICAS, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO
19	325874	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CC.PP. CARLOS TIEORO, LLIPATA Y SAN MARTIN DE PORRES,, DISTRITO DE LLIPATA - PALPA - ICA
20	288804	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHUQUIMAL Y YAULICACHI, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS

